INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Santiago de Cali

Junio 05 de 2023

OFICIO - NACION 003-2022-023

Señores
FUNDACION EDICOL
María Margarita Zapata Paredes
INTERVENTORIA NACION 002 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. NACION 003 DE 2022 **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA (PNNC) Y UNA CABAÑA DE VIGILANCIA DE LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (ARC)."**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No NACION 003 DE 2022

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, queremos hacer solicitud a la interventoría del contrato de obra NACION 003 de 2022 sobre el requerimiento de ampliación de plazo de ejecución de obra desde el 15 de junio de 2023 (fecha contractual de finalización de obra) hasta el 30 de agosto de 2023 equivalente a 75 días, requerimiento del cual la manifestamos las causantes a continuación


solicitamos a la entidad y a la interventoría, revisar y analizar las situaciones que conllevaron a requerir dicha ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra NACION 003 DE 2022 dadas las circunstancias que sea dieron el día 27 de mayo en horas de las noches con respecto a la afectación que sufrió el puente voladizo (tangon) por el fuerte oleaje que presento con afectación de manera significativa en el tramo de acceso a este , siendo el único medio para el ingreso de los materiales , víveres y personas al SFF isla Malpelo lo que conllevo en este momento a realizar obra de contingencia temporal en su reforzamiento esto con el fin de proteger la integridad humana de las personas que estaban realizando intervención en este frente de trabajo (tangon) y permitir el continuo ingreso de los materiales que se requirieren para continuar con el proceso constructivo de de una cabaña de prevención, control y vigilancia de parques naturales nacionales de Colombia (PNNC) y una cabaña de vigilancia de la armada de la república de Colombia (ARC)."

Es por esto que solicitamos se conceda un nuevo plazo de finalización del contrato de obra para el 30 de agosto de 2023 que corresponde a 75 días de ejecución contados a partir del 15 de junio de 2023 , el cual sea concebido con el nuevo cronograma de obra ajustado con el periodo solicitado.

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Adjuntamos reporte sustentados por el **Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico** entidad marítima encargada de ejercer autoridad en todo el territorio marítimo

En el cuadro del pronóstico de planeares y bajares del mes de mayo del año en curso, se evidencia un aumento en la altura del oleaje en el océano pacifico hasta de 4.00 mts de altura lo que afecto la estructura del Tangón.

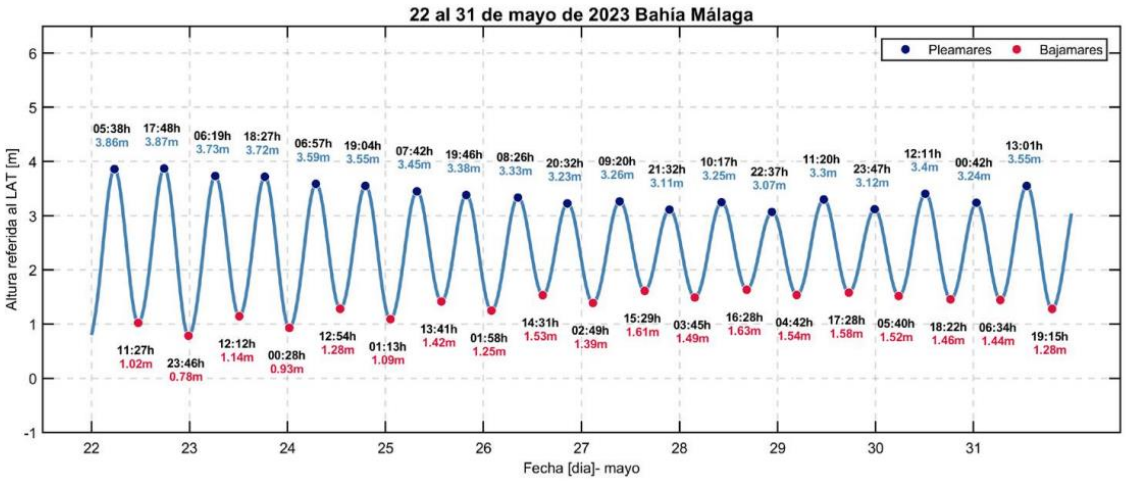

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/137239/CARTILLA+BAJAMARES+Y+PLEAMARES+-+PAC%C3%8DFICA+2023.pdf/124e7277-05d5-4cee-83da-87984c666eed?version=1.0

Adjuntamos afectación del Tangón por el fuerte oleaje

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM



Imagen sin afectación con acceso al tangon

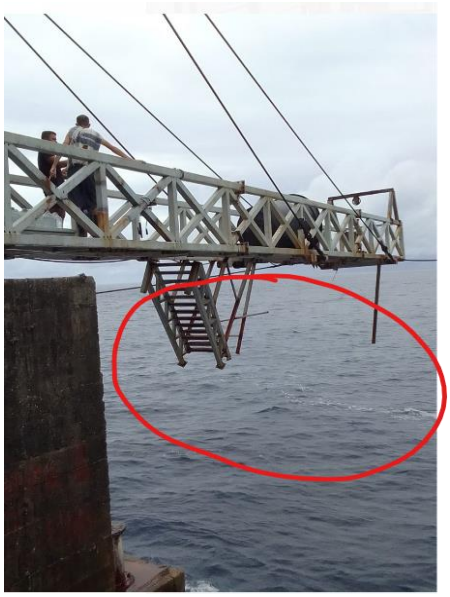


Imagen con afectación sin acceso al tangon

Cordialmente

ING. CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ
CONTRATISTA. CONTRATO DE OBRA No. NACION 003 DE 2022

CC ı **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Santiago de Cali

Junio 05 de 2023

OFICIO - NACION 004-2022-017

Señores
FUNDACION EDICOL
María Margarita Zapata Paredes
INTERVENTORIA NACION 002 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. NACION 004 DE 2022 **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE VOLADIZO TANGÓN"**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA NACION N°004 DE 2022

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, queremos hacer solicitud a la interventoría del contrato de obra NACION 004 de 2022 sobre el requerimiento de ampliación de plazo de ejecución de obra desde el 15 de junio de 2023 (fecha contractual de finalización de obra) hasta el 30 de julio de 2023 equivalente a 45 días, requerimiento del cual la manifestamos las causantes a continuación


solicitamos a la entidad y a la interventoría, revisar y analizar las situaciones que conllevaron a requerir dicha ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra NACION 004 DE 2022 dadas las circunstancias que sea dieron el día 27 de mayo en horas de las noches con respecto a la afectación que sufrió el puente voladizo (tangon) por el fuerte oleaje que presento con afectación de manera significativa en el tramo de acceso a este , siendo el único medio para el ingreso de los materiales , víveres y personas al SFF isla Malpelo lo que conllevo en este momento a realizar obra de contingencia temporal en su reforzamiento esto con el fin de proteger la integridad humana de las personas que estaban realizando intervención en este frente de trabajo (tangon) y permitir el continuo ingreso de los materiales que se requirieren para continuar con el proceso constructivo de el reforzamiento y mantenimiento general de la estructura metálica del puente voladizo Tangón"

Es por esto que solicitamos se conceda un nuevo plazo de finalización del contrato de obra para el 30 de julio de 2023 que corresponde a 45 días de ejecución contados a partir del 15 de junio de 2023 el cual sea concebido con el nuevo cronograma de obra ajustado con el periodo solicitado.

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Adjuntamos reporte sustentados por el **Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico** entidad marítima encargada de ejercer autoridad en todo el territorio marítimo

En el cuadro del pronóstico de planeares y bajares del mes de mayo del año en curso, se evidencia un aumento en la altura del oleaje en el océano pacifico hasta de 4.00 mts de altura lo que afecto la estructura del Tangón.

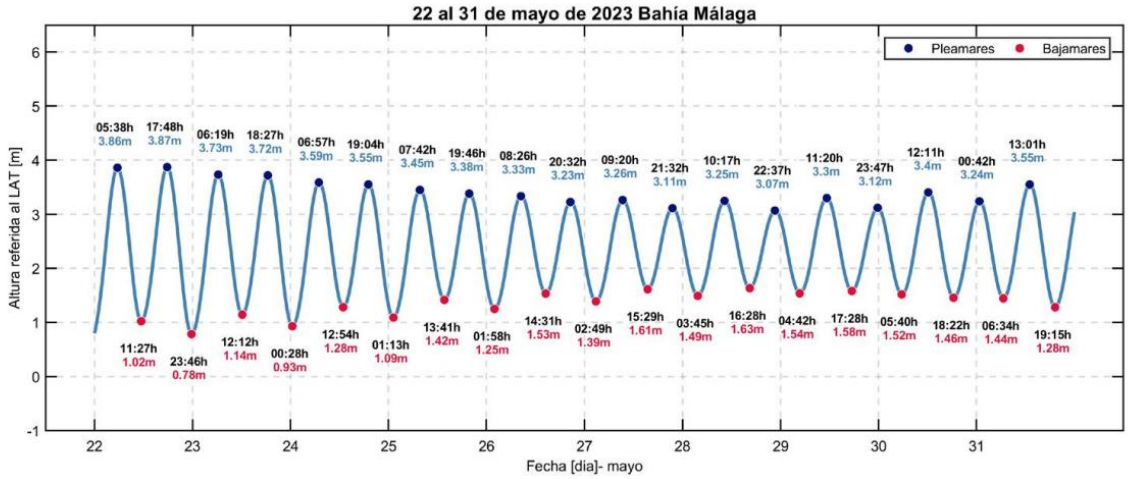

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/137239/CARTILLA+BAJAMARES+Y+PLEAMARES+-+PAC%C3%8DFICA+2023.pdf/124e7277-05d5-4cee-83da-87984c666eed?version=1.0

Adjuntamos afectación del Tangón por el fuerte oleaje

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM



Imagen sin afectación con acceso al tangon

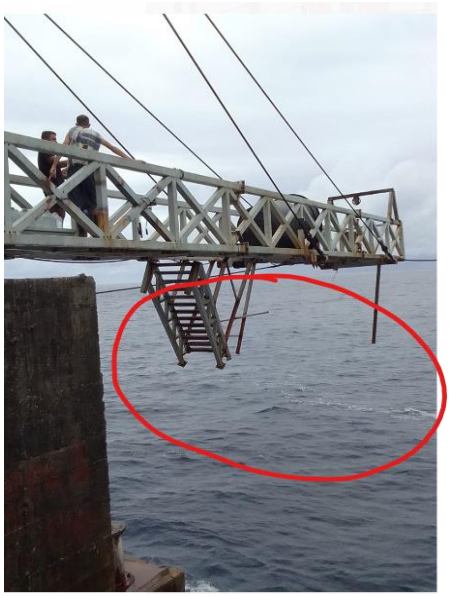


Imagen con afectación sin acceso al tangon

Cordialmente

ING. CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ
CONTRATISTA. CONTRATO DE OBRA No. NACION 004 DE 2022

CC **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Junio 12 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-057

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
Mario Alexander Madrid
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATOS DE OBRA NACION 003 DE 2022

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, el pasado 27 de mayo de 2023 en horas de la noche el puente voladizo Tangón, el cual presta sus servicios como único acceso al SFF Malpelo, sufrió una fuerte afectación a causa del fuerte oleaje y los vientos, los cuales golpearon la parte baja de la estructura del tangón, desgarrando la zona en donde se soportaba la escalera que permitía subir de las embarcaciones a la estructura y posterior acceso a la isla. Como se menciona anteriormente, siendo el tangón el único medio para el ingreso de los materiales, víveres y personas al SFF isla Malpelo, esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud expuesta por el contratista por medio del documento NACION 003-2022-023 y recomienda a la entidad otorgar la prórroga de 75 días (contados a partir del próximo 15 de junio de 2023) para continuar con la ejecución del contrato de obra NACION 003 DE 2022, dando como fecha de finalización el próximo 30 de agosto de 2023.

Muchas gracias por la atención prestada,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO

FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Junio 12 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-058

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
Mario Alexander Madrid
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO


REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATOS DE OBRA NACION 004 DE 2022

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, el pasado 27 de mayo de 2023 en horas de la noche el puente voladizo Tangón, el cual presta sus servicios como único acceso al SFF Malpelo, sufrió una fuerte afectación a causa del fuerte oleaje y los vientos, los cuales golpearon la parte baja de la estructura del tangón, desgarrando la zona en donde se soportaba la escalera que permitía subir de las embarcaciones a la estructura y posterior acceso a la isla. Como se menciona anteriormente, siendo el tangón el único medio para el ingreso de los materiales, víveres y personas al SFF isla Malpelo, esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud expuesta por el contratista por medio del documento NACION 004-2022-017 y recomienda a la entidad otorgar la prórroga de 45 días (contados a partir del próximo 15 de junio de 2023) para continuar con la ejecución del contrato de obra NACION 004 DE 2022, dando como fecha de finalización el próximo 30 de julio de 2023.


Imagen sin afectación con acceso al tangon

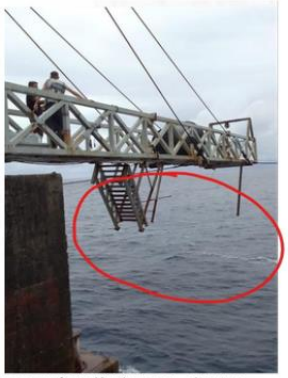
Imagen con afectación sin acceso al tangon

Muchas gracias por la atención prestada,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO
