EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

INFORME MENSUAL No 3.

Periodo Del 18-01-2023 Hasta El 17-02-2023

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

OBJETO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"

LOCALIZACION

Casco urbano –Rural del municipio de Paipa

PAIPA 2023

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 4

3 ALCANCE DEL CONVENIO 4

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 5

3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: 5

ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DE LOS SECTORES A INTERVENIR 6

4 JUSTIFICACION 7

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 7

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO 14

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de Paipa 5

Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir 6

1 INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCÉ PODEMOS AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCÉ PODEMOS PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA con el indicador de resultado; optimización de la vida útil de redes de Alcantarillado y pozos sépticos, estrategia para mejorar la funcionabilidad de las redes de Alcantarillados y eliminación de pozos sépticos

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres y concreto, con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio, afectan en gran medida la calidad de vida de la población Paipana.

El Municipio de Paipa debe garantizar la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de cobertura, continuidad, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio.

Por tal razón el municipio de Paipa junto con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. estructuró el CONVENIO 011 /2022 PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Cuadro No 1. Informe General del Convenio

CONVENIO :	**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No CONV 11 2022**
FECHA CONVENIO :	27 DE OCTUBRE 2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891.801.240-1
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
VALOR DEL CONTRATO	Setecientos unos millones doscientos cincuenta y unos mil seiscientos nueve pesos con sesenta y seis centavos ($ 701.251.609,66) m/cte
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N° 1	18 DE ENERO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N° 1	27 DE ENERO DE 2023 (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO MÁS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	17 DE MARZO DE 2023


3 ALCANCE DEL CONVENIO

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población de algunos barrios y sectores del casco Urbano y rural del municipio, de igual forma se mejora la operación del sistema implementando la REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

El municipio de Paipa está localizado en el valle de Sogamoso, uno de los valles internos más importantes de la región andina, en la parte centro oriental del país y noroccidental del departamento de Boyacá a 2525 m.s.n.m., dista aproximadamente 184 km. de Bogotá y 40 km de Tunja. Su cabecera municipal se encuentra a los 5°47' de Latitud Norte y 73° 06' de Longitud Oeste. Abarca en total, una extensión de 30.592,41 has aproximadamente, localizada en la Cordillera Oriental de Colombia.

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE PAIPA

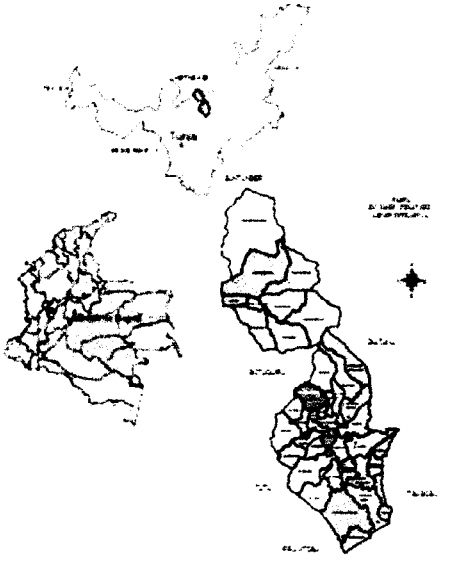

Fuente. http://www.paipa-boyaca.gov.co/MiMunicipio/GaleriaDeMapas/Mapa_Paipa_en_Sur

3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA:

Sector el Tamanaco sobre la calle 23 entre carrera 19 y carrera 18 cuenta con redes de alcantarillado de 24 pulgadas en deficientes condiciones, construidas con tubería en concreto las cuales llevan en funcionamiento un tiempo mayor a 40 años. debido a esto la tubería se encuentra en malas condiciones y colapsadas por las aguas lluvias que son evacuadas por las redes de alcantarillado combinado estas redes han perdido la capacidad hidráulica debido al sedimento que existe en la tubería.

Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 18 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado a sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

Al igual la red de distribución de agua potable en el sector Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 ya cumplió su vida útil de servicio ya que fue construida hace más de 50 años en material de asbesto cemento lo que ha generado disminución en sus capacidades de transporte hidráulico al igual constantemente se han realizado varias reparaciones en la tuberías la cual generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables, contaminación de la red Es necesario, llevar a cabo su reposición con sus respectivas domiciliarias


Calle 27: las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 12 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado ha sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.

Calle 33: Vía Francisco Montaña: Construcción de sistema de recolección de aguas por escorrentía producto de las fuertes lluvias e impedir el ingreso de elementos solidos de gran tamaño que discurren por las vías

Sector Dársena: construcción alcantarillado pluvial para el manejo control y conducción adecuada de las aguas de escorrentía ubicado Vía francisco Montaña y calle 25

Sector Unidad de Atención Integral de Paipa: construcción de alcantarillado Pluvial Ubicado en la vereda el rosal vía que conduce del casco urbano del municipio hacia el corregimiento de Palermo

Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir

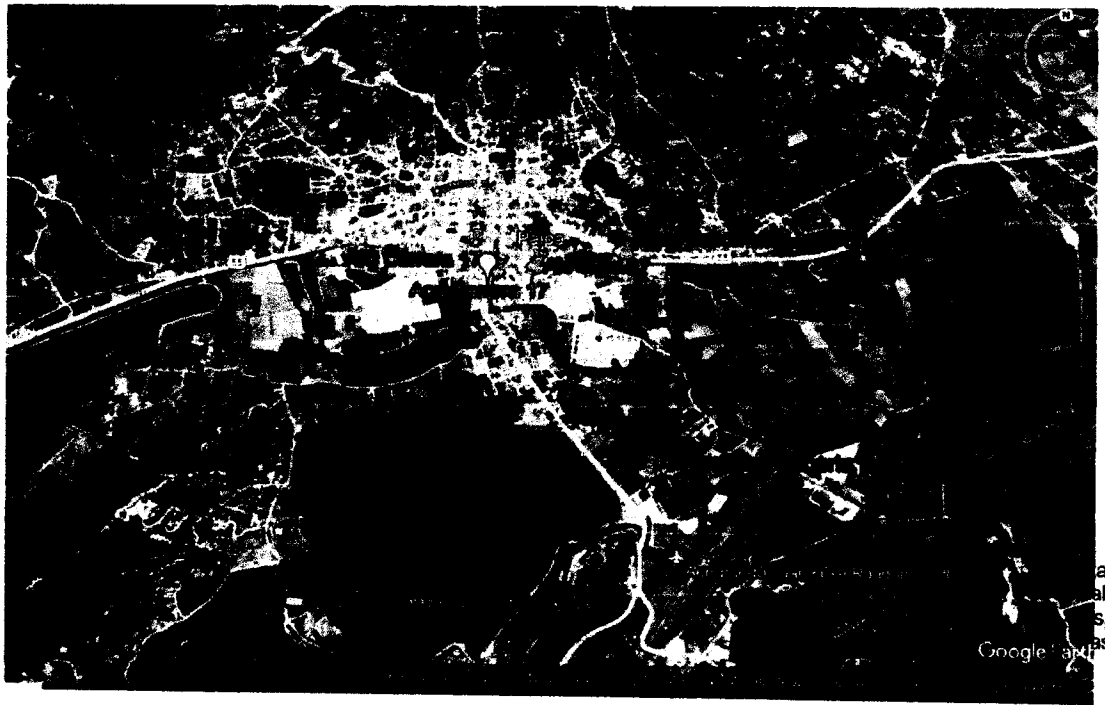

7

4 JUSTIFICACION

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres, concreto con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio.

Al igual la temporada invernal ha traído varios inconvenientes en el funcionamiento y operación de las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y en las redes de acueducto, provocando reboses, rupturas, filtraciones y afectaciones en el saneamiento básico de la comunidad Paipana.

En busca de mejorar las condiciones de operación y fortalecer el sistema de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se proyectó la reposición de las redes en sectores afectados en los cuales se ha evidenciado deterioro por el tiempo útil de las tuberías, las cuales se encuentran obsoletas y en un material que no es eficiente para el adecuado funcionamiento.

Por tal razón es necesario fortalecer estas actividades y promover este tipo de obras que mejoren y optimicen la prestación del servicio.

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

La Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P se encuentra adelantando las siguientes actividades dentro de la ejecución del convenio 011, las cuales se vienen adelantando de acuerdo a la programación y logística de materiales y mano de obra con la que cuenta la empresa de Servicios Públicos Red Vital.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

- ✓ CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS

Esta actividad se realiza con el fin de dar protección al personal externo de obra para evitar algún incidente, además para delimitar la zona e informar que existen trabajos en el tramo específico.



- ✓ DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM

Esta actividad se realiza para tener mayores accesos a la excavación, considerando que el tramo a intervenir se encuentra en muy mal estado.



- ✓ EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM

Esta actividad se realiza para establecer la zanja donde se va a cambiar la red de alcantarillado principal de 18" y para las acometidas de cada predio, las cuales se encuentran en 6".



- ✓ RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

Esta actividad se realiza con el fin de dar protección a la tubería principal y acometidas de alcantarillado y evitar que sufra deflexiones, el material se instala como piso o cama de la tubería, atraque y recubrimiento de la misma.



Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

10


- ✓ RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA

Esta actividad se realiza para llegar hasta el nivel deseado de la superficie



- ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"

Se realiza la instalación de la tubería como reemplazo de la existente.

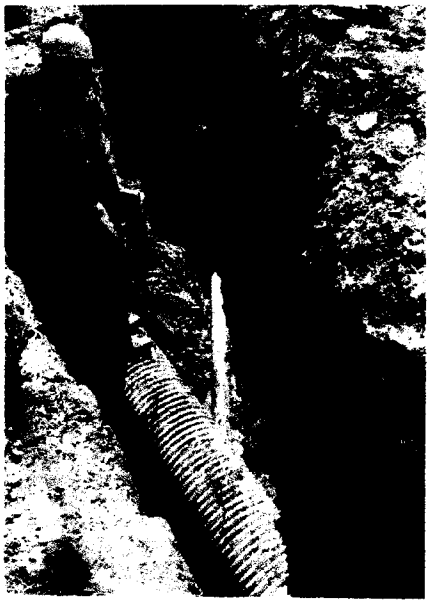

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com


✓ RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS

Se realiza el retiro de la tubería que ya no está cumpliendo con la funcionalidad requerida.



✓ CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA

Se realiza la reposición de la red de cada una de las acometidas existentes en el tramo, incluida la adecuada conexión a la red principal.

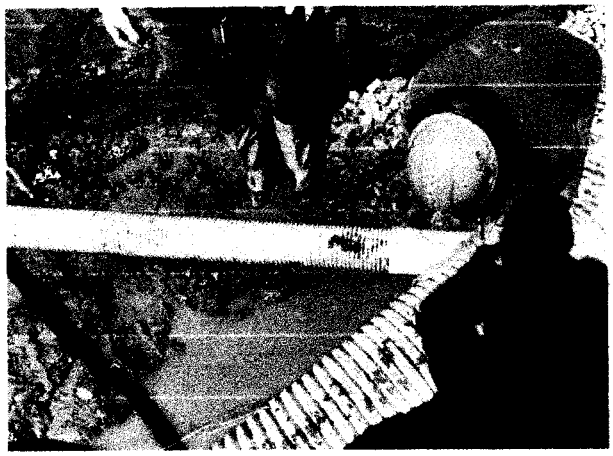

Teniendo en cuenta lo anterior descrito de las actividades y suministro de materiales con respecto al capítulo "B" del presente convenio, se tiene un porcentaje de avance para este periodo del 6.06%, para un total de avance de ejecución del 29,06%

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

En el siguiente cuadro se relaciona la afiliación al Sistema integral de seguridad social se anexan planillas.

PERSONAL DE OBRA MES DE ENERO						
	Nombre	Documento De Identidad	Salud	Pensión	ARL	Fecha de Pago
1	Camargo Luis	4.192.865	Famisanar	Colpensiones	Positiva	2023-02-13
2	Cañadulce Uriel	74.360.447	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva	2023-02-13
3	Malaver Héctor	74.373.225	Sanitas	Colpensiones	Positiva	2023-02-13
4	Ochoa Wilfredy	1.053.615.891	Nueva E.P.S	Protección	Positiva	2023-02-13
5	Tibatá Yovany	1.053.610.862	Famisanar	Colfondos	Positiva	2023-02-13
6	Corredor Edwin	1.053.613.769	Famisanar	Porvenir	Positiva	2023-02-13
7	Becerra Wilson	1.052.396.359	Nueva E.P.S	Colpensiones	Positiva	2023-01-25
8	López Adolfo	89.004.430	Famisanar	Protección	Positiva	2023-02-13
9	Corchuelo Ludy	1.053.606.061	Famisanar	Protección	Positiva	2023-02-13

Se anexa

1. Archivo en Excel de avance de Obra
2. Memorias de cantidades
3. Pago de seguridad Social mes de enero

Emite **TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA**
Empleo Gerente General

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*	*No*	*Anexos*	*Folios*
Elaboró	*Ludy Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa*		*1*		
Revisó	*Ludy Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa*		*2*		
Aprobó	*Tito Dustano Currea Valderrama Gerente General*		*3*		

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

Municipio de Paipa podemos	**PLANEACIÓN Y PROYECTOS** **INFORME DE AVANCE DE OBRA CONV 011/2022**	PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SUMERCE **FECHA** 01/04/2022 **PÁGINA** 1 de 6

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

ACTA DE AVANCE N° 5

											INFORME 5				
	CONDICIONES CONTRACTUALES														
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNO**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**RED VITAL**	**MUNIPIO**	**VR. TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**CANT**	**CANT ACUMULADA**	**RED VITAL**	**MUNIPIO**	**VR. TOTAL**	**V. TOTAL ACUMULADO**
1.00	**SUMINISTRO TUBERIA**														
1.10	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 200mm (6m)	UND	122.00	$ 241.397.97	$ 29.450.552.34		$ 29.450.552.34	$ 29.450.552.34	$ 29.450.552.34		122		$ 0.00	$ 0.00	$ 29.450.552.34
1.20	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 250mm (6m)	UND	83	$ 352.593.35	$ 29.265.248.05		$ 29.265.248.05	$ 29.265.248.05	$ 29.265.248.05		83		$ 0.00	$ 0.00	$ 29.265.248.05
1.30	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 315mm (6m)	UND	83	$ 507.333.00	$ 42.108.639.00		$ 42.108.639.00	$ 42.108.639.00	$ 42.108.639.00		83		$ 0.00	$ 0.00	$ 42.108.639.00
1.40	TUBO EN CONCRETO 24 "	ML	210	$ 162.480.00	$ 34.120.800.00		$ 34.120.800.00	$ 34.120.800.00	$ 34.120.800.00		210		$ 0.00	$ 0.00	$ 34.120.800.00
NP (1.5)	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 160 MM (6M)	UND		$ 215.128.50	$ 0.00										
NP (1.6)	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 350 MM (6M)	UND		$ 967.492.00	$ 0.00										
	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 450 MM (6M)	UND		$ 1.529.725.50	$ 0.00										
				SUBTOTAL	$ 134.945.239.39		$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39	SUBTOTAL		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 134.945.239.39
				IVA	$ 25.639.595.48		$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48	IVA		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 25.639.595.48
				SUBTOTAL + IVA	**$ 160.584.834.87**		**$ 160.584.834.87**	**$ 160.584.834.87**	**$ 160.584.834.87**	**SUBTOTAL IVA**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 160.584.834.87**
2.00	**REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**														
	PRELIMINARES														
2.10	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	74.86	$ 41.785.16	$ 3.128.785.45	$ 483.106.63	$ 2.645.678.82	$ 3.128.785.45	$ 0.00		0				$ 0.00
2.20	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.03	$ 2.813.077.04	$ 80.904.10	$ 12.482.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10	$ 80.904.10		0.028760		$ 0.00	$ 0.00	$ 80.904.10
2.30	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	23.01	$ 21.447.25	$ 493.458.33	$ 76.193.46	$ 417.264.87	$ 493.458.33	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUB TOTAL PRELIMINARES	**$ 3.703.147.88**		**$ 3.128.785.82**	**$ 3.703.147.88**	**$ 80.904.10**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 80.904.10**
2.40	*EXCAVACIONES*														
2.50	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	34.51	$ 16.320.25	$ 563.244.47	$ 86.968.93	$ 476.275.53	$ 563.244.47	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	**$ 563.244.47**		**$ 476.275.53**	**$ 563.244.47**	**$ 0.00**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	RELLENOS														
2.60	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	13.80	$ 105.881.37	$ 1.460.704.80	$ 225.543.16	$ 1.235.161.64	$ 1.460.704.80	$ 0.00		0				$ 0.00
2.70	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	9.20	$ 27.067.35	$ 249.106.24	$ 38.463.77	$ 210.642.47	$ 249.106.24	$ 0.00		0				$ 0.00
2.80	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	11.50	$ 73.050.70	$ 840.375.25	$ 129.759.89	$ 710.615.36	$ 840.375.25	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUB TOTAL RELLENOS	**$ 2.550.186.29**		**$ 2.156.449.47**	**$ 2.550.186.29**	**$ 0.00**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO														
2.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	ML	28.76	$ 449.969.00	$ 12.941.108.44	$ 1.998.198.78	$ 10.942.909.66	$ 12.941.108.44	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUBTOTAL TUBERIA DE ALCANTARILLADO	**$ 12.941.108.44**		**$ 10.942.909.66**	**$ 12.941.108.44**	**$ 0.00**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES														
2.10	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	28.76	$ 19.978.21	$ 574.573.32	$ 88.718.19	$ 485.855.13	$ 574.573.32	$ 0.00		0				$ 0.00
2.11	2.06.14 POZO DE INSPECCION D=1.20 -1.50 H<= 2.00M	UND	1.00	$ 1.921.745.64	$ 1.921.745.64	$ 296.731.14	$ 1.625.014.51	$ 1.921.745.64	$ 0.00		0				$ 0.00

					SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 2,486,318.96		$ 2,140,889.64	$ 2,486,318.96	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	OBRAS COMPLEMETARIAS															
2.12	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	m²	48.00	$ 3.399.59	$ 163.180.32	$ 25.196.20	$ 137.984.12	$ 163.180.32	$ 0.00		0				$ 0.00
2.13	3.06.03 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m³	6.63	$ 792.018.75	$ 5.254.962.87	$ 811.403.48	$ 4.443.559.39	$ 5.254.962.87	$ 0.00		0				$ 0.00
					SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 5,418,143.19		$ 4,681,543.92	$ 5,418,143.19	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	PRELIMINARES															
2.14	2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	86.30	$ 800.60	$ 69.091.78	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78	$ 69.091.78		86.3				$ 69.091.78
					SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 69,091.78		$ 58,423.52	$ 69,091.78	$ 69,091.78				$ 0.00	$ 0.00	$ 69,091.78
	EXCAVACIONES															
2.15	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	51.78	$ 16.320.25	$ 845.062.55	$ 130.483.64	$ 714.578.91	$ 845.062.55	$ 0.00		0				$ 0.00
					SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 845,062.55		$ 714,578.91	$ 845,062.55	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	RELLENOS															
2.16	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	15.53	$ 105.811.37	$ 1.643.673.82	$ 253.784.88	$ 1.389.878.94	$ 1.643.673.82	$ 0.00		0				$ 0.00
2.17	2.01.08 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	15.53	$ 27.067.35	$ 420.464.21	$ 64.922.65	$ 355.541.56	$ 420.464.21	$ 0.00		0				$ 0.00
2.18	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	20.71	$ 73.050.70	$ 1.513.026.10	$ 233.621.84	$ 1.279.404.16	$ 1.513.026.10	$ 0.00		0				$ 0.00
					SUB TOTAL RELLENOS	$ 3,577,164.13		$ 2,024,824.98	$ 3,577,164.13	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ACUEDUCTO															
2.19	2.01.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC O = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA	MI	86.30	$ 42.770.42	$ 3.691.087.25	$ 569.930.01	$ 3.121.157.24	$ 3.691.087.25	$ 0.00						$ 0.00
					SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 3,691,087.25		$ 3,121,157.24	$ 3,691,087.25	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	OTRAS OBRAS DE ACUEDUCTO															
2.20	2.04.50 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	8.00	$ 309.563.22	$ 2.476.505.76	$ 382.390.03	$ 2.094.115.73	$ 2.476.505.76	$ 0.00		0				$ 0.00
					SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 2,476,505.76		$ 2,094,115.73	$ 2,476,505.76	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	PRELIMINARES															
2.21	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	140.52	$ 41.795.16	$ 5.873.055.46	$ 906.841.35	$ 4.966.214.11	$ 5.873.055.46	$ 5.873.055.88	0	140.52			$ 0.00	$ 5.873.055.88
2.22	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.06	$ 2.813.077.04	$ 175.142.18	$ 27.043.19	$ 148.098.99	$ 175.142.18	$ 168.784.62	0	0.06		$ 0.00	$ 0.00	$ 168.784.62
2.23	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	49.81	$ 21.447.25	$ 1.068.244.63	$ 164.844.54	$ 903.300.09	$ 1.068.244.63	$ 1.029.468.00	0	48			$ 0.00	$ 1.029.468.00
					SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 7,116,442.27		$ 6,017,823.19	$ 7,116,442.27	$ 7,071,308.50				$ 0.00	$ 0.00	$ 7,071,308.50
	EXCAVACIONES															
2.23	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	89.65	$ 16.320.25	$ 1.463.182.22	$ 225.925.70	$ 1.237.256.52	$ 1.463.182.22	$ 1.094.762.37		67.08		$ 0.00	$ 0.00	$ 1.094.762.37
					SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 1,463,182.22		$ 1,237,256.52	$ 1,463,182.22	$ 1,094,762.37				$ 0.00	$ 0.00	$ 1,094,762.37
	RELLENOS															

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2.24	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	21.89	$ 105.811.37	$ 2.315.999.27	$ 357.606.69	$ 1.958.392.58	$ 2.315.999.27	$ 2.179.714.22		20.6		$ 0.00	$ 0.00	$ 2.179.714.22
2.25	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	38.30	$ 27.067.35	$ 1.036.787.77	$ 160.087.37	$ 876.700.40	$ 1.036.787.77	$ 0.00		0			$ 0.00	$ 0.00
2.26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	38.30	$ 73.050.70	$ 2.798.134.01	$ 432.051.71	$ 2.366.082.30	$ 2.798.134.01	$ 2.597.682.89		35.56		$ 0.00	$ 0.00	$ 2.597.682.89
				SUB TOTAL RELLENOS	**$ 6.150.921.05**	[redacted]	**$ 5.208.175.28**	**$ 6.150.921.05**	**$ 4.777.397.11**			[redacted]	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 4.777.397.11**
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO														
2.27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML	62.26	$ 315.589.02	$ 19.649.194.99	$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99	$ 17.357.946.10		55		$ 0.00	$ 0.00	$ 17.357.946.10
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	**$ 19.649.194.99**	[redacted]	**$ 16.615.220.14**	**$ 19.649.194.99**	**$ 17.357.946.10**			[redacted]	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 17.357.946.10**
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES														
2.28	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	62.26	$ 19.978.21	$ 1.243.843.35	$ 192.058.22	$ 1.051.785.13	$ 1.243.843.35	$ 1.098.801.55		55		$ 0.00	$ 0.00	$ 1.098.801.55
2.29	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	6.00	$ 359.721.13	$ 2.877.769.04	$ 444.347.92	$ 2.433.421.12	$ 2.877.769.04	$ 1.079.163.39		3		$ 0.00	$ 0.00	$ 1.079.163.39
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	**$ 4.121.612.39**	[redacted]	**$ 3.485.206.25**	**$ 4.121.612.39**	**$ 2.177.964.94**			[redacted]	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 2.177.964.94**
	OBRAS COMPLEMETARIAS														
2.30	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	m^2	1120.00	$ 3.399.59	$ 3.807.540.80	$ 587.911.26	$ 3.219.629.54	$ 3.807.540.80	$ 0.00		0				$ 0.00
2.31	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m^2	153.96	$ 792.018.75	$ 121.935.405.06	$ 11.622.604.51	$ 110.312.800.55	$ 121.935.405.06	$ 0.00		0				$ 0.00
NP (2.32)	3.12.05. TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3 - KM		$ 2.978.75											
				SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	**$ 125.742.845.86**	[redacted]	**$ 113.532.430.09**	**$ 125.742.845.86**	**$ 0.00**			[redacted]	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
[redacted]															
	PRELIMINARES														
2.32	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	224.00	$ 41.795.16	$ 9.362.115.17	$ 1.518.268.71	$ 7.843.846.46	$ 9.362.115.17	$ 0.00	224	224	$ 1.518.268.71	$ 7.843.847.13	$ 9.362.115.84	$ 9.362.115.84
2.33	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.10	$ 2.813.077.04	$ 281.307.70	$ 43.435.90	$ 237.871.80	$ 281.307.70	$ 281.307.70		0.1		$ 0.00	$ 0.00	$ 281.307.70
2.34	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	80.00	$ 21.447.25	$ 1.715.780.00	$ 264.928.58	$ 1.450.851.42	$ 1.715.780.00	$ 0.00	64	64	$ 264.928.59	$ 1.107.695.41	$ 1.372.624.00	$ 1.372.624.00
				SUB TOTAL PRELIMINARES	**$ 11.359.202.87**	[redacted]	**$ 9.632.969.67**	**$ 11.359.202.87**	**$ 281.307.70**			[redacted]	**$ 8.951.542.54**	**$ 10.734.739.84**	**$ 11.016.047.54**
	EXCAVACIONES														
2.35	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	120.00	$ 16.320.25	$ 1.958.430.00	$ 302.395.46	$ 1.656.034.54	$ 1.958.430.00	$ 0.00	80.2	80.2	$ 302.395.46	$ 1.006.488.59	$ 1.308.884.05	$ 1.308.884.05
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	**$ 1.958.430.00**	[redacted]	**$ 1.656.034.54**	**$ 1.958.430.00**	**$ 0.00**			[redacted]	**$ 1.006.488.59**	**$ 1.308.884.05**	**$ 1.308.884.05**
	RELLENOS														
2.36	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	32.00	$ 105.811.37	$ 3.385.963.84	$ 522.816.79	$ 2.863.147.05	$ 3.385.963.84	$ 0.00	31.33	31.33	$ 522.816.79	$ 2.792.253.43	$ 3.315.070.22	$ 3.315.070.22
2.37	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	32.00	$ 27.067.35	$ 866.155.20	$ 133.740.50	$ 732.414.70	$ 866.155.20	$ 0.00		0				$ 0.00

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2.38	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	56.00	$ 73.050.70	$ 4.090.839.20	$ 631.654.54	$ 3.459.184.66	$ 4.090.839.20	$ 0.00		0				$ 0.00
NP (2.39)	3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON METERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA . INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3		$ 100.304.20											
NP (4.40)	3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3		$ 111.672.11											
NP (2.41)	3.12.04 TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS	M3-KM		$ 2.312.50											
NP (2.42)	3.02.10 PEDRAPLEN COMPACTO	M3		$ 119.390.07											
				SUB TOTAL RELLENOS	$ 8.342.858.24		$ 7.054.748.41	$ 8.342.858.24	$ 0.00				$ 2.782.253.43	$ 3.315.070.22	$ 3.315.070.22
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO														
2.39	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	100.00	$ 167.900.70	$ 16.790.070.02	$ 2.592.505.70	$ 14.197.564.32	$ 16.790.070.02	$ 0.00	80	80	$ 2.592.505.70	$ 10.839.550.30	$ 13.432.056.00	$ 13.432.056.00
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 16.790.070.02		$ 14.197.564.32	$ 16.790.070.02	$ 0.00				$ 10.839.550.30	$ 13.432.056.00	$ 13.432.056.00
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES														
2.40	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML	100.00	$ 9.308.45	$ 930.845.00	$ 143.729.06	$ 787.115.94	$ 930.845.00	$ 0.00	80	80	$ 143.729.06	$ 600.946.94	$ 744.676.00	$ 744.676.00
2.41	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	22.00	$ 359.721.30	$ 7.913.868.60	$ 1.206.129.61	$ 6.707.738.99	$ 7.913.868.60	$ 0.00	10	10	$ 1.206.129.61	$ 2.391.083.39	$ 3.597.213.00	$ 3.597.213.00
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 8.844.713.60		$ 7.494.854.93	$ 8.844.713.60	$ 0.00				$ 2.992.030.33	$ 4.341.889.00	$ 4.341.889.00
	OBRAS COMPLEMETARIAS														
2.42	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m²	800.00	$ 3.399.59	$ 2.719.672.00	$ 419.936.62	$ 2.299.735.38	$ 2.719.672.00	$ 0.00		0				$ 0.00
2.43	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m²	109.24	$ 792.018.75	$ 86.602.498.20	$ 9.526.274.80	$ 77.076.223.40	$ 86.602.498.20	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIA	$ 88.322.170.20		$ 79.375.958.78	$ 88.322.170.20	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.44	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	160	$ 14.301.40	$ 2.288.224.00	$ 353.355.01	$ 1.934.868.99	$ 2.288.224.00	$ 0.00		0				$ 0.00
2.45	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	46	$ 88.793.55	$ 4.084.503.45	$ 630.676.26	$ 3.453.827.19	$ 4.084.503.45	$ 0.00		0				$ 0.00
2.46	SUMINISTRO , EXTENDIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO CON DIAMETRO HASTA 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR AL 9% Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	45.5	$ 74.810.75	$ 3.403.889.13	$ 525.584.59	$ 2.878.304.54	$ 3.403.889.13	$ 0.00		0				$ 0.00
2.47	CONCRETO DE CICLOPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACION 60 C/40P	m3	30	$ 421.022.01	$ 12.630.660.18	$ 1.950.263.37	$ 10.680.396.81	$ 12.630.660.18	$ 0.00		0				$ 0.00
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24 "	ml	30	$ 485.000.13	$ 14.550.003.90	$ 2.246.623.63	$ 12.303.380.27	$ 14.550.003.90	$ 0.00		0				$ 0.00
2.49	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	15.00	$ 111.672.11	$ 1.675.081.65	$ 258.644.47	$ 1.416.437.18	$ 1.675.081.65	$ 0.00		0				$ 0.00

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2.50	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	12.00	$ 100.571.48	$ 1.206.857.76	$ 186.347.38	$ 1.020.510.38	$ 1.206.857.76	$ 0.00		0				$ 0.00
2.51	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	8887.50	$ 1.656.25	$ 14.719.921.88	$ 2.272.860.17	$ 12.447.061.71	$ 14.719.921.88	$ 0.00		0				$ 0.00
2.52	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3840	$ 1.656.25	$ 6.360.000.00	$ 982.029.04	$ 5.377.970.96	$ 6.360.000.00	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUBTOTAL REPOSICION TUBERIA	$ 68.099.141.95	[redacted]	$ 38.572.758.03	$ 60.998.141.95	$ 0.00			[redacted]	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 400.112.046.36	$ 58.766.184.70	$ 349.325.861.66	$ 400.112.046.36	$ 32.910.682.50			$ 6.550.772.92	$ 26.581.865.19	$ 33.132.638.11	$ 66.043.320.71
				A	$ 20.005.602.32	$ 2.539.309.23	$ 17.466.293.08	$ 20.005.602.32	$ 1.645.534.13			$ 327.538.70	$ 1.329.093.26	$ 1.656.631.96	$ 3.302.166.09
				I	$ 8.002.240.93	$ 1.015.723.69	$ 6.986.517.23	$ 8.002.240.93	$ 658.213.65			$ 131.045.48	$ 531.637.30	$ 662.682.78	$ 1.320.866.43
				U	$ 12.003.361.39	$ 1.523.585.54	$ 10.479.775.85	$ 12.003.361.39	$ 987.320.48			$ 196.523.22	$ 797.455.96	$ 993.979.17	$ 1.981.299.65
				SUBTOTAL + AIU	$ 440.123.291.80	[redacted]	$ 384.258.447.82	$ 440.123.291.80	$ 36.201.750.88			[redacted]	$ 29.240.091.71	$ 36.445.903.02	$ 72.847.803.88
3.00	REPOSICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA CALLE 33														
3.10	2.06.23 SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO. CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI. FORMA. REF Y CONST. INCL. TAPA)	UNO	1.00	$ 2.406.352.13	$ 2.406.352.13	$ 347.494.29	$ 2.058.857.84	$ 2.406.352.13	$ 0.00		0				$ 0.00
3.20	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m²	15.75	$ 576.367.23	$ 9.077.783.87	$ 1.310.896.27	$ 7.766.887.60	$ 9.077.783.87	$ 0.00		0				$ 0.00
3.30	6.02.06 CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)	m³	4.80	$ 543.324.70	$ 2.607.958.56	$ 376.607.68	$ 2.231.350.88	$ 2.607.958.56	$ 0.00		0				$ 0.00
3.40	6.02.07 CONCRETO CLASE C 21 MPa (3000 PSI)	m³	7.20	$ 475.506.98	$ 3.423.650.26	$ 494.399.34	$ 2.929.250.92	$ 3.423.650.26	$ 0.00		0				$ 0.00
3.50	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	826.00	$ 6.603.09	$ 4.133.533.96	$ 596.911.57	$ 3.536.622.39	$ 4.133.533.96	$ 0.00		0				$ 0.00
3.60	REJA PARA CARCAMO	UNO	1.00	$ 25.430.000.00	$ 25.430.000.00	$ 3.672.272.07	$ 21.757.727.93	$ 25.430.000.00	$ 0.00		0				$ 0.00
3.70	2.05.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	20.00	$ 198.009.20	$ 3.960.184.00	$ 571.878.61	$ 3.388.305.39	$ 3.960.184.00	$ 0.00		0				$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 51.039.462.78	$ 7.370.459.84	$ 43.668.002.94	$ 51.039.462.78				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				A	$ 2.551.973.14	$ 368.522.99	$ 2.183.450.15	$ 2.551.973.14				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	
				I	$ 1.020.789.26	$ 147.409.20	$ 873.380.06	$ 1.531.183.88				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	
				U	$ 1.531.183.88	$ 221.113.80	$ 1.310.070.09	$ 1.020.789.26				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	
				SUBTOTAL + AIU	$ 56.143.409.06	[redacted]	$ 48.035.003.24	$ 56.143.409.06				[redacted]	$ 0.00	$ 0.00	
4.00	REPOSICIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SECTOR UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PAIPA														
4.10	2.06.12 POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 NH 1.00 1.50 N	UNO	6	$ 1.011.536.11	$ 6.099.216.65	$ 963.204.72	$ 5.136.011.93	$ 6.099.216.65	$ 3.034.608.33		3			$ 0.00	$ 3.034.608.33
4.20	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ml	80	$ 315.599.02	$ 25.247.921.80	$ 3.633.970.30	$ 21.613.951.50	$ 25.247.921.80			0				
4.30	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m²	15.8	$ 576.327.23	$ 9.106.602.23	$ 996.326.77	$ 8.110.275.46	$ 9.106.602.23			0				
NP (4.4)	1.02.17 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 51.943.58											
				SUB-TOTAL	$ 48.363.740.68	$ 5.583.501.78	$ 34.770.236.90	$ 40.363.740.68	$ 3.034.608.33			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.034.608.33
				A	$ 2.018.187.03	$ 279.675.09	$ 1.738.511.94	$ 2.018.187.03	$ 151.730.42			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 151.730.42
				I	$ 807.274.81	$ 111.870.04	$ 695.404.78	$ 1.210.912.22	$ 60.692.17			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60.692.17

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

		U	$ 1.210.912.22	$ 167.805.05	$ 1.043.107.17	$ 807.274.81	$ 91.038.25			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91.038.25
		SUBTOTAL + AIU	$ 44.460.114.74	[redacted]	$ 38.247.260.79	$ 44.460.114.74				[redacted]	$ 0.00	$ 0.00	
COSTO DIRECTO SUMINISTRO			$ 134.945.239.39		$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39				$ 0.00	$ 0.00	$ 134.945.239.39
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (19%)			$ 25.639.595.48		$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48				$ 0.00	$ 0.00	$ 25.639.595.48
COSTO TOTAL SUMINISTRO			$ 160.584.834.87		$ 160.584.834.87	$ 160.584.834.87	$ 160.584.834.87				$ 0.00	$ 0.00	$ 160.584.834.87
				RED VITAL	ALCALDIA								
COSTO DIRECTO OBRA			$ 491.515.249.82	[redacted]	$ 427.785.103.49	$ 491.515.249.82	$ 35.945.290.93			$ 6.550.773.92	$ 26.581.885.19	$ 33.132.639.11	$ 69.077.930.04
A.I.U. 10%	ADMINISTRACION (5%)		$ 24.575.762.49	$ 3.187.507.32	$ 21.388.255.17	$ 24.575.762.49	$ 1.797.264.55			$ 327.538.70	$ 1.329.093.26	$ 1.656.631.96	$ 3.453.896.51
	IMPREVISTOS (2%)		$ 9.830.305.00	$ 1.275.002.93	$ 8.555.302.07	$ 10.744.337.03	$ 718.905.82			$ 131.015.48	$ 531.637.30	$ 662.652.78	$ 1.381.558.60
	UTILIDAD (3%)		$ 14.745.457.49	$ 1.912.504.39	$ 12.832.953.10	$ 13.831.425.46	$ 1.078.358.73			$ 196.523.22	$ 797.455.96	$ 993.979.17	$ 2.072.337.90
COSTO TOTAL OBRA			$ 540.666.774.80	$ 78.125.160.87	$ 470.541.613.83	$ 540.666.774.80	$ 39.539.820.03			$ 7.205.851.32	$ 29.240.051.71	$ 36.445.903.02	$ 75.985.723.05
TOTAL COSTO OBRA + SUMINISTRO			$ 701.251.609.66	$ 78.125.160.87	$ 631.126.448.70	$ 701.251.609.66	$ 200.124.654.90			$ 7.205.851.32	$ 29.240.051.71	$ 36.445.903.02	$ 236.570.557.82

AVANCE				
28,53%		5,20%		33,74%
ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO

TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
INTERVENTOR

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,21	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Total
Cerramiento para el tota del tramo	140,52	140,52
SUB TOTAL		**140,52**

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,23	3.13.17 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2

DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho prom	Total
para la red de alcantarillado			
	60	0,8	48,00
SUB TOTAL			**48,00**

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,23	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M2

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Long prom	Ancho	prof prom	Total
excavación para red principal de alcantarillado		55	0,8	1,5	66,00
Excavacion para domiciliarias de alcantarillado	3	2	0,3	0,6	1,08
SUB TOTAL					**67,08**

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA


INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,24	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	Total
Red principal de alcantarillado		55	0,8	0,65	28,60
Área para descontar del tubo		55	0,151976		8,36
Relleno acometidas domiciliarias de alcantarillado	3	2	0,2	0,3	0,36
SUB TOTAL					**20,60**

REGISTRO Y EVIDENCIA

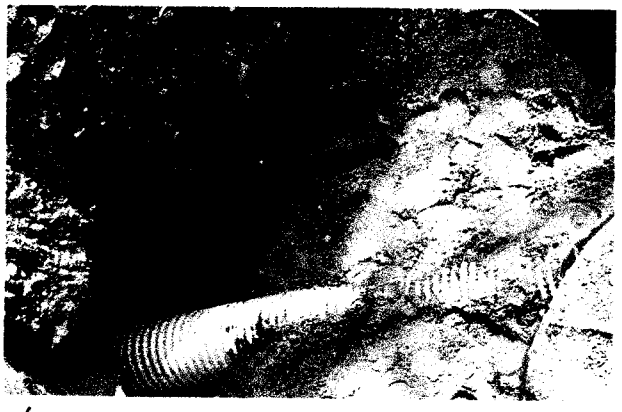

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	Total
Red principal		55	0,8	0,8	35,20
Relleno acometidas	3	2	0,2	0,3	0,36
SUB TOTAL					**35,56**

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"		ML
	DESCRIPCIÓN	**Longitud**	**Total**
Red principal		55	55,00
	SUB TOTAL		**55,00**

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,28	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML

DESCRIPCIÓN	Longitud	Total
Red principal	55,00	55,00
SUB TOTAL		55,00

REGISTRO Y EVIDENCIA



Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA


INFORME DE AVANCE N° 3

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,29	2.06.04 CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UN

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Total
	3	3,00
SUB TOTAL		**3,00**

REGISTRO Y EVIDENCIA

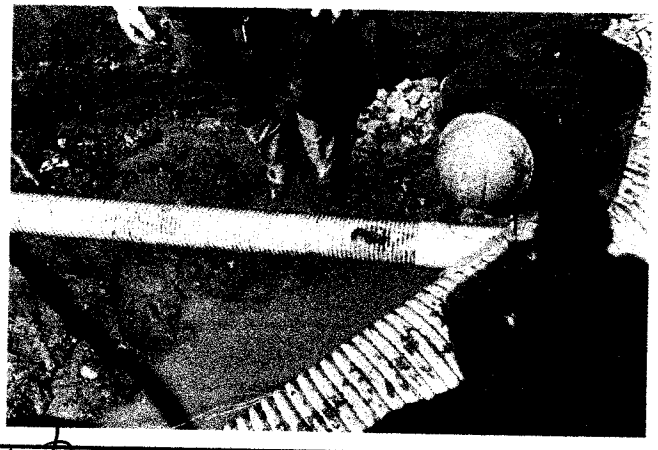

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914688846	9446824743	E	2023/02/10	2023/02/13	BANCO POPULAR	3	$40,787,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (96 Afiliados)						$154,148,563	$24,825,200			$154,148,563	$6,173,400			$169,811,489	$6,540,200			$154,148,563	$3,104,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (96 Afiliados)						$154,148,563	$24,825,200			$154,148,563	$6,173,400			$169,811,489	$6,540,200			$154,148,563	$3,104,000		$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (96 Afiliados)						$154,148,563	$24,825,200			$154,148,563	$6,173,400			$169,811,489	$6,540,200			$154,148,563	$3,104,000		$0	$0
1	CC	74323988	ALFONSO JORGE	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS037	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
2	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
3	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	3	$119,064	$19,100	EPS017	3	$119,064	$4,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$119,064	$0	3	$0	$0
4	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	27	$1,160,867	$185,800	EPS017	27	$1,160,867	$46,500	CCF10	27	$1,226,342	$49,100	14-23	27	$1,160,867	$28,300	27	$0	$0
5	CC	1053605825	ASAKURA ANDREW	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
6	CC	1053604979	AVELLA OSCAR	230201	18	$1,339,433	$214,400	EPS017	18	$1,339,433	$53,600	CCF10	18	$1,339,433	$0	14-23	18	$1,339,433	$0	18	$0	$0
7	CC	1053604979	AVELLA OSCAR	230201	12	$892,956	$142,900	EPS017	12	$892,956	$35,800	CCF10	12	$3,600,158	$144,100	14-23	12	$892,956	$4,700	12	$0	$0
8	CC	23857282	AVILA MIREYA	25-14	30	$1,250,165	$200,100	EPS037	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
9	CC	1053608342	BARON MANUEL	231001	26	$1,111,258	$177,900	EPS005	26	$1,111,258	$44,500	CCF10	26	$1,174,308	$47,000	14-23	26	$1,111,258	$27,100	26	$0	$0
10	CC	46681560	BECERRA MARYBEL	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
11	CC	74360014	BRIÑEZ JAMIX	231001	30	$1,562,616	$250,100	EPS037	30	$1,562,616	$62,600	CCF10	30	$1,635,365	$65,500	14-23	30	$1,562,616	$68,000	30	$0	$0
12	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
13	CC	74130567	CAMARGO JAVIER	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS005	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
14	CC	1053605688	CAMARGO JULIO	230301	25	$2,125,755	$340,200	EPS017	25	$2,125,755	$85,100	CCF10	25	$2,125,754	$85,100	14-23	25	$2,125,755	$11,100	25	$0	$0
15	CC	4192865	CAMARGO LUIS	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
16	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
17	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	230301	30	$1,700,606	$272,100	EPS037	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$1,773,355	$71,000	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
18	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
19	CC	1053606736	CHAPARRO LEIDY	230301	26	$1,091,414	$174,700	EPS041	26	$1,091,414	$43,700	CCF10	26	$1,154,464	$46,200	14-23	26	$1,091,414	$26,600	26	$0	$0
20	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	13	$515,941	$82,600	EPS017	13	$515,941	$20,700	CCF10	13	$515,941	$0	14-23	13	$515,941	$0	13	$0	$0
21	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF10	15	$0	$0	14-23	15	$580,000	$0	15	$0	$0
22	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	2	$79,376	$12,800	EPS017	2	$79,376	$3,200	CCF10	2	$1,629,848	$65,200	14-23	2	$79,376	$2,000	2	$0	$0
23	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	230301	15	$595,317	$95,300	EPS017	15	$595,317	$23,900	CCF10	15	$595,317	$0	14-23	15	$595,317	$0	15	$0	$0
24	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	230301	15	$625,082	$100,100	EPS017	15	$625,082	$25,100	CCF10	15	$2,211,930	$88,500	14-23	15	$625,082	$3,300	15	$0	$0
25	CC	1053606061	CORCHUELO LUDY	230201	30	$4,654,777	$791,400	EPS017	30	$4,654,777	$186,200	CCF10	30	$4,654,777	$186,200	14-23	30	$4,654,777	$113,400	30	$0	$0
26	CC	3005197	CORTES RAFAEL	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
27	CC	74322792	CURREA TITO	25-14	30	$6,121,038	$1,040,800	EPS005	30	$6,121,038	$244,900	CCF10	30	$6,121,038	$244,900	14-23	30	$6,121,038	$149,200	30	$0	$0
28	CC	1053604596	DIAZ SANDRA	25-14	26	$1,061,648	$169,900	EPS005	26	$1,061,648	$42,500	CCF10	26	$1,124,698	$45,000	14-23	26	$1,061,648	$25,900	26	$0	$0
29	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	230301	19	$925,715	$148,200	EPS017	19	$925,715	$37,100	CCF10	19	$925,715	$0	14-23	19	$925,715	$0	19	$0	$0
30	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	230301	11	$535,941	$85,800	EPS017	11	$535,941	$21,500	CCF10	11	$2,529,429	$101,200	14-23	11	$535,941	$2,800	11	$0	$0
31	CC	1049608486	ECHEVERRIA VICTOR	230201	30	$1,691,717	$270,700	CCFC55	30	$1,691,717	$67,700	CCF10	30	$1,764,466	$70,600	14-23	30	$1,691,717	$41,300	30	$0	$0
32	CC	1053608473	ESPEJO CARLOS	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS037	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
33	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	230301	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
34	CC	1053611961	ESPEJO YEISON	230301	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
35	CC	1053607571	FLOREZ DIEGO	230201	19	$950,339	$152,100	EPS017	19	$950,339	$38,100	CCF10	19	$950,339	$0	14-23	19	$950,339	$0	19	$0	$0
36	CC	1053607571	FLOREZ DIEGO	230201	11	$550,197	$88,100	EPS017	11	$550,197	$22,100	CCF10	11	$2,589,333	$103,600	14-23	11	$550,197	$13,500	11	$0	$0
37	CC	74323433	FONSECA JORGE	230201	30	$2,033,910	$325,500	EPS017	30	$2,033,910	$81,400	CCF10	30	$2,106,659	$84,300	14-23	30	$2,033,910	$88,500	30	$0	$0

2023/03/16 03:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1053607522	FORERO DIEGO	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS041	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$13,400	30	$0	$0
39	CC	39662885	GACHA MARTHA	25-14	30	$1,329,540	$212,800	EPS017	30	$1,329,540	$53,200	CCF10	30	$1,402,289	$56,100	14-23	30	$1,329,540	$32,400	30	$0	$0
40	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
41	CC	1053604772	GARZON CAMILO	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
42	CC	46680595	GOMEZ YENNY	231001	3	$119,064	$19,100	EPS017	3	$119,064	$4,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$119,064	$0	3	$0	$0
43	CC	46680595	GOMEZ YENNY	231001	27	$1,131,102	$181,000	EPS017	27	$1,131,102	$45,300	CCF10	27	$1,196,577	$47,900	14-23	27	$1,131,102	$27,600	27	$0	$0
44	CC	74130530	GONZALEZ WILDER	230301	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
45	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
46	CC	1053613608	GRANADOS JIMMY	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
47	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
48	CC	23856706	HIGUERA NUBIA	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
49	CC	1053610697	HOSTOS EDWARD	230301	30	$1,416,535	$226,700	EPS017	30	$1,416,535	$56,700	CCF10	30	$1,489,284	$59,600	14-23	30	$1,416,535	$61,700	30	$0	$0
50	CC	1053610783	HURTADO WILMER	230301	26	$1,031,882	$165,200	EPS017	26	$1,031,882	$41,300	CCF10	26	$1,094,932	$43,800	14-23	26	$1,031,882	$25,200	26	$0	$0
51	CC	46683315	JIMENEZ LUZ	230301	30	$1,250,165	$200,100	EPS037	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
52	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	2	$79,376	$12,800	EPS017	2	$79,376	$3,200	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$79,376	$0	2	$0	$0
53	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	28	$1,111,258	$177,900	EPS017	28	$1,111,258	$44,500	CCF10	28	$1,179,157	$47,200	14-23	28	$1,111,258	$27,100	28	$0	$0
54	CC	1053615233	LA ROTTA PEDRO	25-14	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
55	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	30	$1,270,009	$203,300	EPS005	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
56	CC	74322520	LARA LUIS	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
57	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	9	$765,272	$122,500	EPS017	9	$765,272	$30,700	CCF10	9	$765,272	$0	14-23	9	$765,272	$0	9	$0	$0
58	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	21	$1,785,634	$285,800	EPS017	21	$1,785,634	$71,500	CCF10	21	$3,269,598	$130,700	14-23	21	$1,785,634	$43,500	21	$0	$0
59	CC	40395482	LOPEZ ROSALBA	230201	30	$1,250,165	$200,100	EPS037	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
60	CC	1051588795	MACHUCA JOHNN	25-14	30	$1,578,370	$252,600	EPS017	30	$1,578,370	$63,200	CCF10	30	$1,651,119	$66,100	14-23	30	$1,578,370	$68,700	30	$0	$0
61	CC	74173225	MALAVER HECTOR	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
62	CC	73120570	MATEUS CESAR	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
63	CC	46682947	MESA MARTHA	231001	5	$483,334	$77,400	EPS005	5	$483,334	$19,400	CCF10	5	$483,333	$19,400	14-23	5	$483,334	$2,600	5	$0	$0
64	CC	1053614130	MONROY BENJAMIN	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
65	CC	4192455	MONROY EDILBERTO	25-14	26	$1,031,882	$165,200	EPS041	26	$1,031,882	$41,300	CCF10	26	$1,094,932	$43,800	14-23	26	$1,031,882	$25,200	26	$0	$0
66	CC	4192776	MONROY HERNANDO	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
67	CC	1053606329	MONROY PAOLA	230201	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
68	CC	1053605548	MORALES JESSICA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS005	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0
69	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	2	$94,436	$15,200	EPS017	2	$94,436	$3,800	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$94,436	$0	2	$0	$0
70	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	28	$1,416,535	$226,700	EPS017	28	$1,416,535	$56,700	CCF10	28	$1,484,435	$59,400	14-23	28	$1,416,535	$61,700	28	$0	$0
71	CC	1002538428	OCHOA MARIA	25-14	26	$1,266,768	$202,700	EPS017	26	$1,266,768	$50,700	CCF10	26	$1,329,818	$53,200	14-23	26	$1,266,768	$6,700	26	$0	$0
72	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	10	$2,482,546	$422,300	EPS017	10	$2,482,546	$99,400	CCF10	10	$2,797,047	$111,900	14-23	10	$2,482,546	$0	10	$0	$0
73	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	5	$620,638	$105,800	EPS017	5	$620,638	$24,900	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$620,638	$0	5	$0	$0
74	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	15	$1,551,593	$263,900	EPS017	15	$1,551,593	$62,100	CCF10	15	$0	$0	14-23	15	$1,551,593	$0	15	$0	$0
75	CC	1083619891	OCHOA WILFREDY	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
76	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	30	$1,289,852	$206,400	EPS017	30	$1,289,852	$51,600	CCF10	30	$1,362,601	$54,600	14-23	30	$1,289,852	$31,500	30	$0	$0
77	CC	60423066	PARRA BRIGIDA	230301	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
78	CC	46683468	PATARROYO ALICIA	230201	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
79	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
80	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC24	7	$270,667	$10,900	CCF10	7	$0	$0	14-23	7	$270,667	$0	7	$0	$0
81	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$193,334	$0	5	$0	$0
82	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	18	$793,756	$127,100	ESSC24	18	$793,756	$31,800	CCF10	18	$837,406	$33,500	14-23	18	$793,756	$4,200	18	$0	$0
83	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$1,322,914	$53,000	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
84	CC	4192111	RACHE JORGE	231001	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
85	CC	74360518	RACHE JOSE	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS041	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
86	CC	1053612002	RAMIREZ YENNY	230201	30	$2,682,136	$429,200	EPS017	30	$2,682,136	$107,300	CCF10	30	$2,682,136	$107,300	14-23	30	$2,682,136	$14,100	30	$0	$0
87	CC	1053609802	RICO LINA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	1053613345	RODRIGUEZ DUVAN	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
89	CC	1053615468	RODRIGUEZ DUVAN	230201	15	$750,268	$120,100	EPS037	15	$750,268	$30,100	CCF10	15	$750,268	$0	14-23	15	$750,268	$0	15	$0	$0
90	CC	1053615468	RODRIGUEZ DUVAN	230201	15	$750,268	$120,100	EPS037	15	$750,268	$30,100	CCF10	15	$2,680,724	$107,300	14-23	15	$750,268	$18,300	15	$0	$0
91	CC	7219471	RODRIGUEZ JULIO	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
92	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	30	$1,222,928	$195,700	EPS037	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
93	CC	1053605397	ROJAS MARIO	231001	30	$1,584,749	$253,600	EPS017	30	$1,584,749	$63,400	CCF10	30	$1,657,498	$66,300	14-23	30	$1,584,749	$69,000	30	$0	$0
94	CC	74322163	ROMERO JAIME	25-14	15	$595,317	$95,300	EPS037	15	$595,317	$23,900	CCF10	15	$595,317	$0	14-23	15	$595,317	$0	15	$0	$0
95	CC	74322163	ROMERO JAIME	25-14	15	$595,317	$95,300	EPS037	15	$595,317	$23,900	CCF10	15	$2,182,164	$87,300	14-23	15	$595,317	$14,600	15	$0	$0
96	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	20	$773,334	$123,800	EPS017	20	$773,334	$31,000	CCF10	20	$0	$0	14-23	20	$773,334	$0	20	$0	$0
97	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$0	$0	14-23	10	$386,667	$0	10	$0	$0
98	CC	74323801	RUIZ JOSE	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS037	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
99	CC	1053604273	RUIZ SANDRA	230201	30	$1,637,653	$262,100	EPS017	30	$1,637,653	$65,600	CCF10	30	$1,710,402	$68,500	14-23	30	$1,637,653	$39,900	30	$0	$0
100	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
101	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
102	CC	74322662	SALAZAR HERNAN	230301	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
103	CC	46683220	SALCEDO NINI	230201	26	$1,061,648	$169,900	EPS041	26	$1,061,648	$42,500	CCF10	26	$1,124,698	$45,000	14-23	26	$1,061,648	$25,900	26	$0	$0
104	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS008	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
105	CC	74322535	SANCHEZ HECTOR	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
106	CC	74130153	SUAREZ JOSE	230301	30	$1,270,009	$203,300	EPS037	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$6,700	30	$0	$0
107	CC	1053610842	TIBATA YOVANY	231001	30	$1,700,606	$272,100	EPS017	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$1,773,355	$71,000	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
108	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	30	$1,700,606	$272,100	EPS017	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$1,773,355	$71,000	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
109	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
110	CC	7226057	VALDERRAMA JOSE	230201	30	$1,190,633	$190,600	EPS008	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
111	CC	23856977	VALDERRAMA MARIA	230301	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$66,200	30	$0	$0
112	CC	74322488	VARGAS JOSE	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS008	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
113	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	30	$1,270,009	$203,300	EPS037	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$6,700	30	$0	$0
114	CC	74359989	VASQUEZ ANGEL	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(96)**					$154,148,563	$24,825,200			$154,148,563	$6,173,400			$169,811,489	$6,540,200			$154,148,563	$3,104,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914688846	9446824743	E	2023/02/10	2023/02/13	BANCO POPULAR	3	$40,787,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				96	$24,825,200	$88,300	$0	$24,913,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,402,100	$8,600	$0	$2,410,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$8,120,300	$28,900	$0	$8,149,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$6,029,600	$21,400	$0	$6,051,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$8,273,200	$29,400	$0	$8,302,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$3,104,000	$11,100	$0	$3,115,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	96	$3,104,000	$11,100	$0	$3,115,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$6,540,200	$23,200	$0	$6,563,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	96	$6,540,200	$23,200	$0	$6,563,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				96	$6,173,400	$22,300	$0	$6,195,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$67,700	$300	$0	$68,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,900	$700	$0	$172,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$50,500	$200	$0	$50,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	53	$3,507,700	$12,500	$0	$3,520,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,045,800	$3,800	$0	$1,049,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$277,300	$1,000	$0	$278,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,052,500	$3,800	$0	$1,056,300
TOTAL				96	$40,642,800	$144,900	$0	$40,787,700

2023/03/16 03:45 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052396359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON ARIEL BECERRA VALDERRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 10A 8A 73	TELÉFONO:	3143137
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4481931062		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993079906

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN							SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052396359	BECERRA VALDERRAMA WILSON ARIEL	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600
