PROGRAMACION

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
1			LICITACIÓN OBRA PUBLICA PARQUES					91,63 días?	vie 9/09/22	jue 5/01/23	
2			Gestion de documentos y preparacion para inicio de actividades					14 días	vie 9/09/22	mar 27/09/22	
3			CASA DE LA CULTURA					45 días?	mié 9/11/22	jue 5/01/23	2
4		1	PREMILIMARES					20 días?	mié 9/11/22	lun 5/12/22	
5		1.1	Preliminares					12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22	
6		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	51,00	$ 23.239,00	$ 1.185.189,00	4 días	mié 9/11/22	mar 15/11/22	
7		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	0,00	$ 3.419,00	$ 0,00	10 días	jue 10/11/22	mié 23/11/22	6CC+1 día
8		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	5 días	sáb 12/11/22	sáb 19/11/22	7CC+2 días
9		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	4 días	vie 11/11/22	jue 17/11/22	7CC+1 día
10		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	4 días	sáb 19/11/22	jue 24/11/22	8
11		1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9 días	sáb 19/11/22	jue 1/12/22	
12		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	13,00	$ 51.617,00	$ 671.021,00	5 días	sáb 19/11/22	vie 25/11/22	8
13		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	2 días	vie 25/11/22	mar 29/11/22	12
14		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	10,40	$ 108.666,00	$ 1.130.126,40	2 días	mar 29/11/22	jue 1/12/22	13
15		2	ESTRUCTURAS					5 días	jue 1/12/22	mié 7/12/22	
16		2.1	Estructura en Concreto					5 días	jue 1/12/22	mié 7/12/22	

ago

Tarea	Tarea crítica resumida	solo duración	Hito externo
División	División crítica resumida	Informe de resumen manual	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas
Atraso	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
Resumen	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Resumen del proyecto	Tarea manual	Tareas externas	Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
17		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	96,00	$ 67.469,00	$ 6.477.024,00	2 días	lun 5/12/22	mié 7/12/22	18
18		2.1.2	Instalación de Malla electrosoldada	Kg	284,16	$ 9.854,00	$ 2.800.112,64	3 días	jue 1/12/22	lun 5/12/22	14
19		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					23 días?	mié 7/12/22	jue 5/01/23	
20		3.1	Juegos					5 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22	
21		3.1.1	INSTALACION Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	Un	0,00	$ 1.188.071,00	$ 0,00	3 días	lun 19/12/22	mié 21/12/22	17
22		3.1.2	INSTALACION Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	Un	0,00	$ 3.541.261,00	$ 0,00	3 días	mar 20/12/22	jue 22/12/22	17
23		3.1.3	INSTALACION JUEGO INFANTIL PRIMERA INFANCIA ATI006B	Un	0,00	$ 3.099.708,00	$ 0,00	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	17
24		3.1.4	INSTALACION JUEGO INFANTIL PRIMERA INFANCIA ATI007B	Un	0,00	$ 2.795.584,00	$ 0,00	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	17
25		3.2	Urbanismo y mobiliario					23 días	mié 7/12/22	jue 5/01/23	
26		3.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN, INCLUYE SELLO DE JUNTAS BARRIDO Y RETIRO DE CAPA VEGETAL	m2	107,73	$ 1.361,00	$ 146.620,53	6 días	mié 7/12/22	jue 15/12/22	263
27		3.2.2	BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES(DESM+SUM+INST)	ml	0,00	$ 320.734,00	$ 0,00	2 días	jue 15/12/22	sáb 17/12/22	26
28		3.2.3	Sellado de junta en piso continuo de concreto, con masilla.	ml	0,00	$ 5.315,00	$ 0,00	2 días	sáb 17/12/22	mar 20/12/22	27
29		3.2.4	instalación piso de caucho EPDM+SBR, con diseño decorativo o similar	m2	70,00	$ 302.126,00	$ 21.148.820,00	6 días	mar 20/12/22	mié 28/12/22	28
30		3.2.5	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	2,00	$ 864.938,00	$ 1.729.876,00	2 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	29
31		3.2.6	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	2,00	$ 3.071.614,00	$ 6.143.228,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	205
32		3.2.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	0,00	$ 21.170,00	$ 0,00	2 días	mié 7/12/22	sáb 10/12/22	17
33		3.2.8	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	144,00	$ 21.934,00	$ 3.158.496,00	7 días	mié 28/12/22	jue 5/01/23	29

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
34		3.2.9	INSTALACION BANCA ARCO SIN ESPALDAR GRC 21 MP SEGÚN DISEÑO LARGO: 1,5 M ALTO BANCA: 0,45 M ANCHO: 0,63 M TIPO IDRD	Un	2,00	$ 1.876.675,00	$ 3.753.350,00	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	
35		3.2.10	INSTALACION BANCA MODULAR CURVA ARCO SEGÚN DISEÑO TIPO IDRD	Un	4,00	$ 872.754,00	$ 3.491.016,00	2 días	sáb 31/12/22	mar 3/01/23	34
36		3.1.1 -NP	INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	3,00	$ 1.188.071,00	$ 3.564.213,00	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	
37		3.1.2 NP 04	INSTALACION Mesa de ping pong en concreto de 2.74X1.52m	Un	2,00	$ 3.541.261,00	$ 7.082.522,00	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	36
38		3.2.2 NP 07	PUERTA CORREDERA CON MARCO METALICO Y MALLA DE CERRAMIENTO	M2	3,00	$ 534.557,00	$ 1.603.671,00	1 día	sáb 10/12/22	lun 12/12/22	37
39		3.1.3 NP 09	INSTALACION juego infantil resortado primera infancia ref.=ATI001A	Un	2,00	$ 3.160.418,00	$ 6.320.836,00	1 día	lun 12/12/22	mar 13/12/22	38
40			MONUMENTO LLERAS					45 días?	mié 9/11/22	jue 5/01/23	
41		1	PRELIMINARES					12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22	
42		1.1	Preliminares					12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22	
43		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	50,00	$ 23.239,00	$ 1.161.950,00	2 días	mié 9/11/22	jue 10/11/22	
44		1.1.2	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	5 días	mar 15/11/22	lun 21/11/22	45CC+2 días
45		1.1.3	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	103,00	$ 3.419,00	$ 352.157,00	10 días	vie 11/11/22	jue 24/11/22	43
46		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	2 días	mar 15/11/22	jue 17/11/22	45CC+2 días
47		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	4 días	sáb 12/11/22	mar 22/11/22	45CC+1 día
48		2	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					45 días?	mié 9/11/22	jue 5/01/23	
49		2.1	Urbanismo, obras exteriores y juegos					45 días	mié 9/11/22	jue 5/01/23	

ago

Tarea	Tarea crítica resumida	solo duración	Hito externo
División	División crítica resumida	Informe de resumen manual	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas
Atraso	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
Resumen	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Resumen del proyecto	Tarea manual	Tareas externas	Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
50		2.1.1	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	Ml	40,00	$ 38.965,00	$ 1.558.600,00	3 días	jue 24/11/22	mar 29/11/22	45
51		2.1.2	Desmonte y demolición banca (incluye cargue y retiro)	Un	2,00	$ 83.099,00	$ 166.198,00	2 días	jue 24/11/22	lun 28/11/22	50CC
52		2.1.3	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + ar	M2	91,00	$ 10.545,00	$ 959.595,00	4 días	lun 28/11/22	vie 2/12/22	51
53		2.1.4	DEMOLICION MANUAL BORDILLO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTE)	ML	50,00	$ 14.623,00	$ 731.150,00	2 días	vie 2/12/22	lun 5/12/22	52
54		2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,00	$ 51.617,00	$ 1.032.340,00	2 días	lun 5/12/22	mié 7/12/22	53
55		2.1.6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	15,00	$ 59.360,00	$ 890.400,00	2 días	mié 7/12/22	sáb 10/12/22	54
56		2.1.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0,00	$ 21.170,00	$ 0,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	55
57		2.1.8	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	11,00	$ 10.460,00	$ 115.060,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	55
58		2.1.9	Placa para rampa de acceso para discapacitados y evacuación, concreto de 3000 psi	M2	4,80	$ 80.806,00	$ 387.868,80	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	55
59		2.1.10	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	30,00	$ 64.319,00	$ 1.929.570,00	4 días	mar 13/12/22	lun 19/12/22	58
60		2.1.11	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	2,00	$ 864.938,00	$ 1.729.876,00	2 días	lun 2/01/23	mié 4/01/23	62
61		2.1.12	BANCA EN CONCRETO MODULAR M-40	UN	10,00	$ 215.493,00	$ 2.154.930,00	2 días	lun 2/01/23	mié 4/01/23	62
62		2.1.13	PINTURA EN FRIO	M2	10,00	$ 19.956,00	$ 199.560,00	4 días	mié 28/12/22	lun 2/01/23	
63		2.1.14	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	20,42	$ 86.903,00	$ 1.774.559,26	2 días	lun 19/12/22	mié 21/12/22	59
64		3.2.13 NP 9	SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	50,00	$ 99.343,00	$ 4.967.150,00	4 días	mié 21/12/22	lun 26/12/22	63

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
65		3.2.10 NP 10	instalación Adoquín peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, Incluye base en arena de 3 cm	m2	5,40	$ 50.357,00	$ 271.927,80	4 días	lun 26/12/22	vie 30/12/22	64
66			OFICHIA								
67		1	PRELIMINARES								
68		1.1	Preliminares								
69		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	0,00	$ 23.239,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
70		1.1.2	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
71		1.1.3	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	0,00	$ 3.419,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
72		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
73		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00				
74		1.2	Movimientos de tierras								
75		1.2.1	Excavación mecánica	m3	0,00	$ 8.273,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
76		1.2.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	$ 22.035,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
77		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
78		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	0,00	$ 108.666,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
79		2	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES								
80		2.1	Urbanismo, obras exteriores y juegos								

ago

Tarea	Tarea crítica resumida	solo duración	Hito externo
División	División crítica resumida	Informe de resumen manual	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas
Atraso	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
Resumen	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Resumen del proyecto	Tarea manual	Tareas externas	Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
81		2.1.1	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	Un	0,00	$ 36.767,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
82			DEMOLICION BORDILLO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTE)	ML	0,00	$ 14.623,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
83			Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	m2	0,00	$ 16.640,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
84			instalación Adoquín peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, Incluye base en arena de 3 cm	m2	0,00	$ 77.733,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
85			Placa para rampa de acceso para discapacitados y evacuación, concreto de 3000 psi	m2	0,00	$ 80.806,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
86			RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	0,00	$ 59.360,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
87			BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	0,00	$ 64.319,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
88			CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	0,00	$ 864.938,00	$ 0,00	0 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	
89			INSTALACION BANCA MODULAR CURVA ARCO SEGÚN DISEÑO TIPO IDRD	Un	0,00	$ 872.754,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
90			BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0,00	$ 42.421,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
91			PINTURA EN FRÍO GRIS	ML	0,00	$ 4.243,00	$ 0,00	0 días	mié 28/12/22	mié 28/12/22	
92			PINTURA EN FRIO	M2	0,00	$ 19.956,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
93			JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	0,00	$ 86.903,00	$ 0,00	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	
94			PARQUE CARRERA SEPTIMA					76,75 días?	mié 28/09/22	jue 5/01/23	
95		1	PRELIMINARES					31,75 días	mié 28/09/22	mar 8/11/22	
96		1.1	Preliminares					16,88 días	mié 28/09/22	mié 19/10/22	
97		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	30,00	$ 23.239,00	$ 697.170,00	4 días	mié 28/09/22	lun 3/10/22	
98		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	230,00	$ 3.419,00	$ 786.370,00	12 días	jue 29/09/22	jue 13/10/22	97CC+1 día

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
99		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	1,00	$ 1.274.592,00	$ 1.274.592,00	5 días	sáb 1/10/22	vie 7/10/22	98CC+2 días
100		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	5 días	mié 12/10/22	mié 19/10/22	
101		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	5 días	mié 12/10/22	mié 19/10/22	98CC+1 día
102		1.2	Movimiento de tierras					9,25 días	jue 27/10/22	mar 8/11/22	
103		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	68,38	$ 51.617,00	$ 3.529.570,46	2 días	jue 27/10/22	vie 28/10/22	99
104		1.2.2	Excavación mecánica, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	14,58	$ 28.100,00	$ 409.698,00	3 días	sáb 29/10/22	mié 2/11/22	103
105		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	2 días	vie 4/11/22	mar 8/11/22	106
106		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	49,70	$ 108.666,00	$ 5.400.700,20	2 días	mié 2/11/22	vie 4/11/22	104
107		2	ESTRUCTURAS					5 días	vie 4/11/22	vie 11/11/22	
108		2.1	Estructuras de concreto					5 días	vie 4/11/22	vie 11/11/22	
109		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	52,50	$ 67.469,00	$ 3.542.122,50	2 días	mié 9/11/22	vie 11/11/22	110
110		2.1.2	instalación de Malla electrosoldada	Kg	163,92	$ 9.854,00	$ 1.615.267,68	3 días	vie 4/11/22	mié 9/11/22	106
111		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					41 días?	sáb 12/11/22	mié 4/01/23	
112		3.1	Juegos					3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	
113		3.1.1	instalación juego infantil primera infancia, incluye transporte y obra civil de instalación.	Un	1,00	$ 10.733.933,00	$ 10.733.933,00	3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	109

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
114		3.1.2	instalación Equipo Biosaludable Elíptica Tipo GECAR, elaborado en tubo redondo, incluye transporte y obra civil de instalación.	Un	1,00	$ 2.117.684,00	$ 2.117.684,00	3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	109
115		3.1.3	instalación Equipo Biosaludable Doble Swinger Tipo GECAR, elaborado en tubo redondo, incluye transporte y obra civil de instalación.	Un	1,00	$ 1.781.496,00	$ 1.781.496,00	3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	109
116		3.1.4	instalación Equipo Biosaludable Twister Tipo GECAR, elaborado en tubo redondo, incluye transporte y obra civil de instalación.	Un	1,00	$ 1.781.496,00	$ 1.781.496,00	3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	109
117		3.1.5	instalación Equipo Biosaludable Barras Paralelas Tipo GECAR, elaborado en tubo redondo, incluye transporte y obra civil de instalación.	Un	1,00	$ 1.394.120,00	$ 1.394.120,00	3 días	sáb 12/11/22	jue 17/11/22	109
118		3.2	Urbanismo y moviliario					41 días	sáb 12/11/22	mié 4/01/23	
119		3.2.1	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	Un	1,00	$ 187.026,00	$ 187.026,00	2 días	sáb 12/11/22	mié 16/11/22	
120		3.2.2	MODULO BANCA SENCILLA, EN PERFILERIA METALICA, PINTURA IMITACION MADERA, 3M *1M ADOSADA A MATERA EN CONCERO DE 1*1*0,50M, ESPESOR 0,8 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	0,00	$ 2.808.961,00	$ 0,00	2 días	mié 28/12/22	jue 29/12/22	
121		3.2.3	Placa para rampa de acceso para discapacitados y evacuación, concreto de 3000 psi	m2	6,20	$ 80.806,00	$ 500.997,20	2 días	sáb 12/11/22	mié 16/11/22	109
122		3.2.4	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	0,00	$ 59.360,00	$ 0,00	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	119
123		3.2.5	Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	m2	64,00	$ 16.640,00	$ 1.064.960,00	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	122CC
124		3.2.6	Desmonte y reinstalación Banca en madera M-50	UN	2,00	$ 140.326,00	$ 280.652,00	2 días	mar 3/01/23	mié 4/01/23	129CC
125		3.2.7	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	8,42	$ 86.903,00	$ 731.723,26	2 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22	133

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
126		3.2.8	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	4,00	$ 10.460,00	$ 41.840,00	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	119
127		3.2.9	instalación piso de caucho EPDM+SBR, con diseño decorativo o similar	m2	41,30	$ 302.126,00	$ 12.477.803,80	6 días	vie 18/11/22	vie 25/11/22	126
128		3.2.10	instalación Adoquín peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, Incluye base en arena de 3 cm	m2	92,17	$ 77.733,00	$ 7.164.650,61	3 días	vie 18/11/22	mar 22/11/22	126
129		3.2.11	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	2,00	$ 864.938,00	$ 1.729.876,00	2 días	mar 3/01/23	mié 4/01/23	
130		3.2.12	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0,00	$ 21.170,00	$ 0,00	2 días	sáb 12/11/22	mié 16/11/22	109
131		3.2.13	SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	59,80	$ 99.343,00	$ 5.940.711,40	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	130
132		3.2.14	Cañuela tipo A120 (Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:4).	ml	0,00	$ 89.747,00	$ 0,00	2 días	vie 18/11/22	lun 21/11/22	131
133		3.2.15	Bordillo prefabricado tipo A80 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	91,40	$ 70.724,00	$ 6.464.173,60	2 días	lun 21/11/22	mié 23/11/22	132
134		3.2.16	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	2,00	$ 3.071.614,00	$ 6.143.228,00	3 días	mar 27/12/22	jue 29/12/22	
135		3.1.1.1-NP 02	INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	1,00	$ 1.188.071,00	$ 1.188.071,00	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	
136		3.2.8	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	38,00	$ 21.934,00	$ 833.492,00	3 días	vie 23/12/22	mar 27/12/22	
137			PARQUE LA BALSA					74,75 días?	vie 30/09/22	jue 5/01/23	
138		1	PRELIMINARES					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
139		1.1	Preliminares					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
140		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	66,00	$ 23.239,00	$ 1.533.774,00	5 días	vie 30/09/22	jue 6/10/22	
141		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	62,00	$ 3.419,00	$ 211.978,00	15 días	sáb 1/10/22	vie 21/10/22	140CC+1 día
142		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	5 días	mar 4/10/22	lun 10/10/22	141CC+2 días

ago



Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
143		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	141CC+1 día
144		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	141CC+1 día
145		1.2	Movimiento de tierras					7 días	lun 10/10/22	jue 20/10/22	
146		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	3,62	$ 51.617,00	$ 186.853,54	3 días	lun 10/10/22	jue 13/10/22	142
147		1.2.2	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	2 días	jue 13/10/22	mar 18/10/22	146
148		1.2.3	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	4,50	$ 108.666,00	$ 488.997,00	2 días	mar 18/10/22	jue 20/10/22	147
149		2	ESTRUCTURAS					4 días	jue 20/10/22	mar 25/10/22	
150		2.1	Estructuras en concreto					4 días	jue 20/10/22	mar 25/10/22	
151		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	11,46	$ 67.469,00	$ 773.194,74	2 días	sáb 22/10/22	mar 25/10/22	152
152		2.1.2	instalación de Malla electrosoldada	Kg	33,15	$ 9.854,00	$ 326.660,10	2 días	jue 20/10/22	sáb 22/10/22	148
153		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					55,75 días?	mar 25/10/22	jue 5/01/23	
154		3.1	Juegos					1,25 días	mié 4/01/23	jue 5/01/23	
155		3.1.1	INSTALACION Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	Un	0,00	$ 1.188.071,00	$ 0,00	1 día	jue 5/01/23	jue 5/01/23	117
156		3.1.2	instalación juego infantil en madera	Un	1,00	$ 5.288.612,00	$ 5.288.612,00	1 día	jue 5/01/23	jue 5/01/23	155CC
157		3.2	Urbanismo y moviliario					53,75 días?	mar 25/10/22	mar 3/01/23	
158		3.2.1	INSTALACION BANCA MODULAR CURVA ARCO SEGÚN DISEÑO TIPO IDRD	Un	4,00	$ 872.754,00	$ 3.491.016,00	3 días	mar 20/12/22	jue 22/12/22	

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
159		3.2.7	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	24,47	$ 86.903,00	$ 2.126.533,41	3 días	mié 26/10/22	sáb 29/10/22	263
160		3.2.3	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	2,00	$ 864.938,00	$ 1.729.876,00	3 días	mar 20/12/22	jue 22/12/22	158CC
161		3.2.4	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	3,00	$ 3.071.614,00	$ 9.214.842,00	3 días	vie 30/12/22	mar 3/01/23	134
162		3.1.1 NP 03	INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	2,00	$ 1.188.071,00	$ 2.376.142,00	1 día	jue 22/12/22	jue 22/12/22	
163		3.2.8	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	14,40	$ 21.934,00	$ 315.849,60	3 días	vie 16/12/22	mar 20/12/22	
164			PARQUE COLEGIO DEPARTAMENTAL					45 días?	mié 9/11/22	jue 5/01/23	
165		1	PRELIMINARES					20 días	mié 9/11/22	lun 5/12/22	
166		1.1	Preliminares					13 días	mié 9/11/22	vie 25/11/22	
167		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	111,00	$ 23.239,00	$ 6.767.196,80	5 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	
168		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	312,00	$ 3.419,00	$ 1.386.746,40	12 días	jue 10/11/22	vie 25/11/22	167CC+1 día
169		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	1,00	$ 1.274.592,00	$ 1.656.969,60	5 días	sáb 12/11/22	sáb 19/11/22	168CC+2 días
170		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	5 días	vie 11/11/22	vie 18/11/22	168CC+1 día
171		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	5 días	vie 11/11/22	vie 18/11/22	168CC+1 día
172		1.2	Movimientos de tierras					12 días	sáb 19/11/22	lun 5/12/22	
173		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	115,88	$ 51.617,00	$ 5.981.377,96	2 días	sáb 19/11/22	mar 22/11/22	169
174		1.2.2	Excavación mecánica, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	0,00	$ 28.100,00	$ 0,00	4 días	mar 22/11/22	lun 28/11/22	173

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
175		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	3 días	lun 28/11/22	jue 1/12/22	174
176		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	62,38	$ 108.666,00	$ 6.778.585,08	3 días	jue 1/12/22	lun 5/12/22	175
177		2	ESTRUCTURAS					4 días	lun 5/12/22	sáb 10/12/22	
178		2.1	Estructura en Concreto					4 días	lun 5/12/22	sáb 10/12/22	
179		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	71,00	$ 67.469,00	$ 4.790.299,00	2 días	mié 7/12/22	sáb 10/12/22	180
180		2.1.2	instalación de Malla electrosoldada	Kg	210,16	$ 9.854,00	$ 2.070.916,64	2 días	lun 5/12/22	mié 7/12/22	176
181		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					51,13 días?	sáb 29/10/22	jue 5/01/23	
182		3.1	Juegos					14,38 días	sáb 10/12/22	mié 28/12/22	
183		3.1.1	instalación Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	Un	0,00	$ 3.541.261,00	$ 0,00	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	179
184		3.1.2	INSTALACION Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	Un	0,00	$ 1.188.071,00	$ 0,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
185		3.1.3	INSTALACION juego infantil resortado primera infancia ref.=ATI001A	Un	3,00	$ 3.160.418,00	$ 9.481.254,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
186		3.1.4	INSTALACION juego infantil resortado primera infancia ref.=SF002	Un	1,00	$ 3.775.305,00	$ 3.775.305,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
187		3.1.5	INSTALACION juego infantil TRIKI primera infancia ref.=ATI006B	Un	0,00	$ 3.099.708,00	$ 0,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
188		3.1.6	INSTALACION juego infantil ABACO primera infancia ref.=ATI007B	Un	0,00	$ 2.795.584,00	$ 0,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
189		3.1.7	instalación juego infantil en madera	Un	1,00	$ 5.288.612,00	$ 5.288.612,00	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
190		3.2	Urbanismo y mobiliario					11,75 días?	sáb 10/12/22	lun 26/12/22	

ago



Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
191		3.2.1	MODULO BANCA SENCILLA, EN PERFILERIA METALICA, PINTURA IMITACION MADERA, 3M *1M ADOSADA A MATERA EN CONCERO DE 1*1*0,50M, ESPESOR 0,8 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	0,00	$ 2.808.961,00	$ 0,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	189
192		3.2.2	INSTALACION BANCA MODULAR CURVA INTERIOR SEGÚN DISEÑO L=230 CM ASIENTO GRANITO PULIDO BASES EN CONCRETO. 269 KG	Un	12,00	$ 872.754,00	$ 10.473.048,00	3 días	mié 14/12/22	lun 19/12/22	189
193		3.2.3	Placa para rampa de acceso para discapacitados y evacuación, concreto de 3000 psi	m2	0,00	$ 80.806,00	$ 0,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	189
194		3.2.4	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	0,00	$ 59.360,00	$ 0,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	189
195		3.2.5	Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	m2	501,85	$ 16.640,00	$ 8.350.822,60	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	189
196		3.2.6	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	60,00	$ 86.903,00	$ 5.214.180,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	189
197		3.2.7	instalación piso de caucho EPDM+SBR, con diseño decorativo o similar	m2	28,00	$ 302.126,00	$ 8.459.528,00	6 días	vie 16/12/22	sáb 24/12/22	196
198		3.2.8	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	M2	0,00	$ 10.545,00	$ 0,00	4 días	sáb 10/12/22	jue 15/12/22	179
199		3.2.9	Desmonte y reinstalación ADOQUIN CONCRETO	M2	171,70	$ 42.086,00	$ 7.226.166,20	7 días	sáb 10/12/22	mar 20/12/22	179
200		3.2.10	instalación Adoquín peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, Incluye base en arena de 3 cm	m2	0,00	$ 77.733,00	$ 0,00	8 días	mié 14/12/22	sáb 24/12/22	205
201		3.2.11	instalación piso en adoquín 20x10x6cm (incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello)	m2	70,20	$ 50.357,00	$ 3.535.061,40	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	205
202		3.2.12	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	5,00	$ 864.938,00	$ 4.324.690,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	179
203		3.2.13	SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	106,00	$ 99.343,00	$ 10.530.358,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	179

ago




Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
204		3.2.14	Cañuela tipo A120 (Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:4).	ml	0,00	$ 89.747,00	$ 0,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	179
205		3.2.15	Bordillo prefabricado tipo A80 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	218,20	$ 70.724,00	$ 15.431.976,80	3 días	sáb 10/12/22	mié 14/12/22	179
206		3.2.16	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	3,00	$ 3.071.614,00	$ 9.214.842,00	2 días	sáb 10/12/22	mar 13/12/22	179
207		3.1.1 NP 02	INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	3,00	$ 1.188.071,00	$ 3.564.213,00	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	
208		3.1.2 NP 03	INSTALACION Mesa de ping pong en concreto de 2.74X1.52m	Un	3,00	$ 3.541.261,00	$ 10.623.783,00	1 día	mié 21/12/22	mié 21/12/22	207
209		3.2.1.1 NP 11	INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP PIGMENTADO SEGÚN DISEÑO A=1.8m H=0.8m P=0.57m Peso=369kg ref.=102893	Un	2,00	$ 2.001.701,00	$ 4.003.402,00	1 día	jue 22/12/22	jue 22/12/22	208
210		3.2.7.1 NP 12	DEMOLICION BORDILLO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTE)	ML	145,70	$ 14.623,00	$ 2.130.571,10	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	209
211		3.2.8 N	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	46,00	$ 21.934,00	$ 1.008.964,00	1 día?	sáb 24/12/22	lun 26/12/22	210
212			PARQUE 20 DE JULIO					74,75 días?	vie 30/09/22	jue 5/01/23	
213		1	PRELIMINARES					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
214		1.1	Preliminares					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
215		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	120,00	$ 23.239,00	$ 2.788.680,00	5 días	vie 30/09/22	jue 6/10/22	
216		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	250,00	$ 3.419,00	$ 854.750,00	15 días	sáb 1/10/22	vie 21/10/22	215CC+1 día
217		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	5 días	mar 4/10/22	lun 10/10/22	216CC+2 días
218		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	216CC+1 día
219		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	216CC+1 día

ago

Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
220		1.2	Movimientos de tierras					8 días	lun 10/10/22	vie 21/10/22	
221		1.2.2	Excavación mecánica, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	0,00	$ 28.100,00	$ 0,00	2 días	lun 10/10/22	mié 12/10/22	217
222		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	31,32	$ 51.617,00	$ 1.616.644,44	2 días	mié 12/10/22	vie 14/10/22	221
223		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	2 días	vie 14/10/22	mié 19/10/22	222
224		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	20,36	$ 108.666,00	$ 2.212.439,76	2 días	mié 19/10/22	vie 21/10/22	223
225		2	ESTRUCTURAS					4 días	vie 21/10/22	mié 26/10/22	
226		2.1	Estructura en Concreto					4 días	vie 21/10/22	mié 26/10/22	
227		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	25,52	$ 67.469,00	$ 1.721.808,88	2 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	228
228		2.1.2	instalación de Malla electrosoldada	Kg	75,54	$ 9.854,00	$ 744.371,16	2 días	vie 21/10/22	lun 24/10/22	224
229		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					54,75 días	mié 26/10/22	jue 5/01/23	
230		3.1	Juegos					4 días	lun 2/01/23	jue 5/01/23	
231		3.1.1	INSTALACION Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	Un	0,00	$ 1.188.071,00	$ 0,00	2 días	lun 2/01/23	mar 3/01/23	227
232		3.1.2	instalación Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	Un	0,00	$ 3.541.261,00	$ 0,00	2 días	mié 4/01/23	jue 5/01/23	231
233		3,2	Urbanismo y mobiliario					52,13 días	mié 26/10/22	mar 3/01/23	
234		3.2.1	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	Un	2,00	$ 187.026,00	$ 374.052,00	2 días	mié 26/10/22	vie 28/10/22	263

ago




Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
235		3.2.2	MODULO BANCA SENCILLA, EN PERFILERIA METALICA, PINTURA IMITACION MADERA, 3M *1M ADOSADA A MATERA EN CONCERO DE 1*1*0,50M, ESPESOR 0,8 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	0,00	$ 2.808.961,00	$ 0,00	2 días	vie 30/12/22	lun 2/01/23	120
236		3.2.3	INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP PIGMENTADO SEGÚN DISEÑO A=1.8m H=0.8m P=0.57m Peso=369kg ref.=102893	Un	7,00	$ 2.001.701,00	$ 14.011.907,00	2 días	mar 13/12/22	jue 15/12/22	202
237		3.2.4	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	18,00	$ 86.903,00	$ 1.564.254,00	2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22	234
238		3.2.5	Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	m2	0,00	$ 16.640,00	$ 0,00	2 días	lun 31/10/22	mié 2/11/22	237
239		3.2.6	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	4,00	$ 864.938,00	$ 3.459.752,00	2 días	mar 13/12/22	jue 15/12/22	236CC
240		3.2.7	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	120,00	$ 21.934,00	$ 2.632.080,00	5 días	mié 28/12/22	mar 3/01/23	
241		3.2.8	instalación piso en adoquín 20x10x6cm (incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello)	m2	81,30	$ 50.357,00	$ 4.094.024,10	2 días	mié 2/11/22	vie 4/11/22	238
242		3.2.9	SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	0,00	$ 99.343,00	$ 0,00	2 días	vie 4/11/22	mié 9/11/22	241
243		3.2.10	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	3,00	$ 3.071.614,00	$ 9.214.842,00	4 días	mar 20/12/22	vie 23/12/22	
244		3.1.1-N 03	SUMINISTRO E INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	2,00	$ 1.188.071,00	$ 2.376.142,00	1 día	sáb 24/12/22	lun 26/12/22	243
245		3.1.2-N 04	SUMINISTRO E INSTALACION Mesa de ping pong en concreto de 2.74X1.52m	Un	1,00	$ 3.541.261,00	$ 3.541.261,00	1 día	lun 26/12/22	mar 27/12/22	244
246		3.2.7.1 NP 01	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	M2	78,54	$ 10.545,00	$ 828.204,30	1 día	mar 27/12/22	mié 28/12/22	245
247		3.2.8.1 NP 02	Bordillo prefabricado tipo A80 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	101,14	$ 70.724,00	$ 7.153.025,36	1 día	mié 28/12/22	jue 29/12/22	246
248			PARQUE CHILACOS					74,75 días?	vie 30/09/22	jue 5/01/23	

ago

Tarea	Tarea crítica resumida	solo duración	Hito externo
División	División crítica resumida	Informe de resumen manual	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas
Atraso	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
Resumen	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Resumen del proyecto	Tarea manual	Tareas externas	Margen de demora

Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
249		1	PRELIMINARES					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
250		1.1	Preliminares					16 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	
251		1.1.1	Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	ml	159,80	$ 23.239,00	$ 3.713.592,20	4 días	vie 30/09/22	mié 5/10/22	
252		1.1.2	Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica	m2	102,00	$ 3.419,00	$ 348.738,00	15 días	sáb 1/10/22	vie 21/10/22	251CC+1 día
253		1.1.3	CAMPAMENTO 9 M2	Un	0,00	$ 1.274.592,00	$ 0,00	5 días	mar 4/10/22	lun 10/10/22	252CC+2 día
254		1.1.4	Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.161.544,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	252CC+1 día
255		1.1.5	Instalación provisional de energía, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra	Un	0,00	$ 1.658.560,00	$ 0,00	5 días	lun 3/10/22	sáb 8/10/22	252CC+1 día
256		1.2	Movimientos de tierras					8 días	lun 10/10/22	vie 21/10/22	
257		1.2.2	Excavación mecánica, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	0,00	$ 28.100,00	$ 0,00	2 días	lun 10/10/22	mié 12/10/22	253
258		1.2.1	Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	m3	8,48	$ 51.617,00	$ 437.712,16	2 días	mié 12/10/22	vie 14/10/22	257
259		1.2.3	Relleno con BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 330)	m3	0,00	$ 116.747,00	$ 0,00	2 días	vie 14/10/22	mié 19/10/22	258
260		1.2.4	Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	m3	4,26	$ 108.666,00	$ 462.917,16	2 días	mié 19/10/22	vie 21/10/22	259
261		2	ESTRUCTURAS					4 días	vie 21/10/22	mié 26/10/22	
262		2.1	Estructura en Concreto					4 días	vie 21/10/22	mié 26/10/22	
263		2.1.1	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	m2	15,81	$ 67.469,00	$ 1.066.684,89	2 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	264

ago



Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
264		2.1.2	instalación de Malla electrosoldada	Kg	46,80	$ 9.854,00	$ 461.167,20	2 días	vie 21/10/22	lun 24/10/22	260
265		3	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES					50,5 días?	vie 28/10/22	mar 3/01/23	
266		3.1	Juegos					2 días	lun 19/12/22	mié 21/12/22	
267		3.1.1	INSTALACION Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	Un	0,00	$ 1.188.071,00	$ 0,00	2 días	lun 19/12/22	mié 21/12/22	270
268		3,2	Urbanismo y mobiliario					50,5 días?	vie 28/10/22	mar 3/01/23	
269		3.2.1	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	Un	1,00	$ 187.026,00	$ 187.026,00	2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22	234
270		3.2.2	MODULO BANCA SENCILLA, EN PERFILERIA METALICA, PINTURA IMITACION MADERA, 3M *1M ADOSADA A MATERA EN CONCERO DE 1*1*0,50M, ESPESOR 0,8 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	0,00	$ 2.808.961,00	$ 0,00	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	239
271		3.2.3	INSTALACION BANCA MODULAR CURVA ARCO SEGÚN DISEÑO TIPO IDRD	Un	1,00	$ 872.754,00	$ 872.754,00	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	239
272		3.2.4	Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	m2	90,00	$ 16.640,00	$ 1.497.600,00	2 días	mié 14/12/22	vie 16/12/22	273
273		3.2.5	JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	M2	21,68	$ 86.903,00	$ 1.884.057,04	2 días	lun 12/12/22	mié 14/12/22	275
274		3.2.6	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	un	2,00	$ 864.938,00	$ 1.729.876,00	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	271CC
275		3.2.7	instalación piso en adoquín 20x10x6cm (incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello)	m2	8,10	$ 50.357,00	$ 407.891,70	2 días	vie 9/12/22	lun 12/12/22	276
276		3.2.8	SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	0,00	$ 99.343,00	$ 0,00	2 días	mar 6/12/22	mié 7/12/22	
277		3.2.9	LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	Un	1,00	$ 3.071.614,00	$ 3.071.614,00	4 días	sáb 24/12/22	jue 29/12/22	243
278		3.1.1.1 NP-03	INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	Un	1,00	$ 1.188.071,00	$ 1.188.071,00	1 día?	jue 29/12/22	vie 30/12/22	277

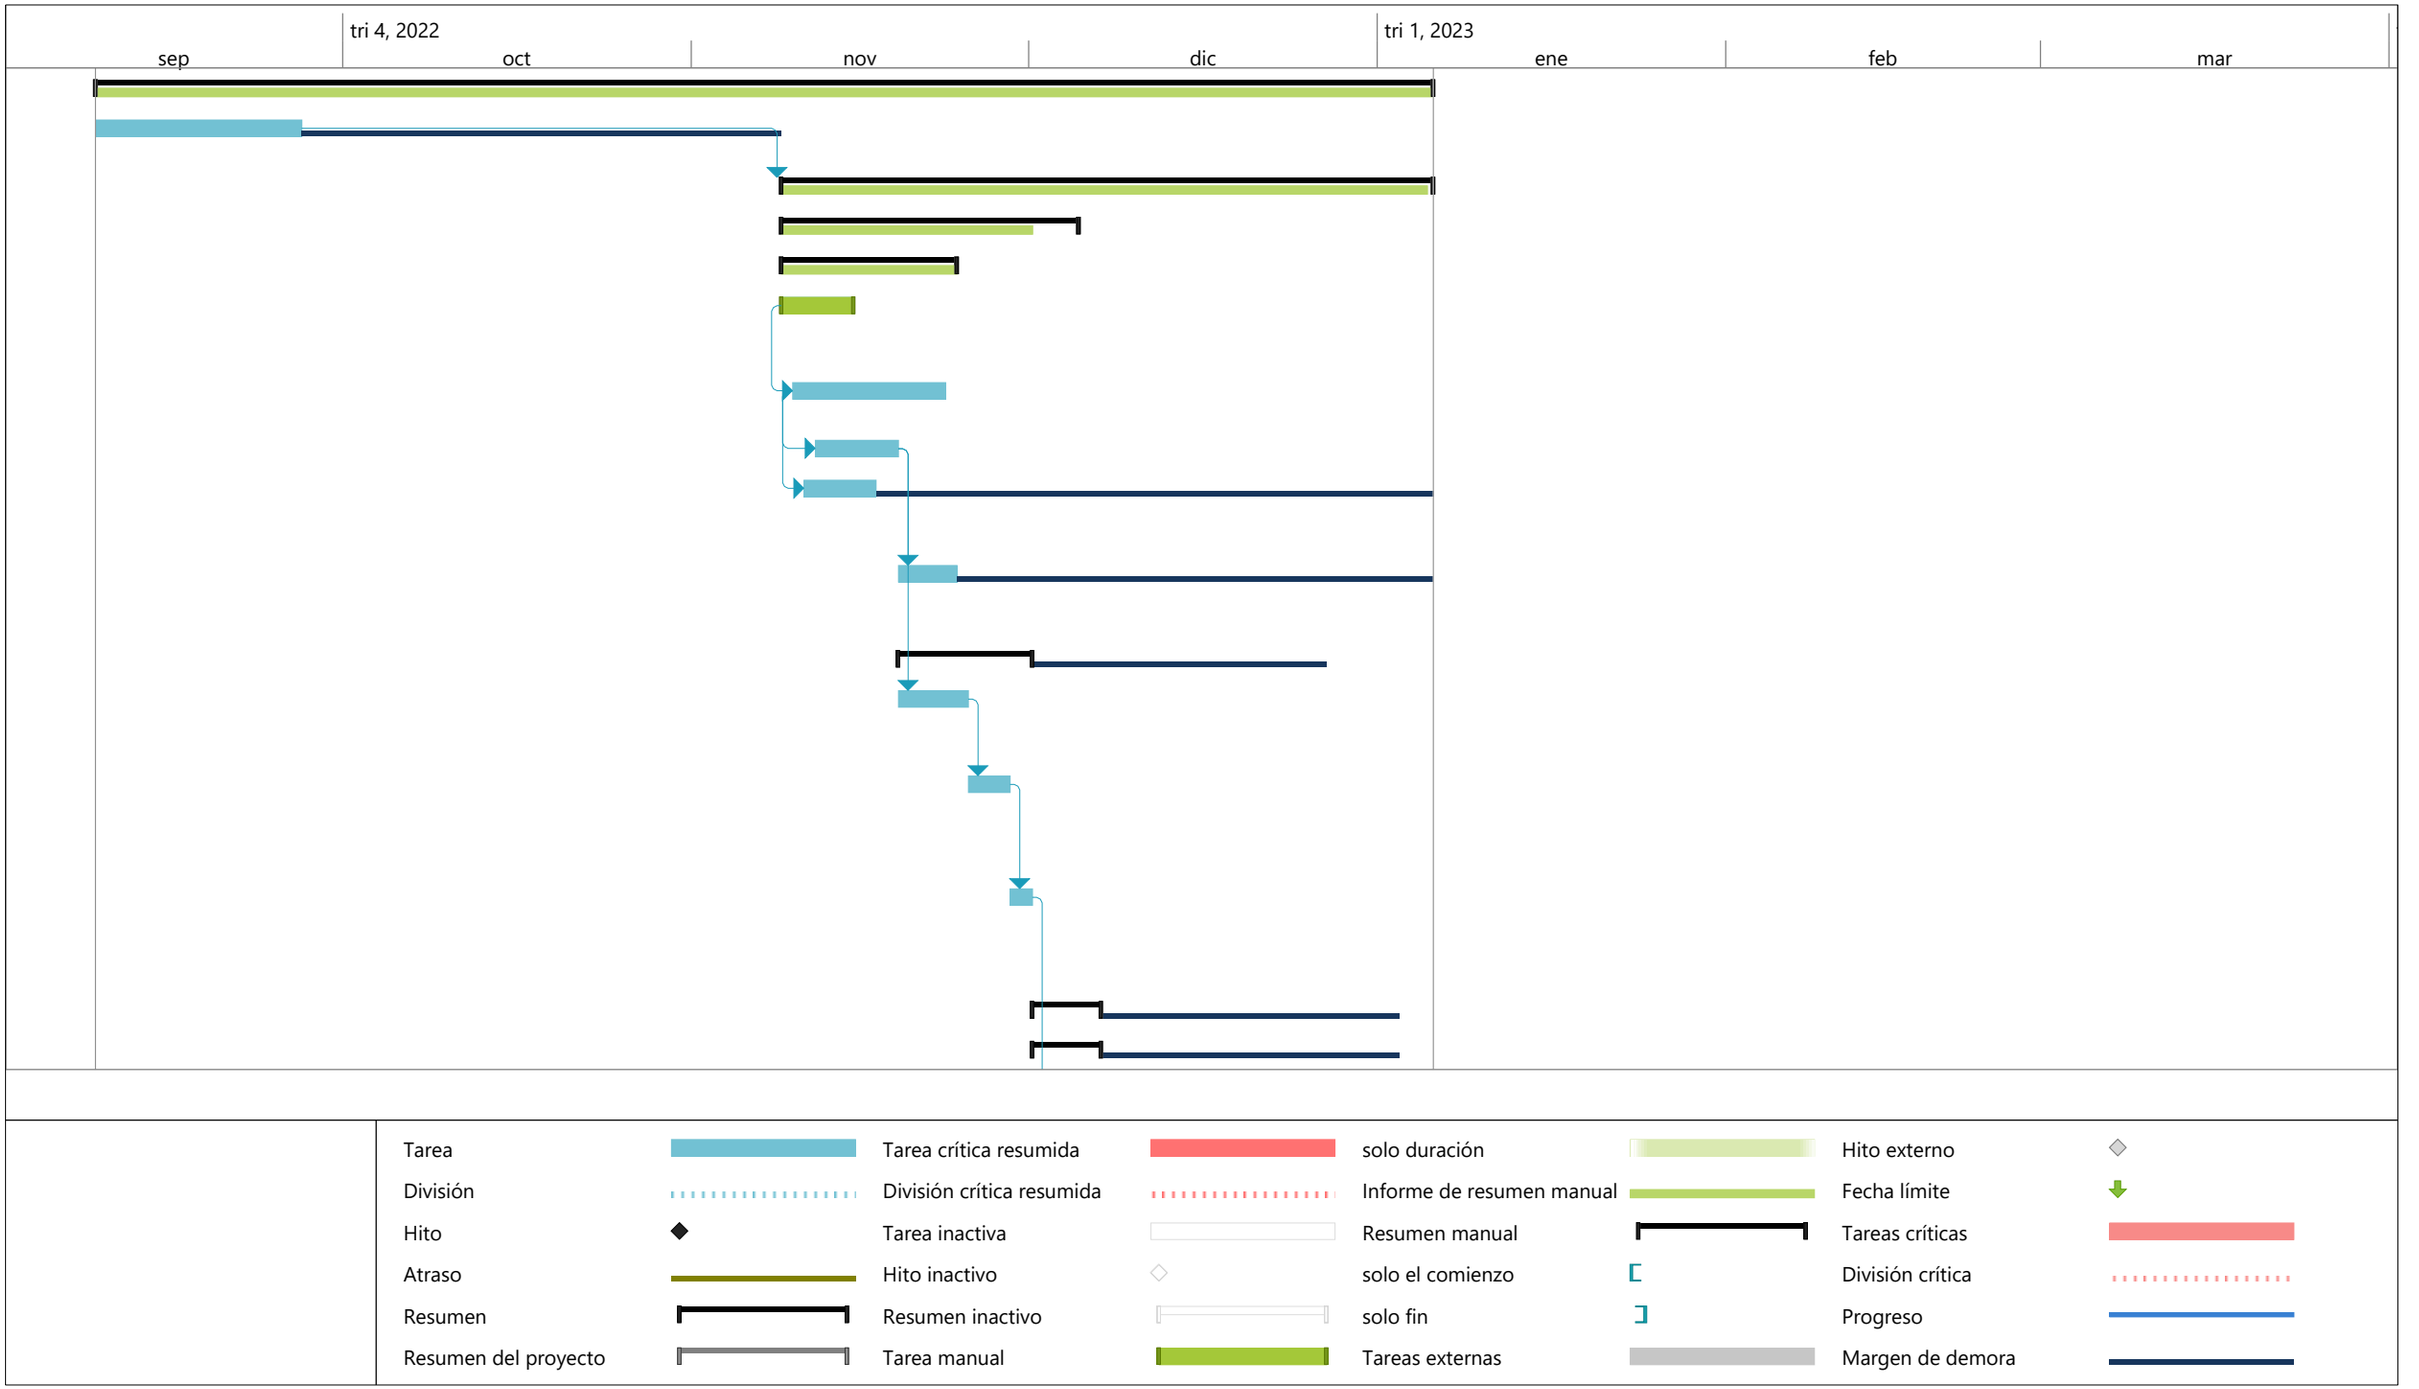
ago

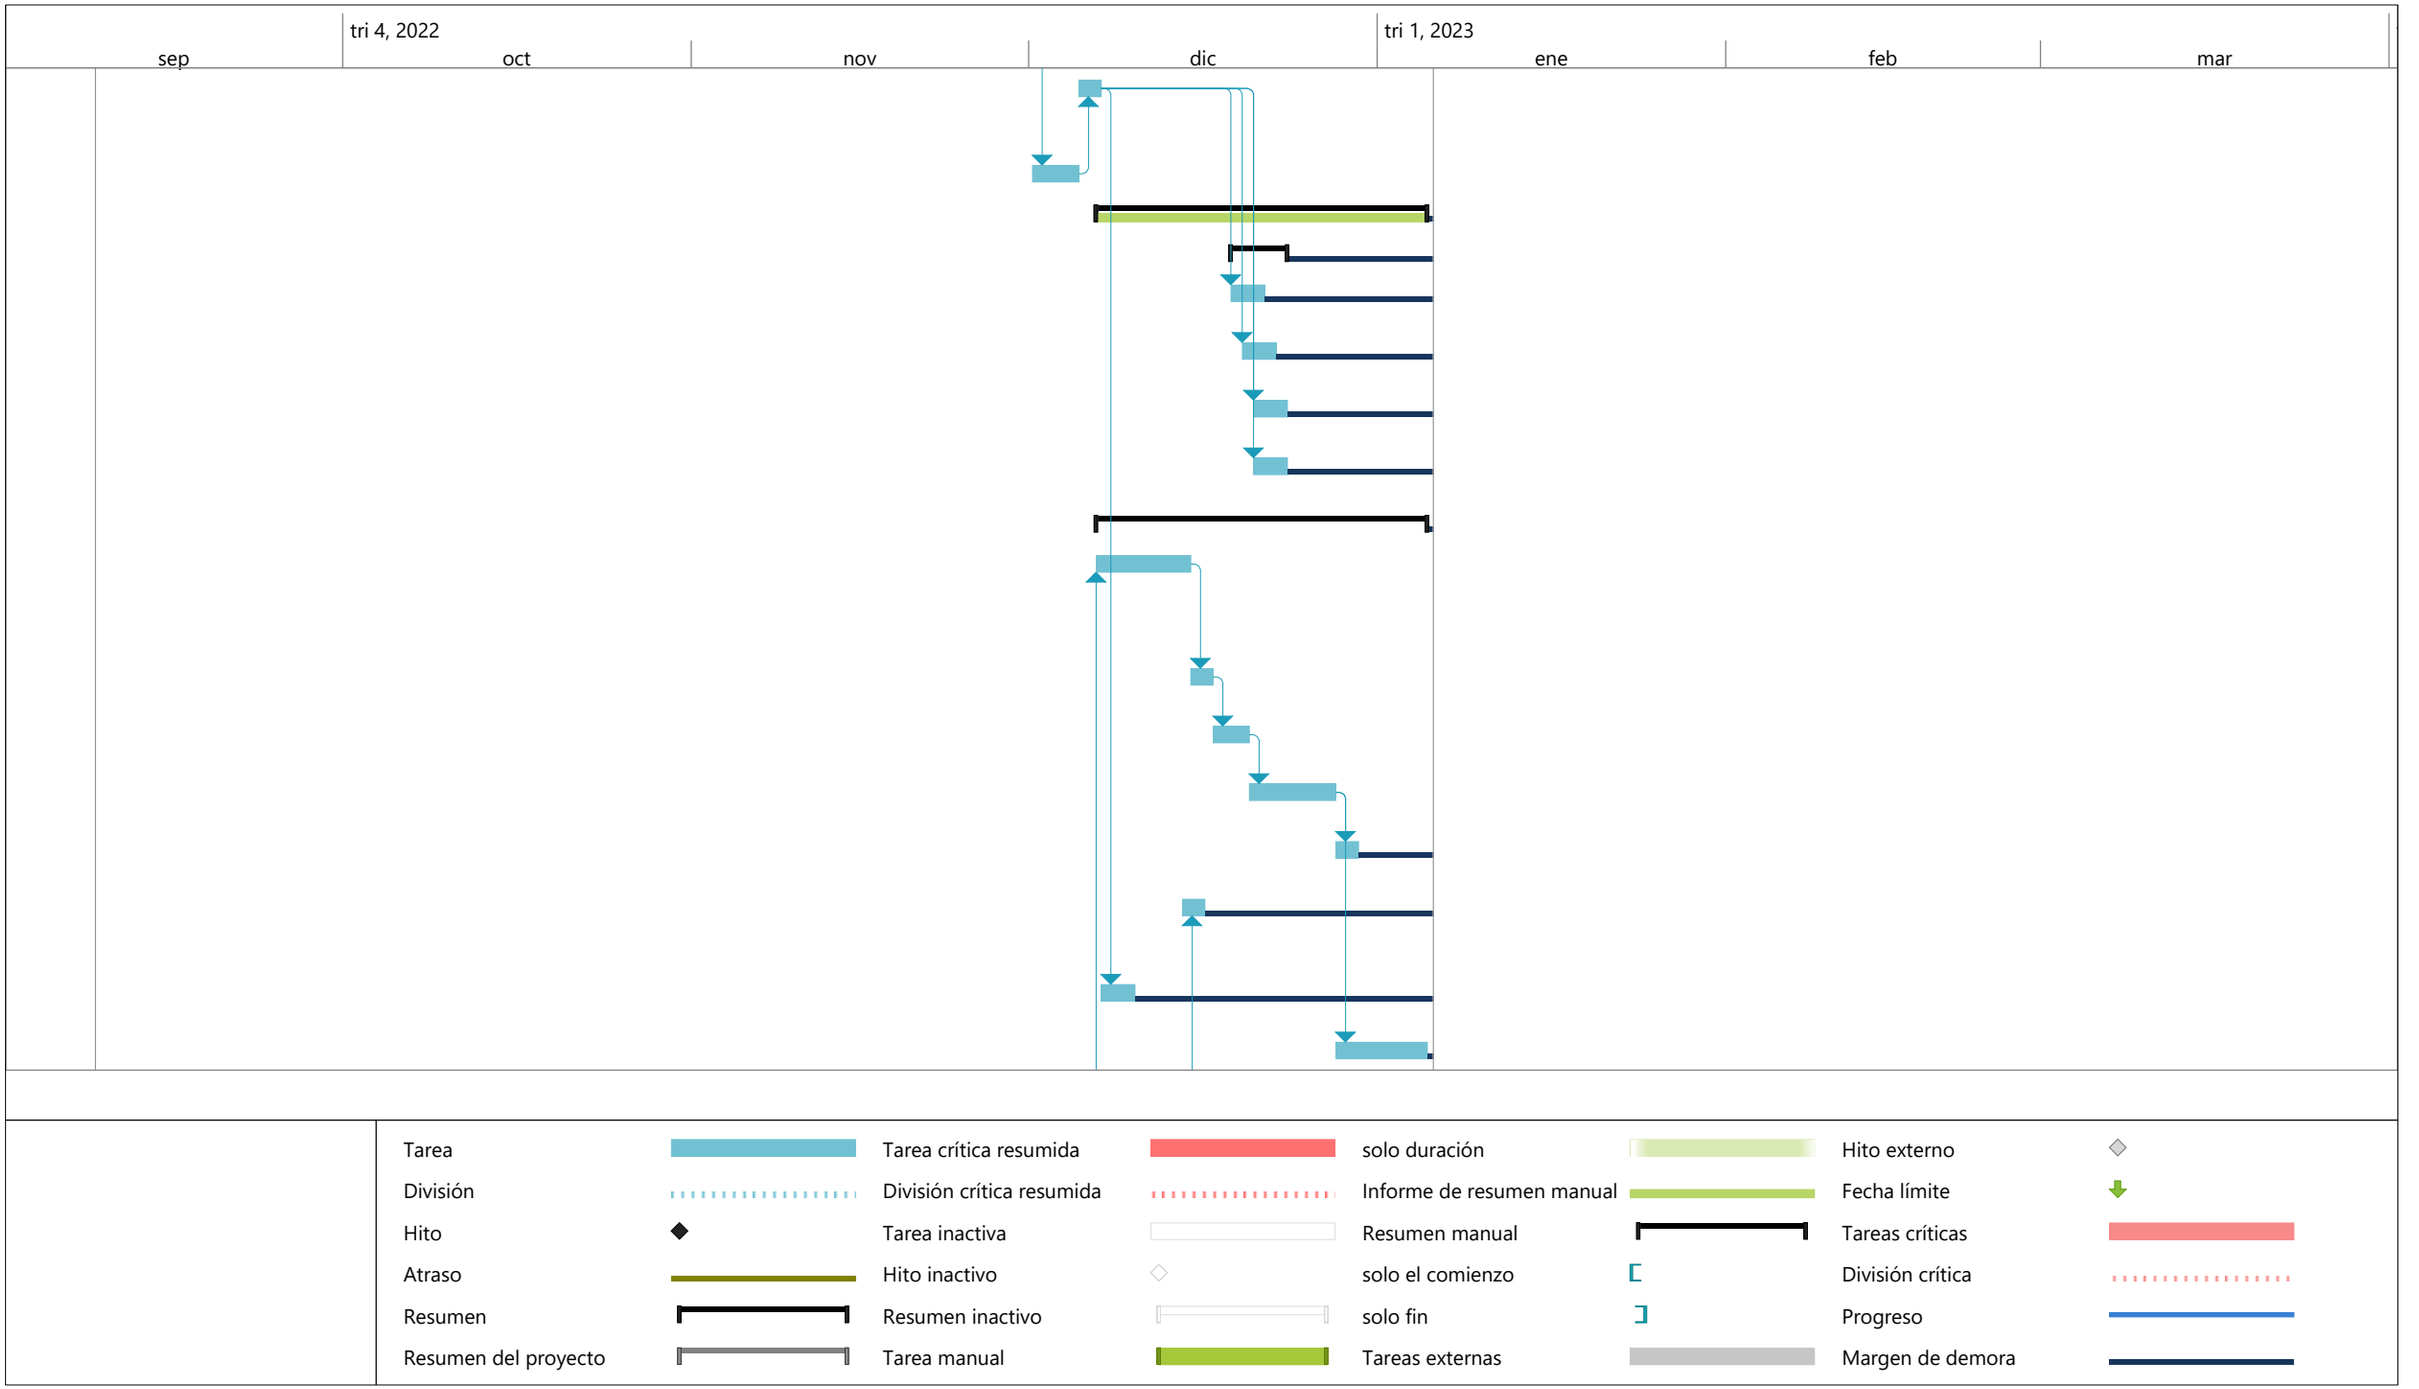
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

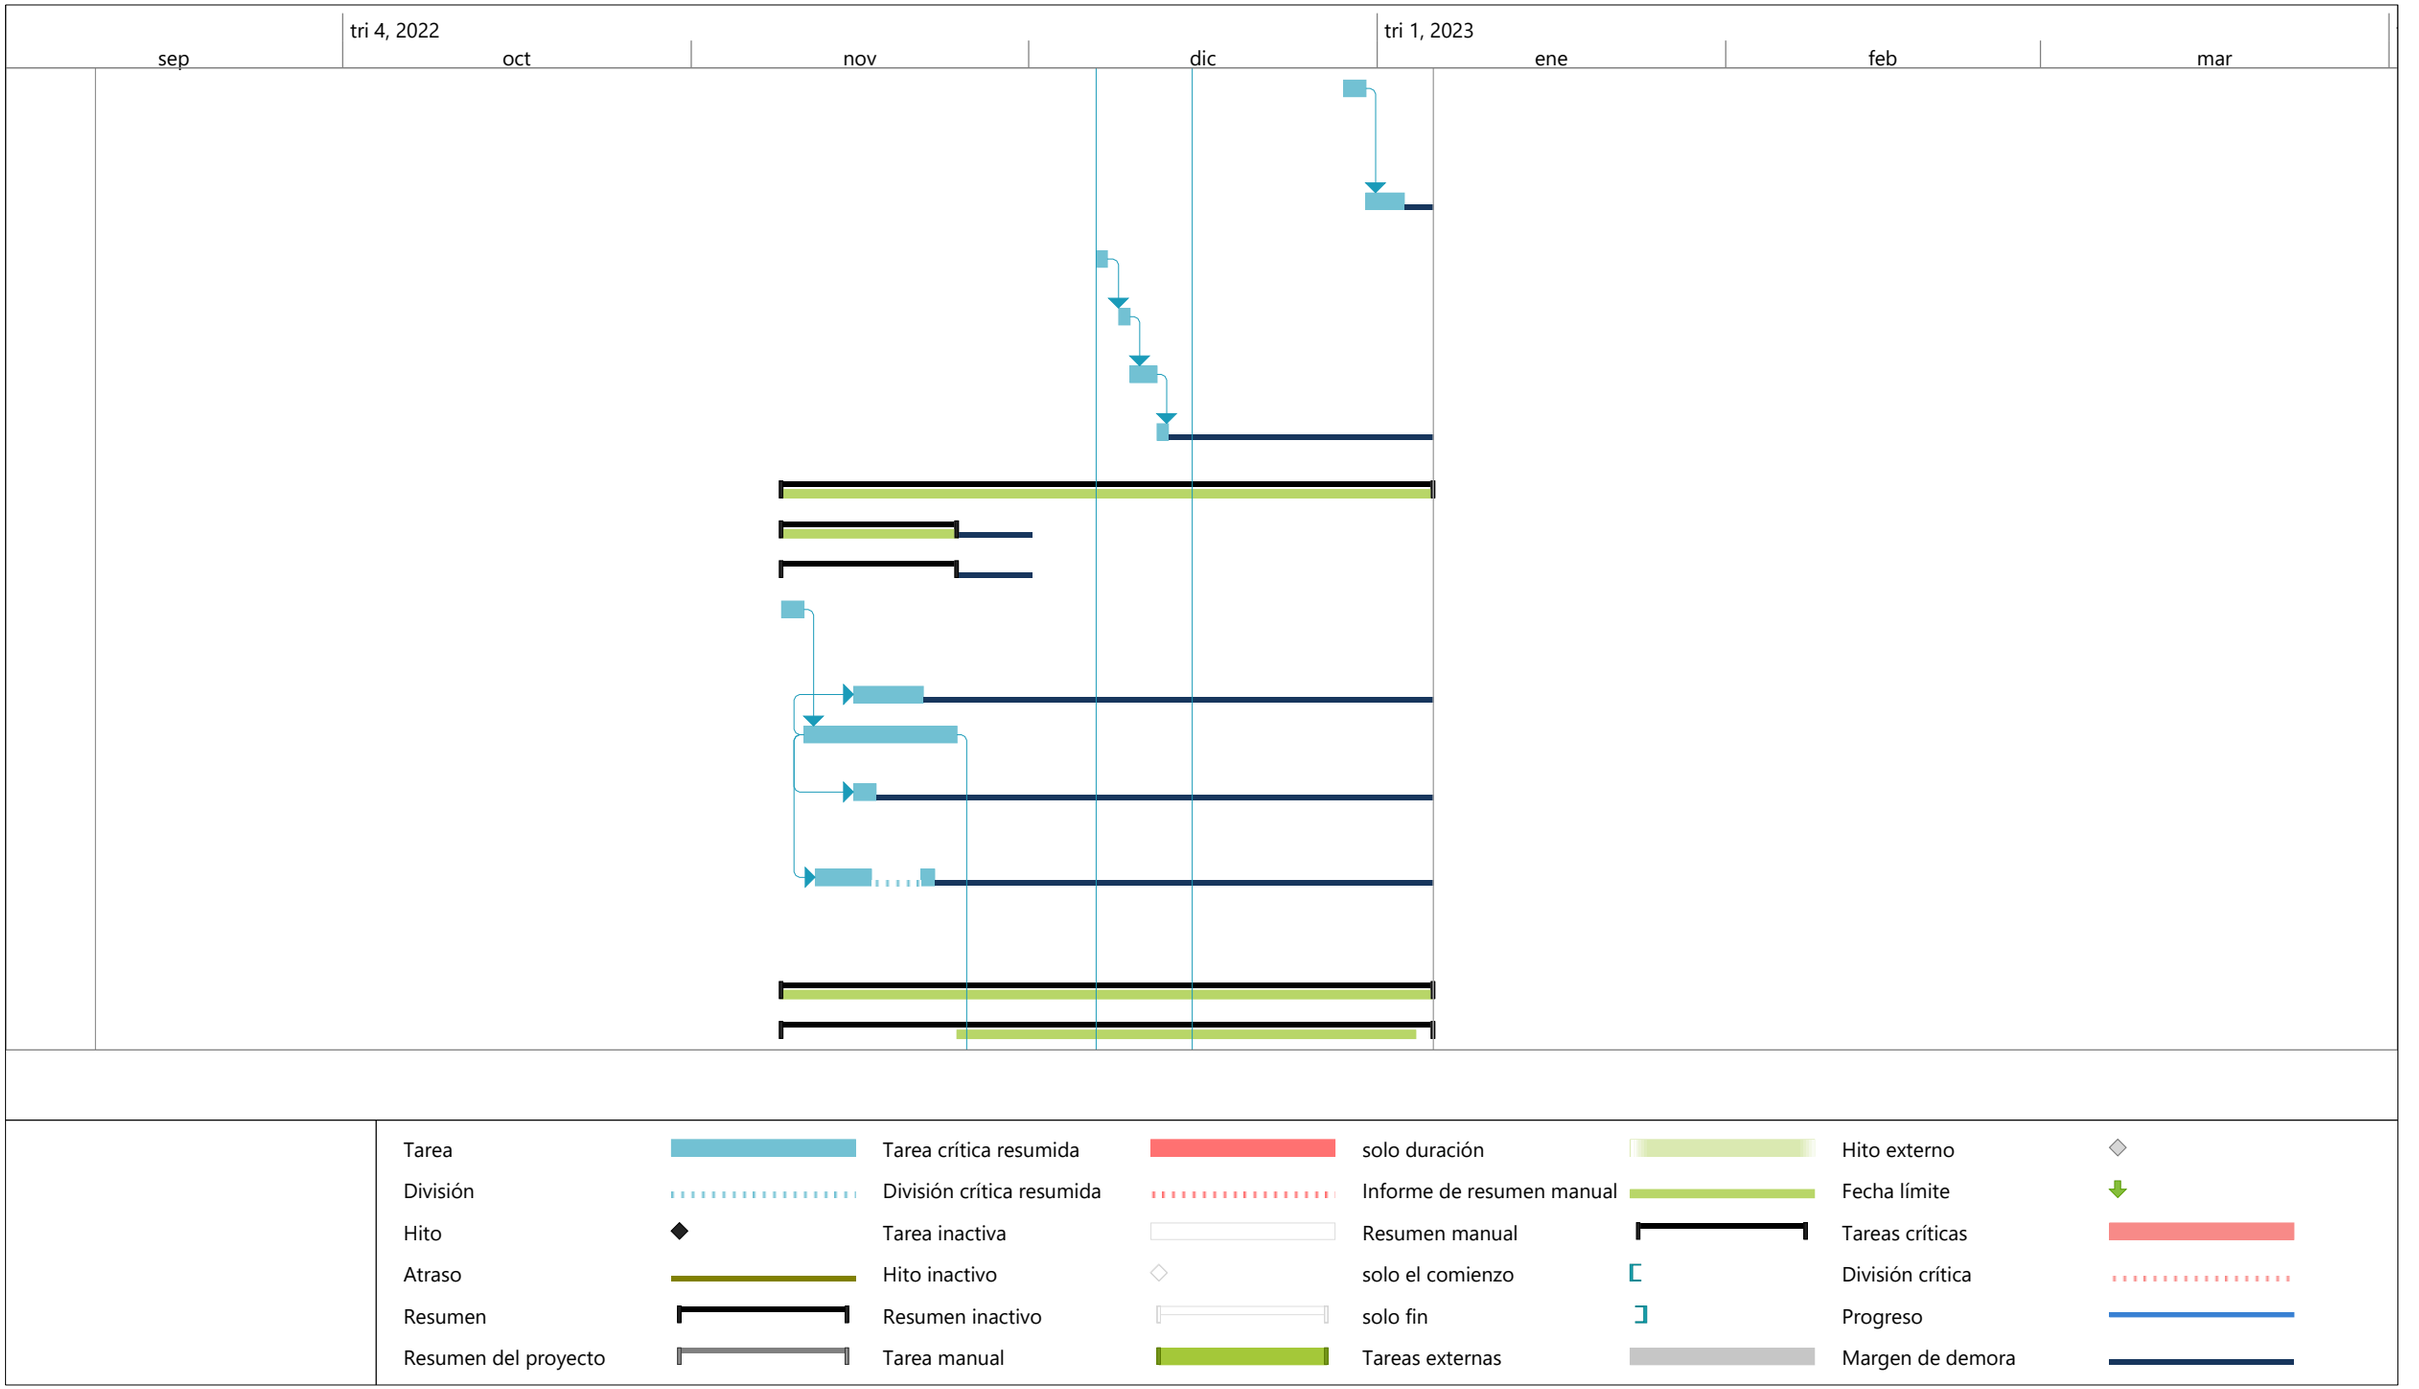
Id	Modo de	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIT	CANT.	VR. UNITARIO +	VR. TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:
279		3.2.2.1-NP 11	INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP PIGMENTADO SEGÚN DISEÑO A=1.8m H=0.8m P=0.57m Peso=369kg ref.=102893	Un	3,00	$ 2.001.701,00	$ 6.005.103,00	1 día?	vie 30/12/22	sáb 31/12/22	278
280		3.2.15 NP 01	Bordillo prefabricado tipo A80 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ml	28,00	$ 70.724,00	$ 1.980.272,00	1 día?	sáb 31/12/22	lun 2/01/23	279
281		3.2.8.1	PINTURA EXTERIOR MURALES	m2	32,50	$ 21.934,00	$ 712.855,00	1 día?	lun 2/01/23	mar 3/01/23	280

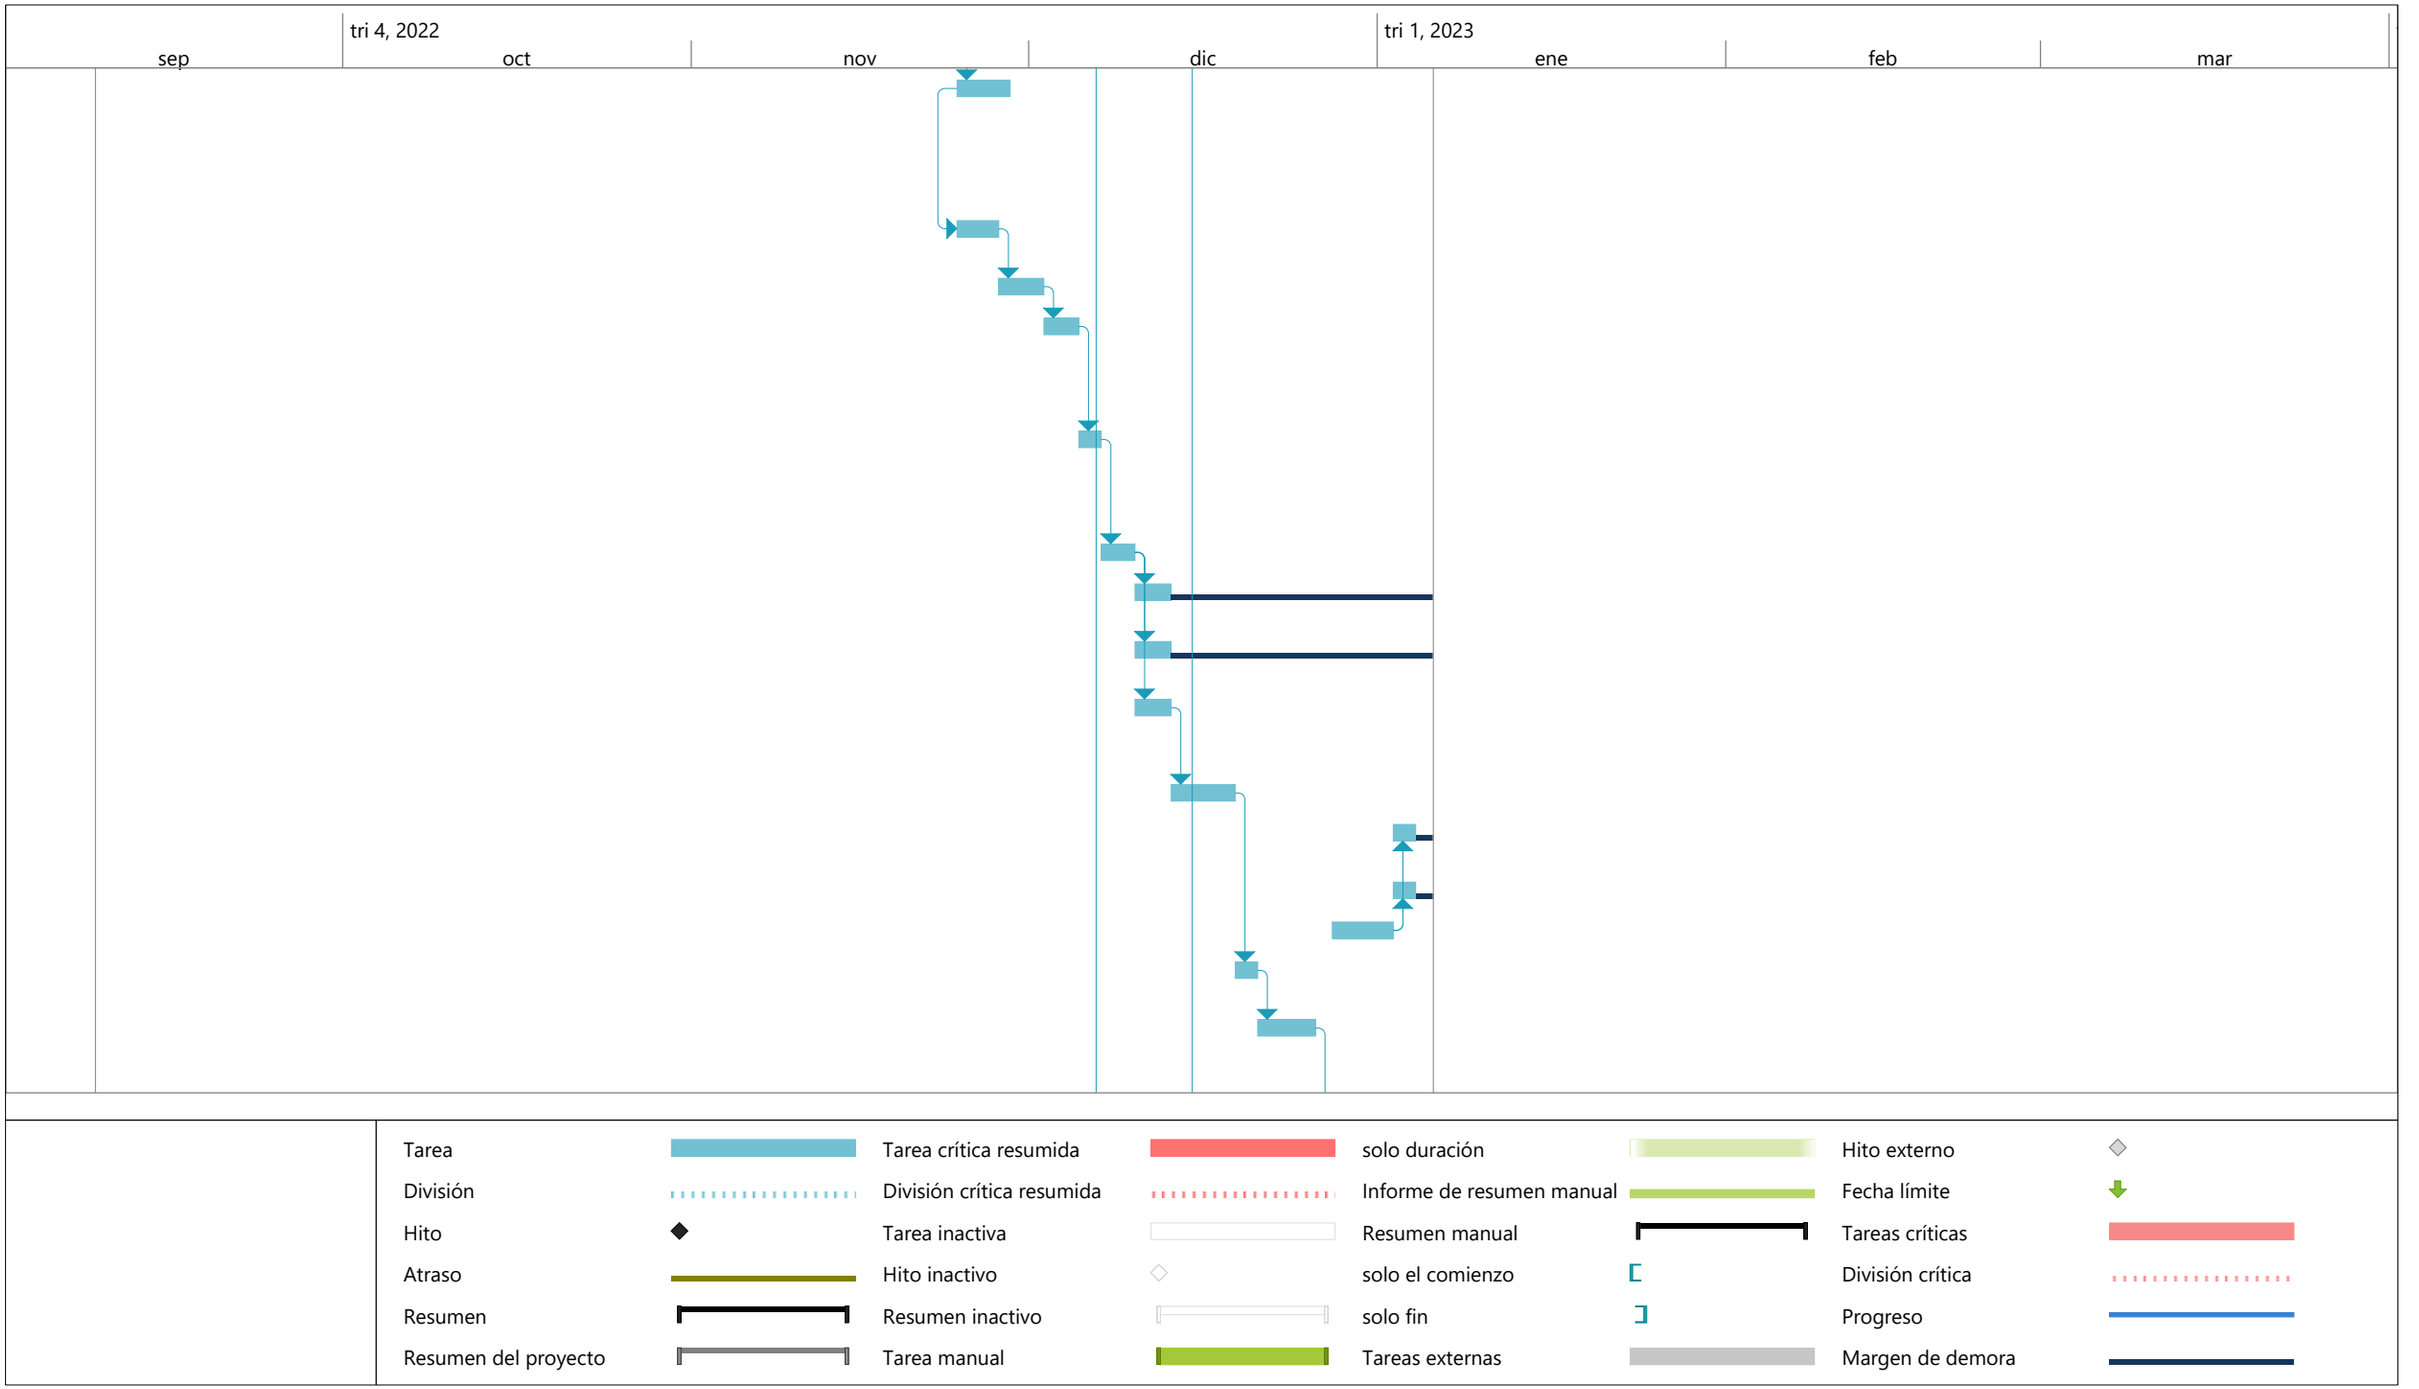
ago

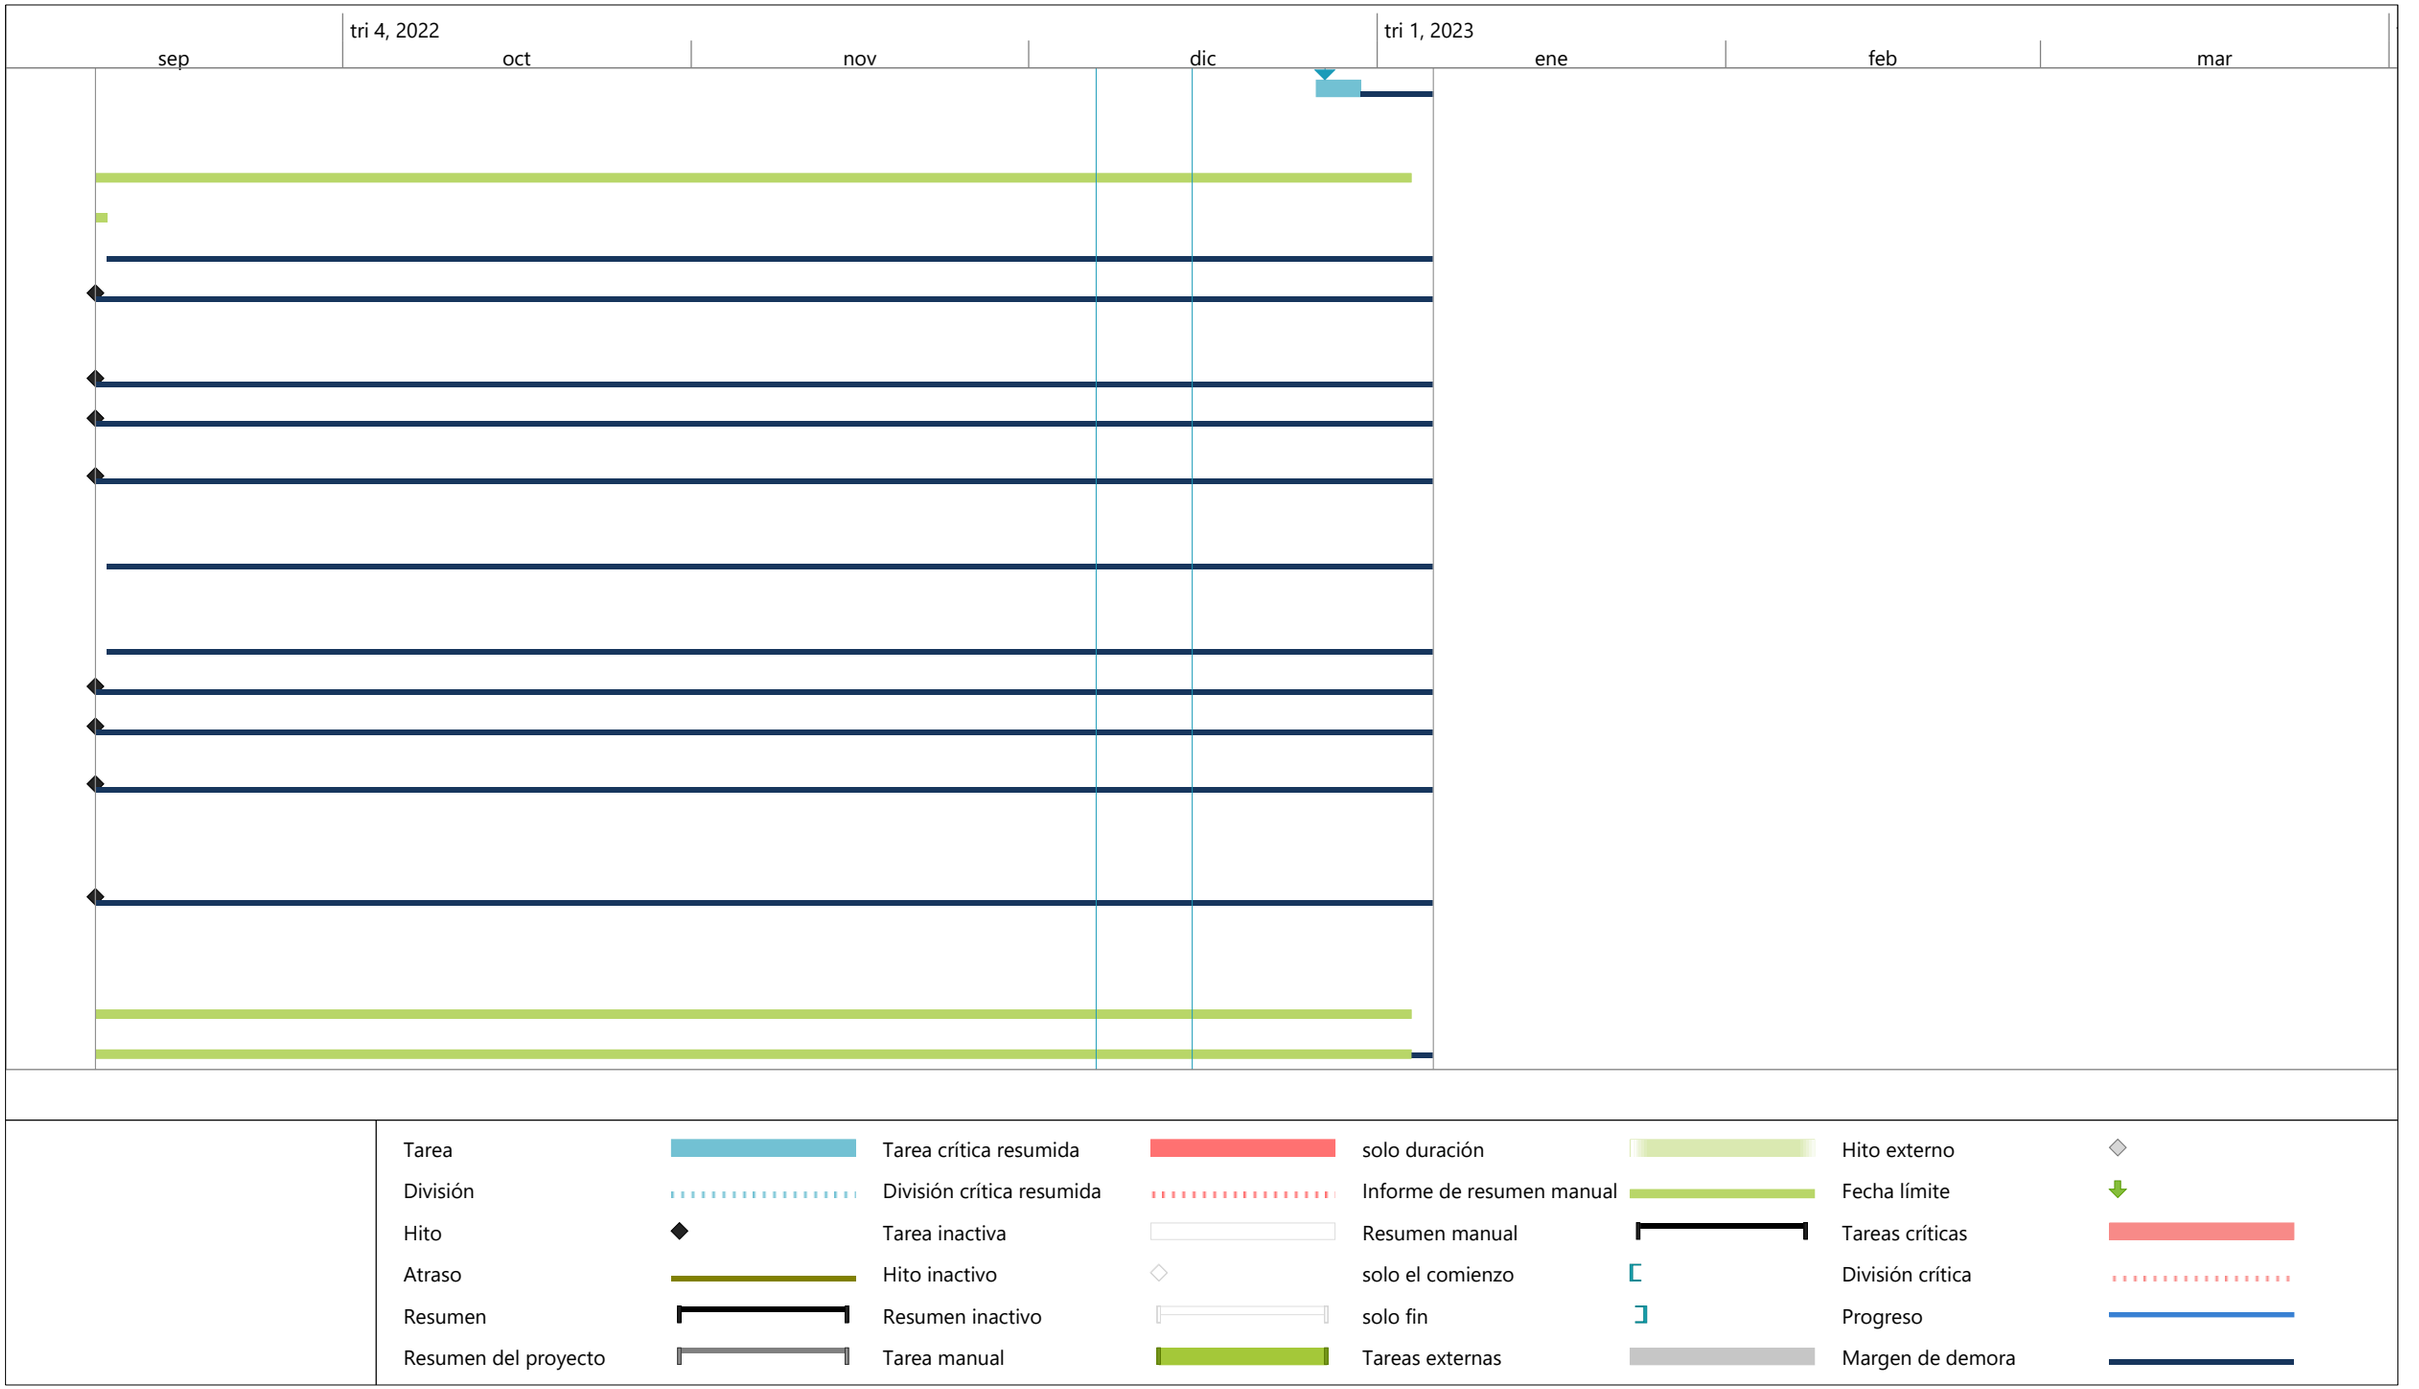
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

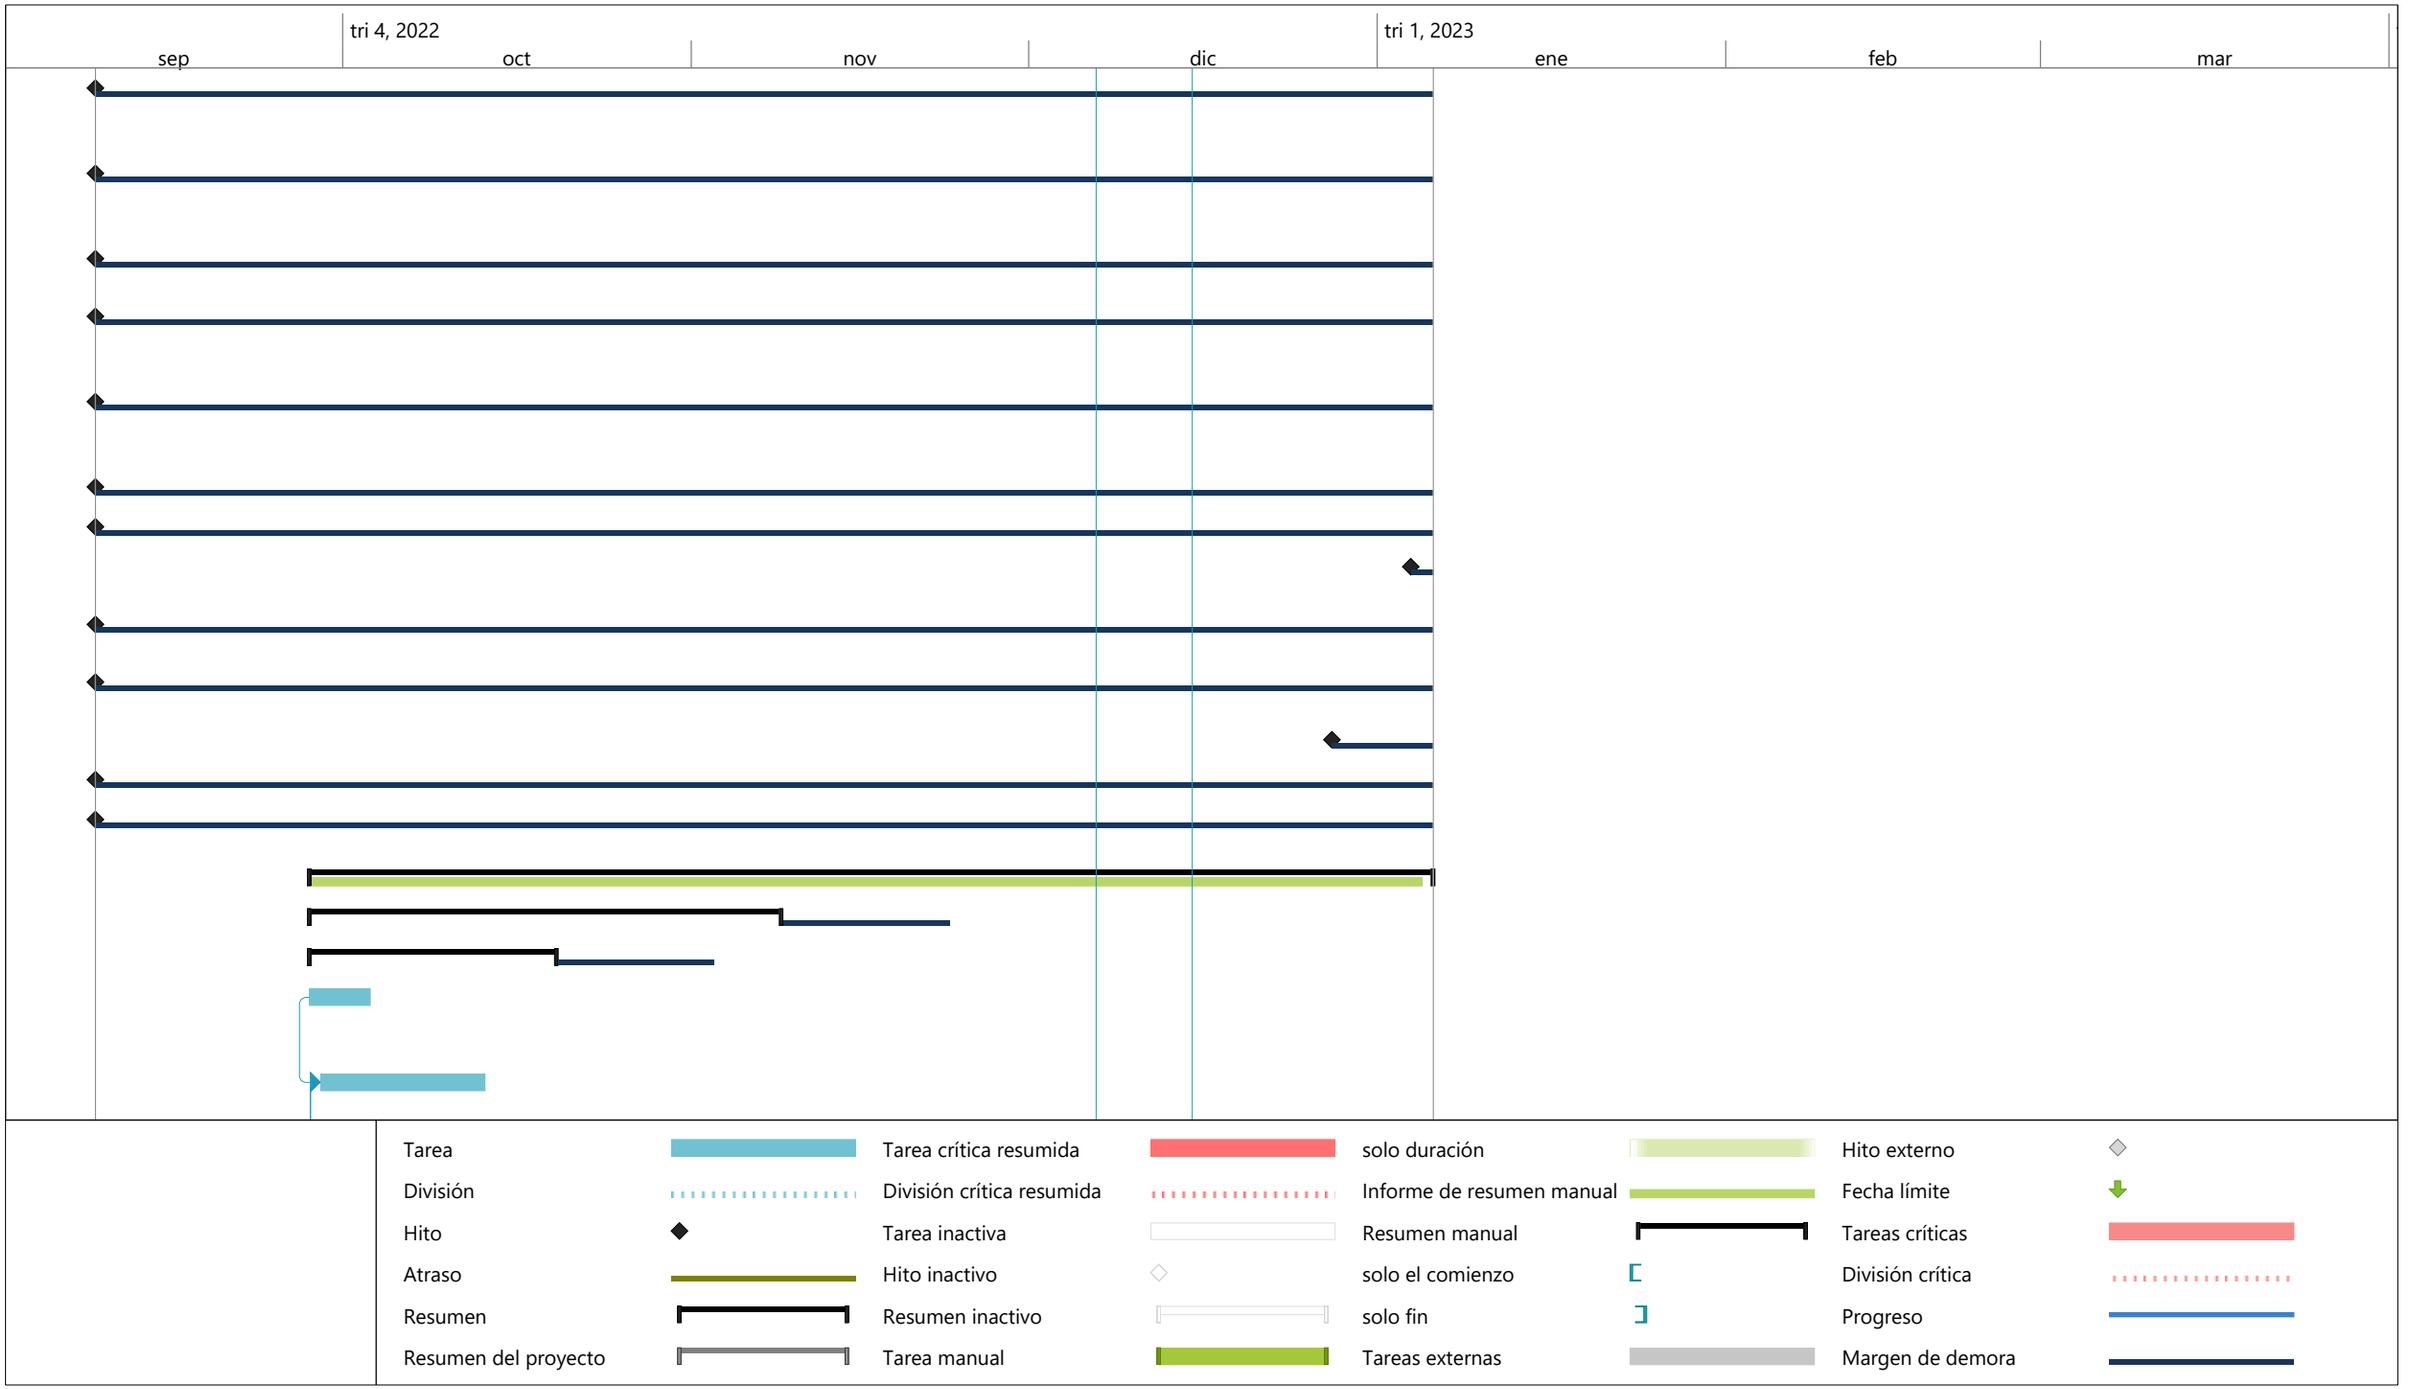

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

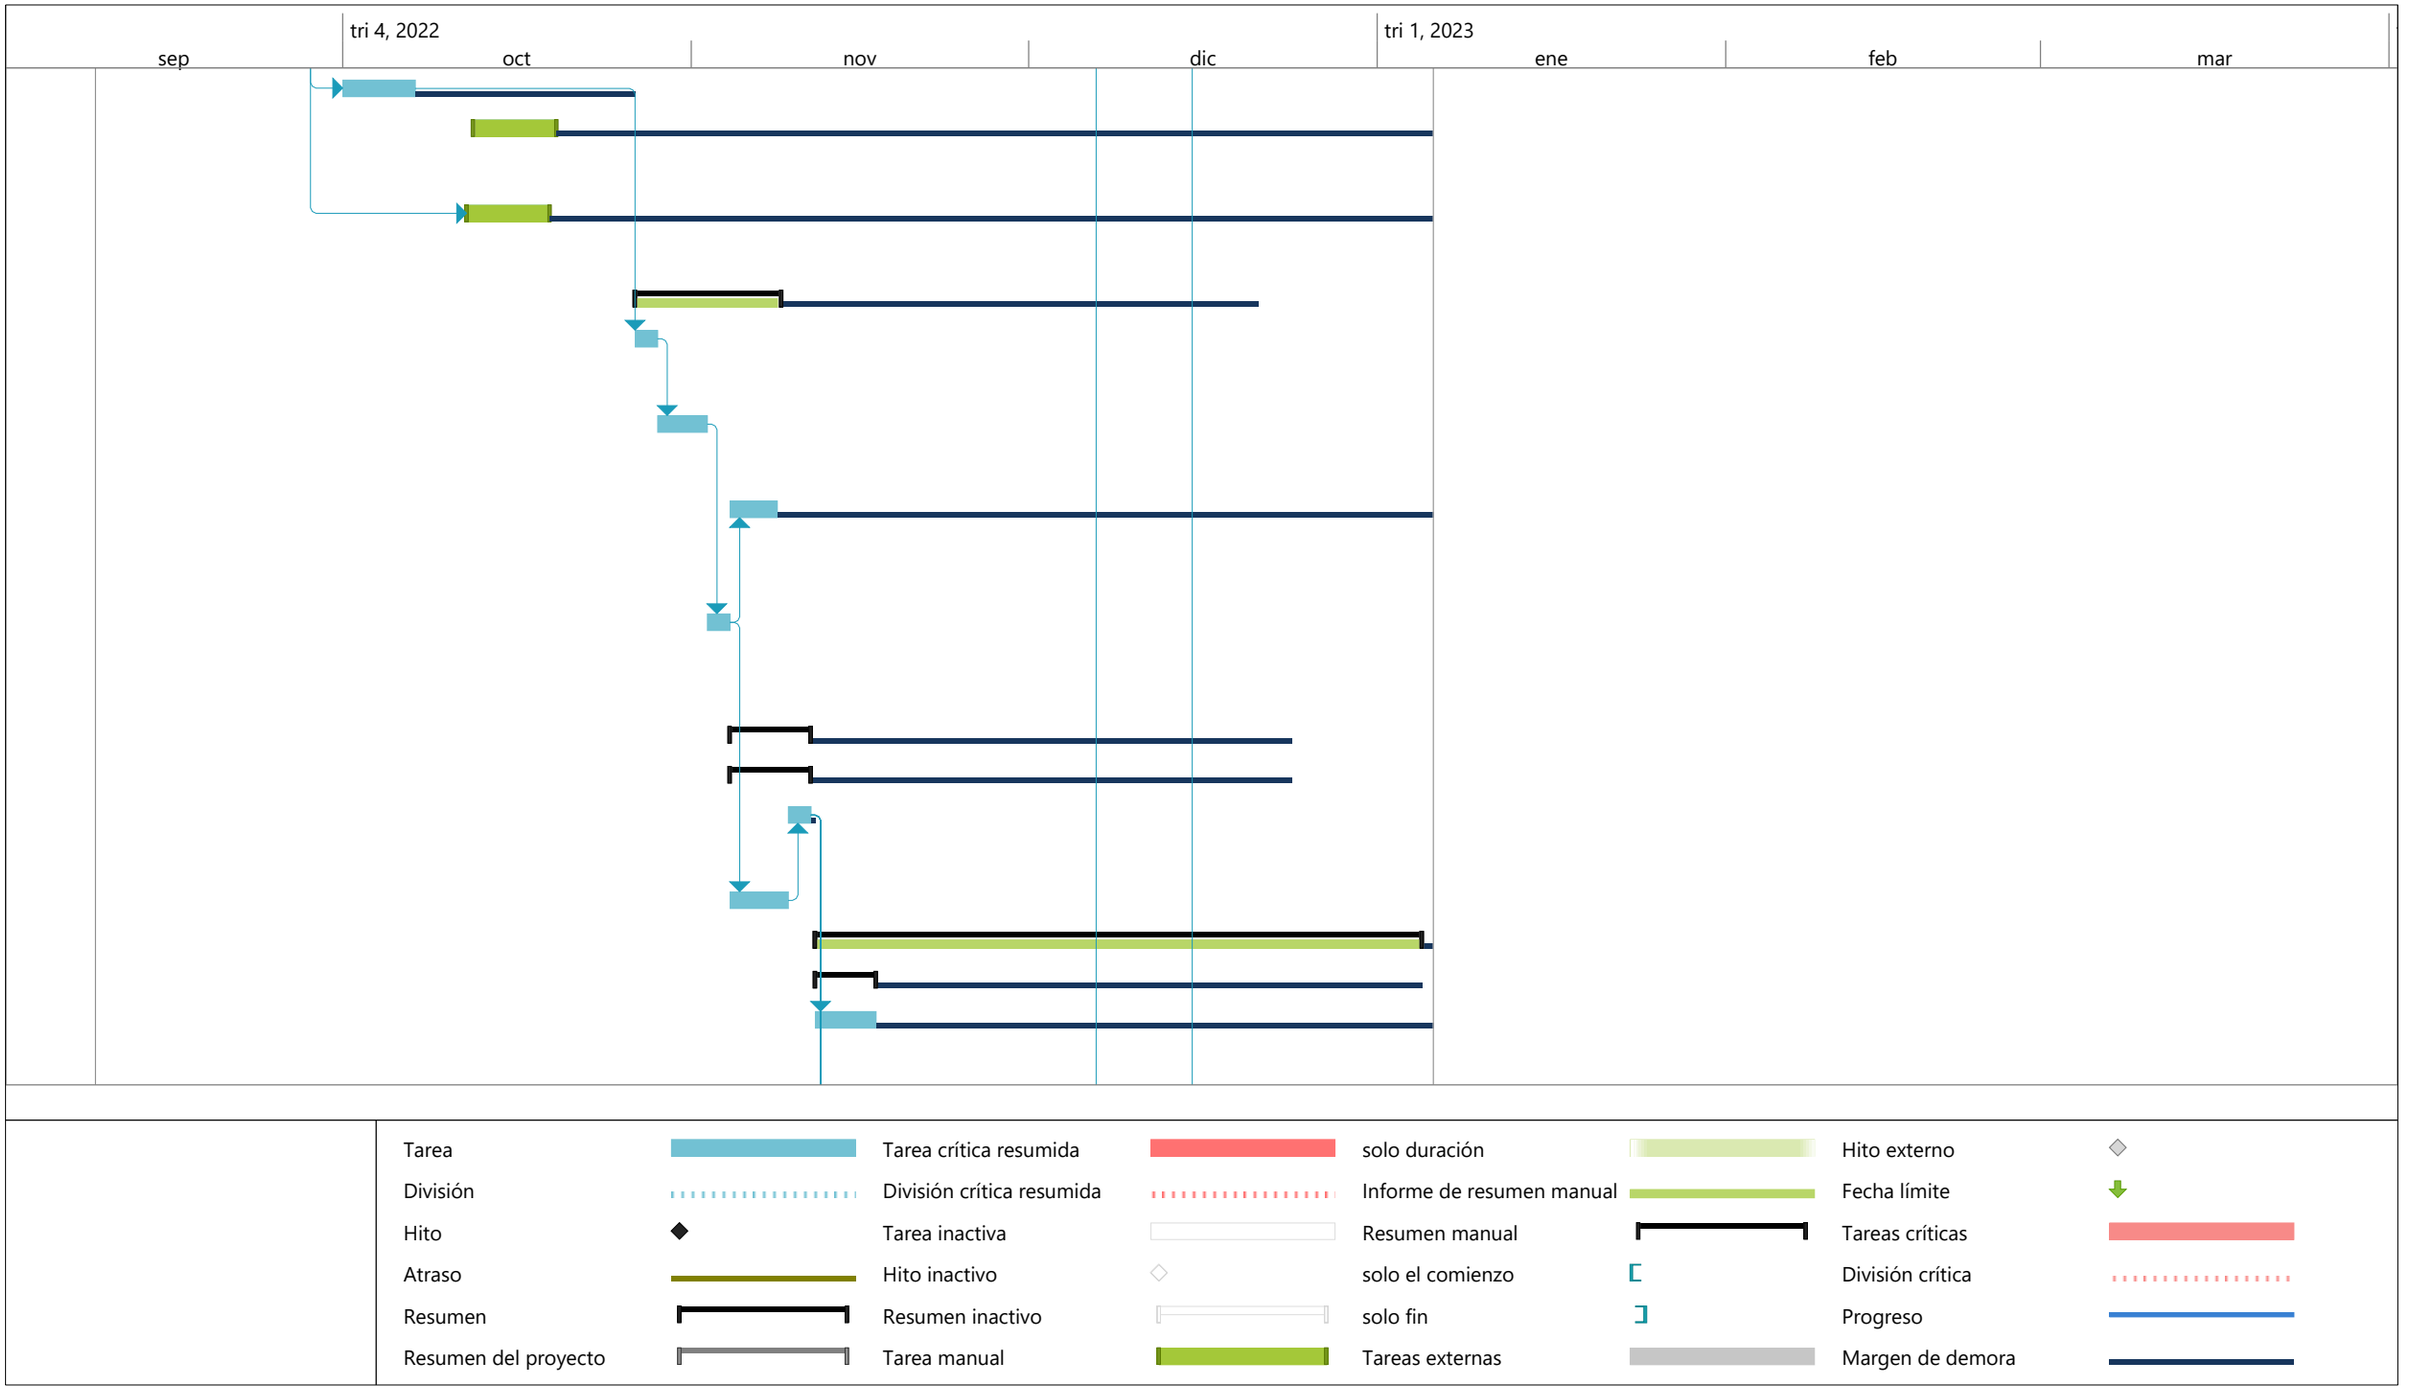

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

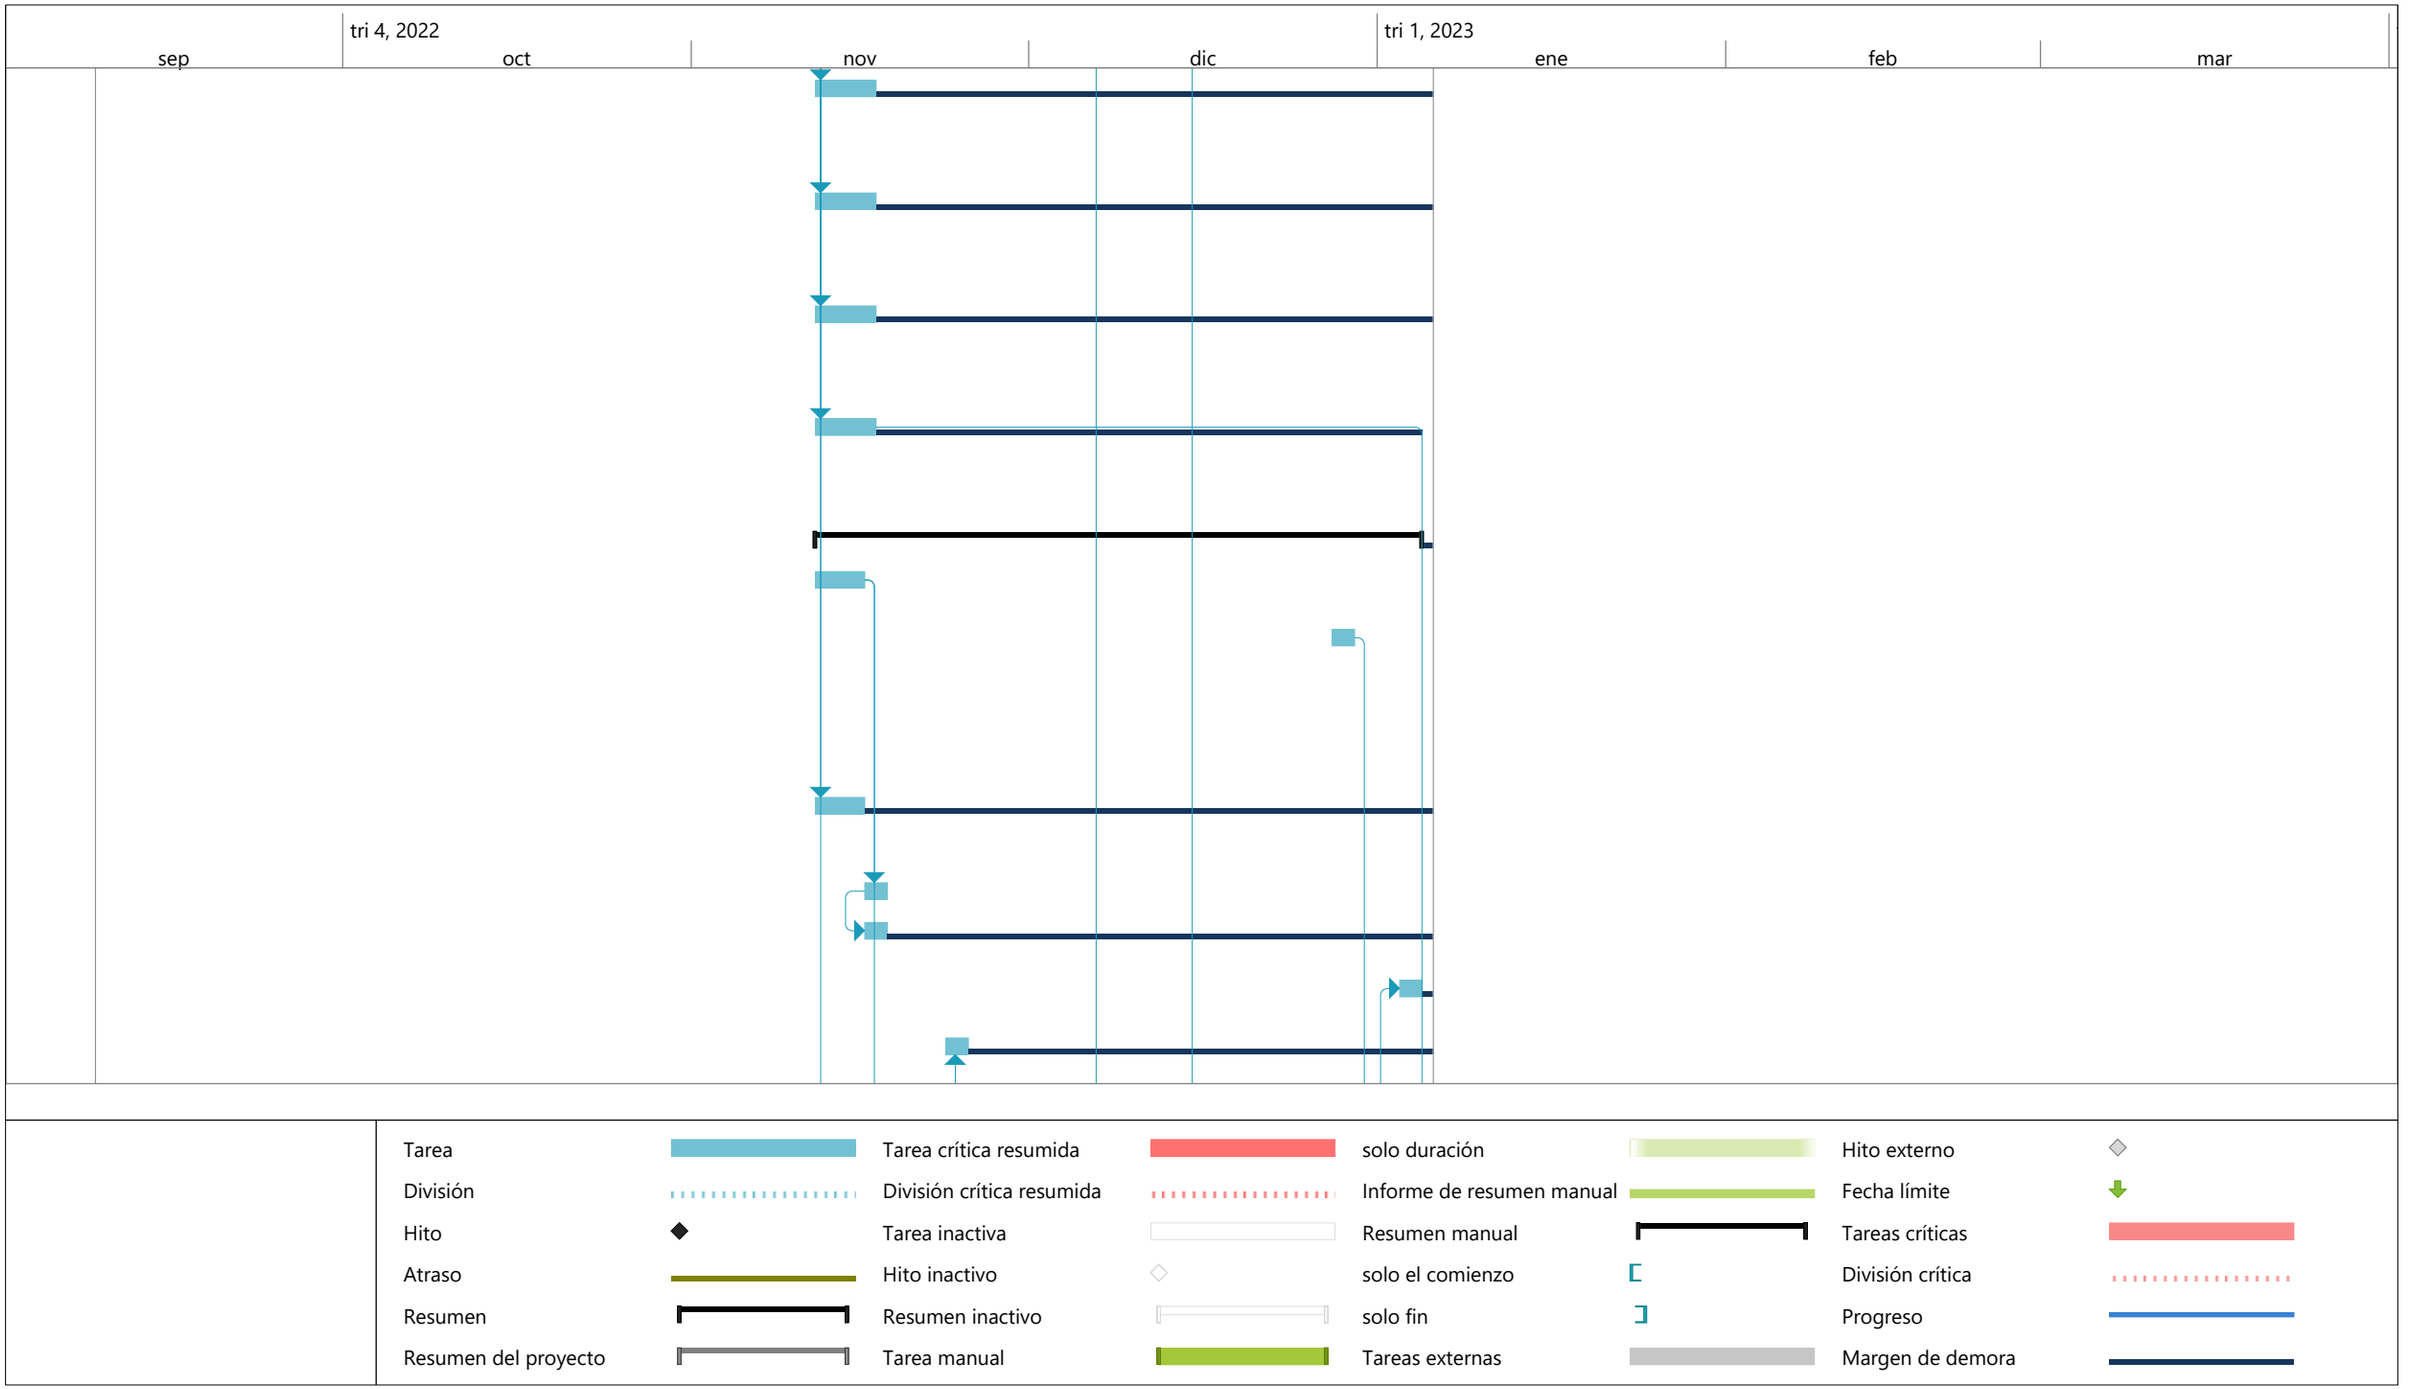

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

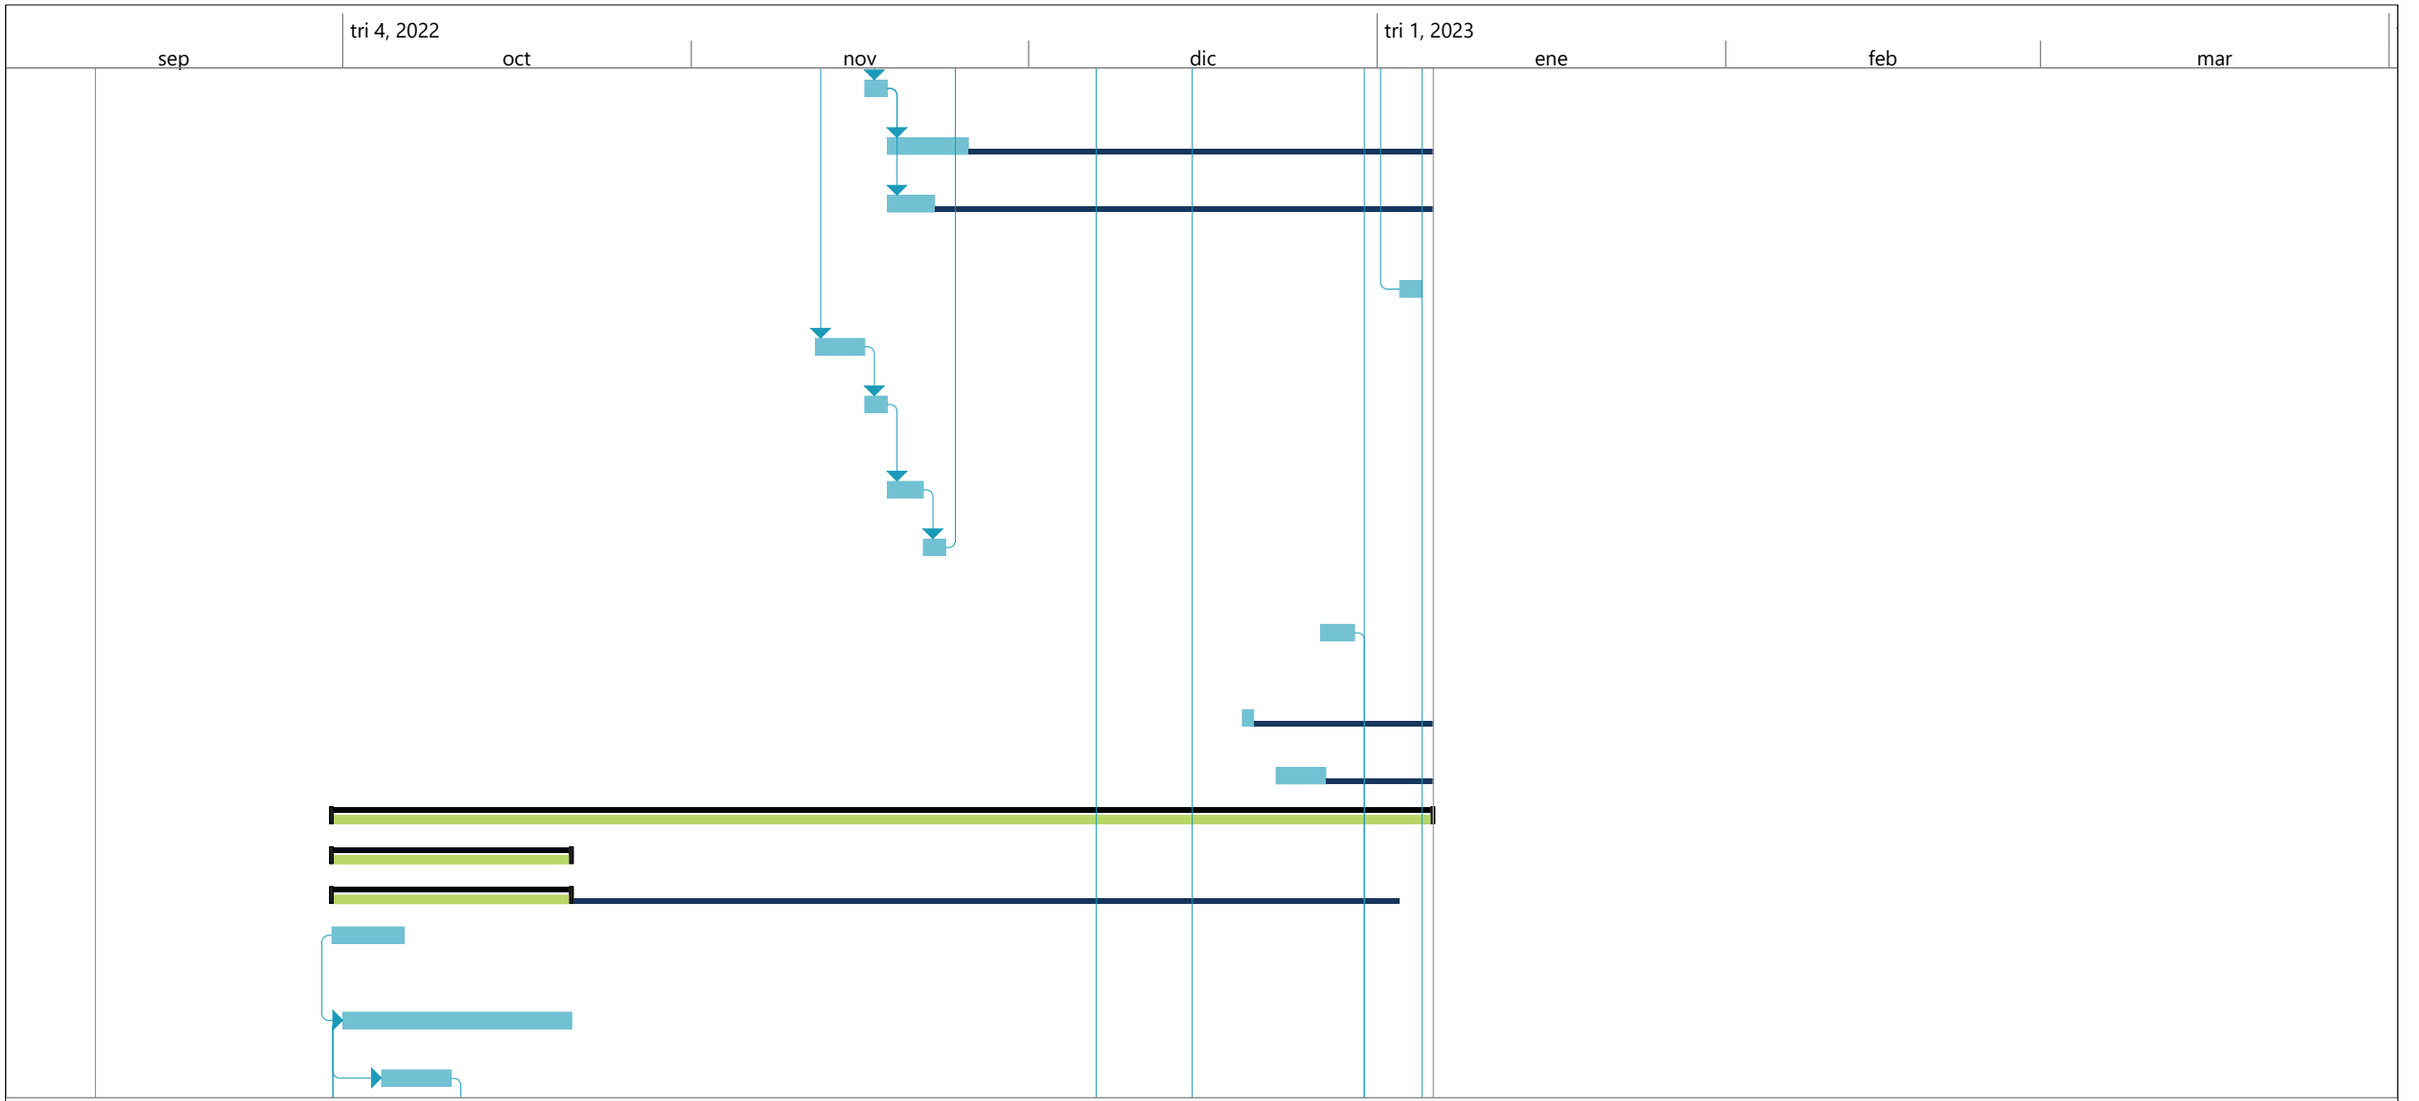

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

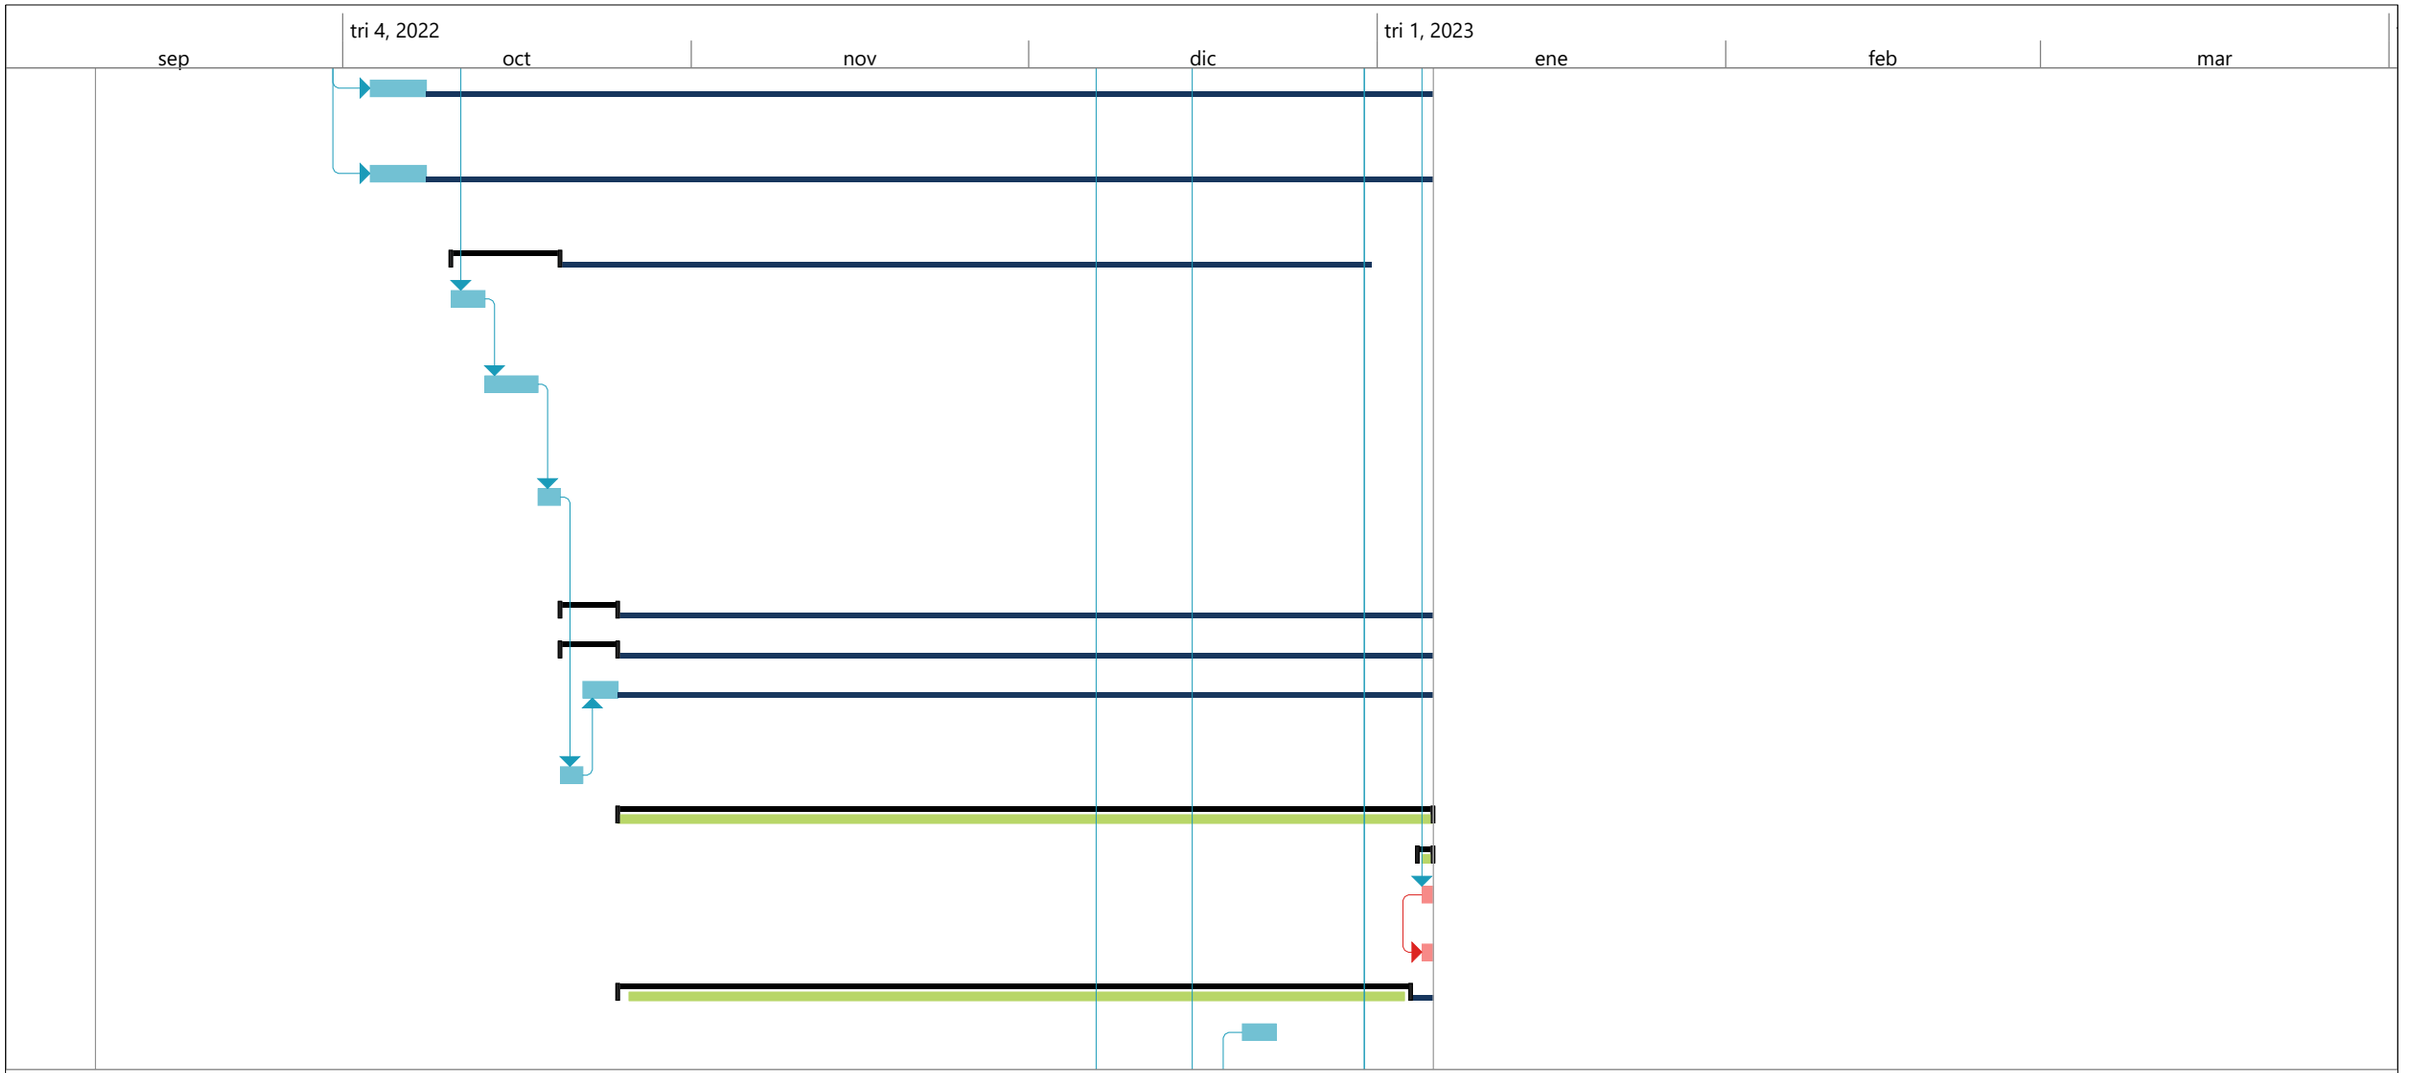

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

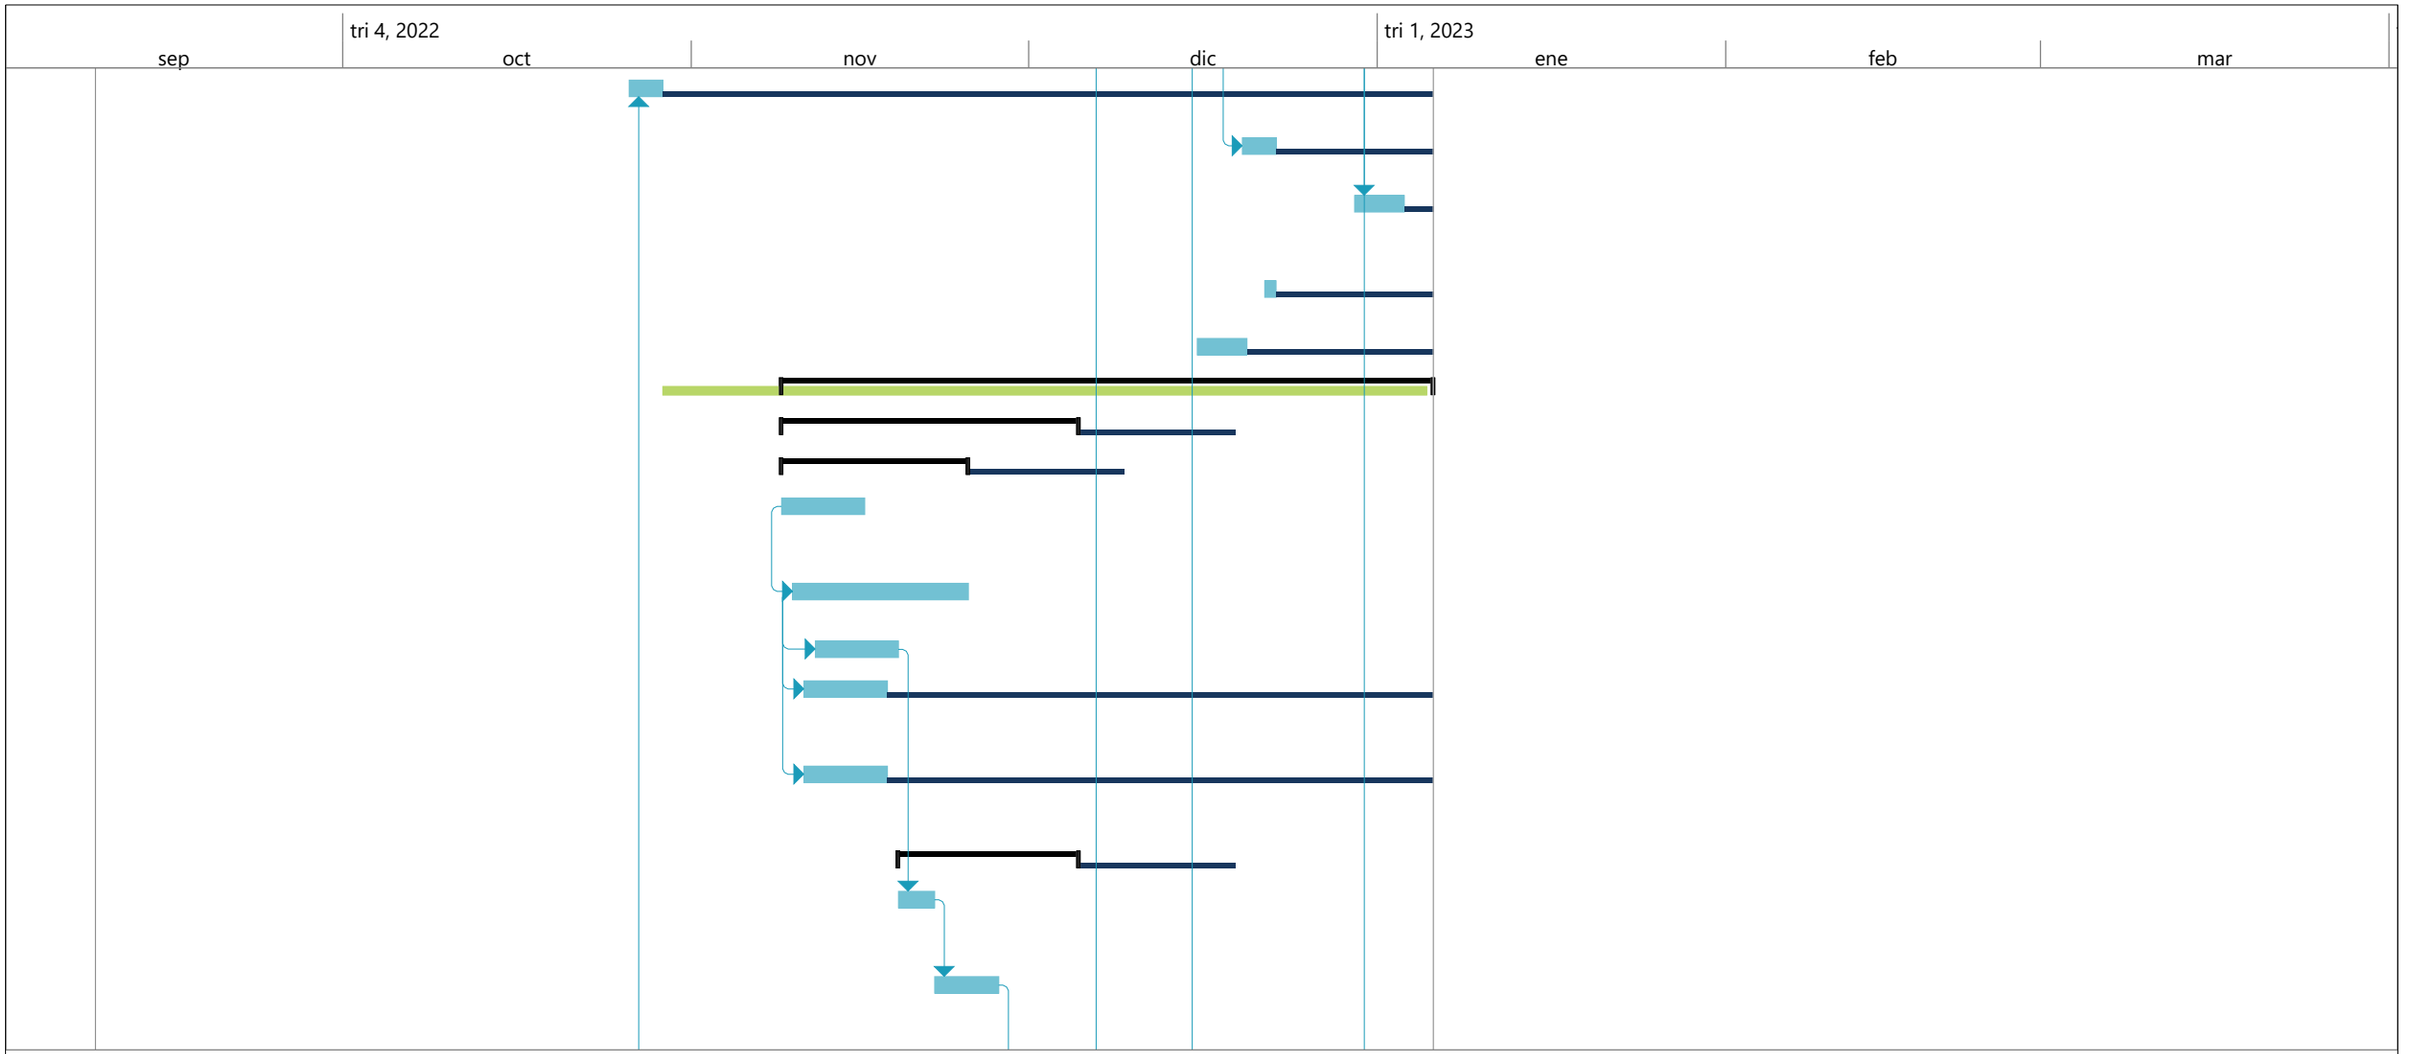

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora



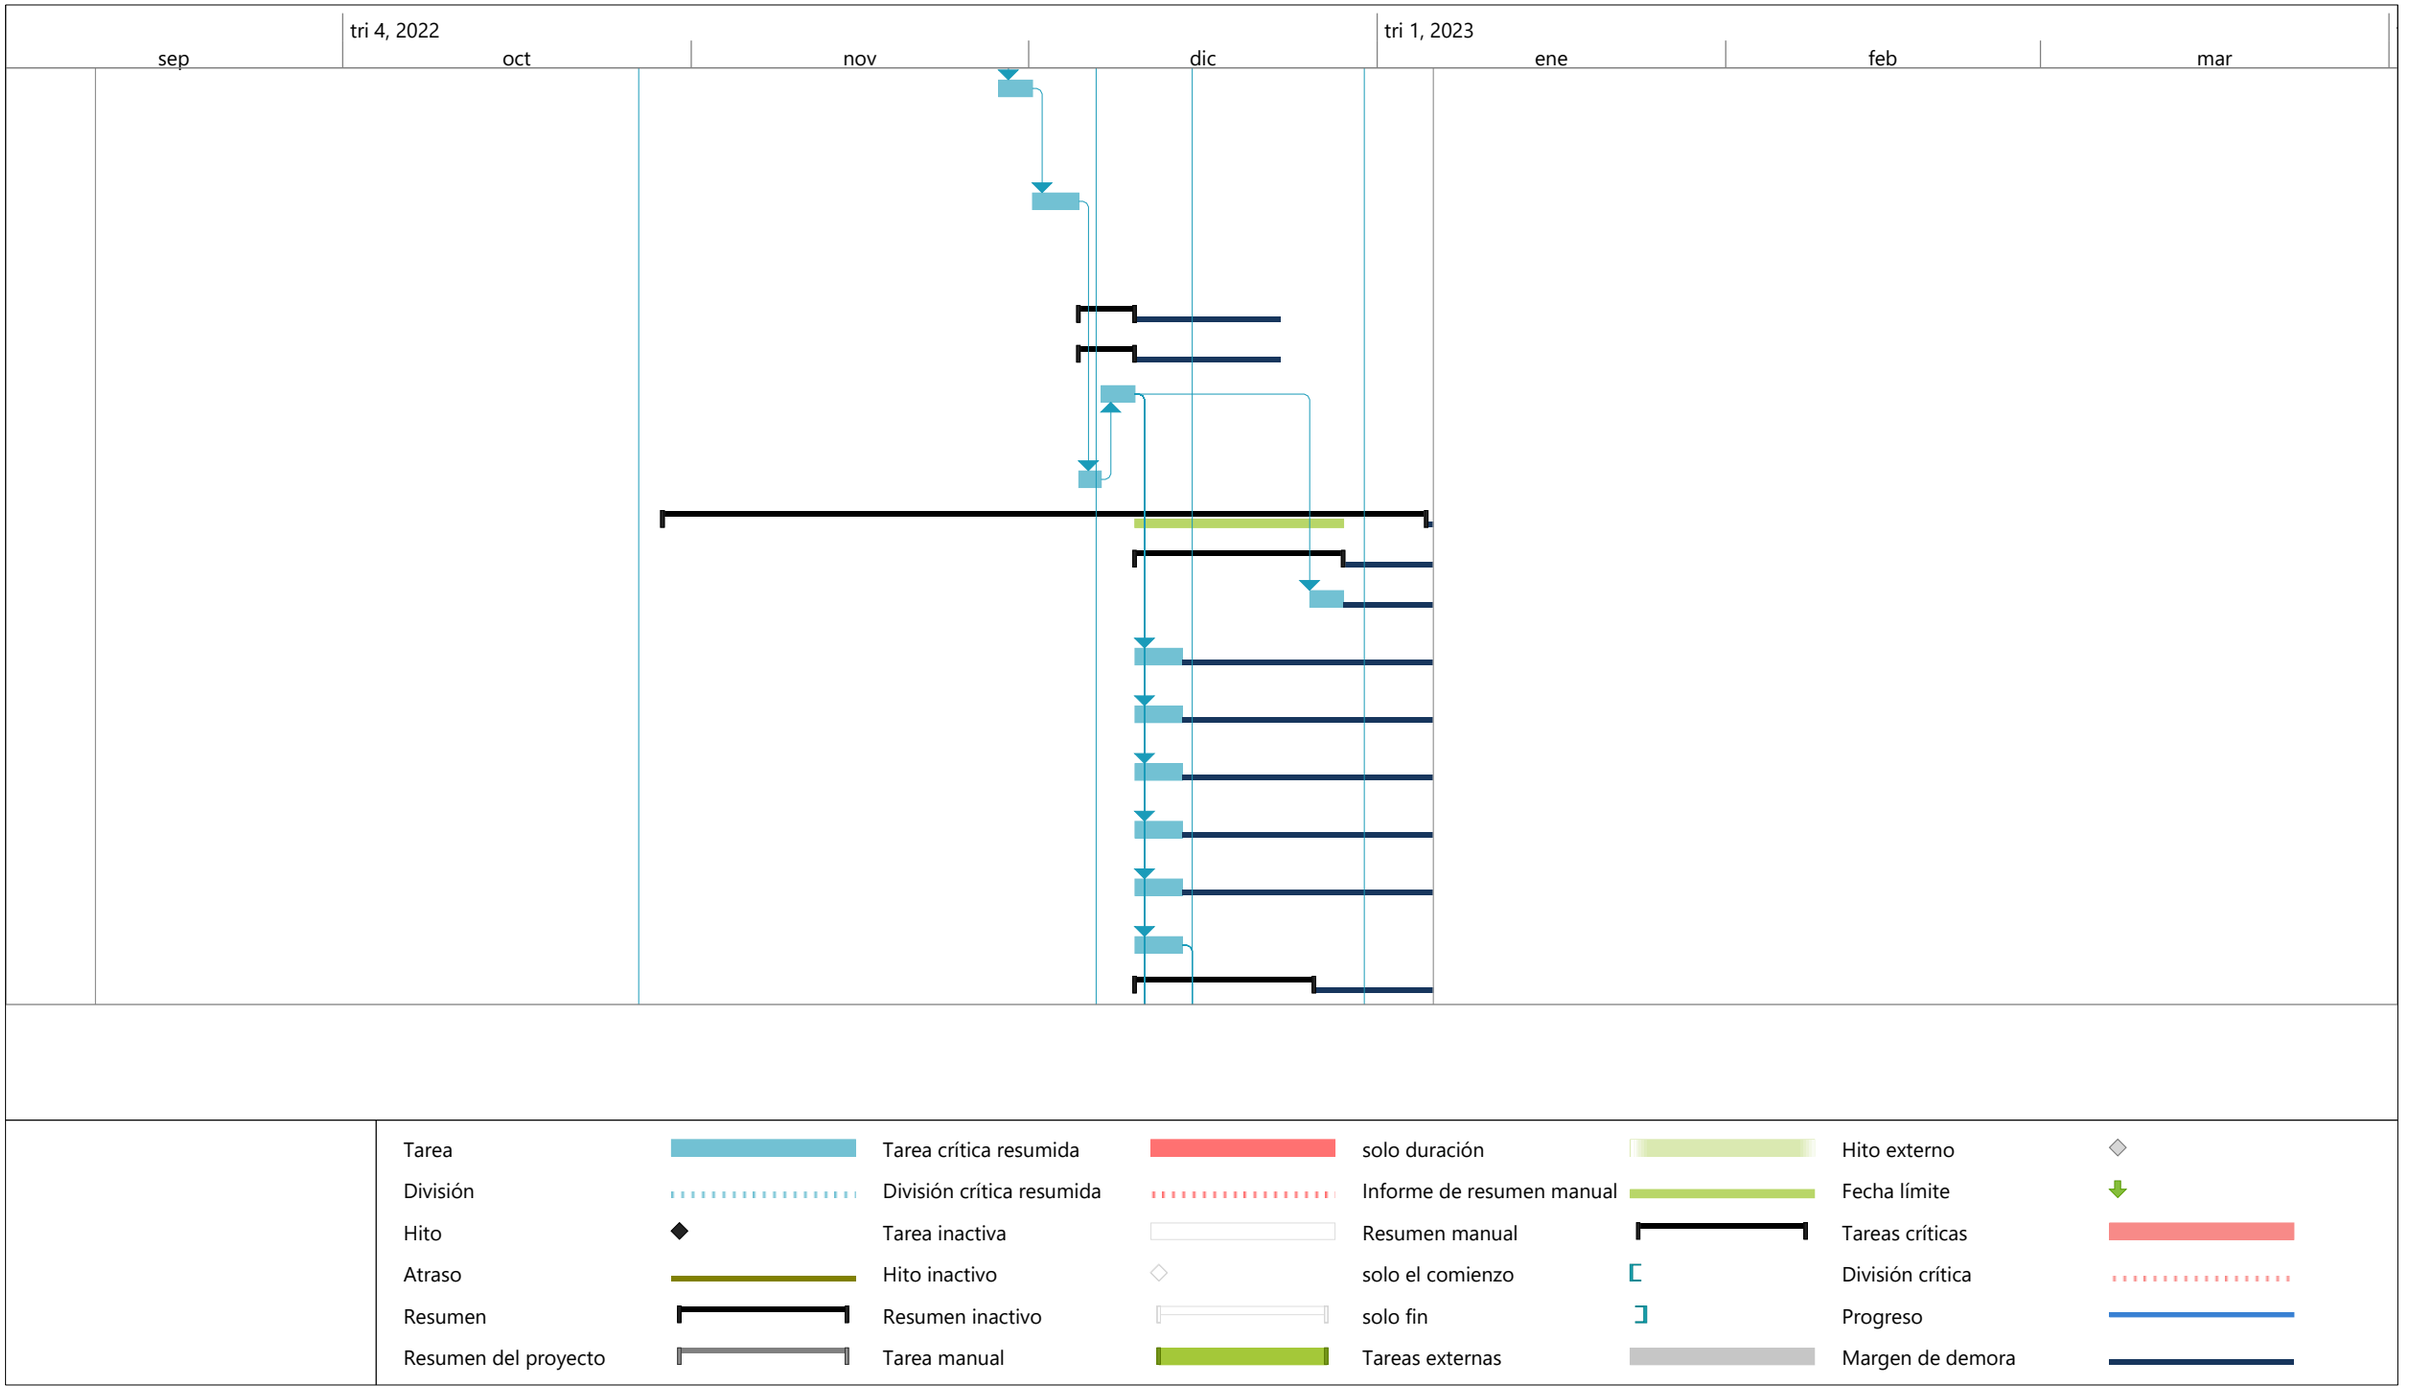
Tarea		Tarea crítica resumida		solo duración		Hito externo	
División		División crítica resumida		Informe de resumen manual		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas	
Atraso		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Resumen		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Tareas externas		Margen de demora	

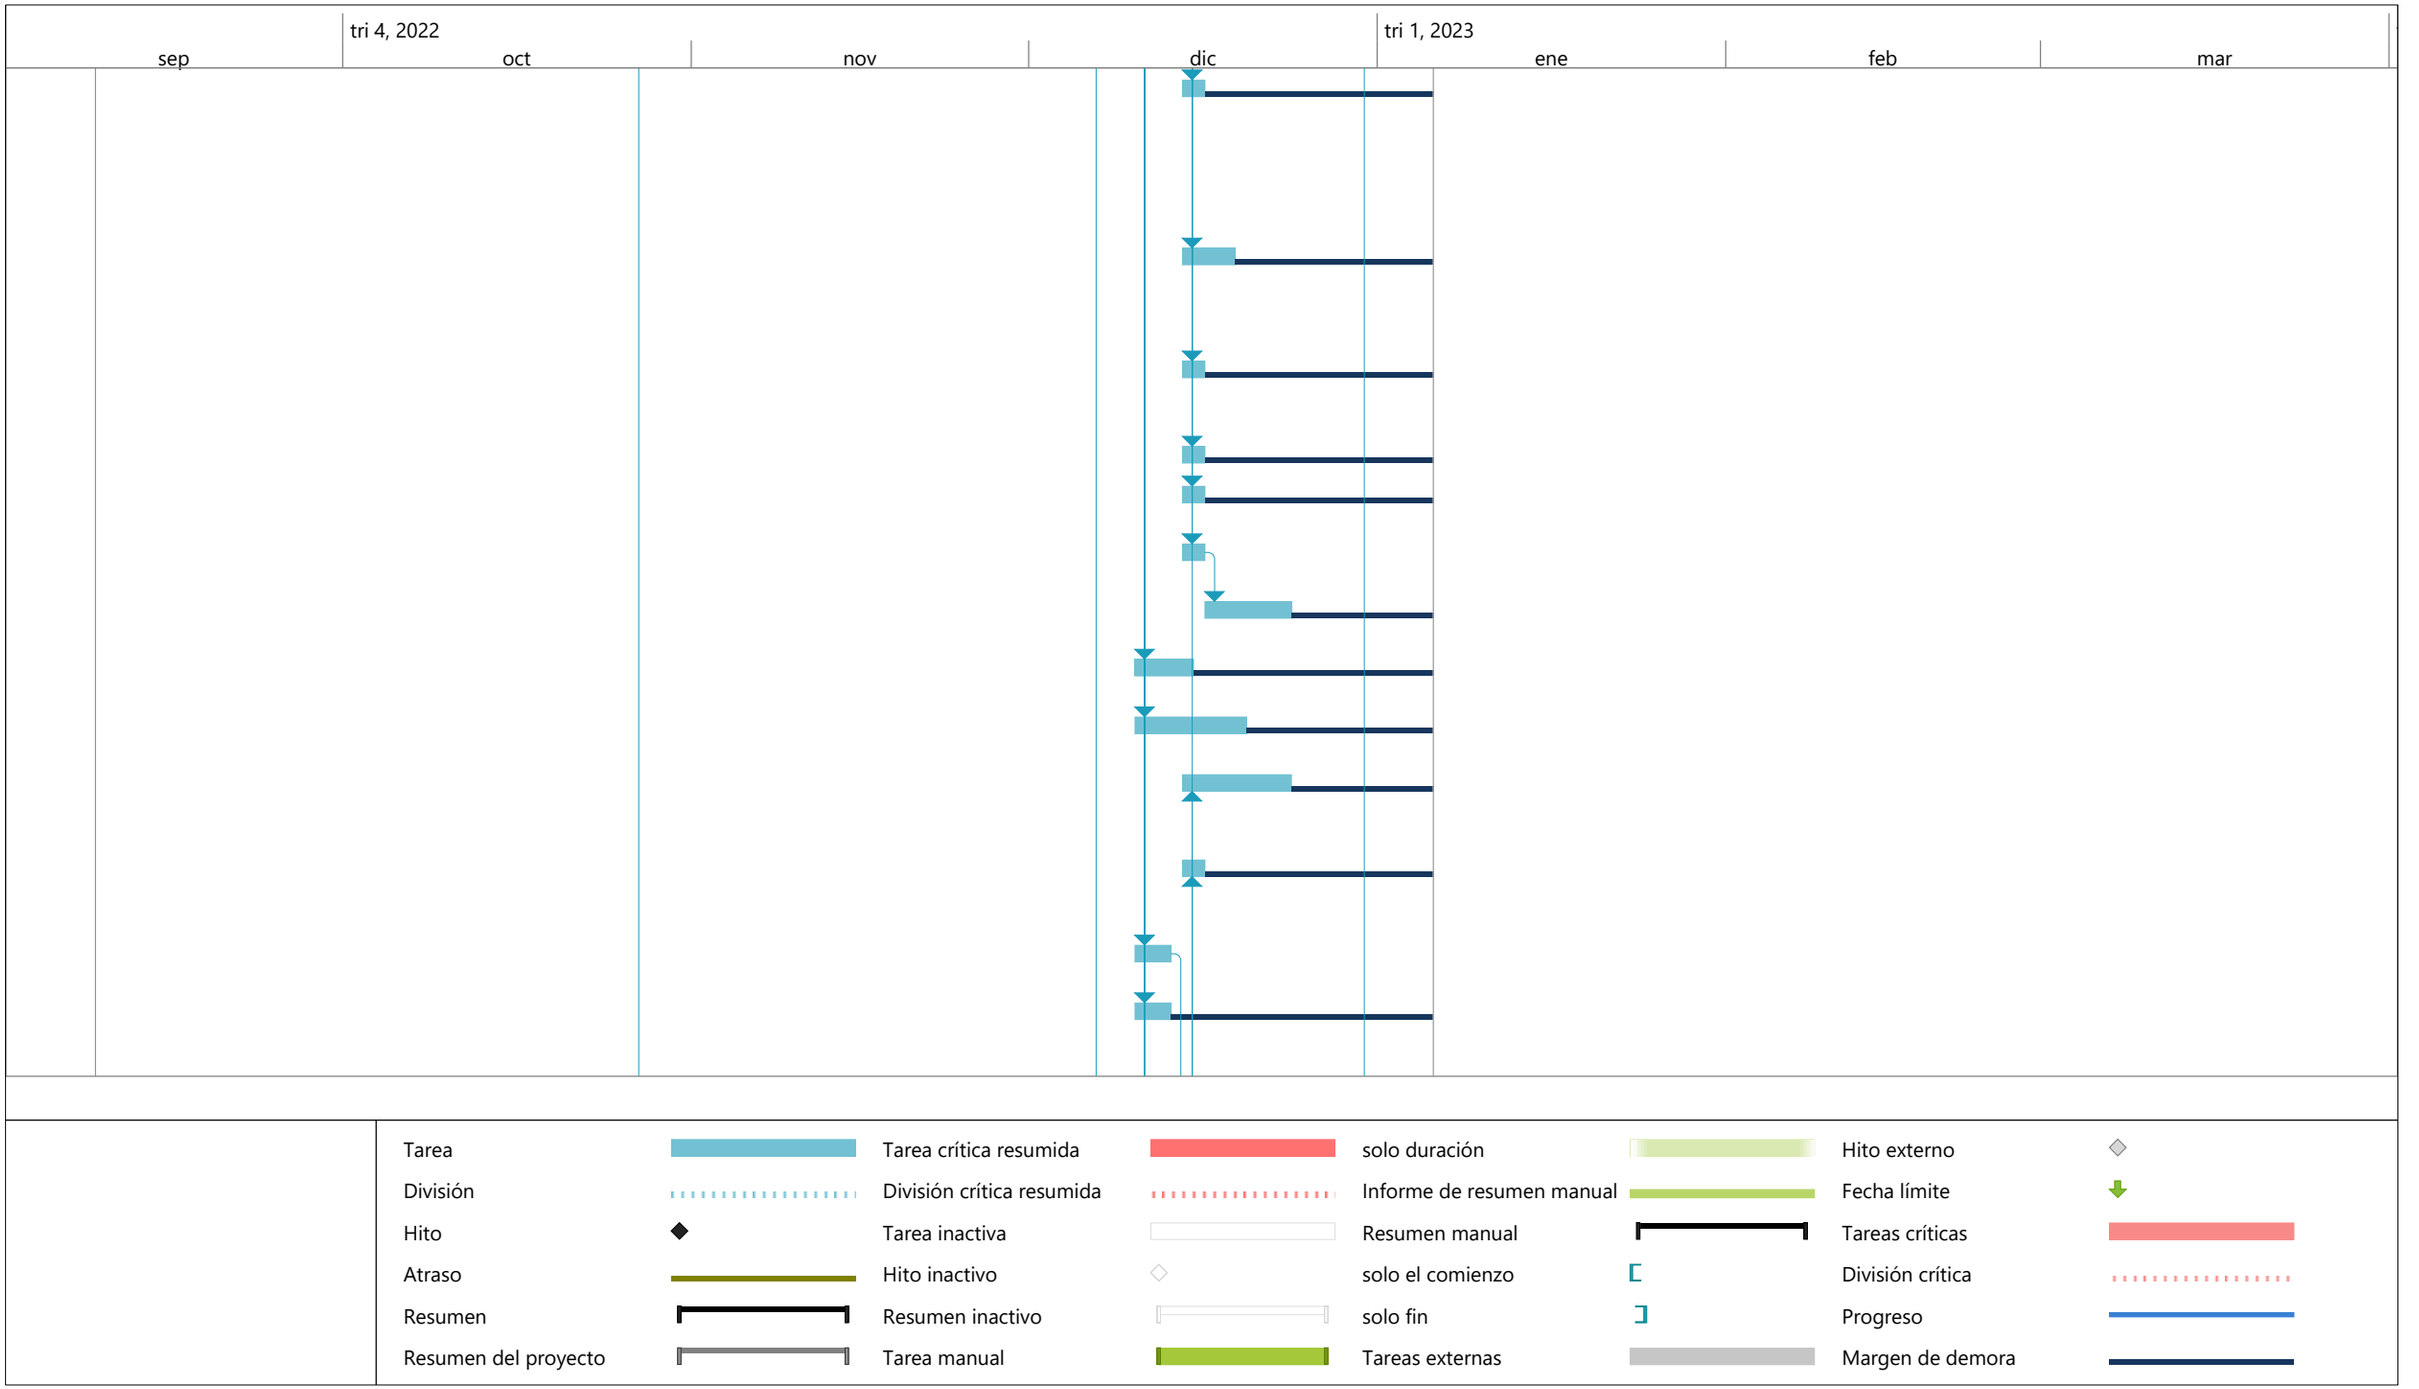


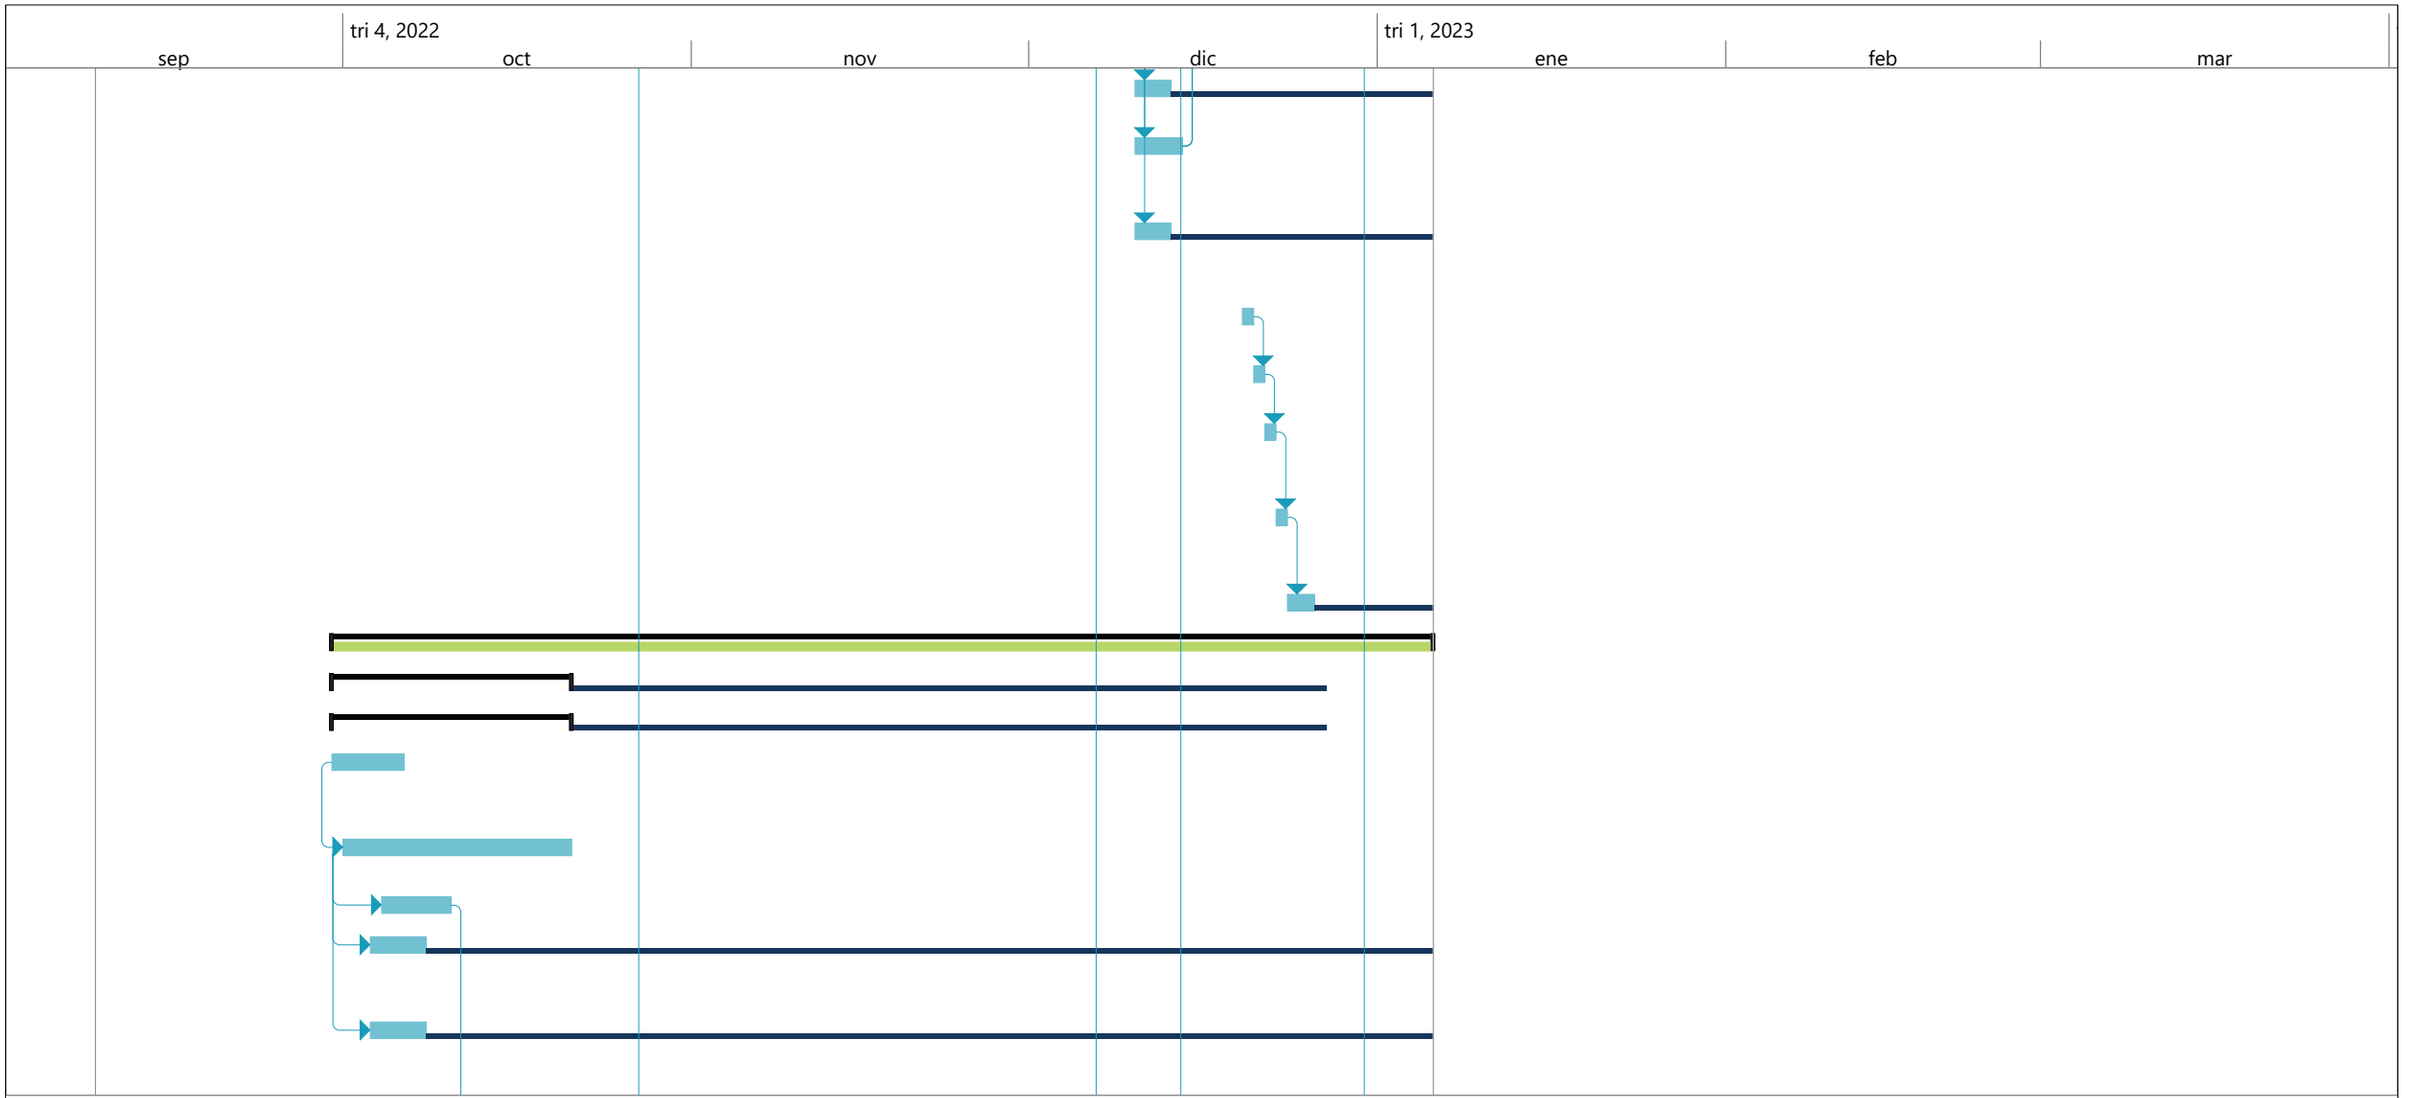
Tarea		Tarea crítica resumida		solo duración		Hito externo	
División		División crítica resumida		Informe de resumen manual		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas	
Atraso		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Resumen		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Tareas externas		Margen de demora	



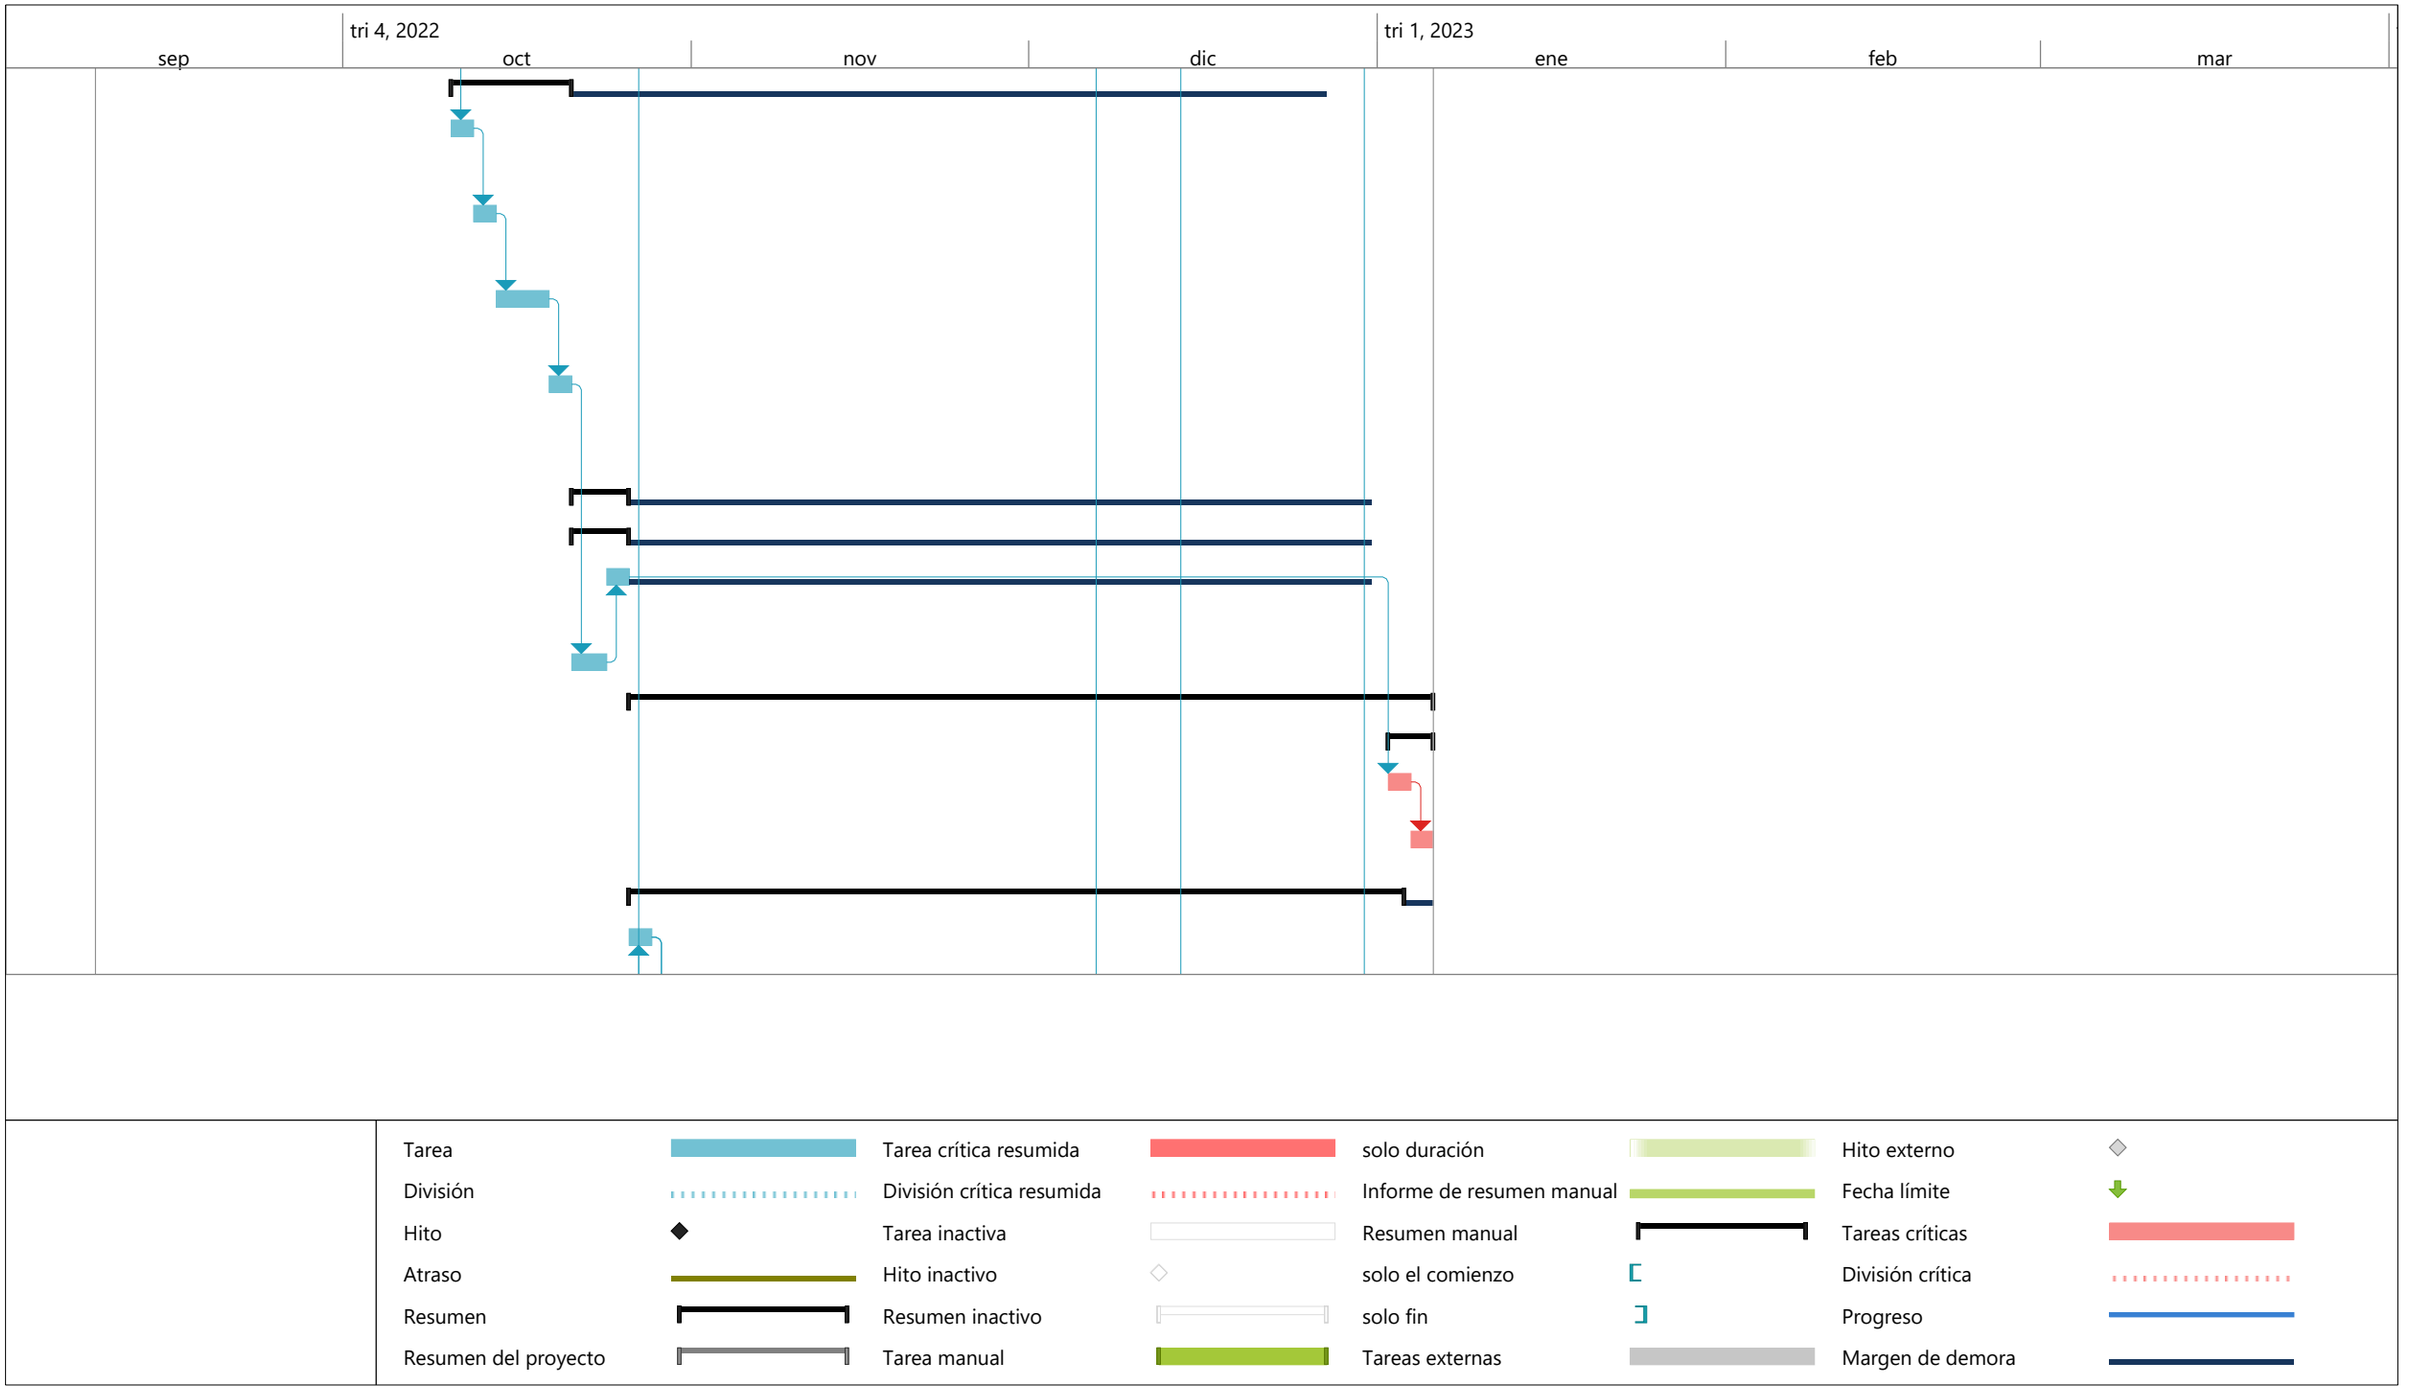
Tarea		Tarea crítica resumida		solo duración		Hito externo	
División		División crítica resumida		Informe de resumen manual		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas	
Atraso		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Resumen		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Tareas externas		Margen de demora	

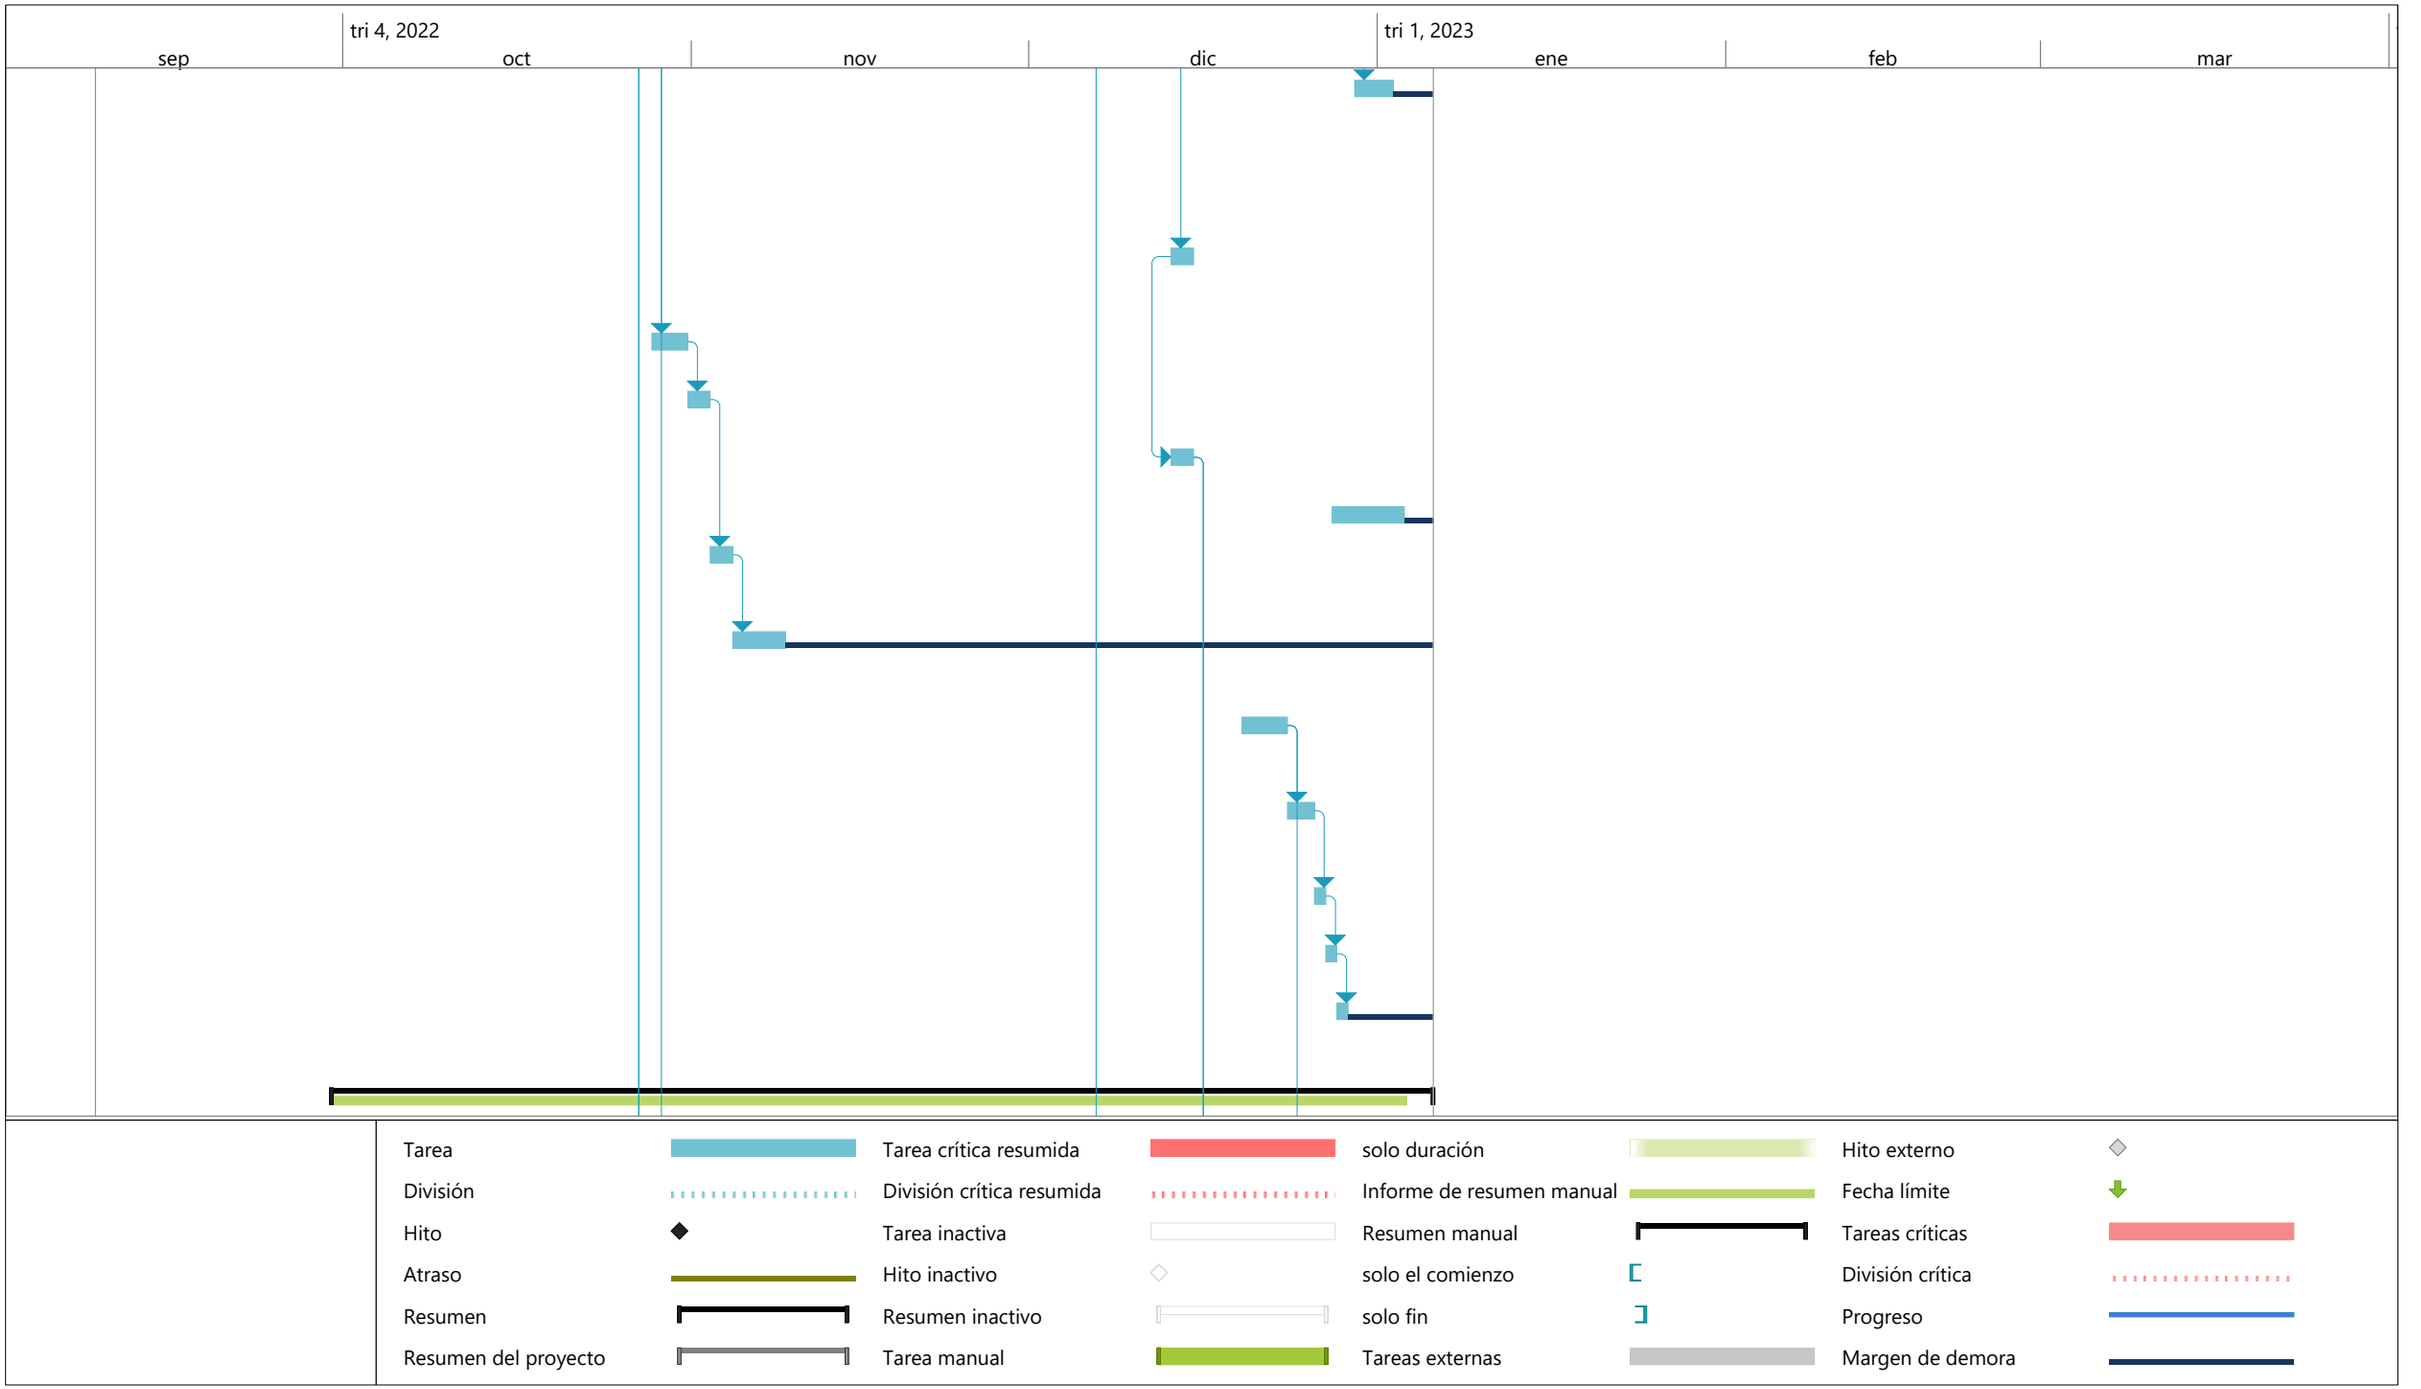

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

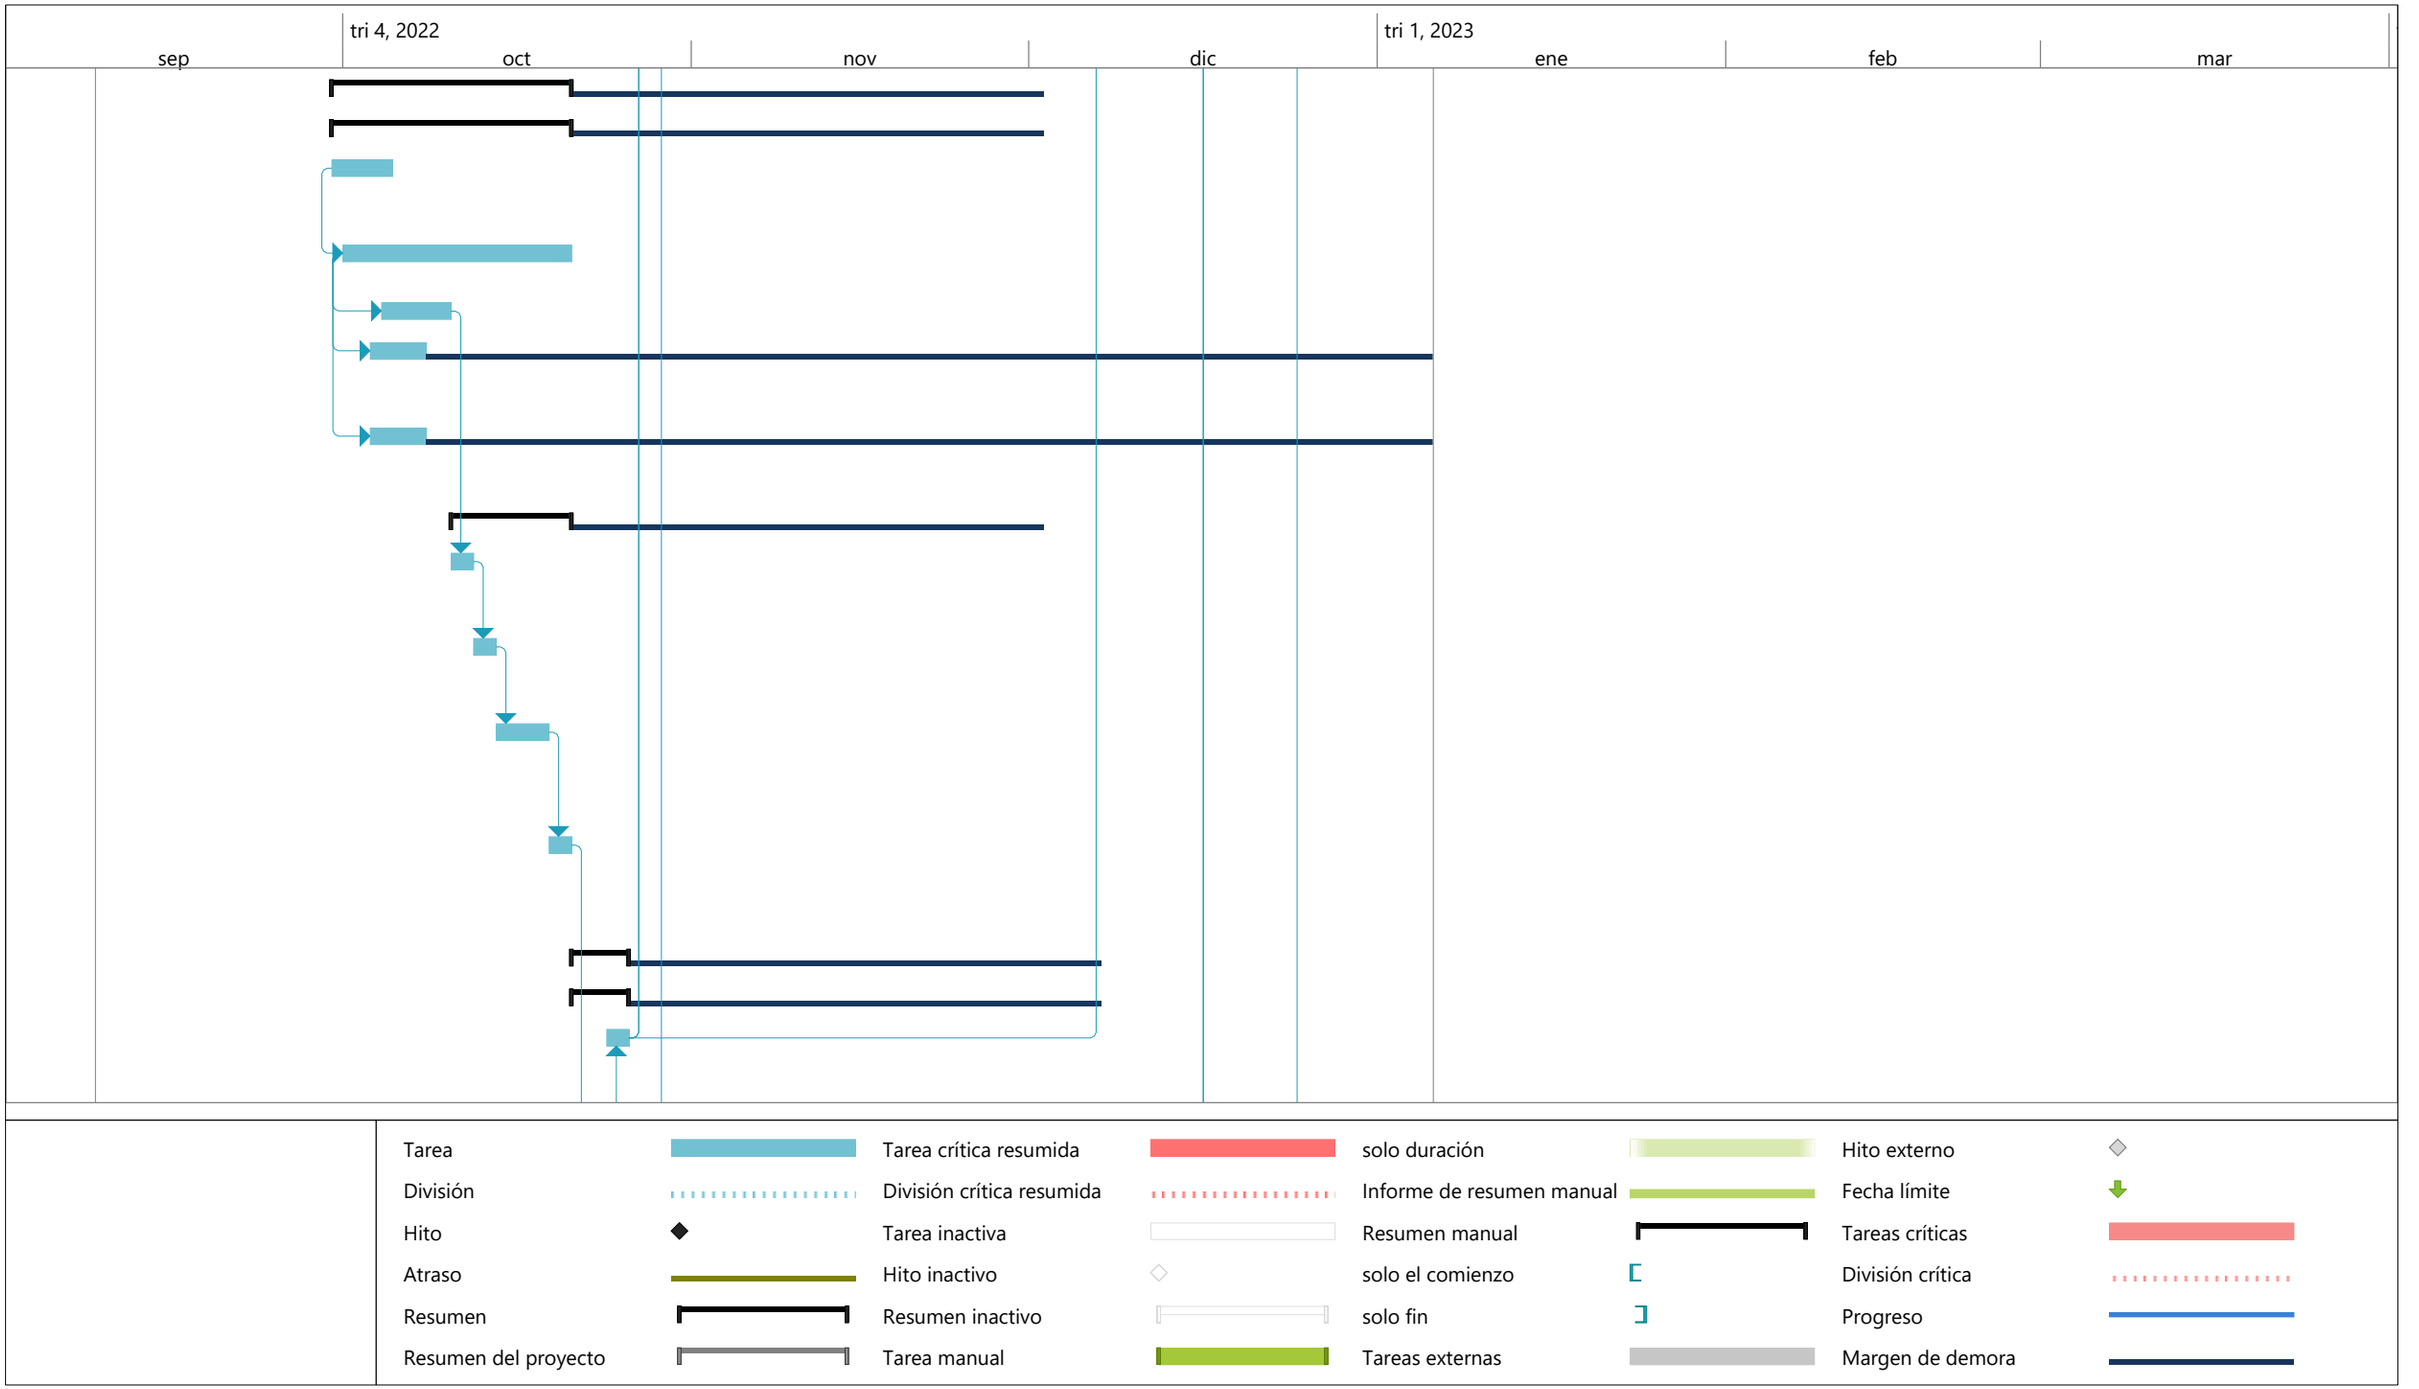

tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora

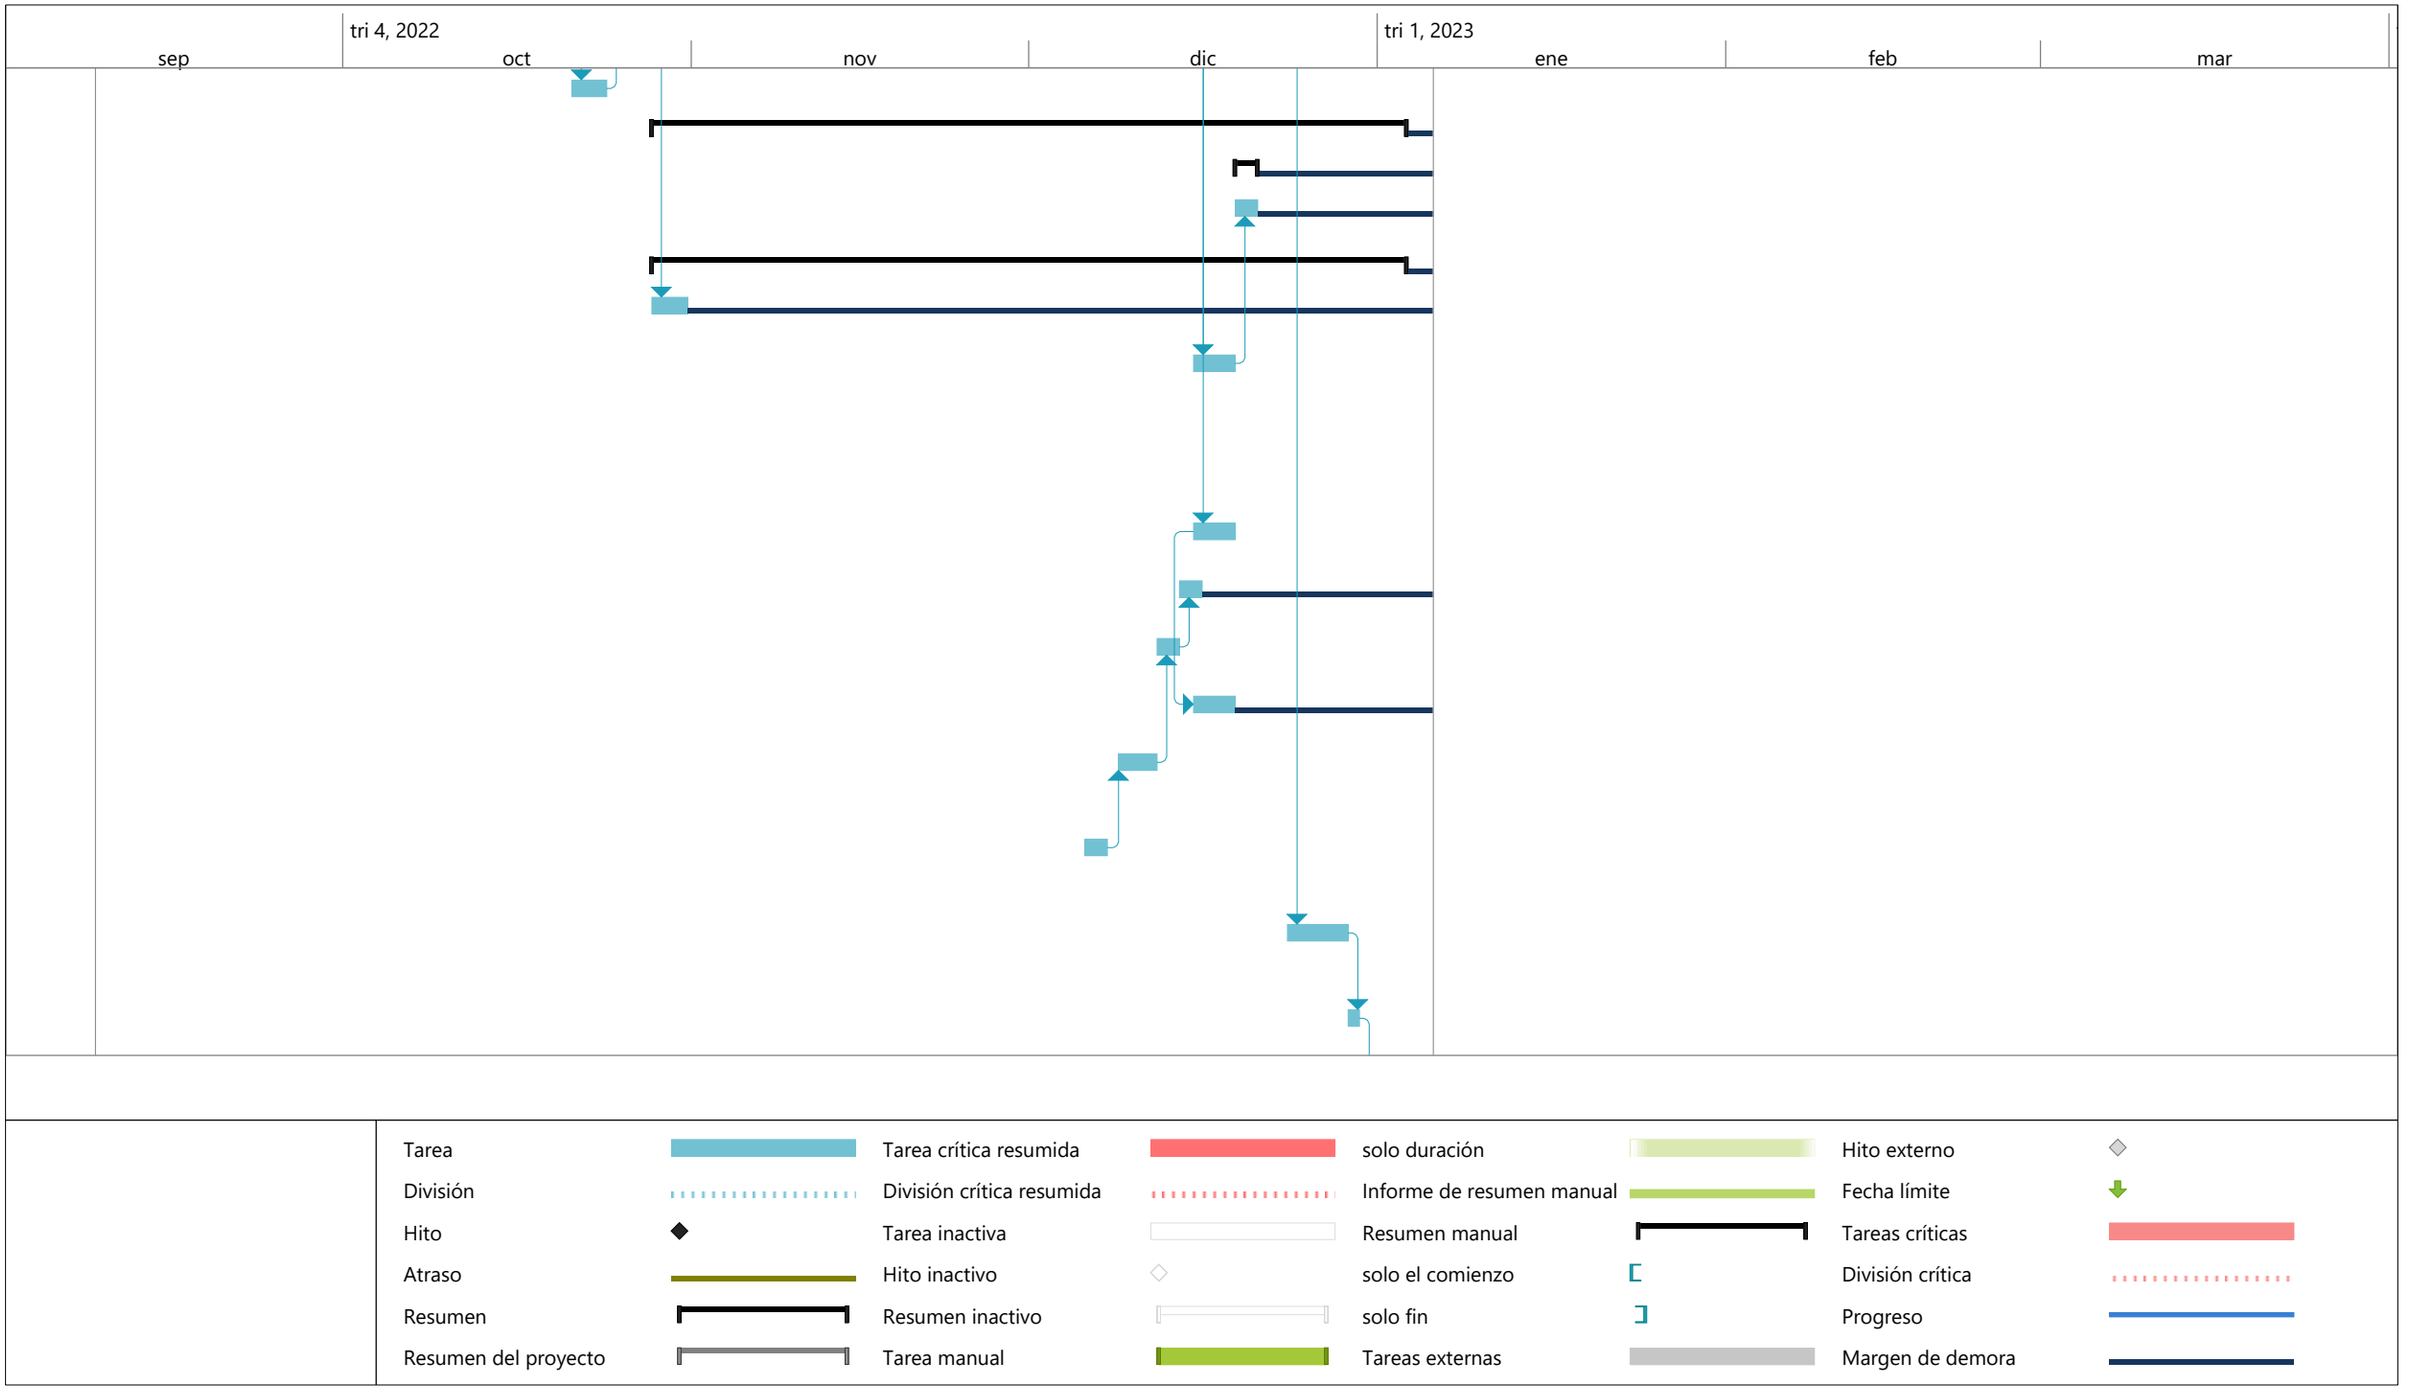


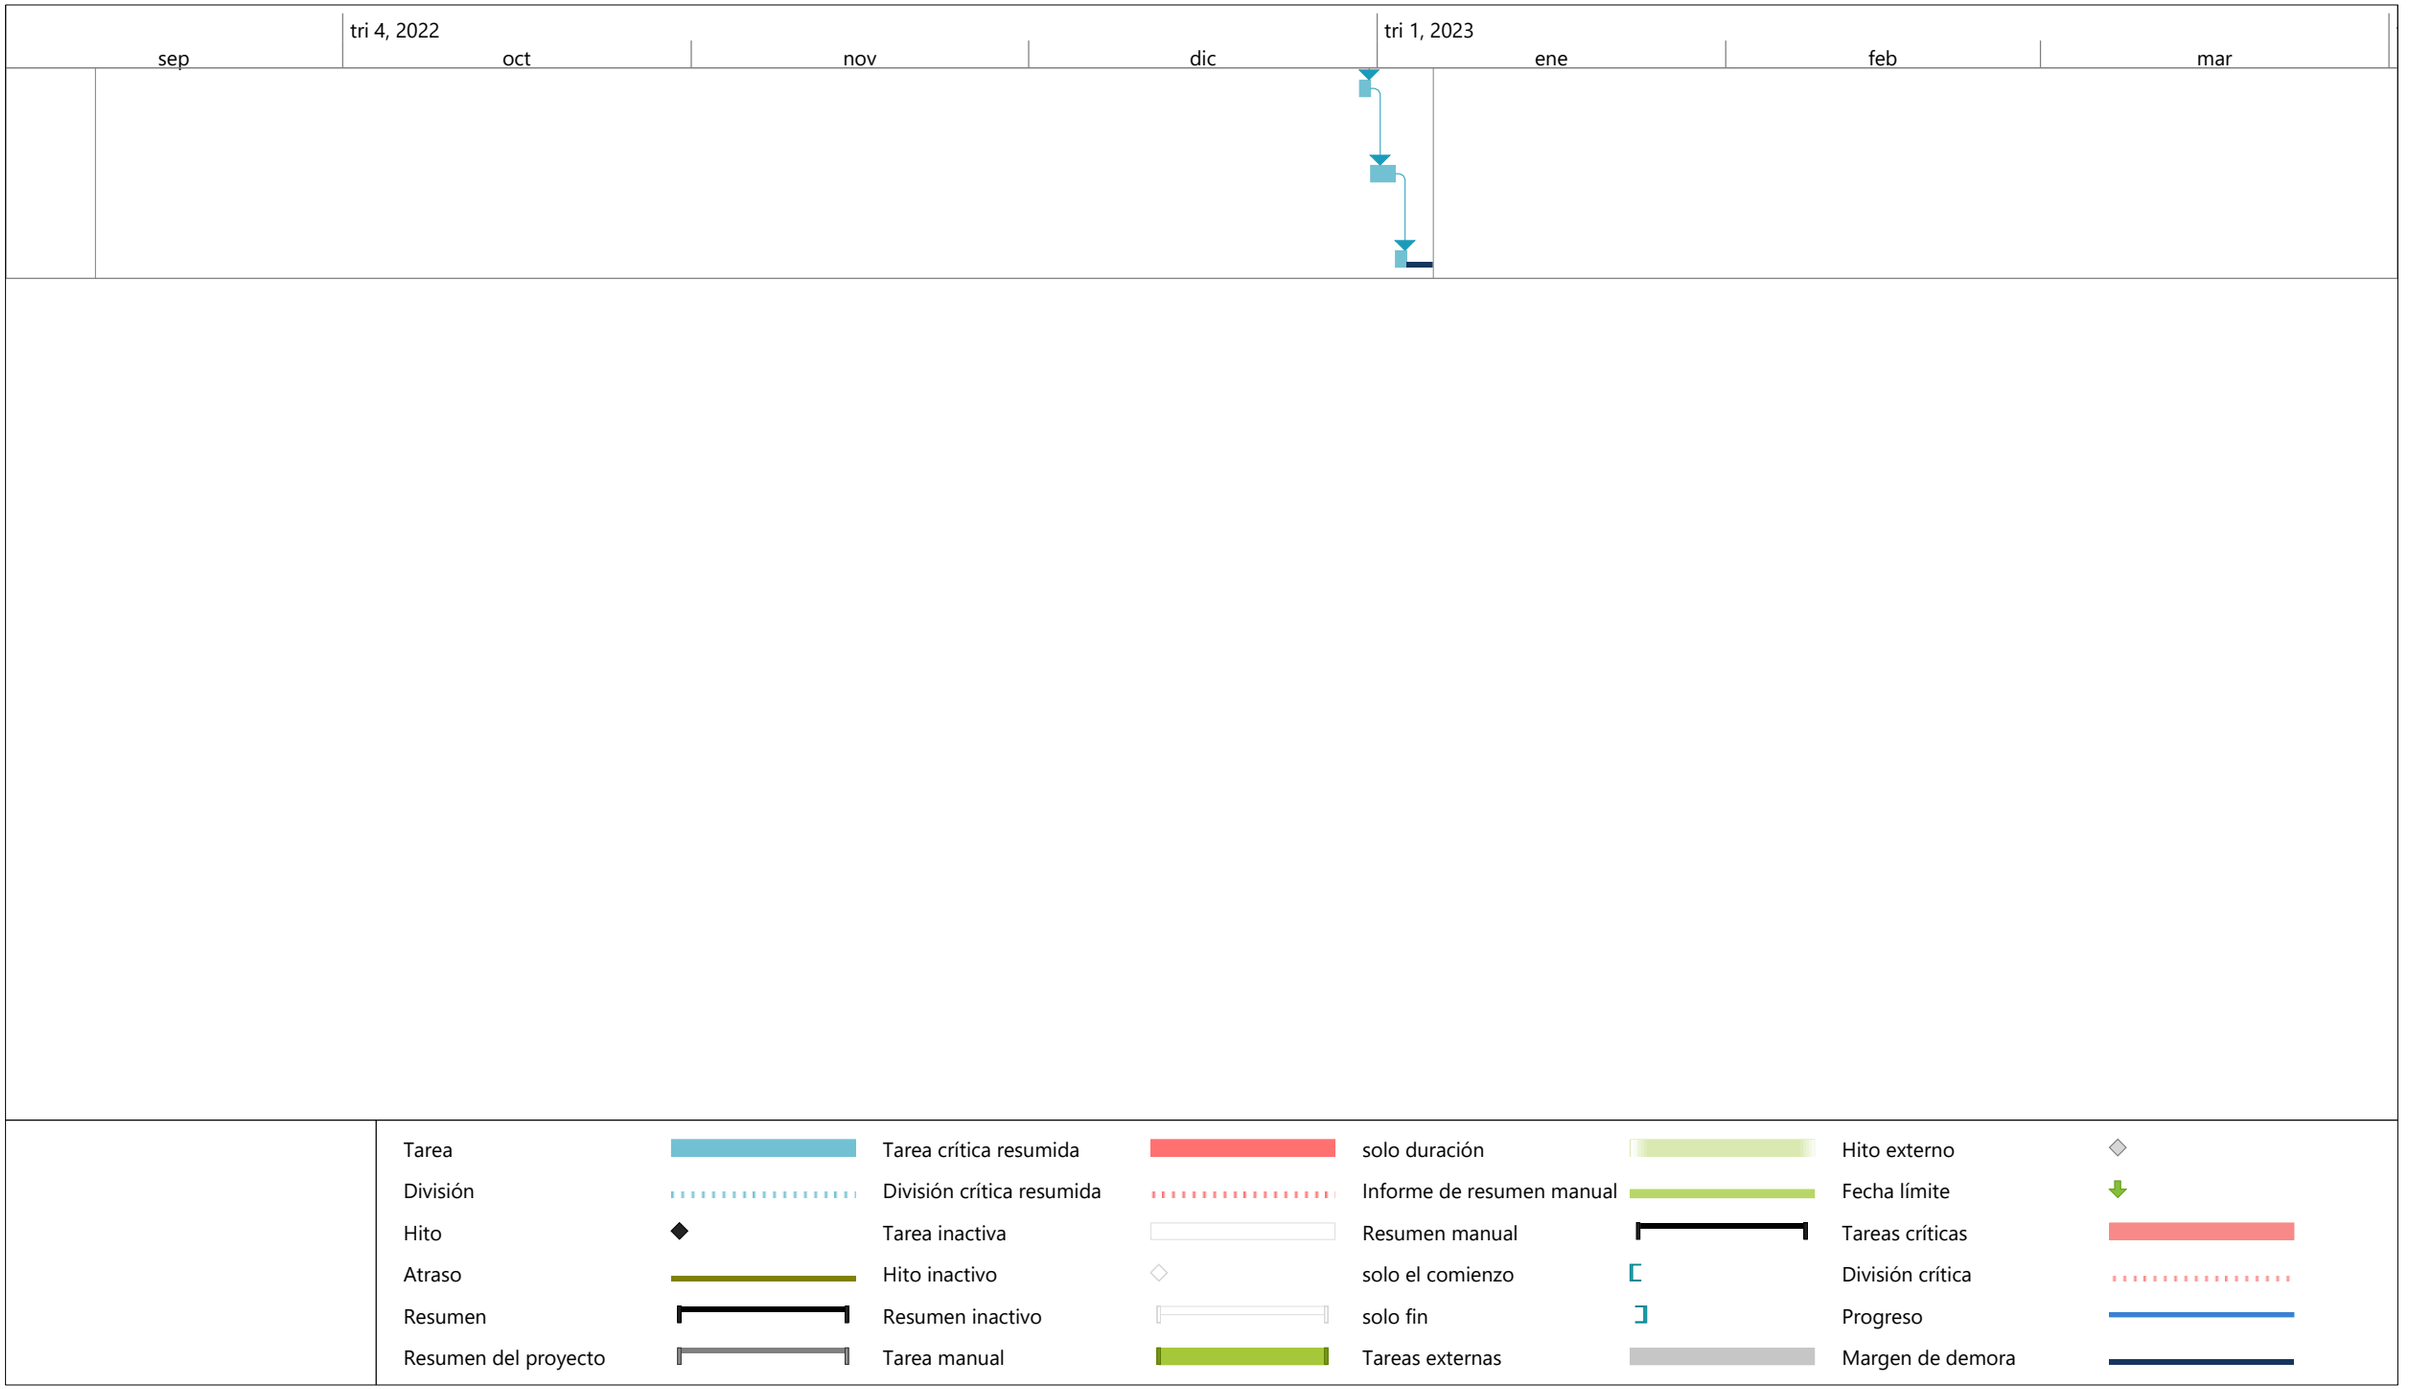
Tarea		Tarea crítica resumida		solo duración		Hito externo	
División		División crítica resumida		Informe de resumen manual		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas	
Atraso		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Resumen		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Tareas externas		Margen de demora	


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Margen de demora


tri 4, 2022
tri 1, 2023
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
Tarea
Tarea crítica resumida
solo duración
Hito externo
División
División crítica resumida
Informe de resumen manual
Fecha límite
Hito
Tarea inactiva
Resumen manual
Tareas críticas
Atraso
Hito inactivo
solo el comienzo
División crítica
Resumen
Resumen inactivo
solo fin
Progreso
Resumen del proyecto
Tarea manual
Tareas externas
Margen de demora
