INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

INFORME 4

(Marzo 22 de 2023- Abril 07 de 2023)

CONTRATO 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

VILLAVICENCIO

CONTENIDO

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 4
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 5
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 5
4. RELACION DEL PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 6
5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO 6
6. AVANCE FÍSICO. 7
7. PÓLIZAS 14
8. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES 40

ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

1. INTRODUCCION.

Este informe tiene como finalidad presentar la información general y especifica del contrato de obra "**CONTRATO 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"** y presentar detalladamente el avance de cada actividad a la fecha. La información contenida incluye aspectos como antecedentes, finalidad, localización del proyecto y condiciones del contrato.

Estas obras se realizarán bajo estándares de calidad generados mediante la experiencia y control del proceso constructivo, como la inspección de materiales, utilización de mano de obra calificada, equipos y herramientas de buena calidad. etc.; las actividades desarrolladas cumplen todos los parámetros de las normas establecidas por los entes correspondientes.

La información consignada en el presente informe está acompañada de los registros fotográficos de las actividades que se mencionan, para dar validez a cada una de ellas.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra N° 0253-SG-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES", fue asignado en culminación del Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía Número SAMC-0009-SG-2022, adjudicado mediante resolución N° 0000190 del 28 de noviembre de 2022, , el cual fue celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA el día 01 de diciembre de 2022 y con acta de inicio del 21 de diciembre de 2022.

El día 02 de marzo de 2023 se radica la solicitud de las condiciones iniciales contractuales ya que una vez se da inicio a las actividades contratadas se evidencia que estas no estaban acorde a lo encontrado en obra, el 07 de marzo de 2023 se realiza la aprobación del acta modificatoria y adicional para continuar con la ejecución y finalización del contrato N° 0253-SG-2022.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°	0253-SG-2022
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
CONTRATISTA	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$174.479.287,85
PRORROGA 1 (OTRO SI 1)	14 DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA TERMINACION	07 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 2 (OTRO SI 2)	30 DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA TERMINACION	07 DE ABRIL DE 2023
ADICIONAL 1	$89.450.096,29
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 268.929.384,14

3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 268.929.384,14
AVANCE %	100%

4. RELACION DEL PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALUD	PENSION	ARL
VICTOR GERARDO BLANCO	86.075.374	MAESTRO	SANITAS	PORVENIR	SURA
LESTHER FABIAN VILLADA	1.121.884.519	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
GABRIEL EDUARDO ROJAS	86.041.319	AYUDANTE	CAJACOPI	PROTECCION	SURA
JOSE LUIS NAVIA	79531057	RESIDENTE DE OBRA			SURA

PLANILLA	MES	VALOR
1053285559	MARZO	$599.000
1053521037	MARZO	$80.900
1053854075	ABRIL	$252.300
1053870925	ABRIL	$18.900

5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Se cuenta con el siguiente equipo en la obra para la ejecución de las actividades:

1. Equipos y herramienta menor

- Picas
- Palas
- Carretillas
- Pulidoras
- Discos de corte
- Taladro
- Rotomartillos
- Andamios
- Mezcladora
- Rana compactadora
- Pisón
- Malacate

6. AVANCE FÍSICO.

En el periodo correspondiente al 22 de marzo al 07 de abril se realizan las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD EJECUTADA
	PRELIMINARES			
1.3	Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, lavamanos quirúrgico, sanitario orinales etc.). Incluye taponamiento provisional de puntos hidráulicos y sanitarios, traslado hasta lugar de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, reinstalación, conexión a puntos hidráulicos y sanitarios, suministro de elementos de conexión, (sifones, accesorios, acoples) y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00	Se realiza la instalación de 3 lavamanos quirúrgicos desmontados previamente, a los cuales se le realiza la instalación de accesorios y sellado con sikaflex en espacios del elemento y muro. actividad al 100%.
1.4	Desmonte y reinstalación de mesas de necropsias. Incluye retiro hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto. Incluye taponamiento temporal de puntos hidráulicos y sanitarios, chazos expansivos de acero inoxidable 3/8" x 2", conexiones a puntos hidráulicos y sanitarios, elementos de conexión (sifones, canastillas de acero inoxidable, accesorios de PVC, tornillos) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	7,00	Se realiza la instalación de 7 mesas de necropsias, las cuales se nivelaron y anclaron al piso, se realiza la instalación de accesorios de pvc y sellado con sikaflex en espacios entre el elemento y muro. actividad al 100%.
1.5	Desmonte y reinstalación de superficies de trabajo en acero inoxidable (1,20 m. x 0,60 m.). Incluye desmonte, traslado hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, elementos de instalación, tornillos, sellado de juntas y demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	Se realiza la instalación y anclaje a muro de 6 mesas de trabajo en acero inoxidable, con su respectivo sellado de juntas con sikaflex. actividad al 100%.
1.11	Desmonte y posterior reinstalación de lámparas de iluminación ubicadas en cielorraso. Incluye retiro hasta el sitio de depósito temporal dentro de la sede del Instituto.	UN	6,00	Se realiza la reinstalación de 6 lámparas, ya que se hace cambio de 15 luminarias nuevas. actividad al 100%.
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			

4.4	Construcción de red hidráulica en tubería PVC RDE 9, de ½". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento	ML	15,00	Se realiza la construcción de 15 ml de red hidráulica de ½" en la parte externa para conexión de llave de jardín. actividad al 100%.
4.6	Suministro e instalación llave de jardín 1/2" x 3/4". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14,00	Se realiza la instalación de 6 llaves de jardín, 5 unidades en la parte interna, 1 en la zona externa. actividad al 100%.
4.7	Suministro e instalación de registro de corte hidráulico (Válvula de bola de 1/2 "), metálico tipo Grival. Incluye instalación en muro, conexiones, regata para instalación de tapa, tapa registro plástica 15 x 15 cm., cinta teflón, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.	UN	7,00	Se realiza la instalación de 9 registros de corte hidráulico de ½", distribuidos en la sala de necropsias y servicios anexos. actividad al 100%.
4.10	Punto sanitario de 4" (tapón de inspección roscado). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC, Tapón de inspección de aluminio tipo colregilla o similar, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. (Según diseño)	UN	5,00	Se finaliza la actividad con la instalación de la tapa de inspección en aluminio según diseño presentado por la entidad. actividad al 100%.
	BASES Y PISOS			
6.1	Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado	M2	131,8	Se realiza la instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0,30x0,30 en 119,52 m2, cubriendo así el área total de la sala de necropsias y servicios anexos. actividad al 100%.
6.2	Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.	ML	105,18	Se realiza la instalación de guarda escoba media caña según especificaciones, en un área total de 91,11 ml, cubriendo así el área total de la sala de necropsias y servicios anexos. actividad al 100%.

6.3	Suministro e instalación de piso tablón de gres grafilado, color y tamaño igual al existente (para andén). Incluye dilataciones o franjas en granito lavado, de grano, medidas y color iguales a las existentes. Incluye material de pega, boquilla y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado. Se deben homologar las características del piso existente en apariencia e instalación.	M2	14,00	Se realiza la instalación de tablón de gres grafilado en 13,62 m2, distribuidos en la zona externa donde debió demolerse para la salida de la tubería sanitaria para conexión con las cajas de inspección y a solicitud de la entidad en la zona de ingreso (portería) y zona de ingreso a la bahía de recepción de cadáveres. actividad al 100%.
	VARIOS			
10.1	Suministro e instalación de rejilla metálica de 0,20 m. de ancho para cárcamo, en tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" x 1" y marco en ángulo de acero inoxidable en 1,1/4", con uñas de anclaje en el mismo material, incluye instalación de marco en placa de contrapiso, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	1,00	Se realiza la instalación de rejilla metálica con su respectivo marco en acero inoxidable de 0,20 m de ancho en cárcamo localizado al ingreso de la sala de necropsias. actividad al 100%.
10.2	Suministro e instalación de marco para rejillas de cárcamos, de 40 cm. de ancho, en ángulo de acero inoxidable de 1,1/4" x 1,1/4" x 1/4", con uñas de anclaje, incluye nivelación y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	10,55	Se realiza la instalación de 9,55 ml de marco para rejillas de cárcamos en acero inoxidable. actividad al 100%.
10.3	Suministro e instalación de protectores guarda camillas para áreas de circulación de la sala de necropsias: guarda camillas IPC. Ref 700, con estructura de soporte en aluminio completa y plástico de alto impacto y jumper interior para amortiguar golpes, dimensiones de 7 3/4" (197 mm) ancho x 1 " (25mm), color igual o similar a existente, anclaje de soporte de aluminio a muro, con chazos expansivos de 1,1/2" de largo x 5/8" mínimo 8 unidades por metro lineal y máximo cada 34 cm de distancia y con tornillo de 3/16". Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.	ML	12,80	Se realiza la instalación de 5,94 ml guarda camillas. actividad al 100%.
10.4	Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16,00	En concordancia con los guardas camillas se instala un total de 8 unidades de terminales para guarda camillas. actividad al 100%.

10.5	Suministro e instalación de tragante metálica - aluminio tipo cúpula de 5" x 3"para instalación en sifones de cárcamos. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	Se realiza la instalación de 6 tragantes metálicas tipo cúpula, distribuidos en los 4 cárcamos construidos. actividad al 100%.
10.7	Suministro e instalación de esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x 2", espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos ¼, "tornillo avellanado 8X2". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	9,00	Se realiza la instalación de 1 unidad de esquinero en ángulo de aluminio, puesto que de acuerdo a la existencia de otros elementos en los muros no permitía la instalación y tampoco se requería la protección del muro. actividad al 100%.
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 03	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline E=9 mm de altura y ancho lámina 30 cm incluye claraboyas de inspección de 60 x 60 en PVC con marco y contramarco en aluminio blanco cada 3 metros aproximadamente en los dos sentidos; se debe instalar seccionado en tramos no superiores a 3 metros. Incluye claraboyas de inspección, remates laterales, uniones y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. (Sala de necropsias y cuartos anexos)	M2	131,63	Se realiza la instalación de 131,63 m2 de cielo raso en PVC en la sala de necropsias y servicios anexos con sus respectivos elementos. actividad al 100%.
NP 07	Suministro e instalación de Pintura Epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros interiores en zonas asépticas, de dos componentes (componente A, pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico, acabado semibrillante, tres manos, color blanco (área morgue y servicios anexos).	M2	436,45	Se finaliza la actividad de aplicación de pintura epoxica, cubriendo así un área total de 426,17 m2. actividad al 100%.
NP 14	Desmonte y reinstalación de Guarda Camillas. existentes en PVC. Incluye todos los materiales, accesorios y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	42,91	Se realiza la reinstalación de guardacamillas previamente desinstalados, los cuales son lavados previa instalación. actividad al 100%.
NP1 5	Desmonte y reinstalación de Muebles y Elementos anclados a muros o a piso (estantería metálica, gabinetes, mesas, puestos de trabajo) - Incluye embalaje y traslado a sitio de almacenamiento indicado por la Entidad.	UN	27,00	Se realiza la reinstalación de los 27 muebles desinstalados previamente. actividad al 100%.
NP 16	Construcción Canal Aguas Lluvias para dar continuidad al existente, en concreto 3000 psi, homologando características y espesores del elemento existente.	ML	2,55	Se realiza la construcción de 2,40 ml de construcción de canal aguas lluvias para dar continuidad al existente, toda vez que se encontraba interrumpida la sección por la

				existencia de una caja de inspección. actividad al 100%.
NP 17	Suministro e instalación Grifería Cuello de Ganso Sencilla para mesas de necropsias, incluye desmonte, elementos necesarios para su correcta instalación y disposición de sobrantes en sitio autorizado.	UN	7,00	Se realiza la instalación de 7 grifos tipo cuello de ganso en cada mesa de necropsias. actividad al 100%.
NP 20	Suministro e instalación de Granito Lavado para bordillo de 0,40x,0,30 m, en rampa de acceso a sede administrativa, incluye dilataciones plásticas cada 1,5 metros.	ML	23,40	Previa demolición del granito existente se realiza la instalación de 22,74 ml de granito lavado con sus respectivas dilataciones plásticas en el muro de acceso a la sede administrativa. actividad al 100%.
NP 22	Suministro e instalación de Registro de Corte Hidráulico, PVC 1", (Válvula Bola 1pulg PVC Soldar tipo pesada PCP) Incluye instalación en muro, conexiones, regatas para instalación de tapa, tapa registro plástica 20 x 20 cm, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.	UN	1,00	Se realiza la instalación de registro de paso PVC de 1" en la sala de necropsias. Actividad al 100%.
NP 23	Conexión de Poceta de Mesa de Necropsias en tubería PVCS de 2" de diámetro, desmontable, incluye tubería PVCS hasta 2 ml, accesorios PVC, unión universal roscada, conexiones a sosco metálico existente, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución	UN	7,00	Se realiza la instalación de conexión de poceta en las 7 mesas de necropsias. Actividad al 100%.
NP 26	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Salida a 120V para tomacorriente GFCI empotrada, 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme, tapa protección Waterproff, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	19,00	Se realiza la instalación de 19 tapas Waterproff, finalizando así la ejecución de la actividad al 100%.
NP 31	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Panel Led 60X60 40W, 6500K, 4226lm, IP65 montaje de incrustar o descolgar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).	UN	18,00	A solicitud de la supervisión y aprobación de otro si 1, se realiza la instalación de 18 luminarias tipo led 60x60 IP65, distribuidas en la sala de necropsias y servicios anexos. actividad al 100%.

NP 36	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, ángulos externo e internos, derivaciones, ángulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	2,00	Se realiza la instalación de 2 ml de canaleta en el cuarto de muestras y rx. actividad al 100%.
NP 37	Suministro e Instalación de Luminaria Led Hermética T8 2x18W IP65 cuerpo plástico reforzado y difusor en policarbonato, driver multivoltaje; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).	UN	1,00	Se realiza la instalación de 1 luminaria tipo led hermética en el cuarto de aseo de la sala de necropsias. actividad al 100%.
NP 38	Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	**M2**	9,95	Se realiza la instalación de 8,80 m2 de ducto según especificaciones en la zona externa para futura conexión y puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado. actividad al 100%.
NP 39	Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornillería, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	**M2**	3,62	Se realiza la instalación de 3,62 m2 de ductos, en los puntos de inyección y extracción del aire existente ya que el existente no era funcional pues los mismos no estaban anclados al cielo raso que existía previamente. actividad al 100%.
NP 40	Rejilla difusora 3 vías de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	**UN**	1,00	Se realiza la instalación de rejilla difusora de 3 vias 14”x14” para la posterior puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado. actividad al 100%.
NP 47	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de Salida Para Toma Especial alimentación marmita 50A 250V empotrada, circuito dedicado; (incluye descableado y cableado en cable 3x10 +12 AWG LSZH, caja 2400 doble fondo, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	**UN**	1,00	Se realiza la instalación de salida para toma especial para alimentación de marmita en la sala de necropsias auxiliar. actividad al 100%.

NP 48	Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	UN	1,00	Se realiza la instalación de rejilla para toma de aire 16”x14” para la posterior puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado. actividad al 100%.
NP 53	Suministro e instalación de conexión de Manguera de ½” súper reforzada 4 capas truper con refuerzo de tramado radial, con llave de regulación de 1/2 x 1/2 " cierre rápido y conector rápido para manguera de 1/2" plástico para mesas de necropsias , incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación.	UN	7,00	Se realiza la instalación de 7 secciones de 2,80 m en cada mesa de necrospias, con llaves de regulación y conector rápido para manguera de ½”. actividad al 100%.

ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

7. PÓLIZAS

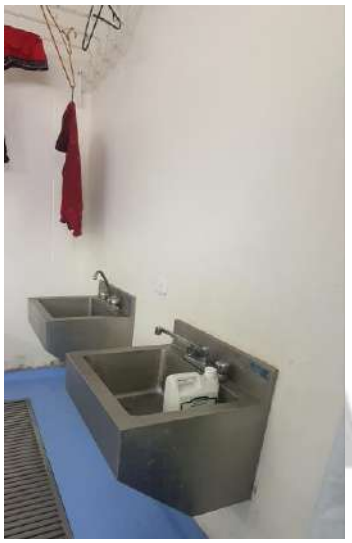
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	02/03/2023	07/04/2024	$26.892.938,30
	Prestaciones sociales	02/03/2023	07/04/2026	$13.446.469,15
	Estabilidad de la obra	07/04/2023	07/04/2028	$80.678.814,90
	Responsabilidad civil	05/12/2022	07/04/2023	$232.000.000,00

ADRIANA RODRIGUEZ MORA
Contratista

Anexos: Registro fotográfico.
Pagos seguridad social.

ANEXO FOTOGRAFICO

ITEM 1.3 Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, lavamanos quirúrgico, sanitario orinales etc.). Incluye taponamiento provisional de puntos hidráulicos y sanitarios, traslado hasta lugar de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, reinstalación, conexión a puntos hidráulicos y sanitarios, suministro de elementos de conexión, (sifones, accesorios, acoples) y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 1.4 Desmonte y reinstalación de mesas de necropsias. Incluye retiro hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto. Incluye taponamiento temporal de puntos hidráulicos y sanitarios, chazos expansivos de acero inoxidable 3/8" x

2", conexiones a puntos hidráulicos y sanitarios, elementos de conexión (sifones, canastillas de acero inoxidable, accesorios de PVC, tornillos) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.






ITEM 1.5 Desmonte y reinstalación de superficies de trabajo en acero inoxidable (1,20 m. x 0,60 m.). Incluye desmonte, traslado hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, elementos de instalación, tornillos, sellado de juntas y demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



ITEM 1.11 Desmonte y posterior reinstalación de lámparas de iluminación ubicadas en cielorraso. Incluye retiro hasta el sitio de depósito temporal dentro de la sede del Instituto.

ITEM 4.4 Construcción de red hidráulica en tubería PVC RDE 9, de ½". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento

ITEM 4.6 Suministro e instalación llave de jardín 1/2" x 3/4". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 4.7 Suministro e instalación de registro de corte hidráulico (Válvula de bola de 1/2 "), metálico tipo Grival. Incluye instalación en muro, conexiones, regata para instalación de tapa, tapa registro plástica 15 x 15 cm., cinta teflón, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.

ITEM 4.10 Punto sanitario de 4" (tapón de inspección roscado). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC, Tapón de inspección de aluminio tipo colregilla o similar, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. (Según diseño)

ITEM 6.1 Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 6.2 Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.







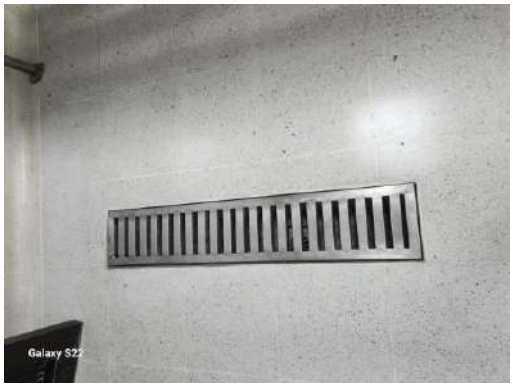


ITEM 6.3 Suministro e instalación de piso tablón de gres grafilado, color y tamaño igual al existente (para andén). Incluye dilataciones o franjas en granito lavado, de grano, medidas y color iguales a las existentes. Incluye material de pega, boquilla y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado. Se deben homologar las características del piso existente en apariencia e instalación.

ADRIANA RODRIGUEZ

ITEM 10.1 Suministro e instalación de rejilla metálica de 0,20 m. de ancho para cárcamo, en tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" x 1" y marco en ángulo de acero inoxidable en 1,1/4", con uñas de anclaje en el mismo material, incluye instalación de marco en placa de contrapiso, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 10.2 Suministro e instalación de marco para rejillas de cárcamos, de 40 cm. de ancho, en ángulo de acero inoxidable de 1,1/4" x 1,1/4" x 1/4", con uñas de anclaje, incluye nivelación y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.









ITEM 10.3 Suministro e instalación de protectores guarda camillas para áreas de circulación de la sala de necropsias: guarda camillas IPC. Ref 700, con estructura de soporte en aluminio completa y plástico de alto impacto y jumper interior para amortiguar golpes, dimensiones de 7 3/4" (197 mm) ancho x 1 " (25mm), color igual o similar a existente, anclaje de soporte de aluminio a muro, con chazos expansivos de 1,1/2" de largo x 5/8" mínimo 8 unidades por metro lineal y máximo cada 34 cm de distancia y con tornillo de 3/16". Incluye todos los

materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.

ITEM 10.4 Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 10.5 Suministro e instalación de tragante metálica - aluminio tipo cúpula de 5" x 3"para instalación en sifones de cárcamos. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 10.7 Suministro e instalación de esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x 2", espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos ¼, "tornillo avellanado 8X2". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM NP 03 Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline E=9 mm de altura y ancho lámina 30 cm incluye claraboyas de inspección de 60 x 60 en PVC con marco y contramarco en aluminio blanco cada 3 metros aproximadamente en los dos sentidos; se debe instalar seccionado en tramos no superiores a 3 metros. Incluye claraboyas de inspección, remates laterales, uniones y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. (Sala de necropsias y cuartos anexos)





ITEM NP 07 Suministro e instalación de Pintura Epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros interiores en zonas asépticas, de dos componentes (componente A, pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico, acabado semibrillante, tres manos, color blanco (área morgue y servicios anexos).

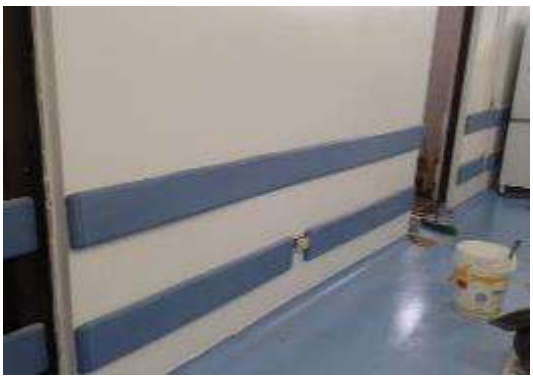








ITEM NP 14. Desmonte y reinstalación de guarda camillas. Existentes en pvc. Incluye todos los materiales, accesorios y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM NP 15 Desmonte y reinstalación de Muebles y Elementos anclados a muros o a piso (estantería metálica, gabinetes, mesas, puestos de trabajo) - Incluye embalaje y traslado a sitio de almacenamiento indicado por la Entidad.

ITEM NP 16 Construcción Canal Aguas Lluvias para dar continuidad al existente, en concreto 3000 psi, homologando características y espesores del elemento existente.

ITEM NP 17 Suministro e instalación Grifería Cuello de Ganso Sencilla para mesas de necropsias, incluye desmonte, elementos necesarios para su correcta instalación y disposición de sobrantes en sitio autorizado.

ITEM NP 20 Suministro e instalación de Granito Lavado para bordillo de 0,40x,0,30 m, en rampa de acceso a sede administrativa, incluye dilataciones plásticas cada 1,5 metros.

ITEM NP 22 Suministro e instalación de Registro de Corte Hidráulico, PVC 1", (Válvula Bola 1pulg PVC Soldar tipo pesada PCP) Incluye instalación en muro, conexiones, regatas para instalación de tapa, tapa registro plástica 20 x 20 cm, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.

ITEM NP 23 Conexión de Poceta de Mesa de Necropsias en tubería PVCS de 2" de diámetro, desmontable, incluye tubería PVCS hasta 2 ml, accesorios PVC, unión universal roscada, conexiones a sosco metálico existente, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución

ADRIANA RODRIGUEZ

ITEM NP 26 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Salida a 120V para tomacorriente GFCI empotrada, 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme, tapa protección Waterproff, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 31 Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Panel Led 60X60 40W, 6500K, 4226lm, IP65 montaje de incrustar o descolgar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).

ITEM NP 36 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, ángulos externo e internos, derivaciones, ángulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 37 Suministro e Instalación de Luminaria Led Hermética T8 2x18W IP65 cuerpo plástico reforzado y difusor en policarbonato, driver multivoltaje; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).

ITEM NP 38 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).









ITEM NP 39 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).





ITEM NP 40 Rejilla difusora 3 vias de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).

ITEM NP 47 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de Salida Para Toma Especial alimentación marmita 50A 250V empotrada, circuito dedicado; (incluye descableado y cableado en cable 3x10 +12 AWG LSZH, caja 2400 doble fondo, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 48 Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).

ITEM NP 53 Suministro e instalación de conexión de Manguera de ½" súper reforzada 4 capas truper con refuerzo de tramado radial, con llave de regulación de 1/2 x 1/2 " cierre rápido y conector rápido para manguera de 1/2" plástico para mesas de necropsias, incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación.





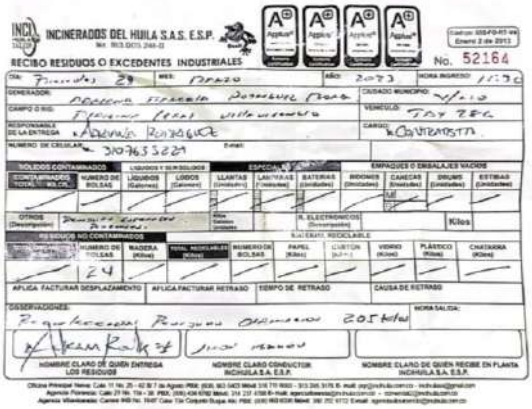




MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS





INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.
RECIBO RESIDUOS O EXCEDENTES INDUSTRIALES
No. 52164

ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES

AR
ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

8. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

MANEJO AGUAS LLUVIAS: En la zona perimetral de las instalaciones intervenidas se observa un avanzado estado de deterioro de los canales aguas lluvias, sin pendiente, lo cual permite el apozamiento de aguas lluvias contribuyendo a la humedad interna, así como el deterioro y/o ausencia de la boquilla del tablón externo, situación que agrava la humedad en las instalaciones; la facheleta de muros tampoco cuenta con boquilla a esto sumado el mal estado de la estructura en pvc del cielo raso de ingreso a la zona de recepción que permite el paso del agua la cual cae directamente en muros, reflejando la humedad en paredes internas.

Se recomienda a la entidad realizar el mejoramiento del canal perimetral, el cual debe contar con las pendientes correctas para su desagüe final, así como la reposición del tablón el cual esta bastante desgastado por el paso del tiempo o en su defecto rectificación de boquilla con el fin de evitar el ingreso de agua lluvia.

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: Se recomienda a la entidad realizar el almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a las indicaciones reglamentarias con el fin de evitar el contacto de estas con el tablón instalado y muros y así prolongar la vida útil de los mejoramientos realizados, ya que previo al inicio de actividades se pudo observar la corrosión del piso existente y muros.

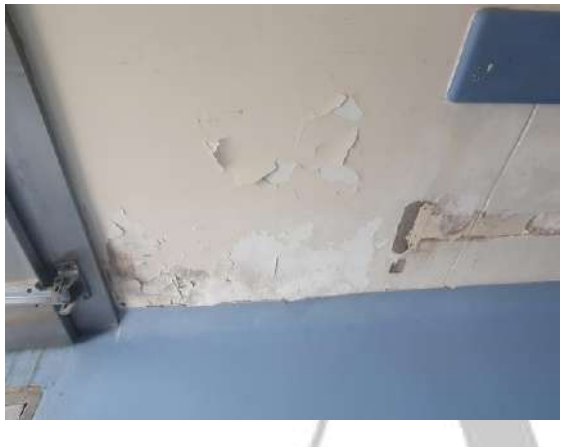








CUARTOS FRIOS: Se recomienda a la entidad realizar el aislamiento correcto de los cuartos fríos con muros así como el manteamiento periódico de los mismos, ya que esto afecta directamente el estado de muros, generando mayor presencia de humedad en paredes que colindan con estas zonas.

AR
INGENIERIA

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-09, 01:17:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
CEDULA CIUDADANIA	CC 40326186
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053854075
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071529565
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 252.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 86.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 43.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 10.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 10.900	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	$ 10.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 56.700	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	3	$ 32.700	$ 0
		SubTotales:		$ 252.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 252.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-09, 01:20:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
CEDULA CIUDADANIA	CC 40326186
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053870925
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071537481
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 18.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 18.900	$ 0
		SubTotales:		$ 18.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 18.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-05, 08:43:42 PM **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1053870915

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-04-05 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79531057		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					NIVIA PEÑA JOSE LUIS	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	0	0	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-23, 09:12:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1054932931

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 23/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LUIS NIVIA PEÑA		
Documento	CC79531057	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 70
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6606060
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79531057	JOSE LUIS NIVIA PEÑA	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 14.000	$ 344.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!
