INFORME NO. 2 DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 0221800026367 DE DICIEMBRE DE 2022

En calidad de contratista de obra designado mediante contrato No. 0221800026367 de diciembre de 2022, se presenta a continuación el ***"INFORME No. 2"***, del contrato de obra pública No. 0221800026367 de diciembre de 2022.

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato
2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato
3.) Concepto sobre la ejecución del contrato
4.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas
5.) Informe financiero
6.) Actividades de Obra
7.) Actividades sociales
8.) Actividades de salud y seguridad en el trabajo

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Información General del contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
NIT Y/O CEDULA:	901.529.039
VALOR:	*CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($413,208,205,00)*
OBJETO:	OBRAS DE REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS BARRIOS URBANIZACION YANACONAS, SAN FRANCISCO, VILLA ELENA Y MOSCOPAN DE LA CIUDAD DE POPAYÁN
PLAZO INICIAL:	*CUATRO (4) MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN	*24 DE MAYO DE 2023*

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

1.2) Información Específica del contrato


FECHA	EVENTO	ACLARACIÓN AL EVENTO
22/12/2022	Firma del contrato	Se suscribe el contrato de obra por las partes
24/01/2023	Acta de inicio	Se suscribe el acta de inicio por las partes
16/02/2023	Acta parcial No. 1	Se suscribe el acta parcial de obra No. 1 por las partes

Nota:*(En esta tabla se debe describir cronológicamente todas las actuaciones, oficios relacionados con el contrato, adicionales, otro si, etc., iniciando el cuadro con la firma del contrato y finalizando con el acta de liquidación.)*

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato

2.1.) Registro Fotográfico

OBRA No. 3 REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A.

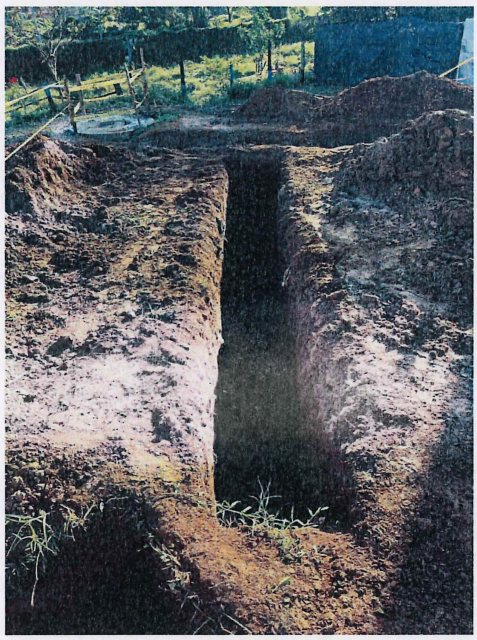FOTO	***FOTO***
	
Descripción: Excavaciones	Descripción: Excavaciones

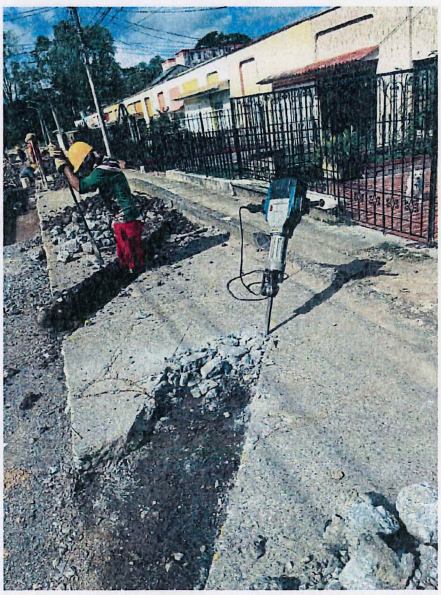
GREMSAD
NIT:901.529.039-7

FOTO	FOTO
	
Descripción: Fundición recamara de inspección	Descripción: Relleno con material importado
FOTO	**FOTO**
	
Descripción: Construcción de cajas de inspección	Descripción: Acero de refuerzo para cajas de inspección

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

FOTO	***FOTO***
	
Descripción: Nivelación del terreno con maquina	Descripción: Suministro, riego y compactación de material de mejoramiento

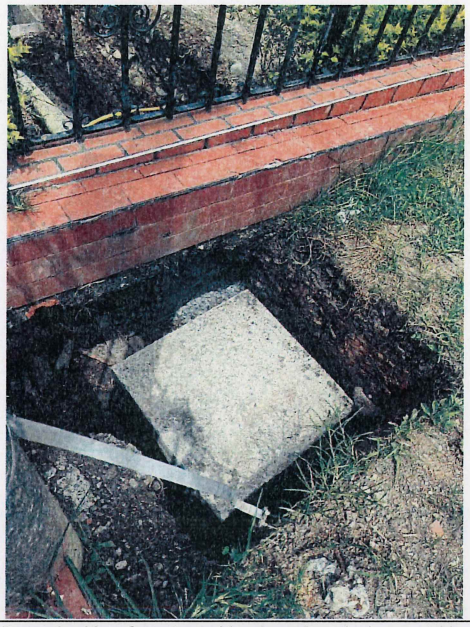
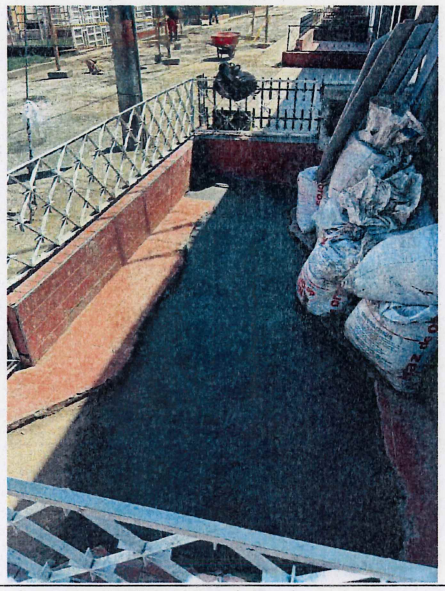
OBRA No. 4: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 3AE DESDE LA CALLE 11 HACIA LA CALLE 11A. BARRIO MOSCOPAN

FOTO	***FOTO***
	
Descripción: Demolición de pavimento rígido	Descripción: Demolición de sumideros

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

FOTO	FOTO
	
Descripción: Excavaciones de las domiciliarias	Descripción: Instalación de tubería para sumideros
FOTO	**FOTO**
	
Descripción: Construcción de sumideros dobles	Descripción: Construcción de sumideros dobles

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

FOTO 	***FOTO*** 
Descripción: Construcción de cajas de inspección	Descripción: Construcción de cajas de inspección
FOTO 	***FOTO*** 
Descripción: Reposición de andenes	Descripción: Suministro e instalación de base estabilizada con cemento

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

3.) Concepto sobre la ejecución del contrato

La ejecución del contrato se desarrolló dentro de los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas y según las exigencias de la supervisión.

4.) Concepto sobre los materiales empleados, y, de normas técnicas de calidad

La ejecución del contrato en cuanto a materiales se desarrolló dentro de los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas y según las exigencias de la supervisión.

5.) Informe financiero

ACTAS	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 413,208,205.00
ACTA No. 1	$ 140,809,315.00
ACTA No. 2	$ 103,810,997.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 168,587,895.00

6.) Actividades de obra

Se realizó el recorrido inicial con el personal de la supervisión a los frentes a intervenir. Se dio inicio a las actividades de obra según el método constructivo especificado para este tipo de obras. Se siguieron los lineamientos establecidos por la supervisión.

7.) Actividades sociales

El componente social está dirigido a la relación e interacción con la comunidad encaminada a mitigar los impactos negativos generados durante la ejecución de dichos proyectos. El profesional social está encargado de la supervisión en el cumplimiento de los proyectos de divulgación de información dirigidos a la comunidad aledaña a la zona de influencia directa de los proyectos.

Es importante mencionar que se sostiene contacto directo con los profesionales del área social de la supervisión, con el fin de esclarecer dudas e inquietudes presentes en dicho proceso. La interventoría inculca a los profesionales sociales, se articule y se sostenga comunicación permanente con los líderes sociales de las AID con el fin de dar tranquilidad y veracidad en la ejecución de dichas obras. Finalmente, estas actividades ejecutadas por el contratista de obra y supervisadas por la interventoría están puesta en conocimiento de la entidad contratante.

8.) Actividades de salud y seguridad en el trabajo

El personal SST se encarga de supervisar que las diferentes actividades realizadas garanticen seguridad y protección al personal directa e indirectamente involucrado en el

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

desarrollo del proyecto.

Se firma el presente informe, a los _____días del mes de _____de _____ (año)

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

_____

Firma

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
R/L: DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ

Proyectó: Laura Valenciano / GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
