FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CARRERA 13 CON CALLE 62 COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	CANTIDAD DE VARILLAS	DIAMETRO(m)	LONGITUD(m)	ESPESOR (m)	PESO(Kg)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	PAÑO 1 CALLE 62	KG	55	#4	1,20		66,00	66,00	
				10	#4	6,00		60,00	60,00	
				5	#4	4,25		21,30	21,30	
				10	#4	1,00		10,00	10,00	
		PAÑO 2 CALLE 62		47	#4	1,80		84,60	84,60	
				14	#4	6,00		84,00	84,00	
				7	#4	1,80		12,60	12,60	
				14	#4	1,00		14,00	14,00	
		PAÑO 3 CALLE 62		46	#4	2,35		108,10	108,10	
				18	#4	6,00		108,00	108,00	
				9	#4	1,60		14,40	14,40	
				18	#4	1,00		18,00	18,00	
		PAÑO 4 CALLE 62		10	#4	6,00		60,00	60,00	
				5	#4	1,60		8,00	8,00	
				46	#4	1,20		55,20	55,20	
				10	#4	1,00		10,00	10,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**734,20**	**KG**

971

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

24
31

G&T
EMPRESAS DE ACERO

BOGOTA
CHAPINERO
ELEMENTO POR ELEMENTO

PAÑO 1 CALLE 62 (Es 1) Peso/Elemento= 157.25Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.20	55	#4	1.20	66.0	
6.00	10	#4	6.00	60.0	
4.25	5	#4	4.25	21.3	
1.00	10	#4	1.00	10.0	

PAÑO 2 CALLE 62 (Es 1) Peso/Elemento= 195.20Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.80	47	#4	1.80	84.6	
6.00	14	#4	6.00	84.0	
1.80	7	#4	1.80	12.6	
1.00	14	#4	1.00	14.0	

PAÑO 3 CALLE 62 (Es 1) Peso/Elemento= 248.50Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
2.35	46	#4	2.35	108.1	
6.00	18	#4	6.00	108.0	
1.60	9	#4	1.60	14.4	
1.00	18	#4	1.00	18.0	

PAÑO 4 CALLE 62 (Es 1) Peso/Elemento= 133.20Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
6.00	10	#4	6.00	60.0	
1.60	5	#4	1.60	8.0	
1.20	46	#4	1.20	55.2	
1.00	10	#4	1.00	10.0	

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

974

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,1	Demolicion pisos de concreto (espesor variable. incluye cargue	BAHIA	M2			348,00				348,00	
		ACCESO Y ANDEN		6,16	3	18,48				18,48	
		ANDEN		2,5	1,6	4,00				4,00	
		TOTAL ACUMULADO				370,48				370,48	
		ACUMULADO ANTERIOR				-386,24				-386,24	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**-15,76**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA




OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

27

34

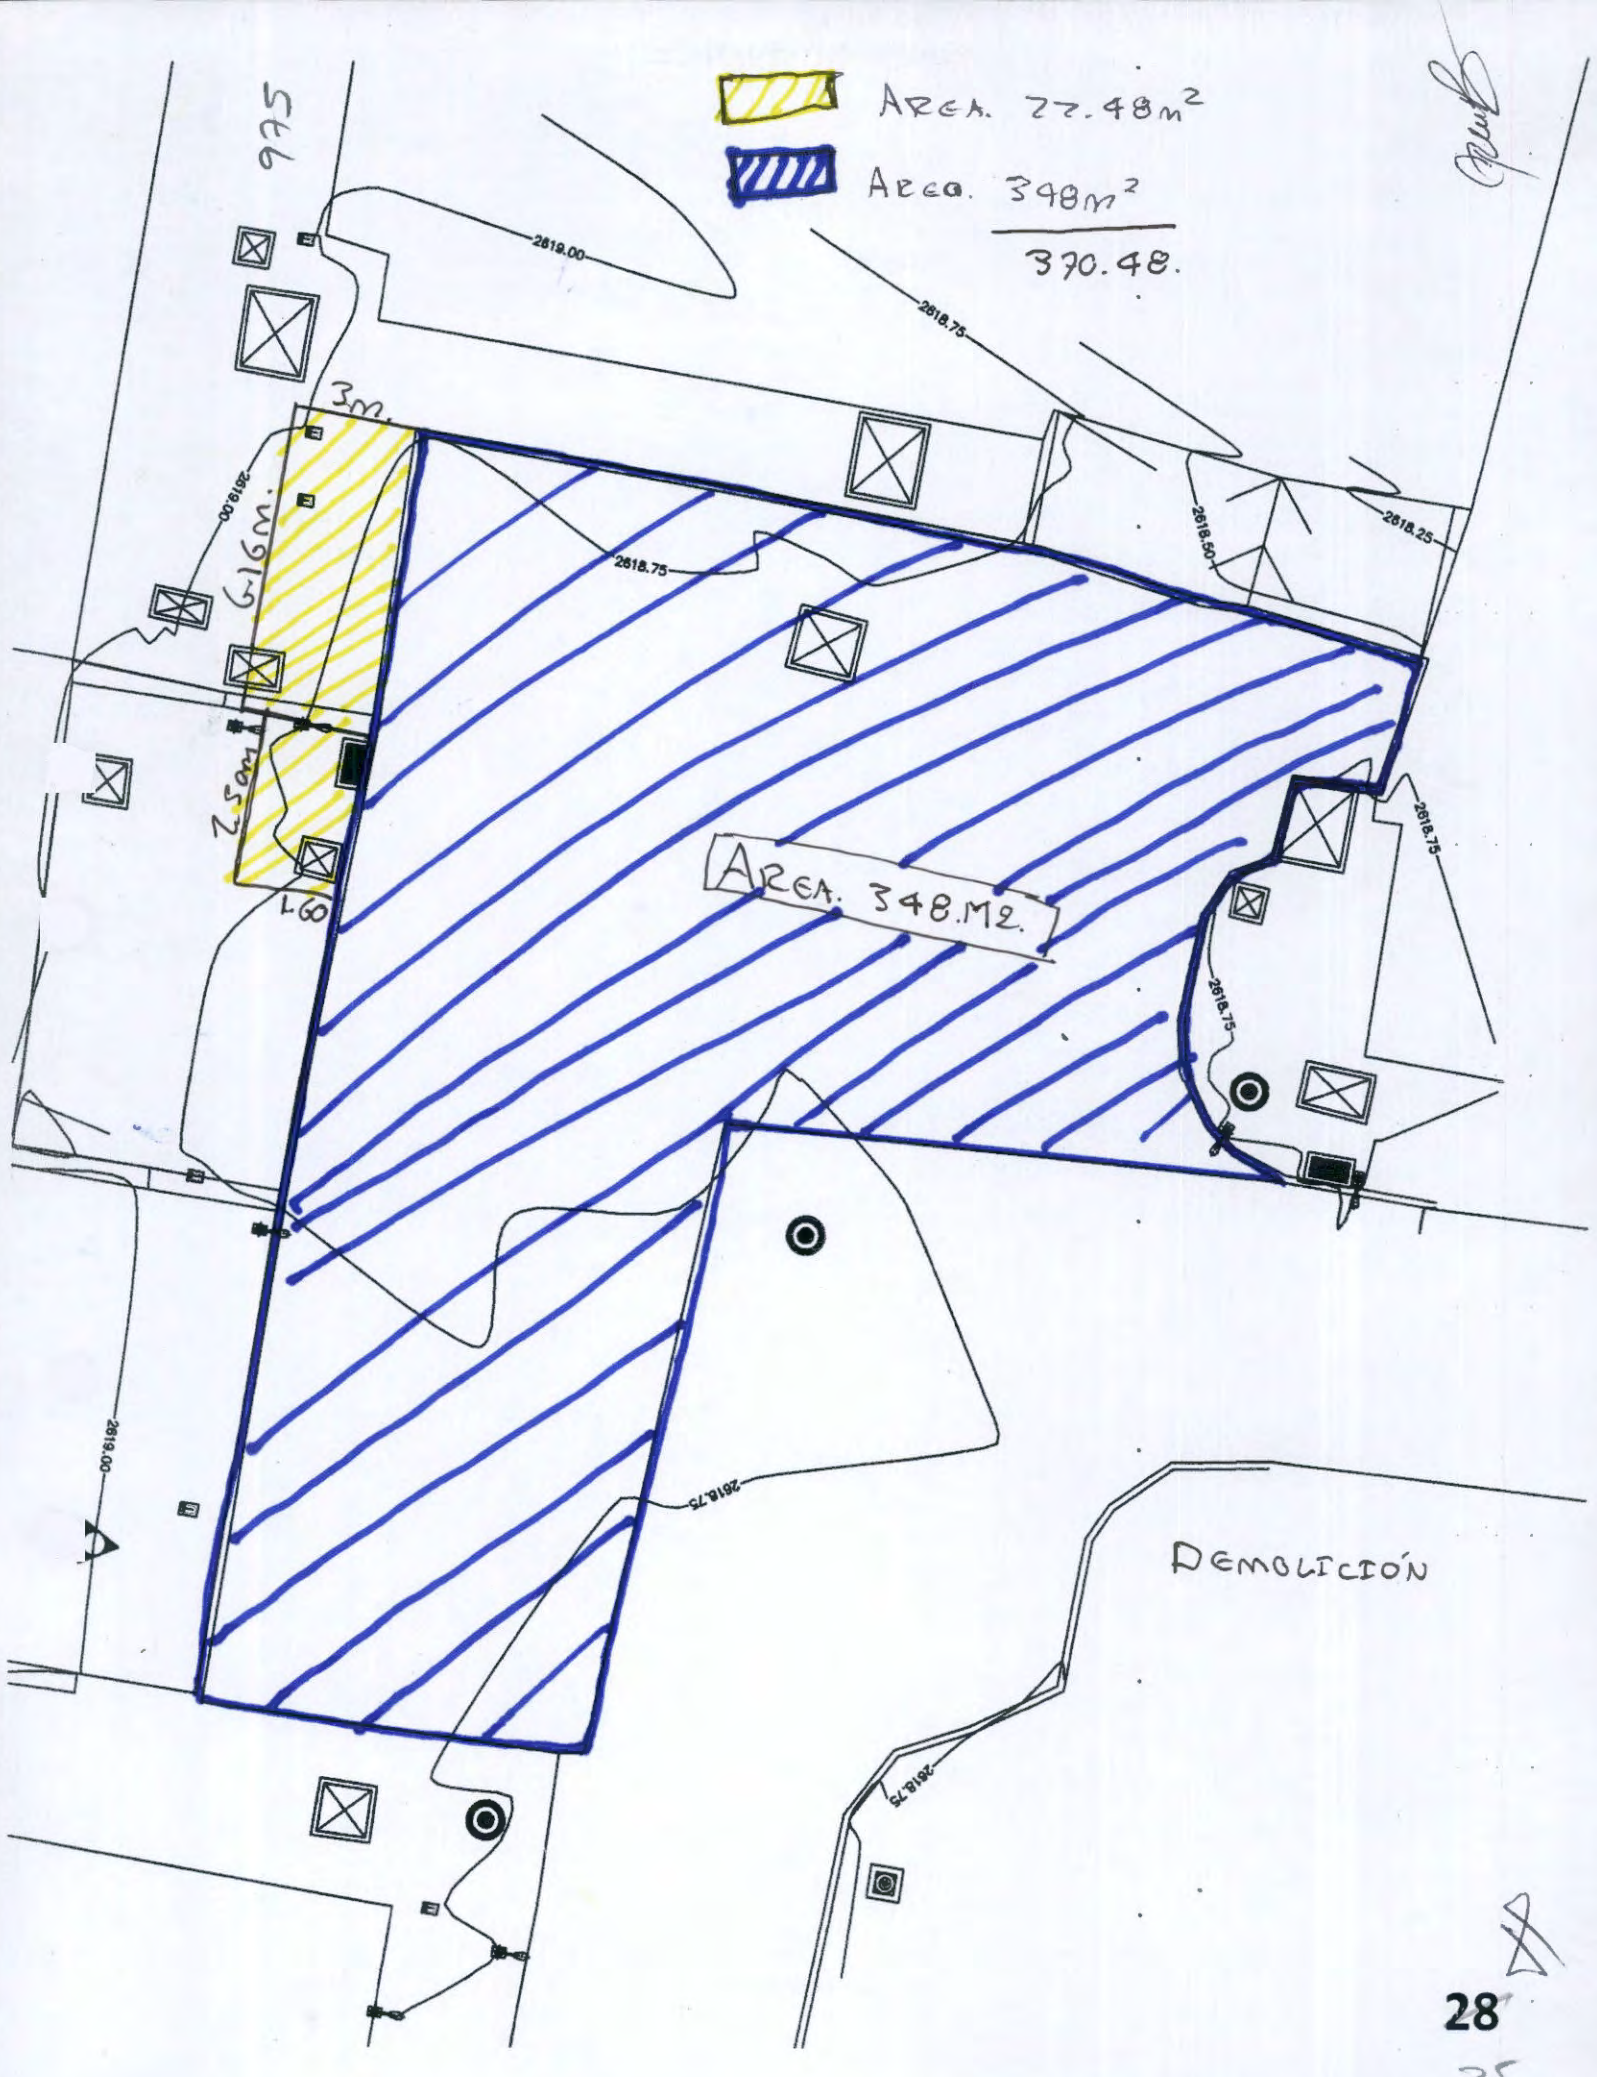
AREA. 22.48m²
AREA. 348m²
370.48.
925
2619.00
2618.75
3m.
6.16m.
2.50m.
LG
2618.50
2618.25
AREA. 348.M2.
DEMOLICIÓN

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

976

OBRA : CONTRATO No. 166 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 64 A CON CARRERA 8 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)		TOTAL	OBSERVACIONES
1,2	Excavacion manual en material comun	BAHIA	M3			348,00	0,38	132,24		132,24	
		SARDINELES Y BORDILLOS		22,4	0,3	6,72	0,3	2,02		2,02	
		ACCESO Y ANDEN		8	3	24,00	0,35	8,40		8,40	
		ANDEN		2,5	1,6	4,00	0,15	0,60		0,60	
		TUB -DOMICILIARIAS		9,7	0,6	5,82	0,7	4,07		4,07	
		TUB POZO A POZO		13,3	0,6	7,98	1,5	11,97		11,97	
		TUB CAJA A POZO		14,5	0,70	10,10	1,6	16,15		16,15	
		TUB SUMIDERO A POZO		14	0,7	9,80	1,6	15,68		15,68	
		CAMBIOS DE TUBERIAS		16	0,60	9,60	0,70	6,72		6,72	
		ACUMULADO ANTERIOR				-135,18				-135,18	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**62,67**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA






OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

29

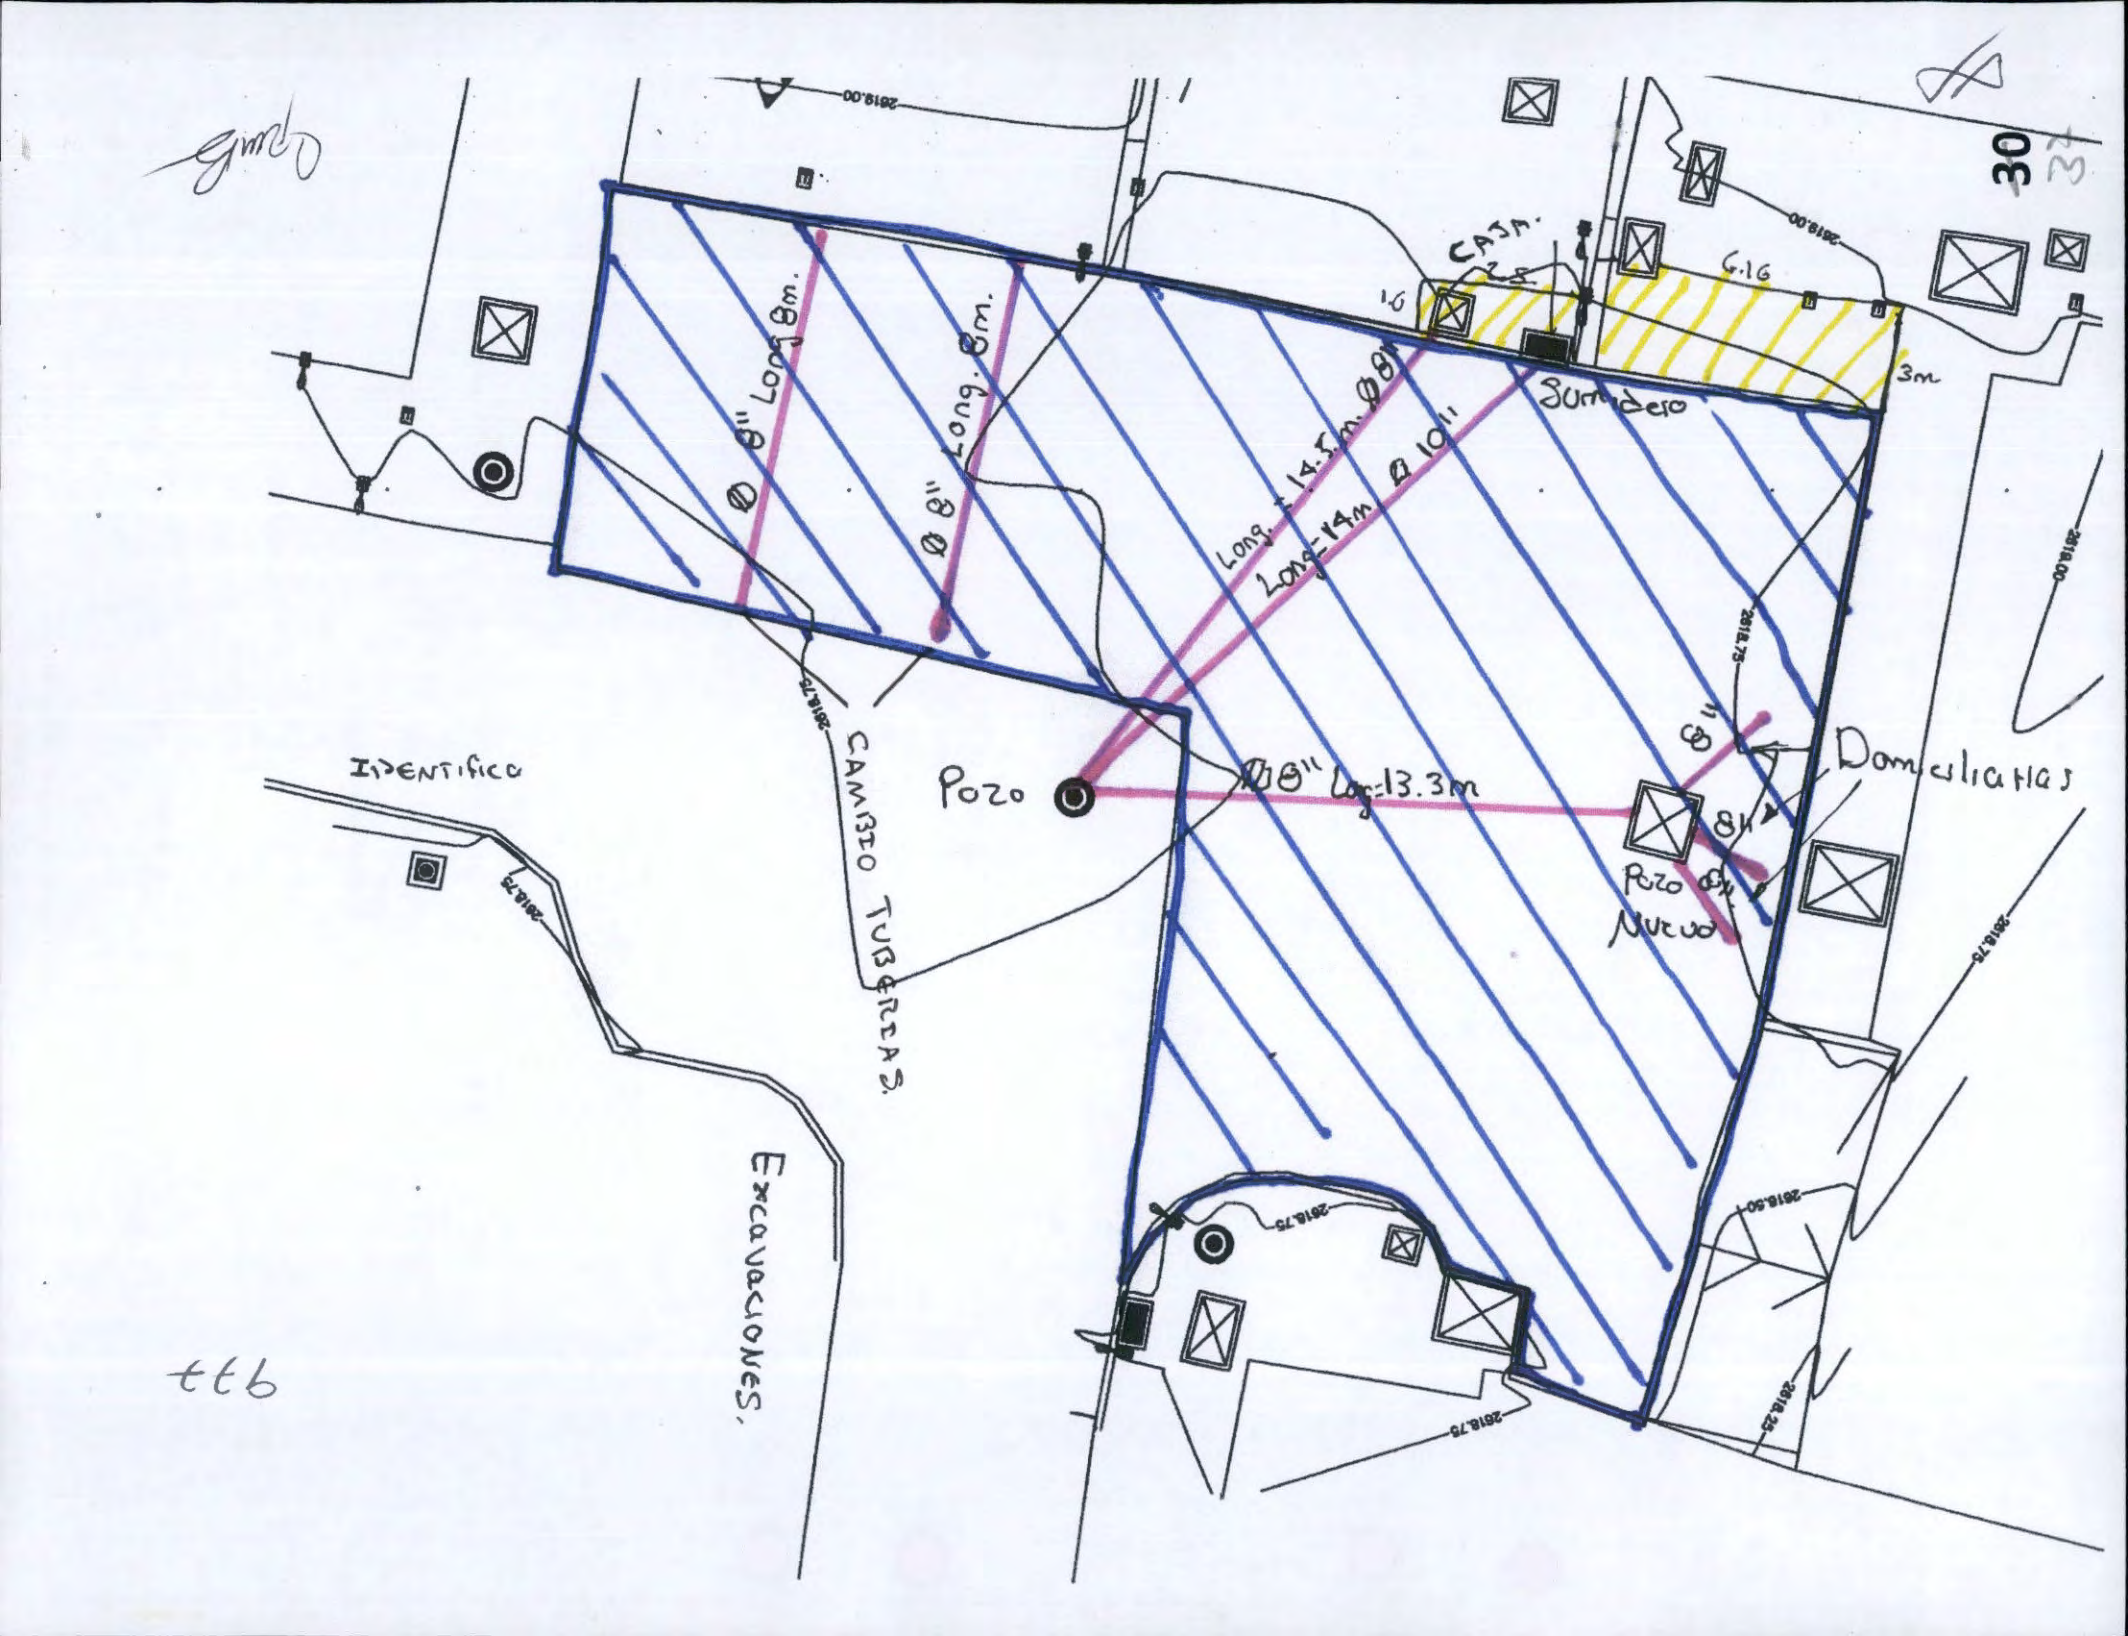
30
CASA.
6.16
3m
Bombeo
Long. 8m.
Long. 8m.
Long. ± 14.5m. Ø 8"
Long=14m Ø 10"
Pozo
Ø8" Long=13.3m
Pozo en Nucvo
Domiciliarias
CAMBIO TUBERIAS.
IDENTIFICO
EXCAVACIONES.
2818.00
2818.75
2818.50
2818.25

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

778

OBRA : CONTRATO No. 186 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,10	Sardinel bajo a85 para rampas (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	ACCESO VEHICULAR K0+00 A K0 +480	ML	4,8						4,80	
		ACCESO VEHICULAR		4,8						4,80	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**9,60**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

32

2819.00
2818.75
Acceso V.
A85.= 9.9m
2818.75
2818.50
2818.25
Pozo Nuevo.
Sumidero Nuevo
Caja. Nueva.
A10= 5.10m.
2818.75
2818.75
Acceso V.
A85.= 4.8 m.
2819.00
2818.75
A10= 7.70m.
2818.75

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

980

OBRA : CONTRATO No. 166 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 64 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,11	Sardinel tipo a10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	SARDINEL	ML	12,8						12,80	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**12,80**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

40

33

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	FACTOR DE EXPANSION	TOTAL	OBSERVACIONES
2,3	Transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 24 km)	BAHIA EXCAVACION				348,00	0,39	132,24	1,25	165,30	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		SARDINELES Y BORDILLOS		22,4	0,3	6,72	0,3	2,02	1,25	2,52	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		ACCESO Y ANDEN		8	3	24,00	0,35	8,40	1,25	10,50	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		ANDEN		2,5	1,6	4,00	0,15	0,60	1,25	0,75	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		TUB -DOMICILIARIAS		9,7	0,6	5,82	0,7	4,07	1,25	5,09	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		TUB POZO A POZO		13,3	0,6	7,98	1,5	11,97	1,25	14,96	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		TUB CAJA A POZO		14,5	0,70	10,10	1,6	16,15	1,25	20,19	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		TUB SUMIDERO A POZO		14	0,7	9,80	1,6	15,68	1,25	19,60	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		CAMBIOS DE TUBERIAS		16	0,60	9,60	0,70	6,72	1,25	8,40	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		DEMOLICION SUMIDERO		1,2	0,40	0,48	1,40	0,67	1,25	0,84	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		DEMOLICION POZO		1,6	0,40	0,64	1,20	0,77	1,25	0,96	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		DEMOLICION CAJA		1	0,40	0,40	1,40	0,56	1,25	0,70	Excavacion manual en material comun (ITEM 1,2)
		DEMOLICION DE PISOS BAHIA				348,00	0,10	34,80	1,25	43,50	Demolicion de pisos en concreto (ITEM 1,1)
		DEMOLICION DE PISOS ACCESO Y ANDEN		6,16	3	18,48	0,10	1,85	1,25	2,31	Demolicion de pisos en concreto (ITEM 1,1)
		DEMOLICION DE PISOS ANDEN		2,5	1,6	4,00	- 0,10	0,40	1,25	0,50	Demolicion de pisos en concreto (ITEM 1,1)
		VALOR PAGADO						-225,95		-225,95	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**70,18**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

981

41

34

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

982

OBRA : CONTRATO No. 168 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
2,9	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	POZO NUEVO	UN						1	1,00	PLACA POZO DE INSPECCION
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**1,00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

35
42

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

983

OBRA : CONTRATO No. 180 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
2,17	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Sum. e Instal.)	POZO A POZO	ML	13,1						13,10	
		CAJA A POZO		14,1						14,10	
		DOMICILIARIA		5,2						5,20	
		DOMICILIARIA		1,7						1,70	
		DOMICILIARIA		2,8						2,80	
		DOMICILIARIA		7,8						7,80	
		DOMICILIARIA		8						8,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**52,70**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA




OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

36

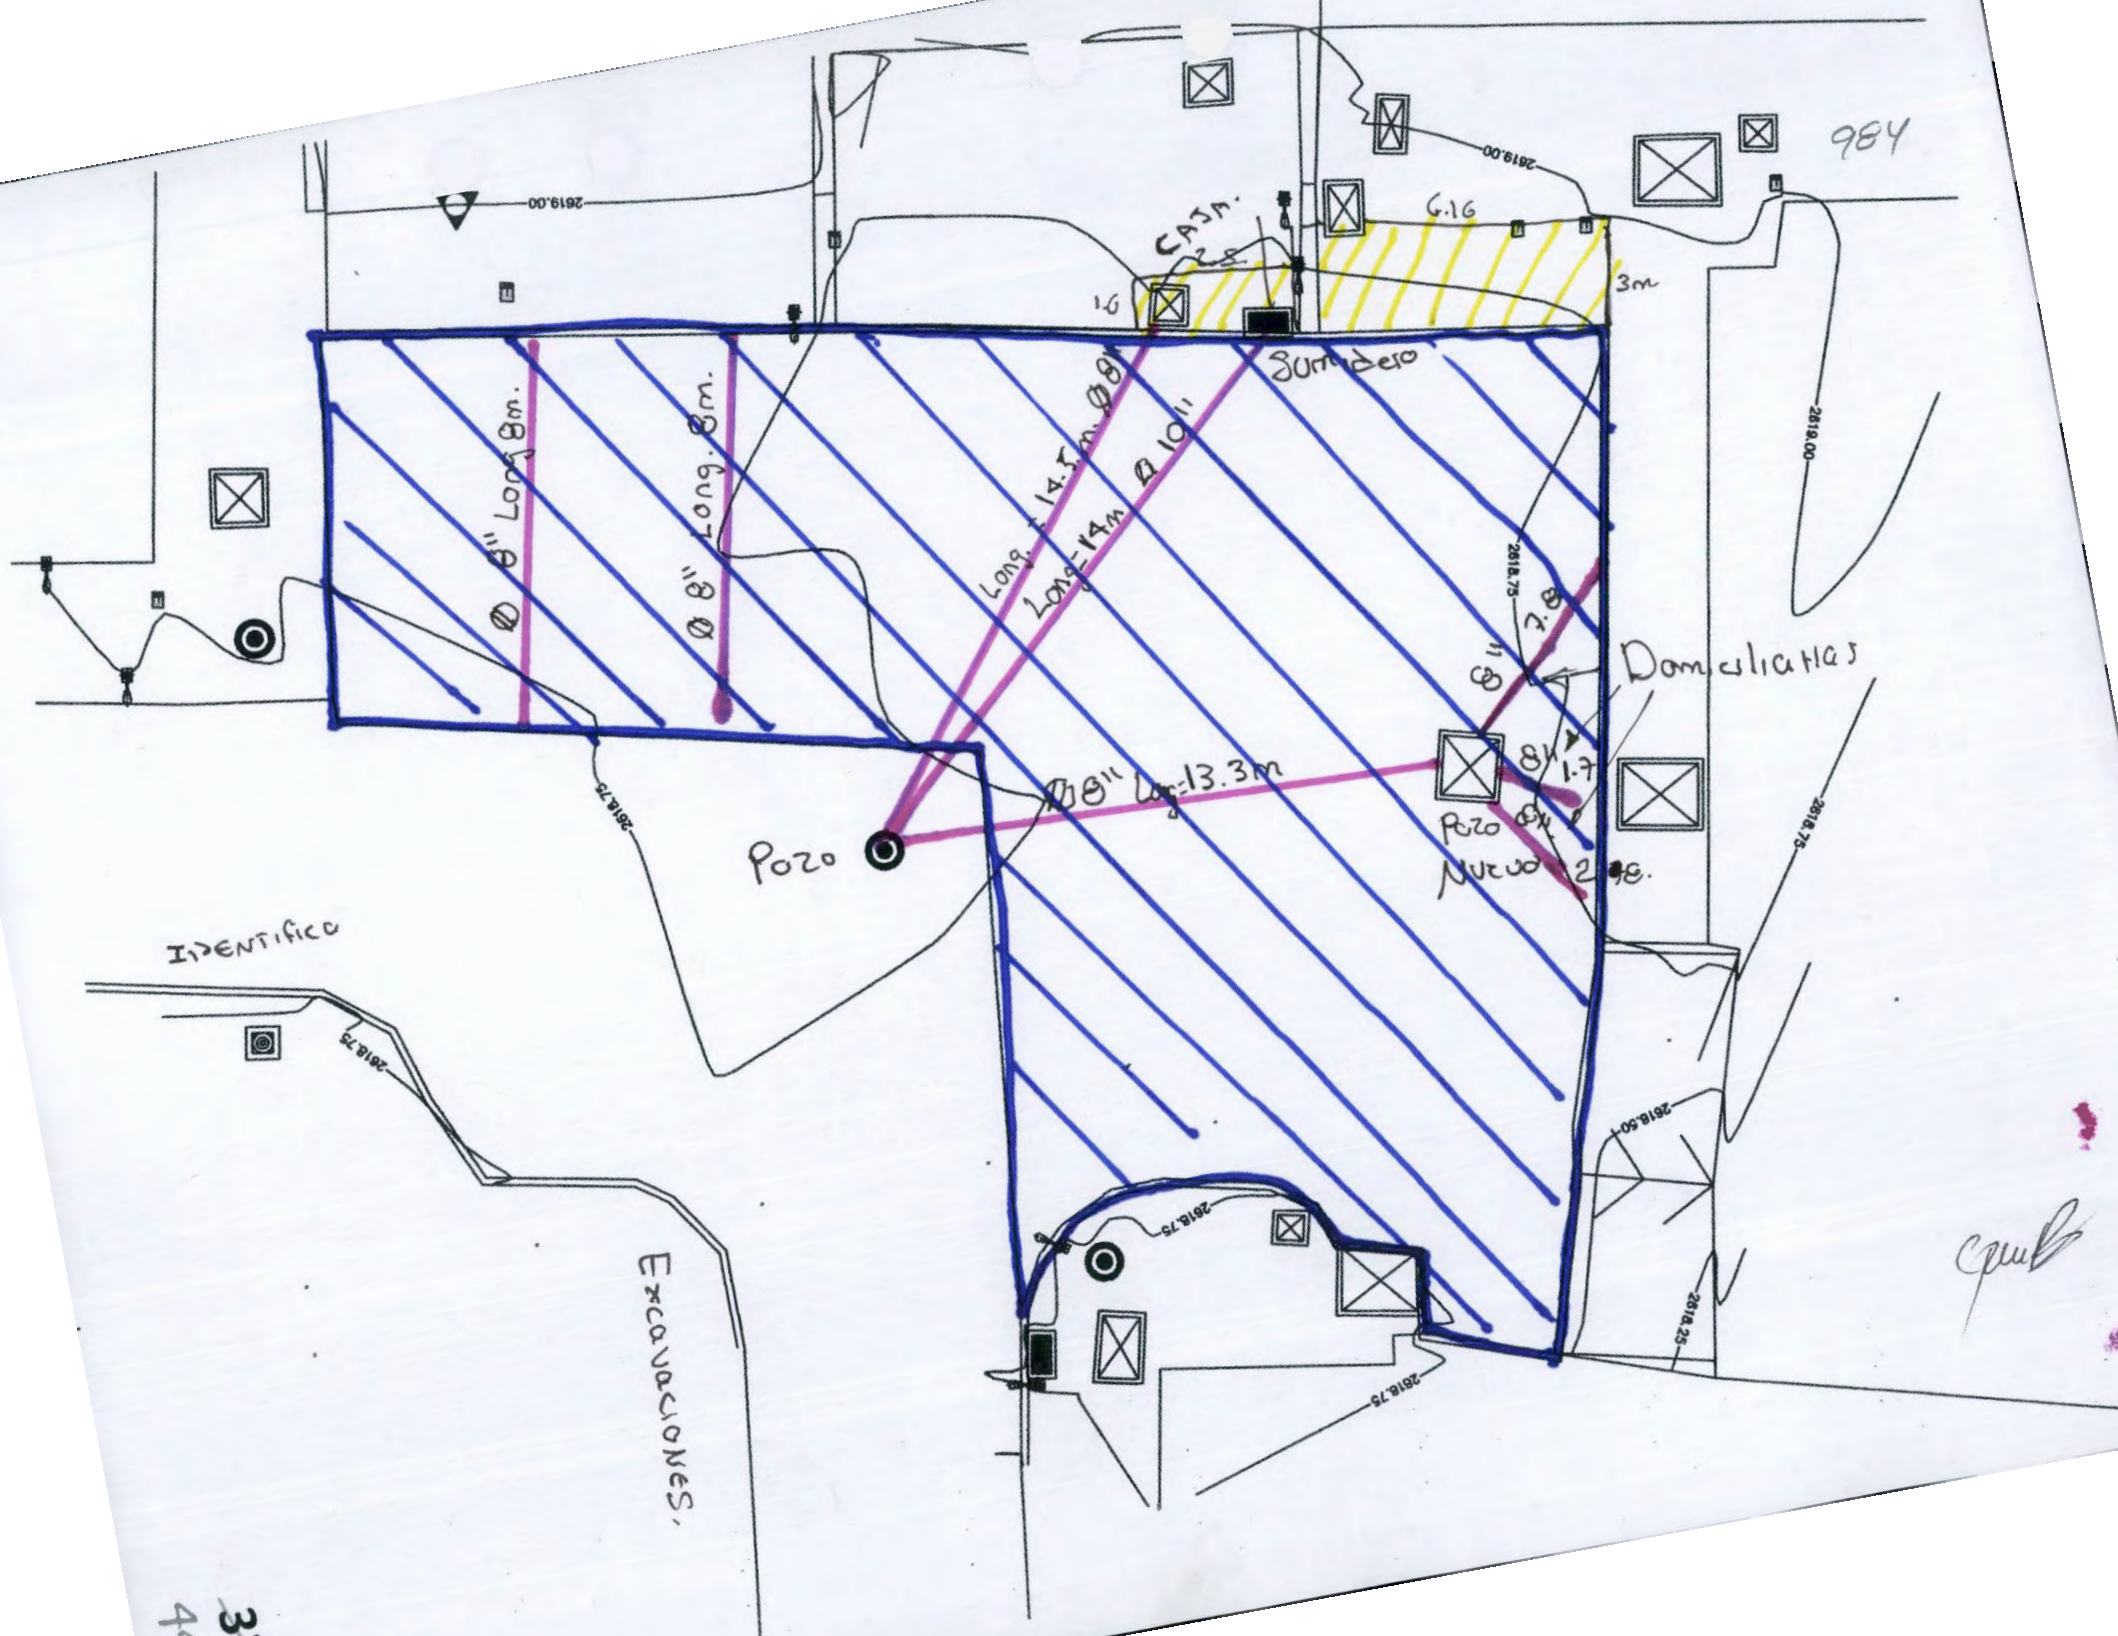
964
CASA
6.16
3m
1.6
Sumidero
Ø 8" Long 8m.
Ø 8" Long 8m.
Long=14.5m Ø 8"
Long=14m Ø 10"
Ø 8" Long=13.3m
Pozo
Pozo Nuevo
Ø 8" Long 2.8m
8"
1.7
Domiciliarias
IDENTIFICO
Excavaciones.
2619.00
2618.75
2618.50
2618.25

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

985

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
2,18	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Sumin. e Instal.)	SUMIDERO A POZO	ML	14						14,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**14,00**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

38

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

986

OBRA : CONTRATO No. 188 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	CANTIDAD VARILLAS	DIAMETRO	LONGITUD(m)	PESO(kg)			TOTAL	OBSERVACIONES
NP-4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	PLACA BAHIA 8 X 3,5	KG	8	#4	1,70	13,6			13,60	
				13	#4	6,00	78			78,00	
				27	#4	3,50	94,5			94,50	
				5	#4	3,00	15			15,00	
		ACCESO VEHICULAR		11	#4	6,00	66			66,00	
				21	#4	3,00	63			63,00	
		DESCUENTO POZO		11	#4	1,60	-17,6			-17,60	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										312,50	KG

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

39
46

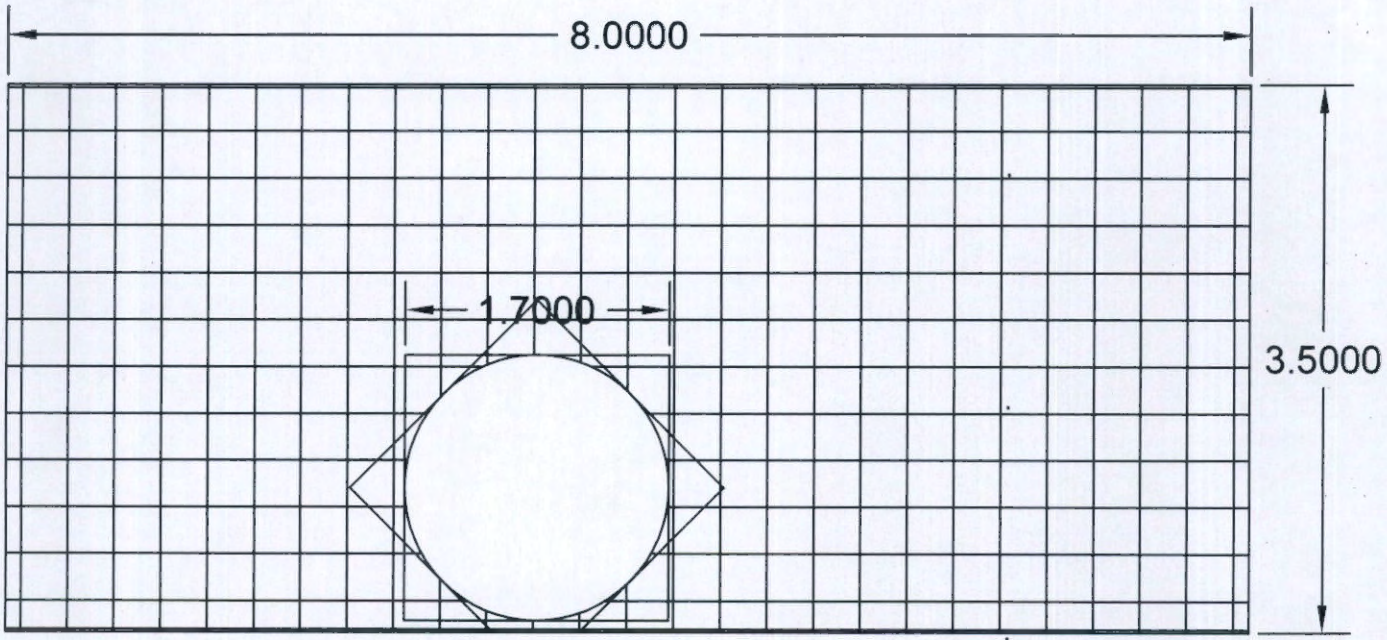
8.0000
1.7000
3.5000

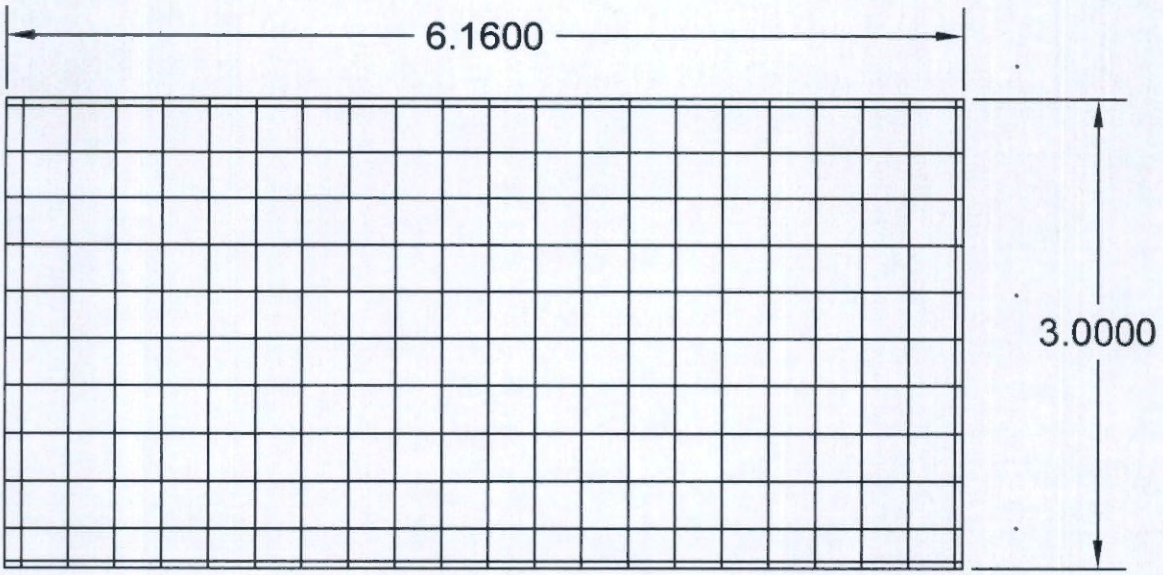
6.1600
3.0000

BOGOTA
CHAPINERO
ELEMENTO POR ELEMENTO

PLACA BAHIA - REFUERZO DE ZONA POZO (Es 1) Peso/Elemento= 201.10Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.70	8	#4	1.70	13.6	
6.00	13	#4	6.00	78.0	
3.50	27	#4	3.50	94.5	
3.00	5	#4	3.00	15.0	

ACCESO VEHICULAR (Es 1) Peso/Elemento= 129.00Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
6.00	11	#4	6.00	66.0	
3.00	21	#4	3.00	63.0	

DESCUENTO POZO (Es 1) Peso/Elemento= 17.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.60	11	#4	1.60	17.6	

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 186 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

989

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 84 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	FACTOR	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-5	PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.20m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	PLACA BAHIA	M2	8	3,5	28,00	0,75			21,00	
		ACCESO A EDIFICIO		6,16	3	18,48	0,75			13,86	
		ACCESO A EDIFICIO		2,5	1,6	4,00	0,75			3,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**37,86**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA






OBSERVACIONES


ESTE ITEM SE COBRA AL 75% YA QUE EL VALOR CONTRATADO ES CON UN ESPESOR e=0.20m Y ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON UN ESPESOR e=0.15m
POR LO TANTO LA RELACION DE ESPESORES 15/20 ARROJA UN FACTOR DE 0.75 QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD EJECUTADA EN ESTA ACTIVIDAD


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

42

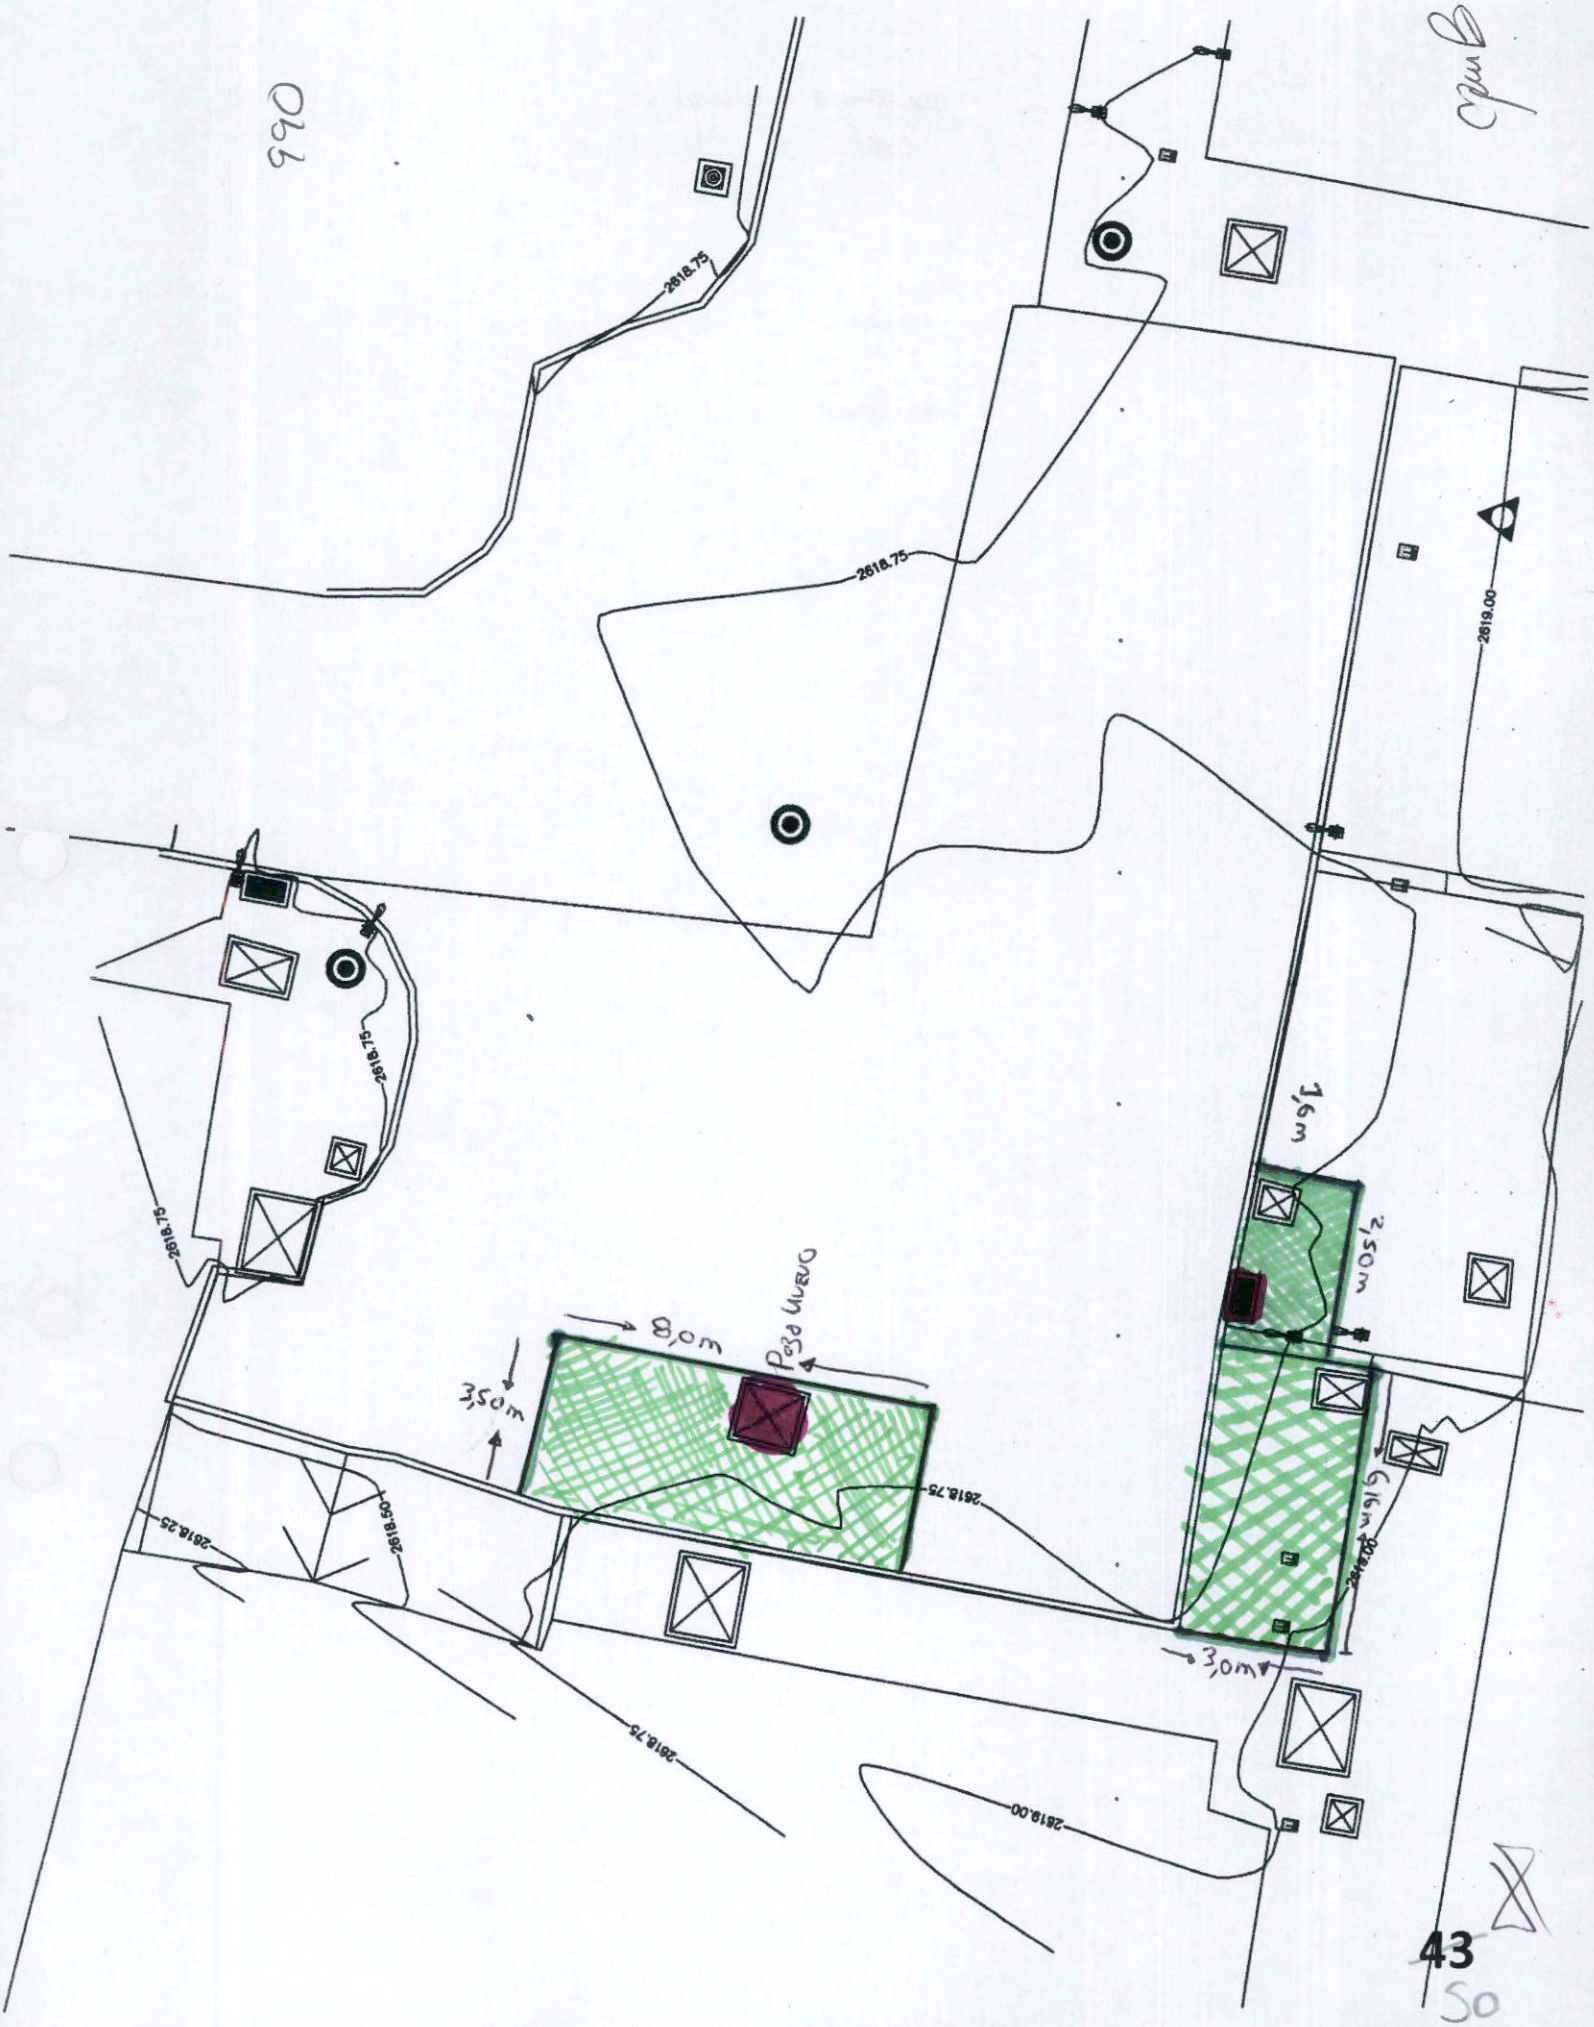
2618.75
2619.00
2618.75
2618.75
2618.75
2618.25
2618.00
2618.75
2618.00
8,0m
Poço Urbano
3,50m
1,6m
1,50m
6,6m
3,0m





FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

991

OBRA : CONTRATO No. 169 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 64 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
		BAHIA				348,30				348,30	
		ANDEN		6,16	3	18,48				18,48	
		ANDEN		2,5	1,6	4,00				4,00	
NP-6	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)		M2								
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**370,78**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

AREA GENERAL DE LA BAHIA

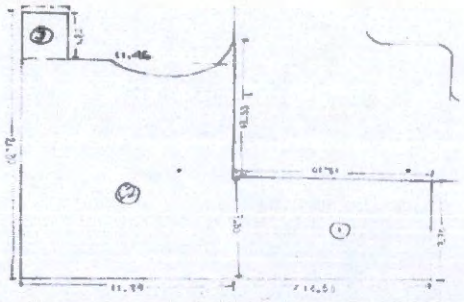




OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

44

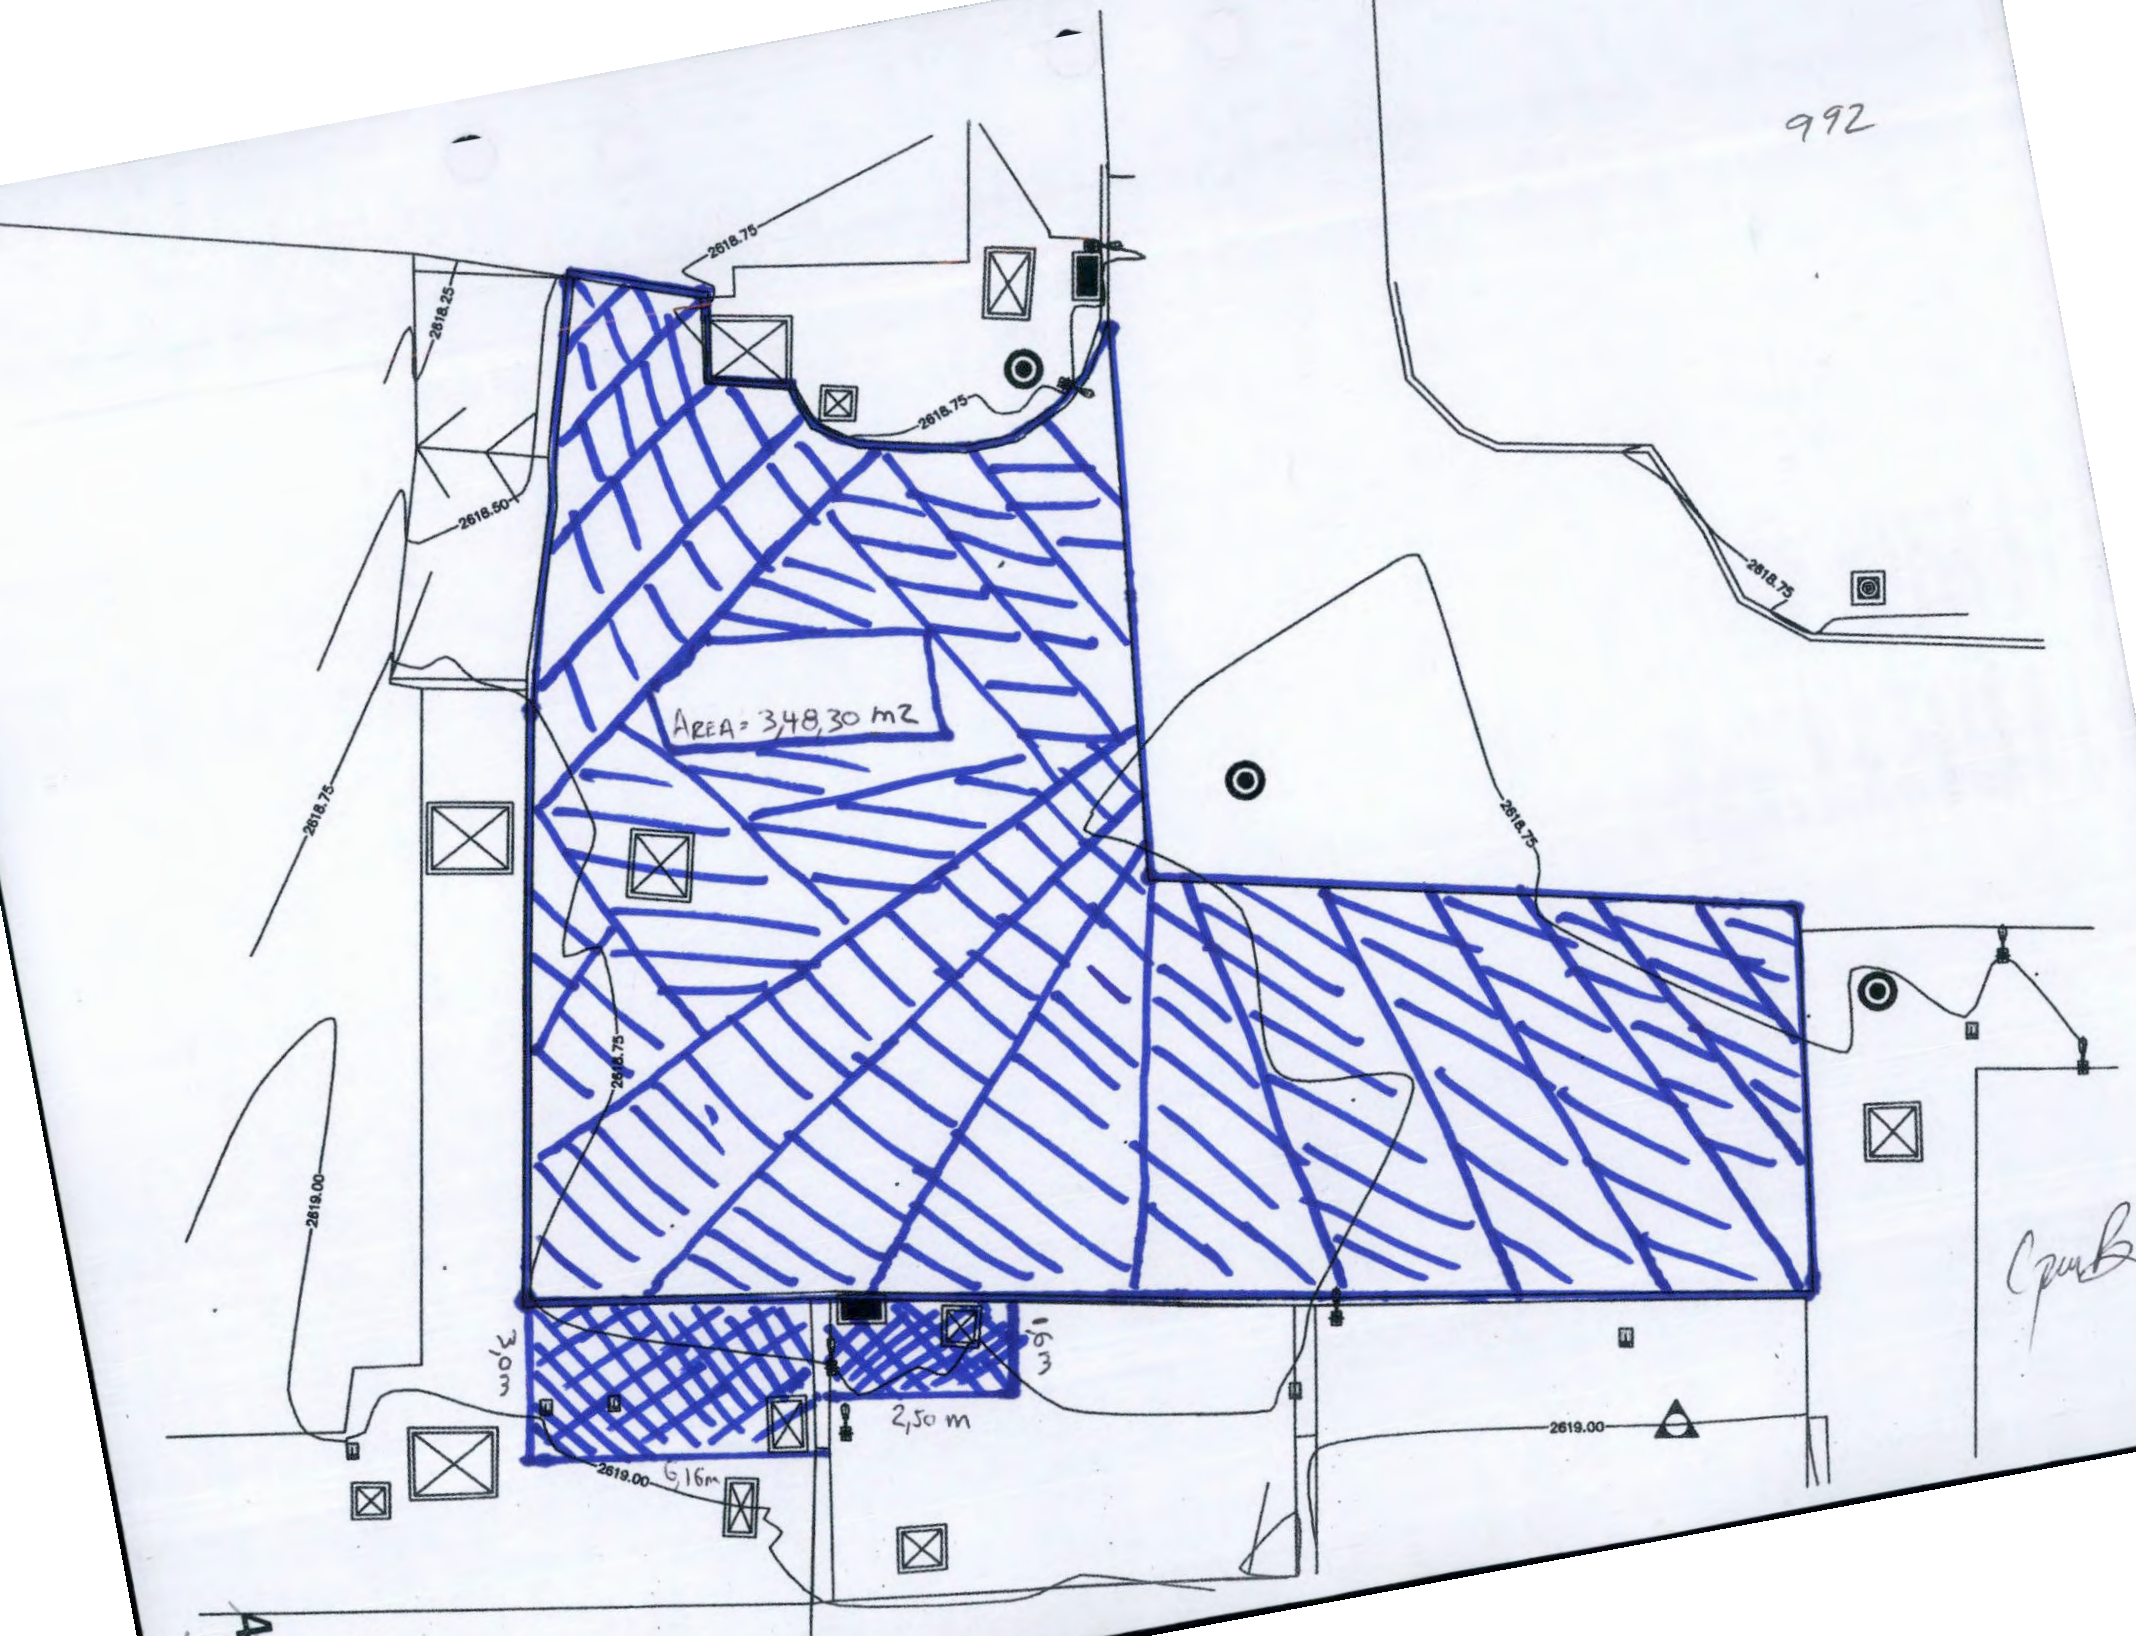
992
2618.75
2618.25
2618.75
2618.50
2618.75
2618.75
AREA = 3,48,30 m2
2618.75
2618.75
2619.00
2619.00
2,50 m
2619.00
6,16m

FECHA						
5	OCTUBRE	2018	CON & CON	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
DD	MM	AA				

993

OBRA : CONTRATO No. 166 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 64 A CON CARRERA 9 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-8	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	BAHIA	M3			348,00	0,15	52,20		52,20	
		ANDEN		6,16	3	18,48	0,3	5,54		5,54	
		ANDEN		2,5	1,6	4,00	0,14	0,56		0,56	
		AREA PLACA BAHIA		3,5	8	28,00	0,13	3,64		3,64	
		TUBERIA 8 pulg		9,7	0,6	5,82	0,6	3,49		3,49	
		TUBERIA 8 pulg		13,3	0,6	7,98	1,4	11,17		11,17	
		TUBERIA 8 pulg		14,5	0,70	10,15	1,50	15,23		15,23	
		TUBERIA 10 pulg		14	0,7	9,80	1,50	14,70		14,70	
		TUBERIA 8 pulg		16	0,60	9,60	0,60	5,76		5,76	
		DESCUENTO TUBERIA 8"		-52,7		0,03		-1,66		-1,66	
		DESCUENTO TUBERIA 10"		-14		0,05		-0,69		-0,69	
		COBRADO A LA FECHA						-57,94		-57,94	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**52,00**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA




OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

46

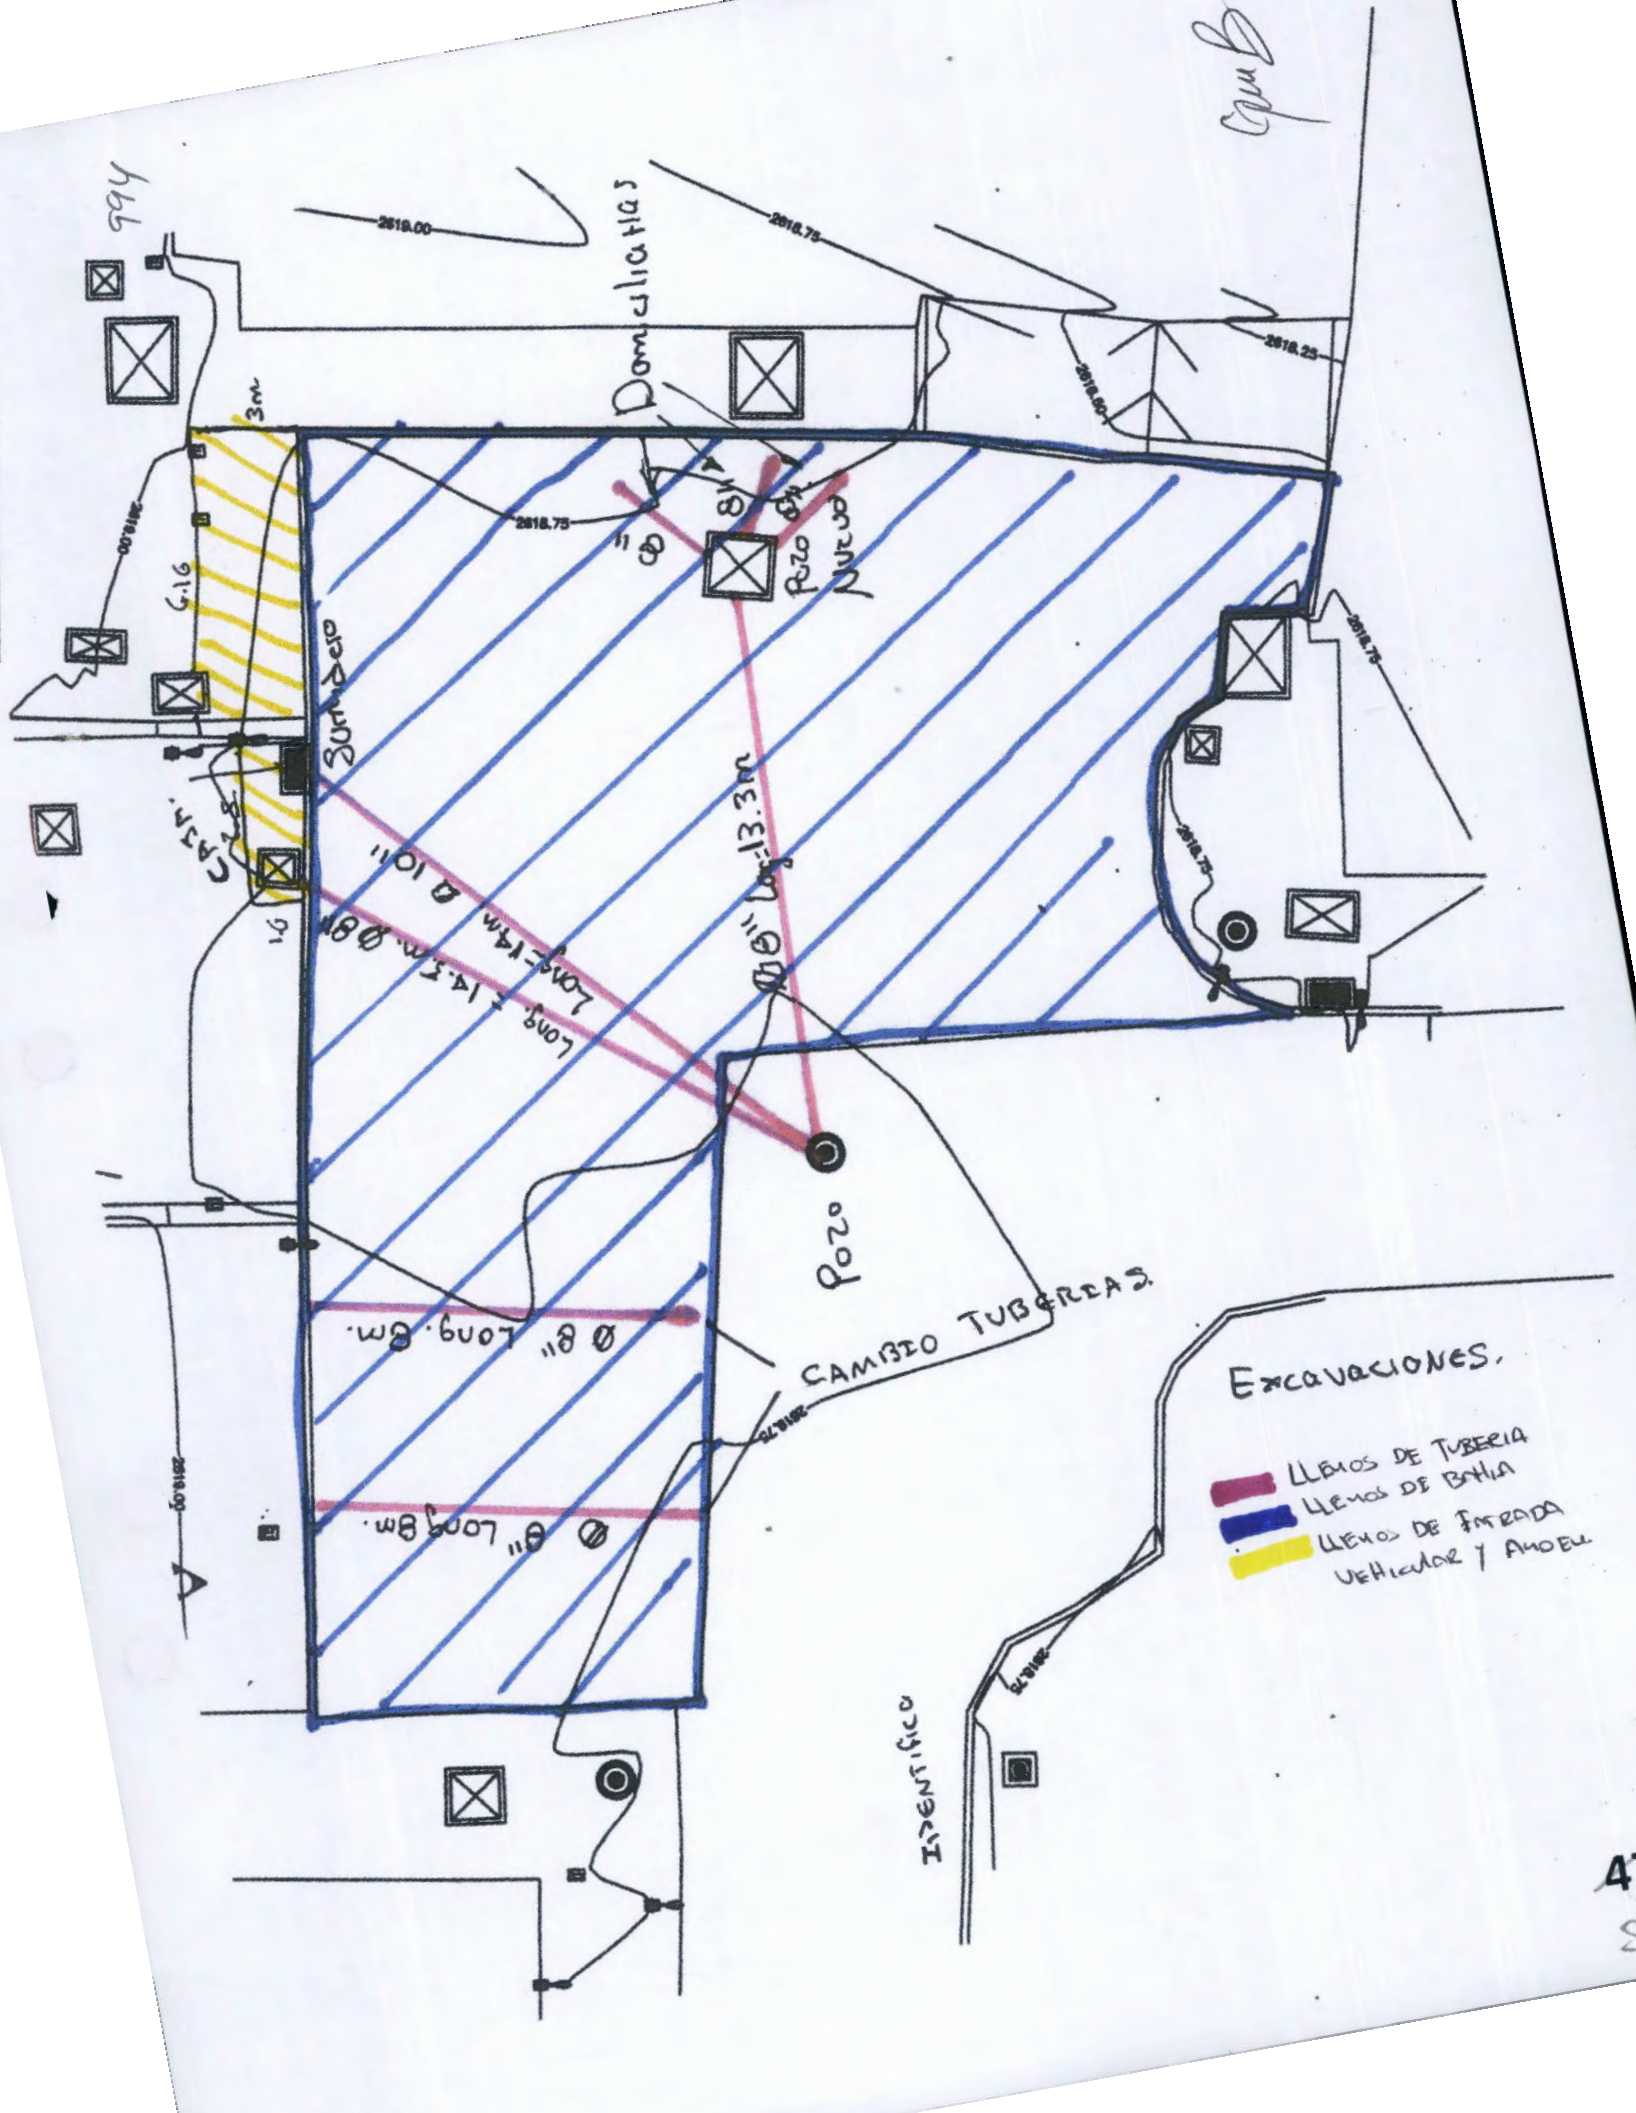
Domiciliarias
Pozo Nuevo
Pozo
Long. = 14.5m. Ø 10"
Long. = 14m. Ø 10"
Ø 8" Long. = 13.3m
Ø 8" Long. 8m.
Ø 8" Long. 8m.
CAMBIO TUBERIAS
Excavaciones.
LLENOS DE TUBERIA
LLENOS DE BAHIA
LLENOS DE ENTRADA VEHICULAR Y ANDEN
IDENTIFICO

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

995

OBRA : CONTRATO No. 160 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 64 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	PROFUNDO (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-27	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	POZO	UN							1,00	
		CAJA								1,00	
		SUMIDERO								1,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**3,00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

48


2618.25
2618.75
2618.50
2618.75
2618.75
2618.75
2618.75
2619.00
DEMOLICIÓN CAJA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO NUEVO
DEMOLICIÓN SUMIDERO
DEMOLICIÓN CAJA
2619.00
2619.00

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 180 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C." 997

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	PROFUNDO (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-36	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m (Inc. Suman. y Consta, Acero para Escaleras, Geo textil y Pañete Impermeable.)	POZO NUEVO	ML				1			1,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**1,00**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

50

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 168 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C." 948

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	PROFUNDO (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Suman, Formaleta, Ref., Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	POZO NUEVO	UN							1,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**1,00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

86 51

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 186 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C." 999

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	PROFUNDO (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-45	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Suman, Forma, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	SUMIDERO	UN							1,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**1,00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

52

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 180 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C." 1000

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	PROFUNDO (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-48	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	CAJA AGUAS RESIDUALES-ANDEN	UN							1,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**1,00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

53

FECHA					
5	OCTUBRE	2018	CON & CON	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
DD	MM	AA			

OBRA : CONTRATO No. 189 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1001

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-53	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	AREA DE ASFALTO	M2			320,00				320,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**320,00**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

54

1002
2618.75
320 m2
AREA ASFALTO
2618.75
2619.00
2618.75
2618.75
2618.50
2618.25
2618.75
2619.00
2618.75
2619.00

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 185 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1003

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 9 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-54	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas)	AREA DE ASFALTO	M3			320,00	0,12	38,40		38,40	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**38,40**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

56

57

64

2819.00
2818.75
2818.50
2818.25
2818.75
2818.75
2818.75
2818.75
2819.00
2818.75
320 m2
AREA ASFALTO
ESPESOR = 0,12 m
V = 38,40 m3

FECHA					
5	OCTUBRE	2018	CON & CON	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
DD	MM	AA			

OBRA : CONTRATO No. 188 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1005

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: BAHIA CALLE 54 A CON CARRERA 8 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-55	BASE GRANULAR CLASE A (BG-A) ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO MGEA_A (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación).	AREA DE ASFALTO	M3			320,00	0,15	48,00		48,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**48,00**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

58

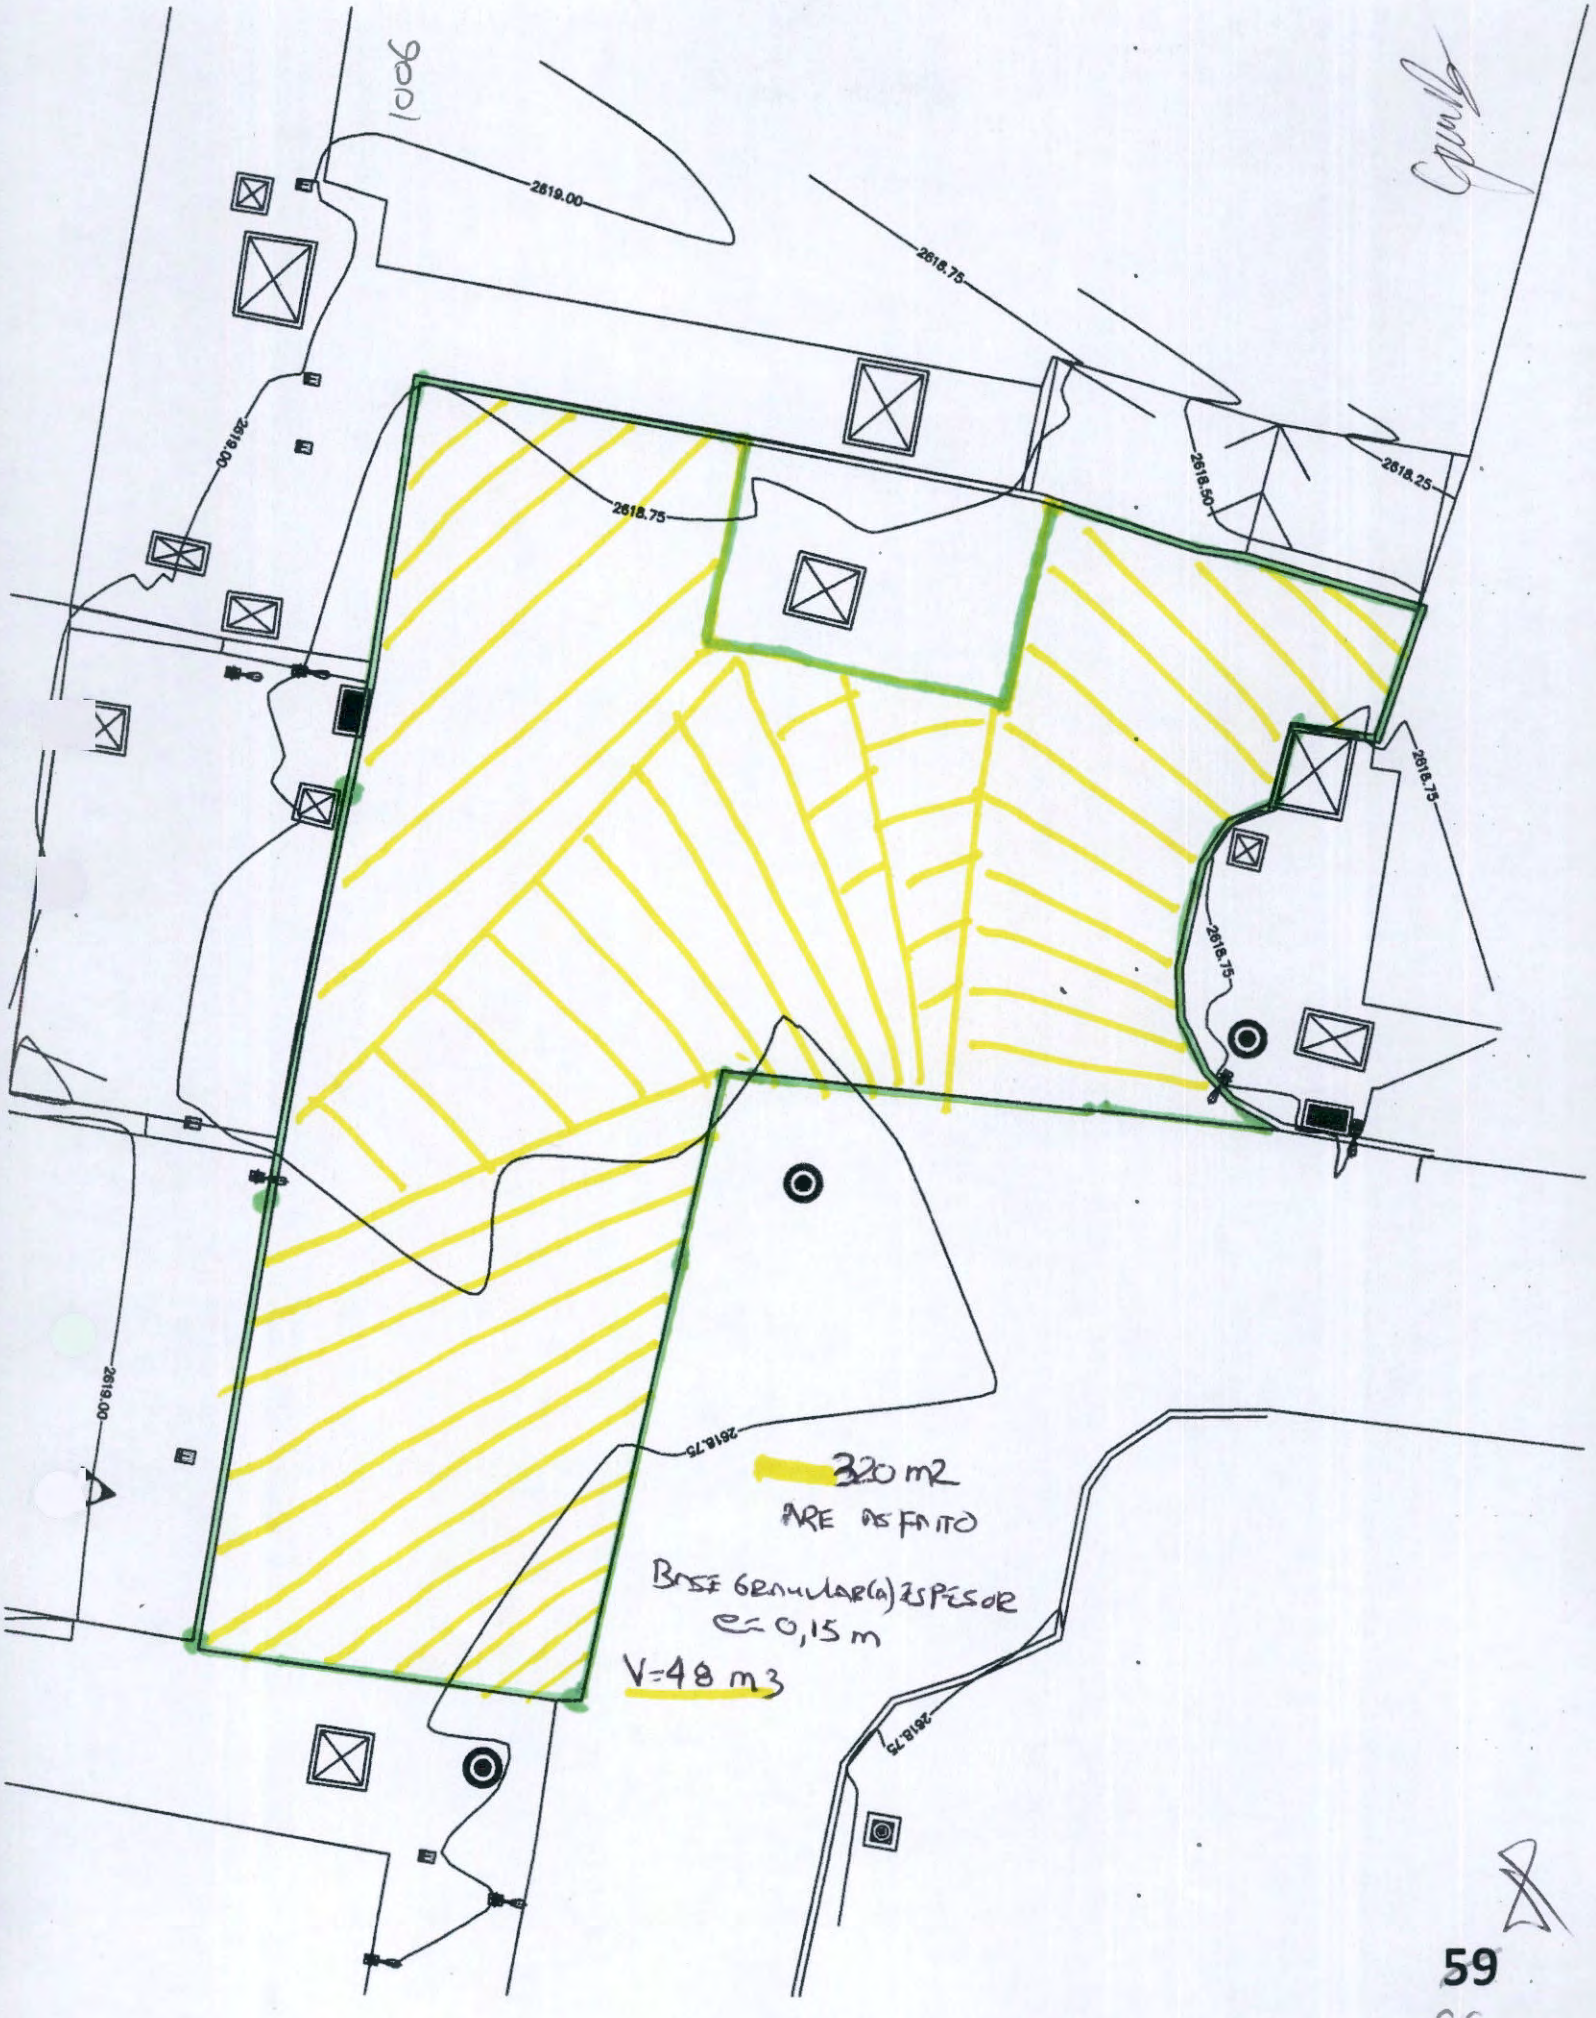
1006
2819.00
2818.75
2818.00
2818.50
2818.25
2818.75
2818.75
2818.75
2819.00
2818.75
320 m2
ARE ASFALTO
BASE GRANULAR(a) 25 PESOR
e= 0,15 m
V=48 m3

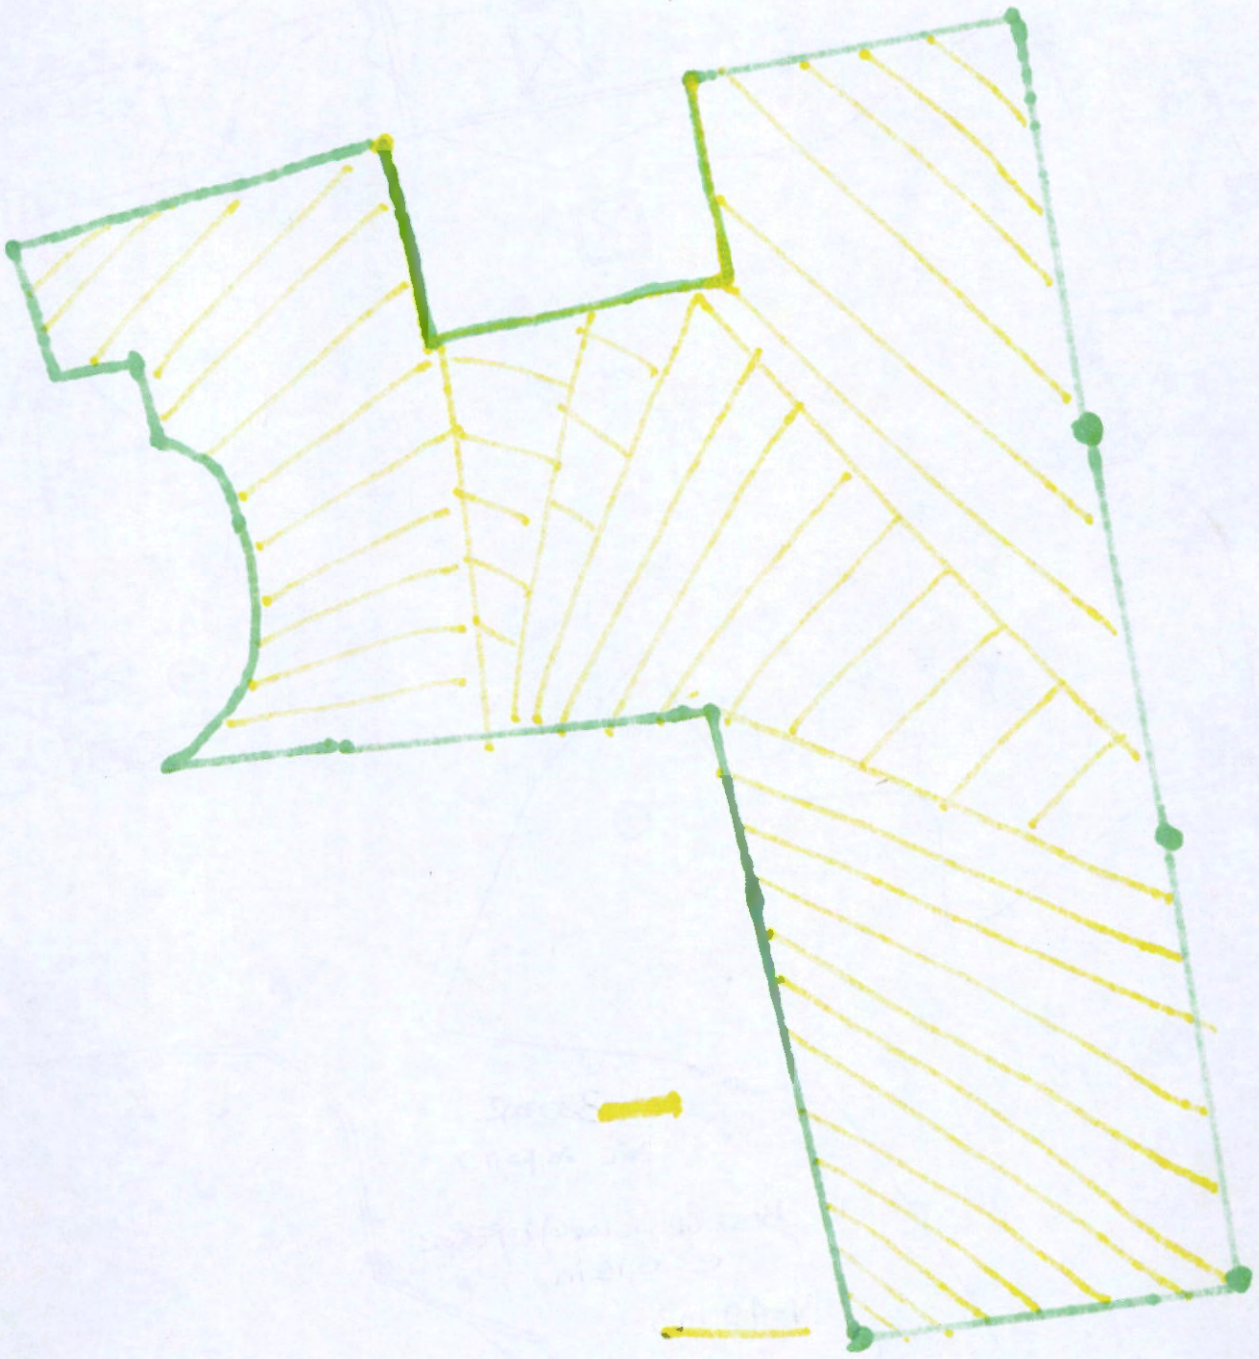

P		
FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1007

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** 2001123 **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
1.2	Excavacion manual en material comun	anden k0 +14,5 a k0+80	M3	65.5	1.8	117.90	0.15	17.69	17.69	
		anden k0 + 84,5+K0+95		10.5	1.8	18.90	0.15	2.84	2.84	
		entrada peatonal		8.5	4.6	39.10	0.15	5.87	5.87	
		rampa entrada		4.5	7.1	31.95	0.35	11.18	11.18	
		sardinel y bajo rampa		92	0.3	27.60	0.55	15.18	15.18	
		A 80		123	0.3	36.90	0.55	20.30	20.30	
		zonas duras		2.7	1.60	4.32	0.35	1.51	1.51	
		zonas duras		2.7	1.60	4.32	0.35	1.51	1.51	
		pago a la fecha						-36.79	-36.79	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**39.28**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

60

Corte 13.

Excavación.

Universidad Tecnológica.

1008

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1059

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** 2000099 **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	CANTIDAD	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
1.9	Bordillo prefabricado a80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	a 80	ML	80.5			1		80.50	
		Franjas adicionales a 80 acceso peatonal transversales		13.2			1		13.20	
		zonas duras Y RAMPA		1.8			5		9.00	
		ADICIONAL RAMPA		2.7			6		16.20	
		PAGO A LA FECHA		4.5			1		4.50	
				80			-1		-80.00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**43.40**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

62

A80. A10 A85.

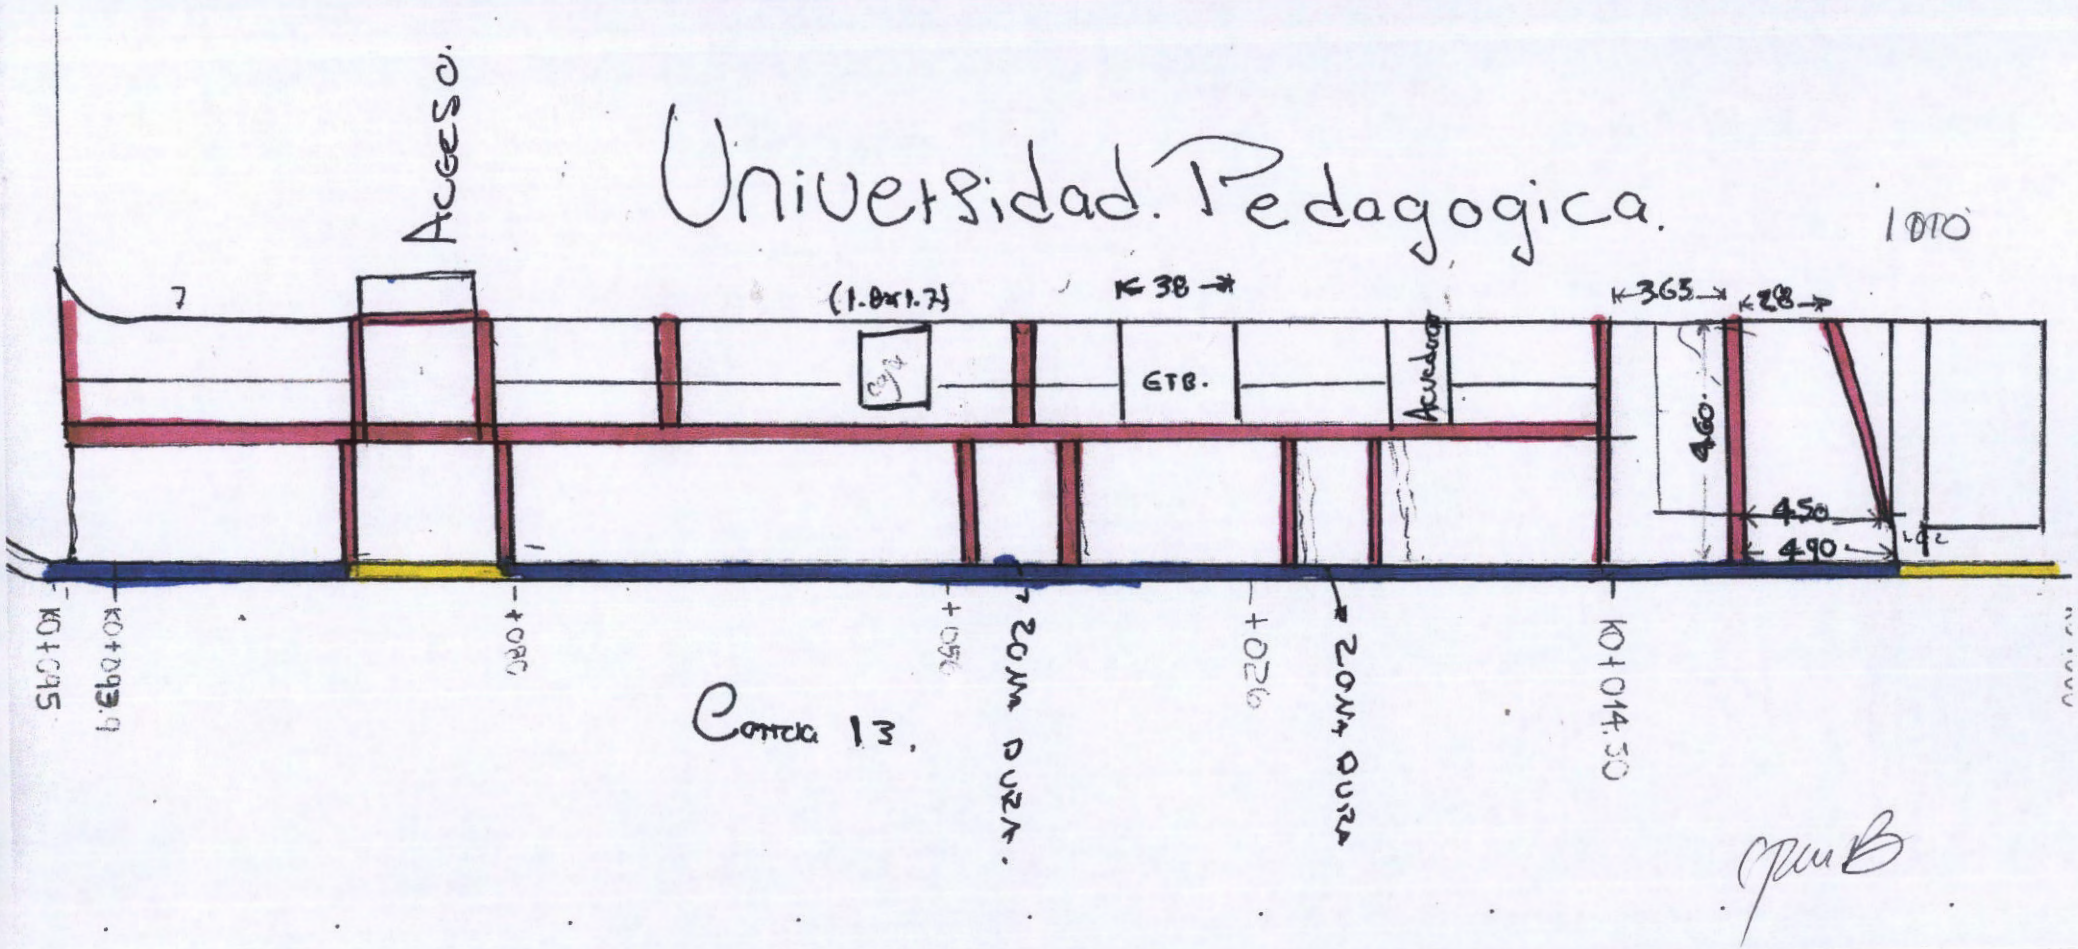

63

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1011

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
1.10	Sardinel bajo a85 para rampas (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	ENTRADA VEHICULAR UNIVERSIDAD	ML	5					5.00	
		ENTRADA 2 UNIVERSIDAD		5					5.00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**10.00**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

64

A80. A10 A85.

Universidad. Pedagogica.

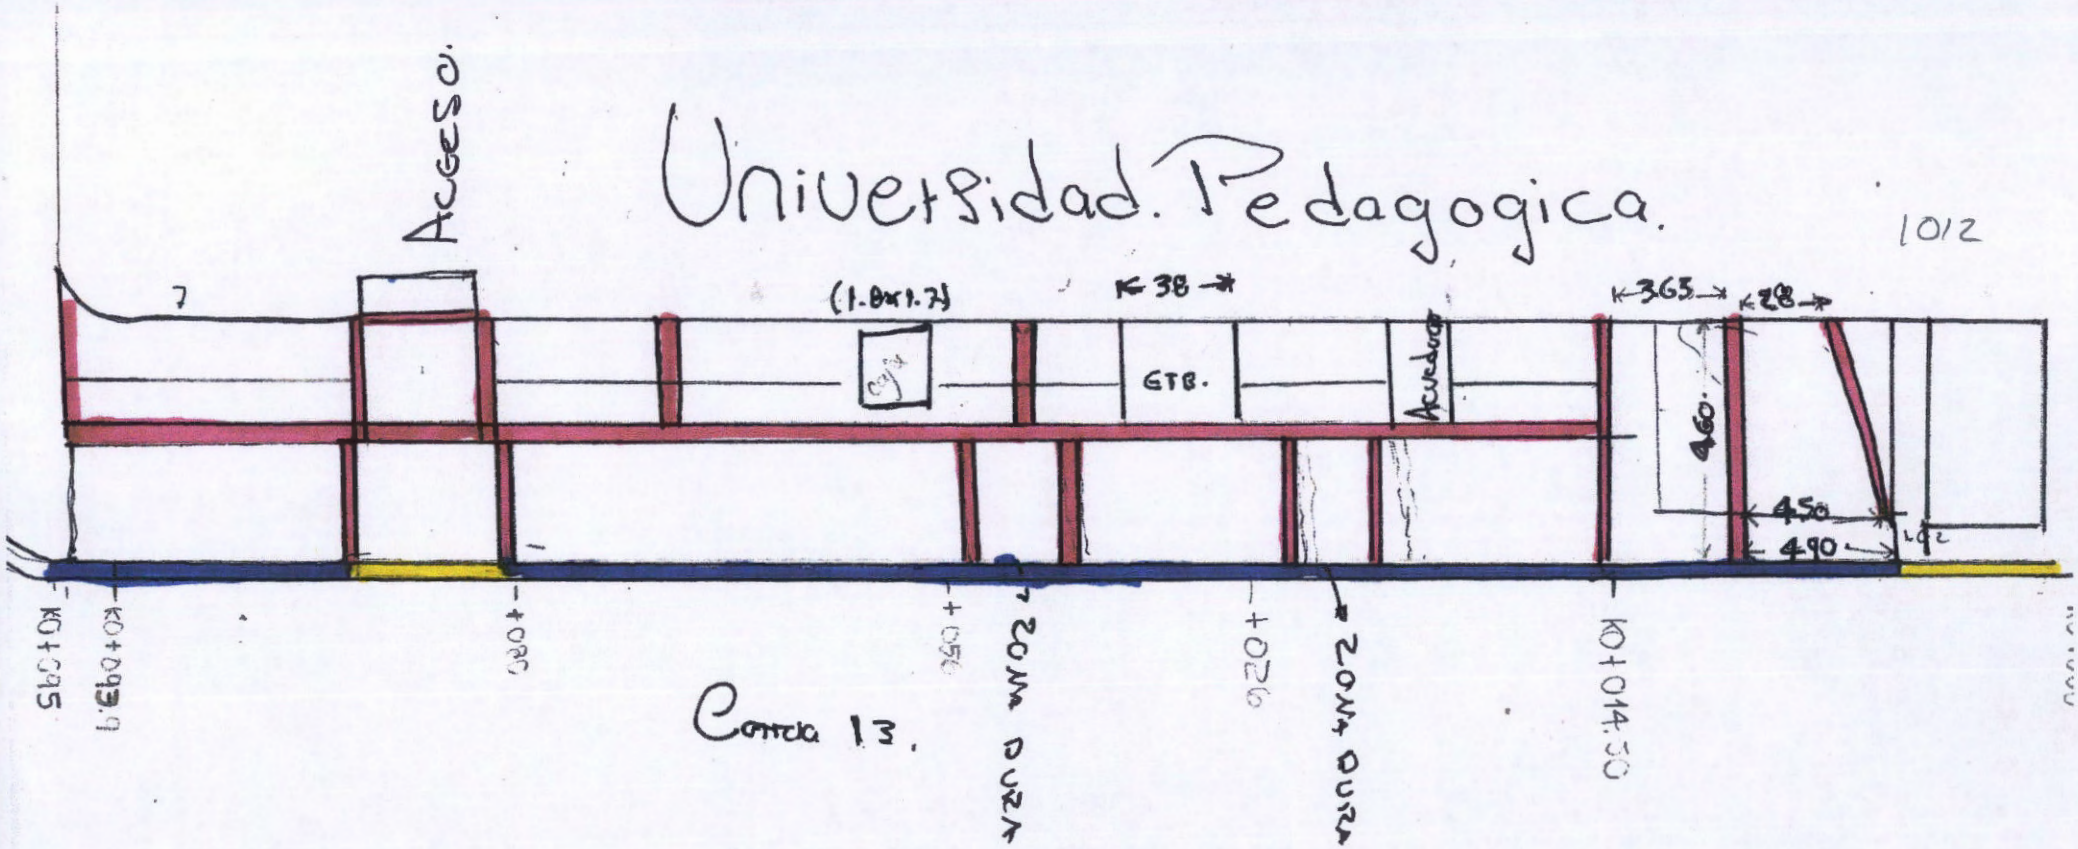

Cuneta 13.

1012

Cuneta

65

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1013

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	CANTIDAD	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
1.11	Sardinel tipo a10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	DESCUENTO ENTRADA VEHICULAR	ML	5			-1		-5.00	
		DESCUENTO ENTRADA 2		5			-1		-5.00	
		LONGITUD SARDINEL		95			1		95.00	
		PAGO A LA FECHA		80			-1		-80.00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**5.00**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

99

A80. A10 A85.

Universidad. Pedagogica.

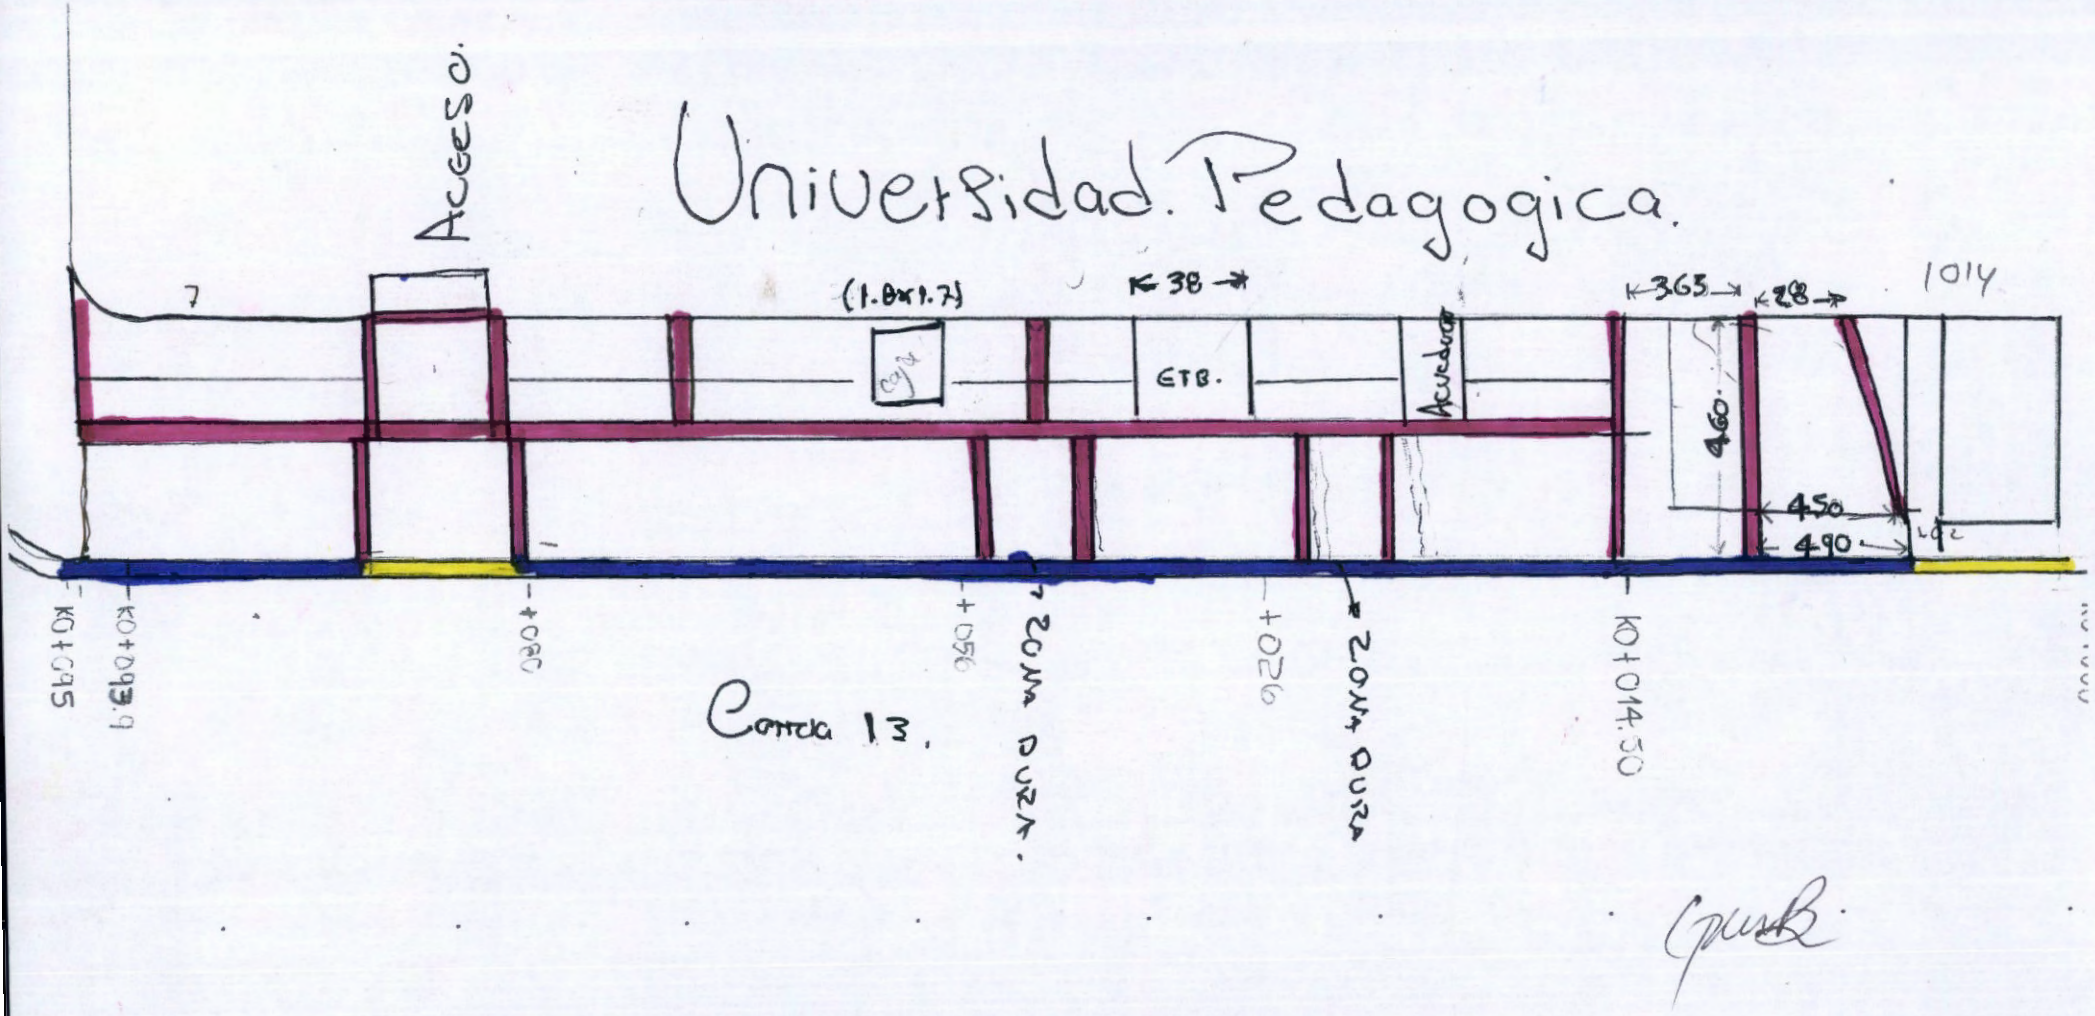

Cerca 13.

Cerca

74
67

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1015


CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO		TOTAL	OBSERVACIONES
NP-4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	ACCESOS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	KG	4	N° 4	5	20.00		20.00	ACCESO 2
				17	N° 4	4.8	81.60		81.60	PAÑO 2 Y PAÑO 3
				9	N° 4	4.50	40.50		40.50	PAÑO 1
				17	N° 4	2.60	44.20		44.20	PAÑO 3
				16	N° 4	2.20	35.20		35.20	PAÑO 1
				17	N° 4	1.60	27.20		27.20	PAÑO 2
				17	N° 4	1.00	17.00		17.00	ACCESO 2
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**265.70**	**KG**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



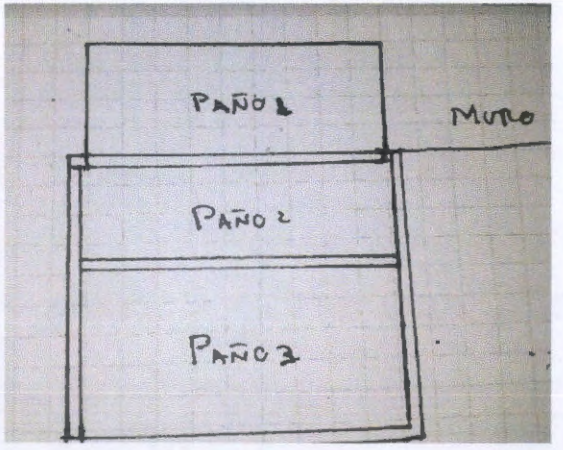

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

89

1016

EMPRESAS DE ACERO

BOGOTA
CHAPINERO
ORDEN DE DESPACHO

Lista de barras #4

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
5.00	4	#4	5.00	20.00	[4 En calle 72 pedagogica acceso 2].
4.80	17	#4	4.80	81.60	[7 En calle 72 pedagogica paño 2].[10 En calle 72 pedagogica paño 3].
4.50	9	#4	4.50	40.50	[9 En Calle 72 pedagogica paño 1].
2.60	17	#4	2.60	44.20	[17 En calle 72 pedagogica paño 3].
2.20	16	#4	2.20	35.20	[16 En Calle 72 pedagogica paño 1].
1.60	17	#4	1.60	27.20	[17 En calle 72 pedagogica paño 2].
1.00	17	#4	1.00	17.00	[17 En calle 72 pedagogica acceso 2].

Peso total barras #4 =265.70 Kg

PESO TOTAL = 265.70 Kg

EMPRESAS DE ACERO

BOGOTA
CHAPINERO
ELEMENTO POR ELEMENTO

Calle 72 pedagogica paño 1 (Es 1) Peso/Elemento= 75.70Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
2.20	16	#4	2.20	35.2	
4.50	9	#4	4.50	40.5	

calle 72 pedagogica paño 2 (Es 1) Peso/Elemento= 60.80Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.60	17	#4	1.60	27.2	
4.80	7	#4	4.80	33.6	

calle 72 pedagogica paño 3 (Es 1) Peso/Elemento= 92.20Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
2.60	17	#4	2.60	44.2	
4.80	10	#4	4.80	48.0	

calle 72 pedagogica acceso 2 (Es 1) Peso/Elemento= 37.00Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
5.00	4	#4	5.00	20.0	
1.00	17	#4	1.00	17.0	

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 168 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA


1018

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	FACTOR	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-5	PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.20m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	RAMPA ACCESO PAÑO 1	M2	4.5	2.2	9.9	0.75		7.43	
		RAMPA ACCESO PAÑO 2		4.8	1.6	7.68	0.75		5.76	
		RAMPA ACCESO PAÑO 3		4.8	2.6	12.48	0.75		9.36	
		ACCESO 2		5	1	5	0.75		3.75	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**26.30**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

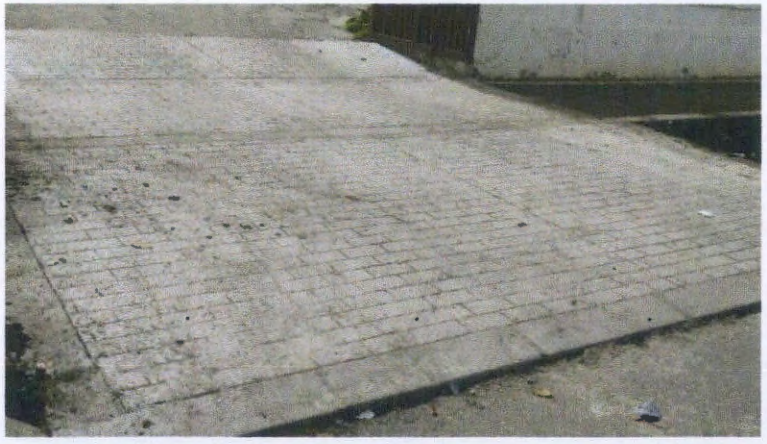

OBSERVACIONES

ESTE ITEM SE COBRA AL 75% YA QUE EL VALOR CONTRATADO ES CON UN ESPESOR e=0.20m Y ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON UN ESPESOR e=0.15m
POR LO TANTO LA RELACION DE ESPESORES 15/20 ARROJA UN FACTOR DE 0.75 QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD EJECUTADA EN ESTA ACTIVIDAD

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

71

72

Piso en concreto.

Corte 13.

Universidad Pedagogica.

Acceso.

(1.0x1.7)

C3

GTB.

Acueducto

460.

365

28

450

490

1019

zona dura

zona dura

+080

+050

+026

K0+014.50

K0+093.9

K0+095

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1020

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-7	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	ACCESO A UNIVERSIDAD	M3	7	4.5	31.50	0.15	4.73	4.73	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									4.73	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

73

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1021

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-13	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ACCESO VEHICULAR	M3	7	4.5	31.5	0.16		5.04	
		ACCESO 2		5	1	5	0.40		2.00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**7.04**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

74

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1022

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CARRERA 13 ENTRE CALLE 72-CALLE 73 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-28	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA)	CAMARA EXISTENTE	UN						1.00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR									**1.00**	**UN**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

En este item, incluye nivelacion camara ETB, caja de aguas residuales, y cajillas acueducto

CONTRATISTA


INTERVENTORÍA

28

75

Universidad. Pedagogica.

1023

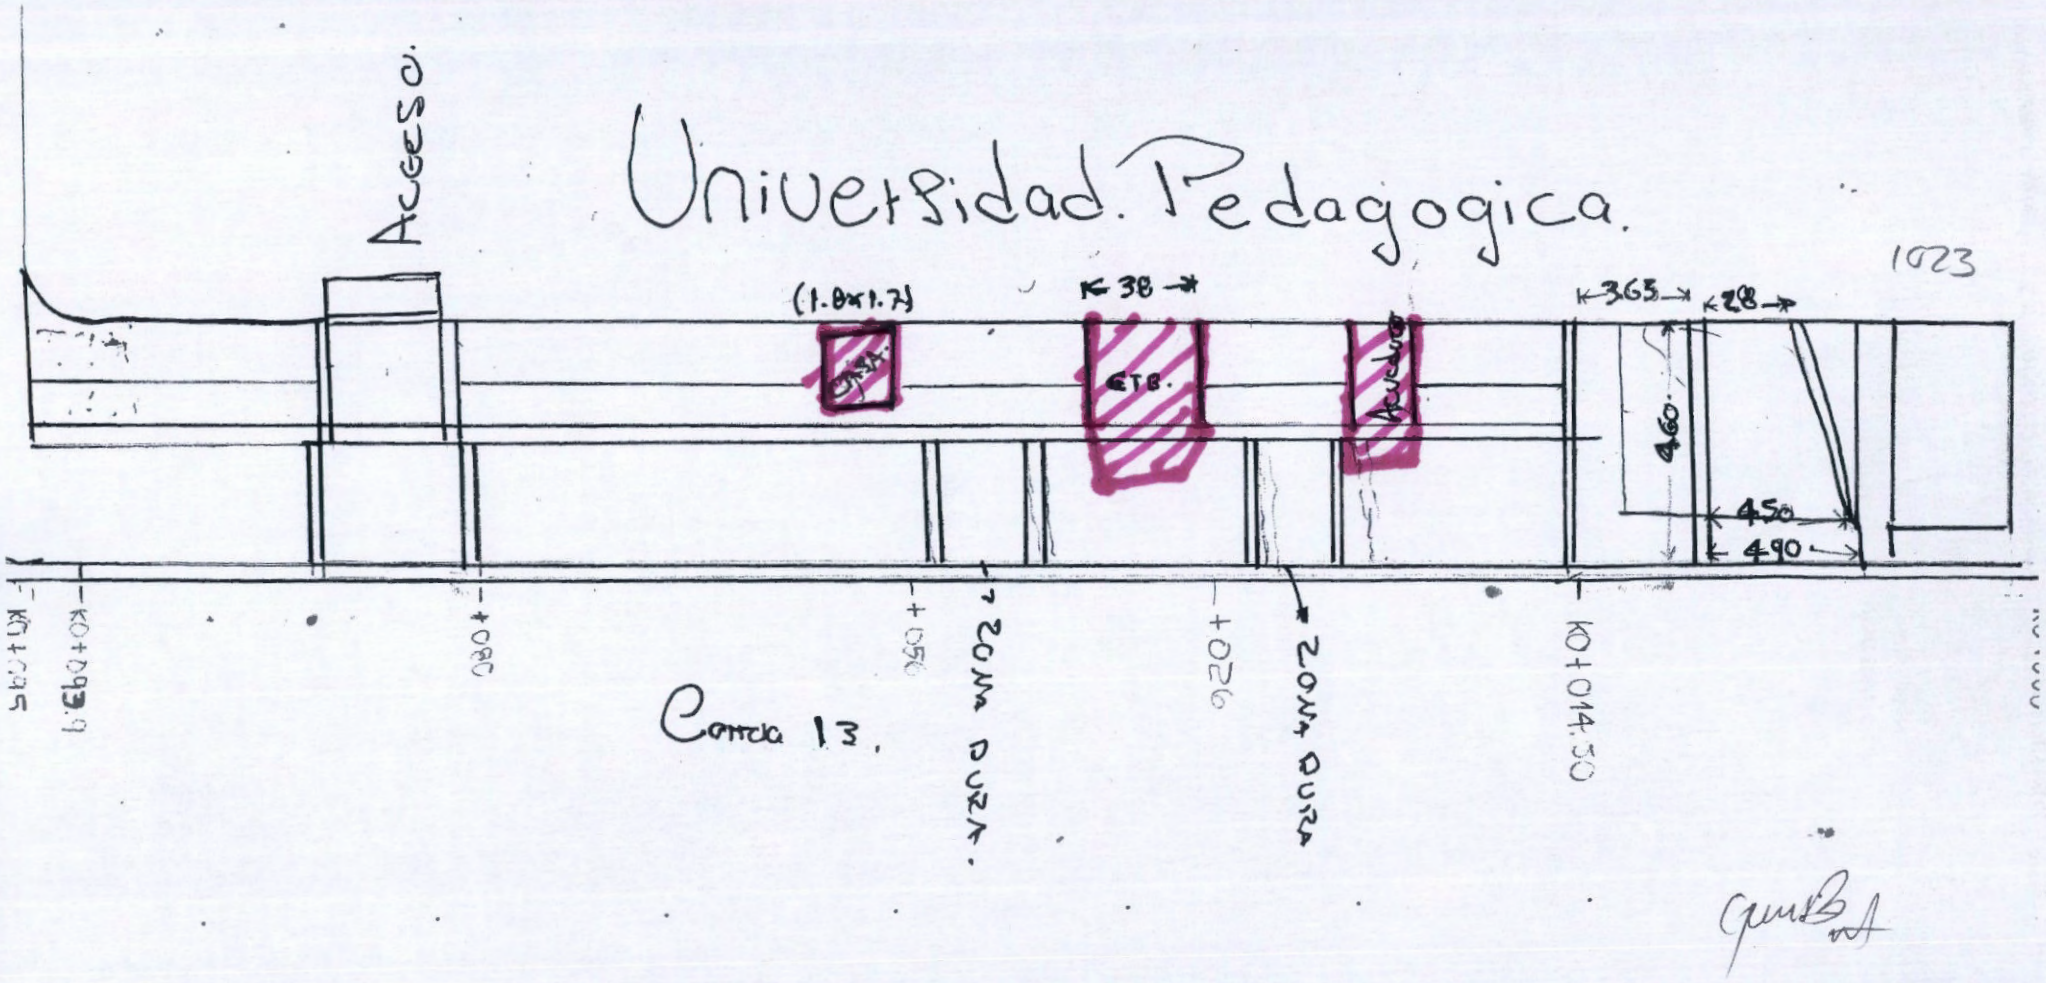

Cerca 13.

76

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 160 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1024

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,2	Excavacion manual en material comun	K0+92 A K0+135	M3	43	4,5	193,50	0,6	116,10		116,10	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6A
		VIGAS PARA MATERA		40	0,3	12,00	0,2	2,40		2,40	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6A
		AGUAS LLUVIAS		40	0,6	24,00	1,6	38,40		38,40	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6A
		TUBERIA ELECTRICA K0+70 A K0+170		100	0,4	40,00	0,5	20,00		20,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6A
		K0+135 A K0+171		36	6	216,00	1,4	302,40		302,40	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6A
		VIGAS PARA MATERA		90	0,3	27,00	0,2	5,40		5,40	CLL 83 ENTRE KRA 6A Y 7A
		AGUAS LLUVIAS		60	0,8	48,00	1,83	87,61		87,61	CLL 83 ENTRE KRA 6A Y 7A
		TUBERIA ELECTRICA		60	0,4	24,00	0,5	12,00		12,00	CLL 83 ENTRE KRA 6A Y 7A
		K0+00 A K0+11		11	2,15	23,65	0,50	11,83		11,83	CLL 83 ENTRE KRA 6A Y 7A
		K0+11 A K0+60		49	6,00	294,00	0,34	99,96		99,96	CLL 83 ENTRE KRA 6A Y 7A
		ACUMULADO ANTERIOR				-451,35				-451,35	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**244,74**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

77

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 160 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1075


CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 63 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	CANTIDAD	VOL (m³)		TOTAL	OBSERVACIONES
1,9	Bordillo prefabricado a80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	DESCANSOS	ML	1,2			26			31,20	CLL 63 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		INICIO RAMPAS DE 1 A 11 - DESCANSOS		1,2			7			8,40	CLL 63 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		RAMPAS 12-16		4,5			1			4,50	CLL 63 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**44,10**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

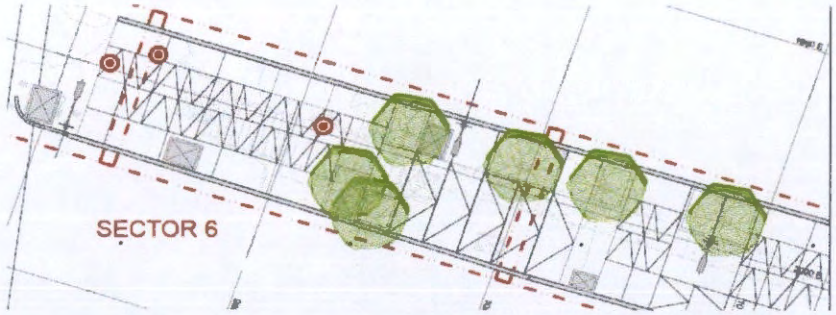

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

78

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1026


CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	CANTIDAD	VOL (m³)		TOTAL	OBSERVACIONES
1,10	Sardinel bajo a85 para rampas (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	INICIO RAMPAS DE 1 A 39	ML	1,2			39			46,80	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		RAMPAS39-45		2,3			6			13,80	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		INICIO RAMPAS DE 1 A 11		1,2			11			13,20	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		RAMPAS 12-16		4,5			5			22,50	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		RAMPAS 17 A 32		1,2			15			18,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		RAMPA 33 A 35		4,5			3			13,50	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**127,90**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

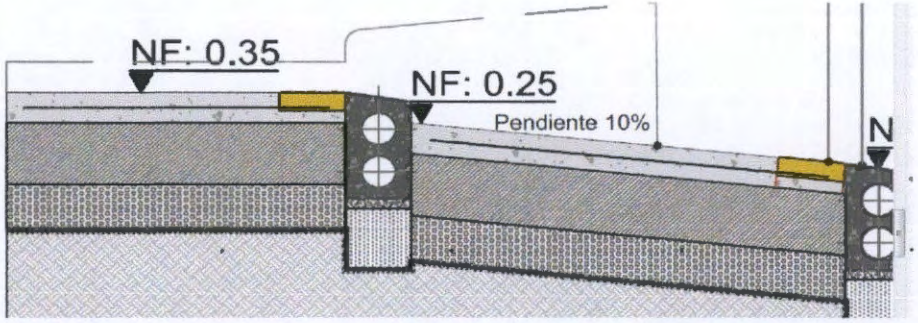



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

79

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 108 de 2017

1027

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	FACTOR DE EXPANSION	TOTAL	OBSERVACIONES
2,3	Transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 24 km)	K0 +92 A K0+135	M3	43	4,5	193,50	0,6	116,10	1,25	145,13	
		VIGAS PARA MATERA		40	0,3	12,00	0,2	2,40	1,25	3,00	
		AGUAS LLUVIAS		40	0,6	24,00	1,5	36,00	1,25	45,00	
		TUBERIA ELECTRICA K0+70-K0 + 170		100	0,4	40,00	0,5	20,00	1,25	25,00	
		K0 +135 A K0+171		36	6	216,00	1,4	302,40	1,25	378,00	
		VIGAS PARA MATERA		90	0,3	27,00	0,2	5,40	1,25	6,75	
		AGUAS LLUVIAS		60	0,8	48,00	1,6	76,80	1,25	96,00	
		TUBERIA ELECTRICA		60	0,4	24,00	0,5	12,00	1,25	15,00	
		K0 +00 A K0 +11		11	2,15	23,65	0,50	11,83	1,25	14,78	
		K0+11 A K0 + 60		49	6,00	294,00	0,34	99,96	1,25	124,95	
		DEMOLICIONES PISOS EN CONCRETO				697,26	0,15	104,59	1,25	130,74	
		DEMOLICION ESTRUCTURAL						310,00	1,25	387,50	
		PAGO A LA FECHA								-1150,84	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**221,00**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

108

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 108 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1028

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
2,8	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)		M3	60	0,4	24,00	0,2	4,80		4,80	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
				100	0,4	40,00	0,2	8,00		8,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**12,80**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

81

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 160 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1029

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS


FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	CANTIDAD DE VARILLAS	DIAMETRO(in)	LONGITUD(in)	PESO(Kg)/ml)		PESO(Kg)	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	MUROS DE CONTENCION	KG	500	#4	6,00	1		3000,00	3000,00	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		VIGAS MATERAS		67	#4	6,00	1		402,00	402,00	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		FLEJES 3/8		67	#3	6,00	0,56		225,12	225,12	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		MUROS DE CONTENCION		350	#4	6,00	1		2100,00	2100,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		VIGAS MATERAS		32	#4	6,00	1		192,00	192,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		FLEJES 3/8		27	#3	6,00	0,56		90,72	90,72	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**6009,84**	**KG**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

82

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1030

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-6	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instaleción)	AREA GENERAL	M2	60	5,5	330,00				330,00	CLL 83 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		AREA GENERAL		100	6	600,00				600,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										930,00	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

CIV 2000898	
Espesor (cm)	Capa
8	Losa en concreto MR 4.0
15	B 600
20	B 400
Geotextil	





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

83

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C." (031)

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 63 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	CANTIDAD	PESO M2		TOTAL	OBSERVACIONES
		INICIO RAMPAS DE 1 A 39		1,3	1	1,30	39	3,00		152,10	CLL 63 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		RAMPAS39-45		1,3	2,1	2,73	6	3,00		49,14	CLL 63 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		DESCANSOS		1,3	2	2,60	26	3,00		202,80	CLL 63 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		RAMPA 48-63		1,5	6,00	9,00	15,00	3,00		405,00	CLL 63 ENTRE KRA 1 RA Y 6
NP-12	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)		KG								
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**809,04**	**KG**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

84

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 169 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1032

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-15	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	AGUAS LLUVIAS	M3	60	0,8	48,00	1,00	48,00		48,00	
		TUBERIA ELECTRICA		100	0,4	40,00	0,30	12,00		12,00	
		ESTRUCTURA		11	2,15	23,65	0,20	4,73		4,73	
		ESTRUCTURA		49	6	294,00	0,20	58,80		58,80	
		AGUAS LLUVIAS		40	0,6	24,00	1	24,00		24,00	
		TUBERIA ELECTRICA		100	0,4	40,00	0,3	12,00		12,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**159,53**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

CIV 2000898	
Espesor (cm)	Capa
8	Losa en concreto MR 4.0
15	B 600
20	B 400
Geotextil	

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

85

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA


1033

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ALTO(m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-20	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerches, parales).	M FINAL- NORTE LA ALTURA INCLUYE ZARPA	M3	20	0,2	4,00	1,5	6,00	1,00	6,00	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		M FINAL- SUR LA ALTURA INCLUYE ZARPA		20	0,25	5,00	1,5	7,50	1,00	7,50	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		M FINAL- SUR LA ALTURA INCLUYE ZARPA		14,5	0,25	3,63	2,2	7,98	1,00	7,98	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		MUROS TRANSVERSALES		4,4	0,2	0,88	0,5	0,44	29,00	12,76	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
		ZARPAS		4,4	0,2	0,88	0,7	0,62	29,00	17,86	CLL 83 ENTRE KRA 1 RA Y 6
				4,4	0,2	0,88	0,7	0,62	15,00	9,24	MUROS ENTRE CRA 6 Y 7A
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**61,34**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

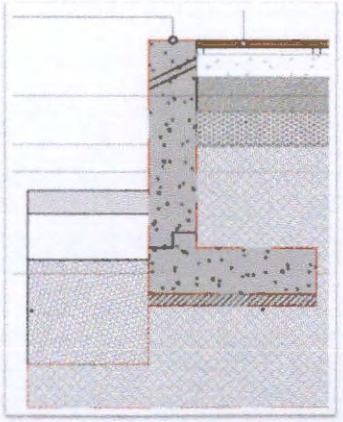





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

98

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 169 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA


1034

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 83 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	PROFUNDO(m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-21	CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)	M FINAL- NORTE LA ALTURA INCLUYE ZARPA	M3	20	0,7	14,00	0,08	1,12	1,00	1,12	
		M FINAL- SUR LA ALTURA INCLUYE ZARPA		20	0,7	14,00	0,08	1,12	1,00	1,12	
		M FINAL- SUR LA ALTURA INCLUYE ZARPA		14,5	0,7	10,15	0,08	0,81	1,00	0,81	
		MUROS TRANSVERSALES		4,4	0,7	3,08	0,08	0,25	29,00	7,15	
		ZARPAS		4,4	0,7	3,08	0,08	0,25	29,00	7,15	
		MURO Y ZARPA		2,7	0,7	1,89	0,08	0,15	7,00	1,06	
		MURO Y ZARPA		1,5	0,7	1,05	0,08	0,08	3,00	0,25	
		MURO Y ZARPA		4,5	0,7	3,15	0,08	0,25	3,00	0,76	
		MURO Y ZARPA		2,7	0,7	1,89	0,08	0,15	1,00	0,15	
		MURO Y ZARPA		2	0,7	1,40	0,08	0,11	1,00	0,11	
		MURO Y ZARPA		4,3	0,7	3,01	0,08	0,24	4,00	0,96	
		MURO Y ZARPA		2,7	0,7	1,89	0,08	0,15	1,00	0,15	
		MURO Y ZARPA		4,3	0,7	3,01	0,08	0,24	4,00	0,96	
		MURO Y ZARPA		2,7	0,7	1,89	0,08	0,15	8,00	1,21	
		MURO Y ZARPA		8,7	0,7	6,09	0,08	0,49	1,00	0,49	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**23,45**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

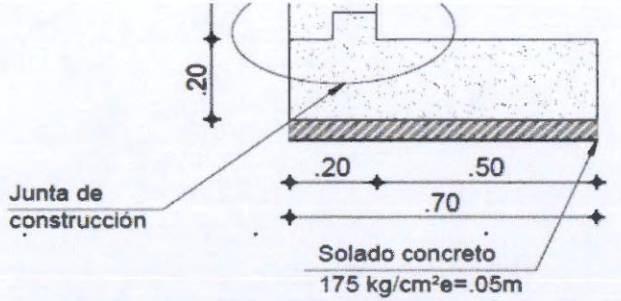

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

87

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 168 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1035

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: CALLE 63 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 7 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-30	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	SEGÚN DISEÑO	ML	60						60,00	CLL 63 ENTRE KRA 6 RA Y 7
		SEGÚN DISEÑO		100						100,00	CLL 63 ENTRE KRA 1 RA Y 6
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**160,00**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

88

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1036

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 5 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,1	Demolicion pisos de concreto (espesor variable. incluye cargue	AREA TOTAL DE INTERVENCION	M2	6,3	7,1	44,73				44,73	AREA POMPEYANO
				3	2	6,00				6,00	AREAS ADOQIN
				3	2	6,00				6,00	AREAS ADOQIN
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**56,73**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

68

1032


Nivelación

Demolición

Excavación.

Base.

Pompeliano 71.

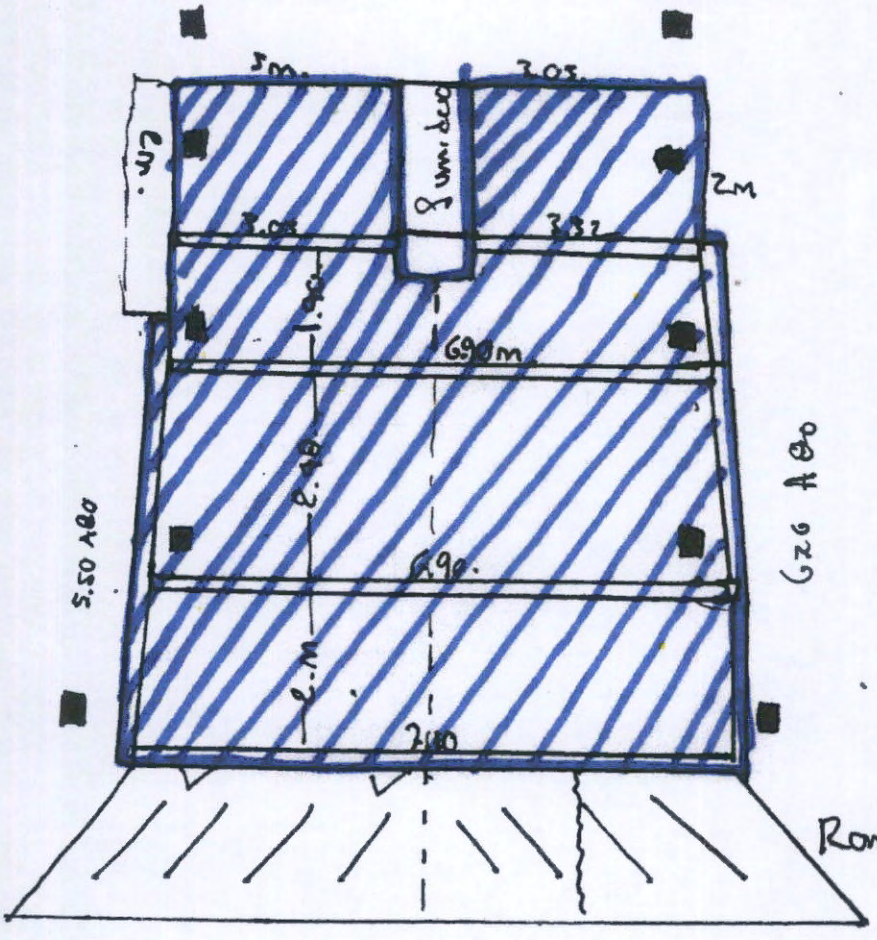

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1038


CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 6 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,2	Excavacion manual en material comun		M3	6,3	7,1	44,73	0,35	15,66		15,66	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**15,66**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

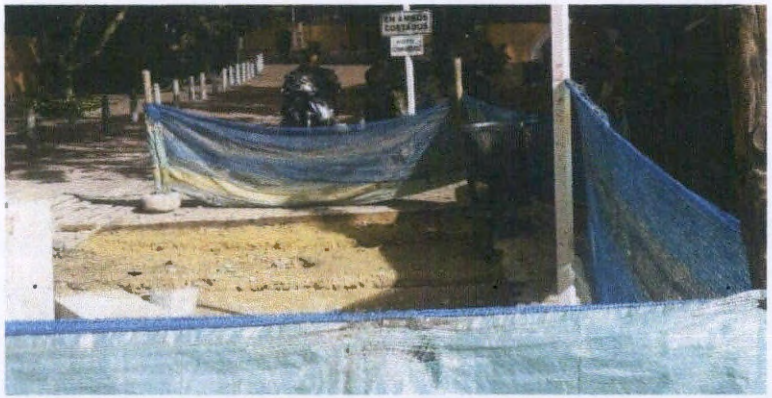

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

91


NIVELACIÓN

DEMOLICIÓN

EXCAVACIÓN

BASE.

PAMPLONA 71.

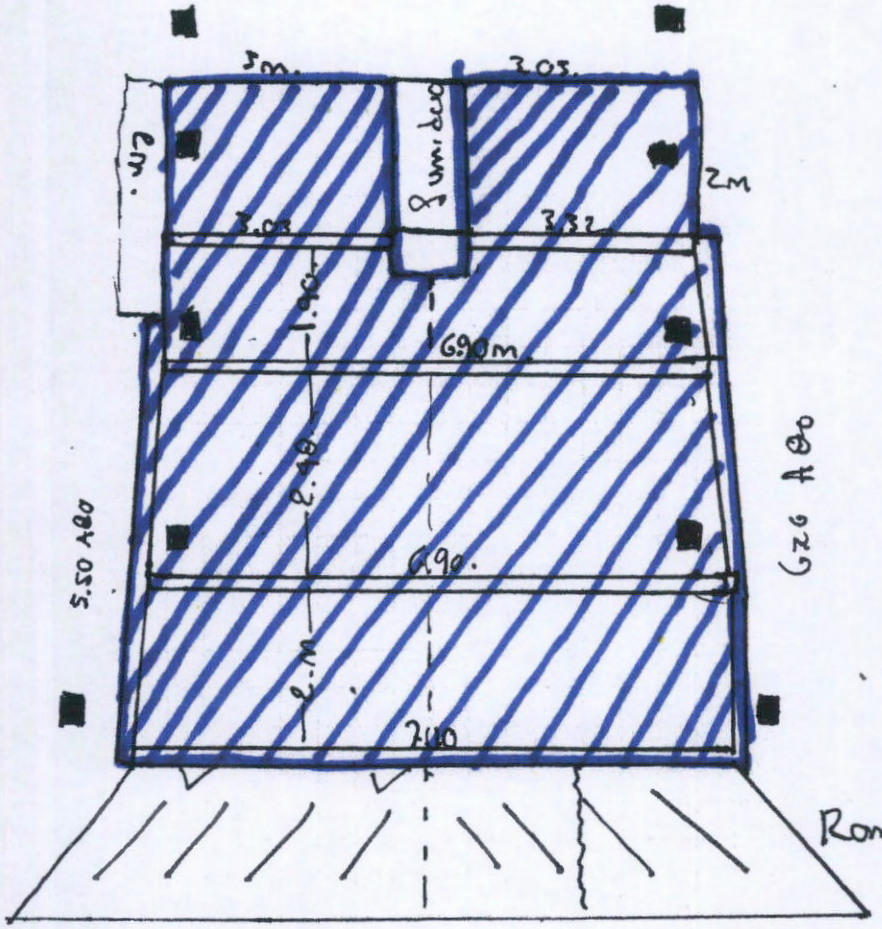

www.convcon.com.co

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

1040

CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 8 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,4	Subbase granular clase c (sbg_c) (suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación)		M3	6,3	7,1	44,73	0,3	13,42		13,42	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**13,42**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

93

1041


Nivelación

Demolición —

Excavación —

Subbase. —

Pompeiano 71.

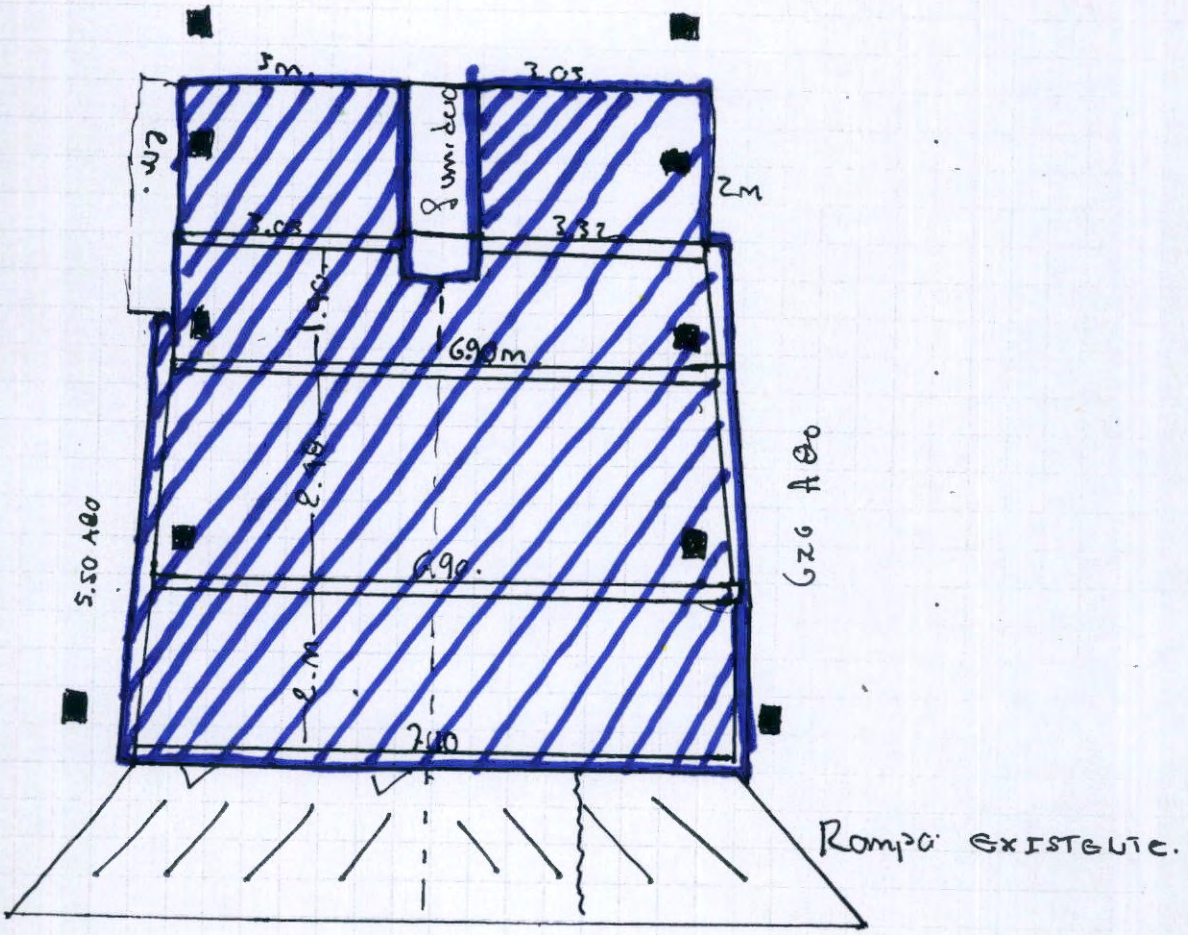

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1042

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 6 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,9	Bordillo prefabricado A 80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000psi)	COSTADO NORTE	ML	6,26						6,26	
		COSTADO SUR		5,5						5,50	
		TRANSVERSALES		7,1						7,10	
		TRANSVERSALES		6,82						6,82	
		TRANSVERSALES		6,95						6,95	
		TRANSVERSALES		6,38						6,38	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**39,01**	**ML**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA


INTERVENTORIA

95

A 80

1043

Pompeliano 71.

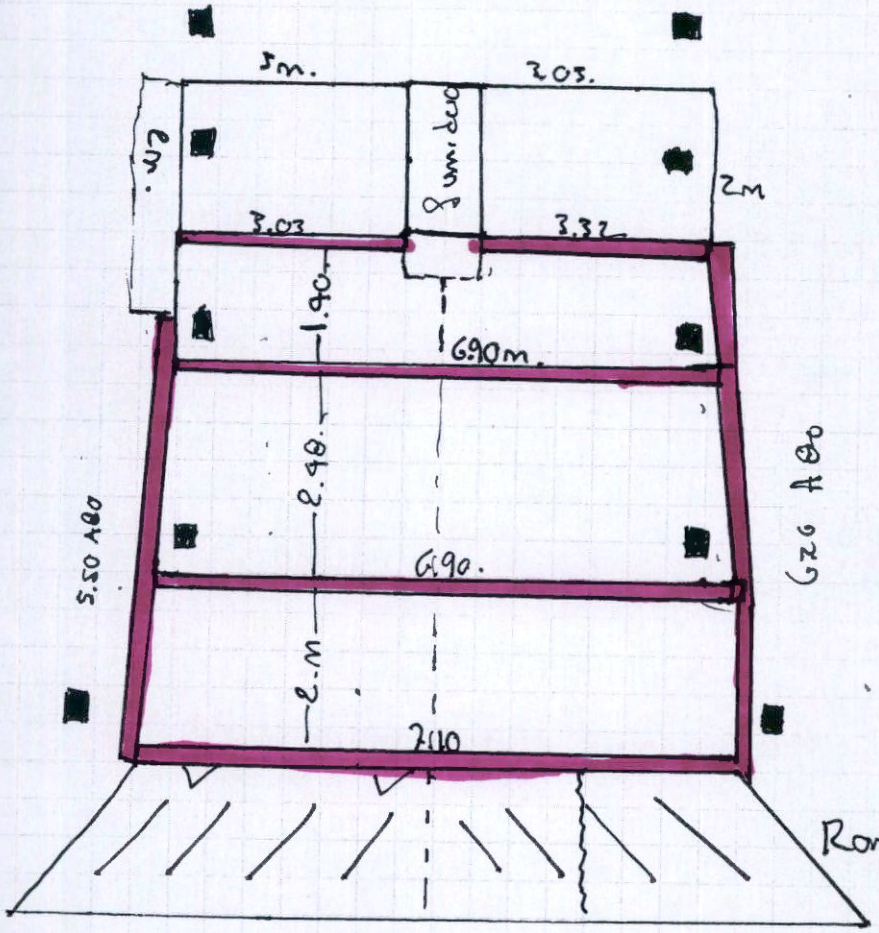

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 106 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1044

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 5 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
1,12	Construccion de anden en adoquin de arcilla sobre arena no incluye bordillo, no incluye redes	PAÑO 1	M2	2	2	4,00				4,00	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**4,00**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA


97

1045

Concreto.

Nivelación Adoquín.

Pompeliano 71.

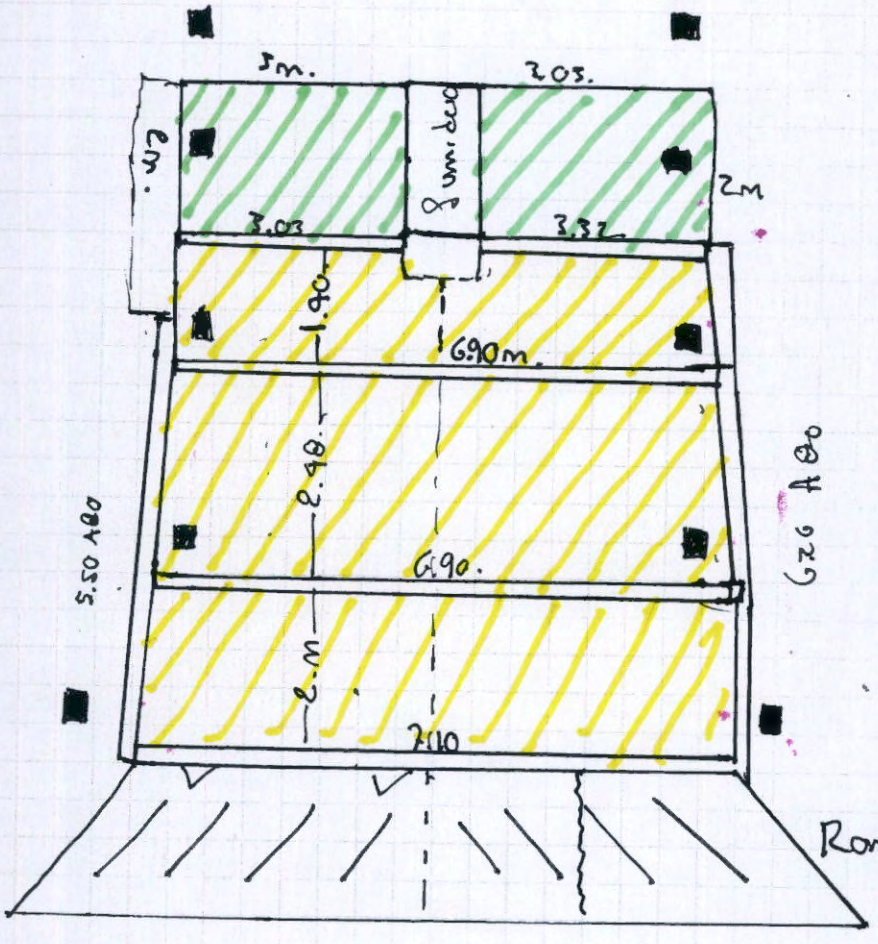

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1046

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 5 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	FACTOR DE EXPANSION	TOTAL	OBSERVACIONES
2,3	Transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 24 km)		M3	6,3	7,1	44,73	0,35	15,66	1,25	19,57	
				6,3	7,1	44,73	0,1	4,47	1,25	5,59	
				3	2	6,00	0,1	0,60	1,25	0,75	
				3	2	6,00	0,1	0,60	1,25	0,75	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**26,66**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA





OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

166


NIVELACIO

DEMOLICIÓN

EXCAVACIÓN.

BASE.

POMPEIANO 72.

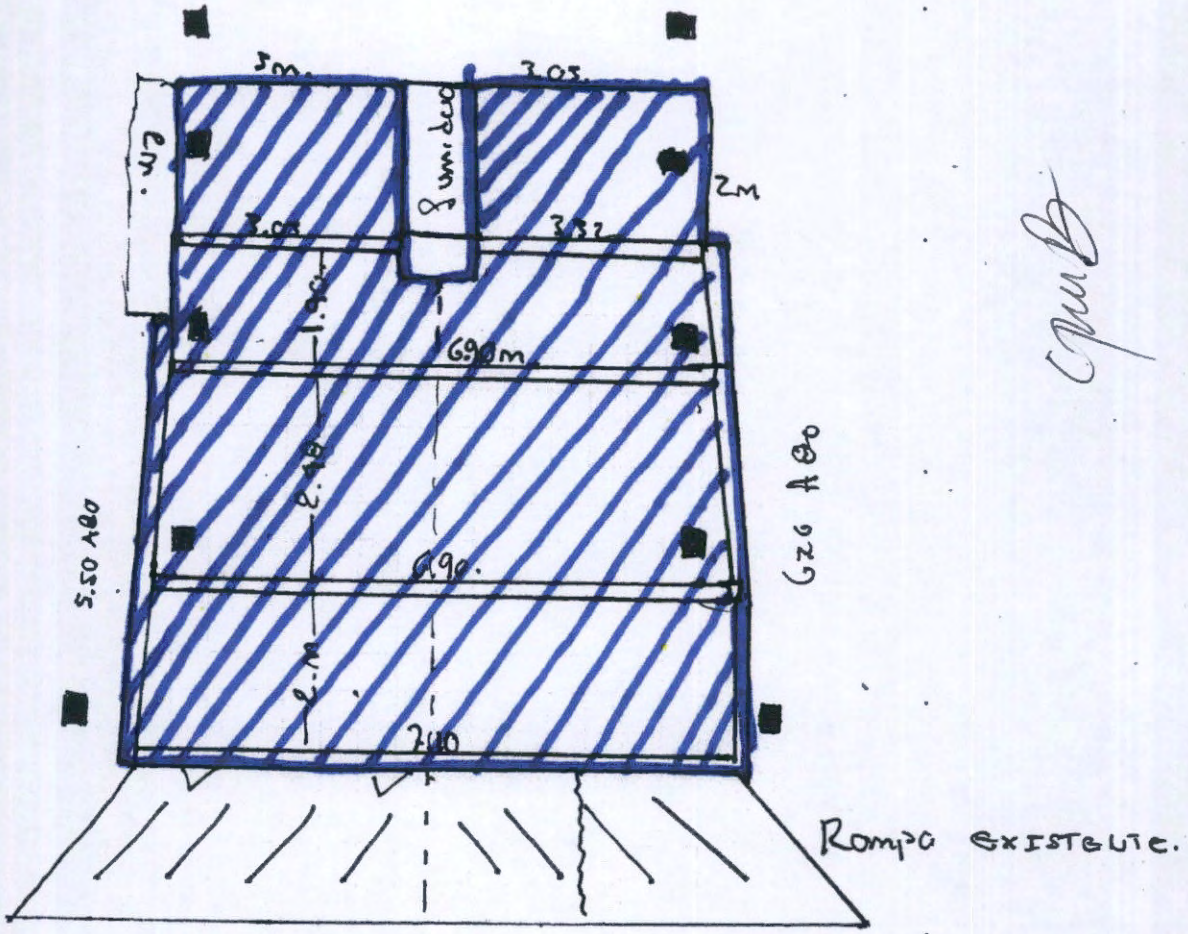

www.convcon.com.co

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1048

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 6 **CIV:** **COSTADO:**

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	CANTIDAD DE VARILLAS	DIAMETRO(m)	LONGITUD(m)	PESO(Kg)			TOTAL	OBSERVACIONES
NP-4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	PAÑO 1 POMPEYANO 71	KG	7	#4	6,00	42			42,00	
				7	#4	2,00	14			14,00	
				24	#4	2,00	48			48,00	
		PAÑO 2 POMPEYANO 71		9	#4	6,00	54			54,00	
				9	#4	2,00	18			18,00	
				24	#4	1,48	35,5			35,50	
		PAÑO 3 POMPEYANO 71		6	#4	6,00	36			36,00	
				6	#4	2,00	12			12,00	
				24	#4	1,40	33,60			33,60	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**293,10**	**KG**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

101

1049

EMPRESAS DE ACERO

BOGOTA
CHAPINERO
ELEMENTO POR ELEMENTO

POMPEYANO 71 PAÑO 1 (Es 1) Peso/Elemento= 104.00Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
6.00	7	#4	6.00	42.0	
2.00	7	#4	2.00	14.0	
2.00	24	#4	2.00	48.0	

POMPEYANO 71 PAÑO 2 (Es 1) Peso/Elemento= 107.52Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
6.00	9	#4	6.00	54.0	
2.00	9	#4	2.00	18.0	
1.48	24	#4	1.48	35.5	

PMPEYANO 71 PAÑO 3 (Es 1) Peso/Elemento= 81.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
6.00	6	#4	6.00	36.0	
2.00	6	#4	2.00	12.0	
1.40	24	#4	1.40	33.6	

(1050)

Pompeliano 71.

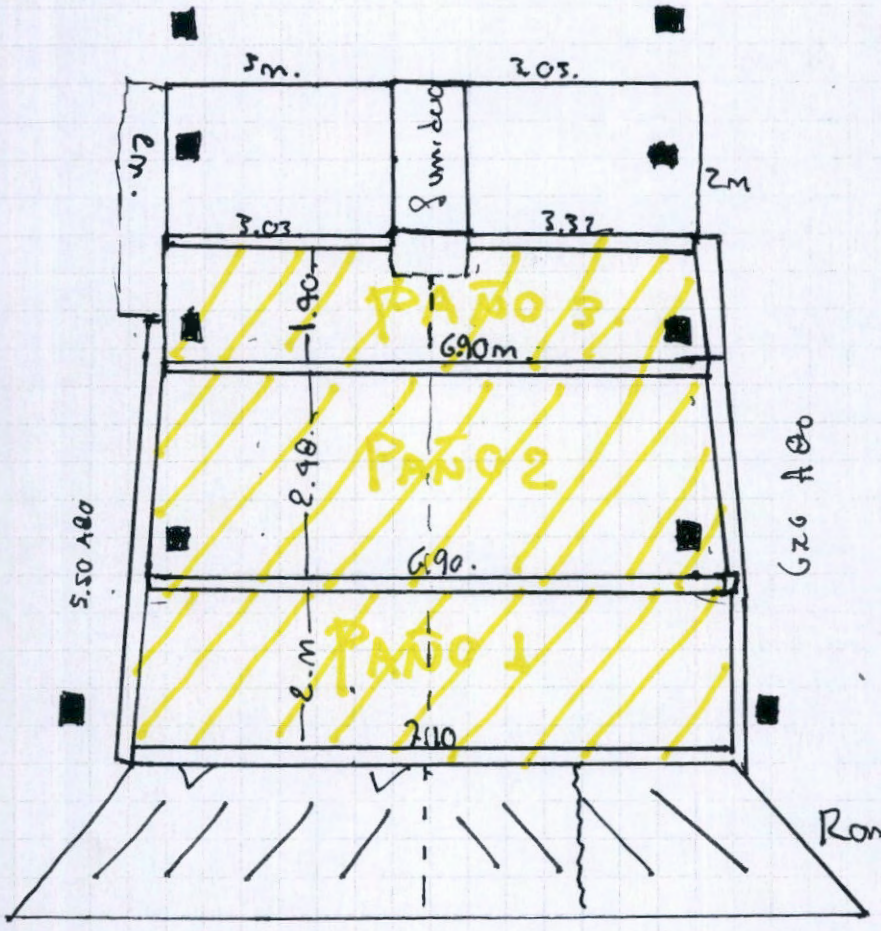

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1051

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 5 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-5	PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.20m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.		M2	6,9	1,4	9,66				9,66	
				6,9	2,48	17,11				17,11	
				7,1	2	14,20				14,20	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										**40,97**	**M2**

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA


104

Concreto.

Nivelación Adoquín.

1052

Pompeiano 71.

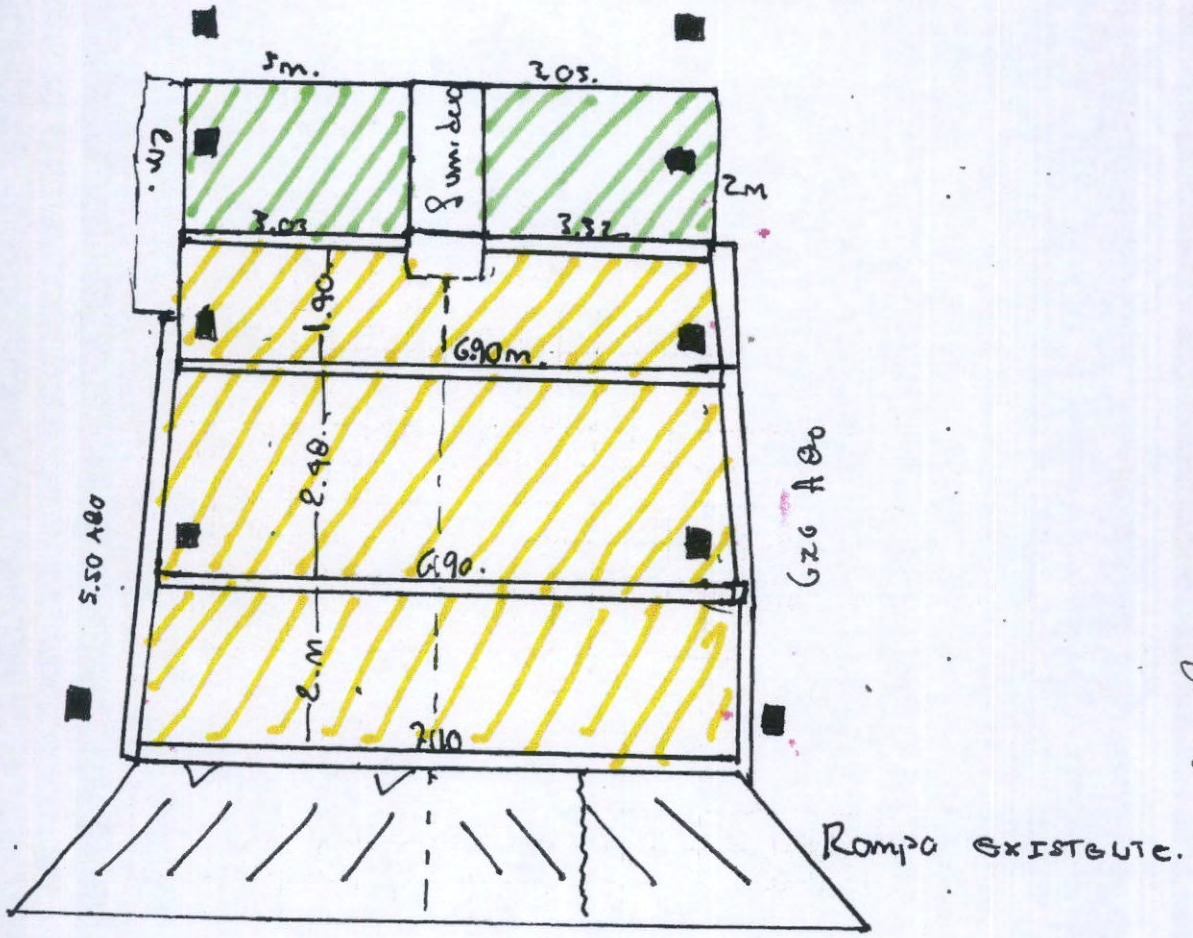

FECHA		
5	OCTUBRE	2018
DD	MM	AA

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CANTIDADES DE OBRA

1053

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR: RYM INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: POMPEYANO CALLE 71 CON CARRERA 5 CIV: COSTADO:

ITEM	DESCRIPCION	ESTRUCTURA Y/O PLACA Y/O ABSCISA	UNIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOL (m³)	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
NP-6	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	AREA POMPEYANO	M2	7,1	6,3	44,73				44,73	
CANTIDAD TOTAL A PAGAR										44,73	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

106

113

1054


NIVELACIO

DEMOLICION

EXCAVACION

BOSC.

POMPELLANO 72.

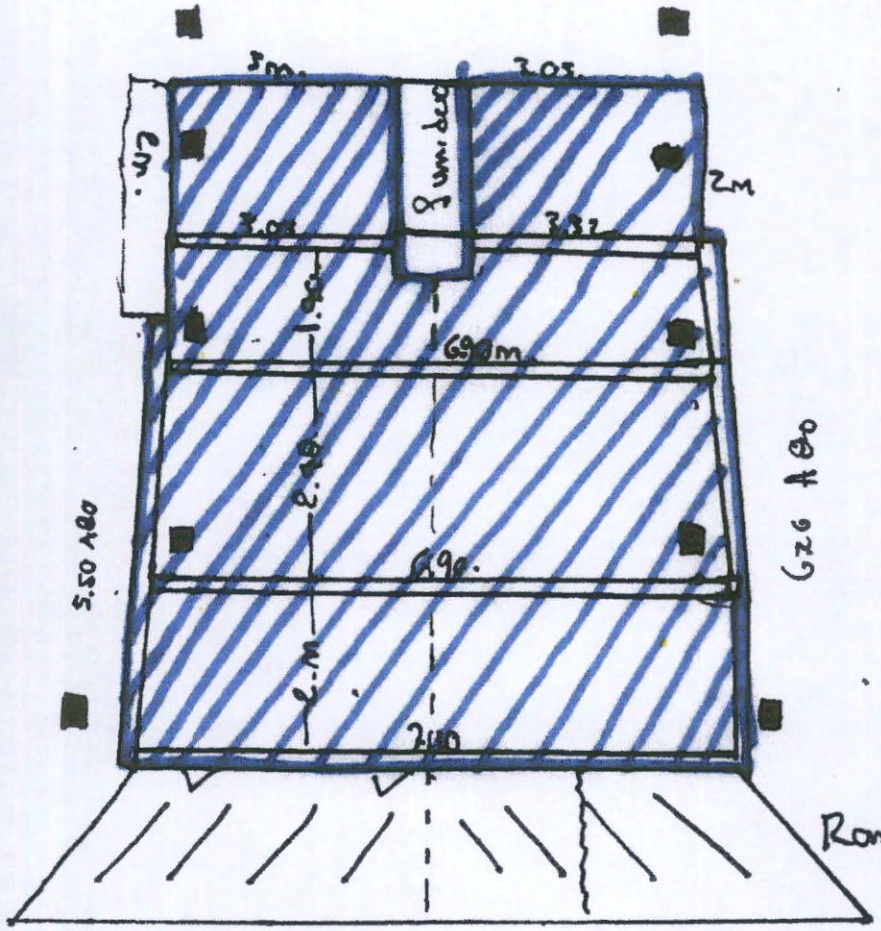

1055

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1. Tipo de Amparo:	X	Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo
		Pago anticipado
	X	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	X	Estabilidad y calidad de la obra
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
		Calidad del servicio
	X	Responsabilidad Civil Extracontractual
		Calidad de los bienes

2. Expedida Por:	**3. Fecha de expedicion:**	DIA	MES	AÑO
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		2	1	2019

4.N° de poliza GU128354; RE 002073

5. Beneficiario-tercero: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

6. Número Contrato o convenio: 100 DE 2017

7. Objeto del Contrato :

CONTRATAR PRO PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESRIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

8.Tomador:

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA , POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

9. Tipo de Amparos	valor del contrato	Porcentaje	Valor Asegurado ($)	10. Vigencia					
				Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTR	$ 1.879.393.996	10%	$ 187.939.399,60	22	11	2018	15	6	2019
PAGO SALARIOS, PRESTACI	$ 1.879.393.996	5%	$ 93.969.699,80	22	11	2018	15	12	2021
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE	$ 1.879.393.996	30%	$ 563.818.198,80	22	11	2018	22	11	2023
RESPONSABLIDAD CIVIL EX	$ 1.879.393.996	400 SMLMV%	$ 312.496.800,00	10	11	2018	15	12	2018

Observaciones POLIZA APLICA PARA LA PRORROGA No. 2 SUSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE APROBACION: **30-01-2019**

Revisado por: JUAN ANDRES ALVIZ GOMEZ
Cargo: ABOGADO MALLA VIAL

Firma

Aprobado por: HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Cargo: ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO

Firma:

1056

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Alcaldia Local de Chapinero
R No. 2019-521-000095-2
2019-01-04 08:57 - Folios: 1 Anexos: 3
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSSULTORIA Y CONSTRUCCI

Bogotá D.C. Enero 02 de 2019

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

DEPTO DE JURIDICA
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.100 de 2017 cuyo objeto es " CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C."

ASUNTO: Envió de Documentos

Cordial saludo,

*Para los fines pertinentes y de acuerdo con la **PRORROGA N° 2 FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018** del contrato citado en referencia, adjuntamos los siguientes documentos para su respectiva legalización:*

- *Póliza de Cumplimiento Nº GU 128354*
- *Póliza de responsabilidad civil Nº RE 002073*

Agradecemos su gentil atención.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Mfn

Dirección: Avenida Carrera 7 No. 127 - 48 Oficina 1006 Teléfono: 4 82 1681 Fax: 520 4147 Bogotá D.C.
E-mail: conycon@conycon.com.co

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 31 GU1283
CERTIFICADO 31 GU2151
CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 3160215

SUCURSAL: 31. CENTRO **USUARIO:** PENAD **TIP CERTIFICADO:** Modificacion **FECHA** DD 02 MM 01 AAAA 2019

VIGILADO supervisión de conducta

TOMADOR/GARANTIZADO:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**C.C. O NIT:**	830041411 0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	**CIUDAD:**	BOGOTA
E-MAIL:	CONYCON@CONYCON.COM.CO	**TELÉFONO:**	4821681
ASEGURADO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	**C.C. O NIT:**	899990619 7
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:** BOGOTA	**TEL.** 1
BENEFICIARIO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	**C.C. O NIT:**	899999061 9
DIRECCIÓN:	CR 13 54 74	**CIUDAD:** BOGOTA	**TEL.** 3385000

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 22 11 2018	HASTA 22 11 2023	845,727,298.20	0.00	845,727,298.

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM 3,249.75	MONEDA	VALORES
100.00	DPS ASESORES LTDA					PRIMA	PESOS	25,291.
						GAST. EXPED.	PESOS	7,000.
						IVA	PESOS	6,135.
						TOTAL		38,426.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE	
	Desde	Hasta				%	Mínimo
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22-11-2018	15-06-2019	187,939,399.60	187,939,399.60	17,181.00	0.00	0
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALE	22-11-2018	15-12-2021	93,969,699.80	93,969,699.80	8,110.00	0.00	0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22-11-2018	22-11-2023	563,818,198.80	563,818,198.80	0.00	0.00	0

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON PRORROGA No. 2 DE FECHA 22/11/2018 SE AJUSTA I NCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE EL 09/02/2018, FECHA DEL ACTA DE INICIO**

OBJETO DE LA PÓLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA I CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO SATISFACCION DE LA OBRA.

1,879.393.996

IZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
TULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.C CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010. LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA T REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O. II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES AN MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PAR TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CO MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762003390960 24/05/2017 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 200001 AL 300000 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 197975 AL 200000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)3160215127

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

1058

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 31 RE0020
CERTIFICADO 31 RE0069

CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 31500069

SUCURSAL: 31. CENTRO | USUARIO: PENAD | TIP CERTIFICADO: Modificacion | FECHA DD 02 MM 01 AAAA 2019

TOMADOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**C.C. O NIT:**	830041411 0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	**CIUDAD:**	BOGOTA
E-MAIL:	CONYCON@CONYCON.COM.CO	**TELÉFONO:**	4821681
ASEGURADO:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**C.C. O NIT:**	830041411 0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	**CIUDAD:** BOGOTA	**TEL.** 4821681
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	**C.C. O NIT:**	082740
DIRECCIÓN:	0	**CIUDAD:** 0	**TEL.** 0

VIGENCIA

	DD	MM	AAAA
DESDE	10	11	2018
HASTA	15	12	2018

VALOR ASEGURADO EN PESOS

ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
312,496,800.00	0.00	312,496,800.

INTERMEDIARIO

%PART	NOMBRE
100.00	DPS ASESORES LTDA

COASEGURO

COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO

PRIMA

TRM	MONEDA	VALORES
PRIMA	PESOS	47,945.
GAST. EXPED.	PESOS	0.
IVA	PESOS	9,110.
TOTAL		**57,055.**

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILDID CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMOVIL CONTRATADA O NO CO LÍMITES MINIMOS POR EVENTO DE $100.000.000/$100.000.000/$200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXIS ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

*** AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA**

OPERAN EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA CO UN LIMITE MINIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMEN RESPONSABLE.

***CLAUSULAS DE GARANTIA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS RESPECTIVOS AISLAMIENTOS DE LA OBRA Y A TOMAR LA ...PECTIVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON CERRAMIENTOS, MALLAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, AVISOS ETC. EL CONTRATISTA DEB ...TAR CON UN PLAN DE MANEJO VEHICULAR DONDE SE INVOLUCREN ACTIVIDADES COMO PASOS TEMPORALES PEATONES Y VEHÍCULO ...ALACIÓN DE BARRICADAS, CANECAS REFLECTIVAS, CONOS LUMINOSOS, DELINEADORES DEMARCACIONES DE CALZADA ETC.**

EXCLUSION DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERÁ COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DI COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LE ...TIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.
...IZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
...ÍTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
...IRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.C CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA, S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA T REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES AN MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PAR TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CO MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762002953906 19/04/2017 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 004247 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)3150006952

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 31 RE0020
CERTIFICADO 31 RE0069

CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 3150006

SUCURSAL: 31. CENTRO | USUARIO: PENAD | TIP CERTIFICADO: Modificacion | FECHA: DD 02 MM 01 AAAA 2019

TOMADOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**C.C. O NIT:**	830041411 0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	**CIUDAD:**	BOGOTA
E-MAIL:	CONYCON@CONYCON.COM.CO	**TELÉFONO:**	4821681
ASEGURADO:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**C.C. O NIT:**	830041411 0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	**CIUDAD:** BOGOTA	**TEL.** 4821681
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	**C.C. O NIT:**	082740
DIRECCIÓN:	0	**CIUDAD:** 0	**TEL.** 0

VIGILADO

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 10 MM 11 AAAA 2018	HASTA DD 15 MM 12 AAAA 2018	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		312,496,800.00	0.00	312,496,800.

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM	MONEDA	VALORES
100.00	DPS ASESORES LTDA					PRIMA	PESOS	47,945.
						GAST. EXPED.	PESOS	0.
						IVA	PESOS	9,110.
						TOTAL		57,055.

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Predios, Labores y Operaciones - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	312,496,800.00	312,496,800.00	47,945.00	10.00	5,000,000
Predios, Labores y Operaciones - Evento	10-11-2018	15-12-2018	312,496,800.00	312,496,800.00	0.00	10.00	5,000,000
Responsabilidad Civil Patronal - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
Responsabilidad Civil Patronal - Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
tista y Subcont Independiente-Vigen	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
tista y Subcont Independiente-Event	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
Vehiculos Propios y No Propios - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
Vehiculos Propios y No Propios -Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
Perjuicios Extrapatrimoniales - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
Perjuicios Extrapatrimoniales - Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
Lucro Cesante - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
Lucro Cesante - Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
Responsabilidad Civil Cruzada - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	10.00	2,500,000
Responsabilidad Civil Cruzada -Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	10.00	1,500,000
Gastos Medicos - Vigencia	10-11-2018	15-12-2018	62,499,360.00	62,499,360.00	0.00	0.00	0
Gastos Medicos - Evento	10-11-2018	15-12-2018	31,249,680.00	31,249,680.00	0.00	0.00	0

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON PRORROGA No. 2 DE FECHA 22/11/2018 SE AJUSTA I VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

****LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE EL 09/02/2018, FECHA DEL ACTA DE INICIO****

OBJETO DE LA PÓLIZA: INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZ CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 100 DE 2017 CUYO OBJETO E "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DI ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

NOTAS:
*** ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: ALCALDIA LOCAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO.**
*** AMPARO DE VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS**

EXCLUSION DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERÁ COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DI COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LE ATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.
IZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
ÍTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
IRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.C CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR DE LA PRIMA META SE HARA EFECTIVO A LA T REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO. EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES AN MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PAR TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CO MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762002939806 19/06/2017 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 004247 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)3150006952

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

1066

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1. Tipo de Amparo:		Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo
		Pago anticipado
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	X	Estabilidad y calidad de la obra
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
		Calidad del servicio
		Responsabilidad Civil Extracontractual
		Calidad de los bienes

2. Expedida Por:	**3. Fecha de expedicion:**	DIA	MES	AÑO
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		25	2	2019

4.N° de poliza GU 128354

5. Beneficiario-tercero: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

6. Número Contrato o convenio: 100 DE 2017

7. Objeto del Contrato :

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESRIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

8.Tomador:

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, ESPECIFICAMENTE EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA DE CONFORMIDAD CON LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

9. Tipo de Amparos	valor del contrato	Porcentaje	Valor Asegurado ($)	10. Vigencia					
				Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTR	$ 1.879.393.996	10%	$ 187.939.399,60	22	11	2018	15	6	2019
PAGO SALARIOS, PRESTAC	$ 1.879.393.996	5%	$ 93.969.699,80	22	11	2018	15	12	2021
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE	$ 1.879.393.996	30%	$ 563.818.198,80	30	1	2019	30	1	2024

Observaciones LA APROBACIÓN RECAE ESPECIFICAMENTE SOBRE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. CUYA VIGENCIA FUE ACTUALIZADA DE CONFORMIDAD CON LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE APROBACION: 01-03-2019

Revisado por: JUAN ANDRES ALVIZ GOMEZ
Cargo: ABOGADO MALLA VIAL

Firma

Aprobado por: HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Cargo: ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO

Firma:

Pendiente Imprimir

1661

Alcaldia Local de Chapinero
R No. 2019-521-002193-2
2019-02-25 15:36 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: JUAN PABLO RICCI RUIZ

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Bogotá D.C. Febrero 25 de 2019

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

DEPTO DE JURIDICA
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.100 de 2017 cuyo objeto es " CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C."

ASUNTO: Envió de Documentos

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes y de acuerdo con el ***ACTA DE RECIBO FINAL FECHA DEL 30 DE ENERO DE 2019*** *del contrato citado en referencia, adjuntamos los siguientes documentos para su respectiva legalización:*

- *Póliza de Cumplimiento Nº GU 128354*

Agradecemos su gentil atención.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Mfn

Dirección: Avenida Carrera 7 No. 127 - 48 Oficina 1006 Teléfono: 4 82 1681 Fax: 520 4147 Bogotá D.C.
E-mail: conycon@conycon.com.co

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 31 GU128354
CERTIFICADO 31 GU216065

SUCURSAL: 31. CENTRO | USUARIO: BONILLAN | TIP CERTIFICADO: Modificacion | FECHA DD MM AAAA: 25 02 2019

TOMADOR/GARANTIZADO:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	C.C. O NIT: 830041411	0
DIRECCIÓN:	AK 7 127 48 OF 1006	CIUDAD: BOGOTA	
E-MAIL:	CONYCON@CONYCON.COM.CO	TELÉFONO: 4821681	
ASEGURADO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	C.C. O NIT: 899990619	7
DIRECCIÓN:		CIUDAD: BOGOTA	TEL. 1
BENEFICIARIO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	C.C. O NIT: 899999061	9
DIRECCIÓN:	CR 13 54 74	CIUDAD: BOGOTA	TEL. 3385000

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 22 11 2018	HASTA 30 01 2024	845,727,298.20	0.00	845,727,298.20

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM 3,249.75	MONEDA	VALORES
100.00	DPS ASESORES LTDA					PRIMA	PESOS	0.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	0.00
						IVA	PESOS	0.00
						TOTAL		0.00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE	
	Desde	Hasta				%	Mínimo
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22-11-2018	15-06-2019	187,939,399.60	187,939,399.60	0.00	0.00	0.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIO	22-11-2018	15-12-2021	93,969,699.80	93,969,699.80	0.00	0.00	0.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-01-2019	30-01-2024	563,818,198.80	563,818,198.80	0.00	0.00	0.00

ETO DE LA MODIFICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO SUSCRITA POR PARTES DE FECHA 30.01.2019 SE ACTUALIZA EL INICIO DE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD A PARTIR DE LA MISMA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

****LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE EL 09/02/2018, FECHA DEL ACTA DE INICIO****

OBJETO DE LA PÓLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 100 DE 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

PÓLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
ARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARA LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA, TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C.
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762003390966 24/05/2017 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 200001 AL 300000 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 197975 AL 200000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO
