
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc
1		**CONTRATO 4017 - INICIO PRORROGA**	**60 días**	**jue 3/08/23**	**lun 2/10/23**	
2		INCIO	0 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	
3		**FRENTE: 'EJECUTAR ADECUACION POLIDEPORTIVO LA PRIMAVERA´ CARRERA 33 CON CALLE 33B, COMUNA 11**	**60 días**	**jue 3/08/23**	**lun 2/10/23**	
4		PRELIMINARES	24 días	jue 3/08/23	dom 27/08/23	
5		DESMONTE DE REFLECTORES	1 día	jue 3/08/23	vie 4/08/23	2CC
6		DESMONTE DE CUBIERTA METALICA	5 días	vie 4/08/23	mié 9/08/23	5
7		DEMOLICION TAPAS DE CONCRETO	5 días	jue 10/08/23	mar 15/08/23	12
8		CORTE DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	5 días	mar 15/08/23	dom 20/08/23	7
9		DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	2 días	dom 20/08/23	mar 22/08/23	8
10		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION TRANSPORTE Y ACARREO EN OBRA	5 días	mar 22/08/23	dom 27/08/23	9
11		DESAGUES	34 días	mié 9/08/23	mar 12/09/23	
12		LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1 día	mié 9/08/23	jue 10/08/23	6
13		EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	3 días	jue 10/08/23	dom 13/08/23	12
14		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION TRANSPORTE Y ACARREO EN OBRA	3 días	sáb 12/08/23	mar 15/08/23	13CC+2 días
15		COLCHON ARENA-GRAVA TUBERERIAS INCLUYE ACARRE	3 días	mar 15/08/23	vie 18/08/23	14
16		TUBERIA PVC SANITARIA 4"	3 días	mié 16/08/23	sáb 19/08/23	15CC+1 d
17		RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADA CON SALTARIN AL 90% P.M. INCLUYE (FACTOR DE EXPANSION,TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO)	1 día	sáb 19/08/23	dom 20/08/23	16
18		REPOSICION LOSA CONCRETO E=12 CM	3 días	dom 20/08/23	mié 23/08/23	17
19		DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	5 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	18
20		SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	5 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	19CC
21		REPOSICION TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI A=28 CM L=60 CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN DISEÑO	10 días	sáb 2/09/23	mar 12/09/23	22
22		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (incluye transporte flejado y doblado y desperdicios)	5 días	lun 28/08/23	sáb 2/09/23	20
23		CONEXIÓN TUBERIA A CAJA DE INSPECCION	1 día	sáb 19/08/23	dom 20/08/23	16
24		REPOSICION CUBIERTA	10 días	mié 13/09/23	sáb 23/09/23	
25		SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .27 MM	10 días	mié 13/09/23	sáb 23/09/23	40
26		CANALES Y DESAGUES CUBIERTA	8 días	vie 15/09/23	sáb 23/09/23	
27		CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18. 25x25 cm, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE GANCHOS SOPORTE. Y PINTURA ESMALTE EXTERIOR (2M)	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	25CC+2 días
28		CONEXIÓN CANAL-BAJANTE	2 días	vie 15/09/23	dom 17/09/23	27CC
29		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	28CC
30		YEE PVC SANITARIA SENCILLA 4"	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	29CC
31		SUMINISTRO E INSTALACION CODO 4X45 CXC	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	30CC
32		SUMINISTRO E INSTALACION CODO 4X90 CXC	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	31CC
33		SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PARA TUBERIA DE 4" (EN PLATINA SUJETO A ESTRUCTURA CON TUERCA MORDAZA)	5 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23	32CC
34		LIMPIEZA RESANE CAJA INSPECCION	2 días	vie 15/09/23	dom 17/09/23	33CC
35		CONEXIÓN TUBERIA A CAJA DE INSPECCION	2 días	dom 17/09/23	mar 19/09/23	34
36		DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MAN	4 días	mar 19/09/23	sáb 23/09/23	35
37		MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA	29 días	jue 24/08/23	vie 22/09/23	
38		LIMPIEZA MANUAL ESTR.METALICA CUBIERTA (TIPO SSPC-SP2) PARA REMOVER CASCARILLA DE AMINACIÓN DESPRENDIDA, HERRUMBE Y PINTURA DESCASCARADA CON HERRAMIENTAS MANUALES NO MECÁNICAS. SOBRE PERFILES METALICOS DE LAS CERCHAS, CORREAS, TENSORES Y COLUMNAS. INCLUYE	10 días	jue 24/08/23	dom 3/09/23	6FC+15 días
39		PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	10 días	dom 3/09/23	mié 13/09/23	38
40		SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE EN VARILLAS-VIENTOS ESTRUCT. METALICA CUBIERTA	10 días	dom 3/09/23	mié 13/09/23	39CC
41		PINTURA ESMALTE EN BAJANTES	2 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23	29
42		OTROS	2 días	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	
43		INSTALACION DE REFLECTOR	2 días	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	25
44		ZONA VERDE	9 días	sáb 23/09/23	lun 2/10/23	
45		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	5 días	sáb 23/09/23	jue 28/09/23	36
46		RECUPERACION SUELO - ABONO	5 días	lun 25/09/23	sáb 30/09/23	45CC+2 d
47		PRADO TRENZA	5 días	mié 27/09/23	lun 2/10/23	46CC+2 d
48		FINAL	0 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	47

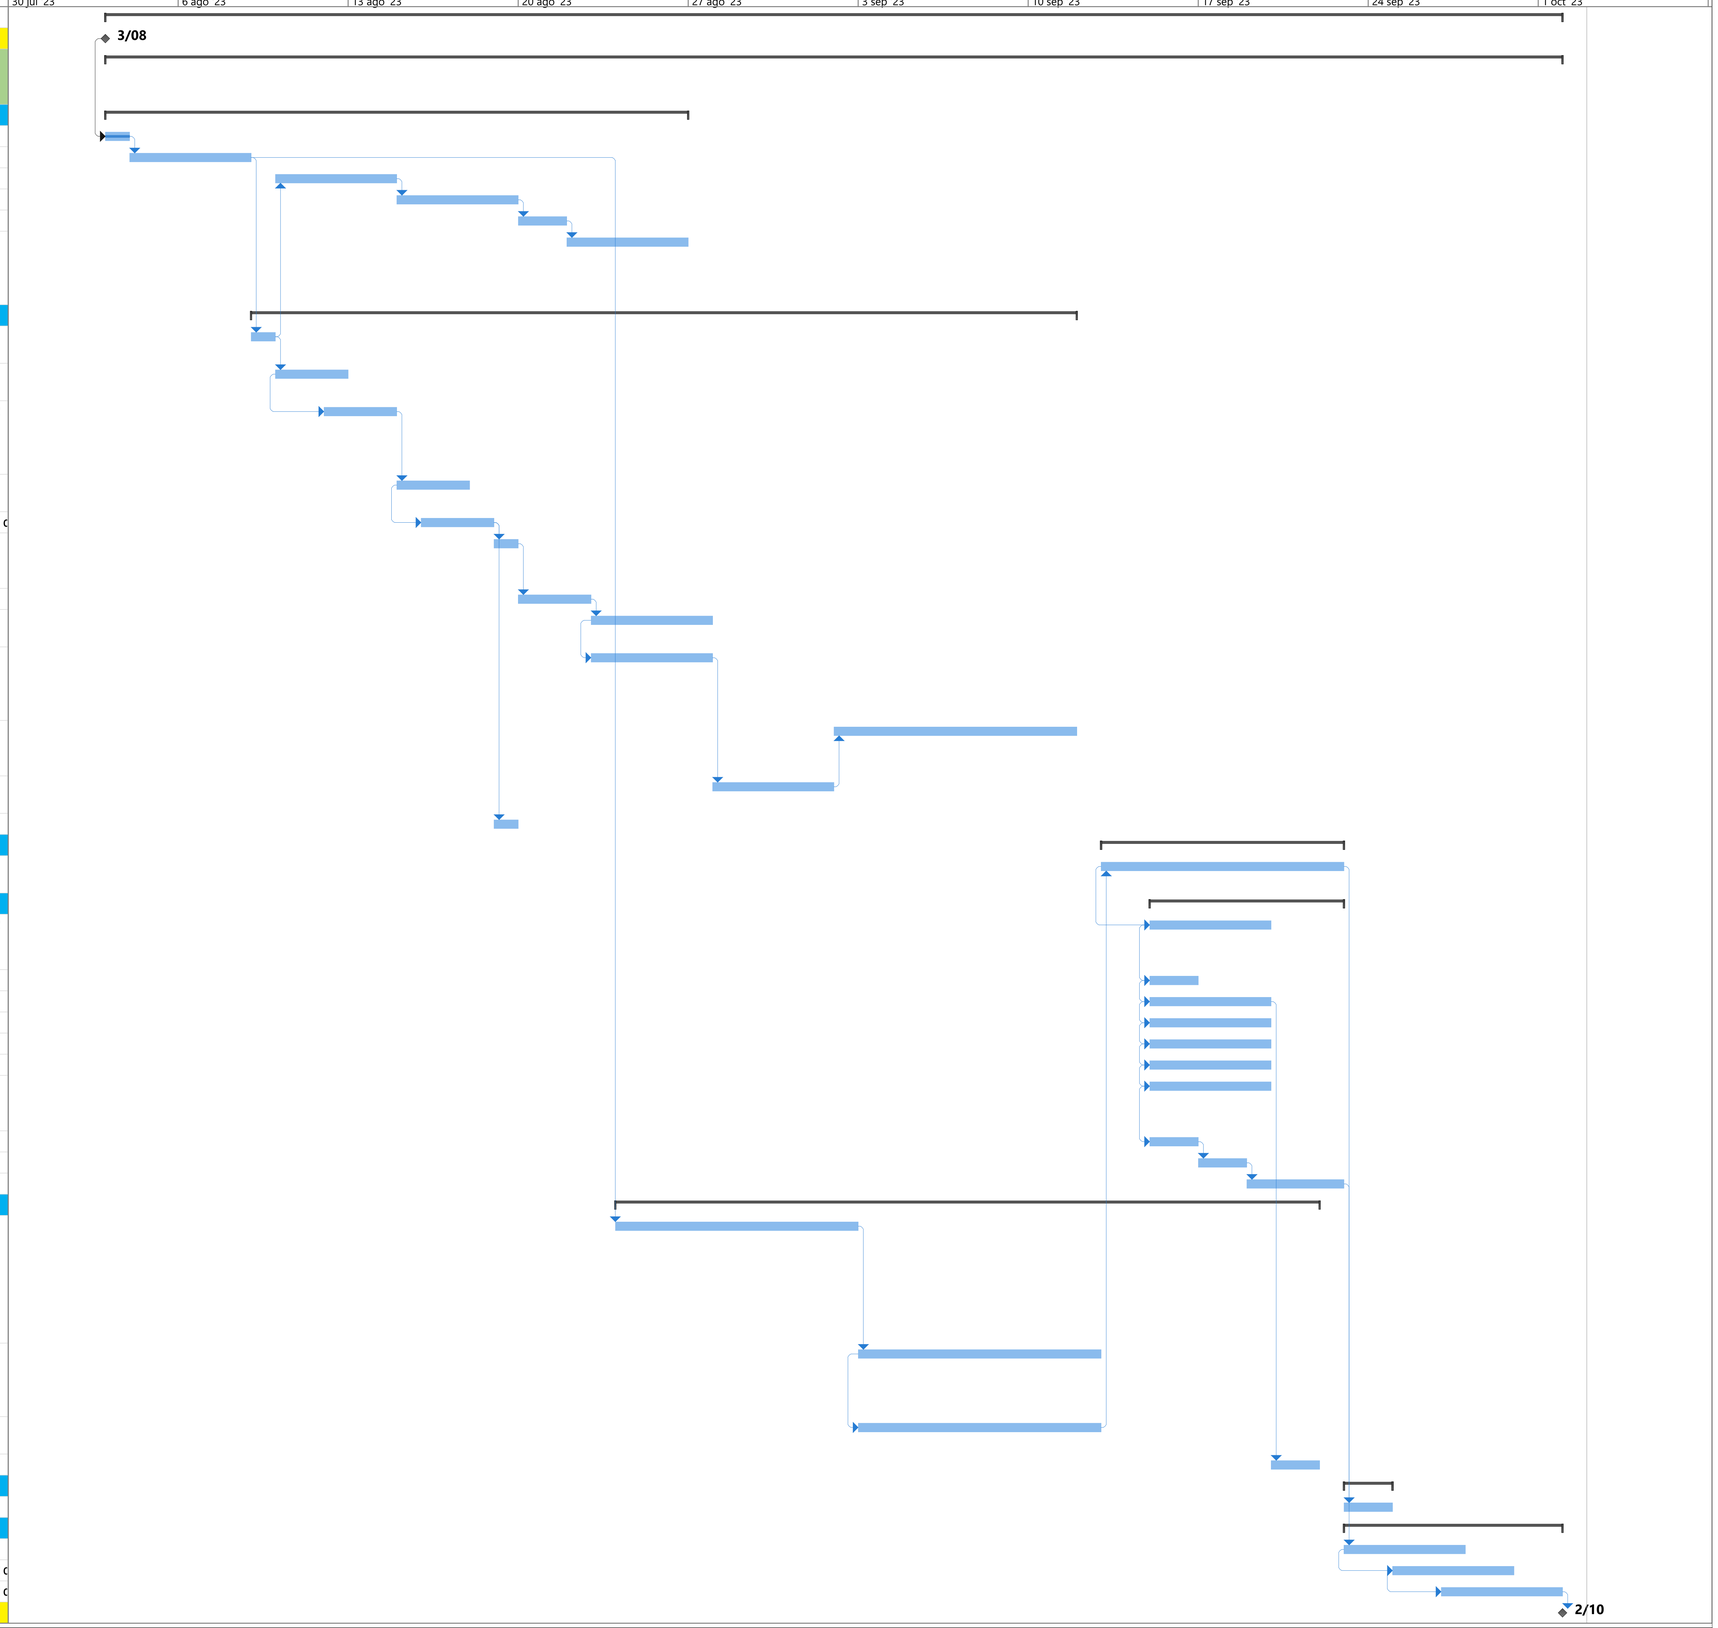

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mié 26/07/23

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso
