&NGECON S.A.S
construcciones

# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

**Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.**

Facatativá, 19 de noviembre de 2022

Señores:
Defensoría del pueblo

Informe final de trabajos realizados hasta la fecha

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,00 | OBRAS CIVILES | | |
| 1,01 | DESMONTE DE DRYWAL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 18,50 |
| 1,02 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA INCLUYE MARCO | U | 1,00 |
| 1,03 | DESMONTE DE PUERTAS | U | 1,00 |
| 1,04 | DESMONTE PASAMANOS | M | 4,00 |








**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892**

# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

**Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.**











Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,05 | DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA | M2 | 4,97 |













**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,06 | S/I DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8mm INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTE | M2 | 27,20 |
| 1,07 | S/I PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON ESTRUCTURA METALICA 1,60 m x 2.10m (INCLUYE HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | U | 1,00 |
| 1,08 | S/I PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON ESTRUCTURA METALICA 1,18 m x 2.10m (INCLUYE HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | U | 1,00 |
| 1,09 | S/I PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON ESTRUCTURA METALICA 1,00 m x 2.10m (INCLUYE HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | U | 1,00 |
| 1,10 | S/I PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON ESTRUCTURA METALICA 2,00 m x 2.10m (INCLUYE HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | U | 1,00 |



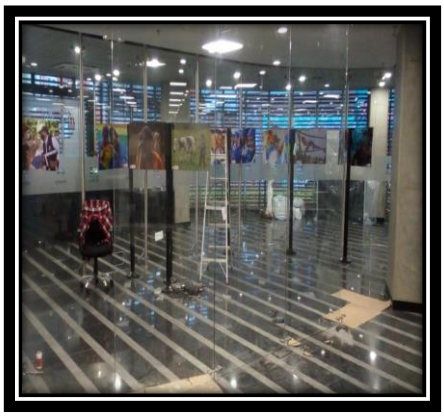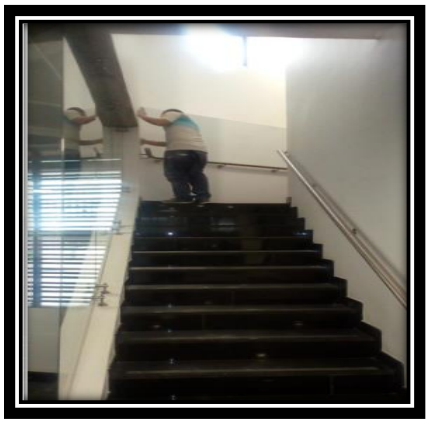


**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892**

# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

**Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.**

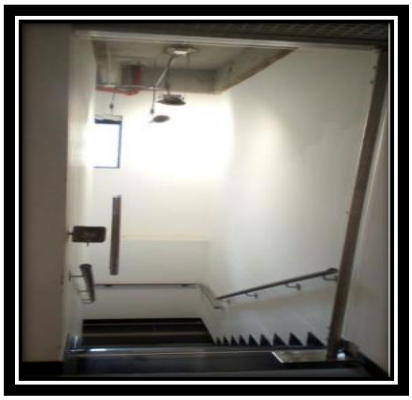



Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,12 | MURO LÁMINA DE PANEL YESO DE 12MM. DOBLE CARA (E=12 CM) | M2 | 52,40 |
| 1,13 | ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES | M2 | 220,00 |
| 1,14 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) | M2 | 220,00 |
| 1,15 | ZOCALO EN PORCELANATO SEGÚN DISEÑO EXISTENTE O SIMILAR | M | 28,50 |











# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

**Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.**









**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP | UN | 10,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, YACCESORIOS | UN | 18,00 |
| 2,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. color naranja, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETAMETALICA Y ACCESORIOS | UN | 14,00 |
| 2,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS | MTS | 61,00 |
| 2,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TELEVISION | UN | 1,00 |

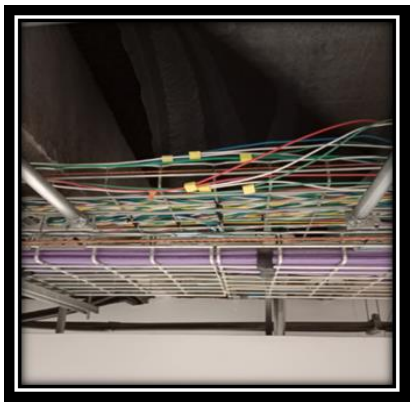







**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 892 3892**

# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

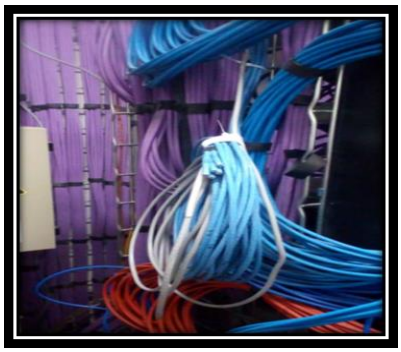


Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 2 Resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 842 6559

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"X3Mts | MTS | 36,00 |
| 2,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1"X3 Mts | MTS | 8,00 |
| 2,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 2"X3 Mts | MTS | 6,00 |
| 2,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Cable 3XNo12 LSHF, EN CAJAS RAWELT Y TUBRIAEMT DE 3/4" Y ACCESORIOS | UND | 2,00 |
| 2,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS, EN CABLE UTP CAT 6A LSHF, EN CANALETA METALICA | UN | 14,00 |
| 2,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOMETRICO EN LA SALIDAS DEL SEGUNDO PISO | UN | 2,00 |








**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 2 Resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 842 6559**


# &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.





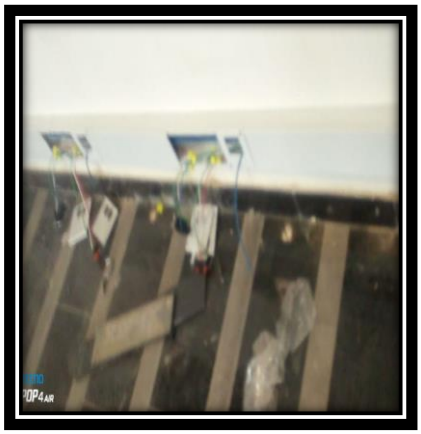


OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
CC No 11.438.286 de Facatativá
Representante legal &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S.

**Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 2 Resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 842 6559**
