RECIBIDO 31 JUL 2023

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

901.383.717-3

GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_188

Medellín, 10 de julio de 2023

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ATN: EDUARDO HERRERA ZAMBRANO
SUPERVISOR DEL PROYECTO
CALLE 42B # 52-106 PISO 9 OFICINA 906 EDIFICIO LA ALPUJARRA
MEDELLIN

REF: CONTRATO No 4600014886, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA – TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL No. 6 JUNIO DE 2023 DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO No. 4600014886 DE 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta Interventoría hace entrega del Informe mensual # 6 en medio físico para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023 de los componentes Técnico, Social, Ambiental y SST con sus respectivos anexos, para así dar cumplimiento a los términos establecidos en el contrato No. 4600014886.

TIPO INFORME	ENTREGABLES
Informe técnico No. 6 – junio de 2023	Folios 102 y Cd con anexos.
Informe Ambiental No. 6 – junio de 2023	Folios 21 y Cd con anexos
Informe SST No. 6 – junio de 2023	Folios 15 y Cd con anexos
Informe Social No. 6 – junio de 2023	Folios 27 y Cd con anexos
	1 Cd actas vecindad Armenia
	1 Cd actas entorno Armenia
	2 Cd actas vecindad Heliconia
	2 Cd actas entorno Heliconia

GNG®

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

901.383.717-3

GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_188

Todos los informes antes relacionados fueron entregados a la supervisión en medio digital a través de correo electrónico.

Atentamente,

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S

JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN CIENTO SESENTA Y CINCO (165) FOLIOS.

Elaboro: JFHL
Revisó: JFHL
Aprobó: JFHL

Copia:

RECIBIDO 31 JUL 2023
Archivo SRF

CONTRATO 4600014886

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 06
SOCIAL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Firma: Mª Ximena U	Firma:	Firma: Fco Zapata.
Elaboró: María Ximena Uribe Residente Social Interventoría	**Revisó:** John Fredy Henao Londoño Director Interventoría	**Aprobó:** Francisco Javier Zapata Arango Apoyo a la Supervisión Social SIF

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
- Localización Del Proyecto 5
- Contrato De Obra 8
- Contrato De Interventoría 9

3. PLAN DE GESTION SOCIAL 10
- Personal Mínimo Requerido 10
- Personal Del Contratista 11

Personal De La Interventoría 18
4. FUNCIONES DEL PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA 19
5. FUNCIONES DEL PERSONAL RESIDENTE SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA SON: 21
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADAS 23
7. PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO 24
- Actas de vecindad 24
- Actas de Entorno 25

8. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA 27
- Manejo de Socialización con la Comunidad 27

9. PROGAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION 29
- Distribución y/o instalación de piezas de comunicación, generadas por el proyecto: 29
- Cartelera Informativa: 33

10. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO 35
- Ubicación Punto de Atención al Ciudadano (PAC) 35
- Buzón de sugerencias: 35
- PQRS 36

11. PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 36
- Empleabilidad general 38
- Empleabilidad mujeres 38

12. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO ... 39
13. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA ... 41
15. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA. ... 43
- Comités De Seguimiento ... 44
- Recorridos Visitas De Seguimiento ... 45

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA ... 53
17. ANEXOS ... 53

1. INTRODUCCIÓN

Las redes viales llenan sin lugar a dudas una necesidad esencial en el mundo moderno, La construcción o mejoramiento de cualquier ruta representa el cumplimiento de anhelos a veces largamente esperados. En general, se asume que toda obra vial es un avance definitivo que se integra al patrimonio público, y como tal, prestará servicio en buenas condiciones por un período muy prolongado. Sin embargo, dicha expectativa se ve frustrada cuando alguna vía se deteriora en forma prematura, o lo que es peor, cuando extensas partes de la red se degradan hasta caer en mal estado, entorpeciendo la conectividad que deben brindar.

El proyecto "Mejoramiento de los Corredores y Atención de Sitios Críticos de las Vías de Segundo Orden: Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura – Titiribí (60AN08-1), y la Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (62AN17), en la Subregión Occidente del Departamento de Antioquia", tiene como propósito disminuir los impactos sociales que se generen durante el proceso de construcción, para así brindar un mejor desarrollo en aspectos colectivos para las zonas de intervención y que, a la vez, mejoren la economía, la educación, la salud, entre otros.

Con el fin de dar cumplimiento al plan de gestión social, se presenta este informe de Interventoría, en donde se da a conocer el plan de acción a desarrollar que garantiza el desarrollo normal de las actividades generales previstas en la obra civil, de forma equilibrada y armónica con el proyecto, de conformidad con los lineamientos sociales establecidos por la Gobernación de Antioquia, mediante la Guía de Manejo Socioambiental y SST, que deben ser aplicados a obras desarrolladas en su área de influencia.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Objeto del proyecto: "Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos de las vías de segundo orden: Alto del Chuscal – Armenia - La Herradura - Titiribí (60AN08-1), y La Miserenga (cruce ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (62AN17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia";

Con este proyecto se pretende mejorar 6,6566 kilómetros de correspondientes a las vías Alto del Chuscal – Armenia – La Herradura – Titiribí (Código: 60AN08-1) en el tramo del Km 0+009,30 al Km 3+009,00 desde la intersección del Alto del Chuscal. Y La Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (Código: 62AN17) en el tramo del K56+839.30 al K58+917.00 y del Km 59+826.90 al Km 61+405.80.

Plazo: El plazo para la ejecución de las obras está estimado en DIEZ (10) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.
Plazo de ejecución por vigencia 2022: 1 mes
Plazo de ejecución por vigencia 2023: 9 meses
Plazo de ejecución total: 10 meses

- **Localización Del Proyecto**

El proyecto se encuentra ubicado en el noroeste de Colombia, en el departamento de Antioquia, situado principalmente dentro de la cordillera de los Andes con una superficie de 63.612 km2.

Heliconia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Ebéjico, por el este con el municipio de Medellín, por el sur con los municipios de Angelópolis y Armenia y por el oeste con Armenia y Ebéjico. Su cabecera dista 41 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. El municipio posee una extensión de 117 kilómetros cuadrados, y una altura sobre el nivel del mar de 1140 metros. El distrito tiene 3 corregimientos, "Alto del Corral", "Pueblito" y "Los llanos de San José". También está conformado por 15 veredas. El municipio se comunica por carretera con los municipios de Ebéjico, Medellín, Angelópolis y Armenia.

Armenia, conocida también como Armenia Mantequilla, es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Ebéjico, Anzá y Heliconia, por el este con los municipios de Heliconia y Angelópolis, por el sur con Angelópolis y Titiribí, y por el oeste con Concordia y Betulia. Su cabecera municipal está a 51 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, y el municipio posee una extensión de 110 kilómetros cuadrados y está a una altura sobre el nivel del mar de 1800 metros. Armenia Mantequilla


posee un corregimiento, La Herradura, y 15 veredas (Palo Blanco, La Quiebra, Travesías, Mojones, Cartagüeño, El Ensenillal, La Loma, El Socorro, Palmichal, El Tambor, El Viringo, entre otras).

Titiribí es un municipio de la República de Colombia, localizado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Armenia y Angelópolis, por el este con los municipios de Angelópolis y Amaga, por el sur con el municipio de Venecia, y por el oeste con el municipio de Concordia. El área municipal es de 142 km², con un territorio montañoso correspondiente a la cordillera Central de los Andes y regado por los ríos Cauca y Amagá.


Ebéjico es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, Limita por el norte con los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, por el este con los municipios de San Jerónimo y Medellín, por el sur con los municipios de Heliconia y Armenia y por el oeste con el municipio de Anzá. Su cabecera dista 42 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Su extensión es de 235 kilómetros cuadrados. Este municipio está dividido administrativamente en 4 corregimientos, El Brasil, Sevilla, La Clara y Guayabal, y en 33 veredas; entre ellas, Fátima, Blanquizal, Comunidad y La Renta. Ebéjico se comunica por carretera con los municipios de San Jerónimo, Medellín, Heliconia y Anzá. El municipio tiene un 100% del territorio en la cuenca del río Cauca donde un 90% de las quebradas del municipio, fluyen a través del río Quebrada seca y un 10% especialmente en las veredas del corregimiento de Sevilla, lo hacen directamente al Cauca.

A continuación, se muestra la ubicación del proyecto.

Figura 1. Ubicación general del proyecto

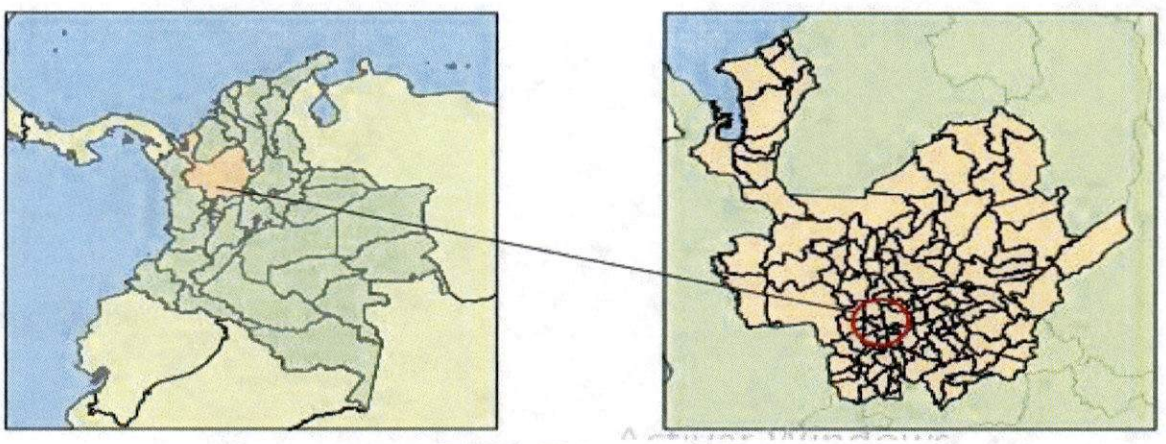

Fuente: Elaboración SIF
Figura 2. Ubicación tramo vías con municipios beneficiados

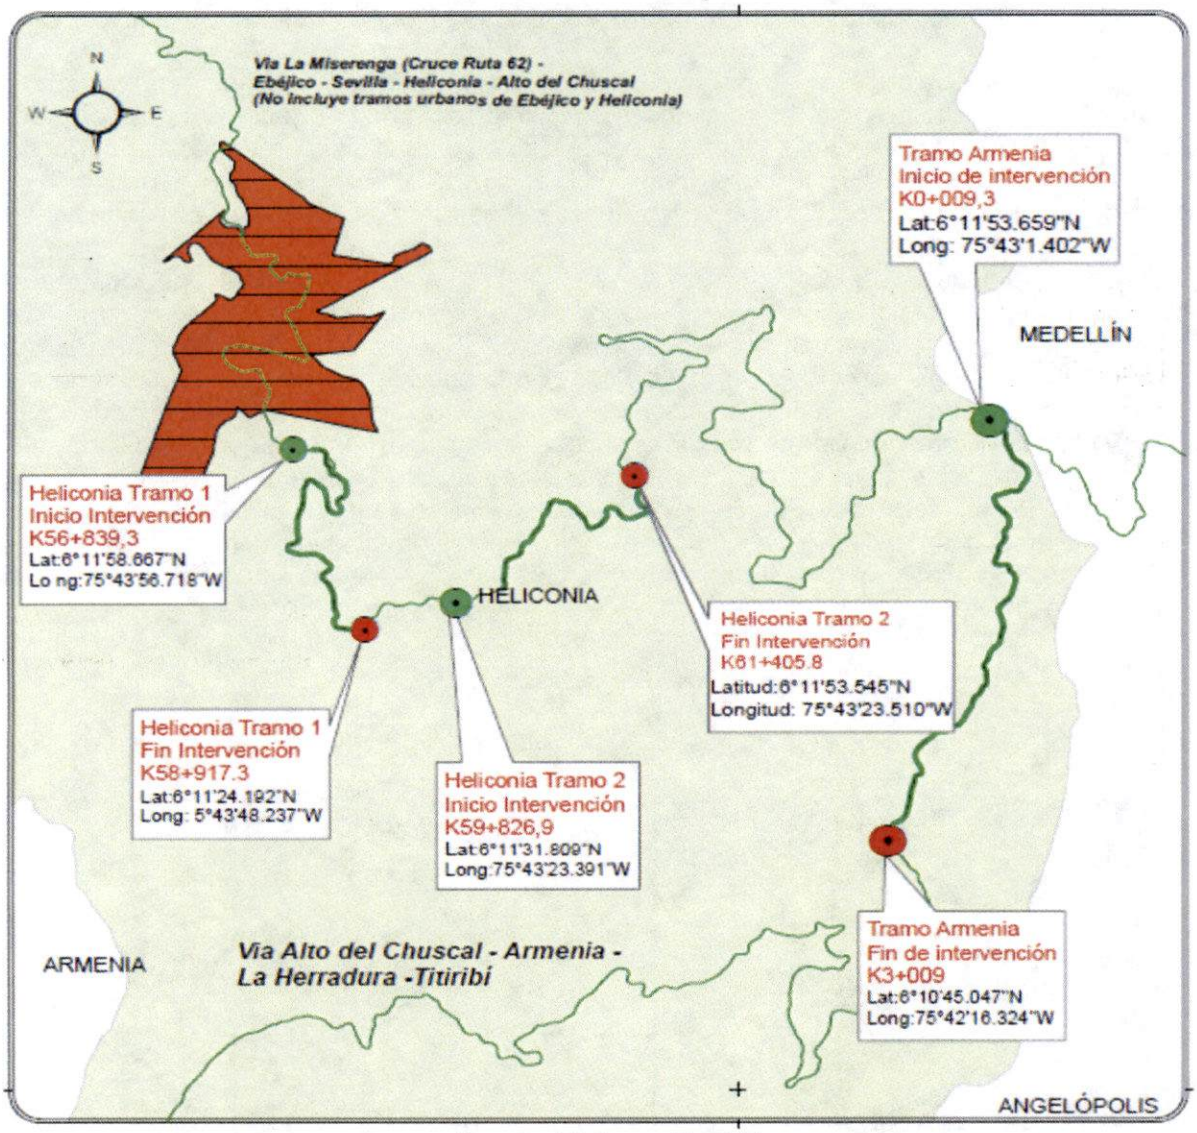

Fuente: Elaboración SIF

- Información Contrato De Obra

CONTRATISTA			
PAVIMENTAR S. A			
Nit.	800040014-6		
e-mail	Atencionalcliente@pavimentarsa.com		
Contrato No.	4600014783		
Objeto	Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos de las vías de segundo orden: alto del Chuscal – armenia - la herradura - titiribí (60an08-1), y la Miserenga (cruce ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - heliconia - alto del Chuscal (62an17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia.		
Localización	(aun no cuentan con campamento ni oficina en el sector)		
Fecha de iniciación	12 de enero 2023	**Fecha de terminación**	12 octubre 2023

- Información Contrato de Interventoría

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			
Contrato No.	4600014886		
Objeto	Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos de las vías de segundo orden: alto del Chuscal – armenia - la herradura - titiribí (60an08-1), y la Miserenga (cruce ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - heliconia - alto del Chuscal (62an17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia.		
Plazo inicial	11 meses		
Fecha de iniciación	12 de enero 2023	**Fecha de Terminación**	12 noviembre 2023

3. PLAN DE GESTION SOCIAL

Para la fecha de este reporte el plan de gestión social se encuentra en revisión por parte la Gobernación de Antioquia.

- **Personal Mínimo Requerido**

El personal profesional y técnico requerido es el siguiente:

1. Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías para el cargo de director de Obra.
2. Dos (2) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías para el cargo de Residente de obra del proyecto.
3. Un (1) Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario y Ambiental para el cargo de Residente Ambiental.
4. Dos (2) Profesional SST.
5. Un (1) Profesional Social
6. Dos (2) Tecnólogos (as) de obras civiles
7. Un (1) Especialista en geotécnica vial y pavimentos.
8. Un (1) Especialista en hidrología e hidráulica Descripción Cantidad Dedicación Plazo (meses)

Descripción	Cantidad	Dedicación	Plazo (meses)
Director de Obra	1	100%	10
Ingeniero Residente de obra	2	100%	
Profesional Social	1	100%	
Ingeniero Ambiental Residente	1	100%	
Profesional SST	2	100%	
Tecnólogo (a) de obras civiles	2	100%	
Especialista en Geotecnia vial y pavimentos	1	50%	
Especialista en hidrología e hidráulica	1	50%	

- Personal Del Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MONC/MOC	DIRECCION DE RESIDENCIA
GABRIEL JAIME RIVERA DUQUE	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	MOC	ENVIGADO
PILAR EUGENIA CADAVID ARBOLEDA	INGENIERA RESIDENTE DE OBRA	MOC	MEDELLIN
MAIRA LORENA GARCIA NARVAEZ	RESIDENTE DE OBRA	MOC	MEDELLIN
GLORIA LILIANA GOMEZ JIMENEZ	INGENIERA OFICINA TECNICA	MOC	MEDELLIN
MARY LUZ CORREA HERNANDEZ	RESIDENTE SOCIAL	MOC	MEDELLÍN
MARIA ANDREA ABREU VELEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	MOC	SANTA ELENA
LEIDY TATIANA DUQUE VILLADA	RESIDENTE SST	MOC	MEDELLÍN
PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO	RESIDENTE SST	MOC	MEDELLIN
LUISA FERNANDA RAMIREZ ZAPATA	TECNOLOGA AUXILIAR DE OBRA	MOC	MEDELLIN
BRYAN ANDRES CARVAJAL YEPES	TECNOLOGO AUXILIAR DE OBRA	MOC	BELLO
WILSON GONZALEZ SANCHEZ	TOPOGRAFO	MOC	MEDELLIN

JOSE RAFAEL BALLESTAS MORALES	TOPOGRAFO	MOC	FONSECA
JUAN CARLOS GONZALEZ ROMAN	ALMACENISTA	MOC	MEDELLIN
CARLOS ARTURO GUERRERO BENJUMEA	LABORATORISTA	MOC	SAN ANTONIO PRADO
JOSE SAMUEL ZARATE	ENCARGADO	MONC	BOGOTÁ
KATERINE GOMEZ MARIN	CADENERA	MONC	MEDELLIN
FERNANDO DE JESUS HENAO GALLEGO	CONDUCTOR	MONC	BELLO
GUSTAVO ANTONIO CANO CHALARCA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
RICARDO ADOLFO ECHEVERRI	AYUDANTE DE OBRA	MONC	EL PUEBLITO
WILMAR ALONSO VELASQUEZ BETANCUR	AYUDANTE DE OBRA	MONC	ARMENIA
JUAN CAMILO RUIZ VELEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	PUEBLITO HELICONIA
DANIEL SEBASTIAN ALVAREZ RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO SEFERINO
JORGE ALBERTO QUICENO OSPINA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
ALBEIRO RESTREPO LOPERA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA

DUVAN LEANDRO JARAMILLO RIVERA	OPERADOR RETROCARGADOR	MONC	BELLO
LEONARDO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	OPERADOR EXCAVADORA	MONC	BELLO
MARIA IDALI HENAO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	PUEBLITO HELICONIA
JOSE ALBERTO QUINTANA ALVAREZ	CONDUCTOR	MONC	MEDELLIN
JOHN FREDY RIOS BUSTAMANTE	OPERADOR RETROEXCAVADORA	MONC	GIRARDOTA
LEONEL DE JESUS HERRERA ORTIZ	OPERADOR COMPACTADOR	MONC	GUARNE
GILDADOR ANDRES PEREZ CADAVID	OPERADOR MOTONIVELADOR	MONC	MEDELLIN
SAUL ADRIAN ESCOBAR ESTRADA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LA CHORRERA
MARIO ANDRES RODRIGUEZ FARLEY	CONDUCTOR	MONC	MEDELLIN
GILDARDO DE JESUS CASTAÑO JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
JHONATAN ESTRADA QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	CORREGIMIENTO ALTO DEL CORRAL
DANIELA CASTAÑO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA

JHONEL RODRIGO ALVAREZ RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
JORGE MARIO ALVAREZ RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
LUIS BERNARDO MEZA REVOLLO	ENCARGADO	MONC	HELICONIA
HENRY DIAZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
JESUS ENEIL MEJIA JIMENEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
FREDY ENRIQUE SERNA BOLIVAR	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
WILLIAM RAMIREZ SERNA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CARDONA	OFICIAL	MONC	MEDELLIN
JUAN CAMILO QUICENO	OFICIAL	MONC	MEDELLIN
MATEO CEBALLOS CORDERO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLIN
VICTOR HUGO SALDARRIAGA SERNA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
LUIS ALBERTO CEBALLOS MESA	OFICIAL	MONC	MEDELLIN
FELIPE HOLGUIN VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	ARMENIA
JOSE OSCAR ARDILA ZARATE	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	COPACABANA

RAUL EDUARDO ARREDONDO VELEZ	ENCARGADO	MONC	MEDELLIN
JOAQUIN EMILIO CARMONA BOHORQUEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	MONC	MEDELLIN
IVAN DARIO GOMEZ MADRID	CONDUCTOR	MONC	MEDELLIN
SEBASTIAN DE JESUS AREIZA ZABALA	OPERADOR	MONC	MEDELLIN
CESAR AUGUSTO ZAPATA MORALES	OPERADOR	MONC	BELLO
ANGIE PAOLA CANO ZAPATA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
JHON JAVIER VELASQUEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LA CANCHA
YOVER ANDRES GARCIA MARIN	OPERADOR	MONC	MEDELLIN
YEIDER ALEXANDER AGUDELO QUICENO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	ITAGUI
JEREMIAS BORJA GUISAO	OFICIAL	MONC	BELLO
HERNANDO LEON PIEDRAHITA PATIÑO	OPERADOR	MONC	MEDELLIN
JUAN CARLOS CANO MARIN	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO HATILLO
JOSE DAVID GULFO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	PUEBLO VIEJO
JHORDY CARO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	PUEBLICO
ESTEBAN GOMEZ SEPULVEDA	OFICIAL	MONC	BARRIO LA PIANOLA

LUIS ANIBAL PEREZ RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO LA BOMBA
JUAN CAMILO TOBON ARANGO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLIN
ROBERTO ARTURO SUAREZ MUNERA	ENCARGADO	MONC	BARRIO LA POLVERA
JULIO CESAR CABARCAS LEIVA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO LA MILAGROSA
JULIO CESAR GARAVIZ ALONSO	OFICIAL	MONC	BARRIO VILLATINA
YOVERSON ARMANDO LUGO TAMAYO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO LA POLVERA
ALEJANDRO LUIS GONZALEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	MONC	BARRIO LA POLVERA
CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ	OPERADOR MINI EXCAVADORA	MONC	MEDELLIN
NELCY TATIANA MENDOZA MOYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5/05/2023	HELICONIA FINCA EL TIRON
ELKIN DAVID OSPINA YEPES	OFICIAL	MONC	ABEJORRAL
LUIS ENRIQUE CERVANTES CHARRIS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	ALGARROBO
JUAN SEBASTIAN AGUDELO RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLIN
JESUS ANDRES AGUDELO CASTAÑO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLIN
RUBET EDIXON MOSCOSO BAENA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLIN

DANIEL STIVEN VAHOS MANCO	OPERADOR HORMIGONERA	MONC	CIUDAD BOLIVAR
NELSON ENRIQUE DEOSSA HERNANDEZ	OFICIAL	MONC	HELICONIA
LEONARDO ANTONIO QUINCENO OSPINA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
JUAN CAMILO RESTREPO BEDOYA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
CRISTIAN CAMILO SUAREZ BLANDON	AYUDANTE DE OBRA	MONC	HELICONIA
YORLEDIS VILLA	AUXILIAR SST	5/06/2023	GUARNE
JEISON SNEIDER CARDONA MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLÍN
CRISTIAN CAMILO VALENCIA GEORGE	AYUDANTE DE OBRA	MONC	MEDELLÍN
JUAN DAVID MOLINA PUERTA	AYUDANTE DE OBRA - PAVIMENTO	MONC	MEDELLÍN
MARTIN ANAYA MANRIQUE	RASTRILLERO	MONC	ITAGUI
REINERIO MOSQUERA CASAS	AYUDANTE DE OBRA - PAVIMENTO	MONC	BELLO
FRANKLIN DE JESUS HENAO VILLADA	ENCARGADO PAVIMENTOS	MONC	MEDELLÍN
IVAN DARIO GOMEZ CASTRO	RASTRILLERO	MONC	MEDELLÍN
JONATAN ALEICES MAYA RODRIGUEZ	RASTRILLERO	MONC	MEDELLÍN
REINALDO ANTONIO AGUIRRE RUEDA	LIGADOR	MONC	MEDELLÍN
HUGO ALBEIRO TABARES MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA- PAVIMENTO	MONC	MEDELLÍN
JUAN MANUEL ZAPATA JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA- PAVIMENTO	MONC	MEDELLÍN
HUBERT HUMBERTO LONDOÑO AGUIRRE	OPERADOR	MONC	BELLO
JORGE HUGO ARIAS GOMEZ	OPERADOR	MONC	MEDELLÍN
LEONARDO CONTRERAS VALBUENA	OPERADOR	MONC	MEDELLÍN
PEDRO RAFAEL JARABA FIGUEROA	RASTRILLERO	MONC	MEDELLÍN

LUIS FERNANDO HIGUITA CASTAÑO	OPERADOR	MONC	MEDELLÍN

- **Personal de La Interventoría**

No.	NOMBRE	CARGO
1	John Fredy Henao Londoño	Director de interventoría
2	Oscar Iván Osorio Peláez	Residente de interventoría
3	Juliana bocanegra	Residente de interventoría
4	Harry Antonio Mena Mosquera	Residente ambiental
5	Daniela Fernanda Torres García	Residente sst
6	Sandra Patricia Bran Rojas	Residente sst
7	María Ximena Uribe Álvarez	Residente social
8	Carlos Zapata	Geotecnia vial y pavimento
9	Leo Dan Ríos López	Inspector
10	Diego Andrés Suarez Arrubla	Inspector
11	Javier Ernesto Rodríguez Diaz	Topógrafo
12	Luis Guillermo López Nieto	Cadenero

No.	NOMBRE	CARGO
13	Gerardo Hurtado	Conductor
14	Cesar Rodríguez	Conductor
15	Carolina Echeverry Bustamante	Secretaria

4. FUNCIONES DEL PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA

- Brindar información oportuna y clara a la comunidad del área de influencia del proyecto, a través de la atención de inquietudes, quejas y reclamos. (PQRS)
- Brindar atención directa y virtual desde el Punto de Atención a la Comunidad PAC
- Asegurar la disponibilidad oportuna y confiable de la información y antecedentes de carácter social para la efectiva toma de decisiones e intervenciones de campo en las comunidades y zonas aledañas donde se desarrollen los diferentes proyectos de la organización, de tal manera que se minimicen los impactos negativos
- Establecer canales de comunicación y ser intermediario entre la comunidad, la entidad contratante y el contratista.
- Realizar la instalación, adecuación y atención en los espacios definidos para la Información y atención a la comunidad.
- Actualizar mensualmente las carteleras informativas, las cuales deben llevar los avances de la obra, en sus 4 componentes (Técnico, Ambiental, Social y SST) Foto, nombre de la actividad y lugar, para las actividades de tipo técnico, como lugar se coloca la abscisa
- Garantizar la instalación del buzón satelital para recepcionar las quejas, reclamos e inquietudes relacionadas con el objeto de la obra.

- Implementar el plan de atención integral e información permanente a la comunidad.
- Ejecutar los programas y presupuesto social definido en el Plan de Gestión Social PGS
- Realizar reuniones informativas (reuniones de inicio, reuniones de avance, reuniones de finalización, reuniones extraordinarias, reuniones con el comité de participación comunitaria).
- Elaborar piezas de comunicación del componente social del proyecto asignado (elaboración y distribución de volantes informativos, elaboración de cartas personalizadas).
- Entregar oportunamente la información a la comunidad sobre las decisiones en relación con la construcción y desarrollo de la obra.
- Apoyar la realización del levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre en el área de influencia directa, del estado previo de los inmuebles, predio, locales y áreas que se puedan ver afectadas por el desarrollo del proyecto. (Las actas de vecindad, de entorno y permisos predios privados, son firmados por el residente civil de interventoría y contratista, y debe llevar los datos básicos de ellos – nombres y apellidos, cc, cargo y nombre de la empresa)
- Desarrollar talleres pedagógicos con la comunidad educativa, las organizaciones sociales de AID y el comité de participación comunitaria, con el objetivo de informar, educar en temas ambientales, seguridad vial y organización y participación comunitaria.
- Garantizar la conformación del comité de participación comunitaria para ejercer control social de la comunidad en la obra, como canal de comunicación entre la comunidad y el contratista recogiendo inquietudes, quejas y respuestas oportunas del contratista.
- Contribuir con la vinculación de mano de obra local con el fin de que la AID tenga sentido de pertenencia, participación y cuidado con la infraestructura a construir.
- Asegurar el cumplimiento de las actividades relacionadas en la matriz de cargos críticos.
- Realizar informes del impacto físico que cause la obra en la comunidad directa e indirectamente afectada por la misma.

- Elaborar y presentar informes y requerimientos solicitados que evidencien la medición de gestión para la organización.

- Las demás funciones inherentes al cargo que el sean asignadas por su jefe inmediato.

5. FUNCIONES DEL PERSONAL RESIDENTE SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA SON:

- Revisar especificaciones, pliegos, contrato de obra y emitir concepto al respecto, tanto del contratista como de la interventoría

- Dar directrices sobre el instructivo de Gestión Social y/o Plan de Gestión Social y velar por la adecuada ejecución del Plan de Gestión Social (PGS) y el presupuesto social

- Revisar los cronogramas de trabajo de cada uno de los contratistas, socializarlos al personal a cargo y hacer seguimiento.

- Coordinar las actividades asignadas al personal a cargo.

- Revisar los insumos entregados por el contratista.

- Manejar toda la comunicación con la comunidad en lo relacionado con el proyecto.

- Vigilar y apoyar todas las actividades relacionadas con el área social del proyecto.

- Realizar visitas periódicas a campo, para verificar el cumplimiento de los programas sociales que se manejan en la obra.

- Asesorar y supervisar a los contratistas en el cumplimiento en las actividades de gestión social. Asistir a las actividades sociales programadas por el Contratista, en caso de ser necesario.

- Revisar los informes sociales, semanales, mensuales y ejecutivos realizados por el personal a cargo.

- Mantener comunicación directa con el contratista y el cliente.

- Asegurar una adecuada y efectiva comunicación con el personal del contratista y del cliente, de tal manera que se garantice la efectiva coordinación de las actividades.

- Propender por que durante el desarrollo del proyecto se implementen las recomendaciones dadas por el cliente en cuanto a la labor social que desempañará el Contratista.

- Coordinar la realización de monitoreos y evaluaciones generales del Programa de Gestión Social, por medio de la evaluación de cumplimiento a través de las listas de chequeo.

- Verificar que los procesos del Contratista se desarrollen de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Contrato.

- Asesorar, acompañar y evaluar continuamente la gestión del Contratista

- Recibir, revisar y corregir los informes sociales de las obras.

- Efectuar control, seguimiento y aprobación para la elaboración de documentos y de todas las actividades que debe adelantar el Contratista para cumplir con las obligaciones de Gestión Social exigidas en los pliegos de condiciones del presente contrato.

- Mantener informado al cliente en forma periódica sobre el avance y las dificultades presentadas durante el desarrollo de la gestión social, así como verificar el cumplimiento de la programación propuesta por el contratista para la ejecución de la gestión social.

- Supervisar que el contratista disponga de la infraestructura y personal que cumpla con los requerimientos definidos en el apéndice del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría.

- Verificar que la ejecución de las labores de gestión social esté acorde con el marco legal, las exigencias contractuales y especificaciones adoptadas en el Apéndice del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría.

- Revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, presentación y convocatorias entre otras para las diferentes reuniones y actividades que se adelanten en el desarrollo del Contrato de obra, adicionalmente se debe verificar que las convocatorias se realicen en los términos estipulados en el contrato sobre el cual se efectuará la interventoría.

- Adelantar todas las acciones conducentes para que el Contratista prevenga, mitigue y controle el impacto social que eventualmente podría causarse.

- Responder ante el la entidad contratante por la verificación del cumplimiento de las medidas y acciones, contenidas en el Apéndice del contrato sobre el cual se efectuará la interventoría.

- Programar y realizar comités de seguimiento social al contrato; realizar seguimiento a los compromisos establecidos en los mismos.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADAS

A la fecha de este reporte las actividades que se han realizado son:

- Revisión de presupuesto social
- Cuñas radiales para informar cierres de vía en Armenia.
- Cuñas radiales para informar los cierres de vía en heliconia
- Elaboración de actas de vecindad y entorno en el tramo el chuscal -heliconia
- Actualización de carteleras informativas para el mes de junio
- Elaboración del formato intervención de predios
- Segundo taller del programa "Lápiz a la obra" tema: fauna y flora
- Capacitación mensual con los empleados (comunicación asertiva)
- Primer encuentro del CPC
- Asistencia a reunión estrategias socio-comunicacionales convocada por la gobernación de Antioquia
- Comité social
- La Secretaría de Infraestructura Física en articulación con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, realizamos Taller Enfoque de Género (Tema: Línea de Vida e Incursión Social) dirigido a los Empleados de Obra Mejoramiento Vial Armenia - Alto del Chuscal - Heliconia

7. PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO

- **Actas de vecindad**

El 22 de marzo se levantaron las actas de vecindad correspondiente al campamento de la maderera Cipreses S.A.S y el local comercial del Alto del Chuscal. A estas se suman las 2 que se habían levantado correspondientes a los altares de la virgen, que se encuentran en la vía hacia Armenia en los K 2+608 y K 2+530.

El 18 de abril se realizó el levantamiento de 3 actas de vecindad en el tramo de Heliconia, en las viviendas que están identificadas que son las primeras en estar cerca de las actividades a realizar de obras transversales.

En los lugares donde no se ha encontrado el propietario se ha tomado un registro inicial de la fachada, se volverá a realizar otra visita buscando un habitante y si no es posible contactarlo en conjunto con la interventoría de dejará en el formato de acta la situación por la que se levanta solo de fachada.

El 3 de mayo se hizo el levantamiento del acta de vecindad de uno de los lugares considerados como crítico, pues dicha vivienda se encuentra en el tramo de Heliconia en un sector que está a la espera de la definición si se va a realizar intervención, pero se estaban haciendo los estudios de suelo y se consideró pertinente el levantamiento de dicha acta.


Para el reporte del mes de junio se terminaron las actas de vecindad que estaban pendientes, aun así, es pertinente hacer la claridad de que en algunas viviendas no fue posible entrar porque no se encontró a los dueños, en estas viviendas se harán más visitas, a medida de que la obra se acerca a estos lugares.

Lugar	No de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No Actas pendientes	No Actas revisadas y aprobadas Interventoría
Armenia	4	4	0	0	4
Heliconia	26	26	19	0	26
Total	**30**	**30**	**19**	**0**	**30**

Ver anexo 1. actas de vecindad

Levantamiento acta de vecindad



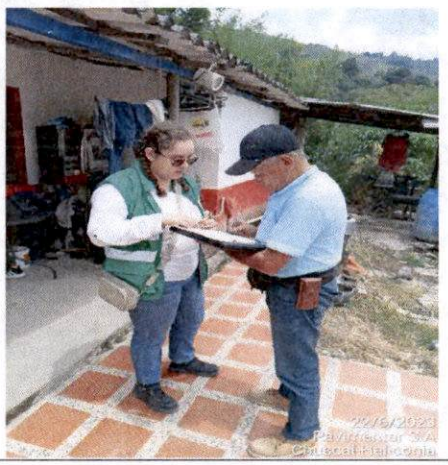

- **Actas de Entorno**

El 14, 15, 22 y 23 de marzo de 2023 se continuó con el levantamiento de las actas de entorno que corresponden del Alto Chuscal hacia Armenia y se hizo del Alto de Chuscal hacia Heliconia el tramo 2, en total se levantaron 13 actas de entorno.

Para las actas de entorno del tramo 2 de Heliconia se contó con el acompañamiento del representante del acueducto vereda del Crucero para que ayudara a identificar las redes de acueducto en la zona.

El 13 de abril se realizó el levantamiento de las actas de entorno del tramo 1 de Heliconia que hacía falta. Se levantó todo el tramo que estaba contemplado inicialmente, así no esté definido completamente las actividades a realizar desde la parte técnica.
Con esta actividad se da por terminado el levantamiento de las actas de entorno, en este momento están en proceso de diligenciamiento del formato, revisión y firmas.

Para la fecha de este reporte las actas de entorno se encuentran terminadas en ambos tramos tanto vía armenia, como vía heliconia con su respectivo registro fotográfico, fílmico y aprobadas por la interventoría.

Lugar	No de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No Actas pendientes	Revisadas y aprobadas interventoría
Armenia	16	16	0	0	16
Heliconia	9	9	0	0	9
Totales	**25**	**25**	**0**	**0**	**25**

Ver anexo 2. actas de entorno

- **Intervención a predios privados**

FECHA	NOMBRE PROPIETARIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	TIPO DE ACTIVIDAD
17/03/2023	Representante Cipreses Román Alberto Ceballos Andrés Gonzales	K 02 +823,00	Construcción de transversales
06/03/2023	José Gabriel Yépez Sánchez	K 1 +580	Construcción de transversales
14/03/2023	Andrés Gonzales	K 0 +009	Instalación valla informativa
20/04/2023	Jhon Jairo Taborda Torres	K58+718, K57+808	Construcción de transversales
09/05/2023	Alonso Patiño	K58+895	Construcción de transversales

Para la fecha de este reporte no realizo intervención a predios.

8. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

- **Manejo de Socialización con la Comunidad**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Este mes de junio ser realizo el segundo taller del programa lápiz a la obra, donde se trabajó el tema de fauna y flora , para la estrategia el contacto es la rectora de la institución educativa San Rafael, quien fue la que escogió a los niños para participar en esta estrategia.

Socialización inicio de obra Heliconia			
Fecha	**Tipo de Reunión**	**Población objeto**	**No. Asistentes**
09-03-2023	Reunión de Inicio de obra	Administración municipal, comerciantes, concejales, junta de acción comunal y comunidad en general	31
14-03-2023	Reunión	Representante maderera Cipreses	3
18-04-2023	Reunión	Representantes acueducto	17
05-05-2023	Presentación Red de Buenos Vecinos	Comunidad del área de influencia de la obra, actores viales, actores institucionales públicos y privados	29
16-05-2023	Primer taller Lápiz a la obra (TEMA: Cultura y Seguridad Vial)	Niños de la institución educativa San Rafael (Cabecera Municipal)	36
31-05-2023	Segundo taller Lápiz a la obra	Niños de la institución educativa San Rafael	32
		Total	116

Segundo taller Lápiz a la obra









Ver anexo 3. Acta de reunión Lápiz a la obra

9. PROGAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION

Para la fecha de este reporte se le informo a la comunidad sobre la socialización de inicio en el municipio de armenia por medio de cuñas radiales. se instaló las vallas informativas de 12x4, las vallas tipo tijera, los pasacalles informativos del cierre hacia Armenia y el Cierre hacia Heliconia, la marcación de vehículos pequeños y volquetas.

Este mes de mayo se realizaron cuñas radiales invitando a la red de buenos vecinos, se hicieron cuñas informando sobre los cierres viales y se están realizando cuñas con mensajes institucionales. Se ha utilizado la emisora de Heliconia principalmente y la de Armenia cuando se informó del cierre por pavimentación.
Se enviaron volantes digitales invitando a la red de buenos vecinos y para informar sobre los horarios de cierre por la pavimentación.

Este mes de junio se realizaron cuñas radiales invitando al CPC, se hicieron cuñas informando sobre los cierres viales y se están realizando cuñas con mensajes institucionales. Se ha utilizado la emisora de Heliconia principalmente y la de Armenia cuando se informó del cierre por pavimentación.
Se cuenta con las 2 vallas institucionales de 12X4, una ubicada en el alto del Chuscal hacia Armenia y la otra en la vía hacia Heliconia en el punto conocido como la virgen del Tirol, y las 4 vallas tipo tijera para cada punto del cierre.

- **Distribución y/o instalación de piezas de comunicación, generadas por el proyecto:**

Durante este periodo se realizó la entrega del siguiente material informativo a la comunidad:

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto	Cantidad
15-03-2023	Valla 12X4	Vallas informativas	Comunidad en general	2
14-03-2023	Vallas tipo tijeras	Vallas informativas	Comunidad en general	4
15-03-2023	Pasacalles	Cierre hacia armenia	Comunidad en general	3
15-03-2023	Pasacalles	Cierre hacia Heliconia	Comunidad en general	3
14-03-2023	Marcación de vehículos pequeños	Imanes informativos	Comunidad en general	6
14-03-2023	Marcación de volquetas	Imanes informativos	Comunidad en general	16

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto	Cantidad
31-03-2023	Volante	Cierre vía Heliconia	Comunidad en general del municipio de Heliconia	Difundido por redes
31-03-2023	Cuña Radial	Cierre vía Heliconia	Comunidad en general del municipio de Heliconia	61 impactos
26-04-2023	Cuña Radial	Cierres Alto del Chuscal- Heliconia	Comunidad en general del municipio de Heliconia	09 impactos
28-04-2023	Cuña Radial	Invitación red de buenos vecinos	Comunidad en general del municipio de Heliconia	21 impactos
10-05-2023	Cuña Radial	Avisos institucionales y de cierre de vía	Comunidad en general del municipio de Heliconia	83 impactos
19-05-2023	Cuña Radial	Horarios de cierre por pavimentación	Comunidad en general de Heliconia y Armenia	54 impactos
28-04-2023	Volante	Invitación red de buenos vecinos	Comunidad en general del municipio de Heliconia	Se difunde por WhatsApp y redes sociales
24-05-2023	Volante	Información del cierre de la vía por pavimentación.	Comunidad en general del municipio de Heliconia y Armenia	Se difunde por WhatsApp y redes sociales
31-05-2023	Volante	Información del cierre de la vía por pavimentación.	Comunidad en general del municipio de Heliconia y Armenia	Se difunde por WhatsApp y redes sociales
Durante todo el mes de junio	Cuña Radial	Invitación al CPC, Avisos institucionales y de cierre de vía	Comunidad en general del municipio de Heliconia	180 impactos
02-06-2023	Volante	Invitación al CPC	Comunidad en general del municipio de Heliconia	Se difunde por WhatsApp y redes sociales

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto	Cantidad
05-06-2023	Volante	Invitación al CPC	Comunidad en general del municipio de Heliconia	Se difunde por WhatsApp y redes sociales
Total				183

Ver anexo 4. Cuña radial

Volantes





GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.383.717-3	CONTRATO 4600014886 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS


INFORME DE INTERVENTORÍA # 6 – SOCIAL









Vallas 12X4

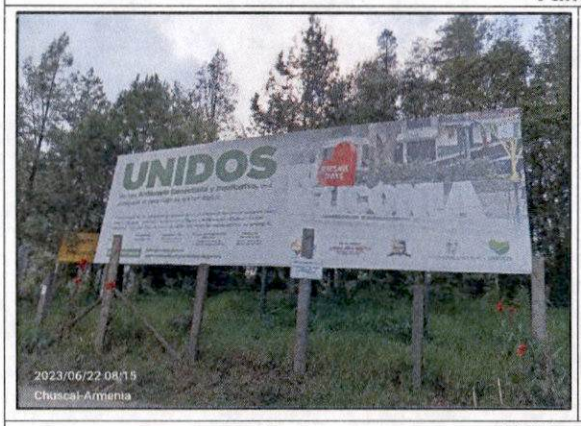

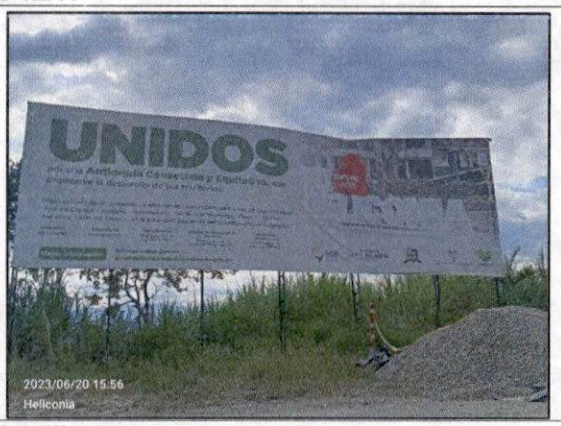

Vallas tipo tijera

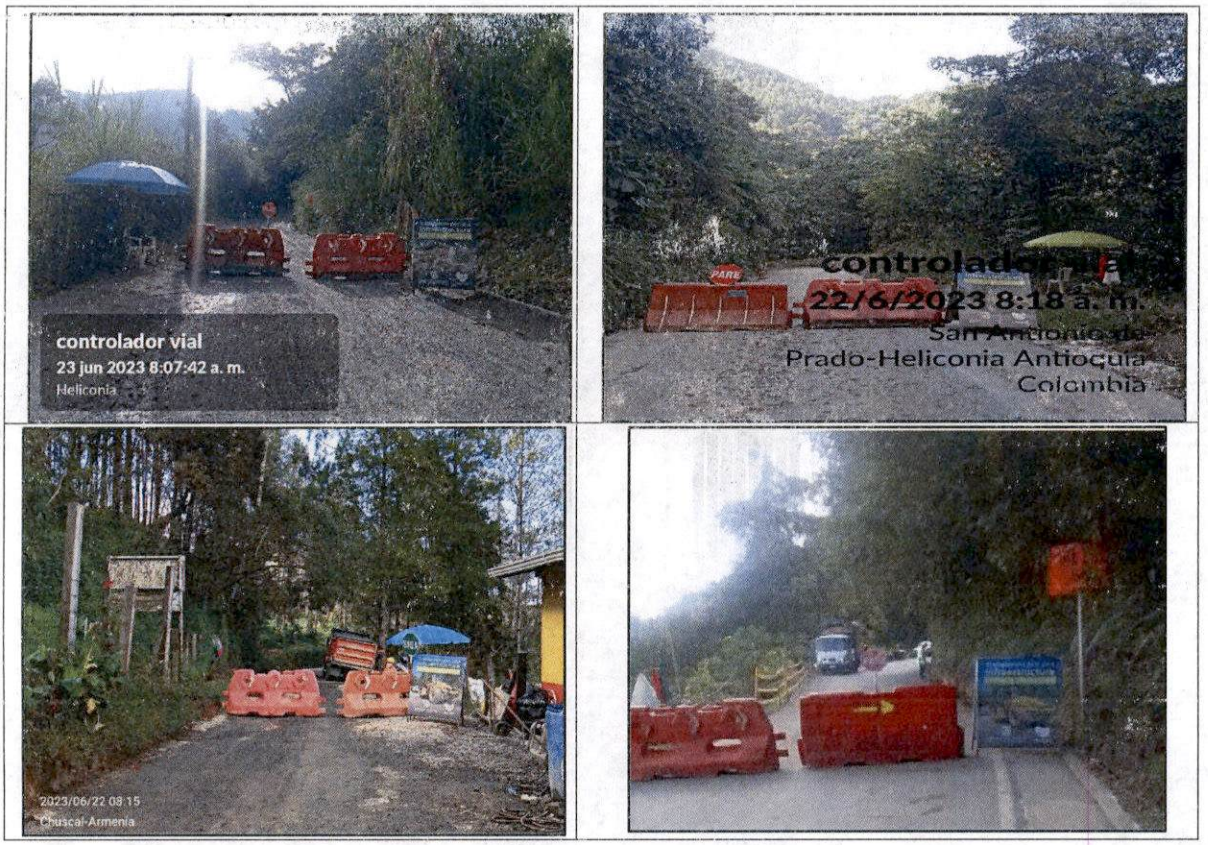

- **Cartelera Informativa:**

  Para la fecha de este reporte se actualizaron las carteleras informativas con la información de cada componente. El 19 de mayo la del Alto del Chuscal, el 25 de mayo en la alcaldía de Heliconia.

Este mes se actualizaron las carteleras informativas con la información de cada componente. El 23 de junio en la alcaldía de Heliconia, el 26 en el Alto del Chuscal, y la alcaldía de Armenia.

Cartelera Alto el Chuscal Cartelera





Cartelera informativa alcaldía de Heliconia





Cartelera informativa alcadía de Armenia





Ver anexo 5. Cartelera informativa

10. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

A la fecha de este reporte se cuenta con un punto de atención, a la comunidad ubicado en el alto del chuscal, (ABSCISA K 0+017) está funcionando los días miércoles desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Punto de Atención a la comunidad





- **Ubicación Punto de Atención al Ciudadano (PAC)**

El punto de atencion a la comunidad esta ubicado en el alto del Chuscal (ABSCISA K 0+017), ya que la oficina del contratista no es de facil acceso para la comunidad.

- **Buzón de sugerencias:**

Para la fecha de este reporte no ha presentado ninguna pqrs por este medio

		
Heliconia	Alto del chuscal	Armenia

- **PQRS**

Para el periodo reportado se cuenta con una PQRS presentada de forma verbal.

No	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Acciones realizadas	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
1	30-05-23	Hugo Horacio Gutiérrez	Pide sean reconocidas las pérdidas económicas por la falta de agua en su finca donde dice se han muerto marranos por eso	Se ha contactado al peticionario, se escuchó su solicitud y se le ha contactado un par de veces para que describa los hechos y darle respuesta. Se sigue a la espera de esta información, pasaron una relación de pérdidas por 10 millones de pesos, pero no está detallada.	Tramite

11. PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

A la fecha de este reporte ya se cuenta con personal en obra, la convocatoria se ha realizado por medio de cuñas radiales y por medio de las eucaristías, invitando a la comunidad a la entrega de hojas de vida, en el que se especificara los tipos de perfiles que se estén requiriendo

De igual manera se proyecta realizar jornadas de empleabilidad de manera articulada con la Alcaldía de Heliconia y de Armenia, y con la Autoridad de Género de estos dos Municipios.

En caso tal que algún tipo de perfil no se encuentre en Heliconia, ni en Armenia, se llevaría cabo jornadas de empleabilidad en el Corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (dada la cercanía que tiene con el área de influencia de la obra) lo anterior en coordinación con el CEDEZO, la oficina de empleo del SENA, la oficina de empleo de la Caja de Compensación Familiar que tenga presencia en San Antonio de Prado y con la Autoridad de Género asignada para el Corregimiento de San Antonio de Prado

Para la fecha del reporte del mes de mayo el total personal 88 contando con la cuadrilla de pavimento que este mes estuvo haciendo presencia en la obra en el tramo hacia Armenia en la primera fase de pavimentación, si bien este personal no es constante si es tenido en cuenta en este informe.

Total, personal 101 contando con la cuadrilla de pavimento que este mes estuvo haciendo presencia en la obra en el tramo hacia Armenia en la primera fase de pavimentación, si bien este personal no es constante si es tenido en cuenta en este informe.

A continuación, se analiza el personal total vinculado con Mano de Obra No Calificada (MONC) y Mano de Obra Calificada (MOC) y personal vinculado por género:

Total, de personal vinculado por Mano de obra Calificada y No Calificada	
Mano de obra Calificada – MOC	15
Mano de obra No Calificada – MONC	86
Empleos generados en el área de influencia	32
TOTAL	101
Total, de personal vinculado por género	
Número de Mujeres vinculadas	14
Porcentaje MOC	74%
Porcentaje MONC	26%
Número de Hombres vinculados	87
Porcentaje MOC	7%
Porcentaje MONC	93%

El personal femenino en obra es del 14%, el masculino es del 86,1%, el total de personas de la comunidad vinculadas al proyecto es del 34%.

- **Empleabilidad general**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA			REPORTE MENSUAL DE EMPLEABILIDAD							Código: FO-M2-P11-038 Versión: 01 Fecha de aprobación: 28-03-2023		
Contratista/Intervetoría	Nombre del Proyecto	No. del Contrato	Fecha Corte	Empleos Generados	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%	No. Hombres	%	No. Mujeres	%
Contratista	ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	CONTRATO N°4600014783 DE 2023	26/06/2023	101	15	86	32	31,68	87	86,14	14	13,86
Interventoria	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	CONTRATO N°4600014783 DE 2023	26/06/2023	15	3	12	2	13,33	10	66,67	5	33,33

- **Empleabilidad mujeres**

Gobernación de Antioquia
Secretaría de Infraestructura Física
Empelabilidad de Mujeres junio

N°	PROYECTO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	CELULAR	NIVEL EDUCATIVO	CARGO	FECHA DE CONTRATACIÓN
1	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	PILAR EUGENIA CADAVID ARBOLEDA	43495570	57	MEDELLÍN	3166944666	PROFESIONAL	INGENIERA RESIDENTE DE OBRA	23/01/2023
2	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	LUISA FERNANDA RAMIREZ ZAPATA	1152693739	29	MEDELLÍN	3016457130	PROFESIONAL	INGENIERA AUXILIAR DE OBRA	23/01/2023
3	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	MARY LUZ CORREA HERNANDEZ	1128389344	34	MEDELLÍN	3186410182	PROFESIONAL	RESIDENTE SOCIAL	23/01/2023
4	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	MARIA ANDREA ABREU VELEZ	43619334	45	RIONEGRO	3206766482	PROFESIONAL	RESIDENTE AMBIENTAL	6/02/2023
5	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	LEIDY TATIANA DUQUE VILLADA	1128385892	35	MEDELLÍN	3216520656	PROFESIONAL	RESIDENTE SST	6/02/2023
6	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	KATERINE GOMEZ MARIN	1000396021	27	MEDELLÍN	3145458195	TECNOLOGO	CADENERA	30/01/2023
7	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	MARIA IDALI HENAO FLOREZ	32211593	44	HELICONIA	3044098596	BACHILLER	AYUDANTE PARE Y SIGA	28/02/2023
8	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	DANIELA CASTAÑO GOMEZ	1037751358	28	HELICONIA	3113982511	BACHILLER	AYUDANTE PARE Y SIGA	15/03/2023
9	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	GLORIA LILIANA GOMEZ JIMENEZ	52252448	46	MEDELLÍN	313672229	PROFESIONAL	INGENIERA OFICINA TECNICA	23/01/2023
10	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	MAIRA LORENA GARCIA NARVAEZ	1018436562	32	MEDELLÍN	3203988838	PROFESIONAL	RESIDENTE DE OBRA	22/03/2023
11	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	ANGIE PAOLA CANO ZAPATA	1037751784	25	HELICONIA	3207557979	BACHILLER	AYUDANTE PARE Y SIGA	26/04/2023
12	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	NELCY TATIANA MENDOZA MOYA	1003178337	21	HELICONIA	3218156256	TECNOLOGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5/06/2023
13	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	YORLEDIS VILLA	1003083077	29	GUARNE	3108119034	TECNOLOGO	AUXILIAR SST	21/06/2023
14	ALTO DEL CHUSCAL ARMENIA, ALTO DEL CHUSCAL HELICONIA	PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO	1152454282	27	MEDELLÍN	3125323715	TECNOLOGO	RESIDENTE SST	3/06/2023

Es importante resaltar que La Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento de las políticas públicas de Inclusión Social, tiene como meta lograr en el transcurso del contrato de obra, un 30 % en mano de obra femenina.

12. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

El 25 de marzo se realizó la capacitación mensual del personal vinculado al proyecto, este mes la capacitación fue sobre el respeto y cuidado del bien ajeno, con el objetivo de plantear como todos somos responsables de este cuidado.
En la capacitación se tomaron como referencias las actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención en predios privados para el cuidado de los bienes ajenos y públicos, como son herramientas que sirven para cuidar a los particulares y a la misma obra al permitir verificar el estado de las propiedades antes de las intervenciones.

El 25 de abril se realizó la capacitación mensual del personal vinculado al proyecto, este mes la capacitación fue sobre el respeto al ciudadano, se mostraron imágenes donde estaban los ciudadanos realizando actividades en relación a la vía y como nosotros nos debemos relacionar con ellos desde el respeto, planteando también que el respeto es con los ciudadanos y los compañeros.
Se les mostraron imágenes sobre dar información adecuada, evitar las peleas, vestir adecuadamente y usar un vocabulario decente, todas estas acciones como manifestaciones de respeto con la comunidad.
El 20 de mayo se realizó la capacitación mensual del personal vinculado al proyecto, este mes la capacitación fue sobre el trabajo en equipo y como cada persona desde su quehacer es valiosa y aportante, es igual de relevante he importante tanto el trabajo de los ayudantes como de los ingenieros, porque todos estamos apuntando al mismo objetivo de sacar adelante la obra en las menores condiciones posibles.

El 17 de junio se realizó la capacitación mensual del personal vinculado al proyecto, este mes la capacitación fue sobre la comunicación asertiva, como desde lo que se dice, la entonación y las posturas corporales comunican, esta capacitación se realizó mediante el juego del teléfono roto principalmente, para mostrar como la información se puede tergiversar.

Durante el período el Contratista realizó las siguientes capacitaciones del área social con el personal de obra:

Fecha	Tema	No asistentes
25/03/2023	Respeto y cuidado por el bien ajeno sea privado o público	26

Fecha	Tema	No asistentes
25/04/2023	Respeto a la comunidad	35
20/05/2023	Trabajo en equipo	33
17/06/2023	Comunicación asertiva	25
	Total	119

Capacitación mensual





Ver anexo 6. Listado de asistencia capacitación

Taller Enfoque de Género Tema: Línea de Vida e Incursión Social
 

13. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA

El 09 de marzo se conformó el Comité de Participación Comunitaria, se invitó a la comunidad a formar parte de este comité pues es el organismo donde se da información constante sobre el avance de obra desde todos los componentes. Se les explica que el CPC se reúne de manera mensual y les brinda información de primera mano, además de ser un espacio donde pueden llevar sus dudas.
Las personas que hacen parte de este CPC deben mayores de edad, residentes del municipio de Heliconia, multiplicadores de la información clara y veraz, mediadores cuando se presenta una situación de conflicto entre comunidad y obra, brindar información sobre las características sociodemográficas de la población, y en general ser el enlace de comunicación con la comunidad.

Para el periodo reportado del mes de mayo, por acuerdos a los que se llegó con la parte técnica el CPC quedo reprogramado para el 7 de junio, se envió a revisión la presentación y se está a la espera de las correcciones.

El 07 de junio se realizó el primer encuentro del Comité de Participación Comunitaria –CPC- donde se dio cuenta de los avances de la obra, para este encuentro se convocó por medio de redes sociales,

WhatsApp y llamadas telefónicas a las personas que se inscribieron en el CPC y se realizó convocatoria abierta para la comunidad en general y los actores representativos del municipio.

Numero	Fecha	Observaciones	Total, asistentes
1	09-03-2023	Conformación del Comité de Participación ciudadana Armenia	7
2	7-06-23	Primer encuentro del CPC heliconia	36

Invitación CPC





Primer encuentro CPC	
	

Ver anexo 7. Acta de reunión CPC

15. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA.

Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría:

ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Se pide al contratista la entrega de las actas de entorno, para la revisión y aprobación.	23/03/2023	Correo	Contratista
Aclaración sobre el cierre en la vía	24/04/2023	Correo	Contratista
Respuesta gobernación de Antioquia sobre invitación a participar en el consejo municipal	25/05/2023	Correo	Contratista – Planeación Heliconia
Se envía oficio al contratista haciendo devolución de actas de vecindad	15/06/2023	Correo	Contratista
Se hace la gestión con comunicaciones para pasa calles	21/06/2023	Correo	Contratista
Se propone a la parte técnica talleres de enfoque de genero	05/06/2023	Correo	Contratista

- **Comités de Seguimiento**

Para la fecha de este reporte se realizaron los siguientes comités de obra.

02/03/2023	Comité social	Mary Luz Correa Ximena Uribe Francisco Zapata
16/03/2023	Comité de obra	Equipo de la interventoría Equipo del contratista
29/03/2023	Conciliación de preacta, suministros para informe	Mary Luz Correa Ximena Uribe
14/04/2023	Comité social	Mary Luz Correa Ximena Uribe Francisco Zapata
27/04/2023	Comité de obra	Equipo de la interventoría Equipo del contratista
09/05/2023	Comité social	Mary Luz Correa Ximena Uribe Francisco Zapata
19/05/2023	Comité de obra	Equipo de la interventoría Equipo del contratista
26/05/2023	Conciliación de preacta, suministros para informe, cronograma de actividades	Mary Luz Correa Ximena Uribe

Comités de Seguimiento








- **Recorridos Visitas De Seguimiento**

Para la fecha de este reporte se realizaron los siguientes recorridos:

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
11-04-2023	Atender a los encargados de la finca El Porvenir que tiene su sistema de acueducto por la vía que conduce hacia Armenia 	Encargados finca El Porvenir, residente social.
19-04-2023	Identificación redes de acueductos en el frente hacia Heliconia 	Representantes de los acueductos verdales, administración municipal, interventoría y contratista
21-04-2023	Recorrido con supervisores de la gobernación de Antioquia	

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		Supervisores gobernación de Antioquia, interventoría y contratista
11-05-2023	Permiso de intervención de predios	
		
19-05-2023	Comité interno de obra	Personal de interventoría y contratista

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		
11-05-2023	Indicción al personal 	Empleados nuevos
FECHA	**OBJETIVO**	**PARTICIPANTES**
24-05-2023	estrategias socio-comunicacionales convocada por la gobernación de Antioquia	

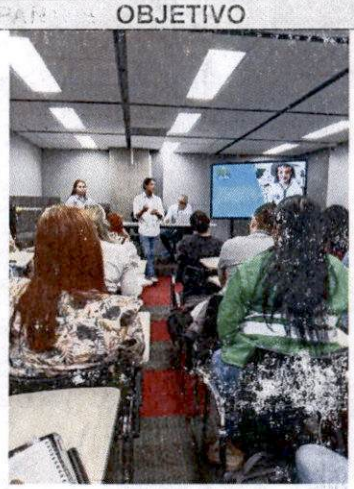FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		Directores y residentes sociales de las diferentes obras de la gobernación de Antioquia
29-05-2023	Recorrido de obra 	
	Acompañamiento acueducto el crucero	

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		Representantes acueducto el cruecero
8-06-23	Comité de obra 	Profesionales de interventoría y contratista
8-06-23	Solicitud de reacomodar manguera para evitar daños	Administrador finca El Provenir

INFORME DE INTERVENTORÍA # 6 – SOCIAL

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		
16-06-23	Reunión con la interventoría, seguimiento a los programas sociales	Residente social interventoría y residente social contratista
		
21-06-23	Reunión con el apoyo a la supervisión social de la SIF	

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.393.717-3	CONTRATO 4600014886 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

INFORME DE INTERVENTORÍA # 6 – SOCIAL

FECHA	OBJETIVO	PARTICIPANTES
		Apoyo a la supervisión social de la SIF, residente social interventoría y residente social contratista
21-06-23	Revisión de presupuesto en la goberación de Antioquia 	Apoyo a la supervisión social y ambiental de la SIF, directores de obra, residentes sociales y residentes ambientales de la interventoría y la gobernación de Antioquia

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Conclusiones

- Para la fecha de este reporte se realizaron un 90% de las actividades programadas para el mes.

Recomendaciones


- Se le recomienda al contratista que todas las actividades realizadas deben ir acompañadas de registro fotográfico fechado y lista de asistencia y acta si lo requiere.
- Se le recomienda al contratista una comunicación asertiva y oportuna con todos los demás componentes.

17. ANEXOS

1. listado de asistencia y acta CPC
2. Acta y listado de asistencia comité social
3. Acta reunión lápiz a la obra taller 2
4. Listado de asistencia capacitación mensual
5. Información actualización carteleras informativas
6. Cuñas radiales
7. Consolidado actas de vecindad y entorno
8. Invitación CPC
9. Registro de piezas comunicacionales
10. Asistencia taller enfoque de género

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

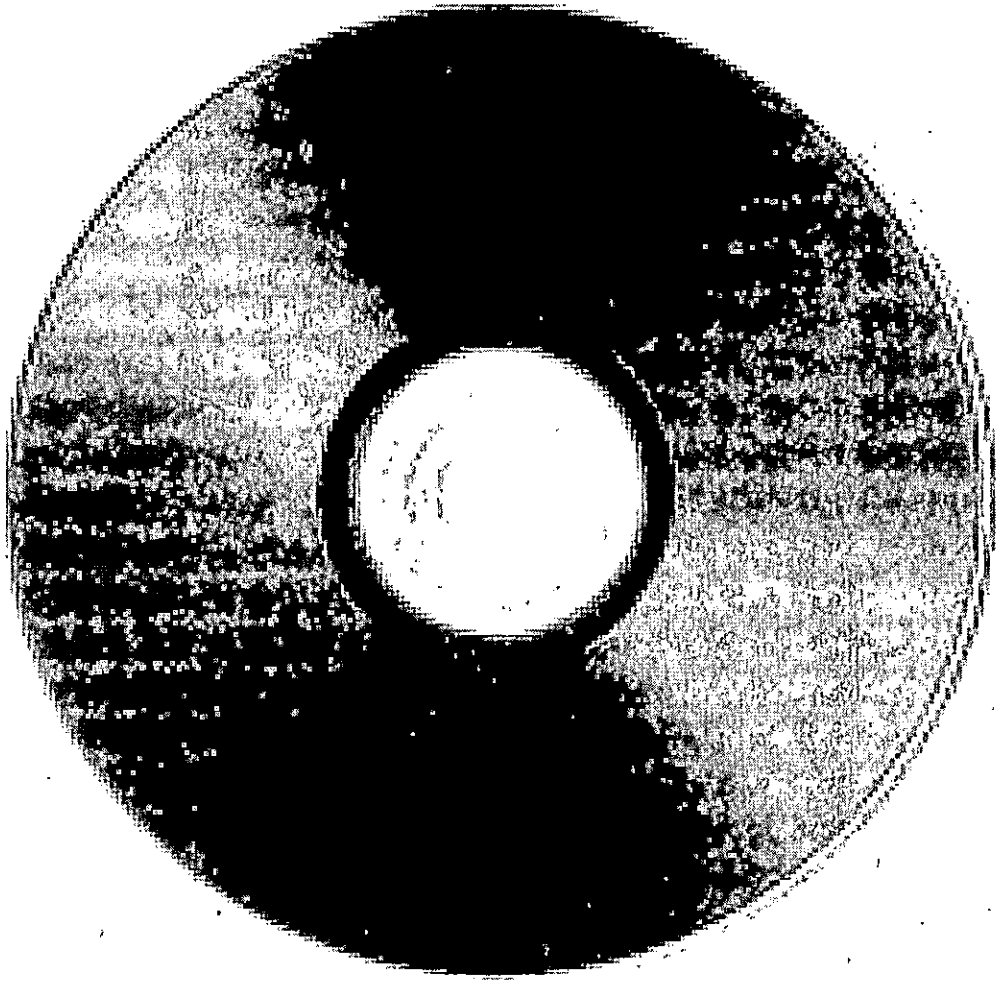

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

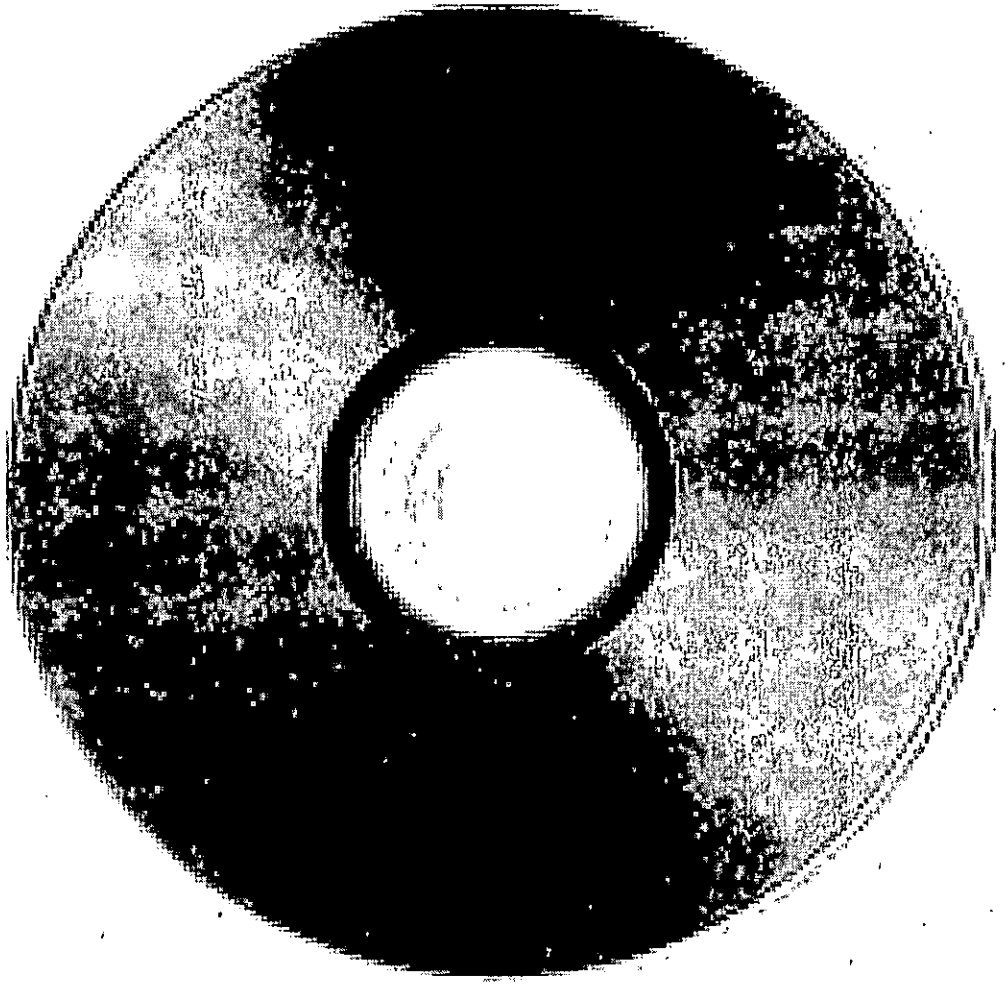

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

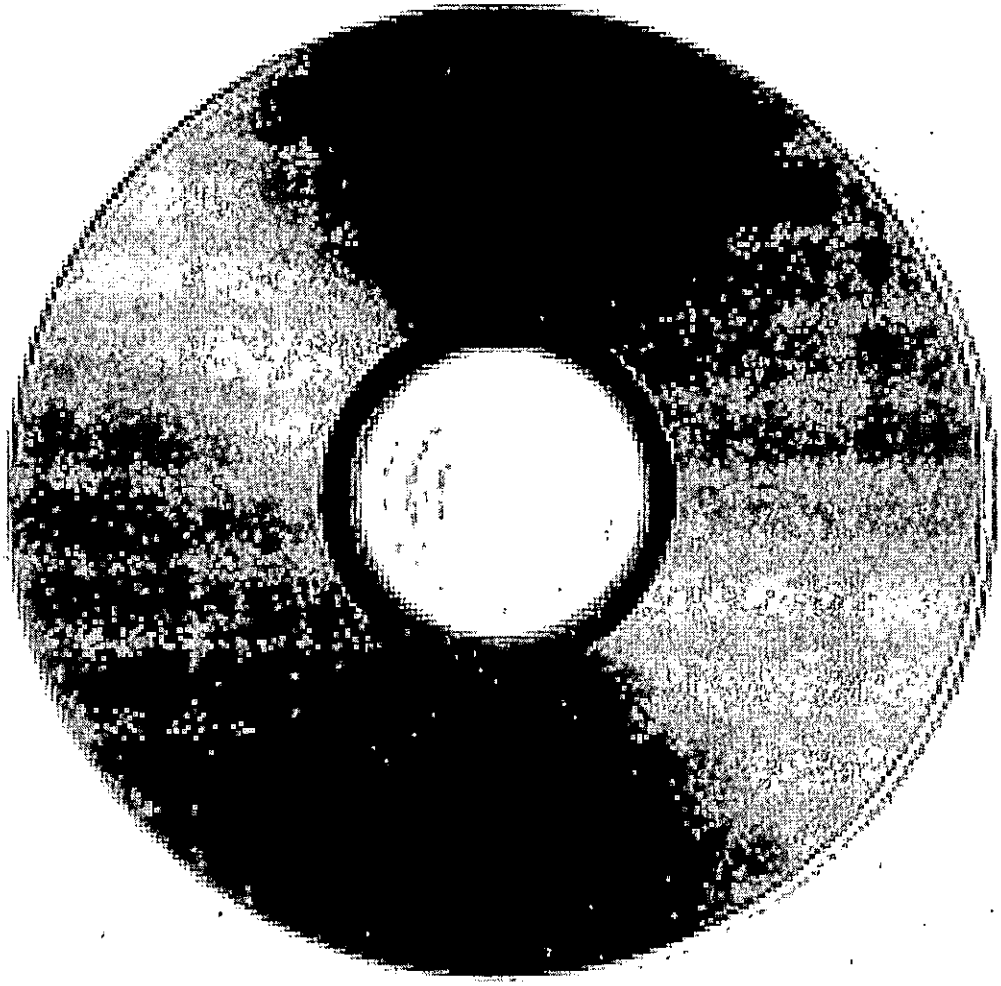

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

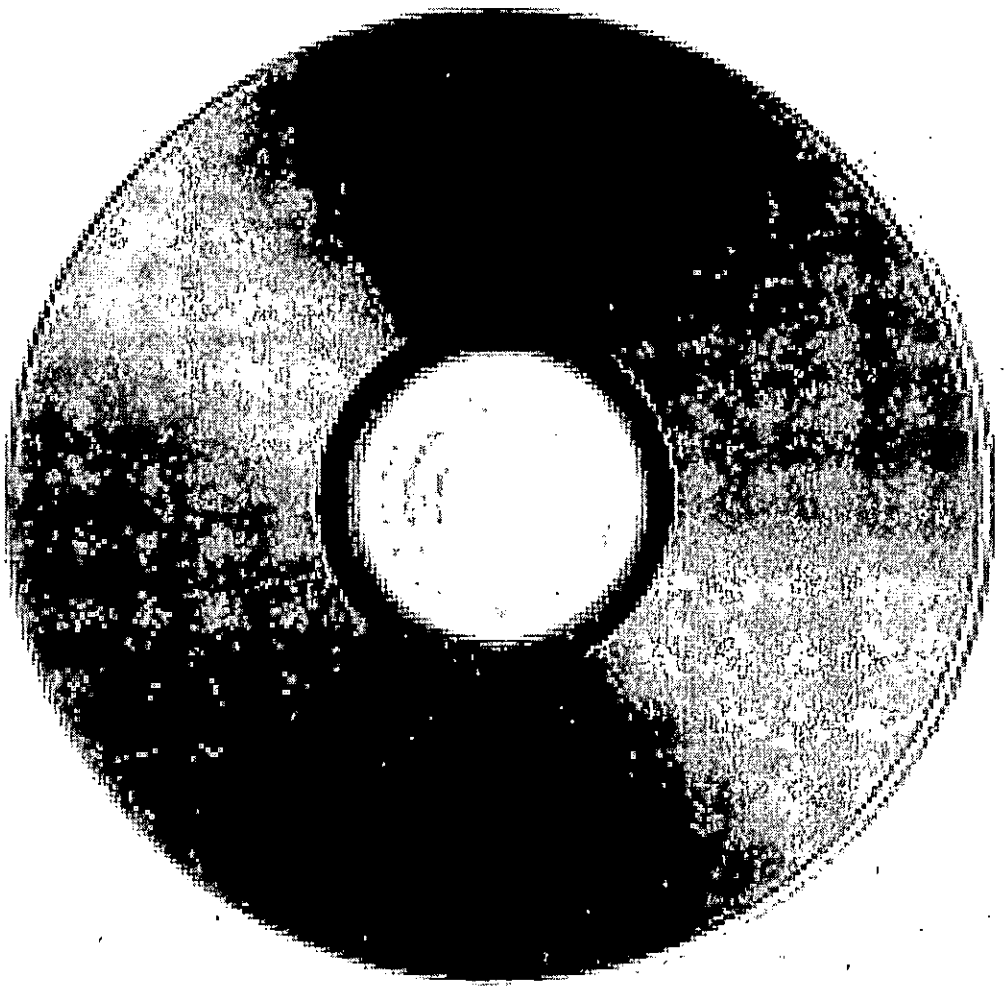

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

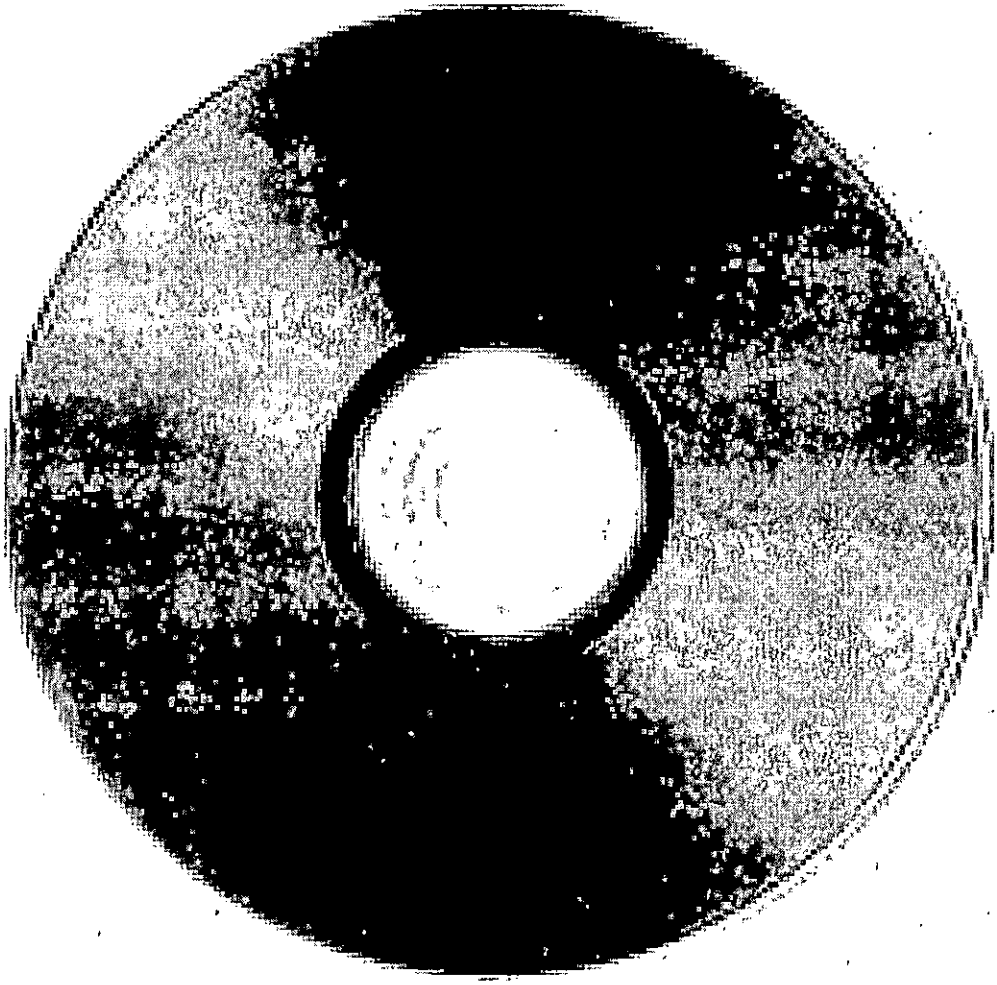

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO


En este folio va un CD/DVD

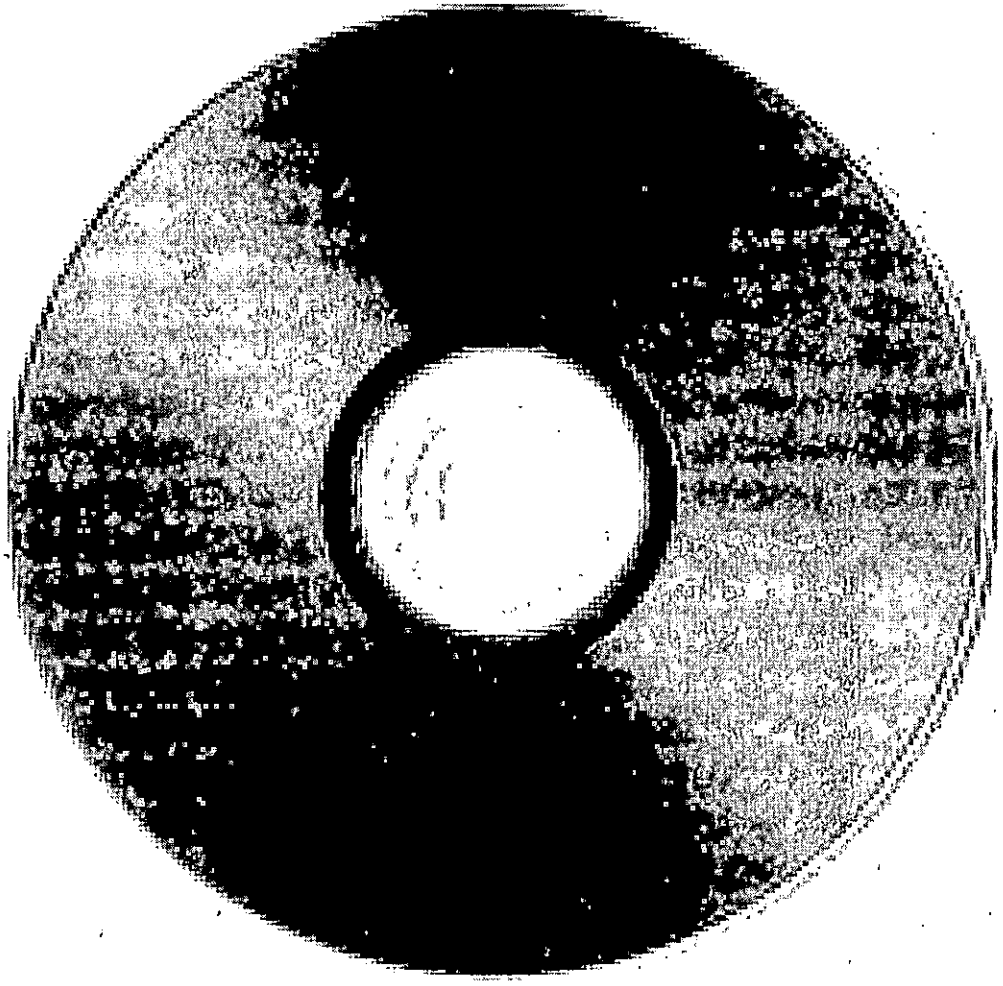

LLONDONOSA

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

En este folio va un CD/DVD

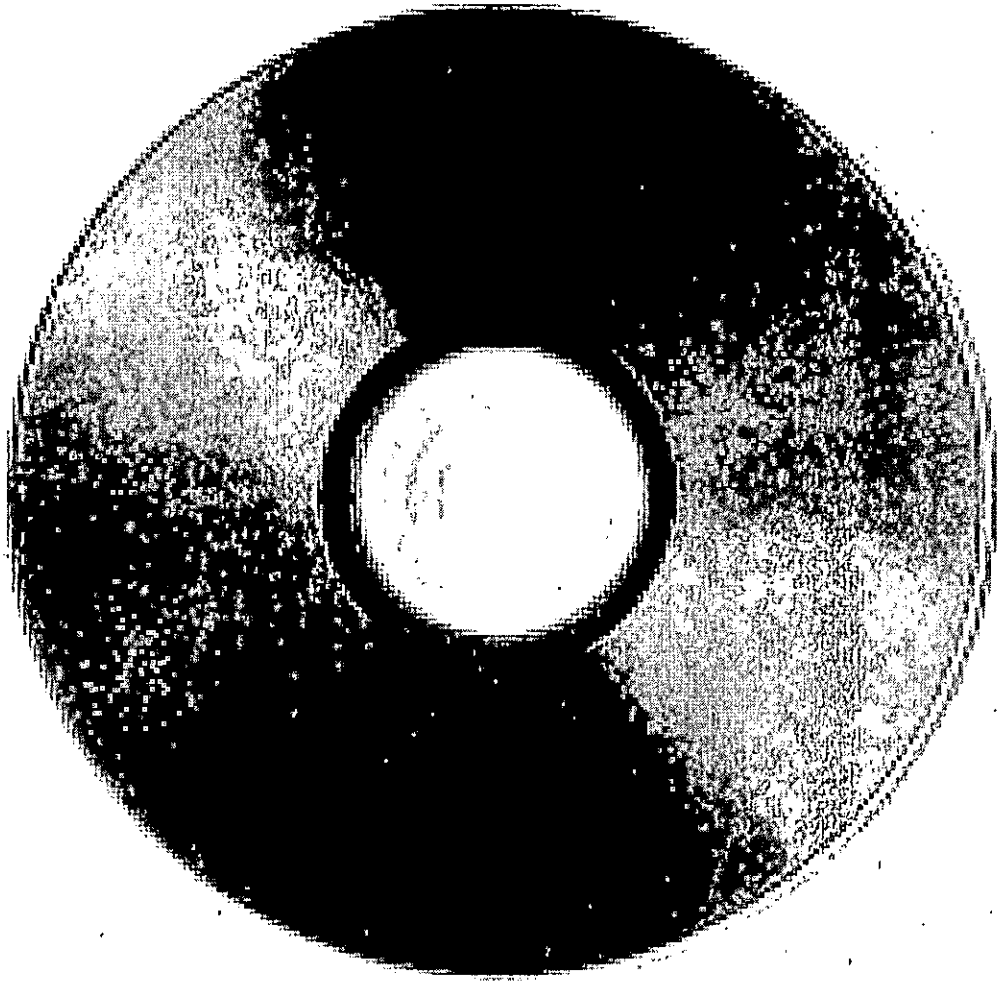

LLONDONOSA
