

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO 268 DE 2022

CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

INGENIERÍA RH

Enero 2023 – febrero 2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

INFORME TÉCNICO MENSUAL

PERIODO DEL 29 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATO OBRA 268 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ D.C – CUNDINAMARCA
28 FEBRERO DE 2023.

Contenido

1 aspecto técnico 4
1.1 descripcion del proyecto: 4
1.2 alcance de las obras contratadas: 4
1.2.1 fase n° 1 (diseños): 4
1.2.2 fase n° 2 (obra civil y eléctrica): 4
1.3 localización: 4
1.4 actividades desarrolladas: 6
1.4.1 otras actividades realizadas: 7
1.5 presupuesto contractual suscrito 7
1.6 estructura de inversion contrato: 14
1.6.1 incidencia porcentual contractual: 14
1.7 avance de obra: 15
2 aspecto administrativo y legal del contrato 16

Ilustraciones:

Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C 5

Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia 5

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022. 15

Ilustración 4: Profesionales contrato 17

Tablas

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022 14

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022 14

1 ASPECTO TÉCNICO

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objeto del proyecto es: *"CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.*

1.2 ALCANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS:

El alcance de las obras que se determinan dentro del objeto del contrato y localizadas en la inspección inicial de obra, se establece las diferentes etapas al desarrollo del proyecto; Fase 1: Diseños y Fase 2: Obras civiles y eléctricas:

1.2.1 FASE N° 1 (Diseños):

- ✓ Levantamiento arquitectónico y toma de medidas.
- ✓ Registro fotográfico actual de los espacios. (Sala n° 1, Sala n° 2 y Sala n° 3)
- ✓ Diseño Arquitectónico.
- ✓ Diseño de elementos no estructurales.
- ✓ Diseño de cableado eléctrico, cableado estructurado, audio, video, seguridad, y aires acondicionado.
- ✓ Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas.

1.2.2 FASE N° 2 (Obra civil y eléctrica):

- ✓ Actividades preliminares, desmontes de mobiliario, demoliciones, retiros de escombro.
- ✓ Mampostería y construcción de muros livianos (drywall y superboard)
- ✓ Alistados, morteros y afinados.
- ✓ Cielos rasos y acabados.
- ✓ Estucos y pinturas.
- ✓ Enchapes.
- ✓ Instalaciones eléctricas.
- ✓ Luminarias.
- ✓ Cableado estructurado.
- ✓ Sistema de ventilación mecánica (Extracción y aires acondicionados.)
- ✓ Suministro e instalación de mobiliario.
- ✓ Suministro e instalación de equipos tecnológicos.

1.3 LOCALIZACIÓN:



Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C



Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia

1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero del 2023 y el 28 de febrero de 2023, se realizó gran avance en cuanto al desarrollo de la FASE N° 1 (diseños) del presente contrato, donde se gestionaron varias reuniones con el personal encargado de los espacios adentro del piso noveno (9°), determinando la espacialidad arquitectónica y el programa arquitectónico a realizar.

- Semana del 29 de enero al 05 de febrero del 2023.
    - Avance en el desarrollo arquitectónico de las salas N° 1, N°2 y N°3; Configuración del programa arquitectónico según retroalimentación de las magistradas.
    - Presentación de primeros acercamientos ajustados de imágenes tridimensionales (3D / Renders).

- Semana del 06 de febrero al 13 de febrero del 2023.
    - El 06 de febrero de 2023 se realiza reunión con la Magistrada Dra. Diana Alexandra Remolina, la interventoría y la supervisión del contrato; Donde se retroalimenta el proyecto y a cargo de la dra. Diana propone una reunión con el profesional y encargado de la producción de eventos del consejo superior de la judicatura. (Ing. Jhon Portella.)
    - Presentación de avance arquitectónico Versión N° 4 a interventoría y supervisión, realizando una mesa de trabajo conjunta para la retroalimentación de los diseños.
    - Ajuste de diseños en salas N° 1 y N° 3.

- Semana del 14 de febrero al 21 de febrero del 2023.
    - Presentación de la reprogramación y reajuste al cronograma inicial de diseños por parte del CONTRATISTA a solicitud de la INTERVENTORÍA.
    - Reunión virtual vía meets con interventoría para asentar y ultimar temas de diseños y espacialidad de las salas.
    - Presentación de cartilla de posibles mobiliarios y paletas de colores.
    - El 21 de febrero se realiza reunión virtual entre el contratista, y la interventoría, Donde se muestra avance del proyecto y producto arquitectónico, haciendo los ajustes dados por interventoría.
    - Reunión con el ingeniero de la entidad encargado en la producción cinemática y de televisión (Jhon Portella).

- Semana del 21 de febrero al 28 de febrero del 2023.
    - Presentación a interventoría y supervisión de los diseños en fase de anteproyecto para su revisión y aprobación.
    - El 22 de febrero se realiza reunión virtual entre el contratista, la supervisión del contrato y la interventoría.
    - Ajustes pertinentes al diseño arquitectónico presentado por INGENIERÍA RH SAS.
    - Presentación de imágenes realistas tridimensionales (Renders) 3 por espacios.
    - Reprogramación y ajuste del programa de diseño arquitectónico.

1.4.1 Otras actividades realizadas:

Actividades complementarias de búsqueda de cotizaciones y muestras de mobiliario y equipo especializado.

1.5 PRESUPUESTO CONTRACTUAL SUSCRITO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.

INGENIERIA RH SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
FASE 1	**FASE 1**				
1A	**DISEÑO**				**$ 76.503,00**
1.1	Ajustes de diseño (Incluye diseño arquitectónico, elementos no estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, aire acondicionado, seguridad, audio y video, presupuesto y especificaciones técnicas, conforme con los ajustes que el proyecto requiera según las necesidades de la entidad)	M2	1,0	$ 76.503,00	$ 76.503,00
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 76.503,00**
	IVA		19%		$ 14.535,57
1A	**TOTAL DISEÑO**				**$ 91.038,57**

FASE 2	**FASE 2**				
2A.	**OBRA CIVIL**				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 713.090,00**
1.1	Desmonte de silletería fija tipo auditorio. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 8.434,00	$ 8.434,00
1.2	Desmonte y retiro de tapete. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00
1.3	Desmonte de tarimas de madera sobrepuestas. (Incluye estructura y piso, retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00
1.4	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 3. (Incluye retiro, trasiego, transporte, mantenimiento mecanismos pantallas y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.5	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 2. (Incluye retiro, trasiego, transporte y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.6	Desmonte y restauración atriles en madera. (Incluye retiro, traslado trasiego, transporte	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.674,00	$ 7.674,00
1.8	Desmonte de plafón en drywall y madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 29.955,00	$ 29.955,00
1.9	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 1.624,00	$ 1.624,00

1.10	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 13.163,00	$ 13.163,00
1.11	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 13.819,00	$ 13.819,00
1.12	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
1.13	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 93.846,00	$ 93.846,00
1.14	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.50m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 140.769,00	$ 140.769,00
1.15	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x2.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 156.410,00	$ 156.410,00
1.16	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.830,00	$ 6.830,00
1.17	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.950,00	$ 6.950,00
1.18	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 9.976,00	$ 9.976,00
1.19	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
2	**MAMPOSTERÍA**				**$ 84.668,00**
2.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,0	$ 41.675,00	$ 41.675,00
2.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,0	$ 42.993,00	$ 42.993,00
3	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 93.954,00**
3.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	1,0	$ 80.481,00	$ 80.481,00
3.2	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 13.473,00	$ 13.473,00
4	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 31.124,00**
4.1	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,0	$ 16.457,00	$ 16.457,00
4.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 14.667,00	$ 14.667,00
5	**CIELO RASOS**				**$ 57.361,00**
5.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	1,0	$ 48.709,00	$ 48.709,00
5.2	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 8.652,00	$ 8.652,00
6	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 29.866,00**
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 5.918,00	$ 5.918,00
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 13.859,00	$ 13.859,00
6.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 10.089,00	$ 10.089,00
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 412.902,00**
7.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 65.718,00	$ 65.718,00
7.2	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 88.527,00	$ 88.527,00
7.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1,0	$ 69.511,00	$ 69.511,00
7.4	Piso en Vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia.	M2	1,0	$ 189.146,00	$ 189.146,00
8	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 3.272.049,00**

8.1	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 847.343,00	$ 847.343,00
8.2	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 446.152,00	$ 446.152,00
8.3	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	1,0	$ 861.021,00	$ 861.021,00
8.4	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 102.487,00	$ 102.487,00
8.5	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 182.535,00	$ 182.535,00
8.6	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 139.469,00	$ 139.469,00
8.7	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 669.720,00	$ 669.720,00
8.8	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 23.322,00	$ 23.322,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.766.853,00**
9.1	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.086,00	$ 54.086,00
9.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 66.207,00	$ 66.207,00
9.3	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 73.404,00	$ 73.404,00
9.4	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 89.721,00	$ 89.721,00
9.5	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 96.318,00	$ 96.318,00
9.6	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.325,00	$ 54.325,00
9.7	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,0	$ 91.403,00	$ 91.403,00
9.8	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 74.009,00	$ 74.009,00
9.9	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 124.583,00	$ 124.583,00
9.10	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00
9.11	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 18.711,00	$ 18.711,00
9.12	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 12.471,00	$ 12.471,00
9.13	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 20.838,00	$ 20.838,00
9.14	Tubería EMT 1-1/4¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 23.849,00	$ 23.849,00
9.15	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 7.774,00	$ 7.774,00

9.16	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 8.334,00	$ 8.334,00
9.17	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 72.148,00	$ 72.148,00
9.18	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.520,00	$ 51.520,00
9.19	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 62.140,00	$ 62.140,00
9.20	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 131.497,00	$ 131.497,00
9.21	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 71.838,00	$ 71.838,00
9.22	Salida Sonido Ambiental. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 29.640,00	$ 29.640,00
9.23	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 56.757,00	$ 56.757,00
9.24	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 25.622,00	$ 25.622,00
9.25	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 44.549,00	$ 44.549,00
9.26	Salidas para audio / micrófono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 80.670,00	$ 80.670,00
9.27	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 55.862,00	$ 55.862,00
9.28	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 72.706,00	$ 72.706,00
9.29	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 176.640,00	$ 176.640,00
10	**LUMINARIAS**				**$ 3.578.741,00**
10.1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 273.098,00	$ 273.098,00
10.2	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 276.654,00	$ 276.654,00
10.3	Lámpara bala tipo LED 20 W JUPITER Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 107.141,00	$ 107.141,00
10.4	Luminaria LED lineal de 3m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 501.413,00	$ 501.413,00
10.5	Luminaria LED lineal de 6m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V CRI>80 - COL	un	1,0	$ 975.391,00	$ 975.391,00

10.6	Luminaria LED lineal de 9m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 1.445.044,00	$ 1.445.044,00
11	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 6.114.696,00**
11.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 91.215,00	$ 91.215,00
11.2	Bandeja portacables tipo malla. (Suministro e instalació. Incluye soportería y accesorios de instalación)	ML	1,0	$ 290.504,00	$ 290.504,00
11.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 6.447,00	$ 6.447,00
11.4	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.585,00	$ 39.585,00
11.5	Rack abierto de 2.10 mts con organizadores verticales de alta densidad frontal trasero. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 2.734.028,00	$ 2.734.028,00
11.6	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 425.984,00	$ 425.984,00
11.7	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 1.026.243,00	$ 1.026.243,00
11.8	Organizador horizontal de 80x80 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 120.418,00	$ 120.418,00
11.9	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 62.388,00	$ 62.388,00
11.10	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 7.051,00	$ 7.051,00
11.11	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.242,00	$ 51.242,00
11.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 63.669,00	$ 63.669,00
11.13	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 509.981,00	$ 509.981,00
11.14	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 586.220,00	$ 586.220,00
11.15	Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu., THHN/THWN-2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 20.424,00	$ 20.424,00
11.16	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00
11.17	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 2.830,00	$ 2.830,00
11.18	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 57.236,00	$ 57.236,00
12	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 45.712.401,00**
12.1	Salida para instalación de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto PVC 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 44.098,00	$ 44.098,00
12.2	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 299.268,00	$ 299.268,00
12.3	Unidad condensadora Multi V,IV, sala fría 20 HP 220/3/60 Ref ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 28.669.705,00	$ 28.669.705,00
12.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 8.095.028,00	$ 8.095.028,00

12.5	Controles inalámbricos. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 194.142,00	$ 194.142,00
12.6	Panel de control encendido apagado automático- control remoto	UND	1,0	$ 677.775,00	$ 677.775,00
12.7	Tubería para refrigeración aislada 1-1/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 54.769,00	$ 54.769,00
12.8	Tubería para refrigeración aislada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 36.373,00	$ 36.373,00
12.9	Tubería para refrigeración aislada 3/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 32.096,00	$ 32.096,00
12.10	Tubería para refrigeración aislada 5/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 45.365,00	$ 45.365,00
12.11	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de base de 10 pulgadas y altura variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 98.809,00	$ 98.809,00
12.12	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de altura de 12 pulgadas y base variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 126.802,00	$ 126.802,00
12.13	Rejillas de suministro RE 12"X12" L-RA-G. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 159.632,00	$ 159.632,00
12.14	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 9º Y 10º PISO - Se adecuará e instalará ducto metálico de 35 cm x 50 cm, (lámina galvanizada en cal 22) de sección cuadrada que permita extraer el aire de las zonas de baños. El ducto se empalma al sistema principal existente.	ML	1,0	$ 140.108,00	$ 140.108,00
12.15	EQUIPO DE VENTILACION MECÁNICA - En el décimo piso se suministrará e instalará un nuevo ventilador centrífugo de mayor capacidad que reemplazará al ventilador E-6 (es la numeración del actual equipo en esa área del piso). El nuevo equipo será del tipo SP-CMX-250/ 2P- MOTOR 1.5 HP, 208 V, carcaza y soporte integrado acabado en pintura electrostática. El ítem comprende el desmonte del antiguo equipo, trasiego y disposición final y todos los accesorios, soportes y ductería para la reinstalación en el mismo sitio del nuevo sistema de extracción.	UN	1,0	$ 7.038.431,00	$ 7.038.431,00
13	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.719,00**
13.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,0	$ 2.719,00	$ 2.719,00
	SUBTOTAL				**$ 61.870.424,00**
	Administración		17%		$ 10.517.972,08
	Imprevistos		3%		$ 1.856.112,72
	Utilidad		5%		$ 3.093.521,20
	IVA sobre utilidad		19%		$ 587.769,03
2A.	**SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL**				**$ 77.925.799,03**

2B.	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				
1	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				**$ 3.722.352**

1.1	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 518.988,00	$ 518.988
1.2	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela. La silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordobán y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 365.156,00	$ 365.156
1.3	MESA MULTIPROPÓSITO APILABLE Suministro e instalación de Mesa de 1,40x0,70m h=+-0,75 multiproposito, con estructura en lámina CR Cal. 14, con acabado en pintura epoxi y electropulido, , accesorios y sistema abatible, Superficies en madera tipo táblex de 30mm madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), laminado de alta presión y Balance-Baker en la cara inferior, canto rígido temofundido de 2mm de color similar a la superficie de trabajo, Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo, ruedas de goma negras de 65mm con freno, según ficha y diseño.	UN	1,0	$ 2.606.826,00	$ 2.606.826
1.4	MANTENIMIENTO DE SILLAS FIJAS TIPO AUDITORIO - mantenimiento general de las sillas de la marca registrada "Series", existentes en la sala. Incluye retapizado en cuero sintético, reemplazo de espuma y herrajes deteriorados utilizando piezas nuevas originales. Las sillas se anclan al piso o a la tarima elevada utilizando herrajes apropiados para segurar a la superficie de la base.	UN	1,0	$ 231.382,00	$ 231.382
2	**EQUIPOS TECNOLOGÍA**				**$ 15.272.927**
2.1	Pantalla industrial de 75" (operatividad 16/7) con resolución nativa 4K UHD 3840 x 2160 (16:9), 50,000 horas de vida útil (al 50% del brillo original), brillo de 400 nits, contraste de 1,400:1, espacio de color (CIE 1931) de 68%, entradas 4 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3), OPS, USB 3.0, salidas de video DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0, entrada de audio análoga RCA, slaida de audífonos de 3.5mm, salida óptica de audio, control por RS-232 y LAN (RJ45), soporte HDR10, conectividad por Wi-Fi y Miracast	UN	1,0	$ 14.337.546,00	$ 14.337.546
2.2	Soporte de pared para monitor, capacidad de carga mínima de 112 Kg, certificado UL y OSHPD	UN	1,0	$ 935.381,00	$ 935.381
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 18.995.279,00**
	IVA		19%		$ 3.609.103,01
2B.	**SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**				**$ 22.604.382,01**

2A.	SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL				$ 77.925.799,03
2B.	SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)				$ 22.604.382,01
	TOTAL OBRA + MOBLIARIO Y EQUIPOS (A + B)				**$ 100.530.181,04**

1A	**TOTAL DISEÑO (Incluido IVA)**	**$ 91.038,57**
2A.	**TOTAL OBRA CIVIL (Incluido AIU e IVA)**	**$ 100.530.181,04**
2B.	**TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**	**$ 100.621.219,61**

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022

1.6 ESTRUCTURA DE INVERSION CONTRATO:

Se estructura el proceso con un listado de actividades de precios unitarios con valores fijos, Donde se ejecuta en el modelo de matriz de desarrollo progresivo en la cual, se determinen las cantidades reales y definitivas de obra, (Terminación de la FASE N° 1), llegando al valor final contractual de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663,00).

1.6.1 INCIDENCIA PORCENTUAL CONTRACTUAL:

CONTRATO DE OBRA 268/2022			
ACTIVIDADES	VR. INVERSIÓN		% INCIDENCIA
DISEÑO	$	91.038,57	0,09%
OBRA CIVIL	$	77.925.799,03	77,44%
MOBILIARIO Y EQUIPOS	$	22.604.382,01	22,46%
VR TOTAL UNITARIOS	$	100.621.219,61	100,00%
VR TOTAL CONTRATO	$		989.251.663,00

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022



	DISEÑO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO Y EQUIPOS
VALORES	$91.038,57	$77.925.799,03	$22.604.382,01
INCIDENCIA PORCENTUAL	0,09%	77,44%	22,46%

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022.

1.7 AVANCE DE OBRA:

El avance de obra se encuentra supeditado al aval de aprobación de la FASE N° 1 (Diseños), la cual se ha realizado un avance según programación del 70 % de ejecución de la actividad total, Actividad a liquidación previa aprobación final de diseños.

2 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las condiciones contractuales suscritas con, la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. mediante contrato de obra:

CONTRATO No.	268 DE 2022
OBJETO	Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022
CONTRATANTE	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA	INGENIERIA RH S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
VALOR TOTAL DEL COTRATO	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663)INCLUIDO IVA Y AIU.
FECHA DE INICIO	28/12/2022
FECHA DE TERMINACION	31/12/2022
MODIFICATORIO N°1	PRÓRROGA N° 1 POR 116 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO N° 1	26/14/2023
POLIZAS	No. 21-44-101402157 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-44-101402157 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 2 EXPEDIDA 27/01/2023
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

POLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA (desde-hasta)	VALOR ASEG.	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN.
21-44-101402157	Seguros del Estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00	16/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		
		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 31/12/2025	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00	16/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
21-44-101402157	seguros del estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00	30/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		

		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 16/04/2026	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00	30/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00	27/01/2023	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		

El aspecto administrativo del contrato, está conformado por el personal profesional de INGENIERIA RH SAS, ofertado y conformado por los siguientes perfiles profesionales de acuerdo con los términos de contratación:

No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 1	
1	DIRECTOR DE DISEÑOS – Arquitecto	50% de dedicación.
2	DISEÑADOR – Arquitecto.	50% de dedicación.
3	DISEÑADOR ELECTRICO – Ing. Eléctrico o electricista.	20% de dedicación.
4	DISEÑADOR DE EQUIPOS TECNOLOGICOS – Ing. De sistemas o electrónico.	20% de dedicación.
No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 2	
1	DIRECTOR DE OBRA – Arquitecto Y/o Ingeniero civil.	50% de dedicación.
2	RESIDENTE DE OBRA 1 – Arquitecto y/o Ingeniero civil.	100% de dedicación.
3	RESIDENTE DE OBRA 2 – Ing. Electrónico o de sistemas.	50% de dedicación.
4	RESIDENTE DE SST –Técnico o tecnólogo en el área de salud en el trabajo.	30% de dedicación.
5	MAESTRO DE OBRA. – Técnico o tecnólogo en obras civiles.	100% de dedicación.

Ilustración 4: Profesionales contrato

Se anexan los registros fotográficos de las actividades desarrolladas durante este periodo, junto con la programación y la documentación de afiliación del personal de obra que viene laborando en el contrato.


Cordialmente,


Ing. Rodrigo Ernesto Hidalgo Martínez
Representante Legal
INGENIERIA RH SAS


ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 /6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 1

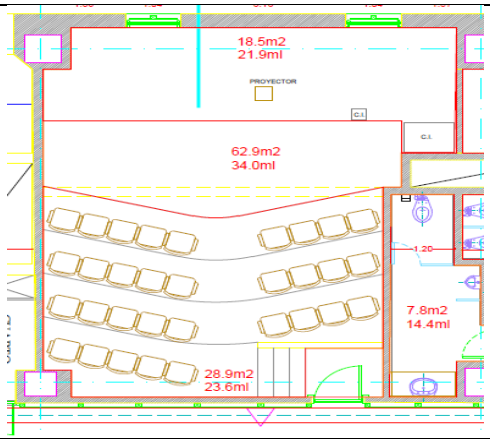

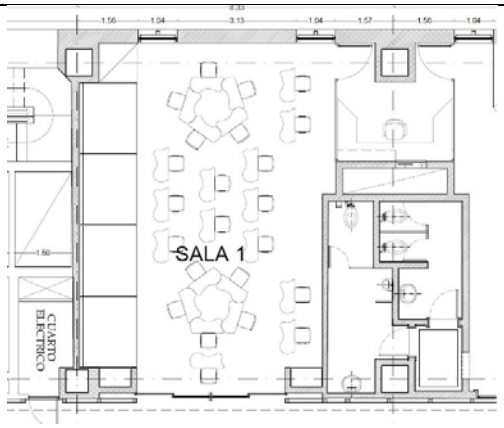

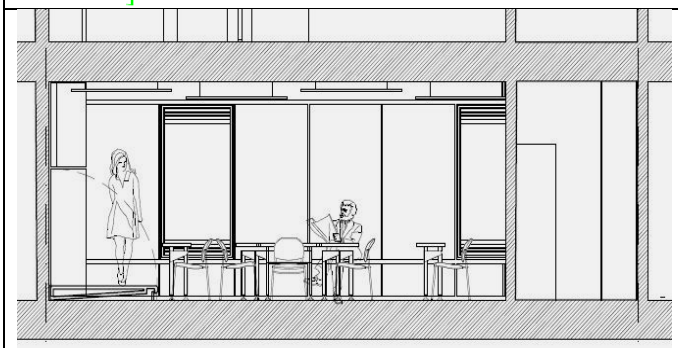

CORTE SALA 1

3 4










REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 2



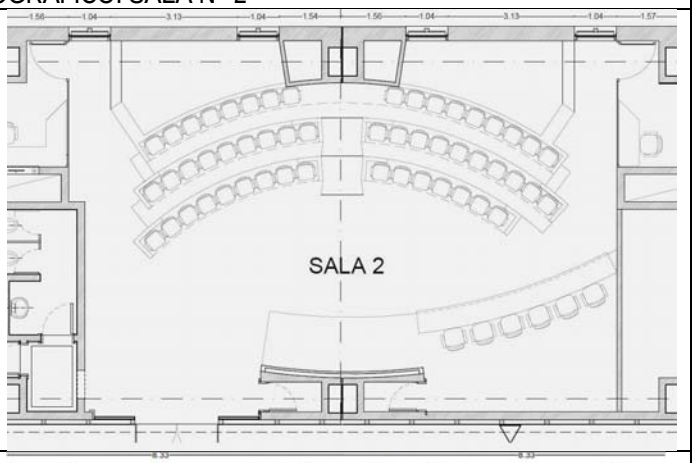

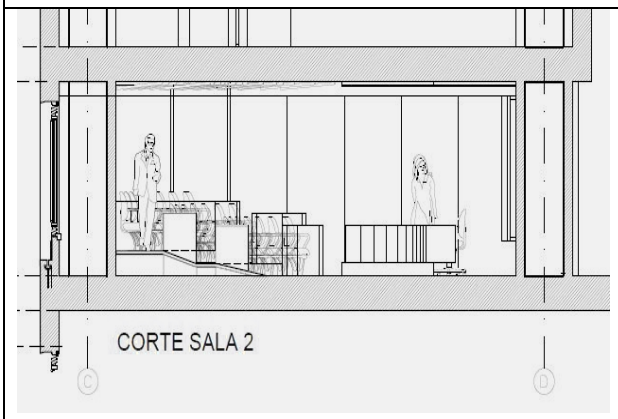


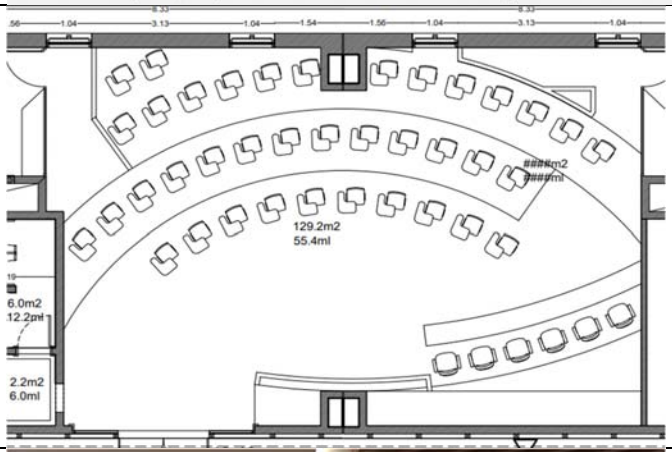






REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 3

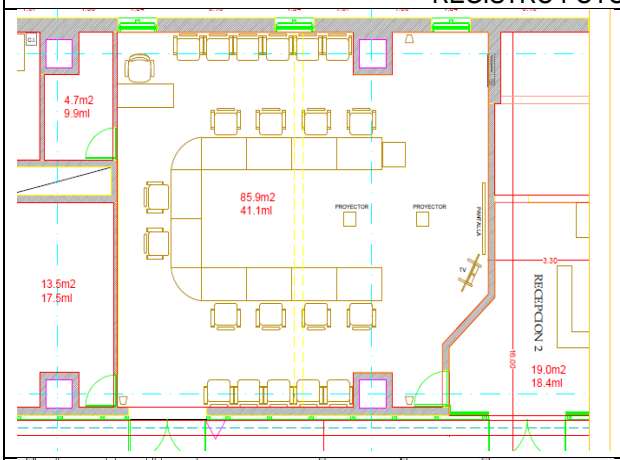

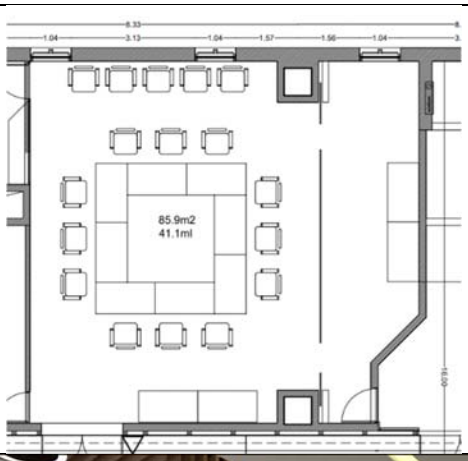










ANEXO DE RE- PROGRAMACIÓN (FASE N° 1)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO 268/2022**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
2		**FASE 1**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
3		1. Acta de inicio	0 días	mié 28/12/22	mié 28/12/22	
4		1.1. Preeliminares	8 días	mié 28/12/22	mié 4/01/23	
5		1.2. Levantamiento arquitectónico, registro fotográfico actual, actas de vecindad y ajuste planimetrias	10 días	lun 2/01/23	mié 11/01/23	4CC+5 días
6		1.3. Primera aproximación arquitectónica	7 días	jue 12/01/23	mié 18/01/23	5
7		1.4. Reunión de avance Nº 1	1 día	jue 19/01/23	jue 19/01/23	6
8		1.5. Busqueda e investigación de referentes, presentación de bosquejos	3 días	jue 19/01/23	sáb 21/01/23	7CC-1 día
9		1.6. Reunión de avance Nº2 (Magistrados)	1 día	lun 23/01/23	lun 23/01/23	8CC
10		1.7. Esquema básico	5 días	mar 24/01/23	sáb 28/01/23	9
11		1.8. Revisión de diseños por parte de interventoría y entidad	2 días	sáb 4/02/23	dom 5/02/23	10
12		1.9. Ajuste a esquemas básicos	3 días	dom 5/02/23	mar 7/02/23	11FC-1 día
13		1.10. Anteproyecto Nº 1	7 días	mié 8/02/23	mar 14/02/23	12
14		**Presupuesto fase 2 (APUs, cronograma, especificaciones)**	25 días	vie 10/02/23	lun 6/03/23	13CC+2 días
15		1.11. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nº 1	5 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23	13
16		1.12. Anteproyecto Nª 2	9 días	lun 20/02/23	mar 28/02/23	15
17		1.13. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nª 2	3 días	mié 1/03/23	vie 3/03/23	16
18		1.14. Presentación de proyecto final (renders, memorias, planos y presupuesto)	7 días	sáb 4/03/23	vie 10/03/23	17
19		**Presentación final**	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23	18FC-1 día;14

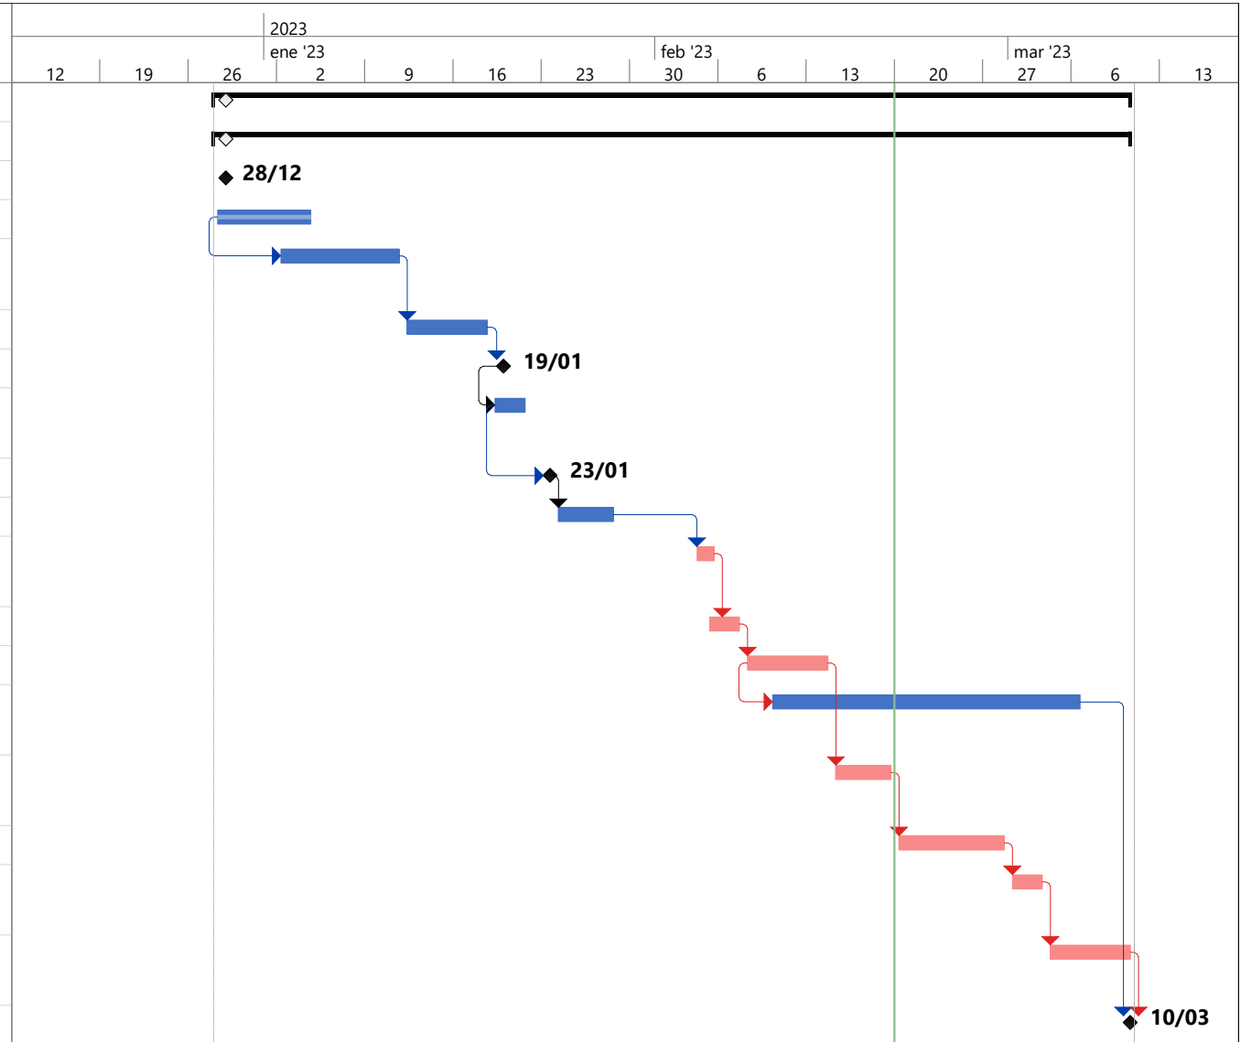

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: lun 20/02/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

ANEXO PLANILLAS DE AFILIACION PERSONAL DE INGENIERIA RH SAS ENERO – FEBRERO 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 /6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-02-09, 03:57:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	INGENIERIA RH SAS
NIT	NI 830061440
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1051702992
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1909674468
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 13.764.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.633.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.440.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 4.625.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 320.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 66.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 1.009.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 364.100	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	1	$ 46.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 186.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 305.300	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 1.789.400	$ 0
N891600091	CCF29	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	1	$ 80.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	18	$ 1.897.600	$ 0
		SubTotales:		$ 13.764.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.764.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!
