LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

CONVENIO No.
2022 03 0150

PERIODO DEL INFORME
FEBRERO

Supervisor
EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ
Secretario de Gobierno del Departamento

Valledupar febrero de 2023

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Contenido

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 3
RESUMEN 3
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 4
EJECUCIÓN O AVANCE DE OBRA 5
Obras programadas versus ejecutada 5
REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
CONCLUSIONES 12

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El Departamento del Cesar, apertura Convenio Solidario **No. 2022 03 0150**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LAJUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA- CESAR, PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE "** dicho proceso fue adjudicado mediante contratación directa, ley 2166 de 2021, conformado por JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN, con NIT 901418532-0, Representado legalmente por **ERVING DURANGO COTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.062.397.402.

El proyecto en mención se encuentra ubicado con coordenadas latitud 9.9752494° y longitud -73.8812991° Ubicada en el parque principal del barrio San Martin del municipio de Bosconia– Cesar, el presente proyecto se fundamenta en el difícil acceso a la recreación por parte de la población en las instalaciones del parque debido a su deterioro.

RESUMEN

El pasado 23 de noviembre de 2022 se dio inicio al contrato de obra **CONVENIO SOLIDARIO,** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO BOSCONIA -CESAR, PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE**" con fecha de suscripción 9 de noviembre de 2022.

Con este convenio solidario a la junta de acción comunal JAC BARRIO SAN MARTIN se busca mejorar las condiciones físicas en beneficio de la comunidad así:

VALOR COSTO DIRECTO		$ 46,728,971.97
ADMINISTRACION DEL 6%	6%	$ 2,803,738.32
IMPREVISTOS	1%	$ 467,289.72
TOTAL PRESUPUESTO		$ 50,000,000

Tabla 1. Costos del contrato de obra
Fuente. Propuesta de la Junta de Acción Comunal

LO HACEMOS MEJOR

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación:	CONTRATACION DIRECTA
Tipo de Contratación:	CONVENIO SOLIDARIO
Justificación de contratación:	LEY 2166 DE 2021
No. Proceso de selección	RESO-SGR-0082-2022
Número del convenio	2022 03 0150
Número del contrato SECOP II	CO1.PCCNTR.4172307
Fecha de suscripción del contrato:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO BOSCONIA-CESAR, PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE.
Contratista:	JAC JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE BOSCONIA
Identificación NIT:	901418532-0
Representante legal	ERVING DURANGO COTES
Identificación representante legal:	C.C. No. 1.062.397.402
Valor inicial del contrato:	$50.000.000
Plazo total del contrato:	2 DOS MESES
Fecha de inicio:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
Plazo final del contrato:	21 DE FEBRERO DE 2023

Tabla 2. Datos generales del contrato de obra.
Fuente. Elaboración propia.

EJECUCIÓN O AVANCE DE OBRA

OBRAS PROGRAMADAS VS EJECUTADA

GOBERNANCIÒN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		SECRETARIA DE GOBIERNO				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO BOSCONIA - CÉSAR, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% PRESUPUESTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% AVANCE EJECUTADO**
1.1	Desmonte de malla eslabonada en mal estado	M2	150	14%	150	14%
1.2	Demolicion de columneta	UN	16	1%	16	1%
1.3	Desmonte de parque infantil en mal estado	UN	1	1%	1	1%
1.4	Mantenimiento de 11 bisaludables incluyew desmonte, mantenimiento, cambio de balinera, pintura y reinstalacion	GL	1	13%	1	13%
1.5	Soporte en tubo galbanizado de 2" para malla	ML	150	15%	150	15%
1.6	Refuerzo con platina para malla de cerramiento 3/4x3/16	ML	45	3%	45	3%
1.7	Suministro e instalacion de parque infantil	UN	1	14%	1	14%
1.8	Reparacion de malla contraimpacto de cancha futbol 7	M2	130	23%	130	23%
1.9	Construccion de malla contraimpacto de cancha multifuncional	M2	85	17%	85	17%
AVANCE				100%		100%

Tabla 3. Ejecución física.
Fuente. Supervisor.

Este periodo se realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto, ubicado con coordenadas latitud 9.9752494° y longitud -73.8812991° Ubicada en el parque principal del barrio San Martin del municipio de Bosconia– Cesar, hasta la fecha del presente informe JAC BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA ha desarrollado las siguientes actividades: Desmonte de malla eslabonada en mal estado, Demolición de columneta, Desmonte de parque infantil en mal estado, Mantenimiento de 11 biosaludables incluye desmonte, mantenimiento, cambio de balinera, pintura y reinstalación, Soporte en tubo galbanizado de 2" para malla, Refuerzo con platina para malla de cerramiento 3/4x3/16, Suministro e instalación de parque infantil, Reparación de malla contraimpacto de cancha futbol 7, Construcción de malla contraimpacto de cancha multifuncional


Cabe resaltar que esta supervisión pudo verificar en campo que la **JAC BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA** ejecuta obras en su totalidad con un avance de ejecución del **100%** de las cantidades de obras programadas en la mayoría de actividades contenidas en este convenio.

Valor del convenio	50,000,000
Valor del primer desembolso	20.000.000
Valor solicitado del desembolso final	30.000.000

Tabla 4. Ejecución financiera del contrato de obra.
Fuente. Elaboración propia.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIA 1 Y 2. Desmonte de malla eslabonada en mal estado

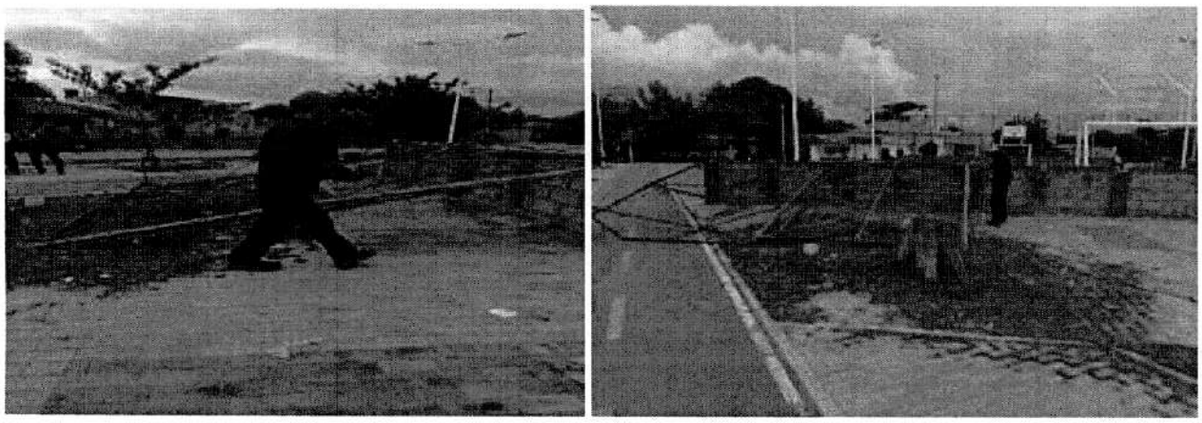


Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 3 Y 4. Demolición de columneta

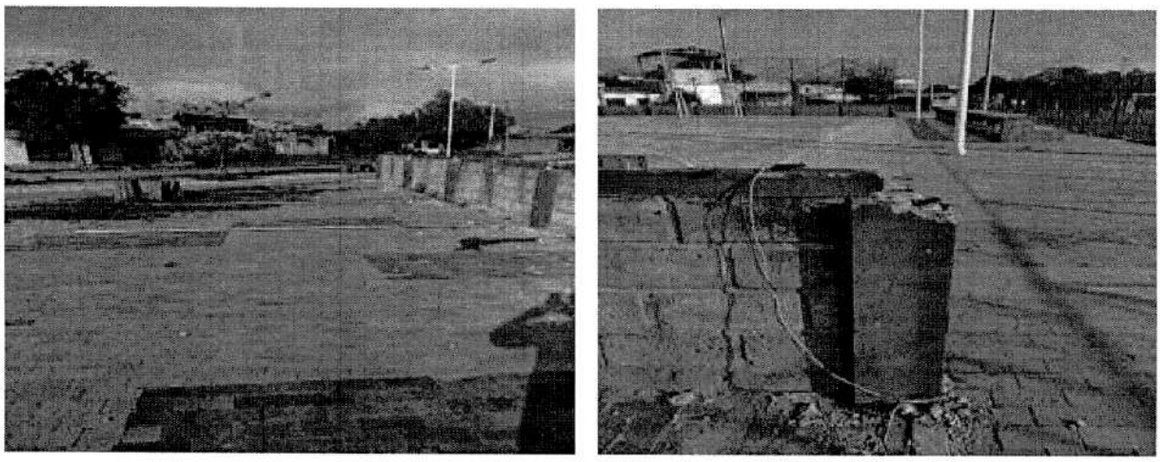


Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 5 Y 6. Desmonte de parque infantil en mal estado

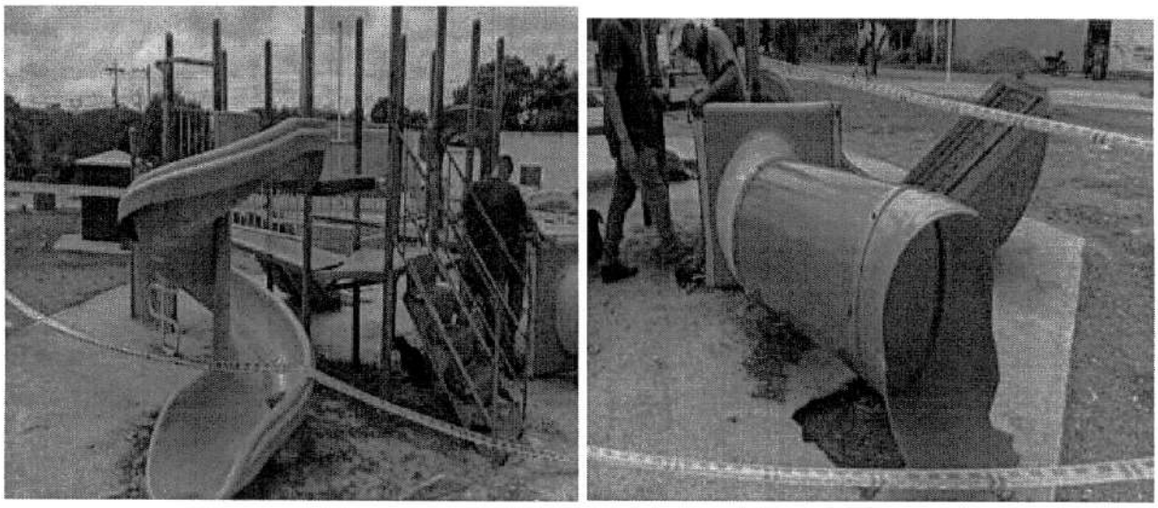



Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 7 Y 8. Mantenimiento de 11 biosaludables incluye desmonte, mantenimiento, cambio de balinera, pintura y reinstalación.

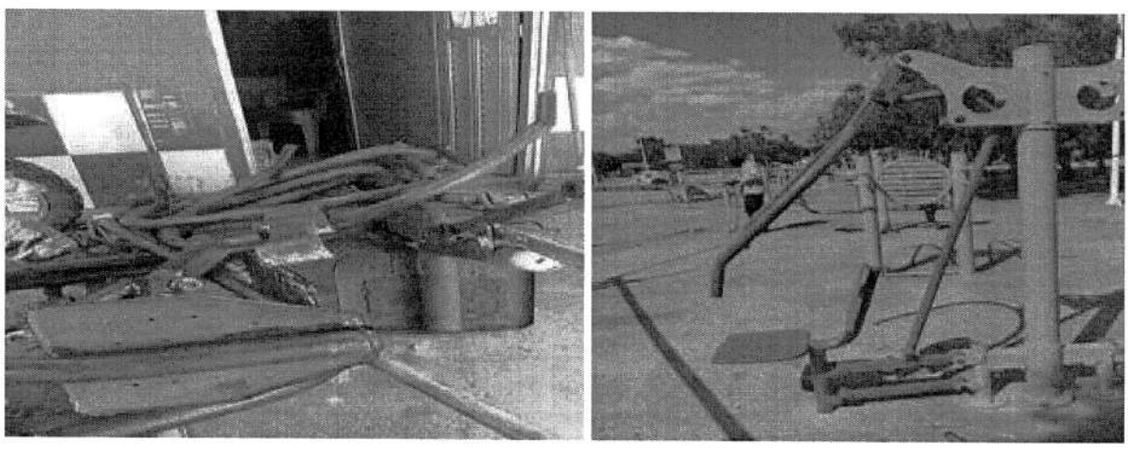


Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 9 Y 10. Soporte en tubo galbanizado de 2" para malla.

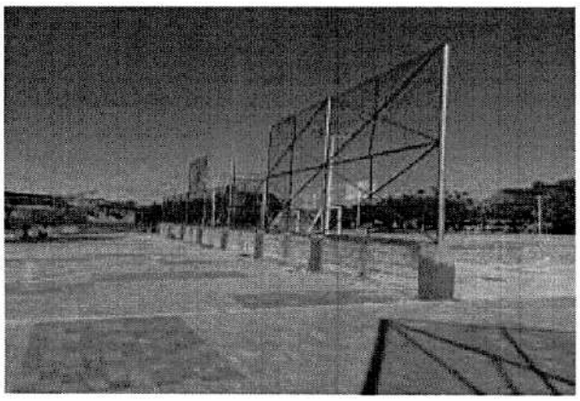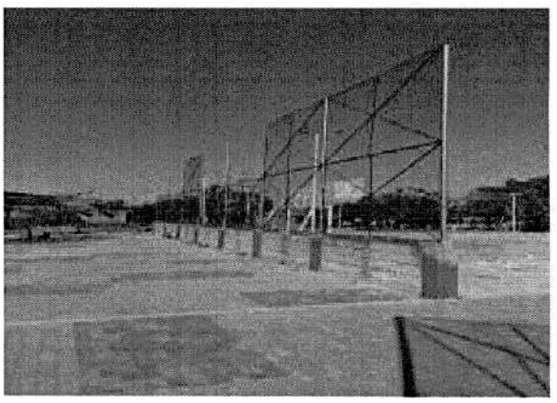Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 11 Y 12. Refuerzo con platina para malla de cerramiento 3/4x3/16.


Fuente. Archivo de seguimiento.

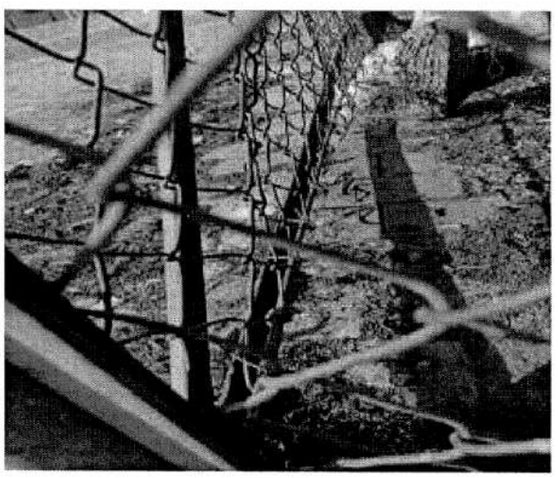FOTOGRAFIA 13 Y 14. Suministro e instalación de parque infantil




Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 17 Y 18. Reparación de malla contraimpacto de cancha futbol 7

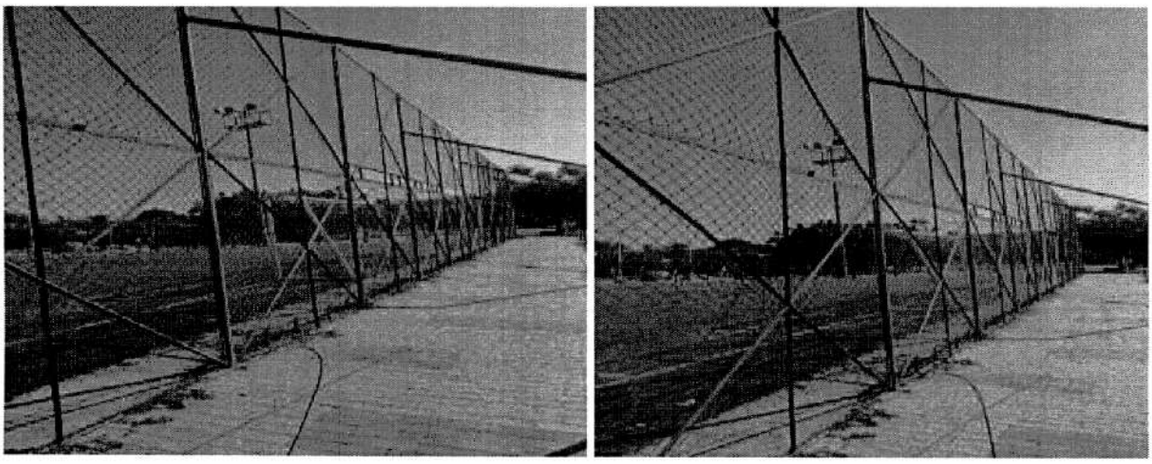

Fuente. Archivo de seguimiento.

FOTOGRAFIA 19 Y 20. Construcción de malla contraimpacto de cancha multifuncional

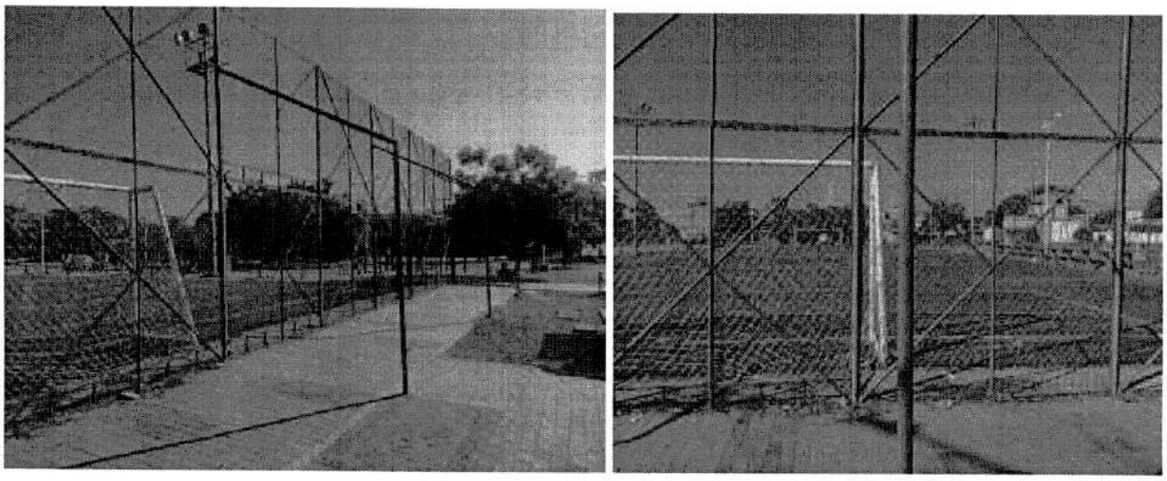

Fuente. Archivo de seguimiento.

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

CONCLUSIONES.

Durante el seguimiento y visita el día 08 de febrero de 2023 se hace entrega de las actividades del convenio donde es evidente el esfuerzo en lograr el objeto del contrato a través del excelente manejo en la ejecución de cada actividad programada, el buen material utilizado y la planeación por parte de la junta de acción comunal del barrio San Martin del municipio de Bosconia, la cual se vio reflejado en los resultados de la calidad y tiempos establecidos en el contrato.

EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ
SUPERVISOR
Secretario de Gobierno
