FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
2	DE	7		01/07/2023	31/07/2023		04	08	2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Nombre/ Razón Social	**ESMERALDA LÓPEZ SÁNCHEZ**	**No. Identificación C.C o C.E**	52.824.497 de Bta.	**Contrato No.**
		NIT		**GGC-640-2023**
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales, con plena autonomía para brindar apoyo técnico a la Dirección de Energía Eléctrica en la supervisión de los diferentes contratos y/o convenios y/o contratos especiales que se encuentren en etapa de ejecución, liquidación o AOM, que sean ejecutados con recursos de los fondos de inversión FAER, FAZNI y PRONE, para los proyectos de la normalización de redes, energización en las zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas del país. Para dicho propósito, realizará el estricto seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y acatará los procedimientos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía para la efectiva ejecución de los recursos que fueron asignados por los fondos. Además, deberá cumplir con las actividades que le designe el supervisor relacionado con las actividades cargo de la Dirección de Energía Eléctrica.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)
1	Realizar todas las actividades administrativas y técnicas encaminadas a brindar el apoyo técnico a la supervisión de los contratos especiales, contratos y convenios, en etapa de ejecución, AOM y/o liquidación, asignados por el supervisor, ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación de proyectos de energía eléctrica.	* Se realiza seguimiento y control con interventoría y el área jurídica del MME de los contratos que me fueron asignados: FAZNI GGC-650-L4-20; FAZNI-GGC-590-L05-20; FAZNI-GGC-648-L05-20; FAZNI-GGC-616-L05-20; FAZNI-GGC-593-L05-20; FAZNI-GGC-634-L05-20; FAZNI-GGC-660-L06-20; FAZNI-GGC- 652-L6-20; FAZNI-GGC- 662-L6-20; FAZNI-GGC-630-L4; FAZNI-GGC-630-L5 y FAZNI-GGC-630-L6 y FAER GGC-504-2022. *Se hicieron las siguientes actividades a los siguientes contratos: 1) Solicitud modificación cláusula cuarta- cambio numeración de hitos de pago contrato FAZNI -593-20. 2) Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-652-20 3) Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-662-20 4) Se remitió modelo de acta terminación contrato de interventoría 630-20-L4

		5) Se contestó correo, traslado de petición radicado 2-2023-021900. 6) Se subió información en el repositorio de información de teams carpeta de liquidación Contrato FAZNI-GGC-652-20. 7) Se subió información en el repositorio de información de teams carpeta de liquidación Contrato FAZNI-GGC-662-20. 8) Se gestionó con la interventoría certificado de cumplimiento de los contratoFAZNI-GGC-652-20 y Fazni-GGC-662-20. 9) Se Remitió a apoyo jurídico el acta corregida de cierre etapa previa del contrato FAZNI -660-20 10) Se notificó por correo a la ing Marcela Araujo los contratos que entran a etapa de liquidación. 11) Se remitió para apoyo jurídico las garantías de la etapa AOM de los contratos FAZNI-GGC-590,648, 616 Y 593 del 2020. 12) Se realizó presentación en power point para presentar al CAFAER la solicitud de reducción de alcance del FAER -504-22.
2	Ejercer el seguimiento y control sobre la ejecución contractual de todos los contratos especiales, contratos en etapa de ejecución y AOM, asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los Operadores de Red.	Se recibieron y se revisaron mediante correo electrónico solicitudes de modificaciones contractuales y comunicaciones de los contratos en el mes de junio del 2023 por parte de la interventoría y operador de red. de los siguientes contratos: FAZNI GGC-650-L4-20; FAZNI-GGC-616-L05-20; FAZNI-GGC-593-L05-20; FAZNI-GGC-634-L05-20; FAZNI-GGC-660-L06-20; FAZNI-GGC- 652-L6-20; FAZNI-GGC- 662-L6-20; FAZNI-GGC-630-L4, FAZNI-GGC-630-L5, FAZNI-GGC-630-L6 y FAER-504-22.
3	Apoyar la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas pactadas en los contratos en etapa de ejecución y AOM asignados, informes periódicos, requerimientos mediante oficio al Operador de Red, conceptos técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes de los contratistas derivados, informes de interventoría, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una eficiente y oportuna supervisión.	1) Solicitud modificación cláusula cuarta- cambio numeración de hitos de pago contrato FAZNI -593-20. 2) Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-652-20 3) Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-662-20 4) Se remitió modelo de acta terminación contrato de interventoría 630-20-L4
4	Requerir al Operador de Red toda la documentación necesaria con el fin de llevar a cabo la suscripción del acta de terminación y balance financiero, acta de liquidación, acta de verificación o cualquier acta cuya suscripción sea necesaria para el adecuado desarrollo o terminación de los contratos asignados.	Se Solicitó la información a la interventoría los documentos faltantes para el trámite de suscripción del Acta de terminación de la etapa de ejecución del contrato FAZNI-GGC-660-20
5	Elaborar, suscribir y revisar los informes técnicos requeridos para la proyección de otrosíes, informes de estado, informes de supervisión, actas de terminación y balance financiero, actas de liquidación, actas de	*Se hicieron las siguientes actividades a los siguientes contratos:

	verificación, respuestas a los entes de control, comunicaciones o demás documentos requeridos por el supervisor en relación a los contratos asignados.	1. Solicitud modificación cláusula cuarta- cambio numeración de hitos de pago contrato FAZNI -593-20. 2. Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-652-20 3. Informe supervisión para pago sexto FAZNI-GGC-662-20 4. Se remitió modelo de acta terminación contrato de interventoría 630-20-L4 5. Se contestó correo, traslado de petición radicado 2-2023-021900. 6. Se subió información en el repositorio de información de teams carpeta de liquidación Contrato FAZNI-GGC-652-20. 7. Se subió información en el repositorio de información de teams carpeta de liquidación Contrato FAZNI-GGC-662-20. 8. Se gestionó con la interventoría certificado de cumplimiento de los contratoFAZNI-GGC-652-20 y Fazni-GGC-662-20. 9. Se Remitió a apoyo jurídico el acta corregida de cierre etapa previa del contrato FAZNI -660-20 10. Se notificó por correo a la ing.Marcela Araujo los contratos que entran a etapa de liquidación. 11. Se remitió para apoyo jurídico las garantías de la etapa AOM de los contratos FAZNI-GGC-590,648, 616 Y 593 del 2020. Se realizó presentación en power point para presentar al CAFAER la solicitud de reducción de alcance del FAER -504-22.
6	Participar en la elaboración de los inventarios de los activos eléctricos derivados de los contratos asignados bajo los parámetros establecidos por el área mediante el Acuerdo de Nivel de servicios entre DEE-SAF para efectuar el respectivo registro contable.	No aplica para el periodo del informe.
7	Realizar un permanente registro, actualización, adecuación, validación, análisis, control y seguimiento de la información y documentos relacionados con el desarrollo de los contratos asignados por el supervisor, y consignarlos en plataformas de la dirección de Energía Eléctrica, establecidos para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre otros.	Se dio cumplimiento en este periodo para los siguientes contratos: FAZNI GGC-650-L4-20; FAZNI-GGC-616-L05-20; FAZNI-GGC-593-L05-20; FAZNI-GGC-634-L05-20; FAZNI-GGC-660-L06-20; FAZNI-GGC- 652-L6-20; FAZNI-GGC- 662-L6-20; FAZNI-GGC-630-L4, FAZNI-GGC-630-L5, FAZNI-GGC-630-L6 y FAER-504-22.
8	Gestionar y asistir a las reuniones, mesas de trabajo y/o visitas a campo a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área, en los casos en que las condiciones sociales, económicas, de bioseguridad, entre otras así lo permitan.	No aplica para este periodo

9	Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás eventos que se le requieran para dar cumplimiento al objeto contractual, levantando los soportes al que haya lugar.	He asistido a las reuniones de seguimiento asignadas
10	Requerir y revisar la información mensual reportada por los Operadores de Red y Contratistas de los contratos asignados por el supervisor, efectuando la aceptación o rechazo, así como su análisis del respectivo avance por medio de las plataformas definidas por el área.	Se dio cabal cumplimiento a los contratos que tengo asignados.
11	Elaborar de manera completa y oportuna los informes mensuales del estado de los contratos asignados por medio de los formatos y/o plataformas establecidas por el Grupo de Supervisión, y los que sean solicitados adicionalmente por el Supervisor acatando los lineamientos y proceso definidos por el área.	Realicé lectura de información referente a los diferentes temas de supervisión, contratos, informes, comunicaciones, documentación para estar al día con el estado actual de los contratos a mi cargo. Elaboré los informes mensuales de los contratos que tengo a cargo los cuales se anexan los soportes.
12	Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva dentro de los plazos definidos por el Ministerio de Minas y Energía al supervisor del contrato o quien este designe, así mismo efectuar su cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas dispuestas para el efecto.	Se dio cabal cumplimiento.
13	Las demás actividades necesarias o inherentes para la ejecución del objeto y su alcance contractual o aquellas que designe el supervisor del contrato.	Se han realizado todas las actividades solicitadas por mi supervisor.

OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato		**AVANCES Y LOGROS DEL MES**
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos	Se realiza informe de actividades realizadas del mes de julio del 2023 y la seguridad social pagada del mes de junio del 2023.
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	He cumplido con las directrices implementadas por el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio.
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Asistí a reuniones de seguimiento a los contratos FAZNI, FAER realizadas por la coordinación de los contratos del Ministerio de Minas y Energía.
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento a toda la información que se va recibiendo.
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales,	Se ha venido dando cumplimiento.

	manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	Cumplimiento a cabalidad.
7	Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad.	No aplica para este periodo del informe
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Cumplimiento a cabalidad.
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	No tengo equipos asignados del Ministerio.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Realicé la correspondiente afiliación a la ARL – Positiva
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Cumplimiento a cabalidad.
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	No aplica para el periodo del informe
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	He cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Cumplimiento a cabalidad.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	No hay novedad en el periodo del informe

16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Cumplimiento a cabalidad
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Cumplimiento a cabalidad
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	No aplica en el periodo del informe.
20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	No aplica en el periodo del informe.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	No tengo carné de contratista del MME.
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Para la suscripción del contrato GGC-640-2023 se firmó compromiso del contratista de seguridad y salud en el trabajo.
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida.	Para la suscripción del contrato GGC-640-2023 se presentó póliza No. 33-44-101239454 expedida por la compañía Seguros del Estado.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se ha dado cumplimiento en el periodo del informe.
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Se ha dado cumplimiento en el periodo del informe.
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Se ha dado cumplimiento en el periodo del informe.

27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se ha dado cumplimiento en el periodo del informe.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.	
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.	
ENTREGABLES/PRODUCTOS		
1	Presentar dos informes (28 de febrero y 30 de julio) con las evidencias del cargue de documentos en el aplicativo AVANZAME derivados de la ejecución contractual de los contratos asignados.	adjunto
2	Presentar un informe (15 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en especial los suscritos con AIR-E S.A.S E.S.P., en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	No aplica para este período del informe
3	Presentar un informe final, dirigido al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual consolide cada uno de los trámites realizados respecto de los contratos asignados, identificando claramente por contrato la gestión de avance y su entrega hasta esa fecha.	No aplica para este período del informe
4	Un (1) informe de las actividades ejecutadas al 15 de diciembre del año en curso.	No aplica para este período del informe
5	Soportes de la cuenta de cobro	Julio 2023

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem "7-Ejecución del contrato" opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON. **Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.**
LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4535127&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

CONTRATISTA	
FIRMA	

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-662-2020 - DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN EL RÍO BAJO VICHADA SECTOR 2 DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Cumaribo

(2033)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

90 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

90% 90% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 4.974.459.045

$ Proyecto $ 4.612.727.863 **$ Interventoría** $ 361.731.182

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-662-2020

Desc. Convenio: GGC-662-2020

N° Contrato: GGC-662-2020

Objeto Del Proyecto:

Diseño De La Solución De Energía Eléctrica Para Vivienda Individual Con Fuentes No Convencionales De Energía Renovables Fncer, Ubicadas En El Río Bajo Vichada Sector 2 Del Municipio De Cumaribo, Departamento Del Vichada

Núm: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En el marco del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, como localizar actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento en adelante O&M posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Equipo de apoyo a la Supervision

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 20:39:57.956

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Comentario 24/11/22 Solicitud Segundo Y Tercer Pago Contrato De Int...

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

© Powered by Interkont.co

Fecha 2023-11-30 20:40:43.535
Comentario Pendiente Entrega Del Acta De Infraestructura Por Parte D...

Fecha 2022-12-16 06:22:49.899
Comentario 24 De Noviembre Del 22. Rad. 1-2022-046861 Solicitud ...

Fecha 2023-04-04 15:59:11.861
Comentario En Marzo Del 2023 Se Modificó El Anexo No. 2 “Cronogra...

Datos relevantes

12

Duración

Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-05-25
876 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci
GGC-662-2020	DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2021-07-07 (4482 Día
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2021-12-30 (639 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución



Indicadores



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

40,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

40,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta
235,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

% Avance De Obra Contratista



Estimado
235
UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
20,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Cumaribo
Municipio(S): Cumaribo
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-12	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De L...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-12
Valor unitario	$23.063.639,32
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	$23.063.639,32
Cantidad ejecutada	1,00
Valor ejecutado	$23.063.639,32
Porcentaje de avance	100,00 %

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15
Valor unitario	$23.063.639,32
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	$23.063.639,32
Cantidad ejecutada	1,00
Valor ejecutado	$23.063.639,32
Porcentaje de avance	100,00 %

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-03-31	2021-04-30	1,00 1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$46.127.278,63

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De Obra/Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %

Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	
Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De ...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$46.127.278,63
Cantidad programada	

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %

Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	
Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$46.127.278,63
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero ‹ Anterior 1 2 3 4 Siguiente › Último »

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-660-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO

Puerto Carreño

(2031)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

84 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

84% 84% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 7.577.740.622

$ Proyecto $ 7.026.792.287,03 **$ Interventoría** $ 550.948.335

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
INTERVENTOR: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-660-2020

Desc. Convenio: GGC-660-2020

N° Contrato: GGC-660-2020

Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas indiciduales, y satisfacción d ela demanda energía en las zonas no interconectadas - ZNI por parte del contratista, de acuerdo con la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

No.

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico : Esmeralda López Sanchez

Coordinador Técnico : Guillermo José Arcila Soto

Supervisor Apoyo Jurídico : Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha 2022-11-03 21:40:55.091

Comentario : Se Realizaron Socializaciones Intermedias En La Comunida...

Fecha 2022-11-30 20:26:48.501

Comentario 31/10/22 Aprobación Pago De La Etapa De Instalación 60...

Fecha 2022-12-16 06:34:58.876

Comentario 25 De Noviembre 22 Con Rad. 1-2022-047206 Solicitud ...

Datos relevantes

Duración

Desde: 2020-12-28

Hasta: 2023-03-03

796 DÍAS

Estado

Proyecto Actualmente

En Modificación

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci
GGC-660-2020	CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	2021-03-31 Hasta 2 05-30 (4078 Día
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2 12-30 (639 Días

Imágenes y evolución


Imágenes




Antes Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución



Indicadores



Estimado
1
UND

No. Actual Contratistas

Ejecutado
100%

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado / Meta
337,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
710,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
370,0/1,0

No. Usuarios Nuevos

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
265,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

17,0/1,0

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. Usuarios Retirados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Puerto Carreño
Municipio(S): Puerto Carreño
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2020-12-28	2020-12-31	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De L...
Fecha de Inicio	2020-12-28
Fecha de finalización	2020-12-31
Valor unitario	$35.133.961,44
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	0,50 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-28	2021-01-27	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-28
Fecha de finalización	2021-01-27
Valor unitario	$35.133.961,44
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Verificación De Usuarios.	2021-03-31	2021-04-30	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Verificación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$70.267.922,87
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	3,50 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican), Y Actas De Verificación De Ussuarios.	2021-07-25	2021-09-03	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-07-25

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-07-25	2021-09-23	1,00	1,00	0,50 %

Fecha de finalización 2021-09-03
Valor unitario $245.937.730,05
Cantidad programada
Valor Programado
Cantidad ejecutada
Valor ejecutado
Porcentaje de avance

Categoria Etapa 1
Descripción Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso ...
Fecha de Inicio 2021-07-25
Fecha de finalización 2021-09-23
Valor unitario $35.133.961,44
Cantidad programada
Valor Programado

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-652-2020 - INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA

Cumaribo

(2032)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

96,26 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

96.25% 96.25% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 5.093.419.705

$ Proyecto $ 4.721.577.305 **$ Interventoría** $ 371.842.400

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-652-2020

Desc. Convenio: GGC-652-2020

N° Contrato: GGC-652-2020

Objeto Del Proyecto:

Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficiar A 250 Viviendas En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Cumaribo - Vichada

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones
solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración,

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2023-03-03 12:53:26.643
Comentario	El Contrato Se Encuentra Vigente Hasta El 27 De Marzo Del...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-05-25
876 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duració
GGC-652-2020	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2(10-07 (1286 Días
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(12-30 (639 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes






Antes

Ahora

Evolución

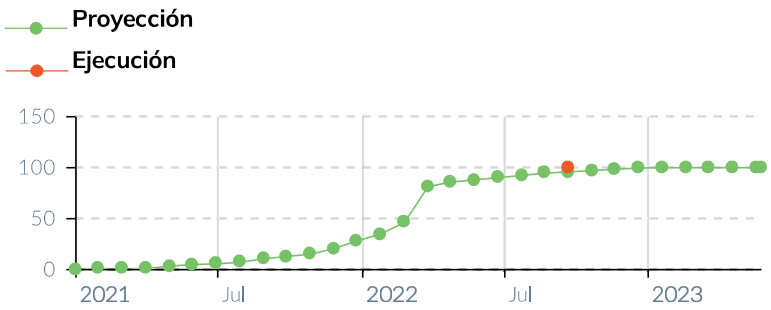

Indicadores



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

102,0/1,0

No. Usuarios Nuevos




Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

No.



100%

Ejecutado / Meta

250,0/1,0

Version 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
250,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
22,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado
0%

© Powered by Interkont.co

Ejecutado / Meta
,0/10,0

% Avance De Obra Contratista

Estimado
250
UND

No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Cumaribo
Municipio(S): Cumaribo
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-03	1,00 1,00 0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De La...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-03
Valor unitario	$23.607.886,52
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00 1,00 0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15

		Valor unitario				$23.607.886,52
		Cantidad programada				
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-03-31	2021-04-30	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De Obra/Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De O...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-650-2020 - CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONE

Caquetá - Cartagena Del Chairá

(2012)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

62,99 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

62.99% 62.99% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 22.145.103.570

$ Proyecto $ 21.026.193.550 **$ Interventoría** $ 1.118.910.020

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-650-2020

Desc. Convenio: GGC-650-2020

N° Contrato: GGC-650-2020

Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas-ZNI por parte del contratista, de acuerdo

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista debera ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha 2022-11-03 22:39:31.294

Comentario	Luego De Superar Las Causales Que Motivaron La Suspensi...

Fecha	2022-11-30 20:18:16.049
Comentario	21/11/22 Cic-Dispac-Ggc 650-2020-L4-091 Aprobación ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-06-20
902 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci

	GGC-650-2020	?CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2021-09-30 (4201 Día
	GGC-630-L04-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2021-01-30 (670 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes




Ahora

Evolución

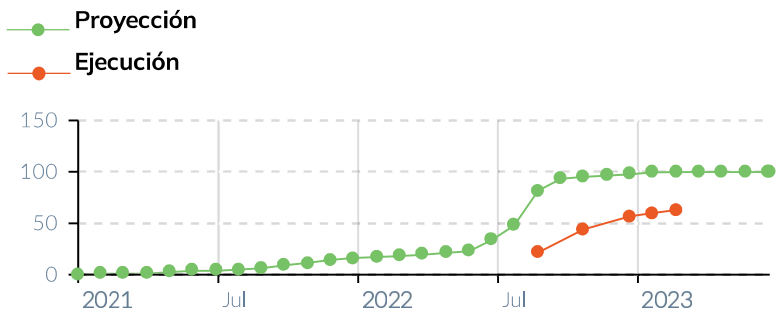

Indicadores



E imc

1

UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado

0%



Ejecutado / Meta
,C 1,C

No. Usuarios Actas De Energización

Ej .ado
0%

Versión: 3.1.50

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
1118,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
0/1,0

No. Usuarios Nuevos

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta

21,6/10,0

% Avance De Obra Contratista

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Caquetá - Cartagena Del Chairá
Municipio(S): Cartagena Del Chairá
Departamento(S): Caquetá

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-03	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma ...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-03
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socializacion Y Capacitación De Usuarios	2021-07-14	2021-08-13	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socializacion Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-07-14
Fecha de finalización	2021-08-13
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratacion De Contrato De Obra / Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratacion De Contrato De ...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$210.261.935,50
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Publicacion De Pliegos O Invitacion Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicacion De Pliegos O Invitacion Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$210.261.935,50
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-648-2020 - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTA

Guaviare - El Retorno

(2023)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

89,25 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

89.25% 89.25% Así va

100% 100% Deberia ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 1.403.616.883

$ Proyecto $ 1.301.602.661 **$ Interventoría** $ 102.014.222

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-648-2020

Desc. Convenio: GGC-648-2020

N° Contrato: GGC-648-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción, Instalación E Presentación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistentes En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (Zni) Del Municipio Del Retorno Del Departamento Del

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 18:50:53.044
Comentario	09/11/22 Mediante Radicado No.1-2022-044719 Suscrip...

Fecha	2022-12-16 05:18:20.295
Comentario	10 Nov-22 Rad. 1-2022-044822 Acta De Terminación De ...

Fecha	2023-03-03 11:46:07.115
Comentario	El 06 De Marzo Del 2023 Se Procedera A Realizar El Inform...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-11-09
589 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-648-2020	CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(10-23 (4224 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

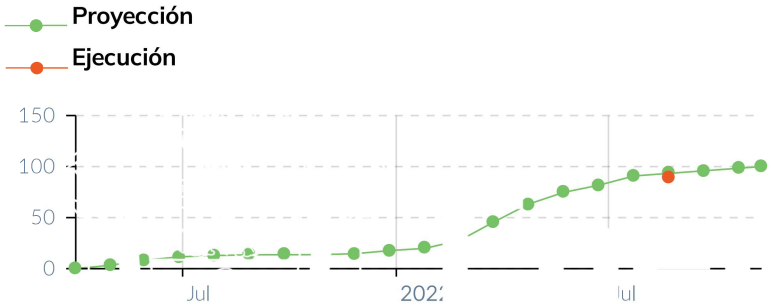

Indicadores



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados

Versión: 3.1.50

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

© Powered by Interkont.co

Estimado
69
UND

No. Usu tratados

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Guaviare - El Retorno
Municipio(S): El Retorno
Departamento(S): Guaviare

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2021-03-31	2021-04-10	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	0,50 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2022-11-09	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2022-11-09
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	0,50 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-08	2021-05-21	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-08
Fecha de finalización	2021-05-21
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	4,00 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificación De Usuarios.	2021-05-22	2021-06-16	1,00	1,00	4,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-05-22
Fecha de finalización	2021-06-16
Valor unitario	$52.064.106,44

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada	2021-06-17	2021-08-16	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado					
		Cantidad ejecutada					
		Valor ejecutado					
		Porcentaje de avance					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-06-17
Fecha de finalización	2021-08-16
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-634-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 42 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

Meta - Puerto Gaitán

(2034)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

[redacted] Días [redacted] Horas [redacted] Minutos [redacted] Segundos

Semáforo Avance Fisico

77,5 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

77.5% 77.5% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 844.841.778

$ Proyecto $ 783.416.586 **$ Interventoría** $ 61.425.192

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-634-2020

Desc. Convenio: GGC-634-2020

N° Contrato: GGC-634-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción Sistema Solar Fotovoltaico Aislado Con Autonomía De 1 Día Que Permita El Acceso Al Servicio De Energía Eléctrica A 42 Viviendas Del Municipio De Puerto Gaitán.

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si.

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 20:11:44.657
Comentario	10/11/2022 CIC-MME- GGC 634-2020-L5-039 - Reanu...

Fecha	2022-12-16 05:34:01.92
Comentario	10 NOV-22 - RADI. 1-2022-044807 Reanudación De Acti...

Fecha	2023-03-03 12:39:21.954
Comentario	A La Fecha Pendiente Los Siguientes Aspectos: Instalación D...

Fecha	2023-03-03 12:41:03.756
Comentario	El Contrato Se Encuentra Suspendido Hasta El 24 De Abril ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-08-24
512 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
Suspendido

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-634-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2(03-30 (4017 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución





Indic

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Nuevos

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Retirados

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Replanteo Actual

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/10,0

% Avance De Obra Contratista

Estimado

1

UND

No. Usuarios Contratados

Ejecutado


0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto

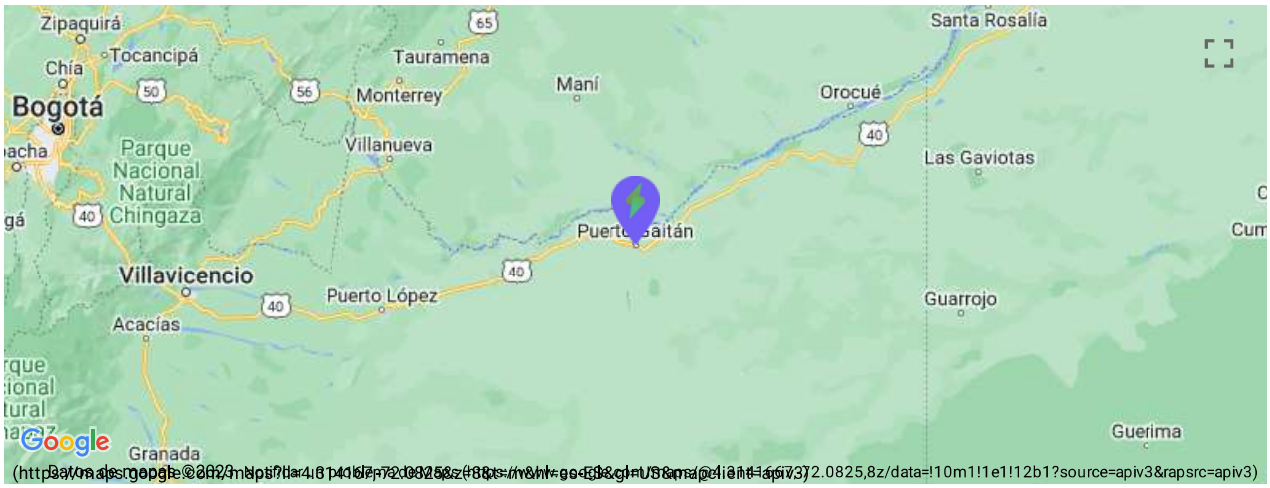

Ubicación: Meta - Puerto Gaitán

Municipio(S): Puerto Gaitán

Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-02	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-02
Valor unitario	$3.917.082,93
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$7.834.165,86
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) Y Actas De Verificación De Usuarios.	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	2,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	0,50 %	$15.428.221,72

Valor unitario
Cantidad programada
Valor Programado
Cantidad ejecutada
Valor ejecutado
Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$3.917.082,93
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Ejecutar La Gestión Para La Obtención De La Existencia Y Suscribirlas Servidumbres Y/O Permisos De Paso Necesarios.	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	1,00 %	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Ejecutar La Gestión Para La Obtención De La Existencia Y ...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$7.834.165,86
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-616-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO

Meta - Puerto Rico

(2029)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

78,93 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 14.179.474.687

$ Proyecto $ 13.469.510.547 **$ Interventoría** $ 709.964.140

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-616-2020
Desc. Convenio: GGC-616-2020
N° Contrato: GGC-616-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción Sistema Solar Fotovoltaico Aislado Con Autonomía De 1 Día Que Permita El Acceso Al Servicio De Energía Eléctrica A 702 Viviendas Del Sector Rural Del Municipio De Puerto Rico

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto del presente contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-12-16 04:31:16.671
Comentario	El 25/11/22 Por Parte Del Drupo De Supervisión Se Solicit...

Fecha	2022-12-16 04:37:54.118
Comentario	11 Nov-22 Mediante 1-2022-045088 Reiteración Solicitud...

Fecha	2023-03-02 21:31:14.317
Comentario	Este Contrato Se Encuentra En Ejecución El Cual Termina El ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2023-02-23
695 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-616-2020	?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(07-30 (4139 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

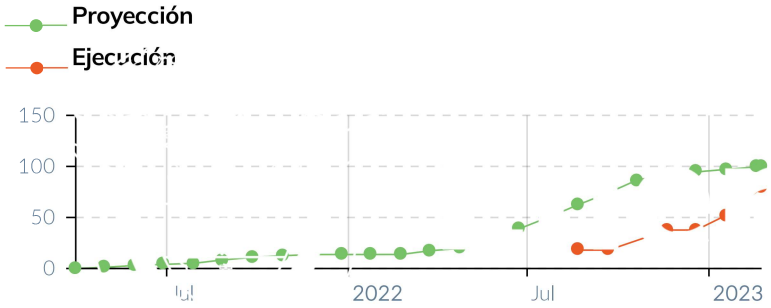

Indicadores



Ejecutado
100%

Ej tado eto
,0

No. Usu tu

Versión 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
18,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. U evos

Estimado

702

UND

No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Meta - Puerto Rico
Municipio(S): Puerto Rico
Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2021-03-31	2021-04-07	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-07
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2023-02-23	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2023-02-23
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-14	2021-06-27	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-14
Fecha de finalización	2021-06-27
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	2021-08-09	2021-09-28	1,00	1,00	4,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-08-09
Fecha de finalización	2021-09-28
Valor unitario	$538.780.421,88

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada	2021-09-29		2021-11-18	1,00 1,00	0,50 %
		Valor Programado					
		Cantidad ejecutada					
		Valor ejecutado					
		Porcentaje de avance					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-09-29
Fecha de finalización	2021-11-18
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI GGC 593 20 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN

Meta - Mapiripán

(2030)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

63,19 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 11.308.706.372

$ Proyecto $ 10.725.332.672 **$ Interventoría** $ 583.373.700

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-593-2020
Desc. Convenio: GGC-593-2020
N° Contrato: GGC-593-2020
Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solarews fotovoltaicas individuales, la administracvión, operación y mantenimineto de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas-ZNI por parte del contratista, de acuerdo con

Número De Acta: 74
Códigos De Los Proyectos:
Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI
Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico : Esmeralda López Sanchez
Coordinador Técnico : Guillermo José Arcila Soto
Supervisor Apoyo Jurídico : Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2023-03-02 21:21:43.429
Comentario	Se Realizaron Por Parte De La Interventoría Los Siguientes R...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2023-01-23
664 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución


Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-593-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(06-30 (4109 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

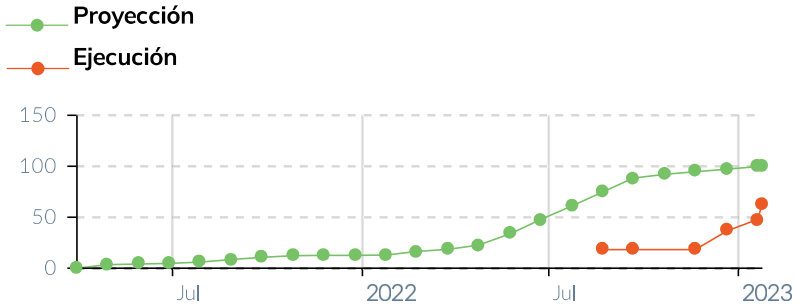

Indicadores





Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%
Ejecutado / Meta
509,0/1,0
No. Usuarios Replan... Actual

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%
Ejecutado / Meta
18,0/1,0
% Avance De Obra Contratista

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
Empleos Directos

Estimado
538
UND
No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Meta - Mapiripán
Municipio(S): Mapiripán
Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-10	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2023-01-23	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2023-01-23

		Valor unitario				$53.626.663,36
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	Cantidad programada 2021-05-11	2021-06-27	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-11
Fecha de finalización	2021-06-27
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	Cantidad programada 2021-07-21	2021-09-09	1,00	1,00	4,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-07-21
Fecha de finalización	2021-09-09
Valor unitario	$429.013.306,88
Cantidad programada	

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada 2021-09-10	2021-10-20	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-09-10
Fecha de finalización	2021-10-20
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual Reporte PDF Reporte EXCEL Reporte WORD

Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto

Detalle del Proyecto | Evolucion del Proyecto | Galeria fotografica | Asociar contratos | Documentos del Proyecto | Bitácora de Proyecto

FAZNI-GGC-590-20 CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTEN EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONEC

Guaviare - Calamar

(2021)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

85 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

85% 85% Así va

100% 100% Debería ir

Información

Valor Global Del Proyecto

1.667.174.349

$ Proyecto $ 1.546.004.893 **$ Interventoría** $ 121.169.456

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia

SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran

Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-590-2020

Desc. Convenio: GGC-590-2020

N° Contrato: GGC-590-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción, Instalación E Implementación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistenten En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (Zni) Del Municipio de Colomer Del Departamento del Guaviare

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :
Esmeralda López Sanchez

Coordinador Técnico :
Guillermo José Arcila Soto

Supervisor Apoyo Jurídico :
Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-03 23:11:29.603
Comentario	04/10/22 Notificación Finalización De Activid…

Fecha	2022-11-30 18:37:49.326
Comentario	El 10/11/2022 Suscripción Acta De Terminac…

Fecha	2022-12-16 05:01:12.932
Comentario	Pendiente Solicitud Por Parte Del Operador …

Fecha	2023-03-03 11:19:04.289
Comentario	El 06/03/23 Se Inician Las Actividades De Cr…

Fecha	2023-04-03 17:52:37.226
Comentario	El Contrato FAZNI-GGC-590-20 Se Encuentr…

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-11-09
589 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
Entregado

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contrat
GGC-590-2020	CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DE EN ELECTRICA D DEPARTAMENT GUAVIARE
GGC-63	ntegr , Co ter la	CONSORCI INTERVENTORE COLOMBIA

Imágenes y evolución

In



Versión: 3.1.50


Antes

Ahora

Evolución

Proyección

Ejecución

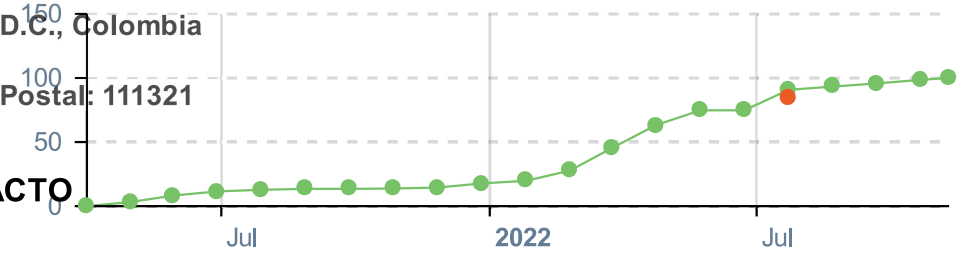

MINENERGIA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

Indicadores

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo)
(https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo)
(https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

0/1.0

No. Usuarios Actas De Energización

© Powered by Interkont.co

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/20,0

% Avance De Obra Contratista



No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Guaviare - Calamar
Municipio(S): Calamar
Departamento(S): Guaviare

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-10	1,00	1,
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar)	2021-03-31	2022-11-09	1,(	
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-08	2021-05-21	1,0	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Part…
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupu…
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2022-11-09
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitaci…
Fecha de Inicio	2021-05-08
Fecha de finalización	2021-05-21
Valor unitario	$7.730.024,46

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiados Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	2021-05-22	2021-06-16	1,0	Cantidad programada Valor Programado Cantidad ejecutada Valor ejecutado Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Lo…
Fecha de Inicio	2021-05-22
Fecha de finalización	2021-06-16
Valor unitario	$61.840.195,72
Cantidad programada	

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-06-17	2021-08-16	1,00	Cantidad programada Valor Programado Cantidad ejecutada Valor ejecutado Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas P…
Fecha de Inicio	2021-06-17
Fecha de finalización	2021-08-16
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Valor Programado

Reportes


Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Re
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Re

Informe De Supervisión - Liquidación

Reporte PDF Reporte EXCEL Re

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**





FAER - GGC-504-22 - AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La Vega, Cauca

(2980)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

17,39 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 24.236.640.294

$ Proyecto $ 24.236.640.294 **$ Interventoría** $ 0

Quienes Participan?

Contratante: CEO S.A.S. E.S.P.
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:

Datos Generales

N° Convenio: GGC-504-2022
Desc. Convenio: GGC-504-2022
N° Contrato: GGC-504-2022
Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura y prestar el serv1c10 de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL

Número De Acta: 60
Códigos De Los Proyectos:
Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en varias veredas del Municipio de la Vega en el Departamento del Cauca", el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de

Comité Que Define: CAFAER
Instalaciones Internas:

N/A

Valor Unidad Instalaciones Internas: $ 0

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Marcela Patricia Araujo Colina	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2022-11-03 22:51:37.075
Comentario	No Se Evidencia Avance En La Etapa 1 Previa Del Contrato. ...

Fecha	2022-11-30 20:47:26.319
Comentario	03/11/2022 El Contratista Solcitará Prorroga Al Contrato P...

Fecha	2022-12-16 06:43:55.811
Comentario	Se Tramitó Prórroga No.3 Por 40 Días En El Item 12 De La ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2022-03-16
Hasta: 2023-08-31
534 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAER
Subtipo: Redes De Trasmisión

Contratos asociados


Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-504-2022	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP.	2022-03-30 Hasta 2(03-29 (7304 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

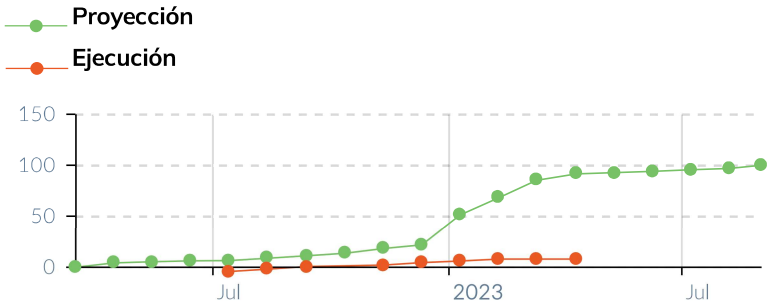

Indicadore




Ejecutado
0%



Ejecutado / Meta
,C 1,0

No. Usuarios Actas De Energización



1[illegible]%

Ejecutado / Meta
1920,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Versión 2021.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
436,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
269,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado
52%

Ejecutado / Meta
26,0/50,0

Empleos Indirectos



Ejecutado
0%

© Powered by Interkont.co

Ejecutado / Meta
,0/100,0

% Avance De Obra Contratista



Estimado
1413
UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
2,0/,0

ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/,0

Acometidas



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
2,0/2,0

ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: La Vega, Cauca
Municipio(S): La Vega
Departamento(S): Cauca

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Suscripción Del Encargo Fiduciario. (15 Después De La Firma Del Contrato)	2022-03-16	2022-03-31	1,00 1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Suscripción Del Encargo Fiduciario. (15 Después De La Fir...
Fecha de Inicio	2022-03-16
Fecha de finalización	2022-03-31
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar)	2022-03-30	2022-03-30	1,00 1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2022-03-30
Fecha de finalización	2022-03-30

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Para La Contratación De La Interventoría Y Firma Para Gestión Documental Etapa 1 - Según Corresponda.	2022-03-30	2022-04-27	1,00	1,00	1,15 %

Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Suscripción Del Contrato De Interventoría Y Firma Para Gestión Documental Etapa 1 Suscripción Del Acta De Inicio.	2022-04-27	2022-06-16	1,00	1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Para La Contrat...
Fecha de Inicio	2022-03-30
Fecha de finalización	2022-04-27
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Suscripción Del Contrato De Interventoría Y Firma Para Ges...
Fecha de Inicio	2022-04-27
Fecha de finalización	2022-06-16
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Revisión Y Aceptación De Diseños Especificaciones Y Presupuesto.	2022-03-16	2022-03-17	1,00	1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Revisión Y Aceptación De Diseños Especificaciones Y Presu...
Fecha de Inicio	2022-03-16
Fecha de finalización	2022-03-17
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

Informe De Supervisión - Liquidación

Reporte PDF Reporte EXCEL Reporte WORD
