••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-662-2020 - DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN EL RÍO BAJO VICHADA SECTOR 2 DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Cumaribo

(2033)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

90 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

90% 90% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 4.974.459.045

$ Proyecto $ 4.612.727.863 **$ Interventoría** $ 361.731.182

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-662-2020

Desc. Convenio: GGC-662-2020

N° Contrato: GGC-662-2020

Objeto Del Proyecto:

Diseño De La Solución De Energía Eléctrica Para Vivienda Individual Con Fuentes No Convencionales De Energía Renovables Fncer, Ubicadas En El Río Bajo Vichada Sector 2 Del Municipio De Cumaribo, Departamento Del Vichada

Núm: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En el marco del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, como localizar actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento en adelante O&M posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Equipo de apoyo a la Supervision

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 20:39:57.956

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Comentario 24/11/22 Solicitud Segundo Y Tercer Pago Contrato De Int...

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

© Powered by Interkont.co

Fecha 2023-11-30 20:40:43.535
Comentario Pendiente Entrega Del Acta De Infraestructura Por Parte D...

Fecha 2022-12-16 06:22:49.899
Comentario 24 De Noviembre Del 22. Rad. 1-2022-046861 Solicitud ...

Fecha 2023-04-04 15:59:11.861
Comentario En Marzo Del 2023 Se Modificó El Anexo No. 2 “Cronogra...

Datos relevantes

12

Duración

Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-05-25
876 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci
GGC-662-2020	DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2021-07-07 (4482 Día
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2021-12-30 (639 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución



Indicadores



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

40,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

40,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta
235,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

% Avance De Obra Contratista



Estimado
235
UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
20,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Cumaribo
Municipio(S): Cumaribo
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-12	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De L...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-12
Valor unitario	$23.063.639,32
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	$23.063.639,32
Cantidad ejecutada	1,00
Valor ejecutado	$23.063.639,32
Porcentaje de avance	100,00 %

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15
Valor unitario	$23.063.639,32
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	$23.063.639,32
Cantidad ejecutada	1,00
Valor ejecutado	$23.063.639,32
Porcentaje de avance	100,00 %

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-03-31	2021-04-30	1,00 1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$46.127.278,63

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De Obra/Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %

Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	
Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De ...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$46.127.278,63
Cantidad programada	

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %

Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	
Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$46.127.278,63
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero ‹ Anterior 1 2 3 4 Siguiente › Último »

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-660-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO

Puerto Carreño

(2031)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

84 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

84% 84% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 7.577.740.622

$ Proyecto $ 7.026.792.287,03 **$ Interventoría** $ 550.948.335

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
INTERVENTOR: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-660-2020

Desc. Convenio: GGC-660-2020

N° Contrato: GGC-660-2020

Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas indiciduales, y satisfacción d ela demanda energía en las zonas no interconectadas - ZNI por parte del contratista, de acuerdo con la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

No.

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico : Esmeralda López Sanchez

Coordinador Técnico : Guillermo José Arcila Soto

Supervisor Apoyo Jurídico : Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha 2022-11-03 21:40:55.091

Comentario : Se Realizaron Socializaciones Intermedias En La Comunida...

Fecha 2022-11-30 20:26:48.501

Comentario 31/10/22 Aprobación Pago De La Etapa De Instalación 60...

Fecha 2022-12-16 06:34:58.876

Comentario 25 De Noviembre 22 Con Rad. 1-2022-047206 Solicitud ...

Datos relevantes

Duración

Desde: 2020-12-28

Hasta: 2023-03-03

796 DÍAS

Estado

Proyecto Actualmente

En Modificación

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci
GGC-660-2020	CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	2021-03-31 Hasta 2 05-30 (4078 Día
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2 12-30 (639 Días

Imágenes y evolución


Imágenes




Antes Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución



Indicadores



Estimado
1
UND

No. Actual Contratistas

Ejecutado
100%

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado / Meta
337,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
710,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
370,0/1,0

No. Usuarios Nuevos

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
265,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

17,0/1,0

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. Usuarios Retirados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Puerto Carreño
Municipio(S): Puerto Carreño
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2020-12-28	2020-12-31	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De L...
Fecha de Inicio	2020-12-28
Fecha de finalización	2020-12-31
Valor unitario	$35.133.961,44
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	0,50 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-28	2021-01-27	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-28
Fecha de finalización	2021-01-27
Valor unitario	$35.133.961,44
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Verificación De Usuarios.	2021-03-31	2021-04-30	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Verificación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$70.267.922,87
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	3,50 %
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican), Y Actas De Verificación De Ussuarios.	2021-07-25	2021-09-03	1,00	1,00

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-07-25

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-07-25	2021-09-23	1,00	1,00	0,50 %

Fecha de finalización 2021-09-03
Valor unitario $245.937.730,05
Cantidad programada
Valor Programado
Cantidad ejecutada
Valor ejecutado
Porcentaje de avance

Categoria Etapa 1
Descripción Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso ...
Fecha de Inicio 2021-07-25
Fecha de finalización 2021-09-23
Valor unitario $35.133.961,44
Cantidad programada
Valor Programado

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-652-2020 - INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA

Cumaribo

(2032)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

96,26 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

96.25% 96.25% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 5.093.419.705

$ Proyecto $ 4.721.577.305 **$ Interventoría** $ 371.842.400

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-652-2020

Desc. Convenio: GGC-652-2020

N° Contrato: GGC-652-2020

Objeto Del Proyecto:

Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficiar A 250 Viviendas En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Cumaribo - Vichada

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones
solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración,

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2023-03-03 12:53:26.643
Comentario	El Contrato Se Encuentra Vigente Hasta El 27 De Marzo Del...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-05-25
876 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duració
GGC-652-2020	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2(10-07 (1286 Días
GGC-630-L06-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(12-30 (639 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes






Antes

Ahora

Evolución

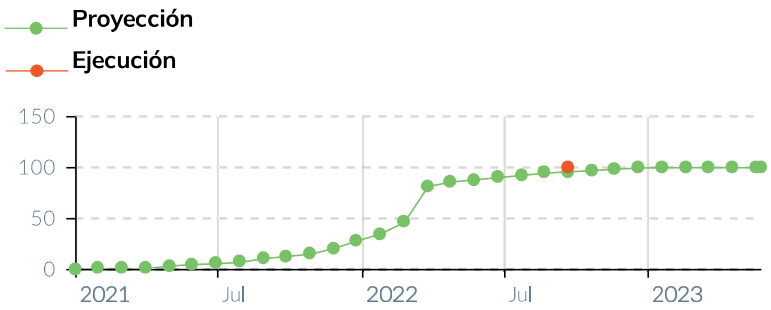

Indicadores



Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

102,0/1,0

No. Usuarios Nuevos




Ejecutado

100%

Ejecutado / Meta

No.



100%

Ejecutado / Meta

250,0/1,0

Version 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
250,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
22,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado
0%

© Powered by Interkont.co

Ejecutado / Meta
,0/10,0

% Avance De Obra Contratista

Estimado
250
UND

No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Cumaribo
Municipio(S): Cumaribo
Departamento(S): Vichada

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo 15 Dias A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-03	1,00 1,00 0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo 15 Dias A Partir De La...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-03
Valor unitario	$23.607.886,52
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00 1,00 0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15

		Valor unitario				$23.607.886,52
		Cantidad programada				
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-03-31	2021-04-30	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-30
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De Obra/Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratación De Contrato De O...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$47.215.773,05
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-650-2020 - CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONE

Caquetá - Cartagena Del Chairá

(2012)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

62,99 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

62.99% 62.99% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 22.145.103.570

$ Proyecto $ 21.026.193.550 **$ Interventoría** $ 1.118.910.020

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-650-2020

Desc. Convenio: GGC-650-2020

N° Contrato: GGC-650-2020

Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas-ZNI por parte del contratista, de acuerdo

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista debera ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha 2022-11-03 22:39:31.294

Comentario	Luego De Superar Las Causales Que Motivaron La Suspensi...

Fecha	2022-11-30 20:18:16.049
Comentario	21/11/22 Cic-Dispac-Ggc 650-2020-L4-091 Aprobación ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2020-12-31
Hasta: 2023-06-20
902 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duraci

	GGC-650-2020	?CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2021-09-30 (4201 Día
	GGC-630-L04-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2021-01-30 (670 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes




Ahora

Evolución

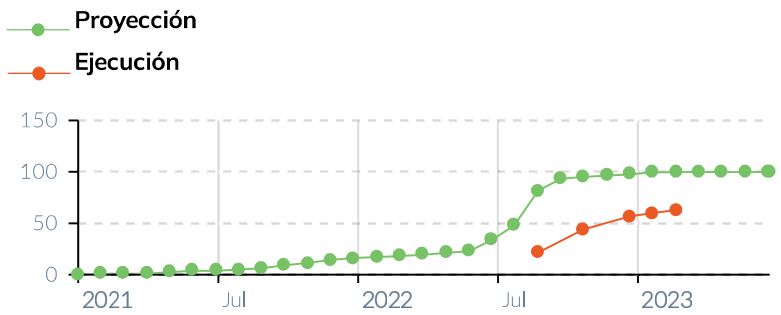

Indicadores



E imc

1

UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado

0%



Ejecutado / Meta
,C 1,C

No. Usuarios Actas De Energización

Ej .ado
0%

Versión: 3.1.50

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
1118,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
0/1,0

No. Usuarios Nuevos

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta

21,6/10,0

% Avance De Obra Contratista

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Caquetá - Cartagena Del Chairá
Municipio(S): Cartagena Del Chairá
Departamento(S): Caquetá

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2020-12-31	2021-01-03	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma ...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-03
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad (En Caso De Aplicar)	2020-12-31	2021-01-15	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Enti...
Fecha de Inicio	2020-12-31
Fecha de finalización	2021-01-15
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socializacion Y Capacitación De Usuarios	2021-07-14	2021-08-13	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socializacion Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-07-14
Fecha de finalización	2021-08-13
Valor unitario	$105.130.967,75
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Elaboración De Pliegos De Contratacion De Contrato De Obra / Suministro	2021-03-31	2021-04-20	1,00	1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Elaboración De Pliegos De Contratacion De Contrato De ...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-20
Valor unitario	$210.261.935,50
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Publicacion De Pliegos O Invitacion Directa Según Corresponda	2021-04-20	2021-05-10	1,00	1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicacion De Pliegos O Invitacion Directa Según Corresp...
Fecha de Inicio	2021-04-20
Fecha de finalización	2021-05-10
Valor unitario	$210.261.935,50
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-648-2020 - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTA

Guaviare - El Retorno

(2023)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

89,25 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

89.25% 89.25% Así va

100% 100% Deberia ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 1.403.616.883

$ Proyecto $ 1.301.602.661 **$ Interventoría** $ 102.014.222

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-648-2020

Desc. Convenio: GGC-648-2020

N° Contrato: GGC-648-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción, Instalación E Presentación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistentes En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (Zni) Del Municipio Del Retorno Del Departamento Del

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 18:50:53.044
Comentario	09/11/22 Mediante Radicado No.1-2022-044719 Suscrip...

Fecha	2022-12-16 05:18:20.295
Comentario	10 Nov-22 Rad. 1-2022-044822 Acta De Terminación De ...

Fecha	2023-03-03 11:46:07.115
Comentario	El 06 De Marzo Del 2023 Se Procedera A Realizar El Inform...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-11-09
589 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-648-2020	CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(10-23 (4224 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

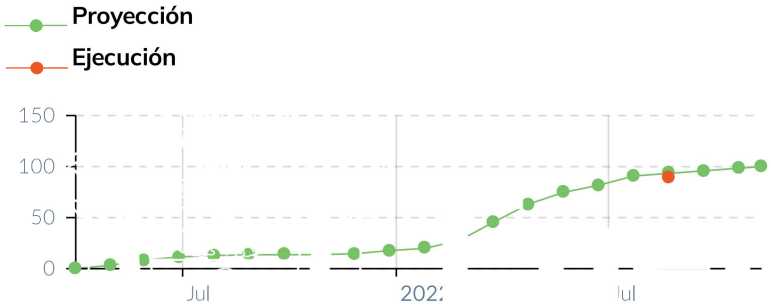

Indicadores



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados

Versión: 3.1.50

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

© Powered by Interkont.co

Estimado
69
UND

No. Usu tratados

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Guaviare - El Retorno
Municipio(S): El Retorno
Departamento(S): Guaviare

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2021-03-31	2021-04-10	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	0,50 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2022-11-09	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2022-11-09
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	0,50 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-08	2021-05-21	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-08
Fecha de finalización	2021-05-21
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	1,00
Valor Programado	1,00
Cantidad ejecutada	4,00 %
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificación De Usuarios.	2021-05-22	2021-06-16	1,00	1,00	4,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-05-22
Fecha de finalización	2021-06-16
Valor unitario	$52.064.106,44

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada	2021-06-17	2021-08-16	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado					
		Cantidad ejecutada					
		Valor ejecutado					
		Porcentaje de avance					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-06-17
Fecha de finalización	2021-08-16
Valor unitario	$6.508.013,30
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-634-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 42 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

Meta - Puerto Gaitán

(2034)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

[redacted] Días [redacted] Horas [redacted] Minutos [redacted] Segundos

Semáforo Avance Fisico

77,5 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

77.5% 77.5% Así va

100% 100% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 844.841.778

$ Proyecto $ 783.416.586 **$ Interventoría** $ 61.425.192

Quienes Participan?

Contratante:	Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR:	Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:	Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-634-2020

Desc. Convenio: GGC-634-2020

N° Contrato: GGC-634-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción Sistema Solar Fotovoltaico Aislado Con Autonomía De 1 Día Que Permita El Acceso Al Servicio De Energía Eléctrica A 42 Viviendas Del Municipio De Puerto Gaitán.

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si.

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-30 20:11:44.657
Comentario	10/11/2022 CIC-MME- GGC 634-2020-L5-039 - Reanu...

Fecha	2022-12-16 05:34:01.92
Comentario	10 NOV-22 - RADI. 1-2022-044807 Reanudación De Acti...

Fecha	2023-03-03 12:39:21.954
Comentario	A La Fecha Pendiente Los Siguientes Aspectos: Instalación D...

Fecha	2023-03-03 12:41:03.756
Comentario	El Contrato Se Encuentra Suspendido Hasta El 24 De Abril ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-08-24
512 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
Suspendido

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-634-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	2021-03-31 Hasta 2(03-30 (4017 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes Ahora

Evolución

Proyección
Ejecución





Indic

Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Nuevos

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Retirados

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Replanteo Actual

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/10,0

% Avance De Obra Contratista

Estimado

1

UND

No. Usuarios Contratados

Ejecutado


0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

Empleos Directos

Dónde está ubicado el proyecto

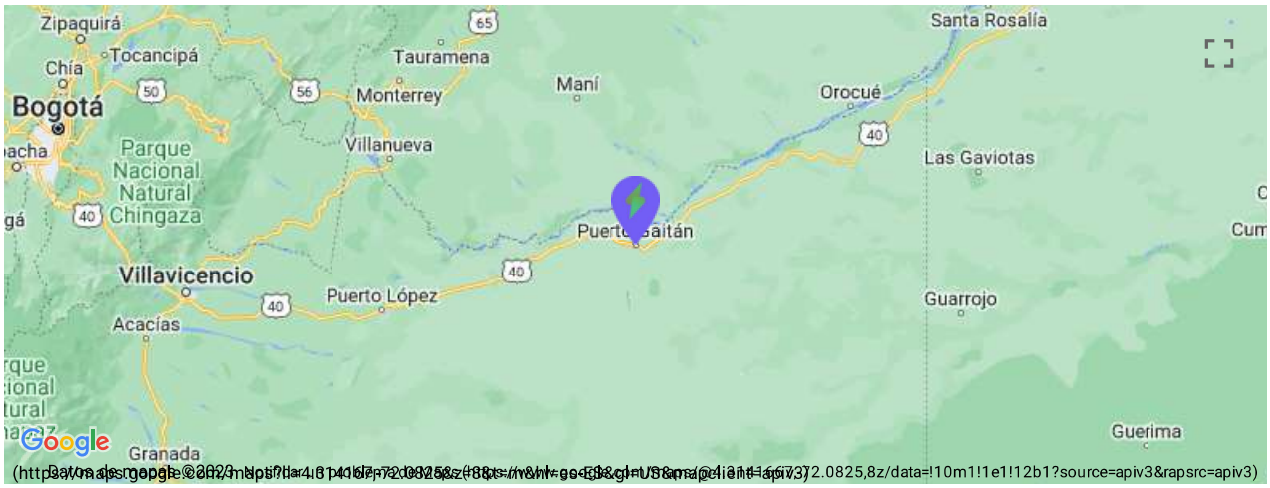

Ubicación: Meta - Puerto Gaitán

Municipio(S): Puerto Gaitán

Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-02	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria (Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-02
Valor unitario	$3.917.082,93
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	1,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$7.834.165,86
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) Y Actas De Verificación De Usuarios.	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	2,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	0,50 %	$15.428.221,72

Valor unitario
Cantidad programada
Valor Programado
Cantidad ejecutada
Valor ejecutado
Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$3.917.082,93
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Ejecutar La Gestión Para La Obtención De La Existencia Y Suscribirlas Servidumbres Y/O Permisos De Paso Necesarios.	2021-04-12	2021-05-12	1,00 1,00	1,00 %	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Ejecutar La Gestión Para La Obtención De La Existencia Y ...
Fecha de Inicio	2021-04-12
Fecha de finalización	2021-05-12
Valor unitario	$7.834.165,86
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI - GGC-616-2020 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO

Meta - Puerto Rico

(2029)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

78,93 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 14.179.474.687

$ Proyecto $ 13.469.510.547 **$ Interventoría** $ 709.964.140

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-616-2020
Desc. Convenio: GGC-616-2020
N° Contrato: GGC-616-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción Sistema Solar Fotovoltaico Aislado Con Autonomía De 1 Día Que Permita El Acceso Al Servicio De Energía Eléctrica A 702 Viviendas Del Sector Rural Del Municipio De Puerto Rico

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto del presente contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Guillermo José Arcila Soto	Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-12-16 04:31:16.671
Comentario	El 25/11/22 Por Parte Del Drupo De Supervisión Se Solicit...

Fecha	2022-12-16 04:37:54.118
Comentario	11 Nov-22 Mediante 1-2022-045088 Reiteración Solicitud...

Fecha	2023-03-02 21:31:14.317
Comentario	Este Contrato Se Encuentra En Ejecución El Cual Termina El ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2023-02-23
695 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-616-2020	?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(07-30 (4139 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

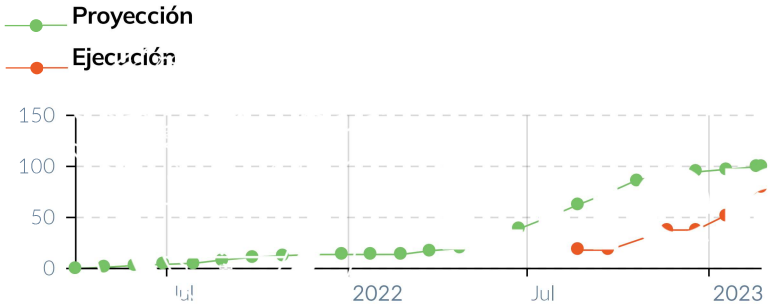

Indicadores



Ejecutado
100%

Ej tado eto
,0

No. Usu tu

Versión 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
0/1,0

No. Usuarios Actas De Energización

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
18,0/1,0

% Avance De Obra Contratista

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/1,0

No. U evos

Estimado

702

UND

No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Meta - Puerto Rico
Municipio(S): Puerto Rico
Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		Cant. Programada
Etapa 1	Apertura De	2021-03-31	2021-04-07	1,00 1,00	0,50 %

	Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-07
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2023-02-23	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2023-02-23
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-14	2021-06-27	1,00	1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-14
Fecha de finalización	2021-06-27
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	2021-08-09	2021-09-28	1,00	1,00	4,00 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-08-09
Fecha de finalización	2021-09-28
Valor unitario	$538.780.421,88

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada	2021-09-29		2021-11-18	1,00 1,00	0,50 %
		Valor Programado					
		Cantidad ejecutada					
		Valor ejecutado					
		Porcentaje de avance					

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-09-29
Fecha de finalización	2021-11-18
Valor unitario	$67.347.552,74
Cantidad programada	
Valor Programado	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**



FAZNI GGC 593 20 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN

Meta - Mapiripán

(2030)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

63,19 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 11.308.706.372

$ Proyecto $ 10.725.332.672 **$ Interventoría** $ 583.373.700

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-593-2020
Desc. Convenio: GGC-593-2020
N° Contrato: GGC-593-2020
Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura de energía a traves de la instalación de soluciones solarews fotovoltaicas individuales, la administracvión, operación y mantenimineto de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas-ZNI por parte del contratista, de acuerdo con

Número De Acta: 74
Códigos De Los Proyectos:
Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior

Comité Que Define: CAFAZNI
Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico : Esmeralda López Sanchez
Coordinador Técnico : Guillermo José Arcila Soto
Supervisor Apoyo Jurídico : Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2023-03-02 21:21:43.429
Comentario	Se Realizaron Por Parte De La Interventoría Los Siguientes R...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2023-01-23
664 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución


Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-593-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	2021-03-31 Hasta 2(06-30 (4109 Días
GGC-630-L05-2020	Realizar La Interventoría Integral,	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA	2021-03-31 Hasta 2(02-23 (694 Días)

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

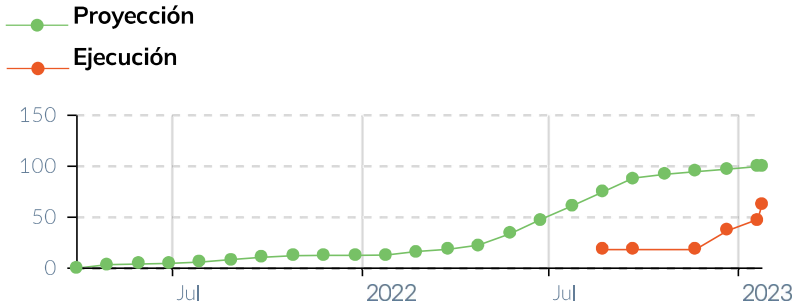

Indicadores





Versión: 3.1.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado
100%
Ejecutado / Meta
509,0/1,0
No. Usuarios Replan... Actual

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
100%
Ejecutado / Meta
18,0/1,0
% Avance De Obra Contratista

© Powered by Interkont.co

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
Empleos Directos

Estimado
538
UND
No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Meta - Mapiripán
Municipio(S): Mapiripán
Departamento(S): Meta

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-10	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Partir De La Firma D...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar	2021-03-31	2023-01-23	1,00 1,00	0,50 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2023-01-23

		Valor unitario				$53.626.663,36
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	Cantidad programada 2021-05-11	2021-06-27	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.
Fecha de Inicio	2021-05-11
Fecha de finalización	2021-06-27
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiarios Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	Cantidad programada 2021-07-21	2021-09-09	1,00	1,00	4,00 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Benefi...
Fecha de Inicio	2021-07-21
Fecha de finalización	2021-09-09
Valor unitario	$429.013.306,88
Cantidad programada	

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	Cantidad programada 2021-09-10	2021-10-20	1,00	1,00	0,50 %
		Valor Programado				
		Cantidad ejecutada				
		Valor ejecutado				
		Porcentaje de avance				

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso D...
Fecha de Inicio	2021-09-10
Fecha de finalización	2021-10-20
Valor unitario	$53.626.663,36
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual Reporte PDF Reporte EXCEL Reporte WORD

Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto

Detalle del Proyecto | Evolucion del Proyecto | Galeria fotografica | Asociar contratos | Documentos del Proyecto | Bitácora de Proyecto

FAZNI-GGC-590-20 CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTEN EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONEC

Guaviare - Calamar

(2021)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

85 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir

85% 85% Así va

100% 100% Debería ir

Información

Valor Global Del Proyecto

1.667.174.349

$ Proyecto $ 1.546.004.893 **$ Interventoría** $ 121.169.456

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia

SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran

Interventor: Consorcio Interventores De Colombia

Datos Generales

N° Convenio: GGC-590-2020

Desc. Convenio: GGC-590-2020

N° Contrato: GGC-590-2020

Objeto Del Proyecto:

Construcción, Instalación E Implementación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistenten En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (Zni) Del Municipio de Colomer Del Departamento del Guaviare

Número De Acta: 74

Códigos De Los Proyectos:

Alcance:

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación

Comité Que Define: CAFAZNI

Instalaciones Internas:

Si

Valor Unidad Instalaciones Internas:

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :
Esmeralda López Sanchez

Coordinador Técnico :
Guillermo José Arcila Soto

Supervisor Apoyo Jurídico :
Neila Luz Baleta Mizar

Bitácoras

Fecha	2022-11-03 23:11:29.603
Comentario	04/10/22 Notificación Finalización De Activid…

Fecha	2022-11-30 18:37:49.326
Comentario	El 10/11/2022 Suscripción Acta De Terminac…

Fecha	2022-12-16 05:01:12.932
Comentario	Pendiente Solicitud Por Parte Del Operador …

Fecha	2023-03-03 11:19:04.289
Comentario	El 06/03/23 Se Inician Las Actividades De Cr…

Fecha	2023-04-03 17:52:37.226
Comentario	El Contrato FAZNI-GGC-590-20 Se Encuentr…

Datos relevantes

Duración
Desde: 2021-03-31
Hasta: 2022-11-09
589 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
Entregado

Tipo De Proyecto: FAZNI
Subtipo: Otros

Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contrat
GGC-590-2020	CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E	EMPRESA DE EN ELECTRICA D DEPARTAMENT GUAVIARE
GGC-63	ntegr , Co ter la	CONSORCI INTERVENTORE COLOMBIA

Imágenes y evolución

In



Versión: 3.1.50


Antes

Ahora

Evolución

Proyección

Ejecución

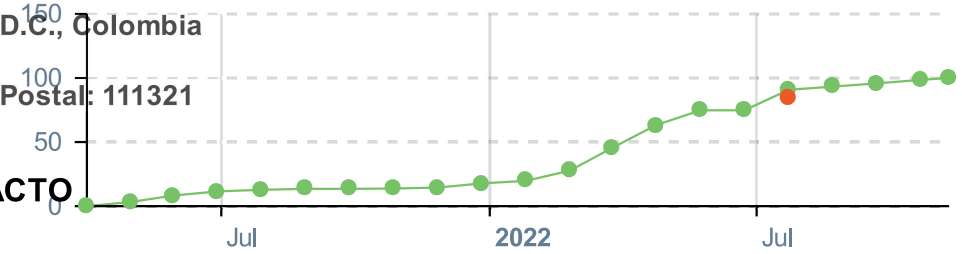

MINENERGIA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

Indicadores

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo)
(https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo)
(https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

0/1.0

No. Usuarios Actas De Energización

© Powered by Interkont.co

Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

Empleos Directos



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta
,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado

0%

Ejecutado / Meta

,0/20,0

% Avance De Obra Contratista



No. Usuarios Contratados

Dónde está ubicado el proyecto

Ubicación: Guaviare - Calamar
Municipio(S): Calamar
Departamento(S): Guaviare

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin		
Etapa 1	Apertura De Cuenta Bancaria. (Plazo A Partir De La Firma Del Contrato)	2021-03-31	2021-04-10	1,00	1,
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar)	2021-03-31	2022-11-09	1,(	
Etapa 1	Realización De Socialización Y Capacitación De Usuarios.	2021-05-08	2021-05-21	1,0	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Apertura De Cuenta Bancaria.(Plazo A Part…
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2021-04-10
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupu…
Fecha de Inicio	2021-03-31
Fecha de finalización	2022-11-09
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realización De Socialización Y Capacitaci…
Fecha de Inicio	2021-05-08
Fecha de finalización	2021-05-21
Valor unitario	$7.730.024,46

Etapa 1	Realizar El Replanteo Y Verificación De Los Usuarios Beneficiados Del Proyecto En El Campo Y Tramitar Las Sustituciones De Los Mismos (Si Aplican) - Y Actas De Verificacion De Usuarios.	2021-05-22	2021-06-16	1,0	Cantidad programada Valor Programado Cantidad ejecutada Valor ejecutado Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Realizar El Replanteo Y Verificación De Lo…
Fecha de Inicio	2021-05-22
Fecha de finalización	2021-06-16
Valor unitario	$61.840.195,72
Cantidad programada	

Etapa 1	Verificar Y Realización De Las Consultas Previas, En Caso De Ser Necesarias	2021-06-17	2021-08-16	1,00	Cantidad programada Valor Programado Cantidad ejecutada Valor ejecutado Porcentaje de avance

Categoria	Etapa 1
Descripción	Verificar Y Realización De Las Consultas P…
Fecha de Inicio	2021-06-17
Fecha de finalización	2021-08-16
Valor unitario	$7.730.024,46
Cantidad programada	

<< Primero < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > Último >>

Valor Programado

Reportes


Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Re
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Re

Informe De Supervisión - Liquidación

Reporte PDF Reporte EXCEL Re

••• **Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto**





FAER - GGC-504-22 - AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La Vega, Cauca

(2980)

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización


[redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

17,39 %

Así Va Vrs. Así Debería Ir



Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 24.236.640.294

$ Proyecto $ 24.236.640.294 **$ Interventoría** $ 0

Quienes Participan?

Contratante: CEO S.A.S. E.S.P.
SUPERVISOR: Cristian Andrés Diaz Duran
Interventor:

Datos Generales

N° Convenio: GGC-504-2022
Desc. Convenio: GGC-504-2022
N° Contrato: GGC-504-2022
Objeto Del Proyecto:

Ampliar la cobertura y prestar el serv1c10 de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL

Número De Acta: 60
Códigos De Los Proyectos:
Alcance:

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en varias veredas del Municipio de la Vega en el Departamento del Cauca", el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de

Comité Que Define: CAFAER
Instalaciones Internas:

N/A

Valor Unidad Instalaciones Internas: $ 0

Equipo de apoyo a la Supervision

Supervisor Apoyo Técnico :	Coordinador Técnico :	Supervisor Apoyo Jurídico :
Esmeralda López Sanchez	Marcela Patricia Araujo Colina	Diana Marcela López López

Bitácoras

Fecha	2022-11-03 22:51:37.075
Comentario	No Se Evidencia Avance En La Etapa 1 Previa Del Contrato. ...

Fecha	2022-11-30 20:47:26.319
Comentario	03/11/2022 El Contratista Solcitará Prorroga Al Contrato P...

Fecha	2022-12-16 06:43:55.811
Comentario	Se Tramitó Prórroga No.3 Por 40 Días En El Item 12 De La ...

Datos relevantes

Duración
Desde: 2022-03-16
Hasta: 2023-08-31
534 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAER
Subtipo: Redes De Trasmisión

Contratos asociados


Contrato	Objeto	Contratista	Duración
GGC-504-2022	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP.	2022-03-30 Hasta 2(03-29 (7304 Días

Imágenes y evolución

Imágenes




Antes



Ahora

Evolución

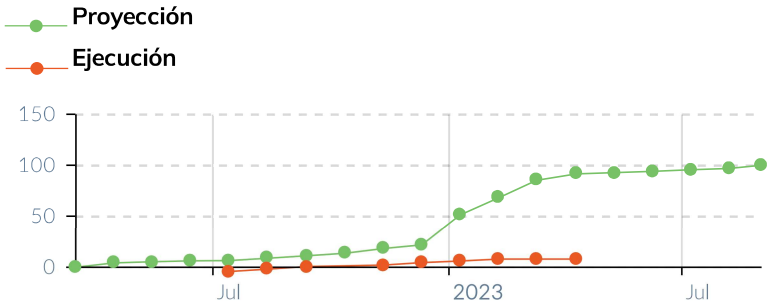

Indicadore




Ejecutado
0%



Ejecutado / Meta
,C 1,0

No. Usuarios Actas De Energización



1[illegible]%

Ejecutado / Meta
1920,0/1,0

No. Usuarios Replanteo Actual

Versión 2021.50

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
436,0/1,0

No. Usuarios Nuevos



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
269,0/1,0

No. Usuarios Retirados



Ejecutado
52%

Ejecutado / Meta
26,0/50,0

Empleos Indirectos



Ejecutado
0%

© Powered by Interkont.co

Ejecutado / Meta
,0/100,0

% Avance De Obra Contratista



Estimado
1413
UND

No. Usuarios Contratados



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
2,0/,0

ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS



Ejecutado
0%

Ejecutado / Meta
,0/,0

Acometidas



Ejecutado
100%

Ejecutado / Meta
2,0/2,0

ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: La Vega, Cauca
Municipio(S): La Vega
Departamento(S): Cauca

Actividades del proyecto

Buscar por categoria o descripción

BUSCAR

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Suscripción Del Encargo Fiduciario. (15 Después De La Firma Del Contrato)	2022-03-16	2022-03-31	1,00 1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Suscripción Del Encargo Fiduciario. (15 Después De La Fir...
Fecha de Inicio	2022-03-16
Fecha de finalización	2022-03-31
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Programada	
Etapa 1	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entidad. (En Caso De Aplicar)	2022-03-30	2022-03-30	1,00 1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Incorporación De Los Recursos Al Presupuesto De La Entid...
Fecha de Inicio	2022-03-30
Fecha de finalización	2022-03-30

Etapa 1	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Para La Contratación De La Interventoría Y Firma Para Gestión Documental Etapa 1 - Según Corresponda.	2022-03-30	2022-04-27	1,00	1,00	1,15 %

Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Suscripción Del Contrato De Interventoría Y Firma Para Gestión Documental Etapa 1 Suscripción Del Acta De Inicio.	2022-04-27	2022-06-16	1,00	1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Publicación De Pliegos O Invitación Directa Para La Contrat...
Fecha de Inicio	2022-03-30
Fecha de finalización	2022-04-27
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Categoria	Etapa 1
Descripción	Suscripción Del Contrato De Interventoría Y Firma Para Ges...
Fecha de Inicio	2022-04-27
Fecha de finalización	2022-06-16
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	
Cantidad ejecutada	
Valor ejecutado	
Porcentaje de avance	

Etapa 1	Revisión Y Aceptación De Diseños Especificaciones Y Presupuesto.	2022-03-16	2022-03-17	1,00	1,00	1,15 %

Categoria	Etapa 1
Descripción	Revisión Y Aceptación De Diseños Especificaciones Y Presu...
Fecha de Inicio	2022-03-16
Fecha de finalización	2022-03-17
Valor unitario	$279.653.541,85
Cantidad programada	
Valor Programado	

« Primero < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Último >>

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD

Informe De Supervisión - Liquidación

Reporte PDF Reporte EXCEL Reporte WORD
