
ANEXO 8.
COPIA BITACORA

14/Junio/2023
Clima: Sin lluvias en la mañana, llovisnas en la tarde retraso la obra.
Personal: Ainolfo Duarte, Maestro, Renso Garcia oficial, Stiven Ochoa, ayudante, Jorge piñeros, ayudante, Lenis Duarte, ayudante, Gustavo Rojas, arquitecto residente
Actividades: Se continua con amarre de acero de columnas y terminacion de amarre de acero de vigas de cimentacion. —



Contratista




Interventoria

15/Junio/2023
Clima: llovisnas todo el día
Personal: Ainolfo Duarte, maestro; Renso Garcia, oficial; Stiven Ochoa, ayudante, Jorge Piñeros, ayudante, Lenis Duarte ayudante, Gustavo Rojas arquitecto residente

Actividades: Se continua con amarre de acero de columnas y terminación de amarr. de acero de vigas de cimentación, no se atlanto mucho por el tema de las llovisnas —



Contratista



Interventoria

Powered by CamScanner

16/ Junio/2023


Clima: llovizna en horas de la tarde, retrasaron el trabajo en obra.
Personal: Adolfo Duarte, maestro; Benso Garcia, oficial; Steven Ochoa, ayudante; Jorge Piñeros, ayudante, Lenis Duarte, ayudante, Gustavo Rojas, arquitecto residente.


Actividades: Amarre de acero de columnas y terminacion de amarre de acero de vigas de cimentación, las lluvias retrasan el trabajo en obra.

Contratista.

Interventoria

17/Junio/2023
Clima: lloviznas intermitentes en todo el día.
Personal: Adolfo Duarte, maestro; Benso Garcia, oficial; Steven Ochoa; ayudante; Jorge Piñeros, ayudante; Lenis Duarte, ayudante; Gustavo Rojas, arquitecto residente.
Actividades: Se continua con el amarre de columnas y terminacion de amarre de vigas de cimentacion.

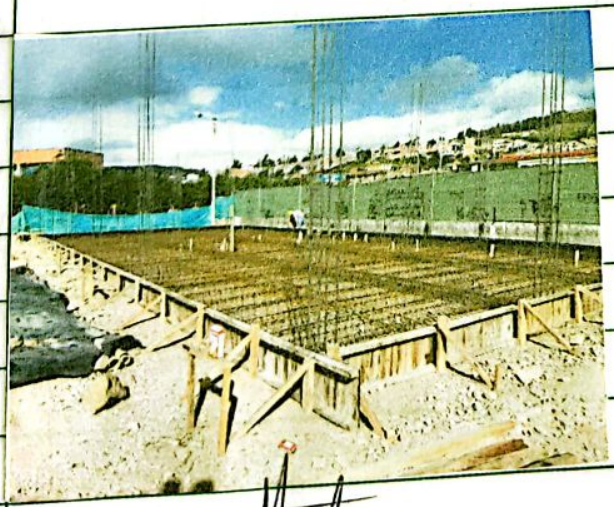

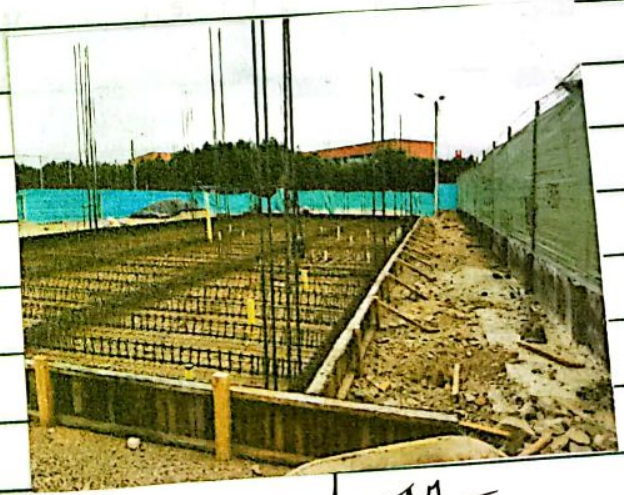

Contratista.

Interventoria.

20/Junio/2023

Clima: lluvias intermitentes mañana y tarde.
Personal: Arnulfo Duarte, maestro; Denso Garcia, oficial; Stiven Ochoa, ayudante; Jorge Piñeros, ayudante, Lenis Duarte, ayudante; Gustavo Rojas, arquitecto.
Equipos: Herramientas y equipos menores.
Actividades: Encofrado en camilla y alistamiento para fundida concreto placa





Contratista

Interventoría.

21/Junio/2023
Clima: Sin lluvias
Personal: Arnulfo Duarte, maestro, Denso Garc oficial; Stiven Ochoa ayudante; Jorge Piñeros, ayudante; Duban Morales, ayudante, Gustavo Roja arquitecto.
Herramienta: Cierra de corte de madera, camillos de unidad pulidora.
Actividades: Amarre de columnas ejes 4. y se continua con el encofrado para fundida de placa de cimentacion

Contratista


Interventoria

22/Junio/2023

clima: sin llovizna
Personal: Arnulfo Duarte, maestro; Renso García, oficial; Stiven Ochoa, ayudante; Jorge Piñeros, ayudante; Duban Morales, ayudante; Gustavo Rojas, arquitecto
Herramienta: menor, cierra de corte matera, camillas de matera 6 unidades, Polidora Grande.

Actividades: Se culmina encofrado de camillas para fundido de concreto. Se continua amarre de acero de columnas de ejes 5.



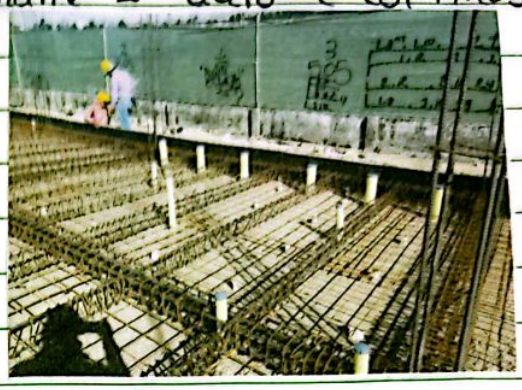

contratista

Interventoria

23/Junio/2023
clima: sin llovizna
personal: Arnulfo Duarte, maestro; Renso García, oficial, Stiven Ochoa, ayudante; Jorge Piñeros, ayudante; Duban Morales, ayudante; Gustavo Rojas, arquitecto.
Herramienta: cierra de corte matera, camillas de matera 6 unidades, Polidora.
Actividades: Se culmina encofrado de camillas para fundido de concreto.

contratista

Interventoria.

Powered by CamScanner

24/Junio/2023
Clima: se presentan lluvias que disminuyen considerablemente el amarre de aceros.
Herramienta: cierra de corte madera, camillas de madera 6 unidades, pulidora.

Actividades: se culmina encofrado de camillas para fundido de concreto





Contratista

Interventoria

26/Junio/2023
Clima: se presentan lluvias en la mañana y en la tarde.
Herramienta: Auto bomba de concreto, vibrador electrico para concreto, herramienta menor.
Personal: Alnulfo Ocaña, Benso Garcia, Stiven Ochoa, Gustavo Rojas.
Actividades: Se realiza fundida de placa inferior de cimentacion, altura 0.12 m, se funde en su totalidad, con concreto. Se realiza vibrado de concretos en todos los elementos estructurales, vigas, viguetas y placa torta inferior.
Se toman tres cilindros de muestra de concreto
se realizo instalacion de tuberia electrica.





Contratista

Interventoria

27/ Jan/10/2023.

clima: se presentan lluvias en la mañana y en la tarde.

personal: Arnulfo Quaite, Reinso Garcia, Steven Ochoa, Gustavo Rojas.

Herramientas: vibrador electico para concreto, Herramienta menor.

Actividades: Instalacion de caseteones de icopor altura lo se instalan contoime a los diseños respetando los anchos de vigas, viguetas y nervios de placa de cimentacion, esta actividad se realiza bajo supervisión de Interventoria.

Instalacion malla electrosoldada de 5mm con traslapo





contratista

Interventoria

28/Julio/2023
Clima: se presentan lluvias en la mañana y tarde.
personal: Adolfo Ovalle, maestro, Pedro Garcia, oficial; Steven ochoa, ayudante, Gustavo Rojas, arquitecto.

Actividades: Instalacion de malla electro soldada de 5mm con traslapos de 25 hasta 30cm, garantizando el traslapo por cuadricula.
Instalación tubería electrica sobre malla electrosoldada
Instalacion de tubería hidraulica.
Instalacia de tubería de gas en zona de calentadores de gas. Se realiza toma de medidas de tuberias, revision de puntos eléctricos ubicados en tuberias, esta inspección se realiza bajo supervición de interventoria








contratista


Interventoria.

29/ Junio/2023

Clima: sin lluvias
personal: Arnulfo Duarte, maestro; Renso Garcia, Oficial; Steven Ochoa; ayudante, Gustavo Rojas Arquitecto.
Herramientas: vibrador electrico para concreto, Herramienta menor.

Actividades: se realiza fundido de concreto placa superior de cimentación, con concreto premezclado de 3.000 psi, se toma asentamiento junto con inspectora de calidad de holcim y se toman 3 cilindros se realiza llenado de vigas, viguetas y columnas, posteriormente se llena la placa de 0,15 m de altura, a todos los elementos se le realiza el proceso de vibrado.






Contratista

Interventoria

30/ Junio/2023
Clima: sin lluvias.
personal: Arnulfo Duarte, Renso Garcia, Oficial, Steven Ochoa, ayudante, Gustavo Rojas, Arquitecto
Actividades: se realiza retiro de formaletas laterales, se riega abundante agua a toda la superficie de la placa en la mañana y en la tarde para mejorar el proceso de fraguado.
se sumergen en aguas los cilindros tomados el dia de ayer.

01/07/2023
personal Maestro Arquito Duarte.
Stiven ochoa ayudante
Renso Garcia oficial.
arq. Gustavo Rojas
clima.: llovisnas lenes.
actividades.
Encofrado de columnas eje 1 del. eje. (A B.C)
4 columnas, se realiza encofrado y fundida en
concreto de 3.500 PSI mezclado en obra
Segun diseño de mezcla establecido.
cemento Holcim y arena del Moral salida
hacia Bogota sector (Punta-Germania.)
mezcla en Valdes.
4 Valdes de cemento (bulto)
8.9 Valdes de Grava
5.7 Valdes de Arena.
Se toman 3 cilindros para fallar la proxima
semana 7 dias y los otros 14 y 28 días.



Contratista


04/07/2023.
personal Arquito Duarte Maestro
Stiven Ochoa ayudante
Jorge Albeiro pineros Ayudante.
Renso Garcia. Oficial
arq: Gustavo Rojas
Actividades.
desencofrado de columnas, eje. (1) del
A al D, armado de cofre de columnas
eje 2 del A al D. & funde concreto
de las 4 columnas, se realiza proceso
de vibrado. el concreto se mezcla en
obra Segun diseño medido en valdes

igual que el día 01/07/2023 y se seguirá midiendo en valdes de la misma forma para todas las columnas.
Se instala viniPel a las columnas descofradas para garantizar el correcto fraguado del concreto.

D.)



Contratista.




Interventoría

05/07/2023
personal de obra
Arnulfo Duarte Maestro
Stiven ochoa Ayudante
Jorge Piñeros Ayudante
Reinso García oficial.
Equipos y Herramientas
• herramienta menor, Formaleta metalica excelente estado, Vibrador de concreto, entre otros
Clima sin novedad.
Actividades.
descofrado columnas fundidas el día anterior
Se instaló Viniper a las columnas en mención para garantizar fraguado.
Se realizó encofrado y fundida de concreto de columnas eje 3 del A al D 4 unidades con concreto de 3.500 psi fundido a Sitio.
Segun diseño medición valdes ver hoja. 40 /01/07/2



Contratista.




Interventoría

Powered by CamScanner

06/04/2023.
personal obra
Arnolto Duarte Maestro
Reyes Garcia oficial
Stiven ochoa ayudante
Jorge piñeros ayudante
equipos herramientas, formaleta metalica para 4 columnas, vibrador de concreto, herramientas menores. etc.
clima. Sin novedad.
Actividades.
desencofrado columnas eje 3 instalacion de visipel para fraguado de concreto.
se encofraron y fundieron columnas eje 4 del A-D. concreto de 3.500 psi en obra.
se elicen para laboratorio los cilindros de placa.
4 valdes de cemento
8.9 valdes de grava
5.4 valdes de arena.
2.5 Agua.
Segun diseño de mezcla.




contratista



07/04/2023.
personal obra.
Arnolto Duarte Maestro
Reyes Garcia oficial
stive ochoa ayudante
Jorge piñeros ayudante

equipos herramientas

Vibrador de concreto, formaleta para columnas 2.60 mt, herramienta menor. mezcladora 2 bultos.
Se realiza desencofrado de columnas eje 4 se instala viripel.
Se encofra y funden columnas eje A 5-6 y Eje B 5-6) 4 columnas.
Se realiza vibrado de concreto y mezcla segun diseño.
Se revisa plomada.





08/07/2023.

PERSONAL:
1 Arq. Residente de obra Gustavo Rojas
1 Maestro Arnulfo Duarte
2 Ayudantes Stiven Ochoa, Jorge Piñeros.
1 Oficial Renso García

EQUIPOS:
- Formaletas metalicas
- Vibrador de concreto
- Mezcladora.
- Herramienta menor.

CLIMA: Lluvias Fuertes.

ACTIVIDADES.
- Desencofrado de columnas Eje A 5-6 y Eje B 5-6, instalación de viripel para fraguado de concreto.
- Realización armado de acero de refuerzo flejes para columnas en el Eje C 5-6 y Eje D 5-6. y encofrado.
- Reunión entre contratista e interventoria para tratar temas relacionados como aspectos técnicos.

NOTA: Por fuertes lluvias no se puede realizar actividad de vaciar fundir columnas.

Powered by CamScanner

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

10/07/2023.

PERSONAL:

1 Arq. Residente de obra Gustavo Rojas.

1 Oficial Ronso García.

3 Ayudantes Stiven Ochoa, Jorge Piñeros, Duvan Morales.

EQUIPOS:

- Formaletas metálicas
- Vibrador de concreto
- Mezcladora
- Herramienta menor.

ACTIVIDADES:

- Armado acero de refuerzo flejes para columnas. en los ejes C 6 y D 6; altura 3.70m.
- Encofrado y fundida de concreto de columnas en los Ejes C 5 y D 5, concreto de 3500 PSI, mezclado y fundido en sit
- Descargue de 2 volquetas de (ladrillo) bloque. No 5.

CLIMA: Lloviznas en la jornada mañana, soleado jornada tarde.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

11/07/2023
