INFORME DE INTERVENTORIA 05
PERÍODO: JUNIO 01 AL 30 DE 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA,
CONTRATO 092 DE 2022

INTERVENTOR: ENRIQUE ZIMMERMAN ORTIZ
E-mail: Enriquezimmerman100@gmail.com

RIOHACHA, JUNIO 30 DE 2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe No 05 de interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato No 092 de 2022 con objeto de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, suscrito entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, corresponde a las actividades ejecutadas por ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, delegado como interventor mediante el contrato No 092 de 2022, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el grado de consistencia de los mismos.

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias de CORPOGUAJIRA, de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna, además, describe las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

La Interventoría pretende con su trabajo, asegurar el cumpliendo de los requisitos implícitos y explícitos contractuales, asegurar la permanente optimización de procesos efectivos que respondana las necesidades de los beneficiarios.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

TITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015", contempla actividades de establecimiento de plantaciones, aislamiento de plantaciones forestales, monitoreo y seguimiento de la restauración y de parcelas de monitoreo, talleres de socialización, sensibilización ambiental y acuerdos de conservación en las comunidades.

1.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.

La población objetivo del proyecto "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015", está determinada primero, por la población del área de influencia directa, que es la población de las veredas perteneciente a los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva y por otro lado, está la población beneficiaria indirecta, que es la población general de los cinco municipios involucrados en el proceso.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.3.1. Objetivo general

Restaurar los ecosistemas forestales de las Rondas hídricas y cuenca del río ranchería y otros, arroyos, quebradas y afluentes de agua en las áreas protegidas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva, La Guajira.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Aumentar la cobertura vegetal que favorezca la regulación natural del recurso hídrico en las Rondas hídricas y cuencas del rio Ranchería y otros en las áreas protegidas y de las zonas de influencia.
- Fortalecer el conocimiento de los pobladores aledaños a las rondas hídricas y cuenca del rio ranchería y otros en las áreas protegidas, sobre el cuidado en las áreas protegidas y conservación del entorno.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 082 de 2022

TITULO II: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

2. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 082 DE 2022.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1.1. Información del contrato


Contrato No.	082	**FECHA**	16/12/2022	**Modalidad de Contratación**	LOP	**Entidad Contratante**	CORPOGUAJIRA	
Contratista	Fundación Agua Luna						**NIT**	900345669-4
Rep. Legal	Gerald Brisson Mendoza						**CC**	19.486.085
Objeto del Contrato	REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015							
Supervisor	Armando Gómez							
Plazo Inicial	14 meses		**Acta de Inicio**	01/02/2023		**Valor Inicial Contratado**	$ 2.783.226.207,00	
Plazo Adicional	0 meses		**Fecha Finalización**	30/03/2024		**Valor Adicional**		
Plazo Total	14 meses		**Fecha Acta Final de Obra**			**Valor Total**	$ 2.783.226.207,00	
Tiempo Trascurrido del Contrato	5 meses		**Fuente de financiación**	Sistema General de Regalías (SGR)		**Valor del Anticipo**	$1.391.613.103,50	
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**	
Porcentaje de Ejecución Física		**Ejecución Financiera**		**Porcentaje de Retraso**	**Actas Parciales Suscritas**			
					No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**
Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado					
12,1%	57,43%							

Tabla 1: Información del contrato No 082 de 2022.

2.1.2. Localización

Este proyecto plantea desarrollar actividades en parte de las microcuencas de los ríos ranchería, el molino, arroyos y afluentes de agua en las áreas protegidas, específicamente en los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva, La Guajira.

El departamento de La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia, está localizado en la parte norte del país y pertenece al grupo de departamentos de la Región Caribe colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del César y al suroeste con el departamento del Magdalena. El territorio de la Guajira está constituido por la península de La Guajira, en su centro por una bajiplanicie, al sur con parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la planicie aluvial de los ríos Ranchería y César.

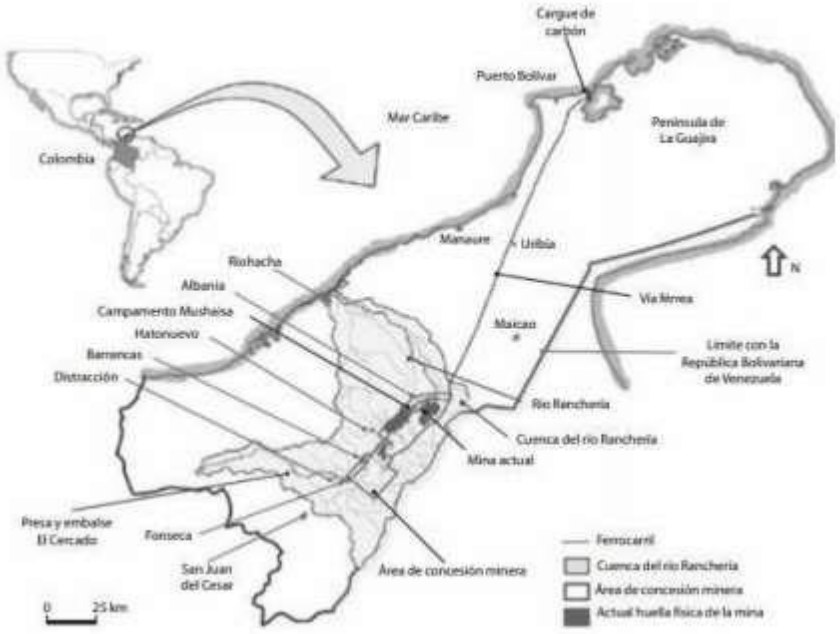

Mapa 1: Localización proyecto.
Fuente: Corpoguajira.

2.1.3. Actividades desarrolladas por la interventoría.

Para el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo las actividades que a continuación se relacionan:

- **Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.**

Esta interventoría en uso de sus facultades realizó el acompañamiento y verificación de las actividades y acciones realizadas en el periodo del mes de junio para dar cumplimiento a la actividad de realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.

Durante el seguimiento realizado por esta interventoría se evidencio la presencia de materiales para la construcción del aislamiento en los municipios que son objeto de intervención, así como el trasporte menor desde los acopios hasta los sitios definitivos. Los materiales disponibles para la construcción del aislamiento son alambre calibre 14, puntales de eucalipto de 2,10M de longitud y 10Cm de diámetro y grapas de excelente calidad.

se verifico por parte de la interventoría la construcción de 18 km de aislamiento cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, como lo es la distancia entre poste y poste, la instalación de un pie de amigo cada 30 metros y los 4 hilos de alambre.

Para el mes de junio según la programación establecida el contratista debió demostrar la instalación de 13,8 km de aislamiento acumulado, pero se evidencia que se cumplió con la instalación de 18 km de aislamiento, superando la cantidad de aislamiento programada, lo que demuestra un avance significativo en la actividad de realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.

Esta interventoría sigue haciendo el respectivo seguimiento a las labores enmarcadas dentro de esta actividad a fin de que se cumpla con la totalidad de la cantidad contratada, es decir, 28 km de aislamiento.

A continuación se relaciona la cantidad de aislamiento instalada por el contratista y verificada por esta interventoría en el mes de Junio.

RELACION AISLAMIENTO INSTALADO						
Municipio	Corregimiento o vereda	Propietario	Nombre del predio	Aislamiento instalado (Km)	Coordenadas	
					N	W
Hatonuevo	Los remedios	Arquímedes Alarza	La granja	1,6	11° 5'46.77"	72°31'35.30"
Fonseca	Las colonias	Heyner Olivella	Leticia	0,7	10°42'23,3"	-72°44'33,0"
Fonseca	Las colonias	Orlys Arciniegas	Las delicas 1	1,5	10°43'15,8"	-72°44'06,4"
Fonseca	Las marimondas	Osval Ramirez	Las cascadas	1	10°45'25.57"	72°44'26.85"

Fonseca	Las Marimondas	Jhon Aragon	Villa esperanza	0,6	10°45'9.64"	72°43'49.57"
Fonseca	Las Marimondas	Yadelis Aragon	Buena vista	0,7	10°45'12.86"	72°43'57.40"
Villanueva	Potrero grande	Jorge López Dongón	Potrero grande	2,2	10°35'12.03"	72°55'50.17"
Villanueva	Potrero Grande	Rosaura Guerra		1,2	10°34'36.72"	72°55'40.26"
Barrancas	Las Pavas	Ovidio Mejía Marulanda	Aguas Blancas	1,5	10°52’00,1”	72°41’50,1”
Barrancas	Las Pavas	Ramiro Mejía Hernandez	La unión	2	10°52’42,6”	72°42’21,4”
Barrancas	Las Pavas	Juan Carlos Mindiola	Los Martirios	2,2	10°51’28,4”	72°41’21,7”
San Juan	Corralejas	Moisés Parodi	Las nubes	2,8	10°41'43,9"	-72°50'06,2"
			TOTAL	**18**		

Tabla 2: Relacion aislamiento instalado.





Fotos 1 y 2. Aislamiento instalado predio Ovidio Mejía, municipio Barrancas.




Fotos 3 y 4. Aislamiento instalado predio Yadelis Aragón, municipio de Fonseca.




Fotos 5 y 6. Aislamiento instalado predio Jorge López municipio de Villanueva.




Fotos 7 y 8. Aislamiento instalado predio Ramiro Mejía municipio de Barrancas.




Fotos 9 y 10. Aislamiento instalado predio Moises Parodi municipio de San Juan.

- **Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.**

Durante el mes de junio esta interventoría realizo el respectivo acompañamiento y seguimiento al proceso de establecimiento de plantaciones forestales en las zonas degradadas.

La interventoría realizo la verificación del estado del material vegetal a utilizar en el proceso de establecimiento de plantaciones encontrando que dentro de las especies vegetales que se utilizaron para la siembra están; Iguamarillo, Guayacán,

Guásimo, Cañahuate, Roble morado, Corazón fino, Ceiba lechosa y Carreto. Se evidencio en este material vegetal un buen estado físico y fitosanitario y un tamaño entre 30 cm y 70 cm lo que es óptimo para su desarrollo y crecimiento luego de realizada la plantación, Provenientes del Agrovivero el Olivo Bendito el cual cuenta con registro Ica No. 20-001-36.

Anexo 1. registro ica del vivero.

Se pudo observar que la restauración activa se realizó en áreas previamente aisladas, donde no existe riesgos de entrada de animales y sin la presencia de tensionante.

Se valido entonces que durante el mes de junio la fundación Agua Luna como responsables de la ejecución del contrato de obra realizo el establecimiento de 363 Hectáreas de siembra, dado que se presentaron frecuentes lluvias y se contó con condiciones favorables de humedad en el suelo, aplicando hidrorretenedor, con el fin de minimizar el porcentaje de mortalidad una vez se presentan condiciones adversas.

Se constato el establecimiento de cuatrocientos (400) individuos de especies forestales nativas amenazadas y propias del bosque seco por hectárea, bajo un trazado aleatorio y/o donde la presencia de claros. Cumpliendo con las especificaciones técnicas dadas por el contrato, referente a distancia entre árboles, utilización de insumos como son fertilizante, hidro retenedor, correctivos, micro elementos e insecticidas, entre otras.

En la siguiente tabla, se relaciona el avance de la actividad.

RELACION PLANTACIONES ESTABLECIDAS							
Municipio	**Sector**	**Propietario**	**Nombre del predio**	**Area sembrada (Hras)**	**Especies sembradas**	**Coordenadas**	
						N	**W**
Hatonuevo	Los remedios	Arquímedes Alarza	La granja	134	Corazón fino, iguamarillo, Roble morado, Cañahuate, Ceiba lechosa, Guayacán, Carreto, Guásimo	11° 5'46.77"	72°31'35.30"
Fonseca	Las colonias	Heyner Olivella	Leticia	10		10°42'23,3"	72°44'33,0"

Fonseca	Las colonias	Orlys Arciniegas	Las delicas 1	10	Corazón fino, iguamarillo, Roble morado, Cañahuate, Ceiba lechosa, Guayacán, Carreto, Guásimo	10°43'15,8"	72°44'06,4"
Fonseca	Las marimondas	Osval Ramírez	Las cascadas	11		10°45'25.57"	72°44'26.85"
Fonseca	Las Marimondas	Jhon Aragon	Villa esperanza	6		10°45'9.64"	72°43'49.57"
Fonseca	Las Marimondas	Yadelis Aragon	Buena vista	7		10°45'12.86"	72°43'57.40"
Villanueva	Potrero grande	Jorge López Dongón	Potrero grande	60	Iguamarillo Roble morado Corazón fino Carreto	10°35'12.03"	72°55'50.17"
Villanueva	Potrero Grande	Rosaura Guerra		15		10°34'36.72"	72°55'40.26"
Barrancas	Las Pavas	Ovidio Mejía Marulanda	Aguas Blancas	20	Corazón fino, iguamarillo, Roble morado, Cañahuate, Ceiba lechosa, Guayacán, Carreto, Guásimo	10°52’00,1”	72°41’50,1”
Barrancas	Las Pavas	Ramiro Mejía Ortiz	La unión	20		10°52’42,6”	72°42’21,4”
Barrancas	Las Pavas	Juan Carlos Mindiola	Los Martirios	20		10°51’28,4”	72°41’21,7”
San Juan	Corralejas	Moisés Parodi	Las nubes	50	Corazón fino, Iguamarillo, Roble morado	10°41'43,9"	-72°50'06,2"
			TOTAL	**363**			

Tabla 3: Relacion establecimiento de plantaciones.




Fotos 11 y 12. Verificacion material vegetal vereda las marimondas, municipio de Fonseca.




Fotos 13 y 14. Establecimiento de plantaciones predio Arquimedes Alarza municipio de Hatonuevo.




Fotos 15 y 16. Establecimiento de plantaciones predio Moises Parodi, municipio de San Juan.




Fotos 17 y 18. Establecimiento de plantaciones predio Jorge Lopez, municipio de Villanueva.

2.1.4. Estado actual del proyecto.

En el período que abarca el presente informe el proyecto de rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de hatonuevo, barrancas,

fonseca, san juan del cesar y Villanueva, departamento de la guajira bpin 20223201010015, se encuentra en estado de ejecución.

Hasta la fecha de ejecución del informe No 05, se refleja un avance de ejecución en tiempo del **57,43%.**, quedando por ejecutar el **42,57%.**

2.1.5. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	Has	726	$ 2.120.058,00	$1.539.162.108,00
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	Km	28	$16.233.890,00	$454.548.920,00
3	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Unid.	8	$ 1.299.740,00	$10.397.920,00
4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Núm.	1	$ 49.798.828,37	$49.798.828,00
5	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración.	Unid.	1	$ 74.885.200,00	$74.885.200,00
6	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Unid.	8	$ 500.000,00	$ 4.000.000

Tabla 4: Características del contrato No 082 de 2022.

2.1.6. Relación de ítems no previstos y adicionales.

A la fecha no se han presentado ítems no previstos y/o adicionales en el contrato 082 de 2022.

2.1.7. Seguimiento al cronograma de ejecución.

CONTRATO No.	082 DE 2022								
OBJETO	"REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015"								
PERIODO INFORMADO	JUNIO								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PONDERADO	CANTIDAD AVANCE JUNIO	%AVANCE JUNIO	CANTIDAD AVANCE ACUMULADO	% AVACE ACUMULADO	% POR EJECUTAR
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	Has	726	72,17%	363	36,08%	363	36,08%	63,92%
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	Km	28	21,31%	18	13,70%	23	17,51%	82,49%
3	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Unid.	8	0,4875%	0	0,00%	4	0,24%	99,76%
4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Núm.	1	2,33%	0	0,00%	1	2,33%	97,67%
5	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración.	Unid.	1	3,51%	0	0,42%	0,36	1,26%	98,74%
6	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Unid.	8	0,1875%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%
						50,21%		**57,43%**	**42,57%**

Tabla 5: Avance físico del contrato No 082 de 2022.

De acuerdo a la programación de obra, presentada por el contratista se tiene que a corte de 30 de junio estaba programado el **12,1%** de las actividades, sin embargo, presenta una ejecución del **57,43%**, lo que indica que se logro superar el retraso existente el periodo pasado y además se consiguió por parte del contratista obtener un avance significativo en la ejecución de la actividad.

2.1.8. Dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto.

En el período que abarca el presente informe ya superadas las dificultades el contratista aprovecho las predicciones de lluvias y las lluvias durante el mes de junio para adelantar en un 50% las áreas de siembras establecidas en el contrato, además se logró reforzar las cuadrillas de trabajo y aprovechando que el mes anterior se distribuyó el material para la instalación del aislamiento se logró también avanzar en la construcción del aislamiento superando lo programado para el mes de junio.

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

2.2.1. Recurso humano del contratista

A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 082 de 2022:

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ROL EN EL PROYECTO
Juan David González	Ingeniero forestal	Ingeniero forestal
Justo Garantiva	Ingeniero Agrónomo	Coordinador
Xiomara González	Trabajador social	Trabajador social
Javier Guerra Murgas	Técnico operativo	Técnico Operativo
Gerald Brisson Mendoza	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo
Geraldine Brisson Ucros	Secretaria	Secretaria
Rafael Tobías Sarmiento	Conductor	Conductor

Tabla 6: Características del contrato No 082 de 2022.

2.2.2. Garantías.

POLIZAS DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.	RIESGO/AMPARO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	18628 63608	Cumplimiento del contrato	$ 278.322.620,70	16/12/2022	15/02/2025
		Calidad del servicio	$139.161.310,35	15/02/2024	15/02/2025

COLOMBIA NIT: 900.814.916-1		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$139.161.310,35	16/12/2022	15/08/2024
		Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones	$139.161.310,35	16/12/2022	15/02/2025
		Aprobación corporación (Corpoguajira)		**10/01/2023**	

Tabla 7: Pólizas suscripción del contrato No 082- de 2022.

2.2.3. Subcontratos.

A la fecha 30 de junio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

2.2.4. Anticipos.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
No	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**%**
1	Mano de obra	$706.893.410	50,80%
2	Insumos	$566.267.277,50	40,69%
3	Compra de equipos y herramientas	$5.198.960,00	0,37%
4	Transporte	$113.253.456,00	8,14%
	TOTAL	**$1.391.613.103,50**	**100%**

Tabla 8: Plan de inversión de anticipo.

2.2.5. Pagos realizados.

Luego de recibido el recurso de anticipo se realizó por parte del contratista los pagos relacionados a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ACTIVIDAD	COMPROMISOS Y PAGOS	RECURSOS	% DE AVANCE
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	$1.539.162.108	Programado	$1.539.162.108	
			Comprometido	$1.539.162.108	
			Pagado	$ 670.351.622	43,55%
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	$454.548.920	Programado	$454.548.920	
			Comprometido	$454.548.920	
			Pagado	$257.389.223	56,62%
3		$ 10.397.920	Programado	$ 10.397.920	
			Comprometido	$ 10.397.920	

	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.		Pagado		
4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	$49.798.828	Programado	$49.798.828	
			Comprometido	$49.798.828	
			Pagado	$	
5	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	$4.000.000	Programado	$4.000.000	
			Comprometido	$4.000.000	
			Pagado	$	
TOTAL ASIGNADO		**$2.057.907.776**	**TOTAL, COMPROMETIDO**	**$2.057.907.776**	100%
			TOTAL, PAGADO	**$927.740.845**	**45,08%**

Tabla 9: Relación de pagos realizados.

Anexo 2. informe financiero entregado por el contratista.

2.2.6. Obligaciones laborales

En periodos anteriores, el contratista anexó las hojas de vida de todo el personal contratado.

2.2.7. Prorrogas y/o adiciones

A la fecha 30 de junio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta prorrogas y/o adiciones.

2.3. ASPECTOS TÉCNICOS

2.3.1. Planos, diseños y especificaciones técnicas

A la fecha 30 de junio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta modificaciones en las especificaciones técnicas y diseños contractuales.

2.4. CONTROL DE CALIDAD.

2.4.1. Pruebas de laboratorio y/o certificado de calidad.

Para el contrato de obra No 082 de 2022, no aplican pruebas de laboratorio y/o controles de calidad.

2.5. CONTROL AMBIENTAL

Para el contrato de obra No 082 de 2022, no se requieren permisos o licencias ambientales.

2.6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES.

Se elabora informe de interventoría del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2023 para el contrato de obra 082 de 2022, donde se realiza el seguimiento y verificación de la construcción de 18 km de aislamiento, donde se evidencia un rendimiento significativo y un gran avance en la actividad de realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.

Se realizo también el seguimiento y acompañamiento al establecimiento de 363 hectáreas de las 26 hectáreas de siembras contratadas en el ítem de realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.

Para finalizar, se puede percibir que el objeto contractual de la REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015, presenta un avance del período del **50,21%**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 092 DE 2022

TITULO III: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0092 DE 2021.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

3.1.1. Información del contrato

Contrato No.	0092	**FECHA**	29/12/2021	**Modalidad de Contratación**	LOP	**Entidad Contratante**	CORPOGUAJIRA		
Contratista	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ						**NIT**	84096536-3	
Rep. Legal	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ						**CC**	84.096.536	
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA								
Supervisor	Luis Eduardo Buelvas								
Plazo Inicial	14 meses		**Acta de Inicio**	01/02/2023		**Valor Inicial Contratado**	$278.370.000		
Plazo Adicional	0 meses					**Valor Adicional**			
Plazo Total	14 meses		**Fecha Terminación Real**		30/03/2023	**Valor Total**	$278.370.000		
Tiempo Trascurrido del Contrato	5 Meses		**Fecha Acta Final de Obra**			**Valor del Anticipo**	$139.185.000		
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**		
Porcentaje de Ejecución Física		**Porcentaje de Ejecución Financiera**		**Porcentaje de Retraso**	**Actas Parciales Suscritas**				
					No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**	
Programado	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**						
35,71%	35,71%	$99.417.857,143	$99.417.857,143						

Tabla 10: Relación de pagos realizados.

3.1.2. Estado actual del proyecto.

En el período que abarca el presente informe, la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, para el proyecto de rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de hatonuevo, barrancas, fonseca, san juan del cesar y Villanueva se encuentra en estado de ejecución con un avance del 35,71% en los 5 meses de ejecución del contrato.

3.1.3. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

Tabla 10: Características técnicas del contrato.

PRESUPUESTO																							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL														Total Mes	COSTO TOTAL AÑO
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	UND	1	5.400.000	14	5.400.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7,00	37.800.000,00
1.2	INGENIERO FORESTAL Y/O AMBIENTAL	UND	1	3.500.000	14	3.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7,00	24.500.000,00
1.3	PROFESIONAL SOCIAL	UND	1	3.000.000	14	3.000.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,25	6.750.000,00
1.4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
1.5	ASISTENTE FINANCIERO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
1.6	ASISTENTE JURIDICO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
																						94.775.000
FACTOR MULTIPLICADOR																						**1,9**
	COSTO DIRECTO DE PERSONAL																					**180.072.500**
4.2.																						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL															COSTO TOTAL
3.1	Campero, Pick-Up, Camioneta, > 4x4	UND	1	7.397.000,0	14	7.397.000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	7,0	51.779.000
COSTOS VEHICULOS Y TRANSPORTES																						**51.779.000**
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES PLENO	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL															COSTO TOTAL
4.1	Servicios Comunicaciones – Internet	UND	1	48.062,12	14,0	672.870	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,0	672.869,75
4.2	Edicion de informes	UND	GL	100.000,00	14,0	1.400.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,0	1.400.000,00
GASTOS COMUNICACIONES E INFORMES DE LA INTERVENTORIA																						**2.072.870**
V	**TOTAL COSTOS**																					**233.924.370**
COSTOS ACUMULADOS																						**233.924.370**
VI	**IVA**																					
6.1	IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO																		19%			**44.445.630**
VALOR TOTAL INTERVENTORIA																						**278.370.000**

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C. 84.096.536 DE RIOHACHA

3.1.4. Relación de ítems no previstos y adicionales.

A la fecha 30 de junio de 2023 no se han presentado ítems no previstos y/o adicionales en el contrato de interventoría 082 de 2022.

3.1.5. Dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto.

En el período que abarca el presente informe ya superadas las dificultades el contratista aprovecho las predicciones de lluvias y las lluvias durante el mes de junio para adelantar en un 50% las áreas de siembras establecidas en el contrato, además se logró reforzar las cuadrillas de trabajo y aprovechando que el mes anterior se distribuyó el material para la instalación del aislamiento se logró también avanzar en la construcción del aislamiento superando lo programado para el mes de junio.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

3.2.1. Garantías.

POLIZAS DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA	**PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.**	**RIESGO/AMPARO**	**V/R. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
LA PREVISORA S.A CAMPAÑA DE SEGUROS NIT: 860002400-2	3017509 1012593	Cumplimiento del contrato	$55.674.000.00	28/12/2022	28/12/2024
		Calidad del servicio	$55.674.000.00	28/02/2024	28/02/2025
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$139.185.000.00	28/12/2022	28/12/2024
		Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones	$13.918.500	28/12/2022	28/02/2027
		Responsabilidad civil	$200.000.000	28/12/2022	28/02/2024
		Aprobación corporación (Corpoguajira)		**20/01/2023**	

Tabla 11: Pólizas suscripción del contrato No 092- de 2022.

3.2.2. Subcontratos.

A la fecha 30 de junio de 2023 el contrato 092 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

3.2.3. Anticipos.

En el contrato de interventoría No. 092 de 2022, estipula que se entregará a el contratista ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ un anticipo correspondiente al 50% del valor contratado por un valor total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($139.185.000). El uso de los recursos debe ser efectuado rigiéndose por el plan o programa de inversión presentado y avalado por la supervisión.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
No	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	Director de interventoría	$41.040.000

2	Ingeniero forestal yo ambiental	$26.600.000
3	Profesional social	$12.825.000
4	Asistente administrativo	$9.310.000
5	Asistente financiero	$9.310.000
6	Asistente Jurídico	$9.310.000
7	Transporte y vehículo	$29.855.000
8	Servicio comunicaciones – internet	$402.000
9	Edición de informes	$800.000
	TOTAL	**$139.185.000**

Tabla 12: Plan de inversión de anticipo del contrato 092 de 2022.

3.2.4. Obligaciones laborales

Pagos de seguridad social y aportes parafiscales del personal profesional contratado.

3.2.5. Prorrogas y/o adiciones

A la fecha 30 de junio de 2023 el contrato de interventoría 092 de 2022 no presenta prorrogas y/o adiciones.

3.3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.3.1. Planos, diseños y especificaciones técnicas

El contrato de interventoría 092 de 2022 no contempla planos ni diseños y no presenta modificaciones y/o observaciones en sus especificaciones técnicas y contractuales.

3.4. CONTROL DE CALIDAD

3.4.1. Pruebas de laboratorio y/o certificado de calidad.

Para el contrato de obra No 092 de 2022, no aplican pruebas de laboratorio y/o controles de calidad.

3.5. CONTROL AMBIENTAL

Para el contrato tanto de obra como el de interventoría no se requieren permisos o licencias ambientales.

3.6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

Para el mes de junio, el contrato de interventoría No 092 de 2022, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN

LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA", avanza satisfactoriamente, Enrique Zimmerman Ortiz y su equipo técnico continúan tomando medidas estratégicas para que las actividades contractuales se lleven a cabo en el término determinado.

Se insta al contratista por parte de la interventoría seguir realizando las labores que conlleven a tener un buen rendimiento y con esto seguir logrando un avance significativo en la ejecución del contrato.

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Interventor

GOBIERNO DE COLOMBIA MINAGRICULTURA ICA Instituto Colombiano Agropecuario

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA DE PROTECCION VEGETAL
GERENCIA SECCIONAL ICA CESAR

EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA- DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE EXPIDE EL PRESENTE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN COMO PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA ESPECIE FORESTAL

A: EBERTO ANTONIO OLIVO PEÑALOZA **REGISTRO Nº 20-001-36**

DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 18ª Cra 4 antiguo vivero municipal

NOMBRE DEL VIVERO: **AGROVIVERO EL OLIVO BENDITO**

DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

LOCALIZACION: : CALLE 18ª Cra 4 antiguo vivero municipal

AREA: 5000 m2

COORDENADAS **N** 10. 473940 **W** 073 23715

CLONES O VARIEDADES DESTINADAS A LA DISTRIBUCION: LAS VARIEDADES O ESPECIES QUE SE ENCUENTRAS REGISTRADAS EN LA RESOLUCIÓN SECCIONAL ICA - CESAR No 00038888

MATERIAL 530.000 PLÁNTULAS

TECNICO RESPONSABLE: NICOLAS ALFONSO MARTINEZ OCHOA

LIBRO DE CONTROL FITOSANITARIO: ICA - CESAR

FECHA DE VISITAS DE INSPECCION: **D 10 M** 10 **A** 2018

FECHA DE EXPEDICION DEL REGISTRO: **D** 19 **M** 12 **A** 2018

VALIDO HASTA: INDEFINIDO

OBSERVACIONES: Resolución Ica seccional Cesar No 000388888 (19/12/2018)

RAFAEL FRANCISCO MURGAS ARZUAGA
GERENCIA SECCIONAL ICA CESAR

ICA – N Y P – RD – 1999 1999 – Imprenta Nacional de Colombia – 80482 DO – 07 – 84 – FORMA 3 - 645

FUNDACION AGUA LUNA

NIT: 900.345.569-4

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0082 DE 2022

RACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOG

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015

Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas

Fecha	Tercero	Detalle	Valor
28/04/2023	Trefilados de Colombis SAS	Compra de insumos VD24916	66.930.000
26/06/2023	Oscar Cuello Campo	Postes Factura No FE3	169.759.774
29/06/2023	Arquimedes Rafael Alarza Solano	Mano de obra	9.497.386
29/06/2023	Jorge Luis Lopez Dangond	Mano de obra	9.497.386
26/06/2023	Edwin Sadith Amin Pinto	Herramientas	1.704.668
Total realizar protección de las plantaciones forestales establecidas			**257.389.215**

lizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciac

Fecha	Tercero	Detalle	Valor
04/04/2023	Ecotec	Mano de obra	136.799.585
29/06/2023	Andreina Cardenas	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Moises Augusto Parodi Zuñiga	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Heimar Jose Fernandez Fragozo	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Ramiro Rafael Mejia Hernandez	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Osval Jacob Ramirez Acosta	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Liliana Carolina Valencia Caldera	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Sorena Leonor Florez Urdiales	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Rosaura Guerra Rodriguez	Mano de obra	13.973.023
06/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 129	90.000.000
07/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 131	38.880.000
14/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 133	75.600.000
06/06/2023	Agropaisa S.A.S	Insumos factura No E03123474	167.335.100
26/06/2023	Victor Uriel Garcia Zuluaga	Herramientas factura ELEC 2139	23.588.250
26/06/2023	Segundo Ezequiel Solano	Transporte de insumos	13.000.000
29/06/2023	Rafael Tobias Sarmiento	Transporte de insumos	13.364.504
Total Realizar el establecimiento de plantaciones forestales			**670.351.622**

TOTAL **927.740.837**



Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas

Fecha	Tercero	Detalle	Valor
28/04/2023	Trefilados de Colombis SAS	Compra de insumos VD24916	66.930.000
26/06/2023	Oscar Cuello Campo	Postes Factura No FE3	169.759.774
29/06/2023	Arquimedes Rafael Alarza Solano	Mano de obra	9.497.386
29/06/2023	Jorge Luis Lopez Dangond	Mano de obra	9.497.386
26/06/2023	Edwin Sadith Amin Pinto	Herramientas	1.704.668
Total realizar protección de las plantaciones forestales establecidas			**257.389.215**

TREFILADOS® DE COLOMBIA S.A.S.
Tenemos Presencia Internacional

NIT: 830058315-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 9061 DICIEMBRE 10 DE 2020
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
AUTORETENEDORES DE ICA
18764042368564 de 2023-01-02
del VAD22163 al VAD30000

Agencia: Valledupar
Crr 7 A No 25 A -126
TELS. 582 1717/ 582 8391

Actividad Económica 2410 *Industrias del Acero*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: VAD 24916

SEÑORES:	FUNDACION AGUA LUNA	NIT	900.345.569-4
DIRECCIÓN:	CL 15 No 13-26	FECHA:	2023/04/28
TELÉFONO:	3002049603	VENCE:	2023/04/28
CIUDAD:	BARRANCAS	VENDEDOR:	MERCADEO VPAR
PEDIDO:	006017346	FORMA DE PAGO:	CONTADO

	CODIGO	PRODUCTO	CANT	BOD.	UNIDAD	PRECIO UNIT.	DTO%	IVA %	TOTAL
1	14003	ALAMBRE PUAS 16.5 X 400 VAQUERO	308	06	ROLLO	$176,450.59	00.00	19	$54,352,941.18
2	36003	GRAPA CERCA VAQUERO 1 X 9 X25	12	06	CAJA	$157,563.03	00.00	19	$1,890,756.30

PESO TOTAL: 4,225.00 kl

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIEBTOS TREINTA MIL PESOS

OBSERVACIONES: PRECIO NETO PAGO ANTICIPADO

RECIBÍ A SATISFACCION:

		SUBTOTAL:	$56,243,697.48
		DTO:	$0.00
RETE ICA 0.0 :	$0	IVA:	$10,686,302.52
RETE FTE 0.0 :	$0	TOTAL:	$66,930,000.00

La factura se considera Aceptada por el comprador, si no existe reclamo alguno en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la mercancía y de este documento, según el caso, bien sea mediante reclamo por escrito dirigido a cartera@treficolsas.com o por medio de nuestra plataforma de aceptación de facturas que recibe al correo electrónico registrado en nuestra base de datos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión. Recibida la presente factura el comprador o el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el documento y se obliga a pagar según las condiciones pactadas aquí. Todo cheque devuelto genera sanción del 20% de acuerdo con el artículo 731 del Código de Comercio. Los intereses de mora causados por el no pago de la presente factura serán los máximos permitidos por ley. Una vez aceptada la factura se autoriza expresamente a TREFILADOS DE COLOMBIA SAS a consultar y reportar información en las bases de datos de las centrales de riesgos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. Por favor consignar a las siguientes cuentas corrientes a nombre de Trefilados de Colombia S.A.S.: Bancolombia 04602877247 - Banco de Bogotá 054068382 - Banco BBVA 691002869 - Banco Davivienda 001569999855 - Banco de Occidente 253023956 - Banco Popular 110042114223 - Banco Agrario 008500101137 - Banco Itaú 006354658 - Banco Caja Social 21002625084 - Vía Baloto Convenio: 959595-3952 – Efecty Convenio: 3952. Por favor informar el pago de su factura al correo cartera@treficolsas.com y a su asesor comercial.

CUFE: 2b8a7316236954f094466186c25f09ec582f0896440166aa2c663235a1e5f053908a13015781006bffee7516e2c5a708

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Registro: 2023/04/28 9:40:41

Impreso por: Software y Servicios Informaticos SAS. Proveedor Tencológico: The Factory HKA Colombia SAS. Nombre del SW: TFHKA_CO Nit. 900.390.126-6

OSCAR ALBERTO CUELLO CAMPO
NIT: 77024481-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 10 7 68, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 6053157259
Email. ocuelloc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764049536746 válida desde 2023-05-26 hasta 2023-11-26 rango desde FE1 hasta FE1000.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900345569
Dirección: CL 15 13 26 Barrancas, Guajira, Colombia, CP 200001
Teléfono: 3003049603
Email: fundagualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:39:18**
FECHA FIRMADO:	**28/06/2023 11:39:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2023	28	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	003	VENTA DE MADERA VENTA DE 6788 PUNTALES DE 210 CMTS DE LARGO X 8 CMTS DE ANCHO A RAZON DE $21.675 CADA UNO	WSD	7.832,00	$20.643,00	5,00	0,00	$161.675.976,00

Notas:

SON: (ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos)
CUFE: 6f100e07fdad97272f9a26191c9b67bfff608da46bc5209edf07366ddf18ea992c587c6c3636865f8ca720fe6e3d2818

Subtotal:	$161.675.976,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.083.798,00
Total:	$169.659.774,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$161.614.047,00	5,00%	$8.080.702,00

Firma Digital: SKHmU20D3olgqZOlMxunxKm0YU68zgMCvCo2XI5C+9K41/gBJl/w6VGo/HVrVRFE QKlPutoHfLoPn0FurU1GAsIzPNiYgOszkVt2kil/6RsHPT6Ikn 3WbL872iRRDtfs ihTJH/sLu3IJkbmWjAgIoRIX77SGkAYvwWGNJpqh4tXuELgMdIFg28vHt2l2jDAa l04UR/4SHYC8DEA9uFHjjX9vEplZNIIZ6TY Ns4PqrZBejeeKKZLQUioMvJ83kbT7 3rubeCkQ+x9C7XTW4xabHz7ICJ/M+g9o4wG5SVevB7TrbgWH25Gh98LOQOwG7BJi e8wYm72O7IA4FZ0WKsx6 hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	**Valor:**	**$ 9.497.386**
pagado a: Jorge Luis Lopez Dangond		
Por concepto de: Mano de obra ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trecientos ochenta y seis pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Jorge L. Lopez Dangond

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 17.973.339 De Villanueva**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

JORGE LUIS LOPEZ DANGOND
CC: 17.973.339 expedida en Villanueva

LA SUMA DE: **9.497.386**

POR CONCEPTO DE: Mano de obra ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trecientos ochenta y seis pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Jorge L. Lopez Dangond

JORGE LUIS LOPEZ DANGOND
CC: 17.973.339 expedida en Villanueva

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14780370061

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
1 7 9 7 3 3 3 9	8	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17973339	1 9 8 6 1 2 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Villanueva 8 7 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	DANGOND	JORGE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Villanueva 8 7 4

41. Dirección principal: CL 8 11 29 BRR LAS DELICIAS

42. Correo electrónico: jorgelopezagropecuario@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 0 0 2 7 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 1	1 9 9 6 0 3 2 0	7 4 9 0	1 9 9 6 0 3 2 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021-08-19 17:12:22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ DANGOND JORGE LUIS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-08-2021 05:18:22PM

Powered by CamScanner

Agua Luna

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira, 26 de junio del 2.023	**Valor:**	**$ 9.497.386**

pagado a: Arquimedes Rafael Alarza Solano

Por concepto de: Mano de obra ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trecientos ochenta y seis pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Arquimedes Alarza

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 84.037.511 de Maicao**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

ARQUIMEDES RAFAEL ALARZA SOLANO
CC: 84.037.511 expedida en Maicao

LA SUMA DE: **9.497.386**

POR CONCEPTO DE: Mano de obra ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trecientos ochenta y seis pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Arquimedes Alarza

ARQUIMEDES RAFAEL ALARZA SOLANO
CC: 84.037.511 expedida en Maicao



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 84.037.511
ALARZA SOLANO
APELLIDOS
ARQUIMEDES RAFAEL
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1966
MAICAO
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-NOV-1985 SAN JUAN DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	1.704.668
pagado a: Edwin Sadith Amin Pinto		
Por concepto de: Herramientas, ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Un millón setecientos cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	Cheque No.	Banco:	
			Sucursal:	Efectivo	x
			Firma y sello del beneficiario		

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Edwin Amin Pinto

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 84.007.225 de Barrancas**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Edwin Sadith Amin Pinto
CC: 84.007.225 de Barrancas

LA SUMA DE: **1.704.668**

POR CONCEPTO DE: Herramientas, ítem realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Un millón setecientos cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Edwin Amin Pinto

Edwin Sadith Amin Pinto
CC: 84.007.225 de Barrancas


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
84.007.225
AMIN PINTO
BENJAMIN SADIT





Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion

Fecha	Tercero	Detalle	Valor
04/04/2023	Ecotec	Mano de obra	136.799.585
29/06/2023	Andreina Cardenas	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Moises Augusto Parodi Zuñiga	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Heimar Jose Fernandez Fragozo	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Ramiro Rafael Mejia Hernandez	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Osval Jacob Ramirez Acosta	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Liliana Carolina Valencia Caldera	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Sorena Leonor Florez Urdiales	Mano de obra	13.973.023
29/06/2023	Rosaura Guerra Rodriguez	Mano de obra	13.973.023
06/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 129	90.000.000
07/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 131	38.880.000
14/06/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 133	75.600.000
06/06/2023	Agropaisa S.A.S	Insumos factura No E03123474	167.335.100
26/06/2023	Victor Uriel Garcia Zuluaga	Herramientas factura ELEC 2139	23.588.250
26/06/2023	Segundo Ezequiel Solano	Transporte de insumos	13.000.000
29/06/2023	Rafael Tobias Sarmiento	Transporte de insumos	13.364.504
Total Realizar el establecimiento de plantaciones forestales			**670.351.622**

ECOTEC CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT: 900539574-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 4 # 6 36, San Juan Del Cesar, La Guajira, Colombia

Tel. 3166109788

Email. andresbrisson10@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764046344956 válida desde 2023-03-22 hasta 2024-03-22 rango desde FE2 hasta FE200.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900345569
Dirección: CL 15 13 26, Barrancas, La Guajira, Colombia
Teléfono: 3002049603
Email: fundagualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE2**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:32:47**
FECHA FIRMADO: **04/04/2023 16:32:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2023	04	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	COSTO DIRECTO Mano de obra, Insumos y Transporte de insumos	C62	1,00	$252.240.734,00		0,00	$252.240.734,00
2	002	ADMINISTRACIÓN	C62	1,00	$63.060.184,00		0,00	$63.060.184,00
3	003	IMPREVISTOS	C62	1,00	$2.522.407,00		0,00	$2.522.407,00
4	004	UTILIDAD	C62	1,00	$10.089.629,00	19,00	0,00	$10.089.629,00

Notas:

SON: (trescientos veintinueve millones ochocientos veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 9060f233163fe4832166b67efd20d092ff39c5f2d61a3d9104da90689d67d976c38d275050e8219bf14bce3c51cef639

Subtotal:	$327.912.954,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.917.030,00
Total:	$329.829.984,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.089.629,38	19,00%	$1.917.030,00

Insumos = 153.965.432
Transporte: 39.064.968
Mano de obra = 136.799.585

Firma Digital: YnQ7xtaOLGCVxJYqcTKfFuMmS3yJ1nl9trEof+W8TQg/gcHjBxzmv/ZaRcl/Df3l
HYU1ZEc2rqxKbIYvEOL4+uWK2sWmH62CnEuX7JDXxm2dQHm9aN
TZn/8184u+uEx5 FIqe0ayyvJ5yPPj5PVB6lqgwOhlvVYMjs7Tr1hZwRw4A0/t6nuMBdbVVoYUlMyU5 m8VyebsTwDuGwuNYNp3u4K0Nx90FcE2MNul
7OIp8lVUE/HTw5q4cGkrwOF8sAUro KevtdE3TlS6YiNJ2x4MillfMNu7TH2Ujfr eJc2lMH3s3P8Feb5DOnDDfp2YJvNSh cgNIY8MYn87I9RcPHNtn
xw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023

pagado a: Andreina Del Carmen Cardenas Barrios

Por concepto de: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Andreina Cardenas

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 1.124.057.620 de Maicao**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

ANDREINA DEL CARMEN CARDENAS BARRIOS
CC: 1.124.057.620 de Maicao

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Andreina Cardenas
ANDREINA DEL CARMEN CARDENAS BARRIOS
CC: 1.124.057.620 de Maicao

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14748082014

(415)7707212489364(8020) 000014748082014

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 2 4 0 5 7 6 2 0

6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 1 2 4 0 5 7 6 2 0

27. Fecha expedición: 2 0 1 3 1 0 1 8

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: La Guajira 4 4

30. Ciudad/Municipio: Maicao 4 3 0

31. Primer apellido: CARDENAS

32. Segundo apellido: BARRIOS

33. Primer nombre: ANDREINA

34. Otros nombres: DEL CARMEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: La Guajira 4 4

40. Ciudad/Municipio: Maicao 4 3 0

41. Dirección principal: CL 15 - 2 CRR LA MAJAYURA

42. Correo electrónico: andreinabcar75@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 4 8 2 0 2

45. Teléfono 2: 3 2 2 6 4 1 1 3 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 0 0 8 1 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 1 0 3 1 8

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades: 3

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, calidades y atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2021 - 03 - 18 / 10 : 34: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDENAS BARRIOS ANDREINA DEL CARMEN

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 18-03-2021 10:34:06

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023

pagado a: Moises Augusto Parodi Zuñiga

Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 84.036.864 de San Juan del C**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

MOISES AUGUSTO PARODI ZUÑIGA
CC: 84.036.864 de San Juan del Cesar


LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

MOISES AUGUSTO PARODI ZUÑIGA
CC: 84.036.864 de San Juan del Cesar

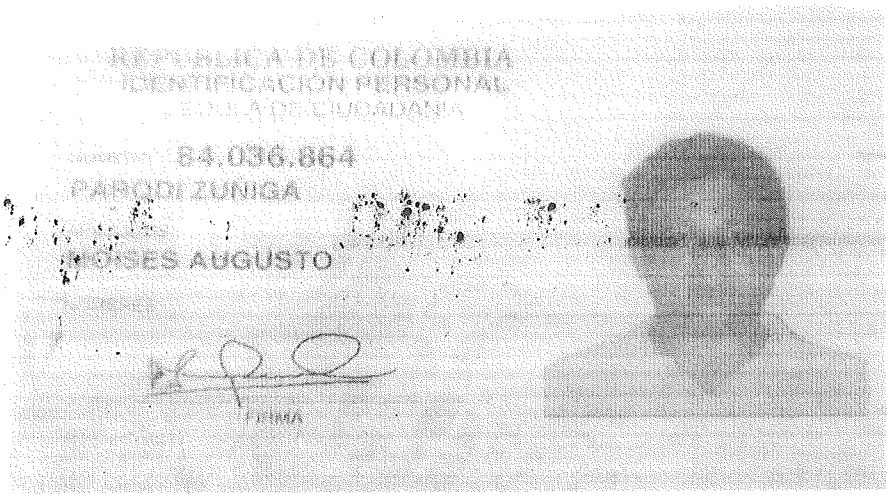
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
84.036.864
PARODI ZUÑIGA
MOISES AUGUSTO
FIRMA


01-OCT-1964
SAN JUAN DEL CESAR
(LA GUAJIRA)
1.70
O+
M
12-DIC-1983 SAN JUAN DEL CESAR

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023
pagado a: Heimar Jose Fernandez Fragozo		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	Cheque No.	Banco:
			Sucursal:	Efectivo x
			Firma y sello del beneficiario	

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Heimar Jose

C.C [x] NIT. [ ] No. 1.193.398.380 de Fonseca

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Heimar Jose Fernandez Fragozo
CC: 1.193.398.380 de Fonseca

LA SUMA DE: **13.973.023**


POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Heimar Jose

Heimar Jose Fernandez Fragozo
CC: 1.193.398.380 de Fonseca

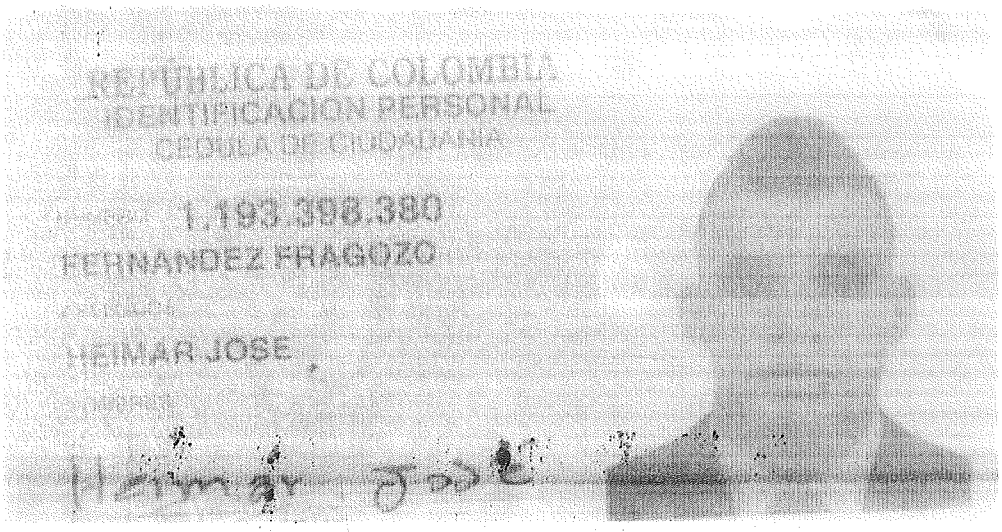
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.193.398.380
HERNANDEZ FRAGOZO
HEIMAR JOSE


23-MAR-2000
FONSECA
(LA GUAJIRA)
1.78
A+
M
16-ABR-2018 BARRANCAS

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023

pagado a: Ramiro Rafael Mejia Hernandez

Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar, y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 5.158.783 de Barrancas**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Ramiro Rafael Mejia Hernandez
CC: 5.158.783 de Barrancas

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Ramirb Rafael Mejia Hernandez
CC: 5.158.783 de Barrancas

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.158.783

MEJIA HERNANDEZ

APELLIDOS

RAMIRO RAFAEL

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1949

BARRANCAS

(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUN-1971 FONSECA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-4800400-88148351-M-0005158783-20000615 01812 0616 0A 02 1833230005

Agua Luna

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023

pagado a: Osval Jacob Ramirez Acosta

Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Osval Ramirez

Elaborado	Aprobadó	Contabilizado

C.C x **NIT.** **No. 17.953.047 de Fonseca**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Osval Jacob Ramirez Acosta
CC: 17.953.047 de Fonseca

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Osval Ramirez

Osval Jacob Ramirez Acosta
CC: 17.953.047 de Fonseca



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.953.047
NUMERO
RAMIREZ ACOSTA
APELLIDOS
OSVAL JACOB
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-AGO-1967
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
26-AGO-1985 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

A-4500700-68134285-M-0017953047-20050323 0068605082B 02 158789120

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023
pagado a: Liliana Carolina Valencia Caldera		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villahueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Liliana Valencia

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C x **NIT.** ☐ **No. 1.192.921.504 de Barrancas**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Liliana Carolina Valencia Caldera
CC: 1.192.921.504 de Barrancas

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Liliana Valencia

Liliana Carolina Valencia Caldera
CC: 1.192.921.504 de Barrancas

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.192.921.504

VALENCIA CALDERA

APELLIDOS

LILIANA CAROLINA

NOMBRES

Liliana Valencia

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1995

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 — ESTATURA

O+ — G.S. RH


F — SEXO

08-ABR-2015 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-4800400-00708746-F-1192921504-20150525 0044301741A 1 43256802

Agua Luna

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023

pagado a: Sorena Leonor Florez Urdiales

Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**

La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	Cheque No.	Banco:	
			Sucursal:	Efectivo	x
			Firma y sello del beneficiario		

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Lorena Florez

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 1.121.333.163 de Villanueva**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Sorena Leonor Florez Urdiales
CC: 1.121.333.163 de Villanueva

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;


Sorena Florez

Sorena Leonor Florez Urdiales
CC: 1.121.333.163 de Villanueva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.333.163
FLOREZ URDIALES
APELLIDOS
SORENA LEONOR
NOMBRES






FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1992
VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-2010 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4802000-00274226-F-1121333163-20101228 0025347845A 1 25524009

Agua Luna

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.973.023
pagado a: Rosaura Guerra Rodriguez		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion ,contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Rosaura Guarra Rodriguez

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C x **NIT.** **No. 56.098.786 de Villanueva**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Rosaura Guerra Rodriguez
CC: 56.098.786 de Villanueva

LA SUMA DE: **13.973.023**

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones novecientos setenta y tres mil veintitrés pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Rosaura Guerra Rodriguez
Rosaura Guerra Rodriguez
CC: 56.098.786 de Villanueva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

56.098.78x
VICENTA RODRIGUEZ

GUAJIRA



29-SEP-1982
VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)

1.57 O+ F

17-MAY-2001 VILLANUEVA

EBERTO ANTONIO OLIVO PEÑALOZA
NIT: 8673480-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 4 CL 18 A SEC ANTIGUO VIVERO MUNICIPAL, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3126881696
Email. elolivobendito@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764041297124 válida desde 2022-12-14 hasta 2023-06-14 rango desde FVE60 hasta FVE500.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900345569
Dirección: Cl 15 13 26, Barrancas, La Guajira, Colombia
Teléfono: 30020490603
Email: fundaqualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 06/07/2023
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE129**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:56:02**
FECHA FIRMADO: **06/06/2023 10:56:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2023	06	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0104	PLÁNTULA DE CORAZÓN FINO	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
2	0109	PLÁNTULA DE IGUAMARILLO Altura: 50-60 cm	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
3	0592	ROBLE MORADO	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
4	0438	PLANTULA DE CAÑAGUATE	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
5	0117	PLANTULA DE CEIBA LECHOSA	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
6	0102	PLÁNTULA DE GUAYACÁN Altura: 50 cm	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
7	0111	PLANTULA DE GUACIMO	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
8	0115	PLÁNTULA CARRETO	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
9	0429	PLANTULA DE CEDRO Altura: 35-40 cm	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00
10	0252	MANGO DE MANZANA SIN INJERTAR Altura: 70 cm - 1 metro	94	5.000,00	$1.800,00		0,00	$9.000.000,00

Notas:

SON: (noventa millones de pesos)
CUFE: 680cf1ce386a4a619eb597ce0bd5b75f49cda92391026e3ebbbdf9726989de892954cf3b6bbf7441d887fdf4f06892ee

Subtotal:	$90.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$90.000.000,00

Firma Digital: XC1kljqqNrFXOFZnT7Iq0Bl9w98v7CkWCyMvlFjRK4OBkdI+iUHWADHkXXkcvyLD
R3xvqpJ+DlwdTKaCYGWlKxakZQ6Qc55MmLLllmqF7okmuaN1bJ
5aChYdyE0n0LAd nabvxrXpradul5FlsQhZ2Y+TqVXBTqyNZFm6llgsccn/rH22NkQ+Q2l+maLLrsQs qWoT+/hXh8y0OEkpaLQwYq4glpD/hLEyq32
E6aGLTEot5p573SKVhW9AQKT5CXRT punV91OlQPiMg6W3/NjD6gLJSsyipyyjGF40lgdPKQd4h2Zl/GqjxAP95cSuSCZC gppVvjArbqehDaJmQpU
aQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0
facturalech

EBERTO ANTONIO OLIVO PEÑALOZA
NIT: 8673480-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 4 CL 18 A SEC ANTIGUO VIVERO MUNICIPAL, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3126881696
Email. elolivobendito@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764041297124 válida desde 2022-12-14 hasta 2023-06-14 rango desde FVE60 hasta FVE500.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA YSUMINISTROS S.A.S
NIT: 900345569
Dirección: Cl 15 13 26, Barrancas, La Guajira, Colombia
Teléfono: 3002049603
Email: fundagualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 07/07/2023
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE131**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:13:11**
FECHA FIRMADO: **07/06/2023 14:13:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	06	2023	07	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0104	PLÁNTULA DE CORAZÓN FINO	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
2	0109	PLÁNTULA DE IGUAMARILLO	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
3	0592	ROBLE MORADO	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
4	0438	PLANTULA DE CAÑAGUATE	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
5	0117	PLANTULA DE CEIBA LECHOSA	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
6	0102	PLÁNTULA DE GUAYACÁN	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
7	0115	PLÁNTULA CARRETO	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
8	0111	PLANTULA DE GUACIMO	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00

Notas:

SON: (treinta y ocho millones ochocientos ochenta mil pesos)
CUFE: ca12c56c048fb67d97ec8b0cf1732fb2a593d0210b2b738ed32519585a5d2343f11c396c0a384686e688162bde31adaa

Subtotal:	$38.880.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$38.880.000,00

Firma Digital: an0dy4liSIjFybFytBfqBwhf0cxyAWKyCvcd/H6AytQBRmIXDbbUb7D8ppUsCc5W SkQ605lf7IHNwB0DUS5wBzSThN5AOAlMsTEZb1alJUecOemlwx XK5qqeHCHKsuzM KCO0lSA+IgWIJ6yDcUu0osCF9feNzAJljdA1X0w2lSkS7z8Hly/DMuDQoQU5YRb6 xq1aqSqpTQ80NLchzD4LqR001RLW8IAVZ/1 6qTM8THZqaS7FwDSNky8HlSlhHFha ac04P6xfz3oFQSBgWqhRg/Pl9YZDrAa8qlvnFfpuEtMFY1IOQxzUEacwh/fHUe2J 9+vJUiECVOGg8Or8Knkx tw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturadeco

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

EBERTO ANTONIO OLIVO PEÑALOZA
NIT: 8673480-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 4 CL 18 A SEC ANTIGUO VIVERO MUNICIPAL, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3126881696
Email. elolivobendito@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764050408859 válida desde 2023-06-14 hasta 2023-12-14 rango desde FVE133 hasta FVE500.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900345569
Dirección: CL 15 13 26, Barrancas, La Guajira, Colombia
Teléfono: 3002049603
Email: fundagualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 14/07/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE133**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:29:14**
FECHA FIRMADO: **14/06/2023 11:29:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	06	2023	14	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0104	PLÁNTULA DE CORAZÓN FINO	94	10.500,00	$1.800,00		0,00	$18.900.000,00
2	0109	PLÁNTULA DE IGUAMARILLO	94	10.500,00	$1.800,00		0,00	$18.900.000,00
3	0592	ROBLE MORADO	94	10.500,00	$1.800,00		0,00	$18.900.000,00
4	0115	PLÁNTULA CARRETO	94	10.500,00	$1.800,00		0,00	$18.900.000,00

Notas:

SON: (setenta y cinco millones seiscientos mil pesos)
CUFE: d4cd1bebab0029b2499191f01b5f7632dd3127c11c9cb065527d913bcea535a8245842f57bf50f6b6c9691551069ecca

Subtotal:	$75.600.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$75.600.000,00

Firma Digital: IhGgJ6HeZDV0q19wxiHuoFC+RjuxbFwiIYfp4LzcYxL+ZFf7JIpu52HqxaYObayj ZEQdxqfeDoDT6F4IliWerN6scLBeHxVxK/F/7QInpmzLQfxM6f q8DvjucC/P4n5X JcBWUr4oJ5rseauyOh7duh0EpvjpSOZjSqvk8roFDbsiVoTJ7vsALMBVc+VDLdQZ eeIr9MWTU2X8MUv6jU2CWIh+Mmn3/+c+mc4 d05IbHJs+LRbxxtxls4AY7IzoGgrz IQCf+AmRCQq3h2AvFIA4/JFmqurDdKChVXITrdIz0E98yYboR0IgjIKpqI0+s6kI Nk7MZuo5FVch0DJ0gFf4 Hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534 0



AGROPAISA S.A.S
NIT: 900345431
CR 35 W 71 37 BOD 59 Bucaramanga
Tel: 6378080
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: E03123474
Fecha: 2023/06/06
Hora: 09:11 a. m.
Página:

Cliente:	FUNDACION AGUA LUNA	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**		**Fecha vcto:**
NIT	900345569	48-Tarjeta Crédito	CONTADO		
Dirección:	COONJUNTO CASTELLANA 3	**Vendedor:**		**Moneda**	**Peso (KG)**
Ciudad:	Barrancas **Teléfono:** 0	RAMIREZ ESPINEL JUAN DE JESUS		PESOS	0

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	UM	LOTE	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
5521	15-15-15*50KG-YARA	YARA	173.00	BLT		$207,400.00	$0.00	$35,880,200.00	0 %	$0.00
7077	HYDROGEL * 25KG	HYDROLIFE	46.00	BLT		$823.750.00	$0.00	$57,354,000.00	0 %	$0.00
8665	CAL DOLOMITA X 50 KG	LA DOLOMITA	465.00	BLT		$30,500.00	$0.00	$14,182,500.00	0 %	$0.00
8666	ORGANIGRAN BORO 10 *20kg	EMPRESAGRO	146.00	BLT		$50,400.00	$0.00	$7,358,400.00	0 %	$0.00
9273	RAFAGA EC X 20 LITROS	INVESA	73.00	UND		$720,000.00	$0.00	$52,560,000.00	0 %	$0.00

Valor letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE *****

Notas:

Estimado cliente verifique los productos entregados en su compra, pasados 15 días calendario no se aceptan reclamaciones. Conserve su factura para cualquier reclamación. No se aceptan cambios en MEDICAMENTOS, ALIMENTOS CONCENTRADOS Y SEMILLAS.

TOTALES

Valor bruto:	**$167,335,100.00**
Descuentos:	**$0.00**
Sub-total:	**$167,335,100.00**
Impuestos:	**$0.00**
Retenciones:	**$0.00**
Total:	**$167,335,100.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Esta factura es un titulo valor, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T 773 y 774 del c.c, decreto 2242 de 2015 art. 86 ley 7676/2013 y decreto 1349 de 2016. Después de vencida esta factura se cobrará interes de mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera (art. 884 de c.c)

Consignar directamente en las siguientes cuentas corriente a nombre de Agropaisa S.A.S, Bancolombia Cta cte 30159007027 37288 // Banco Davivienda Cta cte 0484-6999-7091 // Banco de Bogota Cta cte 184146553 // Banco Agrario Cta cte 3-6001-000437-0 13386 //Banco BBVA Cta cte 199016064 // Banco Itau Corpbanca Colombia sa Cta cte 485-01833-7 // Banco Colpatria Cta cte 401003479 // Banco Popular Cta cte 110-480-24241-1 // Banco Occidente Cta cte 652-83363-3 // Banco Av Villas Cta cte 901-23774-3 // Efecty - Pse - Baloto Convenios 3807 //

Autorización Numeración de Facturación No. 18764014590880 Numeración: HABILITADA Rango desde: E03113144 hasta: E031100000 Vigencia desde: 2022/06/26 hasta: 26/12/2023 - 18 Meses

CUFE: 692c384c5d17f7ecfc7ad18038aeda897de2e6b6389305dd5acc8aaf16afeecd42905866671503b576628828c8fc01e5

FECHA DIAN: 2023-06-06 09:12:03-05:00

Recibi Conforme

Nombre:

Cedula: Firma: _____

Fecha Recibido:

RAMIREZ ESPINEL JUAN DE JESUS
Elaborado por

VICTOR URIEL GARCIA ZULUAGA Y/O FERRETERIA LA SOLUCION GARCIA
NIT 70.383.026-9
CRA 6 No.4-15 SUR
Tel: (035) 3215496201
San Juan Del Cesar - Colombia
ferresolucion20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 2139

Señores	FUNDACION AGUA LUNA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.345.569-4	**Teléfono**	(605) 3002049603 - Ext. 000	**Generación**	26/06/2023, 14:55
				Expedición	26/06/2023, 14:55
Dirección	CL 15 13 26	**Ciudad**	Barrancas -Colombia	**Vencimiento**	26/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RULA GAVILAN	260.00	4,680,000.00
2	LIMA	260.00	2,600,000.00
3	SACO PLASTICO	200.00	300,000.00
4	PALIN HOYADOR	260.00	5,460,000.00
5	CABO DE PALA	260.00	2,860,000.00
6	MANGUERA NEGRA 1/2	55.00	2,750,000.00
7	SURTIDOR	55.00	440,000.00
8	FLEXOMETRO TRAD 5 MT MACHO	121.00	1,815,000.00
9	GUANTES DE CUERO	260.00	1,560,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Veintitrés millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 23,588,250.00

Total Bruto	22,465,000.00
IVA 5%	1,123,250.00
Total a Pagar	**23,588,250.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049189251 aprobado en 20230518 prefijo ELEC desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6*1000

CUFE: 9cd8057d309ba0ac8ef27bd50e3b351ac4d47aab12a2cf1c3be5ee3ed5cf22e2c818936bd2b1999675db07642d89e98f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vay en el XML

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$. 13.000.000
pagado a: Segundo Ezequiel Solano Brito		
Por concepto de: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Trece millones de pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**

Sucursal: **Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

eseq ul el so lano

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C [x] **NIT.** [ ] **No. 17.954.510 de Fonseca**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

SEGUNDO EZEQUIEL SOLANO BRITO
CC: 17.954.510 de Fonseca

LA SUMA DE: 13.000.000

POR CONCEPTO DE: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones de pesos m/cte

ATENTAMENTE;

eSequielSolano


SEGUNDO EZEQUIEL SOLANO BRITO
CC: 17.954.510 de Fonseca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.954.510
SOLANO BRITO
APELLIDOS
SEGUNDO EZEQUIEL
NOMBRES




Ezequiel Solano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1968
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-DIC-1989 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-4800800-00613768-M-0017954510-20140922 0039644751A

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	Valor:	$ 13.364.504
pagado a: Rafael Tobias Sarmiento Ramirez		
Por concepto de: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Trece millones trecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos m/cte		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Cheque No. **Banco:**
Sucursal: **Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

C.C x **NIT.** **No. 84.042.009 de Maicao**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

RAFAEL TOBIAS SARMIENTO RAMIREZ
CC: 84.042.009 de Maicao

LA SUMA DE: **13.364.504**

POR CONCEPTO DE: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Trece millones trecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos m/cte

ATENTAMENTE;



RAFAEL TOBIAS SARMIENTO RAMIREZ
CC: 84.042.009 de Maicao

DIAN
MÁS QUE COLOMBIA MÁS NOMEDIA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14526014010

(415)7707212489984(8020) 000001452601401 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 0 4 2 0 0 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	84042009	1 9 8 1 1 1 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Maicao 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARMIENTO	RAMIREZ	RAFAEL	TOBIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Barrancas 0 7 8

41. Dirección principal
CL 20 12 D 26 BRR EL CEREZO

42. Correo electrónico fundagualuna@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 3 1 4 1 5 0	5 8 9 2 8 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 2 0 2						8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-09-2021 09:34:09AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900345569	4	FUNDACION AGUA LUNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERALD BRISSON	CL 15 No 13 26	BARRANCAS-LA GUAJIRA	5602852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	26002926	9453242954	E	2023/07/18	2023/07/04	BANCOLOMBIA	0	$7,740,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GERALD BRISSON (6 Afiliados)						$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,100			$9,280,000	$371,200			$9,280,000	$571,500		$9,280,000	$464,000
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000
1	CC	1122819595	BRISSON UCROS GERALDINE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)						$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$1,015,100			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$565,400		$8,120,000	$406,000
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (5 Afiliados)						$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$1,015,100			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$565,400		$8,120,000	$406,000
2	CE	354574	ARAGON ESTRELLA BENJAMIN	230301	27	$2,250,000	$360,000	EPS002	27	$2,250,000	$281,300	CCF30	27	$2,250,000	$90,000	14-4	27	$2,250,000	$156,600	27	$2,250,000	$112,500
3	CC	1122400298	BRISSON AMADO ARMANDO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	1065568720	FUENTES PISCCIOTY DIOSELINA GENITH	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	1064119434	GUARIN DEARMAS JOSE CARLOS	230301	27	$1,350,000	$216,000	EPS002	27	$1,350,000	$168,800	CCF30	27	$1,350,000	$54,000	14-4	27	$1,350,000	$94,000	27	$1,350,000	$67,500
6	CC	77160924	GUERRA MURGAS JAVIER ENRIQUE	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000	CCF30	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$2,200,000	$110,000

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNDACION AGUA LUNA (5 Afiliados)						$6,729,000	$1,076,700			$9,439,000	$1,180,000			$9,439,000	$377,600			$9,439,000	$582,600		$9,439,000	$472,000
Centro de Trabajo: BARRANCAS RIESGO 5 (4 Afiliados)						$5,569,000	$891,100			$8,279,000	$1,035,000			$8,279,000	$331,200			$8,279,000	$576,500		$8,279,000	$414,000
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (4 Afiliados)						$5,569,000	$891,100			$8,279,000	$1,035,000			$8,279,000	$331,200			$8,279,000	$576,500		$8,279,000	$414,000
7	CC	19486085	BRISSON MENDOZA GERALD EMANUEL	230201	30	$3,249,000	$519,900	EPS005	30	$3,249,000	$406,200	CCF30	30	$3,249,000	$130,000	14-4	30	$3,249,000	$226,200	30	$3,249,000	$162,500
8	CC	12724202	GARANTIVA BRUGES JUSTO PASTOR		0	$0	$0	EPS005	30	$2,710,000	$338,800	CCF30	30	$2,710,000	$108,400	14-4	30	$2,710,000	$188,700	30	$2,710,000	$135,500
9	CC	70531147	GONZALEZ DIAZ JUAN DAVID	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
10	CC	84042009	SARMIENTO RAMIREZ RAFAEL TOBIAS	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC1	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: BARRANCAS RIESGO I (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000
11	CC	1122815954	BRISSON UCROS JESSICA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF30	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
Total	**Afiliados(11)**					$16,009,000	$2,561,500			$18,719,000	$2,340,100			$18,719,000	$748,800			$18,719,000	$1,154,100		$18,719,000	$936,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900345569	4	FUNDACION AGUA LUNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERALD BRISSON	CL 15 No 13 26	BARRANCAS-LA GUAJIRA	5602852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	26002926	9453242954	E	2023/07/18	2023/07/04	BANCOLOMBIA	0	$7,740,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,561,500	$0	$0	$2,561,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$908,800	$0	$0	$908,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,132,800	$0	$0	$1,132,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$519,900	$0	$0	$519,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,154,100	$0	$0	$1,154,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,154,100	$0	$0	$1,154,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$748,800	$0	$0	$748,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	$748,800	$0	$0	$748,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,340,100	$0	$0	$2,340,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$450,100	$0	$0	$450,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$561,600	$0	$0	$561,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$561,600	$0	$0	$561,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$374,400	$0	$0	$374,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$374,400	$0	$0	$374,400
TOTAL				**11**	**$7,740,500**	**$0**	**$0**	**$7,740,500**

2023/07/05 08:45 AM
