INFORME DE INTERVENTORIA 06
PERÍODO: JULIO 01 AL 31 DE 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA,
CONTRATO 092 DE 2022

INTERVENTOR: ENRIQUE ZIMMERMAN ORTIZ
E-mail: Enriquezimmerman100@gmail.com

RIOHACHA, JULIO 31 DE 2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe No 06 de interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato No 092 de 2022 con objeto de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, suscrito entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, corresponde a las actividades ejecutadas por ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, delegado como interventor mediante el contrato No 092 de 2022, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el grado de consistencia de los mismos.

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias de CORPOGUAJIRA, de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna, además, describe las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 01 al 31 de julio de 2023.

La Interventoría pretende con su trabajo, asegurar el cumpliendo de los requisitos implícitos y explícitos contractuales, asegurar la permanente optimización de procesos efectivos que respondana las necesidades de los beneficiarios.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

TITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015", contempla actividades de establecimiento de plantaciones, aislamiento de plantaciones forestales, monitoreo y seguimiento de la restauración y de parcelas de monitoreo, talleres de socialización, sensibilización ambiental y acuerdos de conservación en las comunidades.

1.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.

La población objetivo del proyecto "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015", está determinada primero, por la población del área de influencia directa, que es la población de las veredas perteneciente a los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva y por otro lado, está la población beneficiaria indirecta, que es la población general de los cinco municipios involucrados en el proceso.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.3.1. Objetivo general

Restaurar los ecosistemas forestales de las Rondas hídricas y cuenca del río ranchería y otros, arroyos, quebradas y afluentes de agua en las áreas protegidas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva, La Guajira.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Aumentar la cobertura vegetal que favorezca la regulación natural del recurso hídrico en las Rondas hídricas y cuencas del rio Ranchería y otros en las áreas protegidas y de las zonas de influencia.
- Fortalecer el conocimiento de los pobladores aledaños a las rondas hídricas y cuenca del rio ranchería y otros en las áreas protegidas, sobre el cuidado en las áreas protegidas y conservación del entorno.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 082 de 2022

TITULO II: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

2. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 082 DE 2022.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL


2.1.1. Información del contrato

Contrato No.	1	**FECHA**	16/12/2022	**Modalidad de Contratación**	LOP	**Entidad Contratante**	CORPOGUAJIRA	
Contratista	Fundación Agua Luna						**NIT**	900345669-4
Rep. Legal	Gerald Brisson Mendoza						**CC**	19.486.085
Objeto del Contrato	REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015							
Supervisor	Luis Buelvas Hernández							
Plazo Inicial	14 meses		**Acta de Inicio**	01/02/2023		**Valor Inicial Contratado**	$ 2.783.226.207,00	
Plazo Adicional	0 meses		**Fecha Finalización**	30/03/2024		**Valor Adicional**		
Plazo Total	14 meses		**Fecha Acta Final de Obra**			**Valor Total**	$ 2.783.226.207,00	
Tiempo Trascurrido del Contrato	6 meses		**Fuente de financiación**	Sistema General de Regalías (SGR)		**Valor del Anticipo**	$1.391.613.103,50	
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**	

Porcentaje de Ejecución Física		**Porcentaje de Ejecución Financiera**		**Porcentaje de Retraso**	**Actas Parciales Suscritas**			
					No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**
Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		1	$1.536.582.270,2	$768.291.135,1	$768.291.135,1
15,93%	63,42%							

2.1.2. Localización

Este proyecto plantea desarrollar actividades en parte de las microcuencas de los ríos ranchería, el molino, arroyos y afluentes de agua en las áreas protegidas, específicamente en los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva, La Guajira.
El departamento de La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia, está localizado en la parte norte del país y pertenece al grupo de departamentos de la Región Caribe colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del César y al suroeste con el departamento del Magdalena. El territorio de la Guajira está constituido por la península de La Guajira, en su centro por una bajiplanicie, al sur con parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la planicie aluvial de los ríos Ranchería y César.

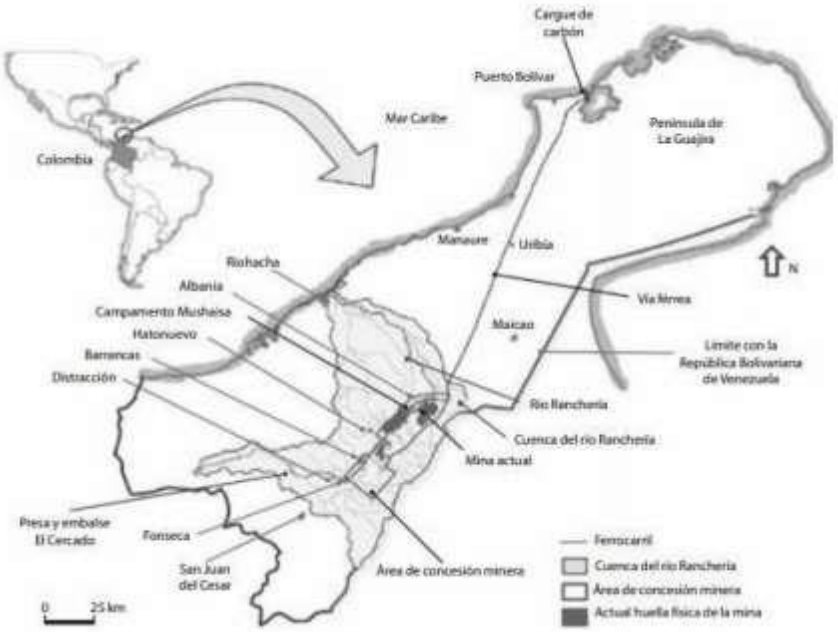

Mapa 1: Localización proyecto.
Fuente: Corpoguajira.

2.1.3. Actividades desarrolladas por la interventoría.

Para el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo las actividades que a continuación se relacionan:

- **Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.**

Durante el mes de Julio, el contratista de obra no tuvo avance en la ejecución de esta actividad, según lo verificado por esta interventoría el contratista avanzo en labores de trochado, ahoyado, transporte y entrega de materiales para continuar con la instalación del aislamiento pendiente por instalar. Esta interventoria en uso de sus facultades sigue presente y al tanto de todas las labores realizadas en el marco del cumplimiento del contrato de obra.

- **Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.**

Durante el mes de julio esta interventoría realizo el respectivo acompañamiento y seguimiento al proceso de establecimiento de plantaciones forestales en las zonas degradadas.

La interventoría realizo la verificación del estado del material vegetal a utilizar en el proceso de establecimiento de plantaciones encontrando que dentro de las especies vegetales que se utilizaron para la siembra están; Iguamarillo, Guayacán, Guásimo, Cañahuate, Roble morado, Corazón fino, Ceiba lechosa y Carreto. Se evidencio en este material vegetal un buen estado físico y fitosanitario y un tamaño entre 30 cm y 70 cm lo que es óptimo para su desarrollo y crecimiento luego de realizada la plantación, Provenientes del Agrovivero el Olivo Bendito el cual cuenta con registro Ica No. 20-001-36.

Se pudo observar que la restauración activa se realizó en áreas previamente aisladas, donde no existe riesgos de entrada de animales y sin la presencia de tensionante.

Se valido entonces que durante el mes de junio la fundación Agua Luna como responsables de la ejecución del contrato de obra realizo el establecimiento de 56 Hectáreas de siembra, dado que se presentaron lluvias y se contó con condiciones favorables de humedad en el suelo, aplicando hidrorretenedor, con el fin de minimizar el porcentaje de mortalidad una vez se presentan condiciones adversas.

Se constato el establecimiento de cuatrocientos (400) individuos de especies forestales nativas amenazadas y propias del bosque seco por hectárea, bajo un trazado aleatorio y/o donde la presencia de claros. Cumpliendo con las especificaciones técnicas dadas por el contrato, referente a distancia entre árboles, utilización de insumos como son fertilizante, hidro retenedor, correctivos, micro elementos e insecticidas, entre otras.

En la siguiente tabla, se relaciona el avance de la actividad.

RELACION PLANTACIONES ESTABLECIDAS							
Municipio	Sector	Propietario	Nombre del predio	Area sembrada (Hras)	Especies sembradas	Coordenadas	
						N	W
Hatonuevo	Los remedios	Arquímedes Alarza	La granja	26	Corazón fino, iguamarillo, Roble morado, Cañahuate, Ceiba lechosa, Guayacán, Carreto, Guásimo	11° 5'46.77"	72°31'35.30"
Villanueva	Potrero Grande	Rosaura Guerra		8	Iguamarillo Roble morado Corazón fino Carreto	10°34'36.72"	72°55'40.26"
Barrancas	Las Pavas	Ramiro Mejía Ortiz	La unión	10	Corazón fino, iguamarillo, Roble morado, Cañahuate, Ceiba lechosa, Guayacán, Carreto, Guásimo	10°52’42,6”	72°42’21,4”
Barrancas	Las Pavas	Juan Carlos Mindiola	Los Martirios	12		10°51’28,4”	72°41’21,7”
			TOTAL	**56**			

Tabla 3: Relacion establecimiento de plantaciones.





Fotos 1 y 2. Establecimiento de plantaciones en el predio de Arquimedes Alarza, municipio Hatonuevo.




Fotos 3 y 4. Establecimiento de plantaciones predio Juan Carlos Medina, municipio de Barrancas.




Fotos 5 y 6. Establecimiento de plantaciones predio Ramiro Mejia, municipio de Barrancas.




Fotos 7 y 8. Establecimiento de plantaciones predio Rosaura Guerra, municipio de Barrancas

2.1.4. Estado actual del proyecto.

En el período que abarca el presente informe el proyecto de rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de hatonuevo, barrancas, fonseca, san juan del cesar y Villanueva, departamento de la guajira bpin 20223201010015, se encuentra en estado de ejecución.

Hasta la fecha de ejecución del informe No 06, se refleja un avance de ejecución en tiempo del **63,43%.**, quedando por ejecutar el **36,58%.**

2.1.5. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	Has	726	$ 2.120.058,00	$1.539.162.108,00
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	Km	28	$16.233.890,00	$454.548.920,00
3	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Unid.	8	$ 1.299.740,00	$10.397.920,00
4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Núm.	1	$ 49.798.828,37	$49.798.828,00
5	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración.	Unid.	1	$ 74.885.200,00	$74.885.200,00
6	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Unid.	8	$ 500.000,00	$ 4.000.000

Tabla 4: Características del contrato No 082 de 2022.

2.1.6. Relación de ítems no previstos y adicionales.

A la fecha no se han presentado ítems no previstos y/o adicionales en el contrato 082 de 2022.

2.1.7. Seguimiento al cronograma de ejecución.

CONTRATO No.	082 DE 2022										
OBJETO	"REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015"										
PERIODO INFORMADO	JULIO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	PONDERADO	AVANCE JULIO	%AVANCE JUNIO	AVANCE ACUMULADO	%AVACE ACUMULADO	%POR EJECUTAR
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	Has	726	$2.120.058,00	$1.539.162.108,00	72,17%	56	5,57%	419	41,65%	58,35%
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	Km	28	$16.233.890,00	$454.548.920,00	21,31%	0	0,00%	23	17,51%	82,49%
3	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Unid.	8	$1.299.740,00	$10.397.920,00	0,4875%	0	0,00%	4	0,24%	99,76%
4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Núm.	1	$49.798.828,37	$49.798.828,00	2,33%	0	0,00%	1	2,33%	97,67%
5	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración.	Unid.	1	$74.885.200,00	$74.885.200,00	3,51%	0,12	0,42%	0,48	1,69%	98,31%
6	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Unid.	8	$500.000,00	$4.000.000	0,1875%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%
								5,99%		**63,42%**	**36,58%**

Tabla 5: Avance físico del contrato No 082 de 2022.

De acuerdo a la programación de obra, presentada por el contratista se tiene que a corte de 31 de julio estaba programado el **15,93%** de las actividades, sin embargo, presenta una ejecución del **63,42%**, lo que indica que se logró superar el retraso existente el periodo pasado y además se consiguió por parte del contratista obtener un avance significativo en la ejecución de la actividad.

2.1.8. Dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto.

En el período que abarca el presente informe ya superadas las dificultades el contratista aprovecho las predicciones de lluvias y las lluvias durante el mes de julio para adelantar en un 50% las áreas de siembras establecidas en el contrato, además se logró reforzar las cuadrillas de trabajo y aprovechando que el mes anterior se distribuyó el material para la instalación del aislamiento se logró también avanzar en la construcción del aislamiento superando lo programado para el mes de junio.

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

2.2.1. Recurso humano del contratista

A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 082 de 2022:

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ROL EN EL PROYECTO
Juan David González	Ingeniero forestal	Ingeniero forestal
Justo Garantiva	Ingeniero Agrónomo	Coordinador
Xiomara González	Trabajador social	Trabajador social
Javier Guerra Murgas	Técnico operativo	Técnico Operativo
Gerald Brisson Mendoza	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo
Geraldine Brisson Ucros	Secretaria	Secretaria
Rafael Tobías Sarmiento	Conductor	Conductor

Tabla 6: Características del contrato No 082 de 2022.

2.2.2. Garantías.

POLIZAS DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.	RIESGO/AMPARO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
BERKLEY INTERNATIONAL	18628 63608	Cumplimiento del contrato	$ 278.322.620,70	16/12/2022	15/02/2025

SEGUROS COLOMBIA NIT: 900.814.916-1		Calidad del servicio	$139.161.310,35	15/02/2024	15/02/2025
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$139.161.310,35	16/12/2022	15/08/2024
		Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones	$139.161.310,35	16/12/2022	15/02/2025
		Aprobación corporación (Corpoguajira)		**10/01/2023**	

Tabla 7: Pólizas suscripción del contrato No 082- de 2022.

2.2.3. Subcontratos.

A la fecha 31 de julio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

2.2.4. Anticipos.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
No	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**%**
1	Mano de obra	$706.893.410	50,80%
2	Insumos	$566.267.277,50	40,69%
3	Compra de equipos y herramientas	$5.198.960,00	0,37%
4	Transporte	$113.253.456,00	8,14%
	TOTAL	**$1.391.613.103,50**	**100%**

Tabla 8: Plan de inversión de anticipo.

2.2.5. Pagos realizados.

Luego de recibido el recurso de anticipo se realizó por parte del contratista los pagos relacionados a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ACTIVIDAD	COMPROMISOS Y PAGOS	RECURSOS	% DE AVANCE
1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	$1.539.162.108	Programado	$1.539.162.108	
			Comprometido	$1.539.162.108	
			Pagado	$ 774.382.317	50,31%
2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	$454.548.920	Programado	$454.548.920	
			Comprometido	$454.548.920	
			Pagado	$454.548.920	100%
3	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	$ 10.397.920	Programado	$ 10.397.920	
			Comprometido	$ 10.397.920	
			Pagado	$5.198.960	50%

4	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	$49.798.828	Programado	$49.798.828	
			Comprometido	$49.798.828	
			Pagado	$0	
5	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	$4.000.000	Programado	$4.000.000	
			Comprometido	$4.000.000	
			Pagado	$0	
TOTAL ASIGNADO		**$2.057.907.776**	**TOTAL, COMPROMETIDO**	**$2.057.907.776**	100%
			TOTAL, PAGADO	**$1.234.130.197**	**59,99%**

Tabla 9: Relación de pagos realizados.

Anexo 1. informe financiero entregado por el contratista.

2.2.6. Obligaciones laborales

En periodos anteriores, el contratista anexó las hojas de vida de todo el personal contratado.

2.2.7. Prorrogas y/o adiciones

A la fecha 31 de julio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta prorrogas y/o adiciones.

2.3. ASPECTOS TÉCNICOS

2.3.1. Planos, diseños y especificaciones técnicas

A la fecha 31 de julio de 2023 el contrato 082 de 2022 no presenta modificaciones en las especificaciones técnicas y diseños contractuales.

2.4. CONTROL DE CALIDAD.

2.4.1. Pruebas de laboratorio y/o certificado de calidad.

Para el contrato de obra No 082 de 2022, no aplican pruebas de laboratorio y/o controles de calidad.

2.5. CONTROL AMBIENTAL

Para el contrato de obra No 082 de 2022, no se requieren permisos o licencias ambientales.

2.6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES.

Se elabora informe de interventoría del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023 para el contrato de obra 082 de 2022, donde se realiza el seguimiento y acompañamiento a las labores que integran la actividad de instalación de aislamiento, dejando claro que la actividad no presenta avance físico medible, sin embargo pero verificando la realización de actividades encaminadas al cumplimiento de la instalación de los 5km pendientes por construir.

Se realizo también el seguimiento y acompañamiento al establecimiento de 56 hectáreas de las 363 hectáreas de siembras contratadas en el ítem de realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.

Para finalizar, se puede percibir que el objeto contractual de la REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20223201010015, presenta un avance del período del **5,99%**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 092 DE 2022

TITULO III: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0092 DE 2021.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

3.1.1. Información del contrato

Contrato No.	0092	**FECHA**	29/12/2021	**Modalidad de Contratación**	LOP	**Entidad Contratante**	CORPOGUAJIRA	
Contratista	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ						**NIT**	84096536-3
Rep. Legal	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ						**CC**	84.096.536
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA							
Supervisor	Luis Eduardo Buelvas							
Plazo Inicial	14 meses		**Acta de Inicio**	01/02/2023		**Valor Inicial Contratado**	$278.370.000	
Plazo Adicional	0 meses					**Valor Adicional**		
Plazo Total	14 meses		**Fecha Terminación Real**		30/03/2023	**Valor Total**	$278.370.000	
Tiempo Trascurrido del Contrato	6 Meses		**Fecha Acta Final de Obra**			**Valor del Anticipo**	$139.185.000	
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**	
Porcentaje de Ejecución Física		**Porcentaje de Ejecución Financiera**		**Porcentaje de Retraso**	**Actas Parciales Suscritas**			
					No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**
Programado	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**					
42,85%	42,85%	$119.301.428,571	$119.301.428,571					

Tabla 10: Relación de pagos realizados.

3.1.2. Estado actual del proyecto.

En el período que abarca el presente informe, la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, para el proyecto de rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de hatonuevo, barrancas, fonseca, san juan del cesar y Villanueva se encuentra en estado de ejecución con un avance del 42,85% en los 6 meses de ejecución del contrato.

3.1.3. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

Tabla 10: Características técnicas del contrato.

PRESUPUESTO																									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL														Total Mes	COSTO TOTAL AÑO
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	UND	1	5.400.000	14	5.400.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7,00	37.800.000,00
1.2	INGENIERO FORESTAL Y/O AMBIENTAL	UND	1	3.500.000	14	3.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7,00	24.500.000,00
1.3	PROFESIONAL SOCIAL	UND	1	3.000.000	14	3.000.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,25	6.750.000,00
1.4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
1.5	ASISTENTE FINANCIERO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
1.6	ASISTENTE JURIDICO	UND	1	2.450.000	14	2.450.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,50	8.575.000,00
																						94.775.000
	FACTOR MULTIPLICADOR																					**1,9**
	COSTO DIRECTO DE PERSONAL																					**180.072.500**
4.2.																						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL															COSTO TOTAL
3.1	Campero, Pick-Up, Camioneta, > 4x4	UND	1	7.397.000,0	14	7.397.000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	7,0	51.779.000
	COSTOS VEHICULOS Y TRANSPORTES																					**51.779.000**
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES PLENO	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL															COSTO TOTAL
4.1	Servicios Comunicaciones – Internet	UND	1	48.062,12	14,0	672.870	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,0	672.869,75
4.2	Edicion de informes	UND	GL	100.000,00	14,0	1.400.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,0	1.400.000,00
	GASTOS COMUNICACIONES E INFORMES DE LA INTERVENTORIA																					**2.072.870**
V	**TOTAL COSTOS**																					**233.924.370**
	COSTOS ACUMULADOS																					**233.924.370**
VI	**IVA**																					
6.1	IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO																			19%		**44.445.630**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA																					**278.370.000**

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C. 84.096.536 DE RIOHACHA

3.1.4. Relación de ítems no previstos y adicionales.

A la fecha 31 de julio de 2023 no se han presentado ítems no previstos y/o adicionales en el contrato de interventoría 082 de 2022.

3.1.5. Dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto.

En el período que abarca el presente informe ya superadas las dificultades el contratista aprovecho las predicciones de lluvias y las lluvias durante el mes de julio para seguir avanzando en las áreas de siembras establecidas en el contrato, además se logró reforzar las cuadrillas de trabajo.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

3.2.1. Garantías.

POLIZAS DEL CONTRATO					
COMPAÑÍA	**PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.**	**RIESGO/AMPARO**	**V/R. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
LA PREVISORA S.A CAMPAÑA DE SEGUROS NIT: 860002400-2	3017509 1012593	Cumplimiento del contrato	$55.674.000.00	28/12/2022	28/12/2024
		Calidad del servicio	$55.674.000.00	28/02/2024	28/02/2025
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$139.185.000.00	28/12/2022	28/12/2024
		Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones	$13.918.500	28/12/2022	28/02/2027
		Responsabilidad civil	$200.000.000	28/12/2022	28/02/2024
		Aprobación corporación (Corpoguajira)		**20/01/2023**	

Tabla 11: Pólizas suscripción del contrato No 092- de 2022.

3.2.2. Subcontratos.

A la fecha 31 de julio de 2023 el contrato 092 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

3.2.3. Anticipos.

En el contrato de interventoría No. 092 de 2022, estipula que se entregará a el contratista ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ un anticipo correspondiente al 50% del valor contratado por un valor total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($139.185.000). El uso de los recursos debe ser efectuado rigiéndose por el plan o programa de inversión presentado y avalado por la supervisión.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
No	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	Director de interventoría	$41.040.000
2	Ingeniero forestal yo ambiental	$26.600.000
3	Profesional social	$12.825.000
4	Asistente administrativo	$9.310.000
5	Asistente financiero	$9.310.000
6	Asistente Jurídico	$9.310.000
7	Transporte y vehículo	$29.855.000
8	Servicio comunicaciones – internet	$402.000
9	Edición de informes	$800.000
	TOTAL	**$139.185.000**

Tabla 12: Plan de inversión de anticipo del contrato 092 de 2022.

3.2.4. Obligaciones laborales

Pagos de seguridad social y aportes parafiscales del personal profesional contratado.

3.2.5. Prorrogas y/o adiciones

A la fecha 31 de julio de 2023 el contrato de interventoría 092 de 2022 no presenta prorrogas y/o adiciones.

3.3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.3.1. Planos, diseños y especificaciones técnicas

El contrato de interventoría 092 de 2022 no contempla planos ni diseños y no presenta modificaciones y/o observaciones en sus especificaciones técnicas y contractuales.

3.4. CONTROL DE CALIDAD

3.4.1. Pruebas de laboratorio y/o certificado de calidad.

Para el contrato de obra No 092 de 2022, no aplican pruebas de laboratorio y/o controles de calidad.

3.5. CONTROL AMBIENTAL

Para el contrato tanto de obra como el de interventoría no se requieren permisos o licencias ambientales.

3.6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

Para el mes de julio, el contrato de interventoría No 092 de 2022, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA", avanza satisfactoriamente, asimismo con el equipo técnico se continúan tomando medidas estratégicas para que las actividades contractuales se lleven a cabo en el término determinado.

Se insta al contratista por parte de la interventoría seguir realizando las labores que conlleven a tener un buen rendimiento y con esto seguir logrando un avance significativo en la ejecución del contrato.

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Interventor



Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion

Fecha	Tercero	Detalle	Valor
31/07/2023	Andreina Cardenas	Mano de obra	5.000.000
31/07/2023	Moises Augusto Parodi Zuñiga	Mano de obra	4.800.000
31/07/2023	Heimar Jose Fernandez Fragozo	Mano de obra	3.900.000
31/07/2023	Ramiro Rafael Mejia Hernandez	Mano de obra	6.744.521
31/07/2023	Osval Jacob Ramirez Acosta	Mano de obra	7.587.000
31/07/2023	Liliana Carolina Valencia Caldera	Mano de obra	9.100.000
31/07/2023	Sorena Leonor Florez Urdiales	Mano de obra	5.365.000
31/07/2023	Rosaura Guerra Rodriguez	Mano de obra	11.459.646
27/07/2023	Eberto Antonio Olivo Peñaranda	Plantulas factura No FVE 149	44.352.000
31/07/2023	Segundo Ezequiel Solano	Transporte de insumos	2.800.000
31/07/2023	Rafael Tobias Sarmiento	Transporte de insumos	2.922.528
Total Realizar el establecimiento de plantaciones forestales			**104.030.695**

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 5.000.000**
pagado a: Andreina Del Carmen Cardenas Barrios		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Cinco millones de pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario	
Andreina Cardenas	
C.C x **NIT.**	**No. 1.124.057.620 de Maicao**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

ANDREINA DEL CARMEN CARDENAS BARRIOS
CC: 1.124.057.620 de Maicao

LA SUMA DE: ……..... 5.000.000

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Cinco millones de pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Andreina Cardenas

ANDREINA DEL CARMEN CARDENAS BARRIOS
CC: 1.124.057.620 de Maicao

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14748082014

(415)7707212489984(8020) 000001474808201 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1124057620 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Riohacha 25

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1124057620	2013,10,18

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	La Guajira 44	Maicao 430

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	BARRIOS	ANDREINA	DEL CARMEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	La Guajira 44	Maicao 430

41. Dirección principal: CL 15 - 2 CRR LA MAJAYURA

42. Correo electrónico: andreinacar73@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3117898202	3226411354

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0081	2021,03,18						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2021 - 03 - 18 / 10 : 34: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDENAS BARRIOS ANDREINA DEL CARMEN

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 18-03-2021 10:34:09AM


DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 4.800.000**
pagado a: Moises Augusto Parodi Zuñiga		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**	
Sucursal:		**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario 		
C.C x **NIT.** ☐ **No. 84.036.864 de San Juan del C**		

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

MOISES AUGUSTO PARODI ZUÑIGA
CC: 84.036.864 de San Juan del Cesar

LA SUMA DE: ……..... 4.800.000

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;



MOISES AUGUSTO PARODI ZUÑIGA
CC: 84.036.864 de San Juan del Cesar



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 84.036.864
PARODI ZUÑIGA
APELLIDOS
MOISES AUGUSTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1964
SAN JUAN DEL CESAR
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
12-DIC-1983 SAN JUAN DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-4801300-00210412-M-0084036864-20100125 0020257580A 1 7990615035

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 26 de junio del 2.023	**Valor:**	**$ 3.900.000**
pagado a: Heimar Jose Fernandez Fragozo		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Tres millones novecientos mil pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario 	
C.C x **NIT.** ☐ **No. 1.193.398.380 de Fonseca**	

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Heimar Jose Fernandez Fragozo
CC: 1.193.398.380 de Fonseca

LA SUMA DE: ……..... 3.900.000

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Tres millones novecientos mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Heimar Jose

Heimar Jose Fernandez Fragozo
CC: 1.193.398.380 de Fonseca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.193.398.380
FERNANDEZ FRAGOZO
APELLIDOS
HEIMAR JOSE
NOMBRES

Heimar José



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-2000
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

18-ABR-2018 BARRANCAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA


P-4800400-01006084-M-1193398380-20180511 0061172722A 1 50492199

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 6.744.521**
pagado a: Ramiro Rafael Mejia Hernandez		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario 	
C.C x **NIT.** ☐ **No. 5.158.783 de Barrancas**	

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:


Ramiro Rafael Mejia Hernandez
CC: 5.158.783 de Barrancas

LA SUMA DE: ……..... 6.744.521

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos m/cte

ATENTAMENTE;



Ramiro Rafael Mejia Hernandez
CC: 5.158.783 de Barrancas



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.158.783

MEJIA HERNANDEZ
APELLIDOS

RAMIRO RAFAEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1949
BARRANCAS
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

07-JUN-1971 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-4800400-68148351-M-0005158783-20060615 01812 06166A 02 183329005

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 7.587.000**
pagado a: Osval Jacob Ramirez Acosta		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Siete millones quinientos ochenta y siete mil pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**	
Sucursal:		**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario		
C.C x **NIT.** ☐ **No. 17.953.047 de Fonseca**		

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Osval Jacob Ramirez Acosta
CC: 17.953.047 de Fonseca

LA SUMA DE: ……..... 7.587.000


POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Siete millones quinientos ochenta y siete mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Osval Ramirez

Osval Jacob Ramirez Acosta
CC: 17.953.047 de Fonseca

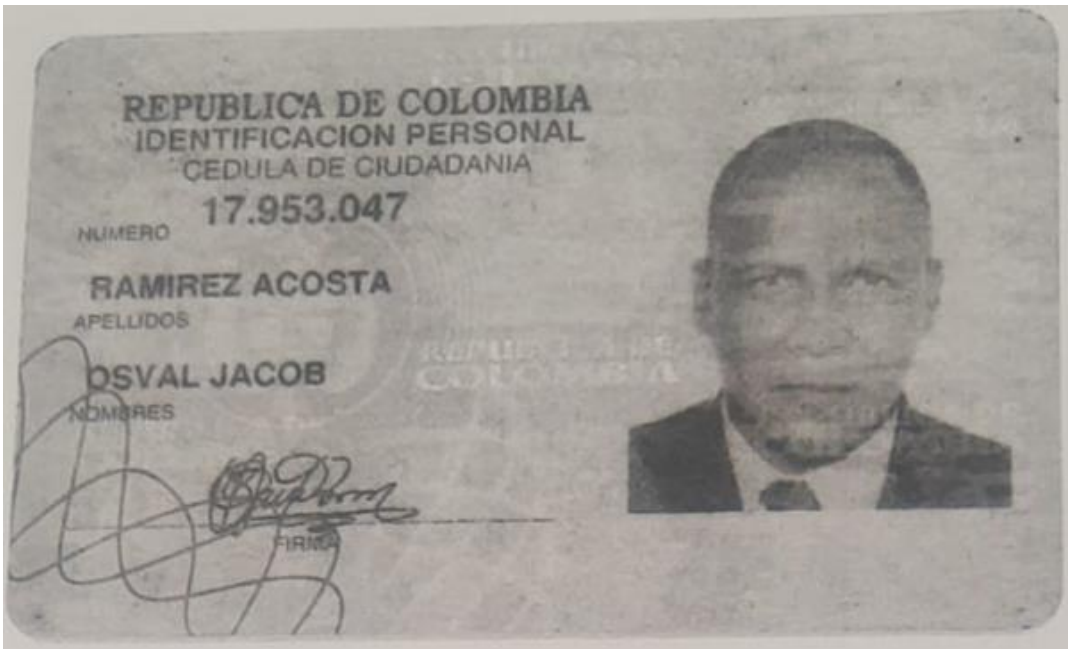

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.953.047
NUMERO
RAMIREZ ACOSTA
APELLIDOS
OSVAL JACOB
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-AGO-1967
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
26-AGO-1985 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-4800700-68134285-M-0017953047-20050323
00686 05082B 02 158789120

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 9.100.000**
pagado a: Liliana Carolina Valencia Caldera		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Nueve millones cien mil pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario	
	
C.C x **NIT.** ☐ **No. 1.192.921.504 de Barrancas**	

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Liliana Carolina Valencia Caldera
CC: 1.192.921.504 de Barrancas

LA SUMA DE: ……..... 9.100.000


POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Nueve millones cien mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Liliana Valencia

Liliana Carolina Valencia Caldera
CC: 1.192.921.504 de Barrancas

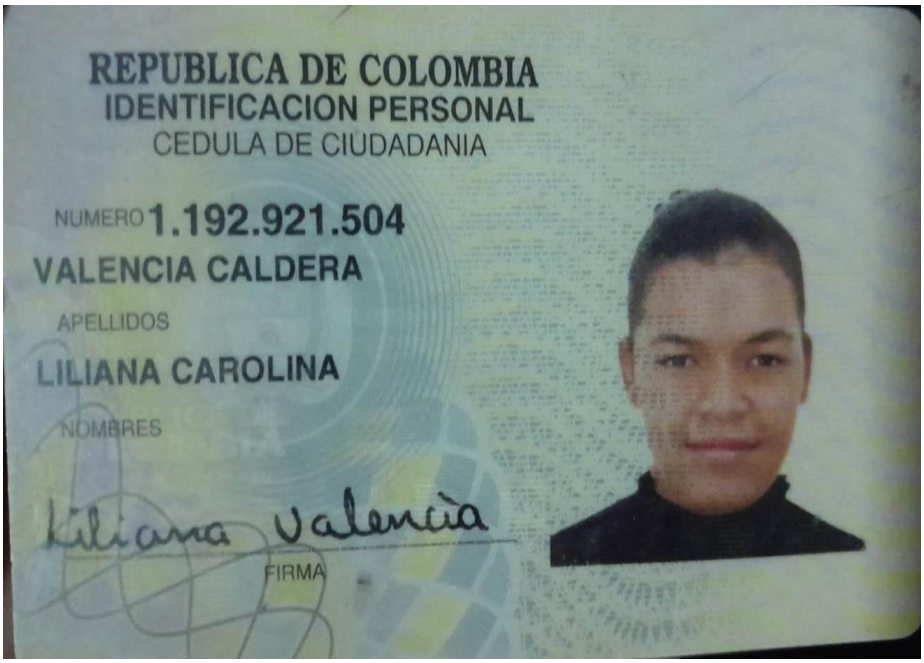

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.192.921.504

VALENCIA CALDERA

APELLIDOS

LILIANA CAROLINA

NOMBRES

Liliana Valencia

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1995

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

08-ABR-2015 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4800400-00708746-F-1192921504-20150525 0044301741A 1 43256802

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 5.365.000**
pagado a: Sorena Leonor Florez Urdiales		
Por concepto de: Mano de obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Cinco millones trecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x

Firma y sello del beneficiario

Lorena Florez

C.C x **NIT.** ☐ **No. 1.121.333.163 de Villanueva**

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

Sorena Leonor Florez Urdiales
CC: 1.121.333.163 de Villanueva

LA SUMA DE: ……..... 5.365.000

POR CONCEPTO DE: Mano de Obra, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Cinco millones trecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;

Lorena Florez

Sorena Leonor Florez Urdiales
CC: 1.121.333.163 de Villanueva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.333.163**

FLOREZ URDIALES

APELLIDOS

SORENA LEONOR

NOMBRES

Sorena florez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1992**

VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

08-NOV-2010 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4802000-00274226-F-1121333163-20101228 **00253**47845A 1 25524009

EBERTO ANTONIO OLIVO PEÑALOZA
NIT: 8673480-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 4 CL 18 A SEC ANTIGUO VIVERO MUNICIPAL, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3126881696
Email. elolivobendito@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764050408859 válida desde 2023-06-14 hasta 2023-12-14 rango desde FVE133 hasta FVE500.

Cliente: FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900345569
Dirección: Cl 15 13 26, Barrancas, La Guajira, Colombia
Teléfono: 3002049603
Email: fundagualuna@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 27/08/2023
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE149**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:13:11**
FECHA FIRMADO: **07/06/2023 14:13:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	07	2023	27	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0104	PLÁNTULA DE CORAZÓN FINO	94	3.000,00	$1.800,00		0,00	$5.400.000,00
2	0109	PLÁNTULA DE IGUAMARILLO	94	2.500,00	$1.800,00		0,00	$4.500.000,00
3	0592	ROBLE MORADO	94	3.050,00	$1.800,00		0,00	$5.490.000,00
4	0438	PLANTULA DE CAÑAGUATE	94	2.900,00	$1.800,00		0,00	$5.220.000,00
5	0117	PLANTULA DE CEIBA LECHOSA	94	3.120,00	$1.800,00		0,00	$5.616.000,00
6	0102	PLÁNTULA DE GUAYACÁN	94	2.700,00	$1.800,00		0,00	$4.860.000,00
7	0115	PLÁNTULA CARRETO	94	2.980,00	$1.800,00		0,00	$5.364.000,00
8	0111	PLANTULA DE GUACIMO	94	4.390,00	$1.800,00		0,00	$7.902.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y cuatro millones trecientos cincuenta y dos mil pesos)
CUFE: ca12c56c048fb67d97ec8b0cf1732fb2a593d0210b2b738ed32519585a5d2343f11c396c0a384686e688162bde31adaa

Subtotal:	$44.352.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$44.352.000,00

Firma Digital: an0dy4iiSijFybFytBfqBwhf0cxyAWKyCvcd/H6AytQBRmIXDbbUb7D8ppUsCc5W SkQ605lf7iHNwB0DUS5wBzSThN5AOAIMsTEZb1alJUecOemIwx XK5qqeHCHKsuzM KCO0ISA+IgWIJ6yDcUu0osCF9feNzAJljdA1X0w2iSkS7z8Hiy/DMuDQoQU5YRb6 xq1aqSqpTQ80NLchzD4LqR001RLW8IAVZ/1 6qTM8THZqaS7FwDSNky8HiSlhHFha ac04P6xfz3oFQSBgWqhRg/Pl9YZDrAa8qIvnFfpuEtMFY1IOQxzUEacwh/fHUe2J 9+vJUlECVOGg8Or8Knkx tw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 2.800.000**
pagado a: Segundo Ezequiel Solano Brito		
Por concepto de: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Dos millones de pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario	
eSequl eLSolano	
C.C x **NIT.** ☐ **No. 17.954.510 de Fonseca**	

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:

SEGUNDO EZEQUIEL SOLANO BRITO
CC: 17.954.510 de Fonseca

LA SUMA DE: ……..... 2.800.000

POR CONCEPTO DE: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Dos millones ochocientos mil pesos m/cte

ATENTAMENTE;

esequielsolano

SEGUNDO EZEQUIEL SOLANO BRITO
CC: 17.954.510 de Fonseca



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.954.510
SOLANO BRITO
APELLIDOS
SEGUNDO EZEQUIEL
NOMBRES

Ezequiel Solano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1968
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-DIC-1989 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


A-4800800-00613768-M-0017954510-20140822 0039664751A 1 25547193

Comprobante de Egreso
No.

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023	**Valor:**	**$ 2.922.528**
pagado a: Rafael Tobias Sarmiento Ramirez		
Por concepto de: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira".**		
La suma de: (en letras): Dos millones novecientos veintidós mil quinientos veintiocho pesos m/cte		

CUENTA	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**

Elaborado	**Aprobado**	**Contabilizado**

Cheque No.	**Banco:**
Sucursal:	**Efectivo** x
Firma y sello del beneficiario 	
C.C x **NIT.** ☐ **No. 84.042.009 de Maicao**	

CUENTA DE COBRO

Barrancas, La Guajira 31 de julio del 2.023

FUNDACION AGUA LUNA
NIT: 900.345.569-4

DEBE A:


RAFAEL TOBIAS SARMIENTO RAMIREZ
CC: 84.042.009 de Maicao

LA SUMA DE: ……..... 2.922.528

POR CONCEPTO DE: Transporte de insumos, ítem realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciacion , contrato de obra pública No. 0082 de 2022, cuyo objeto es **"rehabilitación ecológica en áreas ambientales degradadas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan Del Cesar y Villanueva, Departamento de La Guajira"**

SON: Dos millones novecientos veintidós mil quinientos veintiocho pesos m/cte

ATENTAMENTE;



RAFAEL TOBIAS SARMIENTO RAMIREZ
CC: 84.042.009 de Maicao

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14526014010

(415)7707212489984(8020) 000001452601401 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 0 4 2 0 0 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 0 4 2 0 0 9	1 9 8 1 1 1 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Maicao 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARMIENTO	RAMIREZ	RAFAEL	TOBIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Barrancas 0 7 8

41. Dirección principal: CL 20 12 D 26 BRR EL CEREZO

42. Correo electrónico: fundagualuna@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 3 1 4 1 5 0	5 8 9 2 8 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 2 0 2						8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
