San Jerónimo, 27 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO No 001

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA

NIT: 890.920.814-5

DEBE AL:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTICOS

NIT: 900105870-8

LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ML ($5.320.864).

POR CONCEPTO DE: Desembolso No 1 correspondiente al acta de avance No 1 del convenio solidaridad No 024 del 27 de junio de 2023, que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA ALTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA".

JUAN DE JESUS ÁLVARES TOBÓN

Representante Legal JAC ALTICOS

ACTA N°1	
27 DE JULIO DE 2023	
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VEREDALES DE LA VEREDA LOS ALTICOS	
JUNTA DE ACCION COMUNAL:	LOS ALTICOS
NIT:	900105870-8

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	**$ 21.784**	15,20	$ 331.124
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	**$ 21.784**	15,20	$ 331.124
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	**$ 1.898**	2050,00	$ 3.891.812
4	Construcción de desagues para caminos.	Unidad	**$ 28.300**	1,00	$ 28.300
5	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	has	**$ 971.718**	0,76	$ 738.505
6	Construcción de empalizada con estacon de madera y alambre galvanizado.	m2	**$ 51.931**		$ -
7	Mantenimiento de pasos a desnivel (sobre lamina de agua).	m2	**$ 48.019**		$ -
TOTAL APORTES MUNICIPIO					**$ 5.320.864**
TOTAL APORTES JAC					$ 532.086
VALOR TOTAL CONVENIO					$ 5.852.950

JUAN DE JESUS ÁLVARES TOBÓN
REPRESENTANTE LEGAL JAC LOS ALTICOS
CONTRATISTA

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA
SECRETARIA DE PLANEACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALTICOS

CERTIFICA:

Que la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALTICOS**, identificado con el **Nit 900.105.870-8** a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicios nacionales de parendizaje SENA, asi como a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, ARL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) correspondientes al ultimo semestre.

Se expide en el Municipio de San Jerónimo, departamento de Antioquia, a los 31 días del mes de Julio de 2023.

JUAN DE JESUS ÁLVARES TOBÓN
Representante Legal JAC vereda LOS ALTICOS.
Municipio de San Jerónimo, Departamento de Antioquia.

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN

FECHA: 27 de julio de 2023

OBJETIVO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LOS ALTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.

INTRODUCCION

Este proyecto se desarrolla en el municipio de San Jerónimo en el Departamento de Antioquia, en el camino de herradura de la vereda LOS ALTICOS.

El objeto del proyecto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LOS ALTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.", donde se tiene actividades que comprende excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad, remoción manual de derrumbes menores, conformación con material de la excavación incluye conformación de cunetas, construcción de desagues para caminos, rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

Estas actividades se ejecutaron en el siguiente camino de herradura:



Ilustración 1 Localización del camino, intervenido.

2. FICHA INFORMATIVA

2.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: **COVENIO DE SOLIDARIDAD NRO 024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2023.**

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LOS ALTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA."

CONTRATISTAS: **JAC VEREDA LOS ALTICOS.**

NIT: **900105870-8**

SUPERVISIÓN: CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Tabla 1 Ficha del contrato de obra.

Fecha de inicio	27/06/2023	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	10/08/2022	Fecha de reinicio	N/A
Tiempo transcurrido	25 días	**OBSERVACION:** Se realizaron actividades que comprende excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad, remoción manual de derrumbes menores, conformación con material de la excavación incluye conformación de cunetas, construcción de desagues para caminos, rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	
Plazo total del contrato	45 días		
% de avance obra desde el acta de inicio hasta corte	100%		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 27 de junio de 2023.			

2.2 INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN: CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN

OBJETO: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LOS ALTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.".*

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tabla 2 Aportes

Valor total de los aportes	$ 5.852.950
Aporte del JAC Mestizo parte baja	$ 532.086
Aporte del municipio de San Jerónimo	$ 5.320.864

4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

4.1 Excavación manual.

En esta actividad se realiza excavación manual en material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.
La actividad incluye la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos provenientes de la citada operación. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.

En el tramo del camino mencionado anteriormente se excavo 15.2 metros cubicos en total, los aportes gastados en esta actividad fueron de $ 331.124.

4.2 Remoción de derrumbes.

En esta actividad se realiza la remoción manual de derrumbes menores.
La actividad incluye la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos provenientes de la citada operación. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.

En el tramo del camino mencionado anteriormente se removio 15.2 metros cubicos de derrumbes menores, los aportes gastados en esta actividad fueron de $ 331.124.

4.3 Conformación de camino.

En esta actividad se realiza la conformación del camino con material de la excavación incluye conformación de cunetas.
La actividad incluye la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos provenientes de la citada operación. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.

En el tramo del camino mencionado anteriormente se conformo 2050 metros cuadrados de camino, los aportes gastados en esta actividad fueron de $ 3.891.812.

4.4 Construcción de desagües.

En esta actividad se realiza la construcción de desagues para el camino.
La actividad incluye la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos provenientes de la citada operación. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.

En esta actividad se construyo una unidad de desague, donde los aportes gastados fueron de $ 28.300.

4.5 Rocería.

En esta actividad se realiza la rocería, altura promedio 3 - 4 m en ambas márgenes del camino.
La actividad incluye la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos provenientes de la citada operación. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.
En el tramo del camino mencionado anteriormente se rozaron 0.76 hectareas de camino, los aportes gastados en esta actividad fueron de $ 738.505.

4.6 Registro fotográfico



Foto 1 Vía intervenida

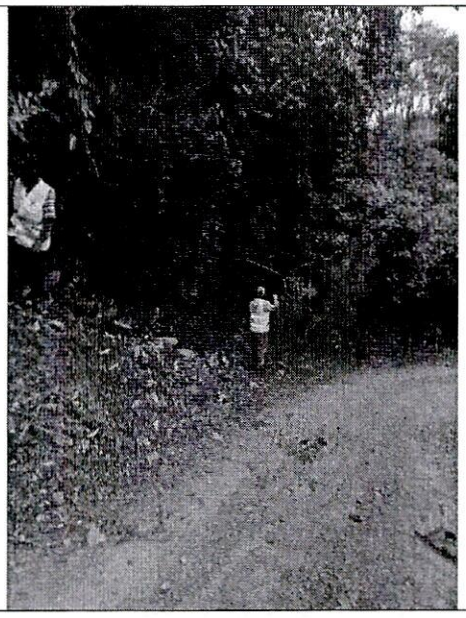


Foto 2 Vía intervenida

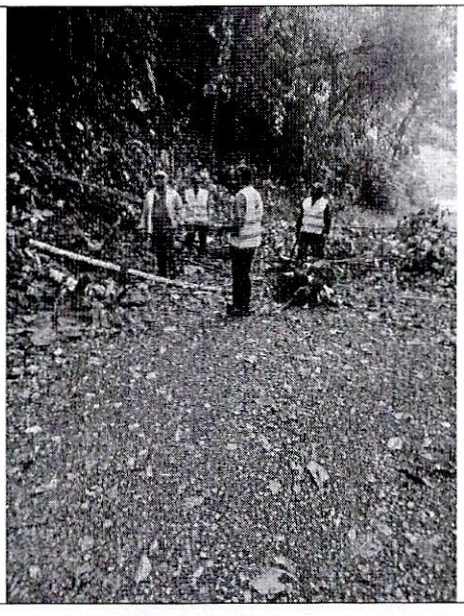


Foto 3 Vía intervenida



Foto 4 Vía intervenida

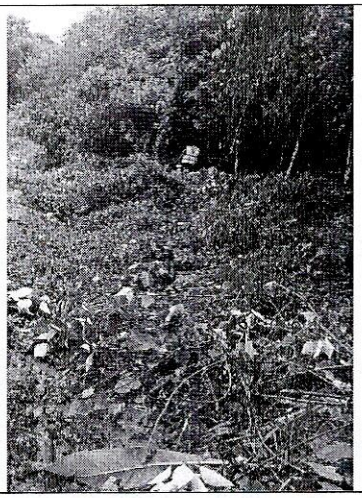


Foto 5 Vía intervenida

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN
