Sincelejo, 01 de agosto de 2023

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Datos generales del contrato

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
Nª DE CONTRATO	PSP-037-2023
CONTRATANTE:	FOMVAS
CONTRATISTA:	LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ
C.C:	1.102.828.845
OBJETO:	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, DE APOYO A LA GERENCIA Y A LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL FOMVAS EN LA SUPERVISION DE OBRAS Y DEMAS PROCESOS MISIONALES QUE ESTE ADELANTANDO LA ENTIDAD.**
VALOR INICIAL:	$14.080.000,oo
PLAZO INICIAL:	4 meses
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**1.** Apoyar las supervisiones que se le sean asignadas en las obras o lugares que se requieran **2.** Realizar las inspecciones, reconocimientos de lugares, obras y proyectos que se le sean solicitadas para verificar el estado actual de estos. **3.** Presentar al supervisor los informes sobre las visitas y/o seguimientos desarrollados. **4.** Soportar cada una de las actividades realizadas ante el supervisor. **5.** Apoyar a la división técnica de la entidad en la revisión de proyectos de inversión y demás asuntos que sean competencia de dicha división. **6.** Asesorar y brindar apoyo a la gerencia de la entidad en las actividades que esta le designe. **7.** Apoyar en la elaboración de la metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (MGA) que formule la entidad. **8.** Asesorar a la oficina de control interno cuando esta así lo requiera. **9**. Presentar informe mensual de las actividades realizadas. **10.** Cumplir con los pagos del sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y presentar los recibos de pago

	correspondiente. **11.** Las demás que se requieran según la naturaleza del contrato.
SUPERVISIÓN:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIVISIÓN TÉCNICA

Para dar cumplimiento al Contrato de **Prestación de Servicios No PSP-037-2023** de fecha de inicio **junio 01** del **2023**, se hace entrega oficial del informe de gestión de labores, en el cual, se describen de manera general cada una de las funciones y/o actividades desempeñadas durante el periodo de tiempo comprendido entre las fechas 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023. Las actividades realizadas fueron:

1. Asignado como ingeniero de apoyo a la supervisión de la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO se realizaron las siguientes actividades:

   A. Elaboración de informes de supervisión
   B. Revisión de informes de interventoría
   C. Visitas técnicas de obra
   D. Elaboración de oficios
   E. participación en comité de obra

2. Asignado como ingeniero de apoyo a la supervisión de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO – FASE II se realizaron las siguientes actividades:

   A. Elaboración de informes de supervisión
   B. Revisión de informes de interventoría
   C. Elaboración de oficios
   D. visitas técnicas de obra
   E. participación en comité de obra

LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ
C.C 1.102.828.845 DE SINCELEJO.
Contratista

ANEXOS: evidencias



FOTO No.1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. – actividad de excavacion*



FOTO No.2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. – actividad de solado en concreto de 14 mpa e = 0,05 m*

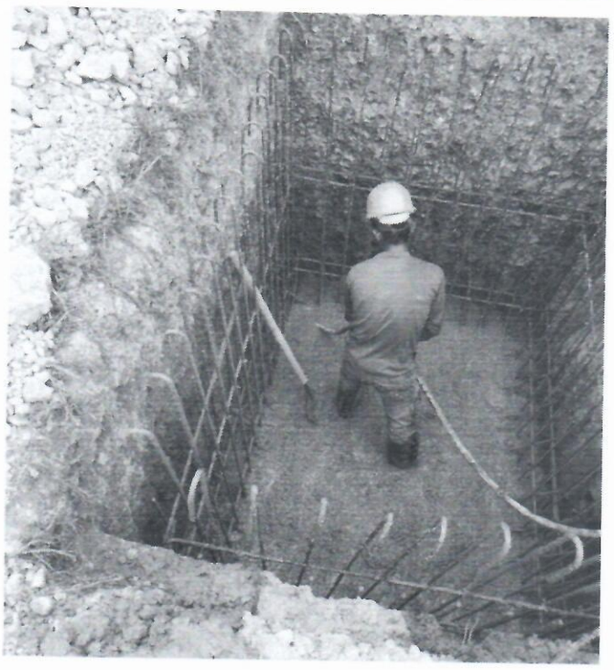


FOTO No.3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. – actividad de construcción de losa de fondo en concreto de 28 mpa premezclado de baja permeabilidad (no incluye acero de refuerzo)*



FOTO No.4. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DN = 16 MM (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS)*

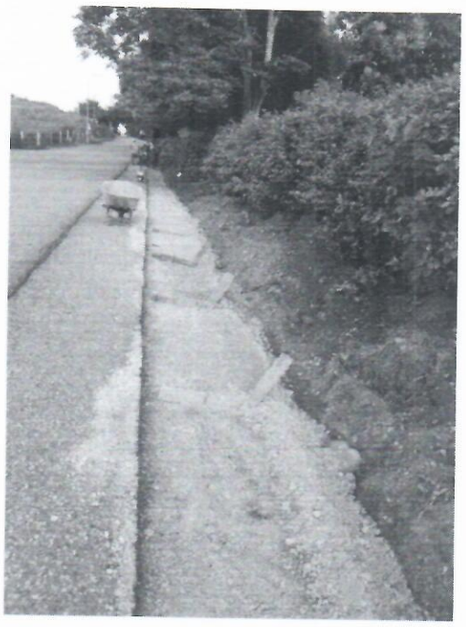


FOTO No.5. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. – actividad de SUB-BASE GRANULAR PARA ANDÉN, CUNETA Y/O EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA)*



FOTO No.6. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL Y VEREDA LA GARITA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE 21 MPA (F´C = 3.000 PSI) Y ESPESOR DE 0.10 M (INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, TEXTURIZADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA)*

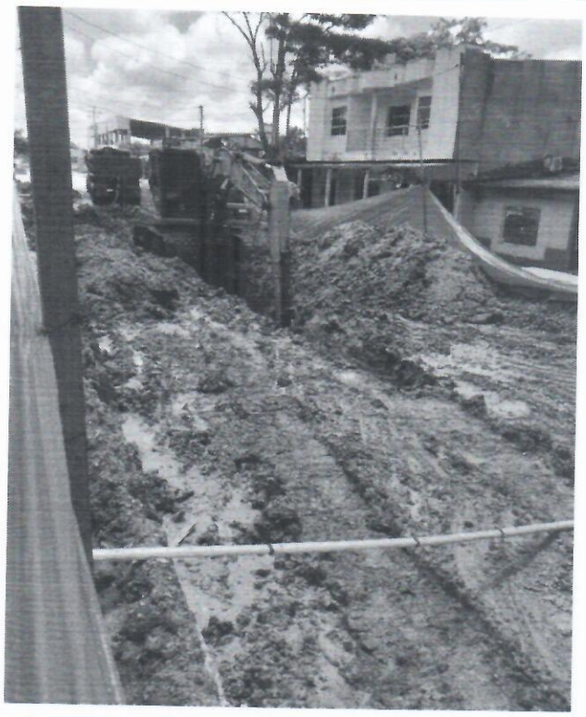


FOTO No.7. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañia de la interventoria, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M*

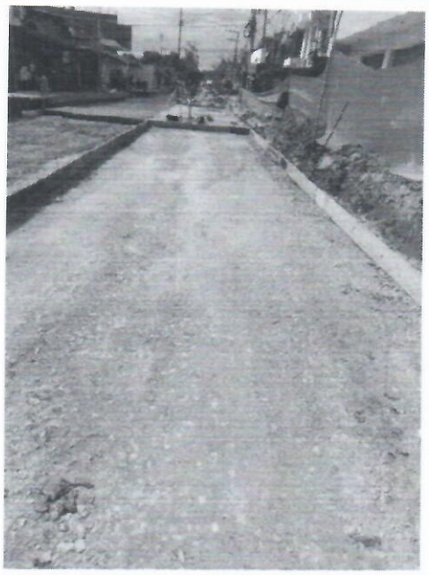


FOTO No.8. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de SUBBASE GRANULAR.*



FOTO No.9. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN*

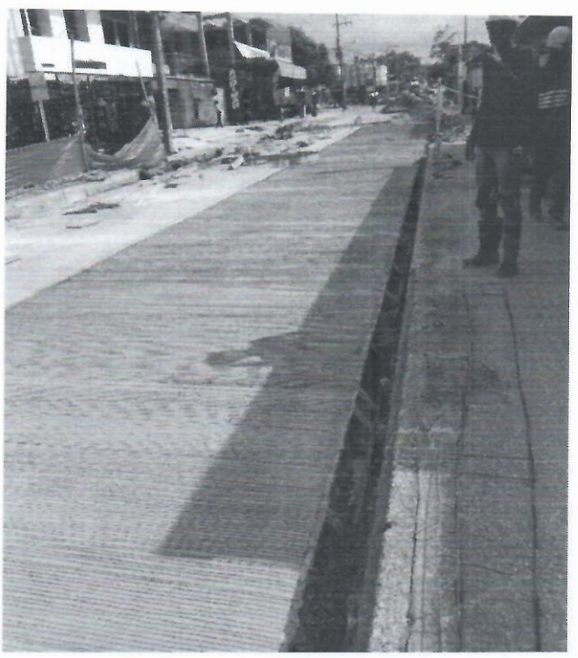


FOTO No.10. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN*



FOTO No.11. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) (Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra)*



FOTO No.12. CONSTRUCCION DE VIAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL ARGELIA PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - FASE II. *visita de obra, en compañía de la interventoría, en donde se procedió a la revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra. - Actividad de Construcción de muro de confinamiento para estabilización de Terrazas en bloque estructural 0,15 relleno en concreto (Altura de Muro de 20 a 90 cms) según diseño.*
