

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Firma		
Nombre	EDWARD VERA REDONDO	VLADIMIR POLO PAZ
Cargo	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	ELABORÓ	APROBÓ

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
PERIODO 04 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bucaramanga, 05 de julio del 2023.

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Ciudad

Ref.: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GR 1-GR2-GR3

Asunto: **INFORME MENSUAL 4**

Cordial saludo.

Yo, **VLADIMIR POLO PAZ**, representante legal de JESAK S.A.S, del contrato de Interventoría No. 429 de 2022, me permito hacer entrega del informe mensual No: 4, del contrato en cuestión, comprendido en el periodo entre el 01 al 30 de junio 2023.

El siguiente informe contiene la información de los contratos de obra e interventoría del objeto en cuestión, así como las actividades realizadas en cada uno de los contratos en el periodo del presente informe.

De antemano me permito manifestar que me declaro responsable por toda la información aquí reportada.

Cordialmente,



R.L. ING. VLADIMIR POLO PAZ
C.C. 73.153.848
JESAK S.A.S.

Contenido

CARTA DE PRESENTACIÓN 2
1.1 Contrato De Interventoría 7
1.2 Recursos Físicos 7
2. CONTRATO DE OBRA 9
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
2.2 RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 9
3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA 11
4 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO 17
5 ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
6 CLIMA 45
7 INFORME DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA 45
8 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 46
9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 46


LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1: BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 3: ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES
ANEXO 4: LISTA DE CHEQUEO PMT
ANEXO 5: PROGRAMACIÓN
ANEXO 6:ENSAYOS DE LABORATORIOS

INTRODUCCIÓN

El proyecto **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER",** se encuentra localizado en el municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, específicamente en los barrios el rosal, campo Madrid, la independencia, la juventud, san Cristóbal, chapinero, la universidad, san alonso, los pinos, la aurora, limoncito, la vega y Albania.



Localización geográfica del proyecto – Departamento de Santander – Municipio de Bucaramanga

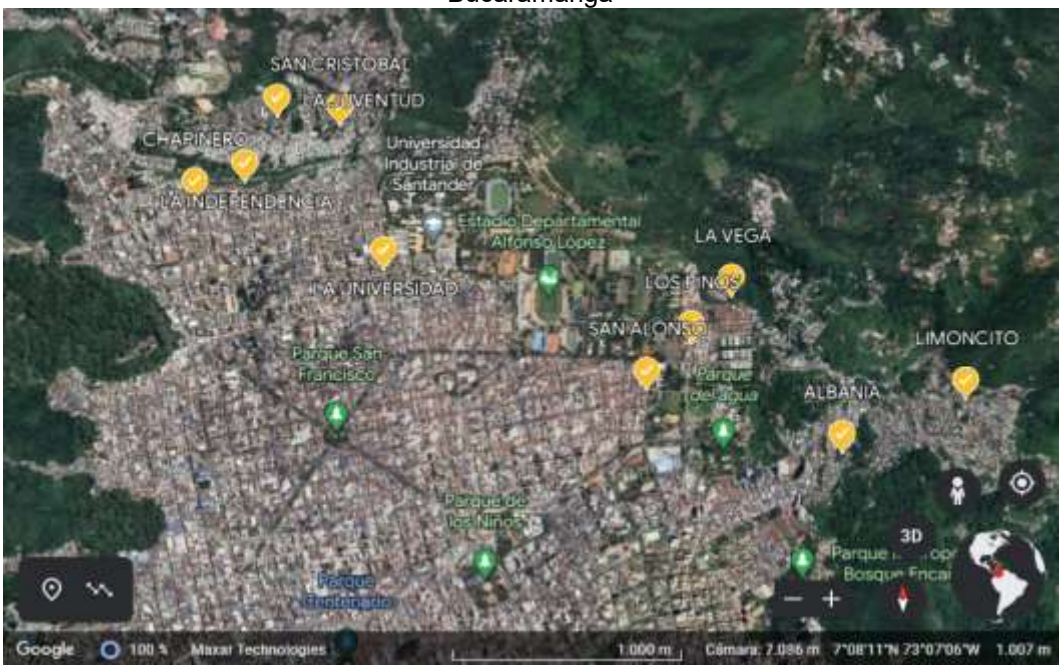

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub

bases granulares), acabados (Concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieren. La Secretaría de Infraestructura se propone brindar a la comunidad en general, estancias seguras para realizar el desplazamiento de las personas en la ciudad, realizar recreación pasiva (caminata), mediante la recuperación de espacio público, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de Oportunidades en Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, Componente: Espacio Público Vital, Programa; Equipamiento Comunitario, cuya meta para el cuatrienio es construir y/o mejorar 100,000 m2 (Metros Cuadrados) de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad, no obstante, para apoyar en el cumplimiento de esta meta, dentro de este proyecto se prevé recuperar 14,076 metros cuadrados (m2), materializados en 15 de las 17 comunas del Municipio, impactando a una población estimada en 457,427 persona

Es por esto que, mediante proceso, el cual tiene como objeto "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER**", se realiza la selección para la ejecución de obra y mediante proceso se realiza la selección de la interventoría.

El presente informe tiene como objetivo describir el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el cuarto periodo, el cual se encuentra comprendido entre el primero (01) de junio de 2023 y el treinta (30) de junio de 2023, para la construcción de las obras correspondientes con el contrato de obra en referencia.

Cabe destacar que tanto el contrato de Interventoría como el contrato de obra se encuentran a la fecha se encuentran activos y en ejecución.

En este informe se analizarán los aspectos técnicos, administrativos y financieros concernientes a las obras, como el avance real de la misma, los controles ejecutados por la Interventoría y el estado del contrato.

En el informe también se detalla un control de personal, de seguridad industrial y salud ocupacional, el cual da un reporte sobre el personal que labora en la obra y la gestión que se realiza para garantizar las normas de seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad de todos los trabajadores.

Se continuo con el respectivo seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se implementó por el contratista y que a la fecha se ejecuta completamente en el cual se han evidenciado certificaciones, permisos, mantenimiento (materiales, maquinaria y equipos) constancia de capacitaciones a los trabajadores en la realización de actividades. Todo esto con el fin de cumplir con los aspectos requeridos en el Plan de Manejo Ambiental.

Es así, que al haber transcurrido el primer periodo de actividades, esta interventoría hace entrega del presente informe en el cual se plasman y expresan las cotidianidades y aspectos relevantes en todos los hitos del alcance y/o especialidades, y en sí, todo el resultado del seguimiento y acompañamiento realizado tanto al contratista como a la entidad, en aras de garantizar el normal desarrollo de las actividades conminando al contratista al cumplimiento del objeto de su contrato dentro de los plazos previstos.

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1 Contrato De Interventoría

NÚMERO DEL CONTRATO	429 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.457.250
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 627.457.250
CONTRATISTA	JESAK SAS R/L VLADIMIR POLO PAZ
SUPERVISOR	ING EDGAR BAYONA FLOREZ
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN #4	15 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PERÍODO EJECUTADO	01/06/2023 a 30/06/2023
% DE AVANCE EN TIEMPO	87,60%

1.2 Recursos Físicos

1. Vehículos
2. Dotación
3. Oficina
4. computadores
5. Equipos de impresión
6. Herramienta de medición

Recursos Humanos

Nombre	Cargo	Estado
Vladimir Polo Paz	Director de Interventoría	Activo
Edward Vera Redondo	Residente Interventoría	Activo
Esledy Corzo Aguilar	Residente Social Interventoría	Activo
Beatriz León Suárez	Residente Ambiental y SST	Activo
Kelly Jiménez Manrique	Inspector Interventoría	Activo
José de la Cruz	Inspector Interventoría	Activo
Javier Eduardo León	Inspector Interventoría	Retirado
Albeiro Rodríguez Cortez	Inspector Interventoría	Retirado

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO No:	022 DE 24 FEBRERO 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901.677.862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK SAS R/L VLADIMIR POLO PAZ
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
% DE AVANCE EN TIEMPO	87,60%

2.2 RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

PROFESIONALES CONTRATISTA	
GERENTE DE PROYECTO	ING YEISON ANDRES GARCES
DIRECTOR DE OBRA	ING. ERNESTO MONTAÑEZ MORA
RESIDENTE DE OBRA	ING LAYDE ILIANA VELANDIA
PROFESIONAL HSEQ	ING. BERNARDO SUAREZ CARREÑO

PROFESIONALES CONTRATISTA	
TECNICO SOCIAL	LEIDY ANDREA AYALA
INSPECTOR DE OBRA	OSCAR ALIRIO PRADA
INSPECTOR DE OBRA	YULI MELISSA SUAREZ
INSPECTOR DE OBRA	LINA MARIA CRISTANCHO

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA

N.º	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES						
1	1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00	1.645,70	$ 3.785.110,00
Subtotal						**$ 15.356.640,00**		
		DEMOLICIONES						
2	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00	273,42	$ 56.844.259,16
Subtotal						**$ 270.062.100,00**		
		EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00	170,67	$ 13.107.193,34
4	3.2	Relleno compactado con material de	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00	264,81	$ 55.847.501,04

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
		subbase granular						
Subtotal						**$ 284.279.700,00**		
		ESPACIO PUBLICO						
5	4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00	1.265,48	$ 174.888.783,20
6	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00	464,75	$ 39.364.325,00
7	4.3	Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00	14,00	$ 5.255.600,00
8	4.4	Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00	21,00	$ 5.579.700,00
9	4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00	396,80	$ 5.713.920,00
10	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		$ 0,00

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
		madera.						
11	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00	265,61	$ 41.700.770,00
12	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00	1,53	$ 1.245.391,13
Subtotal						**$ 1.134.170.160,00**		
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
13	5.1	Realce cajas de servicios públicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00	61,00	$ 8.796.200,00
14	5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00	1,00	$ 244.500,00
15	5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00	1,00	$ 137.000,00
Subtotal						**$ 47.205.700,00**		
		CARPINTERIA METÁLICA						
16	6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00	0	$

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
		de 2" vertical cada 2m anclada al piso						
Subtotal						**$ 57.423.220,00**		
		ASEO Y LIMPIEZA						
17	7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00	0	$ -
Subtotal						**$ 18.070.520,00**		
		PLAN DE MANEJO						
18	8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00	0,75	$ 7.870.500,00
19	8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00	0,85	$ 53.022.745,00
Subtotal						**$ 72.873.700,00**		
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.899.441.740,00**		**$ 518.704.986,28**

		NO PREVISTOS						
9.1	NP	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30	$ 34.821.534,20	322,45	$ 4.613.066,44
9.2	NP	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62	$ 28.257.815,08	320,10	$ 3.716.239,36
9.3	NP	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tubería PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42	$ 1.510.465,20	32,80	$ 825.720,98
9.4	NP	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49	$ 6.498.409,80	3,00	$ 974.761,47
9.5	NP	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49	$ 399.434,70	2,00	$ 26.628,98
9.6	NP	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35	$ 7.141.852,50	27,90	$ 1.328.384,57
9.7	NP	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68	$ 8.493.096,80	0,86	$ 730.406,32
9.8	NP	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86	$ 4.567.058,60	2,00	$ 913.411,72
9.9	NP	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74	$ 26.994.748,00	97,79	$ 13.199.082,03
9.10	NP	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97	$ 4.995.445,50	14,00	$ 466.241,58
9.11	NP	Siembra de árboles Pomarrosa Brasileño H Prim = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11	$ 1.060.165,55	2,00	$ 424.066,22

		NO PREVISTOS						
9.12	NP	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97	$ 13.709.242,50	83,60	$ 4.584.370,69
9.13	NP	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58	$ 3.044.025,60	176,76	$ 1.681.443,64
9.14	NP	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26	$ 13.542.033,90	6,32	$5.709.321,49
9.15	NP	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91	$ 6.101.986,50	31,42	$ 1.278.037,07
9.16	NP	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05	$ 2.410.066,05	1,00	$ 2.410.066,05
9.17	NP	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20	$ 8.404.800,00	6,00	$ 201.715,20
9.18	NP	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28	$ 5.272.368,00	252,47	$ 2.218.524,58
					SUBTOTAL	**$ 177.224.548,48**	**SUBTOTAL**	**$ 45.301.488,40**

4 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

Una vez iniciado el contrato a partir de la firma del acta de inicio el día 16 de marzo de 2023 tanto de obra como de interventoría, se procede a iniciar con el reconocimiento de los espacios a intervenir, a su vez se continua con la ejecución durante el periodo correspondiente desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, completando un total de 9 frentes de trabajo a intervenir

Una vez realizada la medición se procede a realizar un balance por frente y zona, partiendo de las necesidades presentadas por la comunidad en los presupuestos participativos y también con la ayuda de los recursos propios con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual

La interventoría ha evidenciado la necesidad de aumentar en algunos frentes y lo hará de manera formal en una solicitud para agregar actividades y aumento de cantidades con el fin de garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la obra


A continuación, se identifica el flujo de caja a la fecha con su respectivo % de obra ejecutado a la fecha

semana	Fecha inicial	valor programado	valor ejecutado acumulado	%programado acumulado	%ejecutado acumulado	Adelanto / Atraso
1	16 a 22 MARZO	9.610.860,00	$ 5.118.880,00	0,49%	0,26%	-0,23%
2	23 a 29 MARZO	54.919.200,00	$ 12.766.817,00	2,80%	0,65%	-2,15%
3	30 MARZO a 5 ABRIL	130.433.100,00	$ 15.316.637,00	6,65%	0,78%	-5,87%
4	06. A 12. ABRIL	175.349.160,00	$ 17.670.317,00	8,94%	0,90%	-8,04%
5	13. A 19. ABRIL	198.493.680,00	$ 72.589.517,00	10,12%	3,70%	-6,42%
6	20. A 26 ABRIL	243.213.600,00	$ 123.054.845,00	12,40%	6,27%	-6,13%
7	27 ABRIL. A 3 MAYO	317.746.800,00	$ 148.553.045,00	16,20%	7,57%	-8,63%
8	4. A 10 MAYO	360.897.600,00	$ 185.819.645,00	18,40%	9,47%	-8,93%
9	11 A. 17 MAYO	425.035.380,00	$ 223.086.245,00	21,67%	13,23%	-8,44%
10	18. A 24 MAYO	494.272.800,00	$ 296.834.885,00	25,20%	15,43%	-9,77%
11	25. A 31 MAYO	532.323.960,00	$ 339.714.033,49	27,14%	17,32%	-9,82%
12	01. A 07 JUNIO	589.008.420,00	$ 388.749.480,00	30,03%	19,82%	-10,21%
13	08. A 14 JUNIO	698.650.680,00	$ 418.758.900,00	35,62%	21,35%	-14,27%
14	15. A 21 JUNIO	964.812.660,00	$ 438.372.900,00	49,19%	22,35%	-26,84%
15	22. A 28 JUNIO	1.079.750.700,00	$ 479.562.300,00	55,05%	24,45%	-30,60%

Debido a las actividades presentadas en el presupuesto inicial del proyecto y con el fin de cumplir los tiempos establecidos se presenta una programación con fecha de finalización el día 15 de julio de 2023

A continuación, se presenta el flujo de caja del contrato en mención y su fracción en semanas para cumplir el objeto contractual de cada uno de los frentes a ejecutar

La interventoría recomienda el incluir suficiente personal para cada uno de los frentes de trabajo y suplir los atrasos que se vienen marcando en la tendencia de las seis semanas programadas

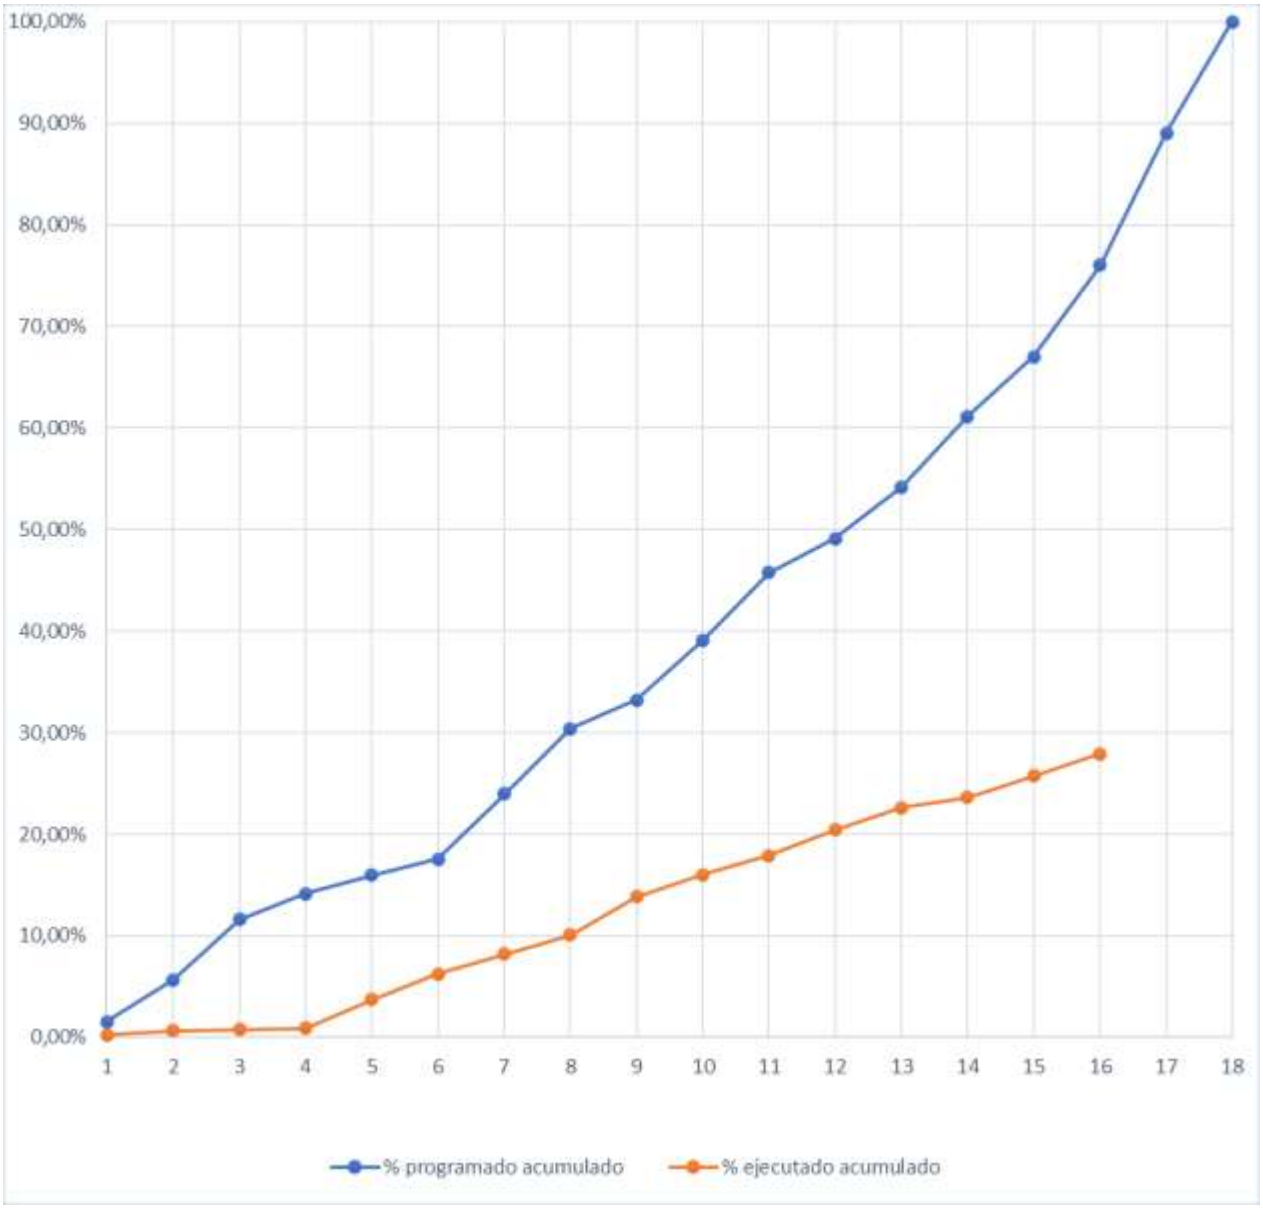

5 ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1.1 **ACTIVIDAD ITEM 2.1 Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.**

Este ítem se refiere a la demolición de los pisos en general y sardinel existente que deberá ser retirado para ejecución de la obra. La demolición se plantea realizarla con martillo hidráulico y herramienta menor de acuerdo a las especificaciones de demoliciones. Los materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de los escombros, serán cargados y retirados de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	1288	38,14

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	32,48 m³









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	28,912 m³







5.1.2 **ACTIVIDAD ITEM 3.1 Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.**

Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material común necesaria para bordillos, para cajas que requieran ser llevadas a niveles de construcción y para la adecuación de la aplicación de sub base granular para cumplimiento de niveles, incluye retiro y disposición final del material sobrante.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	695,6	31,08

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	26,517 m³









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	4,54 m³







5.1.3 **ACTIVIDAD ITEM 3.2 Relleno compactado con material de Sub – Base granular.**

Esta actividad comprende la instalación de sub base granular compactada, con espesores de 0,10 m para andenes y 0,15 m para rampas vehiculares, equipo utilizado para actividad un compactador manual tipo rana.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.2	Relleno compactado con material de sub – base granular	M³	1021,8	37,53

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	24,40 m³


16 jun. 2023 08:53:24
7°7'59.07149"N -73°6'45.78932"W
Barrio San Alonso
Carrera 33a entre calle 17 y 18


20 jun. 2023 13:40:58
7°7'58.39919"N -73°6'45.67616"W
Barrio San Alonso
Carrera 33a entre calle 17 y 18


20 jun. 2023 14:42:47
7°7'58.03196"N -73°6'45.8557"W
Barrio San Alonso
Carrera 33a entre calle 17 y 18



COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	13,12 m³









5.1.4 **ACTIVIDAD ITEM 4.1 Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)**

Actividad que corresponde con la instalación losetas de (40 cm x 40 cm x 6cm) lisas, guía y toperol, instalación de loseta de (40cm x 20 cm x 6 cm) visual amarilla según el manual de espacio público de Bucaramanga, sobre mortero 1:4 con un espesor de 5cm para asentamiento de la loseta.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.1	Construcción de espacio público según MEPB	M²	2.309,8	177,23

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	77,19 m²









COMUNA 14. MORRORICO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	100,04 m²




2023-06-28 16:56
Calle 9a cra 24-25 La Universidad


2023.06.26



5.1.5 **ACTIVIDAD ITEM 4.2 Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10**

Actividad que corresponde con la instalación de sardinel recto prefabricado UC-S10 de 0,80 m, sobre mortero 1:4 a una profundidad de 0,40 m, dejando expuesto lo indicado por el MEPB de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	MI	2.309,8	81,10

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	36,45 m









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	44,65 m









5.1.6 **ACTIVIDAD ITEM 4.3 Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB.**

Actividad que comprende la construcción de rampas peatonales de acuerdo a lo descrito en el MEPB, concreto 3000 Psi, bordeadas con loseta visual (de color amarilla), con pendientes que pueden ir de 12% a 20% según lo del ancho transversal del andén y garantizando el paso peatonal en la franja de circulación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.3	Construcción de rampas peatonales	UND	205	3

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Cra 29 entre calles 10 y 11	1 Und







COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	2 Und






5.1.7 **ACTIVIDAD ITEM 4.4 Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB.**

Actividad que comprende la construcción de rampas vehiculares para acceso a garajes o parqueaderos ocupando un espacio de 0,40 m de la servidumbre de vía máximo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.4	Construcción de rampas vehiculares	UND	205	5

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	1 Und







COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	4 Und








2023-07-01 08:05

5.1.8 **ACTIVIDAD ITEM 4.5 Franja de ajuste al predio.**

Es la franja funcional localizada contra la línea de paramento ya sea del lote o edificación que sirve para absorber las direncias en las medidas del andén con relación las dimensiones típicas de las franjas que lo componen, este es construido en concreto fundido en sitio no superando un ancho de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.5	Franja de ajuste al predio	m	2014,2	237,6

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	118,90 m









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	42 m









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Cra 29 entre calles 10 y 11	76,7 m







5.1.9 **ACTIVIDAD ITEM 4.7 Piso adoquín peatonal rectangular 10x20x6 cm en concreto tipo UC-A30.**

Actividad que comprende la instalación de adoquín para dar acabado de franjas ambientales, tratada como zona verde donde requiere permitir el paso peatonal y vehicular, permitiendo un adecuado drenaje.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.7	Piso adoquín peatonal rectangular	m^2	2049,2	95,81

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	95,81 m²









5.1.10 **ACTIVIDAD ITEM 4.8 Rampa en concreto 3000 Psi mezclado en sitio.**

Actividad que comprende la construcción de rampas en concreto fabricado en sitio y que garantizan empalme con las edificaciones en donde las condiciones de estas no coinciden con los niveles del andén a construir.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.8	Rampa en concreto 3000 Psi.	m³	283	0,408

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	0,408 m²





5.1.11 **ACTIVIDAD ITEM 5.1 Realce de cajas de servicios públicos.**

Actividad que comprende nivelar las cajas de servicios públicos de las viviendas a los niveles de diseño del andén a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la protección de los medidores.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	19

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	7 Und









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	6 Und.









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Cra 29 entre calle 10 y 11	2 Und.









COMUNA 14. MORRORICO		
La Vega	Cal 10 Vegas de Morrorico	4 Und





5.1.12 **ACTIVIDAD ITEM 5.2 Realce de cajas empas**

Actividad que comprende nivelar las cajas del EMPAS que se requieran para el desarrollo de la obra, con la finalidad de que queden los niveles longitudinales y transversales de los andenes a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la estabilidad de sus respectivas tapas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	19

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	6 Und.
 		

5.1.13 **ACTIVIDAD ITEM 5.3 Traslado de señales de transito**

Actividad que comprende nivelar las cajas de servicios públicos de las viviendas a los niveles de diseño del andén a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la protección de los medidores.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	19

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Cra 29 entre calle 10 y 11	2 Und.




5.1.14 **ACTIVIDAD ITEM 8.2 Plan de manejo de tráfico**

Esta actividad corresponde a la implementación del PMT para mitigar el impacto generado por la intervención a realizar en la dirección y tramos de las calles, las carreras y los sectores residenciales y vías de jerarquía inferior aledaños, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, organizado, ágil y cómodo tanto como para los conductores, pasajeros, peatones, personal de obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
8.2	Plan de manejo de tráfico	UND.	1	0,25

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO								
FRENTE DE OBRA :								
PERIODO:	01 A 30 DE JUNIO DE 2023							
RESIDENTE INTERVENTORIA:	EDWARD RICARDO VERA							
ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	ponderación	FRENTES DE INTERVENCION				% de cumplimiento	OBSERVACIONES	CALIFICACION
		100%	SAN ALONSO	AURORA	CHAPINERO	UNIVERSIDAD			90%
1	**Señalización general frente**	33%							30%
	Señales fijas	10%	SI	SI	SI	SI	100%		10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%	SI	SI	SI	SI	100%		20,00%
	Señalización luminosa	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%	SI	SI	SI	SI	100%		10,00%
2	**Manejo peatonal**	45%							43%
	Estado de Señalización	12%	SI	SI	SI	SI	100%		12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%	SI	SI	SI	SI	100%		25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%	N/A	N/A	SI	SI	80%	Se evidencia falta de señalizacion en el fin de obra	3,20%
	Barricadas y/o maletines	4%	N/A	N/A	SI	SI	80%	Se evidencia falta de maletines en el frente de la universidad	3,20%
3	**Personal asignado al PMT**	18%							13%
	Asesor de transito	4%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Pmt vigente aprobado	4%	SI	SI	SI	SI	100%		4,00%
	Controlador de tráfico (mínimo 2)	10%	SI	SI	SI	SI	90%	Se ausentan de manera constante	9,00%
4	**Actividades de contigencia**	4%							4%
	Atención oportuna	4%	SI	SI	SI	SI	100%		4,00%

Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%
Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma:
Residente de interventoria
ING EDWARD RICARDO VERA R.



Firma:
Residente de obra
ING. LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES

6 CLIMA

A continuación, se presenta el estado del clima en cada uno de los días de ejecución del contrato, donde se evidencia el trascurso de cada día y las afectaciones que puede llegar a tener en la ejecución del contrato

MES: JUNIO						DIRECCIÓN: REPORTE GENERAL DE LOS 3 FRENTES																								AÑO: 2023
	B	LLUVIAS DE BAJA INTENSIDAD				F	LLUVIAS FUERTES				S	SOLEADO			N	NEBLINA													
HORA / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 -8:00	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	N	S	S	S			S	S	N	S	S			S	S	S	S	
8:00 -9:00	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	
9:00 -10:00	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	
10:00 -11:00	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	
11:00 -12:00	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	
12:00 -13:00	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S	
13:00 -14:00	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S	
14:00 -15:00	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S	
15:00 -16:00	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S	
16:00 -17:00	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S				S	S	S	S	

En el periodo comprendido no se presentan lluvias de fuerte intensidad, por lo cual no se suspende la jornada laboral en dichas fechas.

7 INFORME DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

La interventoría realiza seguimiento a la calidad de los materiales usados en obra para garantizar la idoneidad de los trabajos realizados en los diferentes frentes, en este momento de la obra se están realizando actividades de instalación de subbase e

instalación de senderos peatonales en cada uno de los frentes a intervenir, cumpliendo con los estándares de calidad. Se adjuntan resultados con soporte fotográfico en el anexo No. 6.-Ensayos y densidades

- Se realiza ensayo de densidades el día 21 de junio en la calle 41 con carrera 25 por barrio la Universidad, dando resultados superiores al 96% en la Sub base .
- Se realiza ensayo de densidades el día 21 de junio en la calle 41 con carrera 33 con calle 18 barrio San Alonso, dando resultados superiores al 97% en la Sub base.

8 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

La interventoría realiza el seguimiento en cada uno de los frentes donde se está realizando la intervención (San Alonso, la universidad, aurora y chapinero), donde se evidencia el uso adecuado del plan obteniendo una ponderación del 90% en la implementación del plan de manejo de trafico debido a que solo cuenta con los debidos controladores viales en 2 de los 9 frentes a intervenir, donde la interventoría solicita la implementación en posibles escenarios en los cuales se puede generar un accidente.

9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Se ha enviado solicitudes al contratista con la finalidad de atender los requerimientos en la parte administrativa, técnica, SST y socio ambienta
- Se ha realizado comités semanales de obra para analizar el avance de la obra y platear compromisos por cada uno de as partes que integran el proyecto para lograr un correcto desarrollo de este
- La interventora realizo la revisión de las hojas de vida del personal administrativo y los aportes a la seguridad social de los trabajadores operativos que ingresaron a la obra en el presente periodo
- Se realizan anotaciones diarias en la bitácora de obra donde se dejan plasmadas las actividades diarias y requerimientos por parte de la interventoría, contratista y entidad contratista a que haya lugar
- Las pólizas de contrato de obra se encuentran actualizadas y vigentes
- La interventoría realiza seguimiento sobre el plan de contingencia entregado por el contratista debido a los atrasos presentados a lo largo del proyecto

CONTRATO DE OBRA No. 022

DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1
- LA VEGA
- LA AURORA

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 3

Powered by CamScanner

14 m x 0,25 x 0,30 = 1,05 m^3 o descapote 4.65

Inspector de Obra | Residente | Interventoría

31-05-2023

continuamos instalación losetas costado pino. demolición y excavación costado oriental, demolición bordillo existente (30,20 m) total demolición 1,60 m

Inspector de Obra | Residente | Interventoría

01-06-2023

Construcción de rampa peatonal, instalación de losetas, demolición de rocas, rompimiento de tubo matriz de agua, daño reportado. se reparó en la tarde por el maestro. se reciben 8 m^3 de arena pareja. se recogen en volqueta 8 m^3 de escombros.

Inspector obra | Residente | Interventoría

02-06-2023

Se continúan trabajos de instalación de losetas se hacen una columbina. se rompió un tubo de agua. se realizó resane de sumidero. 3,3 x 0.15 se recogen en volqueta 8 m^3 de escombros

Inspector de Obra | Residente

03-06-23

continuamos trabajo de Excavación costado oriental e instalación de bordillo. se lesionó el ayudante Ever con un sardinel de 0.80m

a las 10:30 y fue trasladado de urgencias a la clínica la Riviera.

Inspector de obra — Residente

05.06.2023

Continuamos con trabajos de excavación vía nueva, instalación de sardinel 3 ayudantes y 1 oficial. adecuación del anuro. Sale volqueta con escombro con 6.5 m^3 para completar en S/alonso.

Inspector de obra — Residente

06.06.2023

Iniciamos obra con 3 ayudantes y 1 oficial para iniciar compactación sub-base.
Se continuan con instalación de bordillos y replanteo para su instalación en parte baja del costado occidental.
Visita del ing Edgar Bayona Supervisor de infraestructura decide que el sardinel se una a la vía 2 m antes del bordillo existente del costado occidental de la parte baja. Hubo derrame de pintura verde generado por vandalismo en la curva superior del costado occidental llega rana compactadora en buenas condiciones

Inspector de obra — Residente

07-06-2023

iniciamos el dia con 3 ayudantes, 1 oficial 2 palateras. se continuan trabajos de instalación de Sardinel. perforaciones para anclar dobelas.

07-06-2023 Hora 3:15 pm

personal del dia 3 ayudantes 1 oficial. 2 Damos moviendo el transito vehicular. se solicita terminar de pegar las chazos de la losetas y rebrechar asi misma forma. se recomienda dar mejor acabado al sardinel cuya cara parte donde se monto. a ampliar la via. compactar la sub. base esta se organiza no se encuentran. Fundan en concreto.

esp. interventoria

se recibe la pintura gris basalto para el muro del costado de pinos. inspeccionar el taladro percutor o rotomartillo para perforar y anclar varilla de 3/8

Inspector de Obra — Residente

08-06-2023 Hora 8:35 AM

se hace recomendación de corregir las losetas que se encuentran altas, bajas. sin brechar. hacer orden y aseo. compactar muy bien la sub. base. personal. 1 inspector. 1 oficial. 4 ayudantes.

esp. interventoria

continuamos instalación de Sardinel, interventoria realiza visita tecnica si fisi de la cinz y cella observan anomalias en las losetas, correg se entrega Rotomartillo. llega Pavi compactadora. Llovia desde las 3½ pm. corte de via. no se permite el oficial Alexis por llegar alicorado

Inspector de Obra — Residente

024

09-06-2023

9 Junio de 2023 Hora 7:35 AM.
Hago anotación por lluvia 3:30 PM y suspendieron labores en el resto de tarde. Lluvias supertuertes.
En el día de hoy se recomienda hacer muy bien los anclajes de 3/8 con epoxico muy bueno para que funcione entre el concreto antiguo y el concreto nuevo. en la ampliación de viga. se recomienda que esta no revisan por interventoría no se autoriza fundir, Ingen. interventor 9:50 AM recontarin el borde del concreto antiguo. estan colocando los anclajes con Epoxico. bien centrados, y se procede a fundir con concreto especificado y de 3000. psi de resistencia. se autoriza fundir en. sistema intermedio. Ingen. interventor
Continuan trabajos de adecuación para fundir loza de concreto de 3.000 PSI
cuentan con 1 oficial 3 ayudantes
Se acata recomendacion de interventoria
Visita de Jose Domingo ortega llueve desde las 2½ pm hasta 5½ pm por lo tanto se suspenden labores. lluvia de alta intensidad.

Inspector de obra — Contratista

10-06-2023

Iniciamos obra con solo 3 ayudantes sin oficial.
Recalce de tapas valvulas de paso de agua ±2

Inspector de obra — Contratista

13-06-2023 D/a Soleado

iniciamos obra con 2 ayudantes i oficial
9:25 AM se realiza recorrido cotidiano y se
Encuentra 1. controladora de Trafico, 1. Oficial, 2. Ayudante
1. insp obra civil. se está Batiendo en mezcladora para
Fundir las Lozas pendientes de la ampliación de via
El concreto lo' están Batiendo con resistencia de
3000 p.s.i. Esta es la actividad de reforzamiento
El dia de hoy. ——— insp. interventoria

14-06-2023 miercoles. Hora 11 AM.
En recorrido cotidiano se encontraron 2. Ayudantes 1. persona haciendo Aseo, 1. insp. obra civil, 2 personas - controladores de Trafico. Se hace las siguientes. recomendaciones. revisar la junta "brechas" de las losetas. y echarle la mezcla fina. repintar el Nuva con Gris Basalto. hacer Limpieza General y recoger El Material Sobrante. dejar Totalmente Limpio de Toda Suciedad echa o causada por la ejecución de la obra. ——— inspector interventoria:
Se continuan trabajos de remate de bordillo se repinta nuevo con gris basalto, se brechas las baldosas y hacemos recogida de material, aseo y limpieza, se acatan las recomendaciones del inspector José de la cruz.

Inspector de obra Residente

15-06-2023 soleado

Encontramos el dia con 2 ayudantes para hacer trabajos de limpieza y traslado de materiales hacia la acera.
Hora 8 AM recorrido de rutina 2 señoras haciendo Aseo General y recogiendo Material sobrante, en costales de fibra, Impalpable se sugiere regar arena fina sobre la Loseta. para recubrir las brechas entre ellas. ——— insp. interventoria.

Powered by CamScanner

se acata la sugerencia del interventor José de la cruz y se procede a retirar el agua lluvia y la escorrentía secaba la arena de las losas.
Se le cancela al Sr Nelson Tobosa los días de anemado y recibo de los $275.000.
Hay y salvo con el Sr Nelson T.

Supervisor de obra — Residente — Interventoría

16-06-2023 Hora 8:45 AM en recorrido cotidiano diario. Se encontro 1 insp obra civil, 1 persona obrero haciendo aseo, donde acopiaban los materiales. se les recomendo. descarchar. los residuos de concreto, mortero, y recoger todo lo relacionado con escombros, residuos de tierra. debe de quedar 100% limpio y en optimas condiciones
Insp. de interventoria

17-06-2023 Hora 7:50 AM en recorrido cotidiano sector la vega Montevideo comuna 14, se encontraron ejecutando las siguientes actividades. recordando el muro parte superior para darle un mejor acabado. las tapas de las valbulas del acueducto. se fundirán para dar mejor presentación. se sugiere dejar todo muy limpio. Nota Tratar 100% de darle mejor acabado en recorrido, Horadores: Insp interventoría
Se acatan las recomendaciones y seguimiento de interventoria. se aprecia en el cordon ambiental un retroceso del suelo y separación del concreto provocado por las lluvias de esta semana.

Supervisor de obra — Residente — Interventoría

17.06.2023 dia nublado

se continua labores de adecuación sobre derecho del rio Eclipse para dar los ultimos retoques de la

obra con 2 ayudantes y 1 oficial. rectificacion del muro y repisada con gris basalto

Inspector de obra — Residente — Interventoría

20-06-2023 Hora 8:00 AM En recorridos cotidianos se Encontro un ayudante pintando el muro de la zona verde. y el señor insp obra civil Rebrecharndo la Loseta y Cuarto General. para dar por terminado las actividades de este frente de trabajo para sector la vega de Marroneo comunes hoy. yo les dije a los ing Libran que el ing Eduardo da la ultima palabra sobre la terminación insp. interventoria

Inspector de obra — Residente — Interventoria

21-06-2023 Soleado.

frente 10 AURORA C/ 31 KR 28 y 29.
se inician labores de localizacion y replanteo con 1 oficial y un ayudante

Inspector de obra — Residente — Interventoria

22-06-2023 Nublado

7:00 AM iniciamos labores con 1 oficial y 1 ayudante. continuamos cerramiento y elaboracion de colombinos.
Empezamos demolicion con martillo demoledor se suspenden labores por lluvias moderadas desde las 3:45 pm
Se inician trabajos de demolicion con un oficial y un ayudante. el cerramiento se inicia desde la esquina cll 31 con cra 28 hasta el predio 28-60, dejando los accesos a los parqueaderos de los edificios. Kelly Jimenez M Insp. Int.

Inspector de obra — Residente — Interventoría

23-06-2023 Nublado.

7:00 am Se inician labores con un oficial y un ayudante, realizando actividad de demolición con martillo demoledor.

Inspector/obra

24.06.2023 Soleado

7:00 continuamos trabajos de demolición con 1 oficial y 1 ayudante de la Kr 28 con 31 con martillo demoledor

Inspector de obra

26.06.2023 Nublado

7:00 AM: hasta el momento no ha llegado nadie para iniciar obras; llega el oficial César a las 8:00 AM a iniciar labores. Llegan 2 ayudantes a las 10:00 AM Demolición varios en concreto.

En visita de recorrido entre contratista, Interventoria y el supervisor Wilson Motta de la Alcaldia se definen los siguientes aspectos:


1. Las rampas peatonales entre cll 31 con cra 29 esquina se dejaran como se encuentran las actuales, su ubicación no tal cual pero cumpliendo las especificaciones del manual de espacio publico actual.
2. Se respetaran la jardineras existentes conservando los 2 mts de ancho de la franja peatonal, bordeados con el alcaque en concreto.
3. La franja visual delimitara la franja peatonal con las jardineras existentes ejm

Antejardines

FC

Via

4. Edificio del ano #28-38 se determina eliminar el cambio de nivel existente en la franja de circulacion, Aumento la pendiente de salida actual del parqueadero del edificio



se presentan lluvias desde la 1½ PM hasta las 3:00PM

Inspector de Obra

27-06-2023 Nublado

7:00AM se continuan labores de demolición con 1 oficial y 2 ayudantes.

Por disposición de interventoria se realizan cambios en el perfil vial: mantener las jardineras, realizar alcorques en los árboles, mantener la franja visual contiguo al sardinel, la franja peatonal se mantiene de acuerdo al perfil vial. se instalaran los adoquines como especifica el perfil. Autorizó Edwar Vera.

la intervencion en la esquina de la 31 con 29 no se intervendria, solamente la franja ambiental y la franja peatonal por la cl 31

Continuan trabajos de demolicion frente a obra abandonada donde el espesor de la placa oscila entre 30-40-70cm lo cual a dificultado tener un avance representativo. se les sugiere si es necesario el uso de otro martillo demoledor mas, para poder avanzar lo mas rapido y mejor posible en esta actividad.

Kelly Jimenez M.
Insp. Int.

Inspector de Obra

28-06-2023 Nublado
7:00AM iniciamos labores con 1 oficial 2 ayudantes. en actividades de demolicion. desmonte de 2 bolardos. llegan 53 sardineles. Salen 2 viajes completos de residuos sólidos (8m³) c/u Continuan con demolicion de placa frente a obra abandonada, excavacion y replanteo zanja sardinel. en la demolicion continua un espesor promedio 40 cm.

Kelly Jimenez M.
Insp. Intv.

Inspector obr

29-06-2023 Soleado.
7:00 Iniciamos labores con 1 oficial y 3 ayudantes para continuar labores de demolicion y excavacion para instalacion de sardinel. sale viaje de 8m³ de escombros

Inspector de obra

30-06-2023 Soleado
7:00 iniciamos labores continuando con demolicion con 1 oficial y 3 ayudantes. continuamos la excavacion para instalacion de sardinel 0.80m, sin presencia de la interventoria. Sin embargo a las 3:45 hizo presencia interventoria la ing Kelly Jimenez.

Inspector obr

01-07-2023 Soleado
7:00 iniciamos labores con 1 oficial y 3 ayudantes, la ing Ilana Pendiente

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - SANTANDER

GRUPO No. 1

Frente (LOS PINOS) (LA UNIVERSIDAD)

CONSORCIO SANTANDER
2023

Powered by CamScanner

en carrera 34 entre calles 17 y 14. Se realiza realce sumidero, se realiza construcción de vados vehiculares y peatonales en carrera 34 entre calles 13 y 14. Jornada de aseo y limpieza. Personal en obra (2 oficial y 4 Ayudantes).

Residente

INSPECTOR OBRA

Fecha 30/05/23

Clima Soleado.

Frente Los PINOS: Se realiza actividades finales de obra como lo sum remates de rampa. Se realiza actividad de aseo y limpieza. Personal en obra (1 oficial 2 ay.dantes)

Frente Crr 29 entre calles 10 y 11: Se inician actividades de obra a las 7:00 am, actividad de cerramiento de zona a intervenir, se inicia actividades de demolición de varias en concreto. Personal en obra (1 oficial y 4 ayudantes. (Se recibe material de ferretera).

Frente Calle 9a entre carreras 24 y 25. Se inician actividades de cerramiento y demolición de varias en concreto y excavación manual. (Personal en obra: 1 oficial y 4 Ayudantes). Se determina por interv. 0,80 de talla el alcorque.

Residente

INSPECTOR OBRA:

Fecha 31/05/23

Clima: Soleado.

Frente trabajo Crr 29 entre calles 10 y 11 se continua con actividades de demolición y excavación manual. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Llega volqueta (Escombros). llega arena y material de ferretería.

Frente trabajo calle 9a entre carreras 24 y 25. Se continuan actividades de demolición y excavación manual. Llega materia Ferretena y arena. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).

Residente

INSPECTOR OBRA

Fecha 01/06/26 Clima: Soleado.

Frente de trabajo carrera 29 callas 10 y 11. Se continua

con actividad de excavación manual y demolición de varias en concreto, tambien se ejecuta actividad de localización y replanteo. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Frente calle 9ª entre cra 24 y 25 Se continua con actividades de demolición, llega material prefabricados y Sub base. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes) Se realiza aseo.

INSPECTOR OBRA

Fecha: 02/06/23.

Clima: Soleado.

Frente trabajo cra 29 con calles 10 y 11 se continua con actividades de excavación manual y localizacion y replante de la zona intervenida. Se aplica sub base 3/4. y se inicia la instalación de sardinel 0,80m. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Llega volqueta por escombros Frente trabajo calle 9ª entre cra 24 y 25. Se continua con actividades de demolición y excavación manual. Llega material prefabricados. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes)

INSPECTOR OBRA.

Fecha. 03/06/23.

Clima: Soleado.

Frente de trabajo cra 29 con calles 10 y 11 Se continua con actividad de demolición e instalación de Sardinel 0,80 m. Personal en Obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Volqueta recoge escombros Frente trabajo calle 9ª etre carr 24 y 25. Se continua con actividad de excavación manual e inicia actividad de instalación 0,90 m Sardinel Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).

INSPECTOR OBRA.

Powered by CamScanner

Fecha 05/06/23.
Clima: Soleado.
Frente de trabajo Crr 29 entre calles 10 y 11. Se inicia actividad de construcción del espacio publico (loseta y adoquin). Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Frente de trabajo calle 9ª Se continua con actividad de instalación de sardinel 0,80 m. Se continua con actividad de localización y replanteo. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes). Se realiza aseo y limpieza. Se recibe visita por parte del ing Wilson. Motta. donde se aclara hasta donde debemos intervenir esto ya que hay otro contratista que va a intervenir la calle 10 en via y urbanismo, la reducción de área es de 14,90 m², zona a la cual ya se habia ejecutado actividades como demolicion, Exc y repl, excavación e instalación de sardinel. INSPECTOR OBRA Residente Interventoria

Fecha 06/06/23
La interventoria Realiza recorrido por el Frente de pinos sobre la carrera 34 entre calles 12 y 14, evidenciando que los Senderos peatonales no cumplen con la pendiente donde se presenta transicion, tambien se evidencia que no se cumple con los alineamientos en la loseta, tanto la guia como la visual, se le ordena al contratista revisar y reparar las pendientes de las transiciones de los Senderos, entre las rampas vehiculares y el segmento de Franja, tumbien la interventoria dejo señalado cada una de las losetas que se deben levantar y volver a instalar correctamente, hasta que no se encuentre debidamente terminado la interventoria realizara la revision y recibo de este Frente.
La interventoria solicita el retiro de los escombros que se encuentra sobre la via de la carrera 34 entre calles 13 y 14, tambien retirar el material sobrante de material retreo

y losetas prefabricadas, tambien se presentan detalles de aseo y limpieza fuerte, para dejar totalmente terminada la fecha, para dejar totalmente terminada el frente.

el no cumplimiento de estas solicitudes puede llegar a generar procesos sancionatorios y no sea tomado como justa causa de retraso como las ya se han venido presentado en obra

Residente de Interventoria. | Residente de Obra Contratista | Interventoria

En visita del frente en calle 9ª entre Crr 24 y 25 se determina las siguientes aspectos técnicos:

① Radios de giro de la rampas vehiculares a 0,50m a partir de la fecha (se venian instalando a 0,30 m. Primera instrucción dada. Por instrucción de Supervisor

② Entre las casas 24-31 y 24-23. se determina construir grada (2 contra huellas y 1 huella un concreto de 1 mt de ancho en la entrada vehicular de la 24-31 y el restante en loseta

③ Pendientes maximas longitudinales 10 %

④ Se define construir (Dejar acceso vehicular) en 6 viviendas. Adicionan 1 de las 5 ya confirmadas

En constancia firma interventoria y consorcio.


Residente Interventoria | INSPECTOR OBRA | Residente

Frente Crr 24 entre calles 10 y 11 se continua con actividad de instalación de loseta y adoquín Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).

INSPECTOR OBRA. | Residente | Interventoria

— o — o — o — o —

fecha 07/06/23.
Clima: Soleada.
Frente de trabajo cra 29 entre calles 10 y 11 se recibe visita interventoria se define ubicación y pendiente de rampas peatonales, se habia determinado en la fecha 30 Mayo por residente de interventoría que el bordillo para arboles iba 980 m para cada lado del tranco del arbol... a la fecha de hoy se toma diferente decisión y no quedará el arbol centrado, Se solicitó alinear con bordillo del anterior arbol. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).
Se solicita al contratista en el frente cra 29 entre cll 10 y 11 el cambio de adoquines y loseta que se encuentran sueltos, hundidos, con tropiezos, fisurados, desportillados o con defectos que afecten el acabado final, teniendo en cuenta que al momento de brechar esto no va a mejorar, Así mismo la solicitud al proveedor de los desperfectos de terminacion o acabado con el que estan llegando a obra los adoquines y losetas, que esta llegando muy fresco y no cumple con los especificaciones técnicas. Se Anexa Imagen Kelly J. Insp. Int.
En frente de calle 9a entre cra 24 - 25. Se determina por interventoria que los bajantes de las casas. 24-9 y 24-03 se llevaran las aguas al sumidero más cercano. y las aguas del resto de casas se sacaran a la via principal. Tambien determinan ubicación de la rampa peatonal de la esquina de la cra 25 con calle 9a. se construira teniendo como referente el sumidero existente en frente y corriendonos apiux. 1,50 m. del área inicial a intervenir. (Personal en obra 1 oficial y 4 Ayd).

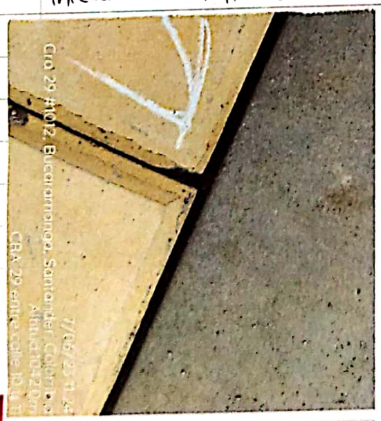







Powered by CamScanner

Fecha 08/06/2023
Clima Soleado / lluvias
Frente trabajo: calle 9ª entre Cra 24-25 se continua con instalación de sardinel 0,80 y 0,20. Se inicia aplicación Sub base 3/4 y localización y replanteo. Se encuentra en obra (1 oficial y 4 Ayudantes)
Se solicita ensayos de densidad en campo.
La interventoria sugiere compactacion del material de relleno comun, antes de la instalacion de la sub base, que tambien debe ir compacta, adicional se les reitera la no instalacion de sardineles, loseta ó adoquines desportillados, fisurados o con acabados que no cumplan las especificaciones tecnicas.

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria.

Interventoria

En los frentes del barrio Pinos en la cra 34 entre cll 12 y 13 y cra 34 entre cll 13 y 14 el dia de hoy se termino el retiro de escombro y material sobrante, pero la via y algunas areas quedaron con materiales particulados sueltos (cascajo) que se debe barrer para evitar accidentes.
El dia de hoy aun no inician la reparacion y arreglos solicitados en los frentes mencionados.

Kelly Jimenez M.
Insp. Interventoria.

Frente de trabajo cra 29 entre calles 14 x 11
Se continua con instalación de loseta y se construye vados peatonales, a su vez se construye franja de ajuste al predio. Se realiza jornada de aseo y limpieza (Ayudantes 4 y 1 oficial).

Inspector Obra

Fecha 09/06/2023.
Clima: Soleado / lluvioso.
Frente de trabajo calle 9a entre cr 24 y 25. se realiza actividad de compactación de material de mejoramiento común solicitado por interventoria y material subbase en zona de peatonal. Se continua con instalación de Sardinel y se realiza aseo y limpieza. Personal Obra (1 Oficial y 4 Ayud).
Frente de trabajo cr29 entre calles 10 y 11 Se continua con actividades de instalación de loseta, realce de cajas SP y Sumidero., se construye vados Peatonales y franja de ajuste al predio.
Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).
Residente
INSPECTOR OBRA. Interventoria

Fecha 10/06/2023
Clima: Soleado.
Frente de trabajo cr 29 entre calles 10 y 11 Se construyen bordillos en alcorque de arboles existentes en la zona; se termina franja de ajuste. y se realiza aseo y limpieza. Personal obra (1 ofical y 4 Ayudantes).
Tambien se hacen correcciones de losetas y adoquines no aprobados por interventoria: Frente de trabajo. calle 9a entre crr 24 y 25. Se realiza actividad de replanteo y aplicación de Sub base 3/4., se termin instalación de sardinel, Se realiza actividad de aseo y limpieza. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).
Residente
INSPECTOR OBRA. Interventoria

Fecha 13/06/2023. Clima. Soleado.
Frente de trabajo calle 9a Entre Crr 24 y 25. se inicia actividad de construcción de espacio publico (Loseta) sin presencia de interventoria, se continua con replante y aplicación de Sub base 3/4. Se realiza actividad de Aseo y limpieza. (Personal en obra 1 oficial y 4 Ayudantes)
Residente
INSPECTOR OBRA. Interventoria


024

Fecha 14/06/2023
Frente cra 34 entre cll 12 y 13 y frente cra 34 entre cll 13 y 14 al dia de hoy no hay presencia del personal del contratista realizando los arreglos.

Kelly Jimenez M.
Insp. Interventoria.

Frente 9a entre cra 24 y 25, el cerramiento se encuentra desorganizado, se le solicita al contratista el ajuste entre linea visual y el sardinel que presenta mas de 10cm de brecha.
Se le reitera al contratista la no instalacion de ningun material prefabricado (sardinel-loseta-) que se encuentre despostillado, fisurado o con algun desperfecto en el acabado que no cumpla con las especificaciones tecnicas. (hombros de diferente color)
Se le recuerda al contratista que distancia maxima entre sardineles es de 2cm, los instalados en la cll 9a entre cra 24 y 25 presentan brechas hasta de 4cm y que debe ser realizada con mezcla, se observa en la "mezcla pega" material particulado de gran tamaño que no cumple.
se anexan imagenes de lo anteriormente mencionado.




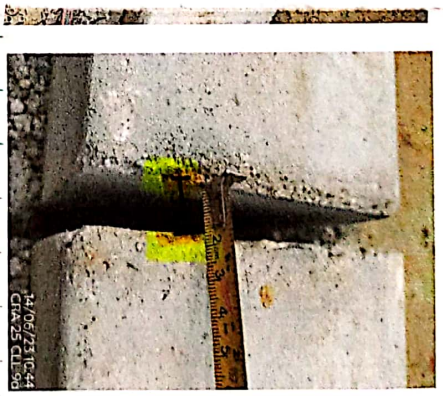






Powered by CamScanner

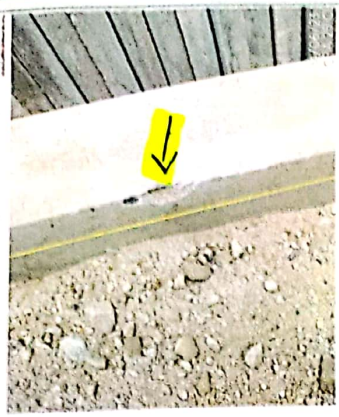



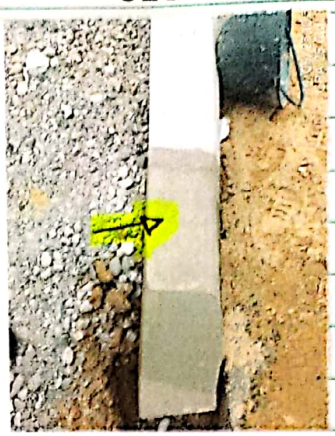

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria

Frente de la 9ª se realiza actividad de construcción de espacio publico (Loseta). Se realiza jornada de aseo y limpieza.

Miller Juez Zuluaga
INSP. OBRA.

Residente

Interventoria

Fecha: 15/06/23

Clima: Soleado.

Se inician actividades de instalación de loseta en calle 9ª entre Cr 24 y 25 sin presencia de interventoria.

Frentes pinos entre la cra 34 cll 12 y 13 inician labores de arreglos, se encuentra un oficial y un ayudante, en el frente de cra 34 entre cll 13 y 14 no hay personal trabajando.

Frente cra 29 entre cll 10 y 11 La universidad, el dia de ayer se realizo una primer revision, se solicitaron los siguientes arreglos: Cambio o desmanche de todos los adoquines o losetas que se mancharon al fundir las franjas de ajuste, cambio de las losetas y adoquines, despatillados, fisurados, mal cortados, ajuste de las losetas y adoquines que se encuentran sueltas, hundidas ó altas ("con muela"), el arreglo de franjas de ajuste y alcorques despatillados y con pegues mal terminados, terminar de bruchas, rellenar bien la brecha de los sardineles, pero el dia de hoy no se encuentra nadie trabajando, ayer trabajaron medio dia, sacaron adoquines y no se han instalado nuevamente.

Powered by CamScanner

frente cll 9a entre cra 24 y 25, se encuentra el personal instalando losela, se les sugiere usar hilos para la alineacion e ir arreglando las que desde ya se ven desalineadas, no instalar las fisuradas, ni las que presentan en los bordes una fisura pequeña que se ve superficial pero que al momento del uso del espacio publico probablemente presente desprendimientos.

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria

En frente de trabajo de cr 29 entre calles 10 y 1
Se continua con arreglos sugeridos por la interventor
como lo son los cambios de adoquines manchado
instalación de señal de PARE y arreglo de
bordillos despicados, se espera para el dia de mañana
quede OK el frente de trabajo. (Personal en obra 2ayuda
En frente de trabajo calle 9a entre cr 24 y 25 se
continua con instalaáin de loseta y se reciben
sugerencias de la interventoria y se hace correcciá
INSP. OBRA.

Fecha. 16/06/2023
Clima: Soleado.
Se inician actividades a las 7:00am. de construcción de espacio publico, se continua con aplicacaán de arena fina (Brechar) sin presen de Interventoria. Personal (1 oficial y 3 Ayudantes).
Frente cr. 34 entre calles (12 y 13) y (13 y 14) Los Pin se encuentren haciendo arreglos. de cambios de nivel en compañia de la interventoria. se hace recorrido y se dejan acuerdos de arreglos tales como: ✓ Rebaba o corraza de rampas peatonales ✓ Limpiar loseta, muros y sardineles manchados con cemento ✓ Arreglar losetas sueltas y partidas ✓ Fracturas en Franjas de ajuste al predio y en rampas vehiculares ✓ Pendientes max 10% ✓ seguir

brechando ✓ Recoger escombros en jardinera esquina calle 12 ✓ Empalme rampa peatonal calle 12. ✓ Mejor todas las rampas peatonales. Mauricio Sanguino. Jayden M.
INSPECTORA. Residente.

Frente cra 34 entre cll 12 y 13, se realiza recorrido con el contratista ing. residente e inspectora para determinar nuevamente los arreglos y actividades a mejorar para poder recibir a satisfacción el dia 20 de junio como se acordo en comite; entre los cuales se les refiere: 1. mejorar y arreglar todas las pendientes longitudinales en los cambios de niveles que superen el 10%, asi mismo recordarles que el 10% de pendiente es el maximo permitido pero si es posible dejar menos pendiente se haga, ya que es importante recordar que este espacio publico sera usado tambien por personas discapacitadas. 2. Mejorar todos los franjas de ajuste que se encuentren torcidas, despostilladas, o que se encuentren por encima del nivel de las loselas. 3 Todas las loselas sueltas, hundidas o "altas" que causen tropezones a los peatones. 4. Todos los loselos que no tengan la alineacion correcta. 5. Todos los accesos peatonales que sus acabados "Rotomeado" no cumple con las especificaciones. 6 Todos los rampas vehicubles que se encuentran ya fisuradas. 7 Todos los realces de cajas que se encuentran mal terminados (bordes despostillados torcidos). 8 Revisar todos los brechas de las juntas de los sardineles que ya se encuentran con fisuras o dilatad 9. Todos las loselas partidas, fisuradas, despostilladas. 10. Cambio y arreglo de enchape acceso parqueadero predio esquinero cra 34 cll 13. 11. Limpieza de la via y muros parcimentos viviendas y antejardines que tienen escombro 12. Espacio publico totalmente brechado. y todo lo que a su consideracion no cumpla con las especificaciones tecnicas y e MEPB. En este frente se encuentra trabajando hay un oficial.

Kelly Jimenez M Insp. Int.

Interventoría

Frente cra 34 entre cll 13 y 14 barrio Rincon, en este frente se realiza tambien recorrido, las observaciones son las mismas que el frente cra 34 entre cll 13 y 12. En este frente no se encuentra nadie trabajando aún en los arreglos.
Frente cra 29 entre cll 10 y 11 barrio la universidad, el dia de hoy continuan realizando los arreglos, sigue sin ser retirado aun el material que sobro, Arena, triturado.
frente calle 9a entre cra 24 y 25, continua instalacion de loseta para construccion de espacio publico. Se les sugiere revisar muy bien las pendientes transversales para evitar cambios bruscos en las transiciones a los inicios de los accesos vehicolares y evitar al maximo que nos queden quiebres y/o ondulaciones muy marcados. Igualmente referirles que el nivel del espacio publico que se esta construyendo en lo posible no debe quedar por encima del nivel de la vivienda. Tambien se les recomienda pasar hilos transversalmente en cuadrantes maximo de 3m para evitar repicados referentes a la alineacion de las losetas, asi mismo conservar el hito y la alineacion inicial. y no retirarlo.

Interventoria — Kelly Jimenez M
Insp. Int.

No se autoriza instalacion de loseta, adoquin hasta que se ejecuten (lan der) los ensayos de densidades, de lo contrario deberian levantar posteriormente para recibo. Asi mismo informar con un dia de anterioridad minimo el dia y la hora en que se van a tomar dichos ensayos para definir en que sitio se hacen los ensayos.

Interventoría — Kelly Jimenez M.
Insp. Int.

Powered by CamScanner

En frente de trabajo calle 9a entre cra 24 y 25 se acatan recomendaciones de la interventoría a cargo la inspectura Kelly con quien se determinan pendientes en campo y se autoriza dejar un resalto en el parqueadero de la casa 24-51. de 5,5cm. en uno de los extremos de dicha entrada, tambien se establece dejar el bombeo min y conservar la pendiente longitudinal en toda la zona a intervenir. Maber Cruz Jaydeff.

Fecha 17/06/23

Clima: Soleado.

Frente trabajo. calle 9a cra 24 y 25 Se continua con instalación de loseta sin presencia de interventoria, se instala Conexión de bajantes. Personal en obra (1 oficial, 4 Ayudantes

Maber Cruz Jaydeff. Residente

INSP. OBRA

Interventoria

Fecha 20/06/23.

Clima: Soleado.

Frente de trabajo calle 9a se inician actividades de instalación de loseta. con presencia de interventoria, Personal en Obra (1 oficial y 3 Ayudantes).

Frentes cra 34 entre dls 12 y 13 y cra 34 entre dls 13 y 14 barrio Pinos; el dia de hoy no se encuentra personal trabajando en los arreglos solicitados. Frente cra 29 entre dll 10 y 11 La universidad, en la mañana no se encuentra personal del contratista trabajando en los arreglos pendientes que se iniciaron donde se levantaron algunos adoquines manchados, pero no se volvieron a instalar de inmediato, lo que puede ocasionar que al momento de volver esten mas desalineados, se le recuerda al contratista que este frente aunque ha sido recibido y que llegado el caso, (debido) el dia de recibir se encuentre algo mas por arreglar o ajustar debido a esto deberan de igual manera solucionar, hasta que se pueda recibir a satisfaccion. La falta de logistica ha causado retrasos en los procedimientos

Interventoria

Kelly Jimenez M.
Insp. Int.

Frente cll 9a cda 24 y 25, continua instalación loseta para construccion espacio publico, asi mismo se realiza toma de ensayos de densidad antes de la instalacion, de no tomarse antes deberan levantarlas los y tomarla para la toma del ensayo antes de la entrega final. Tambien se les recuerda el uso de hilos longitudinales y transversales para el alineamiento, ya que se ha evidenciado errores en la ejecucion de la actividad y ha causado reprocesos. Se les recuerda avisar la toma de ensayos de densidad con un dia de anterioridad.

Kelly Jimenez M.

Se termina el dia con instalación de loseta en calle 9a entre cra 24 y 25. recibiendo observaciones de interventoria. Personal en obra (1 Oficial y 4 Ayudantes)

INS. OBRA.

Fecha. 21/06/2023

Clima: Soleado.

Se continua con instalacion de loseta en calle 9a entre cra 24 y 25. con presencia de interventoria definiendo en campo en presencia de Ing. Eduar vera que los parqueaderos de la casa 24-31 y 24-23 van fundidos a 1 metro y el restante va en loseta. Personal en obra (1 oficial y 3 Ayu)

Se realizan pruebas de densidad en calle 9a.

Frente cra 29 entre cll 10 y 11, en la mañana no se encuentra personal del contratista trabajando en los arreglos pendientes y poder recibir, se espera que en la jornada de la tarde retomen las actividades.

Frentes cra 34 entre cll 12 y 13 y cra 34 entre cll 13 y 14 barrio pinos hay se encuentra una persona junto al inspector Amaury retomando los arreglos de estos dos frentes.

Frente cll 9a entre cra 24 y 25 barrio la universidad. se realizan los ensayos de densidad, se le recuerda

al contratista que la interventoria definira el sitio para la toma de los ensayos, en caso de realizarsen despues de instalados las losetas, deberan levantar para esta actividad la loseta que se requiera, si es el caso.

Interventoria Kelly Jimenez M. Insp. Int.

En frente de trabajo cr 29 entre calles 10 y 11 Se continuan con ameglos finales para entrega a interventoria. En calle 9a se continua con construcción de espacio público y se ameglan solicitudes de la interventoria como lo son sardinel corridos y losetas desalineadas, también se toman muestras de densidades en puntos que define la interventoria (Insp. Kelly). Personal en Obra (1 oficial y 4 Ayud).

Insp Obra. Jorge M. Residente Interventoría

Fecha 22/06/23.

Clima: Soleado / Lluvias fuertes (3:30 a 5 pm).

En calle 9a entre cr 24 y 25 se continua con instalación de loseta en presencia de interventoria se definen niveles en casas. (24-17) y ( ). Se inican actividades de realce de cajas de servicios Públicos. Personal en Obra (1 oficial y 3 Ayudantes). En frente de trabajo de la crr 29 entre calles 10 y 11 se continua con actividad de brechar la loseta instalada y se dá por terminado ameglos pendientes sugeridos por Interventoria.

Fecha 23/06/23

Clima: Soleado parcialmente

En calle 9a entre Cr 24 y 25 se continua con instalación de loseta sin presencia de interventoria a la hora, se continua con realce de cajas de servicios públicos. Personas en obra (1 oficial y 2 ayudantes). En acompañamiento de interventoria, se definen pendientes trans.

Insp. Obra.


Fecha: 24/06/23

Clima: Soleado.

Se continua con instalación de loseta sin presencia de interv.

Powered by CamScanner

Se realza sumidero y se instalan bajantes casas (24-04) (24-09). Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes)
Mulu Suzy Tuke
INSP OBRA.
NOTA: Se define en cr 24 entre calles 9 y 99 y cr 24 entre calle 9 y 99 que el giro de la guia en una franja de 2 m. y el restante del anden en loseta lisa. pol interv. Residente Edwar Vera.

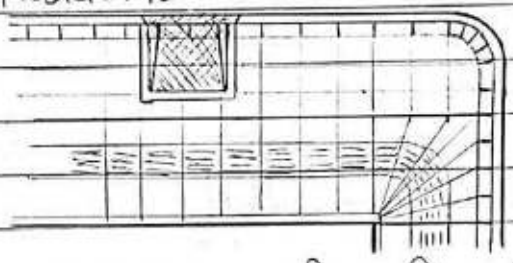

Mulu Suzy Tuke — Inspector
Residente
Interventoria

25/ JUN/2023

Clima: Nublado
7:00 am se inicia jornada con un (1) oficial y tres (3) ayudantes en la 9a entre cra 24 y 25 Barrio Universidad HSEQ de Interventoria y Consorcio hacen presencia en obra, se continua con instalacion de loseta, corte de loseta en Franja de ajuste, replanteo en cera (24-03) para pasar niveles.
Se le solicita al contratista el arreglo de los bajantes que quedaron por fuera de la franja de ajuste, tambien el uso de hilos que no se puede reemplazar con la regla metalica, es importante dejarlos durante toda la actividad de instalacion de la loseta. Se le sugiere al contratista debido al clima actual donde en la parada de la tarde esta llaviendo, no fundir ninguna actividad como franja de ajuste, rampas, realce de cajas, para evitar que se dañen y tener reprocesos, independiente del pago se les recuerda que al momento de recibir las actividades estas se hagan conforme a las especificaciones tecnicas.

Frentes cra 29 entre cll 10 y 11, cra 34 entre cll 12 y 13, cra 34 entre cll 13 y 14 al dia de hoy no han sido recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria, en los 2 frentes del barrio Pinos se encuentran realizando aun arreglos y en el de la 29 no hay presencia hoy de personal.

Kelly Jimenez M. — Residente — Interventoria
Insp. Interventoria.

27 Junio 2023

Clima: Parcialmente Nublado.

Al momento de la visita de la Interventoria no se encuentra presencia de inspector ni residente por parte del contratista.

Al personal le hace falta herramientas como el palustre plato adecuado para poder darle a las rampas y la franja de ajuste el acabado final como es, tambien se evidencia que falta loseta visual amarilla, No estan aplicando el Antisol a las rampas ni alas franjas de ajuste ni realce de cajas, Motivo por el cual en los demas frentes al momento de recibir todos los elementos fundidos estan presentando agrietamientos.

Se evidencia nuevamente losetas partidas, es importante que el contratista revise la calidad de los prefabricados con su proveedor.

Se les recomienda realizar el llenado de juntas o brecha del espacio publico al dia dia de instalado o no maximo a 3 dias para evitar que pierdan la alineacion con la que se instalan inicialmente, asi como la fundido de la franja de ajuste, ya que se ha evidenciado que cuando se demoran en realizar estas actividades, las losetas se desalinean y esto trae reprocesos, pues se les recuerda que al momento de recibir todo debera cumplir con las especificaciones tecnicas contempladas en el MEPB actual. y que ademas de ser funcional debe quedar estetico con los mejores acabados y terminaciones posibles.

EDWARD VERA.
INTERVENTORIA.

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria.

Powered by CamScanner

28/06/2023 Clima. Soleado.

Se continua con actividad de instalación de loseta realce de cajas de SP y pozo empas. Personal en obra (1 oficial y 3 Ayudantes).

cll 9a entre cra 24 y 25 se define que la loseta guie continue en el giro de las curvas de modo que formen un angulo de 90° en el centro de la curva y evitar el mayor desperdicio de loseta, ya que pasamos de un ancho de 1,60 a 3,60. el cambio de nivel entre los predios # 2431 y 24-23 continua siendo tal y como se estipulo una groda de 0,80 m de ancho, el ancho de la huella min 30 cm y los dos contrahuellas repartidos en la altura o diferencia del nivel de un predio al otro, que no supere los 17cm el remate de las rampas contiguas de estos dos predios en el cambio de nivel se realizara de manera que se minimice lo que mas se pueda la pendiente, jugando desde antes con los niveles de las dos rampas.

Kelly Jimenez M.
Insp. Int.

Frentes cra 29 entre cll 10 y 11, barrio pinos cra 34 entre cll 12 y 13 y cra 34 entre cll 13 y 14 al dia de hoy no han sido recibidos a satisfaccion por la interventoria.

Kelly Jimenez M
Insp. Int.

Se continua en instalación de loseta y se dejan pendientes y con interventoria.

Yulieth Sanz Tulande
INSP. OBRA.

Residente

Interventoria

29/06/2023 Clima: Soleado.

Se inicia actividades a la 7:00 am con personal en obra (1 oficial y 3 Ayudantes) se continuan actividades de realce de cajas y fundida de porqueaderos, en presencia de

Interventoria (Insp. Kelly).
Frente dll 9a entre cra 24 y 25, se realiza balance de cantidades con inspectora contratista Melisa S, continuan con fundida de vado vehiculares, construccion espacio publico, realce de cajas y fundida franja de ajuste

Kelly Jimenez M.
INSP. OBRA — Residente — Insp. Interv. — Interventoria

30/06/23 Clima: Soleado.
Se continua con realce de cajas en calle 9ª entre 24 y 25 (La Universidad). Personal en obra (1 oficial y 3 Ayud). En compañia de interv. (Ing. Edvard e Insp. Kelly) se define en casa (24-31) bordillo 9, 10 reforzado para confinar loseta seguido de la escalera ya antes definida. Frente 9a entre cra 24 y 25 se define con contratista ing. residente e inspector, como se va a fundir la escalera ó grado en el cambio de nivel de los predios # 24-31 y 24-23 continuan con realce de cajas servicios publicos.

Kelly Jimenez
Insp. Int

Se continua con fundida de franja de ajuste. y rampa vehicular. en calle 9ª. (1 oficial y 3 Ayudantes).
INSP. OBRA. — Residente — INTERVENTORIA

01/07/23 Clima: Soleado.
Se inician actividades 7:00 am sin presencia de interventoria, se continua con construcción de vados vehiculares, y realce de cajas de servicios públicos. (1 Oficial y 3 Ayudantes).
INSP. OBRA. — Interventoria

4/07/23 Clima: Soleado.
Se inician actividades 7.00 am, se continuan con actividades de realces de cajas, fundida de vados peatonales y franja ajuste, se realiza replanteo en vados vehiculares Personal en Obra (1 oficial y 3 Ayudantes).
Se realiza demolicion de escalera entre predios 24-31 y 24-23 fundida el dia viernes Paque no quedo con los

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 1

Powered by CamScanner

Fecha: 29/may/2023 Clima: Soleado

Se inician actividades 7:00AM con el personal de obra (1 Oficial y 2 Ayudantes), se realizan actividades de construcción de espacio publico segun MEPB y Piso en Adoquin Peatonal rectangular en la carrera 33a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se presenta el inspector de interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 30/may/2023 Clima: Soleado

Se inician labores 7:00AM con el Personal de obra (1 Oficial y 3 ayudantes), se realizan actividades de muro en concreto para desnivel de caja en la carrera 33a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se Presenta el inspector de interventoria Jose de la Cruz.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 31/may/2023 Clima: Soleado

Se inician labores 7:00AM con el Personal de obra (2 Oficial y 4 ayudantes), se realizan actividades de excavacion manual, y Relleno compactado con material de Sub-base en la carrera 33a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se Presenta el inspector de interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria.

Inspector de obra

Fecha: 1/Jun/2023 Clima: Soleado

Se inician labores 7:00AM con el Personal de obra (2 Oficiales y 4 Ayudantes), Se realizan actividades de excavación manual, Relleno Compactado con material de Sub-base, Franja ajuste y Construccion de espacio Publico Segun MEPB en la carrera 33a entre Calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se

Powered by CamScanner

Presenta el inspector de interventoria Jose de la Cruz.

Lina Cristancho
Inspector de obra
Fecha: 2/Jun/23 Clima: soleado
Se realizan labores desde las 7:00AM con el personal de obra (4 oficiales y 6Ayudantes) se hacen actividades de excavacion manual, Relleno con material de sub-base, Franjas de ajuste y Piso en adoquin Peatonal rectangular en la Carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se presenta el Inspector de Interventoria Jose de la Cruz.

Lina Cristancho
Inspector de obra
Fecha: 3/Jun/23 Clima: soleado
Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (4 Oficiales y 4Ayudantes) Se hacen actividades de excavacion manual, Relleno con material de sub-base, Franjas de ajuste y Piso en Adoquin Peatonal rectangular en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se Presenta el Inspector de Interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho
Inspector de obra
Fecha: 5/Jun/23 Clima: soleado
Se inician labores 7:00 Am con el Personal de obra (1 oficial y 2 Ayudantes), la bodega se encuentra abierta sin Taladro demoledor, 3 Pulidoras y rana compactadora que fueron robadas el Fin de semana, Se realizan actividades de adoquin Peatonal en la carrera 33 a entre calle 17 y 18

del barrio San Alonso, se Presenta el inspector de interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 6/Jun/2023 — Clima: Soleado
Se inician labores 7:00 AM con el personal de obra (3 Oficiales y 4 Ayudantes), se realizan actividades de demolición de varias, Construccion de espacio publico segun MEPB y Adoquin Peatonal en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se Presenta el inspector de interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 7/Jun/2023 — Clima: Soleado
Se inician labores 7:00 AM con el personal de obra (3 oficiales y 6 Ayudantes), se realizan actividades de Franja de ajuste, muro en concreto solicitado y autorizado por interventoria y Adoquin Peatonal en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se daña una compactador y se solicita tecnico, realiza visita inspector Jose de la cruz interventoria.

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 8/Jun/2023 — Clima: soleado / lluvioso
08.06.2023 Hora 9:58 AM. Hoy no está al dia, la Bitacora. El anterior no se hizo escrito porque la bitacora no se encontraba en obra hoy 08 de junio se encuentran varias anomalias, orden y Aseo no se a tenido encuenta. en varias ocaciones se les a sugerido, materiales sin cubrir, En losetas hay muchas imperfecciones. en las zontas de ajuste. no les echo continuas. hay muchos imperfectos. cajas de acueducto sin terminar escombros por todas partes. Insp. interventoria.

Se inician labores 7:00 Am con el Personal de obra (3 Oficiales y 6 ayudantes), se le indica al Inspector de Interventoria que los materiales no se encuentran tapados debido a que cada noche Se roban las Protecciones, hay Pendientes que se estan realizando bajo su criterio con el Fin de dejar todo Para su aprobación Final, Se realizan actividades de Construccion de espacio Publico segun NTPB y trabajos de escalera en desnivel de predio en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, Se Finalizan labores a las 3:00 pm Por Fuertes lluvias y realiza visita inspector de interventoria Jose de la cruz.

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 9/Jun/2023 — C. Raúl Soledad Narváez

Hora 9:00 AM se certifica dia anterior fuertes lluvias en horas de la tarde 3:00 pm se suspenden con actividad se solicita al señor contratista retiro de escombros. dejar terminada las Tapas Acueducto. Franja de Ajust bien terminadas y Retomadas, recoger desechos de Loseta Fuente al sitio Inicio de obra. dar acabad a los cameron Terrestres Electrificados. y poste transformadores. Todos los rellenos y sub base deben de ser compactados, tener compactador en sitio. Antes de hacer actividades los anteriores. de Soledad

9:10 AM
Insp. Interventoria

Se informa al inspector de interventoria que los escombros serán retirados en el transcurso de la mañana, el tema de mantener el compactador en sitio es necesario porque se estaban realizando actividades que no requieren Compactación.
9:30 Am llega volqueta Para retiro escombros.

Powered by CamScanner

10:00AM llega rana Compactadora para continuar con actividades de excavación manual y Relleno con material de SUb-base, Se realizan actividades de Prueba de ajuste, Adoquin Peatonal y escaleras en Concreto con el Personal de obra (2 OFiciales y 6 ayudantes), Se realiza Compactación y el interventor Jose de la Cruz, no se encuentra en Obra, El Residente de interventoria Edwar Vera define el desnival con escalera en concreto y terminacion escobiado, Loseta Guia, Toperol y visual antes y despues de escalera y rampa en adoquin, se Presentan fuertes lluvias (3:00 Pm).

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 10/Jun/2023 Clima: Soleado

Se inician actividades 7:00 Am con el personal de obra (1 OFicial y 4 Ayudantes), Se realizan actividades de piso en adoquin Peatonal y brecha en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.


Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 13/Jun/2023 Clima: Soleado

Se solicita a partir de la fecha pruebas de densidad 3 minimo por frente despues de la compactacion de la sub base, asi mismo el areglo de los reales de los cajas de servicios publicos que ya se han fundido y que han arreglado pero que aún asi siguen sin cumplir las especificaciones tecnicas, de igual manera todos las losetas, adoquines, franjas de ajuste, que se encuentran mal ejecutados, levantados, sueltas, con tropiezos, sin alineamiento, con brechas de hasta 2cm entre adoquin y la franja visual, de ser necesario demoler, para que los elementos del espacio publico cumplan con las especifi-


Powered by CamScanner

caciones del MEPB. se adjuntan imagenes.



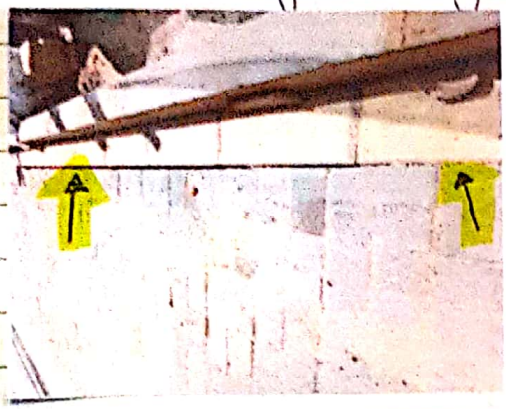




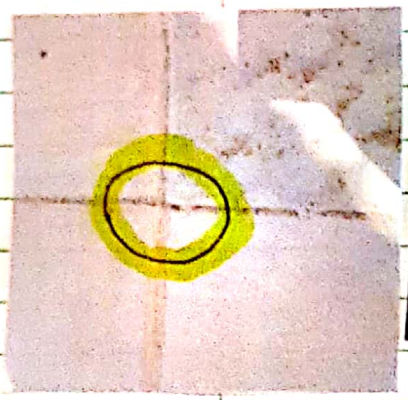





El dia de hoy no hay personal de obra trabajando en el frente cra 33a entre cll 17 y cll 18, Se solicita la demolicion de las escaleras frente al predio # 17-56, las cuales no cumplen las especificaciones tecnicas (se adjunta imagen)

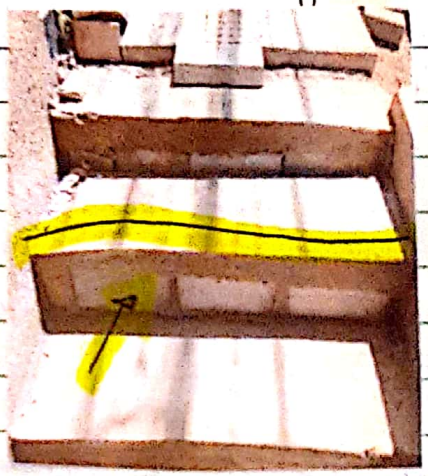

Se da inicio de obra en el frente cra 33 a entre cll 18 y cll 19, se solicita el retiro de escombro de los dos frentes en el barrio Son Alonso y mejorar el acopio de los materiales que se encuentran por todos lados

Insp. interventoria. 13-06-23

Se inician actividades en la carrera 33 a entre calle 18 y 19 del barrio San Alonso, con el Personal de Obra (5 Ayudantes) Se hace demolición de varias en concreto, se presenta la volqueta en obra Para retiro de escombros y se realiza aseo y organización de acopio de material, Durante el Fin de semana se robaron 15 señalizadores Tubulares y se ve afectado el sendero Peatonal de la carrera 33 a entre Calle 17 y 18, se presenta a obra inspector de Interventoria Jose de la Cruz.

Lina Cristancho
Inspector de obra

Residente

Fecha: 14/Jun/23 Clima: Soleado

Se inician labores 7:00 Am con el Personal de obra (2 Ayudantes) en la Carrera 33 a entre calle 18 y 19 Se realizan actividades de demolición en varias de concreto, llega volqueta a retirar escombros de acopio.

En la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso se inician actividades de mejoramiento de adoquin y otros segun lo solicitado por interventoria, con el Personal (1 oficial y 1 Ayudante)

Hora 11.25 AM En recorrido cotidiano se encontro que en cra 33A 17 y 18 se realiza el levantamiento del Area del adoquin. 1. persona en presencia de la insp. obra civil. Lina.

En el sector cra 33A Calles 18 y 19. se encuentra la Volqueta color Azul placas KFJ 461 recogiendo Escombros con 2 señoras paleando. 1 señor demoliendo. y recogiendo Escombros para Acopia. r. insp interventoria.

Se retira 1 Ayudante de la carrera 33 a entre calle 17 y 18,

Lina Cristancho
Inspector de obra

Residente

Fecha: 15/Jun/2023 Clima: Soleado

Hora 9:40 AM En recorrido cotidiano se encontro en el frente 7 cra 33A calles 17 y 18 3 personas Laborando. Levantando adoquin, levantando Mortero y van a recortar con pulidora cinta de agosto, y tambien la loseta Amarilla.

frente 2 carrera 33A entre calles 18 y 19 estan demoliendo con taladro demoledor y cortes con pulidora, estan retirando 3 personas obreros. 1. insp obra civil. se sugiere recoger los escombros. de ambos frentes. orden y Aseo.

~~Insp.~~ interventoria

Se inician actividades 7:00 am con el Personal de obra (1 OFicial y 2 Ayudantes) en la Carrera 33 a entre calle 17 y 18 y se realizan actividades de mejoramiento de adoquin y (3 Ayudantes) en la carrera 33a entre calle 18 y 19 con actividades de demolicion de varios m concreto, se Presenta robo de colombinas o señalizador Tubular y se ve afectado el sendero peatonal, ademas se presentan robos de Material de losetas. Realiza inspección el Señor Jose de la cruz.

Lina Cristancho
Inspector de obra

Residente

Fecha: 16/Jun/2023 Clima: Nublado

Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 OFicial y 5 Ayudantes) en la Carrera 33a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.

12.10 Meridiano En la obra calle 33A entre calle 17 y 18 se reinstalando el Tramo de Adoquin. que se levanto por mala instalación. se exige una clasificacion mas minuciosa para caer en error de calidad. por ese se hace esta recomendación para evitar no caer en errores posteros. Si se va a laborar deben de presentar la documentacion del personal

que van a Laboran y quieren del consorcio santander los van a compañar. hoy se encuentran 2 oficial 3 ayudantes 1 inspectora Obra civil. ing residente, 1 HSQ, Tambien se encuentra personal adicional de Metrolinea realzando Barras para sol de estacionamiento de Bus alcro linea.

En el Frente 2 carrera 33A entre calles 18 y 19 se Encuentran demoliendo y recolectando escombro para acopiar. tambien haciendo cortes de piso con pulidora. 2 Ayudantes. insp. interventoria

Se realizan actividades de mejoramiento de Piso en Adoquin, se realiza compactacion sin Presencia de interventoria y se humedece mortero por las condiciones climaticas, se continuan actividades de demolicion en la carrera 33a entre calle 18 y 19, se hace retiro de escombros. Realiza visita inspectores de interventoria e ingeniero residente, se revisa la nueva instalacion de Adoquin y se aprueba por interventoria con los niveles que se estan instalando. Frente al Predio 17-36 y 17-38

Lina Cristancho — Residente
Inspector de obra
Fecha: 17/Jun/2023 clima: soleado

Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (2 oficiales y 4 Ayudantes) Se continua con la modificacion de los niveles del Piso en Adoquin con la supervisión del inspector Jose de la cruz, se revisan niveles y se define trabajar Por tramos. El inspector de interventoria aprueba lo instalado el dia de ayer y lo Presentado para trabajar el dia de hoy en la carrera 33a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso

11:20 AM Se verificación Niveles y Trazos con hilos. 200 en adoquin .20 Loseta Amanilla. mas .10 entramo. entre 17.26 asta 17.56. y se Encontro .02 cms de mas Aberta el sardinel y se decidi dejarlo en

cinta de Aguste, para dejar corregido el desperfecto de Alineamiento. se le recuerda al Consorcio Santander que en Adelante debe de sacarce Pruevas de densidad a la sub base. se recomienda de compactar con compactador Saltarin o canguro, para lograr la densidad y hacino Tener inconvenientes a futuro. Sin este requisito, no se autoriza la instalación de adoquin, loseta, y demas personal que se encuentra laborando 2 Oficiales, 4 Ayudantes 1. Inspectora Obra civil. y Laboranin asta 5 pm: este respecto Al Frente 1 Carrera 33A calles 17 y 18.
El Frente 2 carrera 33A calles 18 y 19 se cargo un viaje de Escombro. se les sugerio hacer orden y aseo, dejar todo cerramiento y demarcación, hoy no se laboró en horas de la mañana. El ingeniero Oscar perada nos Acompaño en las Actividades del dia Sabado. ~~Ing.~~ Interventoria
Todas las actividades de compactación se realizan con rana autocompactadora y se realiza aseo en ambos frentes ademas de arreglar los cerramientos.

Lina Cristancho — Jayder M. Residente
Inspector de obra
Fecha: 20/Jun/23 Clima: Soleado
Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 Oficial y 6 Ayudantes) en la Carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso, se realizan actividades de relleno en Material de sub-base, se realiza compactación sin la Presencia de interventoria, se realiza demolicion, excavacion e instalacion de sardinel, se realiza aseo y se arregla cerramiento y acopio de escombros, Realiza visita inspector de interventoria y aprueba niveles del Predio 01.
Lina Cristancho — Jayder M. Residente
Inspector de obra

11:50 AM. Esta anotación se hace después de la socialización del Barrio chapinero entre carrera 17, 14 entre calles 4 y 5. Estuve acá en San Alonso carrera 33A entre calles 17 y 18. se realizaron revisación de Niveles con el maestro ejecutor, en la cual extendieron sub base y la compactación con canon manto Ramos y se hace la sugerencia que sea compactador vertical llamado "canguro" y con buena humedad para mejor compactación y resistencia también estaban haciendo las cintas de ajuste, junto con el acceso vehicular que se había dejado. se exija echarle antisol para evitar Fisuras, se demolio otra parte de Sardinel.
1 maestro, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 insp obra civil.
1 insp interventoria.

fecha: 21/Jun/23 clima: soleado

Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 5 Ayudantes), se realizan Pruebas de densidades en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 Frente al Predio 01, se deja todo sub-base con los niveles revisados y aprobados por el inspector de interventoria Jose de la cruz, se realiza aplicacion de Antisol a todo lo que se realizo el dia de ayer como cintas de ajuste y Rampas de ingreso vehicular, Se realizan actividades de demolicion e instalacion de Sardinel.

11:35 AM. Grupo 1 cuna 33A entre calles 17 y 18 se realizo rectificación niveles de la sub base instalada y compactada en la cual se realizaron 3 Apiques y las llevaron al Laboratorio en la cual enviaron los resultados, 1 Apique 97.72%, 2 Apique 95.68% 3 Apique 97.79%, esta cual se autorizo iniciar con Adoquin y todo cumplio con las dosificaciones y sugerencias que en reiteradas veces se hacen. Personal: 1 maestro 5 Ayudantes. - 1 incapacitado. 1 insp Obra civil. se esta instalando sardinel, esta la esquina de calle

18 con carrera 33A, se inician cortes de Material ceramico y demolicion de pisos. En el Grupo 2 cra 33A calles 18 y 19 no se esta interviniendo. se insiste. en orden de Material Loseta, Adoquin, brechas con misma Firma, ya dado orden de calle 17 a Jiu abajo. para mejor presentacion a nuestro sitio donde vamos Laborando. Gracias. [redacted] resp. Interventoria
SO realiza orden y aseo en ambos frentes y retiro de escombros, se realizan actividades de construccion de espacio segun MIPG

Lina Cristancho — Jaydoff. Presidente
Inspector de obra
Fecha: 22/Jun/2023 clima: soleado / lluvioso
Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 Oficial y 6 Ayudantes), Se continuan con actividades de demolicion de sardinel, excavacion, instalacion de Adoquin Peatonal y construccion de espacio Publico en la carrera 33A entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.
12 AM con permanencia a 95% de tiempo se realizan actividades. como Limpieza y Barrido, Brechas de Adoquin, Loseta. E instalacion de Adoquin, loseta corte de pisos existentes con pulidora y demolicion. Se permite dar acabado y mejoramiento a la Escalera 3 Huellas y contra huellas con concreto y epoxico de adherencia, Escobeado y Rotonado dar muy buen acabado Esto fué consultado al señor ing Bladimir pedo. se solicita dar inicio inmediato de trabajo en el sector dos cra 33A entre calles 18 y 19 sin demoler el sector 1 cra 33A entre calles 17 y 18.
[redacted] inspector interventoria.
Se Presentan Fuertes lluvias desde las 9:00 Pm y se hace necesario parar actividades y arreglar daños que se generan por

Powered by CamScanner

las lluvias.

Lina Cristancho Residente Interventoría
Inspector de obra
Fecha: 23/Jun/2023 Clima: Soleado
Se inician actividades 7:00 Am con el personal de obra (1 Oficial y 6 Ayudantes), se continua actividades de replanteo y sub-base en el Predio 17-76 y 17-80, se toman niveles y se definen con el Inspector de interventoria Jose de la cruz y se define hacer una rampa Frente al Predio 17-80.
12:20 Meridiano Se pasaron Niveles y se deja una Rampa de 3 ML X 1.20 en loseta y el adoquin sigue con su pendiente a la Rampa Baja para desarrollar. se continua colocación de losetas peatonales y almacen de cadena-D1 y adoquin se sugiere dejar terminada las cintas de Ajuste y biechar. se continua con sub base esta el cambio de nivel. personal. Laborando 1 maestro, 4 Ayudantes. En el Frente 1 carrera 33A entre calles 17 y 18. En el Frente 2 carrera 33A calles 18 y 19 esta inactivo por falta de personal y servicio electrico. ~~JK~~ inspector El Frente 2 se encuentra activo con 2 Ayudantes, se encuentran realizando demolicion y excavación de sardinel.

Lina Cristancho Residente Interventoría
Inspector de obra
Fecha: 24/Jun/2023.
Se inician actividades 7:00 AM con el personal de obra (1 Oficial y 4 Ayudantes), Se realizan actividades de construccion de espacio Publico Frente 1 e instalación de Sardinel, Se hace retiro de escombros en la carrera 33 a entre calle 18 y 19 y Se continuan las excavaciones Para instalación de sardinel en el Frente 2 (2 Ayudantes).

Powered by CamScanner

9:35 AM se continua con instalación de loseta y instalación de sardinel asta la esquina de la calle se continua con los chazos en loseta Banda de ajuste. 1 Maestro 4 Ayudantes. 1 imp Obra civil 2 señores ayudantes por administración haciendo Aseo General. estan actividades en el frente 2 En el frente 2 se esta haciendo Limpieza de Escombros. con Volqueta AZul y sus palaros - Instalacion sardinel y la excavacion para instalar su respectivo Sardinel. se solicita en el frente 2 reactivar señalizacion y sendero peatonal. señalizacion de Materiales petreos. ~~Ilegible~~ importados Se realizan actividades de Corte de ajuste y roulce de cejas

Lina Gisbuncho
Inspectora de obra
Fecha: 26/JUN/2023

Contratista

Interventoría

Clima: Soleado Lluvioso

se inician labores 7:00 AM en el Frente 1 Carrera 33 a entre calle 17 y 18 con el personal de obra (1 oficial 4 S Ayudantes) realizando actividades de Piso en Adoquin Construccion de espacio Publico, roulce de cejas y Corte de Ajuste y en el Frente 2 Carrera 33 a entre calle 18 y 14 con (2 Ayudantes realizando instalacion de sardinel.

4:20 pm. se demarcaron las Losetas que deben cambiar. se sugiere organizar Adecuadamente los materiales, Madaras, Lonas verdes, cambiar las cintas de los senderos peatonales para dar presentacion a la obra. ir dejando limpio desde la calle 17 esquina roto donde va la adecuacion del espacio publico. favor dar termino de escalera del 17-56 queda y la Rampa con muro, ~~dar~~ le acabado Final. se Solicita Traer Adoquines .20 cm ~~Ilegible~~

las curvas pendientes por instalar. [illegible] insp.
Fecha: 27/Jun/2023 Clima: soleado
Se inician actividades 7:00 Am con el personal de obra, en el Frente 1 (1 Oficial y 4 Ayudantes) y Frente 2 (2 Ayudantes), Realizando actividades de demolición, replanteo, conformacion con Sub-base, cinta de ajuste y brecha de cardinel. Se realiza aseo, cerramiento y arreglo de sendero peatonal
2:10 pm. En el Frente 1 cra 33A entre calles 17 y 18 se realizaron Empalme concreto plataforma poste alta tension, excavaciones y compactación de subbase en el predio 17.86 y queda lista para colocar Loseta y Adoquin. Las Bandas de Ajuste se les coloco producto de Antisol para evitar Futuras Adherencias.
en el frente 2 2 personas brechando sardinel y colocando concreto por la parte externa hacia el Asphalto. se Solicita el quimico de Adherencia entre cunetones ya curado y concreto nuevo. se solicita que hagan llegar sardinel de .20X.20X.50 para ejecutar las curvas pertinentes necesarias
[illegible] insp interventoria.

Lina Cristancho
Inspector de obra

[illegible]
Residente

[illegible]
Interventoria

Fecha: 28/Jun/2023 Clima: soleado
Se inician actividades 7:00AM con el Personal de obra en el Frente 1 (1 OFICIAL y 4 Ayudantes) realizando actividades de Piso en adoquin, construccion espacio Publico, cinta de ajuste, demolicion y retiro de cajas, se revisan niveles con el Inspector Jose de la cruz y se define escalera y desnivel de rampa en el Predio
y el Predio, ademas se revisa Posicion de las rampas Peatonales de la calle 18. En el Frente 2 (2 Ayudantes) realizando demolicion y relleno de sardinel y Pavimento.


Hora 3:15 pm, en el transcurrir del día se realizaron diferentes actividades, Retiro de cajas, Fraguado, Ajuste, terminación de embellecimiento plata, Formaleta, poste de alta tensión, se demolieron los pisos externos de los siguientes predios N°S 17-96 / 17-100 Aztra la esquina calle 18. se cargaron escombros en Volqueta placas. KFG 461. se insiste en solicitar las sardineles de .20x.20x.50 para dejar Terminado los curvos de las esquinas calle 18 con cra 33A en sus ambos sentido. y la esquina calle 18 de las mismas carreras se reitera la solicitud del epoxico de adherencia para concretos para Muros y escalera del predio 17-56, Aro para la cámara de Telefonía que se debe de dejar terminado. después de la de la pared de Bus. También hacer el cambio de las Losetas que están demarcadas con color Rojo se encuentran vencidos y desnivelados en sentido contrario a la pendiente. que lleva hacia la calle se definirá escaleras y Rampa para el adquirente en el predio. 17-96. Inspeccionado intervenido

Line Cristancho
Inspector de obra
Fecha: 29/Jun/2023

Interventoría
Atendido Soleado

El día de hoy se define por parte de la entidad (supervisor wilson motta) dejar rampa vehicular para el predio ubicado en la carrera 33A # 18-42 del Barrio San Alonso, ya que se presento por parte del propietario el contratista y el consorcio tramitó la solicitud a la interventoria, para realizar el tramite y aprobacion con la entidad. Por dicho motivo se Aprueba y debe ser instalada la rampa de Acceso vehicular en este predio.


La interventoria reitera hacer de manera adecuada los procesos constructivos, usar los materiales idoneos para la estabilidad de obra, por tal motivo se debe usar la tuberia sanitaria y no usar la tuberia de ventilacion como se esta instalando en este momento, se solicita el cambio inmediato de estos materiales para ser validado por la interventoria, para el respectivo Avance.



Residente de Interventoria

Se realiza cambio de tuberia de ventilacion a Sanitaria segun lo solicitado por Interventoria.
Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 6 Ayudantes), se realizan actividades de replanteo y excavación, Relleno con material de sub-base, retiro de cajas y Frenajus de ajuste en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.
Se realiza retiro de escombros.

Lina Cristancho
Inspector de obra
Fecha: 30/Jun/2023



Residente

dinci solembo
Se inicia actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 6 Ayudantes), se realizan actividades de Replanteo, excavacion y Relleno con Sub-base, se realiza punto de cambio de nivel Frente al Predio 17-80.
Hora 11:45 AM frente a carra 33A entre calles 17 y 18 se continua demolicion asta el predio 17-100 esquina calle 18 y se autoriza excavar, para la respectiva compactacion y ubicacion de sub base, ya que se corrigio los desagues PVC sanitarios. los 3 bajantes, se sigue con Adoquin y loseta. personal 1 Maestro 6 Ayudantes. 1 insp obra civil consorcio, 1 persona

Haciendo 9350 del consorcio Santander
en el frente 2 se hace limpieza de escombros
se descargan los sardineles, +20K+208.50 que fa
para las curvas de las ESQUINAS.
——— insp. interventoria.

Lina Cristina — Jayter M.
Inspectora de obra — Residente

Powered by CamScanner

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 11
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 29/5/2023 AL 03/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 12 y 13 costado oriental
Descripción:	

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 12 y 13 costado oriental
Descripción:	

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 12 y 13 costado oriental
Descripción:	

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 12 y 13 costado oriental
Descripción:	

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 11
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:**	29/5/2023 AL 03/06/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Carrera 34 entre calles 13 y 14 costado oriental
Descripción:	

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 11
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:**	29/5/2023 AL 03/06/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Continua instalacion loseta sobre cra 33a

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Continua instalacion loseta sobre cra 33a

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 12
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:**	5/06/2023 AL 010/06/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	contruccion espacio publico y fundida franja de ajuste

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	contruccion espacio publico y fundida franja de ajuste

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Demolicion varios sendero cra 33a

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Demolicion varios sendero cra 33a

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 12
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 5/06/2023 AL 010/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Arreglo muro de contencion y fundida franja de ajuste

2



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Arreglo muro de contencion y fundida franja de ajuste

3



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	aplicacacion sub base ampliacion via calle 10

4



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	aplicacacion sub base ampliacion via calle 10

5



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	instalacion sardinel prefabricado

6



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	instalacion sardinel prefabricado

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 12
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 5/06/2023 AL 010/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	excavacion para instalacion sardinel y aplicación sub base

2



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	excavacion para instalacion sardinel y aplicación sub base

3



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	excavacion para instalacion sardinel

4



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	excavacion para instalacion sardinel

5



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	aplicación sub base

6



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	aplicación sub base

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 13
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 13/06/2023 AL 17/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Arreglo muro contencion y cra 10a

2



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Arreglo muro contencion cra 10a

3



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Fundida concreto 3000 psi ampliacion via cra 10

4



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Fundida concreto 3000 psi ampliacion via cra 10

5



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Fundida concreto 3000 psi ampliacion via cra 10

6



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio La Vega
Descripción:	Fundida concreto 3000 psi ampliacion via cra 10

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 13
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 13/06/2023 AL 17/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Desinstalacion adoquin

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Desinstalacion adoquin

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Realce parada metrolinea

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Realce parada metrolinea

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 13
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 13/06/2023 AL 17/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	cra 29 entre calle 10 y 11 La Universidad
Descripción:	Cambio adoquines manchados

2



Localización:	cra 29 entre calle 10 y 11 La Universidad
Descripción:	Cambio adoquines manchados

3



Localización:	cra 29 entre calle 10 y 11 La Universidad
Descripción:	aseo y sello juntas

4



Localización:	cra 29 entre calle 10 y 11 La Universidad
Descripción:	aseo y sello juntas

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 13
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 13/06/2023 AL 17/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Replanteo y cerramiento

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Replanteo y cerramiento

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Demolicion placa y sardinel

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Demolicion placa y sardinel

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 14
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 19/06/2023 AL 24/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	reinstalacion adoquin

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	reinstalacion adoquin

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 14
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 19/06/2023 AL 24/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion varios,No hay avance

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion varios,No hay avance

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion placa y sardinel, No hay avance

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion placa y sardinel, No hay avance

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion varios, No se avanzo

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 18 y 19
Descripción:	Demolicion varios, No se avanzo

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 14
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 19/06/2023 AL 24/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	La Aurora calle 31 entre cra 28 Y 29
Descripción:	Localizacion y replanteo

2



Localización:	La Aurora calle 31 entre cra 28 Y 29
Descripción:	Localizacion y replanteo

3



Localización:	La Aurora calle 31 entre cra 28 Y 29
Descripción:	Demolicion varios

4



Localización:	La Aurora calle 31 entre cra 28 Y 29
Descripción:	Demolicion varios

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 14
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:** 19/06/2023 AL 24/06/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

1



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	instalacion sub base y cConstruccion espacio publico

2



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	instalacion sub base y cConstruccion espacio publico

3



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	Construccion espacio publico

4



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	Construccion espacio publico

5



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	Construccion espacio publico

6



Localización:	calle 9a entre cra 24 y 25 La Universidad
Descripción:	Construccion espacio publico

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 15
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	3	**Periodo:**	26/06/2023 AL 01/07/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Instalacion espacio publico y adoquin

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	demolicion e instalacion sub base

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	demolicion e instalacion sub base

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Fundida franja de ajuste

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio San Alonso Cra 33A entre calle 17 y 18
Descripción:	Fundida franja de ajuste

Alcaldia de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

02 / Junio / 2023

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander.

LUGAR:	FECHA:	HORA:

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Edward R. Vera R	Jesak SAS	Residente Interv.	———	3135434445	
Beatriz León Suárez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatriz.leon87@hotmail	3022315706	
Lady Andrea Ayala S.	consorcio santander	Prof. Social	———	3223094703	
Estefany Cotto Aguilar	Jesak SAS	Prof Social		3104622104	
Oscar Parada	Consorcio santander	Inspector	———	3172858384	
Layde Iliana Velandia	Consorcio Santander	Residente		3204138635	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 02 / Junio / 2023

Compromisos.

→ Se Solicita al ing Daniel Montiel el alcance de Barrio Albania y San cristobal para la socializacion del dia 02/Junio/2023, a las 3:00 pm., el ing Daniel hace saber que se va a instalar loseta Solicitando levantamiento en campo para definir

Componente Social.

Se realizo reunion de socializacion de inicio en el barrio la independencia y se obtuvo respuesta para realizar la Socializacion de inicio en el barrio albania., Se realizo Actas de vecindad de Limoncito San Alonso, la Aurora, la universidad. Esta pendiente Actas de vecindad de chapinero y la independencia. para la siguiente semana, Esto pendiente socializar San cristobal, campo madrid, Rosal y Juventud. Se solicita la entrega del informe social#3 para el dia 05 de Junio de 2023 Para el dia martes 06 de Junio se Solicita la respuesta de los PQR del barrio universidad.

HSEQ

Se cumplieron los compromisos pactados en el comite anterior, el contratista ha venido trabajando en el seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la Interventoria solicita la entrega del Informe #3 componete HSEQ para el dia 05 de Junio de 2023., la interventoria envio oficio de Implementacion Señalizacion vial, el contratista cumple con las Afiliaciones y seguridad del personal_

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 02 / Junio / 23.

Componente Tecnico.

% programado: 25,20%.

% Ejecutado. 15, 43%.

Retraso: 9,77%.

→ la interventoria solicita la solicitud de Adicion y prorroga para el dia 05 de mayo de 2023.

- Se realiza seguimiento al plan de contingencia en cada uno de los frentes de trabajo. con 36 personal en 6 frentes de trabajo., de cuenta con Sardinel, loseta Sub base. y todo lo necesario.

la vega: - loseta 100% → 03 Junio
- Sardinel costado occ → 06 Junio

Pinos - Detalles y entrega - 03 Junio.

San Alonso - 17 y 18 - Sardinel - 100% - 05 Junio
Sub base - 100% 06 Junio.
loseta - 100% 09 Junio
Adoquin - 100% 09 Junio

Universidad - cr 29 Terminado - 10 Junio

9 A. Terminado - 17 Junio

Frentes por iniciar.

San Alonso 18 y 19 → 05 Junio 2023.

Aurora calle 31 carrera 28 y 29 → 07 Junio 2023.

San Alonso calle 20 carrera 29 y 30 → 07 Junio 2023.

- Se solicita la entrega de informe componente tecnico # 3 para el dia 05 de Junio de 2023.

Powered by CamScanner

Alcaldia de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Hacer el levantamiento en Campo de Albania para definir la distribución del sedero Peatonal	Contratista e Interventoría	08/06/2023.
Actas de vecindad Chapinero y la Independencia	Contratista	15/06/2023
Reunión de Socialización de Inicio Campo Madrid y el Rosal	Contratista	08,09/06/2023
Socialización Inicio San Cristobal y Juventud	Contratista	16/06/2023
Entrega de Informe Social Mensual #3. Con anexos	Contratista	05/06/2023
Entrega de Informe HSEQ #3	Contratista	05/06/2023
Solicitud de adición y prorroga	Contratista	05/06/2023
Entrega de frente Vega de Morrorico	Contratista	08/06/2023
Entrega de Planos	Contratista	05/06/2023
Entrega de frente San Alonso entre Calles 19 y 18 y la Universidad Cra 29	Contratista	10/06/2023
Informe Tecnico	Contratista	05/06/2023

Powered by CamScanner

COMITE DE SEGUIMIENTO

Alcaldía de Bucaramanga

15/JUN/2023

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ___DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander.

LUGAR: Campamento Contratista **FECHA:** 15/JUN/23 **HORA:** 8:00Am

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Eslendy Cairo Aguilar	Interventoria Jesak	Prof Social		3104627104	
Vladimir Polo Paz	JESAK SAS	Director I/nia		3108118774	
Leidy Andrea Arcila Sanmiguel	Consorcio Santander	Prof. Social		3223094703	
LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	INT. RESIDENTE		3204436635	
Beatriz Leon Suarez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatrizleonsa@hotmail.	3022315206	Beatriz León
Bernardo Suárez Garcia	Consorcio Santander	HSEQ		3164986325	
Oscar Payada	CS	Inspector	———	3172853884	
Eduard Rivera	Residente Interventoria	JESAK SAS	———	3185484445	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/jun/2023

Compromisos:
- Oficio al supervisor Barrio albania.

Social:

Están pendientes reuniones de socialización en San cristobal Campo madrid, y la Juventud. Se va a realizar visita técnica con ediles de campo madrid para definir alcance. Estan pendientes actas de vecindad en chapinero, albania, la independencia y el rosal. Se inicia chapinero el 20 jun/23. Se recibió el informe técnico No 3 y fue aprobado.

HSEQ:

Se han venido subsanando las observaciones que se han realizado en obra; se aprobó y radicó el MAO en la alcaldía. Esta pendiente completar el informe 2 y entregar el informe #3; sigue pendiente la entrega del cuadro de control de seg. social. Se aclara el cuadro de seg. social del informe #1 corresponde al pago de seg. social Marz-Abril. El del informe #2 es del periodo Abril-Mayo. Sigue pendiente el comite para control de PMT (con movilidad-transito). Se deben presentar con los informes mensuales los certificados de cantidad de material depositado en escombreras y de material recibido de canteras (subbases) adicionalmente el certificado de calidad de material prefabricado.

Técnico:

Se han presentado no conformidades end proceso constructivo de las franjas peatonales en los frentes Pinos y San alonzo. Adicionalmente se han encontrado prefabricados deficientes en su calidad y acabado. Se requiere al contratista tomar medidas correctivas para evitar estos retrabajos a futuro. La interventoria ha dado instruccion a los inspectores para que realicen el

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/jun/23

Control de calidad y rechacen el material no conforme de inmediato, de igual forma se siguen dejando anotaciones en bitacora de las no conformidades y de los tramos que no pueden ser recibidos.

Frentes nuevos a intervenir:

* Aurora: se inició con Instalacion de Pmte, demolicy excavación
* 2 Frentes nuevos en San Alonzo en la c/le 20 entre 29 y 30 se inician Jueves 22/jun/23
* Chapinero: Se Prevé inicio el 26/jun/23

El contratista manifiesta que va a toabajar en el Frente San alonzo cra 33A entre 17 y 19 el Fin de semana incluyendo Festivo. Por lo cual se espera entregarla primera cuadra el miercoles 21/jun.

Se están ejecutando las no conformidades en los Pinos y en la universidad.

los APU's nuevos no previstos fueron aprobados.

El contratista debe presentar acta de modificacion.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Oficio al supervisor para definir alcance en el barrio Albania	Interventoria Jesak SAS	15 de Junio de 2023
Reuniones de socialización de inicio la Juventud y campo Madrid	Contratista	Del 20 al 23 de Junio de 2023.
Oficio solicitando alcance en El Rosal y San Cristobal	Contratista	16 de Junio de 2023.
Entrega del informe HSEQ #24 3.	Contratista	20 de Junio de 2023
Ejecución actividades no conformes Pino, y San Alonso	Contratista	20 de Junio de 2023.
Actas de vecindad Chapinero	Contratista.	20 de Junio de 2023
Pago de Seguridad Social a 30 de Abril y el pago a Mayo	Contratista	15 de Junio de 2023.
Comité de Trafico Mensual	Contratista	17 de Junio de 2023.
Certificado de material de bomberos	Contratista	23 de Junio de 2023
Certificado de material de Canteros	Contratista	23 de Junio de 2023.
Certificado de calidad de materiales certificados	Contratista	23 de Junio de 2023.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

30 Junio 2023.

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y CONSORCIO SANTANDER.

LUGAR: Campamento Contratista. **FECHA:** 30/06/23 **HORA:** 10:00 AM.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Edwurd R Vera P	JESAK SAS.	Residente Inter	eduar_vera@hot	3185484445	
Oscar Parada	CS	Inspector	———	3172858385	
Eslendy Cotto Aguilar	Jesak SAS	Prof Social	———	3104622104	
Beatriz Leon Suarez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatrizleon87@hotmail.com	3022315206	Beatriz León
Bernardo Suárez Cáceres	Consorcio Santander	HSEQ	inspectorhseq.cs@gmail.com	3012767950	Bernardo Suárez
LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	ING. RESIDENTE		3204438635	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 30/Jun/23.

Compromisos.

- Se radico oficio de necesidad para el barrio alemania lo cual se espera respuesta de este Frente.

Social

En la parte Social se realiza Socializacion de inicio del Frente Juventud y campo Madrid, Esta pendiente el Barrio San cristobal debido a la falta de Definicion de Ubicacion en este frente., se Solicita programar reunion de Socializacion en el barrio Alemania teniendo en cuenta trasmitir la informacion del nuevo alcance, el dia 29 de Junio se realiza reunion Social con la entidad. teniendo enfasis en el cumplimiento de los alcances propuestos en las Socializaciones como iniciar Frentes (Limoncito y Chapinero) Se debe programar Socializacion de cierre de Frentes de la (vega, Pinos, universidad cr 29), Acompañamiento de la parte tecnica para realizar Cierre de Aceta vecindad; se solicita el informe mensual #4 para el dia miercoles 05 de Julio de 2023.

HSEQ

El contratista Entrega el informe mensual #2 y es aprobado por la Interventoria, pendiente de la entrega del informe #3, Se entrego el cuadro de seguridad al 30 de Abril y el pago de seguridad de mayo, realizaron la Conformacion del comite de trafico y se realizó el Comite de trafico #1., Entregaron el certificado de Escombrera del mes de Abril y mayo, NO se entregaron los certificados de material de cantera queda pendiente para el dia 07 de Julio de 2023., se entregaron el certificado de calidad de materiales de Abril, pendiente el del mes de mayo. y Junio.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 30 Junio · 2023.

El profesional HSEQ se compromete a entregar los informes 3 y 4 el dia 05 de Julio de 2023, se programa visita con la ing Ambiental NIDIA CENTENO el dia 05 Julio 2023 para revision de manejos ambiental en chupinero Se solicita los nuevos frentes a iniciar el uso adecuado del PMT., se debe presentar seguridad social del Frente Chupinero

TECNICO

- El Frente de vega ya esta totalmente terminado
- Pinos: se entrega el dia 04 de Julio. a la interventoria para hacer entrega a la comunidad.
- San Alonso 33A: se entrega el tramo de la 17 a 18 el dia 07 de Julio de 2023, y el tramo 18 a 19 el dia 15 Julio.
- Aurora: se debe entregar terminado el dia 15 de Julio
- Universidad: C24 totalmente terminado, calle 9A para el dia 07 de Julio de 2023.
- Chupinero: este frente inicia el dia Martes 04 de Julio 2023
- Limoncito: Se prevee el inicio de este frente para el dia 10 de Julio de 2023

Esta pendiente definir los barrios Alboania, chupinero, San Cristobal para que el contratista continue con la ejecucion del Contrato la interventoria solicita plan de contingencia para los obreros representativos que se han venido presentando y estan Aumentando dia a dia, lo cual afecta la ejecucion y el cumplimiento contractual.

Se solicita el informe # 3,4 para el dia 05 de Julio con la preacta # 2, con cada una de las Actividades ejecutadas a la fecha

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8


COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Definir de forma exacta el alcance de los Sectores de Albania, el Rosal y San Cristobal	Interventoría	06 de Julio de 2023
Iniciar los frentes de Chapinero y timoneto	Contratista	04 de Julio de 2023. 15 de Julio de 2023
Programar Reunión. de socialización de Cierre de los Pinos y Cra 29 este 10-11 (la Universidad	Contratista	05 de Julio de 2023
Realizar Actas de vecindad de Cierre a los Sectores finalizados (Programación).	Contratista	05 de Julio de 2023
Entrega de Informe Social Mensual #4 con sus respectivos anexos	Contratista	05 de Julio de 2023
Entrega del Informe HSEQ #3 junto con sus Informes anexos e Informe #4.	Contratista	05 de Julio de 2023
Cotizado de Material de Cunetas y prefabricados del mes de mayo y Junio	Contratista	07 de Julio de 2023
Informe 3 y 4 del area tecnica	Contratista	05 de Julio de 2023
Definir el perfil vial de chapinero	Interventoría	04 de Julio de 2023

Powered by CamScanner

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO									
FRENTE DE OBRA :									
PERIODO:	01 A 30 DE JUNIO DE 2023								
RESIDENTE INTERVENTORIA:	EDWARD RICARDO VERA								
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**FRENTES DE INTERVENCION**				**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%	**SAN ALONSO**	**AURORA**	**CHAPINERO**	**UNIVERSIDAD**			**90%**
1	**Señalización general frente**	**33%**							**30%**
	Señales fijas	10%	SI	SI	SI	SI	100%		10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%	SI	SI	SI	SI	100%		10,00%
	Señalización luminosa	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%	SI	SI	SI	SI	100%		10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**							**43%**
	Estado de Señalización	12%	SI	SI	SI	SI	100%		12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%	SI	SI	SI	SI	100%		25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%	N/A	N/A	SI	SI	80%	Se evidencia falta de señalizacion en el fin de obra	3,20%
	Barricadas y/o maletines	4%	N/A	N/A	SI	SI	80%	Se evidencia falta de maletines en el frente de la universidad	3,20%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**							**13%**
	Asesor de transito	4%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Pmt vigente aprobado	4%	SI	SI	SI	SI	100%		4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%	SI	SI	SI	SI	90%	Se ausentan de manera constante	9,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**							**4%**
	Atención oportuna	4%	SI	SI	SI	SI	100%		4,00%

Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma:
Residente de interventoria
ING EDWARD RICARDO VERA R.



Firma:
Residente de obra
ING. LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	21-06-2023
LOCALIZACION:	CALLE 41 CON CARRERA 25 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 gr/cm3		**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	4.291	4.245	4.241
W. CONO DESPUES	1.253	1.112	1.231
W. ARENA CONO	3038,0	3.133	3.010
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.496	2.601	2.492
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.384	2.489	2.380
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W.ARENA EN EL HUECO	1.614	1.709	1.586
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	*1,46*	1,46	1,46
VOLUMEN DEL HUECO	1.105	1.171	1086,3

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,5	6,9	6,60

MUESTRA TOTAL SECA	2.238	2.328	2.233
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,02	1,99	2,06
% DE COMPACTACION	**97,82%**	**96,09%**	**99,29%**

OBSERVACIONES:


ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA


REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CALLE 9A ENTRE CARRERA 24 - 25 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 1



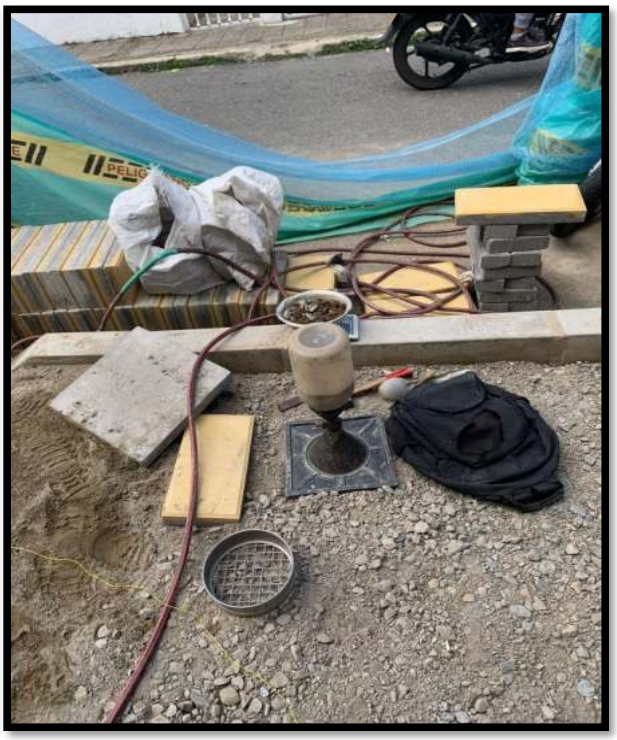

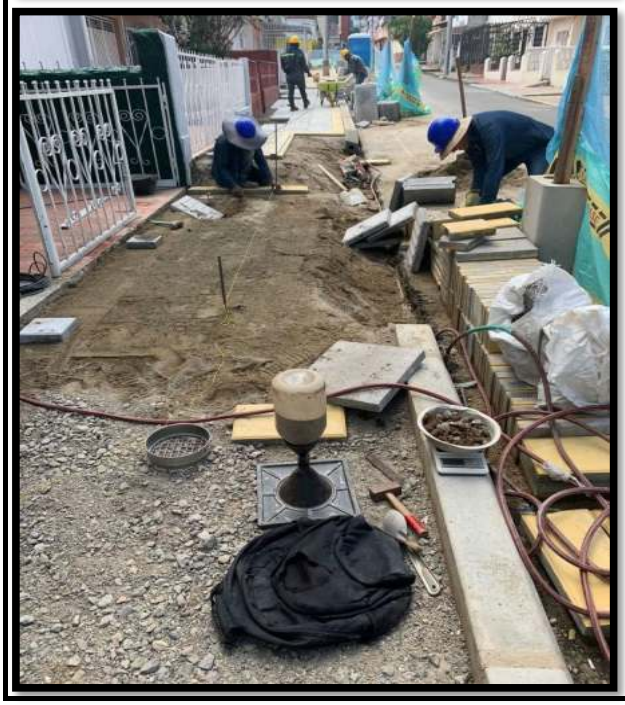




PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CALLE 9A ENTRE CARRERA 24 - 25 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 2







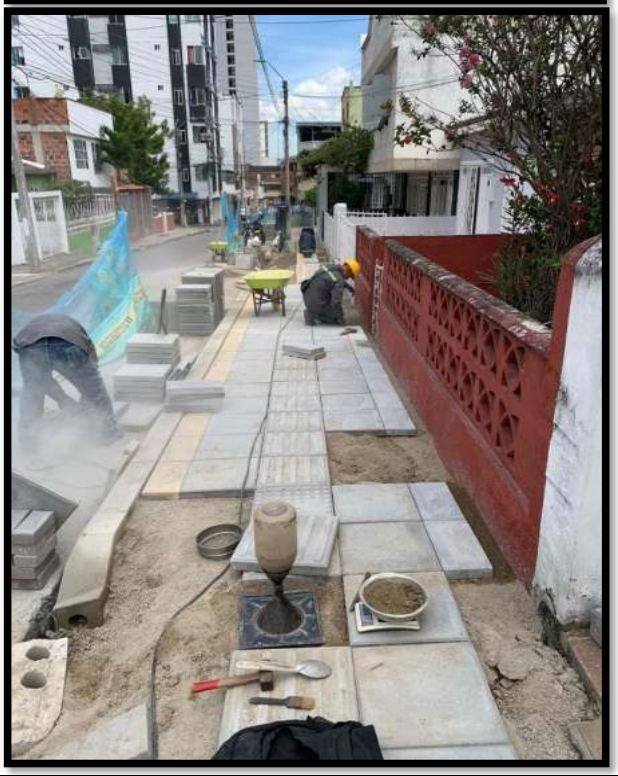

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CALLE 9A ENTRE CARRERA 24 - 25 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 3









ALDIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA				**ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO** **NORMA INVIAS E - 161 -13**			
PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I						
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6					**FECHA:**	21-06-2023
LOCALIZACION:	CARRERA 33 CON CALLE 18 BUCARAMANGA					**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3		**TIPO DE SUELO**	SUB BASE		

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	4.578	4.535	4.404
W. CONO DESPUES	1.574	1.468	1.373
W. ARENA CONO	3004,0	3.067	3.031
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.477	2.520	2.519
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.365	2.408	2.407
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W.ARENA EN EL HUECO	1.580	1.643	1.607
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	*1,46*	1,46	1,46
VOLUMEN DEL HUECO	1.082	1.125	1100,7

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,8	6,5	6,80

MUESTRA TOTAL SECA	2.214	2.261	2.254
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,05	2,01	2,05
% DE COMPACTACION	**98,85%**	**97,06%**	**98,92%**

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CARRERA 33 CON CALLE 18 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 1









PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CARRERA 33 CON CALLE 18 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 2










PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6				
LOCALIZACION:	CARRERA 33 CON CALLE 18 BUCARAMANGA				
TIPO DE SUELO	SUB BASE	**FECHA:**	21-06-2023	**TRAMO**	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DENSIDAD 3








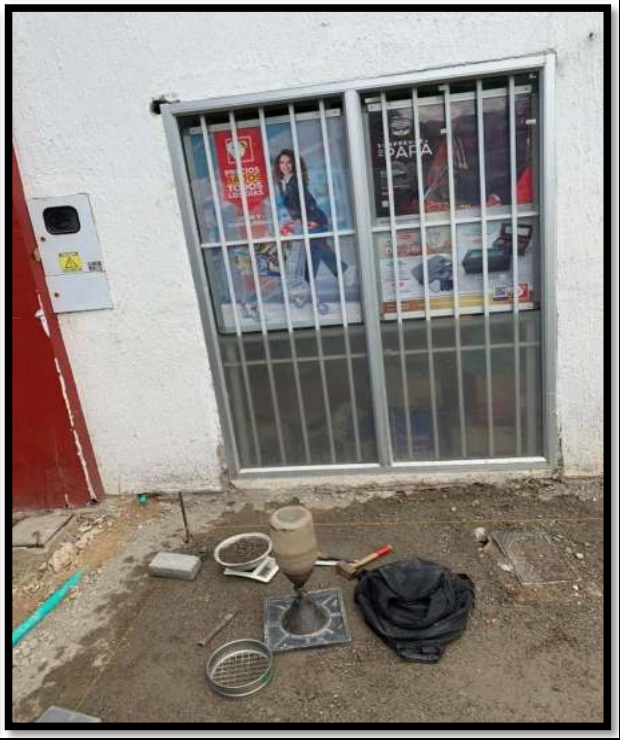

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 429 de 2022
INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

INFORME HSEQ INTERVENTORÍA

Firma		
Nombre	**ING. BEATRIZ LEON SUAREZ**	**ING, VLADIMIR POLO PAZ**
Cargo	**PROFESIONAL HSEQ**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	ELABORÓ	**APROBÓ**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

BUCARAMANGA

2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 4
1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 5
4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 7
4.1 Recurso Humano Interventoría. 7
4.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 7
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 8
5.1 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 8
5.1.1 Seguridad Social. 8
5.1.2 Recurso Humano. 8
5.1.3 Capacitación y Sensibilización del Personal. 11
5.1.4 Exámenes Médicos. 12
5.1.5 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 12
5.1.6 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). 13
5.1.7 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 13
5.1.8 Puntos de Hidratación. 14
5.1.9 Gestión de Tareas. 14
5.1.10 Inspecciones y Preoperacionales. 14
5.1.11 Elementos de Protección Personal EPP. 14
5.1.12 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. 15
5.1.13 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 15
5.1.14 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 16
5.2 Plan de Calidad. 16
5.3 Manejo Ambiental en la Obra. 17
5.3.1 Fuente de Materiales y Proveedores. 17
5.3.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 17
5.3.3 Manejo de materiales de construcción. 17
5.3.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 18
5.3.5 Manejo Residuos de Construcción (RDC). 19
5.3.6 Control de Emisiones Atmosféricas. 20
5.3.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. 20
5.3.8 Uso Eficiente de los Recursos. 21
5.3.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 21
5.3.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 21
5.3.11 Orden, Aseo y Limpieza en Obra. 22
5.3.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 22
5.4 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias. 23
5.5 Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 24

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.....25
7. REGISTRO FOTOGRAFICO.....27

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra. 5
Tabla 2. Marco Legal de Referencia.....5
Tabla 3. Personal de Interventoría.....7
Tabla 4 Registro Capacitaciones Personal Interventoría. 7
Tabla 5. Relación Personal Mínimo Contratista de Obra. 8
Tabla 6 Relación Personal Operativo Contratista. 8
Tabla 7 Novedades del personal Contratista de Obra.....11
Tabla 8. Registro de Charlas y Capacitaciones.....11
Tabla 9. Exámenes Médicos ocupacionales. 12
Tabla 10. Elección y conformación COPASST.....13
Tabla 11. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.13
Tabla 13. Gestión de Tareas (ATS, Permisos) 14
Tabla 14. Inspecciones y Preoperacionales.....14
Tabla 15. Seguimiento EPP. 14
Tabla 16. Indicadores Cumplimiento al Pan SST.....16
Tabla 17. Equipos y Herramientas mínimas del proyecto.....17
Tabla 18. Material Adquirido. 17
Tabla 19. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en la Obra. 19
Tabla 20. Gestión de Residuos. 19
Tabla 21. Consolidado de material dispuesto en el Botadero El Parque. 20
Tabla 22. Listado de Vehículos y Maquinaria Usados en Obra. 20
Tabla 23. Listado de Sumideros en Frentes de Obra. 21
Tabla 24. Listado de Vegetación en Frentes de Obra. 22
Tabla 25. Indicadores de cumplimiento Plan de Manejo Ambiental. 23
Tabla 26. Verificación de Elementos de Emergencia en Frentes de Obra. 23
Tabla 27. Atención de Emergencias. 24
Tabla 28. Casos COVID-19 Acumulados en el Periodo. 24

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Grafica Novedades del Personal de Obra. 11
Figura 2. Grafica Exámenes Médicos. 12
Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentes y Enfermedad. 13
Figura 4. Clasificación de Residuos. 18
Figura 5. Gráfica Residuos Sólidos Generados. 19
Figura 6. Gráfica Residuos de Construcción Generados. 20

INTRODUCCION

El proyecto cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER" es el resultado de la implementación de la estrategia general de Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto 0085 de 2018, trazando los lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó, resultado de la ejecución exitosa de la estrategia previamente citada.

Ahora bien, este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras. En ese mismo sentido tales serán adecuados conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto la ejecución planteada inicialmente, será conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (Concretos in situ y prefabricados), y se verificará la calidad de materiales; por último se instalará carpintería metálica (baranda) a modo de amoblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieren.

Por lo anterior, El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA suscribió mediante el Contrato de Interventoría No. 429 de 2022, se adjudicó a la firma JESAK S.A.S., la "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", EL cual tiene como finalidad controlar, asegurar, apoyar y verificar la ejecución y cumplimiento del contratista frente a las obligaciones contractuales y legales del Contrato de obra 22 de 2023 cuyo objeto contractual es la "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1" por parte del contratista CONSORCIO SANTANDER.

El siguiente informe mensual constituye el No. 4 de interventoría de la etapa de construcción, enfocado en la coordinación, acompañamiento y supervisión de la frente a las diferentes actividades y métodos de carácter HSEQ y Protocolo de Bioseguridad que el Contratista estableció para el desarrollo del proyecto, de tal manera que se controle el cumplimiento y la gestión realizada de los componentes establecidos en el contrato, el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Calidad durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

1. OBJETIVO

Verificar y realizar seguimiento de todas las actividades HSEQ realizadas por el contratista CONSORCIO SANTANDER, derivadas del contrato de obra No. 22 de 2023, conforme a la normatividad legal vigente en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el área HSEQ de la Interventoría JESAK SAS, a las actividades desarrolladas por el CONSORCIO SANTANDER, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, en el marco de la gestión HSEQ en la ejecución de los procesos constructivos que se realizan para el proyecto denominado “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 1 –

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra.

PROYECTO	GRUPO	COMUNA	BARRIO	ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO (M2)
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	1	1 Norte	Rosal	491
			Campo Madrid	340
		2 Nororiental	La Independencia	221
			La Juventud	613
		3 San Francisco	Chapinero	335
			La Universidad	301
		13 Oriental	San Alonso	501
			Los Pinos	362
			La Aurora	401
		14 Morrorico	La Vega	301
			Limoncito	481
			Albania	521

Fuente. Anexo técnico.

3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

Tabla 2. Marco Legal de Referencia

Norma	Descripción
Ley 9 del 24 de enero de 1979	Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos contaminantes del medio ambiente.
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Ministerio de Trabajo).	Por la cual se establecen las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. Esta resolución busca preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en las diferentes áreas en las que se realizan actividades de obra o actividades conexas con la misma.
Resolución 2413 de 1979 (Mintrabajo).	Por la cual se reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la

Norma	Descripción
	industria constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta actividad.
Decreto 02 del 11 de enero de 1982 (Minsalud).	Por el cual se reglamentan parcialmente el título i de la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Aunque en su gran mayoría este Decreto se encuentra derogado por el Decreto 948 de 1995, aún se encuentran vigentes las normas relacionadas con los métodos de medición de contaminantes al aire.
Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 (presidencia).	Por el cual se reglamenta parcialmente el título i de la ley 9 de 1979, así como el capítulo ii del título vi -parte iii- libro ii y el título iii de la parte iii -libro i- del decreto - ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Se establecen también los parámetros para vertimientos en las redes de alcantarillado público cuando haya necesidad de ello y dentro del desarrollo de las obras se establece la prohibición de verter combustibles y aceites a estas redes.
Resolución No. 1792 del 3 de mayo de 1990 (ministerio de salud).	Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido.
Ley 55 del 2 de julio de 1993.	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo.
Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Esta ley en su título X establece los modos y procedimientos de participación ciudadana en las actuaciones administrativas que afecten el medio ambiente.
Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.	Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
Decreto 806 del 4 de agosto de 1998.	Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud.
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2.005.	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Resolución 627 del 7 de abril de 2006 (M.A.V.D.T.).	Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Resolución 910 de 2008.	Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Ley 1333 de 2009.	Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Ley 1562 de 2012.	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409 de 2012.	Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas.

Norma	Descripción
Resolución 0652 de 2012.	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Ley 1643 de 2013.	Por medio de la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1072 de 2015.	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Resolución 0312 de 2019.	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Resolución 4272 de 2021.	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

4.1 Recurso Humano Interventoría.

La interventoría actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas especificadas de seguimiento al contratista. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales:

Tabla 3. Personal de Interventoría.

PROFESIONALES INTERVENTORÍA			
No.	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CARGO**
1	73.153.848	Vladimir Polo Paz	Director de Obra
2	1098697864	Edward Ricardo Vera Redondo	Residente de Obra
3	1.098.636.032	Beatriz Leon Suarez	Profesional HSEQ
4	63.532.664	Eslendy Corzo Aguilar	Profesional Social
5	1.098.722.717	Kelly Jiménez Manrique	Inspector de Obra
6	91.176.135	José de la Cruz Suárez	Inspector de Obra

4.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa JESAK S.A.S., a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realiza:

- ✓ Exámenes médicos.
- ✓ Pago y Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Proceso de Capacitación e Inducción.
- ✓ Entrega de EPPs a su personal incluyendo mascarilla.

Anexo 1. Capacitaciones SST y Ambientales personal Interventoría.

Tabla 4 Registro Capacitaciones Personal Interventoría.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
02/06/2023	SEÑALIZACION EN OBRAS	5	1 hora
07/06/2023	TRABAJO EN EQUIPO	5	1 hora
15/06/2023	PROTECCION AMBIENTAL	5	1 hora
30/06/2023	AUTOCUIDADO	5	1 hora

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, la interventoría realiza actividades de control y supervisión de las diferentes medidas ejecutadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

A continuación, se realiza un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos por el contratista para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

5.1 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Interventoría realiza revisión del plan de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que presenta el contratista, bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y el ciclo de mejora continua PHVA.

5.1.1 Seguridad Social. La INTERVENTORIA realiza el seguimiento y verificación a las afiliaciones al sistema de seguridad social integral del personal inicial aprobado. Dicho documento fue enviado por el contratista, revisando que estas personal cuenten con documentación en regla. La INTERVENTORIA ha velado por el complimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo durante el período del presente informe.

5.1.2 Recurso Humano. La interventoría realiza seguimiento y control del personal que cuenta el contratista durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

Tabla 5. Relación Personal Mínimo Contratista de Obra.

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO
1	1.098.663.816	Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente del Proyecto
2	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de Obra
3	1.090.363.682	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra
4	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ
5	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Trabajador Social
6	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra 1
7	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra 2
8	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra 3

Tabla 6 Relación Personal Operativo Contratista.

PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA & NO CALIFICADA					
#	**ÁREA**	**CÉDULA**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CARGO**	**ESTADO**
1	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	**ACTIVO**
2	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gómez Delgado	Oficial de Obra	**ACTIVO**
3	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	**ACTIVO**

4	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcón Afanador	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
5	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duván Higuera Esteban	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
6	Operativo	1.007.712.253	José Armando Laguna Gómez	Oficial de Obra	**ACTIVO**
7	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varón	Controladora de Trafico	**ACTIVO**
8	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
9	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso Quintero Quintero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
10	Operativo	17.575.151	Raúl Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**ACTIVO**
11	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**ACTIVO**
12	Operativo	88.285.407	Daniel Jesús Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**ACTIVO**
13	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñán	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
14	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Flórez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
15	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andrés Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
16	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**ACTIVO**
17	Operativo	91.229.173	David García Hernández	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
18	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Páez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
19	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	**ACTIVO**
20	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
21	Operativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejía Cristancho	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
22	Operativo	1.265.732	Simón Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
23	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodríguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
24	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
25	Operativo	5.956.989	Armando José Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
26	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
27	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
28	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
29	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderón	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
30	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
31	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
32	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñán	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
33	Operativo	5.677.471	Elías Rondón Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
34	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
35	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesús Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
36	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Cáliz Marín	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

37	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodríguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
38	Operativo	91.540.153	Gregorio López	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
39	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
40	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodríguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
41	Operativo	91.541.667	Jairo Andrés Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
42	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
43	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gómez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
44	Operativo	1.102.362.216	Jesús Antonio Briglia Martínez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
45	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincón	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
46	Operativo	85.477.952	José Alfredo Vergel Pérez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	73.020.875	José Luis Garzón Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
48	Operativo	91.448.171	José Raúl Sánchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	5.645.538	José Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	5.685.373	José Román Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza González	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastián González Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
53	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejía Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
54	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velázquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
55	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florián Chamorro	Oficial de Obra	**RETIRADO**
56	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gómez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
57	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Núñez Flores	Maestro de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velásquez Rodríguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernández Pérez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
61	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota García	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
63	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutiérrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
64	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	1.095.790.257	Rafael García Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

70	Operativo	6.167.313	Santi José González Márquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andrés Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejía Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejía	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
75	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

Tabla 7 Novedades del personal Contratista de Obra.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO SANTANDER			
DESCRIPCIÓN	**PROFESIONALES**	**OPERATIVOS**	**TOTAL DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	8	21	29
No. de Ingresos en el Periodo	0	21	21
No. de Egresos en el Periodo	0	35	35

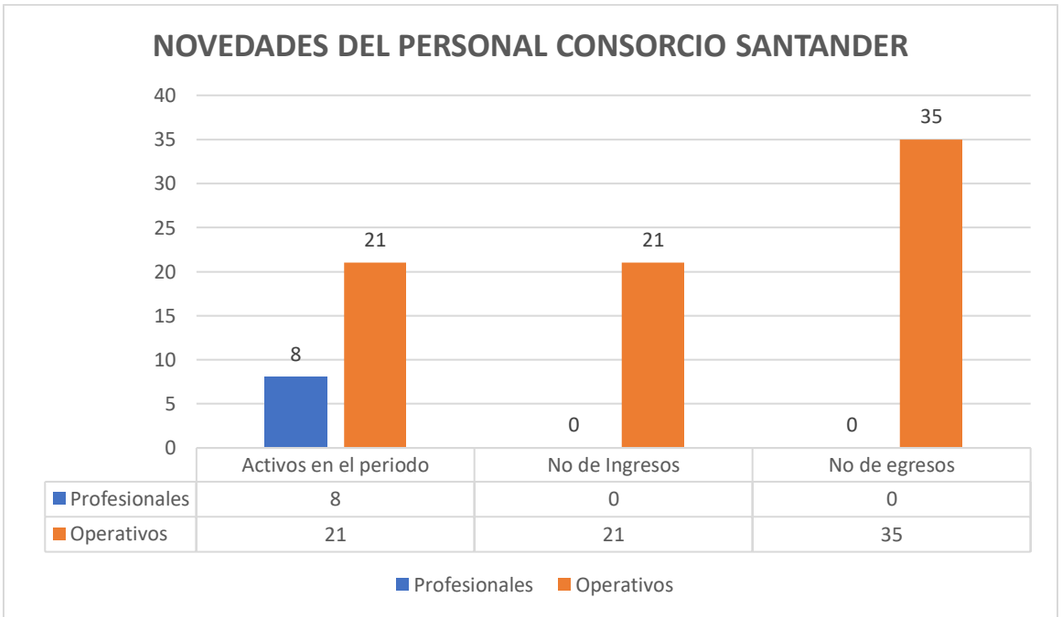


Figura 1. Grafica Novedades del Personal de Obra.

5.1.3 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, el contratista realizo charlas de 5 a 10 minutos en temas HSEQ a todos los trabajadores en los frentes de obra activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 8. Registro de Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/06/2023	INDUCCIÓN / PROTECCIÓN AMBIENTAL	46	50 min
2/06/2023	TRABAJO EN EQUIPO	45	5 – 10 min
3/06/2023	AUTOCUIDADO	43	5 – 10 min

5/06/2023	INDUCCIÓN / PROTECCIÓN AMBIENTAL-CUIDADO DE LOS RECURSOS	40	50 min
6/06/2023	INDUCCIÓN / EXCESO DE CONFIANZA	40	50 min
7/06/2023	INDUCCIÓN / PAUSA ACTIVA / PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO	41	50 min
8/06/2023	INDUCCIÓN / PLANEAMIENTO ANTICIPADO	40	50 min
9/06/2023	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	40	5 – 10 min
10/06/2023	SEÑALIZACIÓN EN OBRA	38	5 – 10 min
13/06/2023	IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS	31	5 – 10 min
14/06/2023	INDUCCIÓN / RESPONSABILIDAD DE TODOS	35	50 min
15/06/2023	SENTIDO COMÚN	29	5 – 10 min
16/06/2023	LEVANTAMIENTO DE OBJETOS	29	5 – 10 min
17/06/2023	INDUCCIÓN / MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	29	50 min
20/06/2023	SABER ESCUCHAR	27	5 – 10 min
21/06/2023	INDUCCIÓN / ¡LA PREVENCIÓN ES DE TODOS!	27	50 min
22/06/2023	USO Y CUIDADO DE LOS EPP	27	5 – 10 min
23/06/2023	INDUCCIÓN / PAUSA ACTIVA	27	50 min
24/06/2023	HABITOS DE TRABAJO	30	5 – 10 min
26/06/2023	INDUCCIÓN / LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y SU MANEJO	30	50 min
27/06/2023	¿POR QUÉ USAR UN CÓDIGO DE COLORES?	30	5 – 10 min
28/06/2023	RECICLAJE	30	5 – 10 min
29/06/2023	USO RACIONAL DE ENERGÍA	30	5 – 10 min
30/06/2023	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	30	5 – 10 min

5.1.4 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados y entregador por el contratista en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Tabla 9. Exámenes Médicos ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO SANTANDER		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	21	0	35
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0
TOTAL	**21**	**0**	**35**

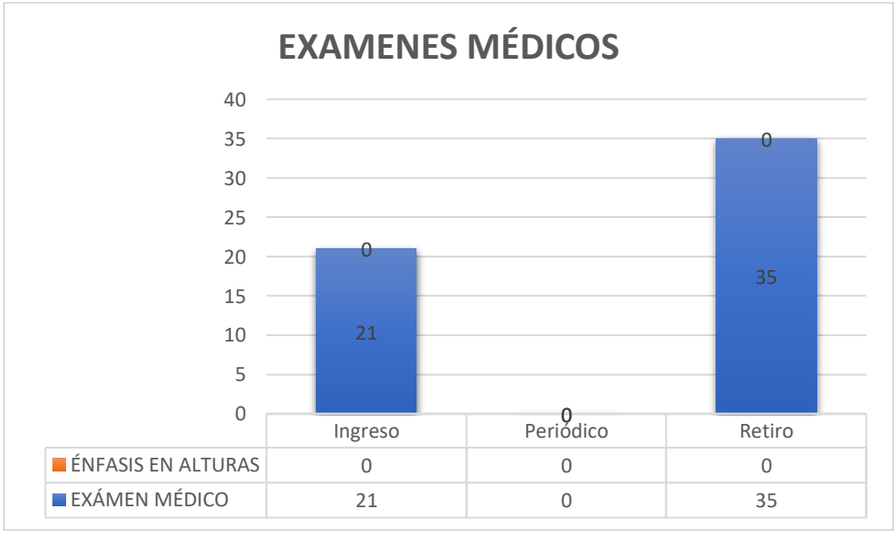


Figura 2. Grafica Exámenes Médicos.

5.1.5 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). La Interventoría verifica la conformación y elección de los miembros del COPASST por parte del contratista

el día 23 de abril de 2022, según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

De 10 a 49 Trabajadores: Un (1) representante por cada una de las partes.
De 50 a 499 Trabajadores: Dos (2) representantes por cada una de las partes
De 500 a 999 Trabajadores: Tres (3) representantes por cada una de las partes.
De 1000 o más trabajadores: Cuatro (4) representantes por cada una de las partes.

Tabla 10. Elección y conformación COPASST.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COPASST	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/06/2023	Actividad Ejecutada

5.1.6 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). La Interventoría verifica la conformación y elección de los miembros de comité de convivencia el cual está compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores con sus respectivos suplentes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1356 de 2012 Art. 1.

Tabla 10. Elección y conformación COCOLA.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COCOLA	11/05/2023	Actividad Ejecutada

5.1.7 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. La Interventoría realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 11. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	TOTAL
Atención por primeros auxilios	1	1
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	0
Remisión ARL	1	1
TOTAL	**1**	**1**

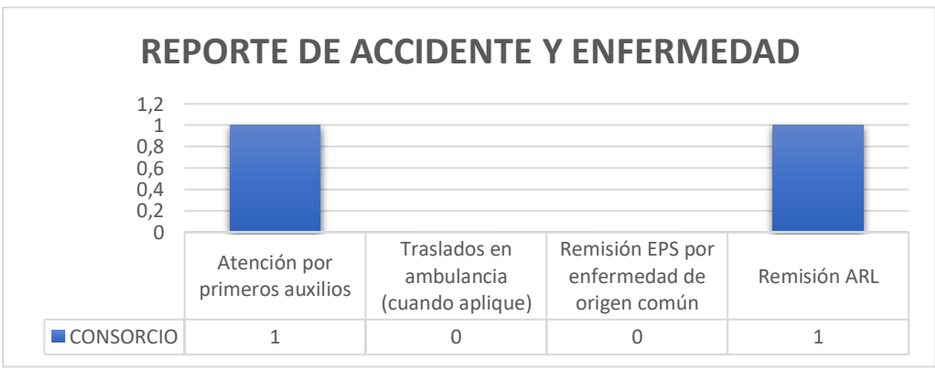


Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentes y Enfermedad.

El día 03 de junio de 2023 en el frente Vegas de Morrorrico se informa que el Sr. Ever Antonio Carrascal Durán sufrió un golpe en el pie izquierdo, producto de la caída a una altura menor a 30 cm de un sardinel UC-S10 que se encontraba acomodando en ese momento. Se realizo llamado a la línea de emergencia 123 y una ambulancia prestó el primer auxilio al trabajador, posteriormente se trasladó a la clínica la Riviera para la atención de la emergencia.

5.1.8 Puntos de Hidratación. La Interventoría verifica la instalación y mantenimiento del punto de hidratación en los frentes de obra activos, los cuales se encuentran ubicados en las áreas de trabajo del personal operativo, mediante botellones de agua.

5.1.9 Gestión de Tareas. A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo:

- La interventoría verifica presente periodo el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS e inspecciones de los equipos usados en el desarrollo de la actividad.

Tabla 12. Gestión de Tareas (ATS, Permisos)

Tipo de Trabajo	Descripción	No. Permisos o ATS	Observaciones
Demolición, Excavación	**ATS**	10	Actividades de demolición, excavación e instalación de sardinel

- **Trabajo Seguro en Alturas:** en el presente periodo no se realizaron actividades de alto riesgo como trabajo en alturas.

5.1.10 Inspecciones y Preoperacionales. La interventoría verifica en el presente periodo el diligenciamiento de inspecciones y preoperacionales para el desarrollo de las actividades.

Tabla 13. Inspecciones y Preoperacionales.

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección							
	Máquinas y Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra San Alonso, Pinos, Vegas de Morrorrico, La Universidad y La Aurora	X	X	X	X	X	X	X	X

5.1.11 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo la interventoría evidencia la entrega y reposición de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 14. Seguimiento EPP.

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	CASCO	Ingreso Personal
	GAFAS CLARAS Y/O OSCURAS	Ingreso Personal

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
Protección Facial		
 Protección Facial – COVID-19	MASCARILLA O TAPABOCAS	Ingreso Personal
 Protección auditiva	Tapaoido de Inserción	Ingreso Personal
 Protección Corporal	Camisa manga larga	Ingreso – Una vez cumplido el periodo de prueba
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal
 Protección Miembros superiores	Guantes de Vaqueta con refuerzo	Ingreso – Una vez cumplido el periodo de prueba

5.1.12 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. Interventoría verifica la instalación de cerramiento perimetral como medida preventiva, para el aislamiento de las zonas de obra y evitar el paso de personal no autorizado ingrese a las mismas, esto mediante tela de polipropileno de color verde, malla de color azul, con una altura de 1.8 metros y parales de madera rolliza hincados cada 2.5 metros en los frentes de obra de La Vega, Los Pinos, San Alonso, La Universidad y La Aurora.

La interventoría verifica que el Consorcio instala en el frente de trabajo señalización preventiva e informativa, como acción preventiva para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. De igual manera se realiza instalación de señalización informativa y advertencias pertinentes como ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO, SENDEROS PEATONALES, CERRAMIENDO DE CARRIL, INICIO Y FIN DE OBRA.

Durante la actividad de excavaciones se realiza la señalización y demarcación de las áreas de trabajo con delineadores tubulares, conos y cinta de peligro. De igual manera el contratista realiza instalación de la señalización informativa (uso obligatorio de EPP), emergencias (ruta de emergencia, punto de encuentro), prohibición (prohibido el ingreso de personal) mostrando la información y advertencias pertinentes de acuerdo a la normatividad.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Manejo de Tráfico diseñado por el consorcio, se establece que se realizara comité mensual de tráfico con un representante por parte del contratista, interventoría y de la dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. El día 22 de junio se realiza la confirmación y el primer comité, se lleva a cabo la visita a los frentes activos y se valida que se está aplicando el PMT de acuerdo con el documento aprobado por parte de DTB.

5.1.13 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

- ✓ Afiliaciones del personal.
- ✓ Pago de Seguridad Social.
- ✓ Inspecciones y Preoperacionales.
- ✓ Exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Charlas diarias y capacitaciones.
- ✓ Estadísticas de ausentismo y accidentalidad.
- ✓ Entrega de EPP.
- ✓ Cerramiento, demarcación y señalización.
- ✓ Instalación de punto de primeros auxilios.

5.1.14 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, evidenciando entre otras las siguientes actividades.

Tabla 15. Indicadores Cumplimiento al Pan SST.

#	INDICADOR CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	**100 %**
Implementación del SGSST	ISGSST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con el SG-SST.	ISGSST **= 100 %**
Entrega de EPP	$\% \, CEPP = \frac{\# \, EPP \, ENTREGADO}{\# \, EPP \, REQUERIDO} * 100$	$\%CEPP = \frac{147}{147} * 100 = \mathbf{100}\%$
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Trabajadores usan correctamente los EPP })}{(\# \text{ Total Trabajadores})}$	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(29)}{(29)}$ **= 100 %**
Inducción, charlas diarias y capacitaciones.	$CI = \frac{\# \, PERSONAS \, ASISTEN}{\# \, PERSONAS \, INGRESAN} * 100$	$CI = \frac{64}{64} * 100 = \mathbf{100}\%$
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales.	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	**100 %**
Capacitaciones SST	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Capacitaciones realizadas})}{(\# \text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(15)}{(15)}$ **= 100 %**
Señalización y aislamiento	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas señalizadas})}{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas que deben señalizarse})}$	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(5)}{(5)}$ **= 100 %**
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\# \text{ Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(20)}{(20)}$ **= 100 %**
ATS	$\text{ATS} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ ATS realizadas})}{(\# \text{ ATS por actividades semanales y frentes})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(10)}{(10)} = \mathbf{100} \, \%$

5.2 Plan de Calidad.

La interventoría realiza revisión del Plan de Calidad diseñado por el contratista y los certificados de los equipos y demás herramientas para la ejecución del proyecto. A continuación, se hace referencia a las herramientas y el equipo usados en obra para el desarrollo del proyecto:

Tabla 16. Equipos y Herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.

5.3 Manejo Ambiental en la Obra.

A continuación, se presenta la Gestión Ambiental realizada en el periodo por el contratista CONSORCIO SANTANDER, el cual tiene como finalidad presentar las acciones implementadas para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. El contratista radicó ante la alcaldía el Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO) para las actividades del contrato.

5.3.1 Fuente de Materiales y Proveedores. La Interventoría como parte de sus funciones contractuales, ha realizado seguimiento durante los recorridos a las fuentes de materiales que utiliza el contratista para la construcción y obras que desarrolla actualmente en el proyecto.

El contratista entrega los certificados de extracción de materiales pétreos y certificado de RUCOM, expedidos por la Agencia Nacional Minera, provenientes de la ARENERA LOS PINOS LTDA identificada con Nit 900.309.138, propiedad del señor Ángel Miguel Niño Prieto identificado con CC 91.101.017, ubicada en la Vereda San Pedro finca los potreritos 2 kilometro arriba del puente de pescadero vía Bucaramanga – San Gil.

5.3.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Interventoría evidencia que el contratista destina y cuentan con oficina administrativa ubicada en la Carrera 22 No. 11 – 12 Barrio San Francisco. Se destina dentro del frente San Alonso toma en arriendo un local de 2 mts x 2 mtr para el bodegaje de las herramientas, de igual manera en el frente Pinos el parqueadero del inmueble ubicado en la carrera 34 # 12 - 23 como campamento, donde se cuenta con un área para el almacenamiento, para el frente la Vega se tomó en arriendo una construcción en obra gris donde se adecuo el campamento para guardar materiales y herramientas, en el frente La Universidad se toma en arriendo una habitación del predio ubicado en la Carrera 29 # 11 – 22 para que sirva como campamento y bodega de materiales. Para el mes de junio se abre el frente La Aurora para el cual se toma en arriendo el garaje de un edificio cuya dirección es calle 31 # 28 – 17, para que sirva como campamento y bodega de materiales. Para cada uno de los frentes se dispone de un baño portátil flusing dando cumplimiento de normatividad legal.

5.3.3 Manejo de materiales de construcción. Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista adquiere el siguiente material:

Tabla 17. Material Adquirido.

Material	Volumen / Unidad
Arena	16 m^3
Triturado ¾	32 m^3

Material	Volumen / Unidad
Arena	16 m^3
Cemento Gris	190 Und.
Loseta Toperol de 40x40x6	263 Und.
Loseta Guía de 40x40x6	1.153 Und.
Loseta Lisa de 40x40x6	5.663 Und.
Loseta visual o amarilla de 40x40x6	453 Und.
Sardinel 0,80x0,50x0,20	1.119 Und.
Sardinel 0,20x0,50x0,20	90 Und.
Sardinel rampabaja 0,80x0,35x0,20	17 Und.
Transición derecha 0,60x0,50x0,20	13 Und.
Transición izquierda 0,60x0,50x0,20	13 Und.
Adoquín gris 20x10x6	30.334 Und.
Malla electrosoldada	168 m

El material pétreo como arena y triturado fue suministrado por proveedor Arenera Chicamocha S.A.S., empresa que cuenta con los permisos ambientales y mineros respectivos. Adicionalmente la interventoría verifica que se encuentre como anexo al informe mensual.

5.3.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el contratista CONSORCIO SANTANDER instaló un punto ecológico en cada uno de los frentes, los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.



Figura 4. Clasificación de Residuos.

Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** para depositar los residuos aprovechables como el plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

La empresa encargada de hacer la recolección de estos residuos sólidos es la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga) y Limpieza Urbana quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y el colaborador encargado del aseo diario acopia las bolsas con residuos para que estas sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 18. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en la Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
6 kg	2 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo de 2023
7 kg	3 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril de 2023
9 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de mayo de 2023
8 kg	4 kg	0 kg	Del 01 al 30 de junio de 2023

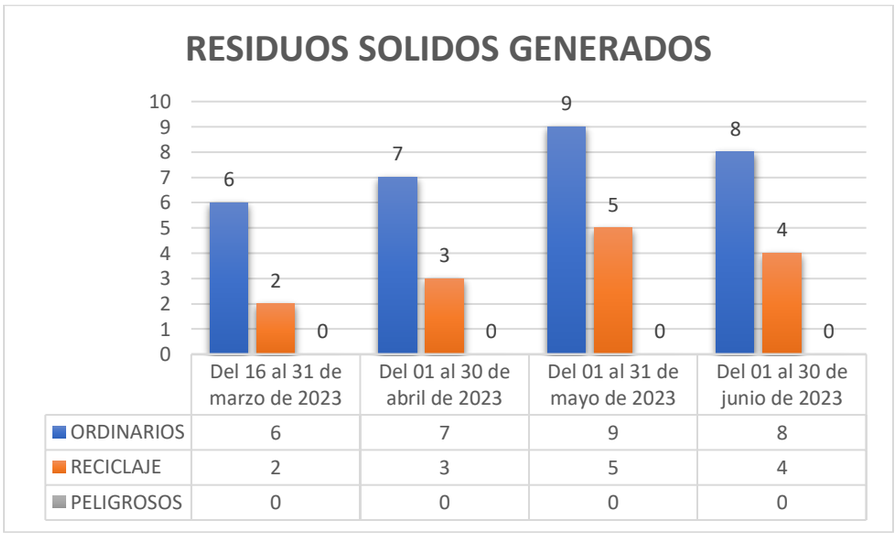


Figura 5. Gráfica Residuos Sólidos Generados.

Tabla 19. Gestión de Residuos.

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
PELIGROSO	Envases contaminados químicos	Acopio temporal En la obra	Cuando se tenga la cantidad mínima para su entrega
ORDINARIO	Empaques de comida, Residuos de alimento. Desechables, toallas de papel, tapabocas o mascarillas.	Acopio temporal EMAB y Limpieza Urbana	3 veces por semana
RECICLABLE	Papel, cartón, plásticos limpios y secos, envases de vidrio, metales	Acopio temporal EMAB y Limpieza Urbana.	2 veces por semana

5.3.5 Manejo Residuos de Construcción (RDC). Durante el periodo del presente informe, interventoría evidencia la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) en la escombrera Botadero El Parque (lugar que cuenta la autorización del ente ambiental), del material generado de las actividades de excavación y demolición. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de

material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

Interventoría verifica en el informe mensual del contratista los recibos y/o certificación de la escombrera El Parque por el valor correspondiente generado en el periodo.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en el frente de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 20. Consolidado de material dispuesto en el Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo de 2023	**0 m^3**
96 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril de 2023	**96 m^3**
32 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de mayo de 2023	**32 m^3**
104 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de junio de 2023	**104 m^3**

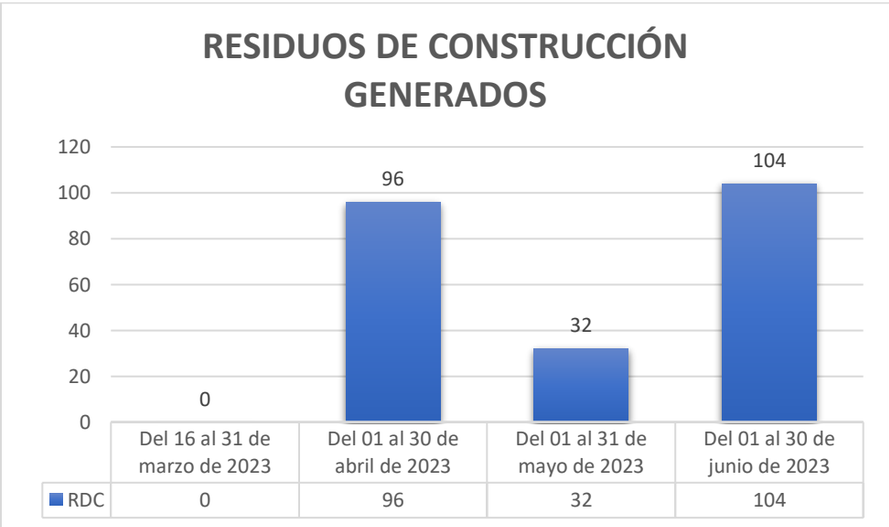


Figura 6. Gráfica Residuos de Construcción Generados.

5.3.6 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, la interventoría observo el cubrimiento con plástico negro los acopios temporales de materiales granulares y escombros, el cubrimiento de vehículos y humectación de las zonas para el barrido esto como medidas mitigación para evitar la emisión de material particulado en los frentes de obra y vías.

5.3.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. Interventoría verifica y realiza seguimiento a la maquinaria y Vehículos utilizados para actividades de transporte de materiales, evacuación de residuos,

Tabla 21. Listado de Vehículos y Maquinaria Usados en Obra.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA				ESTADO EN OBRA		SOAT	TECNICO - MECANICA
		PLACA/ REF	TIPO	COLOR	CAPACIDAD Kg/PSJ	ACT	NO ACT		
1	CHEVROLET	ICF925	VOLQUETA	AMARILLO	6000	X		19/01/2024	7/02/2024
2	CHEVROLET	KFG461	VOLQUETA	AZUL BRUMA	9000	X		20/08/2023	22/08/2023
3	DODGE	RDC740	VOLQUETA	BLANCA	6000	X		29/12/2023	30/12/2023

De igual manera el contratista realiza previamente al inicio de las actividades el preoperacional de las mismas. Se realiza el llenado de combustible de las volquetas en las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

5.3.8 Uso Eficiente de los Recursos. De acuerdo con los permisos de servicios necesarios para el desarrollo de la obra como agua y energía en los puntos de cada frente de obra se realizó el siguiente convenio:

- Frente San Alonso se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el local El Arsenal ubicado en el predio de la carrera 33A # 17 – 38. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.
- Frente La universidad se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por la Sra. Carmen Julia Giraldo en el predio ubicado en la carrera 29 # 11 – 22. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido. Adicional como este frente está dividido en dos, para el otro sector se está prestando los servicios por parte de la Sra. Luz Fonseca en el predio ubicado en la Calle 9ª # 24 – 23.
- Frente La Aurora se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el edificio ubicado en el predio de la calle 31 # 28 – 17. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

5.3.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. EL CONSORCIO SANTANDER cuenta con un inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponde en cada frente de Obra.

Tabla 22. Listado de Sumideros en Frentes de Obra.

N° DE SUMIDERO	FRENTE	MEDIDA	ESTADO DEL SUMIDERO
1	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
2	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
3	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
4	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
5	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
6	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
7	SAN ALONSO	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
8	LA AURORA	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
9	LA AURORA	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza

5.3.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente periodo no se ejecutaron actividades de poda aérea y radicular para ningún individuo vegetal. Se hizo visita con el Ingeniero Forestal para revisión del manejo que se debe dar a la vegetación presente en los diferentes frentes activos para posteriormente contar con la aprobación del área ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga.

Tabla 23. Listado de Vegetación en Frentes de Obra.

NOMBRE COMÚN	TIPO DE INTERVENCIÓN (PODA, TALA, TRASLADO, CONSERVACIÓN)	FRENTE	OBSERVACIÓN
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
OITÍ	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	PODA AÉREA Y RADICULAR
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	SE REQUIERE PODA AÉREA Y RADICULAR
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	SE REQUIERE PODA AÉREA Y RADICULAR
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	SE REQUIERE PODA AÉREA Y RADICULAR
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	SE REQUIERE PODA AÉREA Y RADICULAR

5.3.11 Orden, Aseo y Limpieza en Obra. Para esta actividad, el Consorcio a conformado la Brigada de Orden y Aseo dispuesta por un trabajador quien es el encargado del orden y aseo dentro de los frentes activos. Se realizan actividades de barrido con previa humectación de las zonas para el barrido esto como medidas mitigación para evitar la emisión de material particulado en los frentes de obra y vías.

5.3.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta los indicadores de cumplimiento de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista y el seguimiento que realizó la interventoría en el periodo.

Tabla 24. Indicadores de cumplimiento Plan de Manejo Ambiental.

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Capacitaciones Ambientales	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Capacitaciones realizadas})}{(\#\ \text{Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(8)}{(8)}$ **= 100 %**
Manejo de Residuos sólidos	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\text{Vol. Residuos Reciclados})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IRS} = 100\ \text{X}\ \frac{(4)}{(12)}$ **= 33.3 %**
Disposición de Escombros	$\text{IEV} = 100\ \text{X}\ \frac{(\text{Vol.}\ \ \text{Residuos con recibo})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IDE} = 100\ \text{X}\ \frac{(104)}{(104)}$ **= 100%**
Vehículos Certificados	$\text{IEV} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\text{Vehículos que cumplen})}{(\#\ \text{Total de Vehículos})}$	$\text{IEV} = 100\ \text{X}\ \frac{(3)}{(3)}$ **= 100%**
Permiso de Aprovechamiento Forestal	$\text{IPAF} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\text{Árboles Talados})}{(\#\ \text{Árboles Autorizados para tala})}$	No aplica para el periodo
Compensación de árboles	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\text{Árboles Sembrados})}{(\#\ \text{Árboles requeridos para siembra})}$	No Aplica para el periodo
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	**100 %**
Cumplimiento Actividades Ambientales	$\text{ICAA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\text{Actividades implementadas})}{(\#\ \text{Actividades programadas})}$	No Aplica para el periodo
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Actividades ejecutadas})}{(\#\ \text{Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100\ \text{X}\ \frac{(5)}{(5)}$ **= 100 %**
Baterías Sanitarias requeridas	$\text{UBS} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Actividades ejecutadas})}{(\#\ \text{Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100\ \text{X}\ \frac{(4)}{(4)}$ **= 100 %**
Manejo de campamento e instalaciones provisionales	0 % deficiente 50 % regular 100 % adecuado.	**100 %**
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	**100 %**

5.4 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

La interventoría verifica las medidas planteadas en el Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el contratista CONSORCIO SANTANDER, el cual dispone para el componente de atención a emergencias con botiquín de emergencias, camilla, extintor multipropósito con recarga vigente durante la ejecución del proyecto en los frentes de obra activos SAN ALONSO, LA UNIVERSIDAD Y LA AURORA.

Tabla 25. Verificación de Elementos de Emergencia en Frentes de Obra.

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
	Botiquín	1	23-06-2023	Buen Estado
	Camilla	1	23-06-2023	Buen Estado

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
Campamento de Obra Frente San Alonso	Extintor Multipropósito ABC # 1 - 10 lb	1	23-06-2023	Buen Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Universidad	Botiquín	1	23-06-2023	Buen Estado
	Camilla	1	23-06-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 2 - 10 lb	1	23-06-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Aurora	Botiquín	1	23-06-2023	Buen Estado
	Camilla	1	23-06-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	23-06-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024

Se evidencia inspección realizada por el contratista al punto de primeros auxilios instalado en los frentes de obra.

Tabla 26. Atención de Emergencias.

Tipo de Atención	Fecha	Tiempo	Asistentes	Observaciones
Conformación brigada de emergencias	11/05/2023	30 min	3	Se realiza conformación de las Brigadas de emergencia contando con la colaboración de cada uno de los inspectores de los diferentes frentes.
Emergencias reportadas en el mes	03/06/2023	30 min	0	Accidente del Sr. Ever Antonio Carrascal Duran
Simulacros en el mes	N.A.	N.A.	N.A.	No se tiene programado simulacro de emergencias

El contratista realiza la conformación de las brigadas para la atención de las emergencias en los frentes de obra y se realiza la capacitación de sus miembros.

5.5 Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

La interventoría evidencia que el contratista adopto un protocolo de bioseguridad para mitigar la posibilidad de contagio del COVID-19, bajo la Resolución 350 de 2022, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional y la declaración de pandemia establecida por la Organización Mundial de la salud el 11 de marzo de 2020, ante la presencia inminente del coronavirus COVID-19 en Colombia.

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, el CONSORCIO SANTANDER no reporto casos positivos de COVID-19 en su personal directo y subcontratista.

Tabla 27. Casos COVID-19 Acumulados en el Periodo.

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, la Interventoría ha velado para que la gestión HSEQ, y se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente y los planes diseñados por el contratista. Por otro lado, se ha dado acompañamiento y se ha hecho seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por el CONSORCIO SANTANDER durante la etapa de ejecución de obra.

- La Interventoría realiza la revisión del informe mensual entregado por el contratista de la Gestión HSEQ cumpliendo con requerimientos. Se le remiten observaciones para aplicar en el siguiente periodo.

- Se verifica la documentación de ingreso del personal, como: Afiliaciones a Seguridad Social (EPS, AFP, ARL, CCF), Exámenes médicos de Ingreso, inducción, notificación de riesgos, de cada uno de los colaboradores que ingresan al proyecto.

- El contratista realizo entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP), para los trabajadores.

- Dentro del periodo la interventoría ha solicitado al contratista la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo de la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo, protección a los sumideros y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias, las cuales han sido atendidas por parte del mismo, garantizando la circulación segura de los peatones y/o residentes de la zona.

- Se evidencia el compromiso del contratista en el acatamiento de las observaciones emanadas de la interventoría a fin de mejorar la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los frentes. El contratista en consiente de la importancia de cumplir con los requisitos legales aplicables al proyecto.

- Todos los requerimientos que se le realizaron al contratista fueron en base a los LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en la APRENDICE I, Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El contratista cuenta con una bitácora A&SST en la cual se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

- El contratista realizó la conformación y elección de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y la reunión mensual según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

- El contratista realizó la conformación y elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1356 de 2012 Art. 1.

- El contratista realizó la conformación de las Brigadas de Emergencias.

- En el presente periodo se registró cero (0) de casos COVID-19 positivos.

- En el presente periodo se registró un (1) accidente laboral.

- Durante este periodo se llevó a cabo comité de obra con el ente contratante (Alcaldía) en compañía del supervisor y los profesionales tanto de la Interventoría como del contratista de obra dejando constancia en las actas.

- El contratista ha implementado puntos de primeros auxilios y puntos ecológicos en todos los frentes de obra activos, para dar cumplimiento a las medidas preventivas del MAO.

- EL contratista a la fecha de corte tiene pendiente paz y salvos de personal que se ha retirado de obra, se le solicito que esta documentación sea enviada a la interventoría, para su correcta revisión y seguimiento.

- De acuerdo a la evaluación realizada por la interventoría a la Ficha de Seguimiento de labores ambientales y SST, se da una calificación del 98%.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Alcaldía de Bucaramanga	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 1. Sensibilizacion del personal





Figura 2 Capacitaciones de Seguridad y Medio Ambiente.





Figura 3. Orden, Aseo y limpieza en la Obra.





Figura 4. Uso de EPP y Dotación.

Alcaldía de Bucaramanga	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 5. Control de Maquinaria, herramientas y equipos.





Figura 6. Equipos de Emergencias.





Figura 7. Cerramiento de Obra





Figura 8. Proteccion y limpieza de Sumideros.

Alcaldía de Bucaramanga	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 9. Señalización Preventiva e Informativa Instalada.





Figura 10. Señalización Plan de Manejo de Trafico.





Figura 11. Instalacion de Baterías Sanitarias en Frentes de Obra.





Figura 12. Mantenimiento y limpieza Baterías Sanitarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 13. Puntos Ecológicos en Obra.





Figura 14. Delimitación y demarcación de áreas.





Figura 15. Residuos de Construccion Generados de actividades de excavación y demolición.





Figura 16. Evidencia Actividad de Evacuación de RCD.

Alcaldía de Bucaramanga	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 17. Entrega de Dotación y EPP.





Figura 18. Campamento de Obra.





Figura 19. Cubrimiento de Materiales.





Figura 20. Pausas Activas.

Alcaldía de Bucaramanga	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 21. Adecuacion paso Peatonal.





Figura 22. Uso adecuado de Herramientas y Equipos.





Figura 23. Almacenamiento de Materiales.





Figura 24. Actividades de Seguimiento al contratista.

Alcaldía de Bucaramanga	**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2023





Figura 25.Comite de Obra.





Figura 26.Comite de Obra .





Figura 27.Comite de Obra .





Figura 28. Capacitacion Personal Interventoría.

JESAK
NIT. 901320986-8

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código	FO-002
Versión	001
Fecha	Marzo 2022

Actividad

☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?: _____

Tipo Actividad

☒ Actividad Programada
☐ Actividad no programada

Datos de la Actividad

Facilitador	Beatriz León Suárez	**Firma:**	**Hora Inicio:**	7:00 Am
			Hora Final:	8:00 Am
Tema:	Señalización en Obras		**Fecha:**	02/06/23

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Esteidy Cotto Aguilar	63 532 664	Prof Social	
2	Edward R Vera R	1098674864	Residente Interv	
3	José de la cruz Suarez	91176135	Insp. interventoría	
4	Kelly Jimenez M	1098722717	Insp. Interv.	Kelly Jimenez M
5	Beatriz León	1098636032	HSEQ	Beatriz León
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

JESAK
NIT. 901320986-8

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código	FO-002
Versión	001
Fecha	Marzo 2022

Actividad

☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?: _____

Tipo Actividad

☒ Actividad Programada
☐ Actividad no programada

Datos de la Actividad

Facilitador	Beatriz León Suárez	**Firma:** Beatriz León	**Hora Inicio:**	7:00 Am
			Hora Final:	8:00 Am
Tema:	Trabajo en Equipo.		**Fecha:**	07/06/23

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Edward R Vera R	1098672864	Residente Interno	
2				
3	Estefany Cortes Aguilar	63532664	Prof Social	
4	Jose de la cruz suarez	91176135	insp. interventoria	
5	Kelly Jimenez M	1098722717	Insp. Int.	Kelly Jimenez.
6	Beatriz León	1098636032	HSEQ	Beatriz León
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	FO-002
		Versión	001
		Fecha	Marzo 2022

Actividad

☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?: _____

Tipo Actividad

☒ Actividad Programada
☐ Actividad no programada

Datos de la Actividad

Facilitador	Beatriz Leon Suarez	**Firma:** Beatriz Leon	**Hora Inicio:**	7:00 Am
			Hora Final:	8:00 Am
Tema:	Protección Ambiental		**Fecha:**	15/06/23

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	Beatriz Leon	1098636032	HSEQ	Beatriz Leon
2	Eskendy Coito Aguilar	63538664	Prof Social	
3	Edward R Varela	1093697364	Res. Intervento	
4	Jose de Javier Suarez	91176135	Insp. interventor	
5	Kelly Jimenez M	1098722717	Insp. Int.	Kelly Jimenez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	FO-002
		Versión	001
		Fecha	Marzo 2022

Actividad	Tipo Actividad
☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?: _____	☒ Actividad Programada ☐ Actividad no programada

Datos de la Actividad

Facilitador	Beatriz León Suarez	**Firma:**	Beatriz León	**Hora Inicio:**	7:00 Am
				Hora Final:	8:00 Am
Tema:	Autocuidado			**Fecha:**	30/06/23

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1				
2	Beatriz León	1098636032	HSEQ	Beatriz León
3	Edwar R Vera R	1093697364	R. Interventoría	
4	José de la cruz suarez	91176135	insp. interventoría	
5	Eskedy Cotto Aguilar	63532664	Prof Social	
6	Kelly Jimenez M.	1098722717	Insp. Int.	Kelly Jimenez M.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	GOBERNAR ES HACER Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	PERIODO					
	ENTRE			HASTA		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			98%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	0%	Se evidencia que el contratista cuenta con las carpetas A&SST, pero no estan actualizadas totalmente.	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el municipio de Bucaramanga mediante la secretaria de infraestructura en el desarrollo de las actividades del proyecto.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista acato las observaciones en el ambito A&SST hechas por la Interventoria y La Ingeniera Nidia Centeno Profesional Ambiental de la Alcaldia.	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%	Cuentan con Brigada de Orden, Aseo y limpieza BOAL.	**11,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	El contratista ha entregado de manera oportuna los soportes de proveedores de materiales asi como los del sitio de disposicion final de RCD.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista entrega el MAO y se remite a la supervisión.	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista ha implemento la debida proteccion a los sumideros en los frentes de obra intervenidos.	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista mantiene un acopio debidamente delimitado para los materiales y RCD	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista Cuenta con un campamento de obra en cada frente debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con 3 volquetas autorizadas las cuales transportan los RDC y cumplen con la normatividad vigente.	**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	Los vehiculos y maquinarias que salen de los frentes de obra intervenidos se encuentran libres de residuos de materiales y/ RCD que puedan llegar a generar un accidente.	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza diariamente jornada de Orden, aseo y limpieza en los fremtes de obra.	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza medidas de control de emision de material particulado en la obra.	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**4,0%**	Aplica	100%	Las zonas verdes en el area de intervencion de la obra no se ven afectadas ya que se encuentran libres de materiales de construccion.	
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza la debida proteccion de los individuos arboreos sin afectacion alguna por las actividades o acciones de la obra.	8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica	0%	No aplica esta actividad	

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	GOBERNAR ES HACER
		Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	PERIODO					
	ENTRE			HASTA		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			98%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica	0%	No aplica esta actividad	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con un baño portatil en cada frente de obra.	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza la proteccion a las excavaciones realizadas en los frentes de obra.	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista suministro la Dotacion y Los Elementos de Proteccion Personal para realizar las labores establecidas a cada trabajdor, hacen uso adecuado de ellos.	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con kit de emergencia en todos los frenten de obra con los elementos requeridos y debida señalizacion.	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista implemento la señalizacion preventiva e informativa y la señalizacion del Plan de Manejo de Trafico.	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con el Plan de Emegencia completo para todos los frentes de obra.	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta en los campamentos de obra con todos los equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista cumple con os requerimientpos de maquinarias, equipos y vehiculos.	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza las afiliaciones del personal a ARL, EPS, y AFP.	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista ha socializado la politica de SST, el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y se encuentra publicado.	**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	Se cuenta con COPASST y Comité de Convivencia Laboral.	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista realizo la induccion, capacitacion al SG-SST y SGA y notifica los riesgos de acuerdo al cargo a la actividad a desarrollar.	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza actividades de Promocion y Prevencion a todos los trabajadores.	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con sitio en los frentes de obra para que los trabajadors se cambien y guarden sus objetos personales y EPP.	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con inventario y hojas de seguridad de las sustancias quimicas.	

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	PERIODO					
	ENTRE			HASTA		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			98%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	El contratista cuenta con un programa de mantenimiento para la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados en la obra.	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	Se han conformado las brigadas de emergencias.	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	El contratista Instalo el cerramiento en los frentes de obra.	5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO			98%

Beatriz León

(FIRMA)
(Nombre) BEATRIZ LEON SUAREZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA

Bernardo Suárez Gmeiro

(FIRMA)
(NOMBRE) BERNARDO SUAREZ CARRENO
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista

JESAK
NIT. 901320986-8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato 429 de 2022

"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER" GRUPO 1

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME SOCIAL MENSUAL No 4

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Estado de revisión y aprobación

Elaboró	Aprobó
ESLENDY CORZO AGUILAR	ING. VLADIMIR POLO PAZ
Profesional Social de Interventoría	Director de Interventoría

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
JUNIO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN……..... Pág. 3

2. OBJETIVOS……. Pág. 4

2.1 Objetivo General…… Pág. 4

2.2 Objetivos Específicos……... Pág. 4

3. DESCRPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO……. Pág. 5

3.1 Contrato de Interventoría Pág. 5

4. LINEA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA…… Pág. 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLAN DE DIALOGO CIUDADANO…….. Pág. 5

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía……. Pág. 5

4.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana……... Pág. 11

4.3 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas…… Pág. 14

4.4 Acciones de Formación a Empleados de Obra……..... Pág. 15

4.5 Programa de Gobernanza para la Movilidad……. Pág. 15

4.6 Línea Estratégica: Comunicación Estratégica…… Pág. 18

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA……..... Pág. 21

5.1 Informe de Gestión……..... Pág. 21

6. CONCLUSIONES……. Pág. 24

7. ANEXOS……. Pág. 25

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales del Contrato de Interventoría **5**

Tabla 2. Horarios y Puntos de Atención al Ciudadano PAC **6**

Tabla 3. PQRS Recibidas **7**

Tabla 4. Recorridos por Frentes de Obra **9**

Tabla 5. Participantes de Comités Veedores.....**11**

Tabla 6. Reuniones de Socialización de Inicio.....**12**

Tabla 7. Actas de Vecindad, de Entorno y Rampas **14**

Tabla 8. Personal Mano de Obra No Calificada.....**17**

Tabla 9. Personal Mano de Obra No Calificada Femenina.....**20**

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al contrato 429 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, se describe a continuación el Plan de Acción para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el cual tiene como propósito establecer los lineamientos, estrategias, instrumentos y periodicidad de las acciones que la Interventoría aplicará para el seguimiento y verificación de todas las actividades contractuales de orden social, de acuerdo al apéndice J de la Alcaldía de Bucaramanga.

Este informe presenta la recopilación de las responsabilidades concretas dentro del componente de Gestión Social y los programas establecidos para la ejecución del mismo durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, en base en la etapa que cursa el Proyecto y la consolidación puntual de las tareas realizadas en cada uno de sus programas con el grupo 1.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Supervisar, asesorar y controlar de forma oportuna las acciones y avances del contratista, garantizando su cumplimiento en las obligaciones del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, las cuales están descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes que contribuyen en el desarrollo de las actividades comprendidas para la ejecución del componente de Gestión Social.

2.2. Objetivos Específicos

- Revisar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del contratista, conforme a los documentos contractuales.
- Elaborar y desarrollar el Plan de Acción atendiendo a los procesos y lineamientos que hacen parte del componente de gestión social.

- Auditar y garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la interventoría para el desarrollo del Contrato de obra.

- Presentar los informes correspondientes a las obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.

- Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por el Contratista para el desarrollo del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1. Contrato de Interventoría

Tabla 1: *Datos Generales del Contrato de Interventoría*

CONTRATO	**429 de 2022**
OBJETO	**"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"**
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.470.935.00
INTERVENTORÍA	JESAK S.A.S.
SUPERVISOR	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA (Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ)
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2023
PERIODO EJECUTADO	01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
POR EJECUTAR	QUINCE (15) DÍAS

4. LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA DE PLAN DE DIALOGO CIUDADANO

La Interventoría realiza seguimiento a cada una de las actividades del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual se divide en 3 líneas estratégicas, que agrupan los programas y acciones enfocadas a maximizar los beneficios del proyecto y mitigar los impactos sociales producidos por el mismo, los cuales se mencionan a continuación:

4.1. Programa De Servicio A La Ciudadanía

Este programa busca crear un espacio entre las entidades involucradas en el desarrollo del contrato y la comunidad beneficiada del mismo con el fin de ser un puente de comunicación entre las partes, para esto es necesario que el contratista cumpla con ciertos requerimientos así:

- **Punto De Atención al Ciudadano**

En el desarrollo del contrato se implementan Puntos de Atención al Ciudadano PAC, según lo estipulado en el Apéndice J del componente de gestión social, en el cual, para su adecuado funcionamiento el contratista estableció un espacio, horarios y formatos para registrar gestionar y tramitar las diferentes **PQRSD** de manera oportuna y promover un

dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del contrato, se cuenta con el apoyo de la Junta de Acción Comunal JAC y ediles.

Tabla 2: *Horarios y Puntos de Atención al Ciudadano PAC*

ATENCION AL CIUDADANO				
BARRIO	**HORARIO**	**UBICACIÓN:**	**LINEA TELEFONICA**	**CORREO**
La Aurora	9:00am – 12:00p	Calle 10 vegas	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
La Universidad	9:00am – 12:00p	Calle 9ª entre carrea 24 y 25 costado norte	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
San Alonso	9:00am – 12:00p	Cra 33ª entre calles calles 17 y 19	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

Fotografías 1 y 2: *Puntos de Atención Al Ciudadano PAC*

	
La Aurora	La Universidad

- **Gestionar y Tramitar Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de Manera Eficaz y Oportuna.**

Para garantizar una adecuada atención a la comunidad la empresa contratista Adecuaciones Santander creó un formato de PQRSD en el cual los beneficiarios pueden registrar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes directamente relacionados con el proyecto y el cual encontraran en los puntos PAC. Información que ya fue socializada con la población aferente del proyecto, además se les compartió el número de contacto y el correo electrónico con el fin de tener una comunicación directa y poder resolver situaciones dentro de los tiempos establecidos.

Mensualmente se realizará un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se

presentaron durante el período reportado, con base en lo anterior; del formato ya diligenciado se realizará un balance del estado en el que se encuentran cada PQRSD mediante informe, dando así seguimiento y verificación al proceso de atención a estas solicitudes.

En este informe de ejecución comprendido entre el 01 al 30 de junio, el contratista Consorcio Santander recibió seis (6) PQRS, las cuales se encuentran en trámite para dar respuesta a la comunidad. **(Anexo 1*).***

Tabla 3: *PQRS Recibidas*

PQRS		
Fecha	**Sector**	**Entidad que da respuesta**
01 junio / 2023	En el barrio la universidad el señor Daniel Pedraza Martínez, solicita rampa de acceso vehicular en la vivienda ubicada calle 9ª #24-75, anexa registro fotográfico del vehículo que guardan en el interior de la vivienda, la cual fue aprobada por el supervisor del contrato Edgar Bayona.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada
01 junio / 2023	En el barrio la universidad la señora Nancy Sánchez, solicita amablemente dejar acceso para entrada del vehículo placas IPR531, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada
02 Junio / 2023	En el barrio la universidad el señor Fabian Gonzalo Arenas residente de la propiedad ubicada en la calle 9ª #24-31 solicita se haga una rampa de acceso a vehículo marca skoda Felicia con placas CXA116, debido a que le vehículo se guarda en el garaje, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona acerca de la rampa.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada
06 junio / 2023	En el sector de la universidad el señor Wilson David Uribe solicita acceso a parqueadero en la vivienda ubicada en la calle 9ª #24-51, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista

	aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.	Pqrs cerrada
08 junio / 2023	En el barrio la universidad el señor German Darío Barrea residente de la vivienda ubicada en la calle 9ª #24-59 solicita rampa de ingreso para el ingreso de 3 motos que guardan en el predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría en visita a la propiedad mencionada anterior mente se evidencia que es una entrada peatonal mas no una entrada vehicular, por tal fue negada la rampa por el supervisor Edgar Bayona.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada
20 Junio / 2023	En el barrio san Alonso la señora Ana Lucia Castro abogada, veedora comunitaria emite una pqrs por malos olores, los cuales salían del baño portátil ubicado en la Cra 33ª #18.11 y por atrasos en la obra, se da la siguiente respuesta por medio de correo electrónico. “En relación con el tema expuesto por malos olores que se presentan debido al baño portátil el cual estaba ubicado en la Cra 33ª #18-10 generando contaminación y malestar general a los apartamentos 201, 202 y 301 del edificio DANI, se revisa el tema con el contratista tomando la decisión de trasladarlo a la dirección Cra 33ª #18-58 con el fin de generar menos impacto a la comunidad, ya que la vivienda se encuentra en remodelación y no está habitada por ninguna persona. Por consiguiente, en el APÉNDICE I “COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” se le solicita al contratista que los baños portátiles que son instalados para la ejecución de la obra tengan un sistema “Flushing” el cual consiste en liberar y remover partículas contaminantes del sistema, forzando un fluido a alta velocidad a través de este, generando una menor polución en el ambiente. Las personas encargadas de supervisar el aseo de estos garantizan que dos (2) veces a la semana se hagan limpieza general en los baños. Se	Profesional social contratista. Profesional HSEQ contratista. Pqrs cerrada

	adjunta evidencia de recibos de la empresa MASSI de las últimas dos semanas que permite verificar lo expuesto anteriormente. En cuanto a los comerciantes afectados por el cierre, es importante tener en cuenta que se está ejecutando el contrato 022- 2023 de la alcaldía de Bucaramanga, direccionado por la secretaria de infraestructura al cual se le debe de dar cumplimiento en su totalidad, entendemos la preocupación de la comunidad por el cerramiento mientras se está haciendo el contrato, no obstante, el contratista está dando cumplimiento en los tiempos establecidos, sin embargo se han presentado situaciones que interfieren en el desarrollo de las actividades tales como: Robo de maquinaria, renuncia de personal de mano de obra no calificada, alta demanda que tienen los prefabricados requeridos para la obra como lo son los sardineles, remates de sardinel, remate de rampa y losetas; eso se debe a que actualmente en el área metropolitana se encuentran muchas obras activas que requieren de los mismos prefabricados y los proveedores autorizados no logran suplir los requerimientos de todos los contratistas.	

- **Recorridos Urbanos**

Los recorridos urbanos permiten identificar acciones que puedan afectar a la comunidad, minimizando situaciones que interfieran para el óptimo desarrollo del contrato.

Para llevar a cabo estos recorridos la interventoría programará en conjunto con la profesional social de la firma contratista, las fechas y hora de esta actividad.

Las profesionales sociales de interventoría y contratista realizaron acompañamiento y reconocimiento a los siguientes sectores, además se menciona en otros puntos del presente informe actividades que se llevaron a cabo en cada barrio.

Tabla4: *Recorridos por los frentes de obra*

BARRIOS	ACTIVIDADES REALIZADA
EL ROSAL	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra.
	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de

CAMPO MADRID	la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra.
LA INDEPENDENCIA	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra.
LA JUVENTUD	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra.
CHAPINERO	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra, se hicieron actas de vecindad y las actas de servicios públicos de luz, agua y arriendo.
LA UNIVERSIDAD	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir, se realizaron actas de servicios públicos de luz, agua y arriendo, se da respuesta a pqrs enviadas por la comunidad de la calle 9ª con 25.
SAN ALONSO	Se llevó a cabo recorrido diarios en el sector, se realizaron las actas de servicios públicos de luz, agua y arriendo, se hizo un puerta a puerta el día 16 de junio con el fin de comunicarle a la comunidad que los días sábado 17, domingo 18 y lunes festivo 19 se iba a trabajar para avanzar un poco más en la obra y mitigar impactos negativos por los atrasos que ha presentado la obra.
LOS PINOS	Se llevó a cabo recorridos diarios, se encuentra a la espera de entrega de la obra para ser entregada a la comunidad.
LA AURORA	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir, se realizaron las actas de servicios públicos de luz, agua y arriendo.
LA VEGA	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir, se realizó socialización de inicio de obra, se hicieron actas de vecindad y de entorno, además se ejecutaron las actas de servicios públicos de luz, agua y arriendo. Se encuentra a la espera de entrega de la obra para ser entregada a la comunidad.
LIMONCITO	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra.
ALBANIA	Se llevó a cabo recorrido de reconocimiento de la zona a intervenir y se realizó socialización de inicio de obra, se encuentra a la espera de la entidad supervisora del contrato para que determinen el alcance de la obra ya que no se van hacer andenes como se están realizando en el contrato, si no se cambió a andenes en concreto con el fin que cumpla doble función sendero peatonal y tránsito de vehículos.

De la fecha del 01 al 30 de junio se realizaron recorridos de obra todos los días, con la finalidad de identificar y mitigar impactos de situaciones que se presentaron con los trabajadores y comunidad aledaña.

- **Conformación de Comités de Veeduría**

La interventoría verifica la conformación de los comités de veeduría y participación ciudadana con el fin de promover la importancia de las obras, sus cuidados y el buen uso para la sostenibilidad de las mismas y realizará seguimiento a la información que se solicite.

En las reuniones de socialización de inicio fue posible conformar las veedurías ciudadanas de los barrios Albania, El Rosal, La Juventud y Campo Madrid, las personas inscritas en el comité de participación y veedurías se pueden observar en el siguiente cuadro. **(Anexo 2).**

Tablas 5: *Participantes de Comités Veedores*

COMUNA	BARRIO	VEEDURIA	QUIENES LA CONFORMAN	INTEGRANTES
Comuna 14	Albania	Creada	4 representantes de la comunidad	Vladimir Quintero Carmen Contreras Dincelina Rivera Martha Sepúlveda
Comuna 1	El Rosal	Creada	3 representantes de la comunidad	Ovidio Vargas Libia Castillo Alfredo Ramírez
Comuna 2 nor-oriental	La Juventud	Creada	4 representantes de la comunidad	Víctor Cabrera Mary Luz Orduz Sandra Ardila Eliecer Jaime
Comuna 1 norte	Campo Madrid	Creada	3 representantes de la comunidad	Luz Velázquez Wilson Caballero Jesica Rodríguez

Dando continuidad a las reuniones de veeduría, conformadas en meses anteriores, se realizó recorrido con el grupo conformado en el barrio Las Vegas de Morrorico el día 07 de junio, dando inicio a la socialización de avance de obra, con el acompañamiento del inspector Amaury Mendoza, la profesional social de interventoría Eslendy Corzo, el profesional HSEQ Bernardo Suarez y profesional social contratista, se le explica al grupo de veedores el atraso y los inconvenientes que se han presentado durante la ejecución del objeto contractual en el sector de la calle 10 Vegas de Morrorico, entre ellos el traslado de las palmas con su respectiva autorización, el proceso de construcción donde se creó un borde de ajuste de contención, se realizó la poda aérea y radicular para poder intervenir en el terreno y proyectarle a 29 metros de franja peatonal, además según el perfil vial se amplió dos metros para una mejor circulación de la franja peatonal, se tomaron en cuenta las observaciones de parte de la comunidad para mantener el espacio de la zona verde y preservar la seguridad de los peatones. Se les informa a los veedores el avance que se ha tenido hasta la fecha y está pendiente la fecha para el cierre de la misma. **(Anexo 3).**

4.2. Programa De Dialogo Y Participación Ciudadana

Este programa se define por la necesidad de establecer el buen manejo de la información en relación con la comunidad y el desarrollo de la obra.

Por medio de la interventoría social se realizó la verificación de los diferentes momentos informativos así:

- **Reunión de Inicio**

Con el fin de dar inicio a las actividades técnicas e informar a la comunidad las obras a ejecutar se adelantaron las reuniones de socialización de inicio en los barrios Albania, El Rosal, La Juventud y Campo Madrid. **(Anexo 4)**

Para esta actividad fueron convocados los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC, los Ediles, líderes comunitarios, representantes de la entidad contratante, interventoría, contratista y comunidad en general.

Se realizó la invitación por medio de volantes informativos puerta a puerta con el fin de que la comunidad asista y participe de la socialización y conozcan aspectos importantes respecto a la ejecución del contrato.

Tablas 6: *Reuniones de Socialización de Inicio*

FECHA HORA	DESCRIPCIÓN	ASISTENTES
ALBANIA 02/06/2023 3:30 am	La interventoría realiza acompañamiento a las reuniones de socialización de inicio del grupo 1. Se hace la presentación de los asistentes y por medio de diapositivas los profesionales encargados del área técnica, ambiental, SST y social brindan información relacionada con el contrato, se despejan las dudas y se resuelven inquietudes de la comunidad respecto al proyecto.	**20**
EL ROSAL 09/06/2023 3:30 pm		**18**
LA JUVENTUD 23/06/2023 3:30 pm		**14**
CAMPO MADRID 28/06/2023 10:00 am		**24**

Fotografías 3 y 4: *Reuniones de Socialización de Inicio*

	
Fecha: 02/06/2023 Lugar: B/Albania	Fecha: 28/06/2023 Lugar: B/Campo Madrid

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Santander lleva un total de doce (12) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se va a intervenir.

- **Reunión de Avance**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se ejecute el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha ejecutado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades faltantes.

- **Reunión de Finalización:**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se presente el 100% de la obra física terminada, es decir finalizada la etapa de construcción.

- **Actas de socialización, volantes informativos, registro fotográfico, formato de entrega de piezas divulgativas.**

Se creó un modelo de volante informativo el cual fue aprobado por la interventoría y posteriormente entregado en la zona donde se realizaron las reuniones de socialización de inicio, esta actividad se ejecutó puerta a puerta, además esta misma información se le compartió vía WhatsApp a los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC, ediles y líderes comunitarios de los barrios Chapinero y La Independencia.

Fotografías 5, 6, 7 y 8: *Volantes de Invitación*



4.3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Actas de Vecindad y/o Entorno**

Con el fin de conocer el estado de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tendrá en cuenta el criterio técnico que permite ubicar las zonas que posiblemente puedan verse afectadas con los trabajos que se van a realizar. Adicional a lo anterior se levantó el formato acta de vecindad de inicio registrando de manera detallada el estado inicial de las áreas susceptibles de ser afectadas con la construcción.

El area de gestión social realizo acompañamiento al area técnica para el levantamiento de las Actas de Vecindad de Inicio a cargo del contratista, se conto con la presencia de la interventoría, esta actividad se realiza con el fin de conocer el estado actual de cada una de las viviendas ubicadas frente a la obra para evitar futuras reclamaciones, pero en el caso de que exista algun daño o afectación el contratista debera dejar igual o en mejores condiciones de como se encontraba.

Ademas si se evidencias rampas de acceso vehicular también se realizan las actas correpondientes como soporte del estado en el que se encuentran para el desarrollo del contrato ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS.

Tablas 7: *Actas de Vecindad y/o Entorno y Rampas*

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 16 # 4 -03 B	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-18	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-24	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-34	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-42	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-50	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-56	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 4 # 16-60	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-04	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-16	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-32	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-40	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-48	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-60	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-66	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Cra 17 # 04-72	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 5 # 16-45	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 5 # 16-43	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 5 # 16-35	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 5 # 16-25	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de vecindad	Calle 5 # 16-11	20/Junio/ 2023
Chapinero	Acta de entorno	Cra 17 # 04-26	20/Junio/ 2023

Para este informe la interventoría recibe un archivo PDF de los formatos anteriormente mencionados.

- **Otras Actividades**

La profesional social hace apoyo al contratista como intermediaria con la comunidad, para buscar los servicios de luz y agua y el campamento para los frentes de trabajo. **(Anexo 5)**

- **Actas de Compromiso**

La interventoría veló por que el contratista, en caso de requerirse, firmara acuerdos con los propietarios de predios, que permita el normal desarrollo de las actividades de obra programadas.

En el tiempo comprendido del presente informe no se realizaron actas de compromiso.

4.4. Acciones de Formación a Empleados de Obra

Se verificará el cumplimiento de un plan pedagógico con los trabajadores que ejecutan actividades en el desarrollo del contrato por medio de charlas preventivas. **(Anexo 6)**

En el tiempo comprendido del presente informe el contratista da cumplimiento a este punto, por lo tanto, en el mes de junio se realizaron charlas a los trabajadores, tratándose temas tales como:

I. Terapia de relación Jacobson.
II. Relajación muscular.
III. Trabajo en equipo.

Fotografías 9 y 10: *Capacitación Mano de Obra No Calificada MONC*





4.5. Programa de Gobernanza para la Movilidad

- **Articulaciones Interinstitucionales**

A la fecha no se han realizado actividades de gestión y articulación institucional pero el contratista tendrá en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto, logrando un trabajo articulado con cada una de las entidades o instituciones.

- **Generación de Empleo**

Este programa busca vincular a personal, brindando oportunidades que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas de los habitantes de la localidad.

El consorcio Santander hasta la fecha de 30 de junio, realizo convocatoria por medio de los presidentes de Junta de Acción Comunal JAC y en las reuniones de socialización de inicio de los sectores a intervenir para que la comunidad en general tenga conocimiento de las ofertas y oportunidades laborales que hay para el personal del área metropolitana de Bucaramanga.

Para este informe se sigue dando cumplimiento al apéndice J, donde hace referencia en la importancia que tiene la contratación de mano de obra femenina.

Por medio del correo electrónico corporativo y en los Puntos de Atención al Ciudadano PAC, se recibieron las hojas de vida de manera digital de las personas interesadas.

Fotografías 11 y 12: *Información a la Comunidad*

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Tabla 8: *Personal Contratado MONC*

PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA & NO CALIFICADA					
#	**ÁREA**	**CÉDULA**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CARGO**	**ESTADO**
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	**ACTIVO**
2	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	**ACTIVO**
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	**ACTIVO**
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	**ACTIVO**
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	**ACTIVO**
6	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	**ACTIVO**
7	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	**ACTIVO**
8	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	**ACTIVO**
9	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	**ACTIVO**
10	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	**ACTIVO**
11	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
12	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
13	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
14	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Oficial de Obra	**ACTIVO**
15	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**ACTIVO**
16	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
17	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso quintero Quintero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
18	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**ACTIVO**
19	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**ACTIVO**
20	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**ACTIVO**
21	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
22	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
23	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
24	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**ACTIVO**
25	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
26	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
27	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	**ACTIVO**
28	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
29	Operativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
30	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
31	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
32	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
33	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
34	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
35	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
36	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
37	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
38	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
39	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
40	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
41	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
42	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
43	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
44	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
45	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

46	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
48	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
53	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
54	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
55	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
56	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
57	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
63	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	**RETIRADO**
64	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
69	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
75	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
78	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
81	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
83	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

4.6. LÍNEA ESTRATÉGICA: Comunicación Estratégica

La interventoría verificó la entrega de las piezas generales de divulgación como herramientas de información que describen aspectos de la obra los cuales serán distribuidos a los residentes del área de influencia.

El Consorcio Santander por medio de la profesional social propicia canales de información claros, veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto; Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos. Además, para la segunda fase de inicio se busca sensibilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, por lo tanto, se da a conocer que todas estas adecuaciones son incluyentes porque tienen en cuenta a la población en condición de discapacidad.

Para el logro de lo anterior se ha hecho uso de las siguientes estrategias de comunicación

- Volantes Informativos
- Sistema de Cornetas

- Voz a Voz
- Grupos Whatsapp de la Comunidad

- **Piezas Informativas**

La profesional social del contratista hizo entrega de las piezas de divulgación para su respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría.

- **Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto**

En el mes de junio se hizo acompañamiento social a la profesional del contratista en diferentes actividades que fortalecen el trabajo con la comunidad.

Fotografía 13: *Reunión Social*



- **Valla Informativa**

Se envió la información solicitada con relación a la valla a utilizar durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos requeridos por la oficina de prensa de la alcaldía municipal, una vez aprobada será ubicada en un punto estratégico de la obra.

Fotografía 14: *Imagen de la Valla Informativa*



- **Divulgación de información PMT**

Se han implementado señales informativas en cada frente de trabajo, con el fin de evitar índices de accidentalidad en las zonas donde se está ejecutando la obra, generando condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos en general.

Fotografías 15 y 16: *Señalización y Senderos Peatonales*





- **Cintas de seguridad:**

Las cintas reflectivas ayudan a prevenir el riesgo de accidentes de tránsito al advertir a las personas que transitan en las vías de otros vehículos, de cerramientos o señalamientos. Los frentes activos en obra cumplen con la norma vial con sus respectivas cintas de seguridad.

- **Controlador de Trafico:**

En el mes de junio se continúa implementado esta medida, con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el tráfico y transporte terrestre. Se tiene en cuenta para la contratación la importancia de generar empleo a mujeres y apoyar a amas de casa del sector que se está interviniendo.

Tabla 9: *Personal Femenino Contratado*

Operativo	**ACTIVO**	Femenino	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelac	Controladora de Trafico	La Univesidad
Operativo	**ACTIVO**	Femenino	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	La Univesidad

Para las controladoras de tráfico, se llevaron a cabo charla sobre las funciones con las que deben cumplir en sus puestos de trabajo y también con el buen uso de los EPPs.

- **Tecnologías de la Información y Comunicación:**

Por medio de este ítem se hizo relevancia en la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información por medio de:

- Mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico
- Imágenes, folletos, avisos o carteles en físico o digital

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

5.1. Informes de Gestión

- **Informe Mensual.**

Con el fin de dar cumplimiento al ítem de entrega informes mensuales la interventoría recibió el informe mensual social No 3 de la firma contratista, el cual fue revisado y aprobado por esta interventoría, de la misma manera se presenta el informe mensual social de la interventoría No 3 para su revisión y aprobación.

- **Inspección de Campo.**

Los criterios que sigue la interventoría para valorar el desempeño social del contratista están basados en los acompañamientos y resultados de las inspecciones semanales realizados en el proyecto.

Además, el contratista dio cumplimento a la entrega en físico del documento correspondiente al componente de Gestión social el “Plan de Dialogo Ciudadano y comunicación Estratégica”, dicho documento fue radicado en la secretaria administrativa de la alcaldía de Bucaramanga. **(Anexo 7)**

- **Bitácora Social**

La profesional social del contratista registra en la bitácora social información del componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica lo cual permite tener claridad en cada una de las actividades realizadas en campo y la cual es revisada y firmada por la profesional social de la interventoría.

- **Comités Integrales.**

El área social estará presente en las reuniones en las que sea convocada y/o pertinente la participación, brindando información relacionada y actualizada en el tema del componente de gestión social.

Se propone realizar reuniones y acompañamientos desde el área social de la interventoría al grupo 1 del contratista para conocer el trabajo desarrollado, los avances, aciertos e inconvenientes identificados durante la ejecución de las obligaciones estipuladas desde el componente de gestión social.

El día viernes 02, 15, 30 de junio de 2023 se realizó una reunión con la interventoría JESAK SAS y los 3 grupos que hacen parte del contrato 429 Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga, con el contratista Consorcio Santander, la interventoría Jesak SAS y el supervisor del contrato donde se habló sobre las actividades realizadas a la fecha desde el área técnica y social, igualmente dificultades presentadas en obra, además se adquieren unos compromisos con el fin de mejorar la ejecución del contrato. **(Anexo 8)**

Fotografías 17 y 18: *Acompañamientos Comités Técnicos*





En el mes de junio igualmente la profesional social de la interventoría Jesak SAS hizo acompañamiento a la profesional social de la empresa contratista Consorcio Santander en actividades como actas de vecindad y su respectiva revisión para firmas y socializaciones de inicio.

Fotografía 19: *Acompañamiento Social*



El día 29 de junio se desarrolló un comité social en la Alcaldía de Bucaramanga con la participación de las profesionales sociales de los contratistas, la interventoría y la supervisión con el fin de revisar los avances a nivel alcanzados a la fecha, conocer el faltante en relación a las reuniones de socialización de inicio, actas de vecindad y las PQRS recibidas en cada uno de los sectores y la solución frente a las mismas, además se resuelven dudas y preguntas que surgen en relación a la ejecución del contrato. **(Anexo 9)**

Fotografía 20: *Reunión Social*



- **Calificación del Componente de Gestión Social**

Durante el mes de junio se diligencia el Excel correspondiente a la lista de chequeo que permite evidenciar de manera detallada el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista Consorcio Santander. **(Anexo 10)**

6. CONCLUSIONES

El contratista dio alcance a las actividades del componente social que se ha venido desarrollando en esta etapa del contrato y a las actividades descritas en el Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

Es fundamental seguir contando con el acompañamiento por parte de las profesionales sociales de la Alcaldía en las diferentes reuniones y socializaciones que se desarrollen con la comunidad ya que son las persona que representan en el área social a la entidad contratante durante la ejecución del proyecto.

El lineamiento para el componente de Gestión Social se propone a los contratistas teniendo en cuenta el apéndice J y se está implementado tal y como se muestra en el presente informe.

Se está dando cumplimiento al Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para mitigar los impactos que se ocasionan en la ejecución del contrato y de esta manera generar apropiación y sostenibilidad en las comunidades que garantice el adecuado desarrollo del proyecto.

7. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATO DE PQRS Y RESPUESTAS

ANEXO 2: ACTA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VEEDURÍAS

ANEXO 3: ACTA DE REUNIÓN RECORRIDOS COMITÉ VEEDOR

ANEXO 4: ACTA DE REUNIONES SOCIALIZACIÓN DE INICIO

ANEXO 5: ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 6: CAPACITACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC

ANEXO 7: OFICIO CON RADICADO DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

ANEXO 8: ACTA DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTOS A COMITES TÉCNICOS

ANEXO 9: ACTA DE REUNIÓN SOCIAL ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ANEXO 10: CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: Junio 6/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Wilson David Ulloa Camacho.
Número del documento de Identidad	91'236.953. de Bmanga.
Dirección	Calle 9A # 24-51
Número(s) de teléfono(s)	3168348467 — 3162848983
Correo electrónico	Wdaourca@hotmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

- Solicito acceso a Parqueadero: por tener Vehiculo.
- Residencia Antigua Sin Plano Arquitectonico

Solicitud de Intervención adelantada en la Secretaria infraestructura con el Ingeniero Bayona y el interventor el Ingeniero Vladmir- Junio 5/2023

Firma del peticionario:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 061

Bogotá D C, 08 de junio 2023

Señor
Wilson David Camacho
91.236.953
Propietario casa Calle 9ª #24-51

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la universidad emitida el 06 de Junio

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la universidad acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la **calle 9ª #24-51** el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido: Wilson David Camacho
91.236.953

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: OAP

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 2023 Mayo 01 de 2023

1. TIPO DE SOLICITUD.
Marque con una X el tipo de PQRSD

ción	X	Queja	☐	Reclamo	☐	Sugerencia	☐	Denuncia	☐

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Daniel Pedraza Martinez
Número del documento de identidad	1.100.890.054 de Rionegro (Santander)
Dirección	Calle 9A # 24 – 75
Número(s) de teléfono(s)	3176792198 – 3154307990
Correo electrónico	pedraza2562.defender@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD


Comedidamente me permito solicitar, que en la Obra de Adecuación de Andenes que se está
ejecutando en la Calle 9A con Carrera 24 del Barrio la Universidad del Municipio de Bucaramanga,
por favor se revise y se respete el Acceso Vehicularque tiene mi Inmueble que está ubicado en la:
Calle 9A # 24 – 75, toda vez que diariamente parqueo el vehículo de placas KLK440 siendo éste el
Garaje de mi Vivienda, y se ve afectado el ingreso por dicha remodelación, ya que quedaría el
Andén completo e inhabilitándome el parqueadero; espacio que ya existía antes de iniciar la Obra
que se está ejecutando actualmente frente a mi Casa, por tal motivo requiero se estudie la
posibilidad de aprobar que en este caso me dejen el Ingreso vehicular.
Por lo tanto, adjunto Fotos que evidencian lo que describo anteriormente y Agradezco de antemano
la colaboración que me puedan brindar en el menor tiempo posible porque reitero que dicha Obra
está en Ejecución, por último quedo atento a una pronta y positiva respuesta.


Firma del Peticionario:

Powered by CamScanner





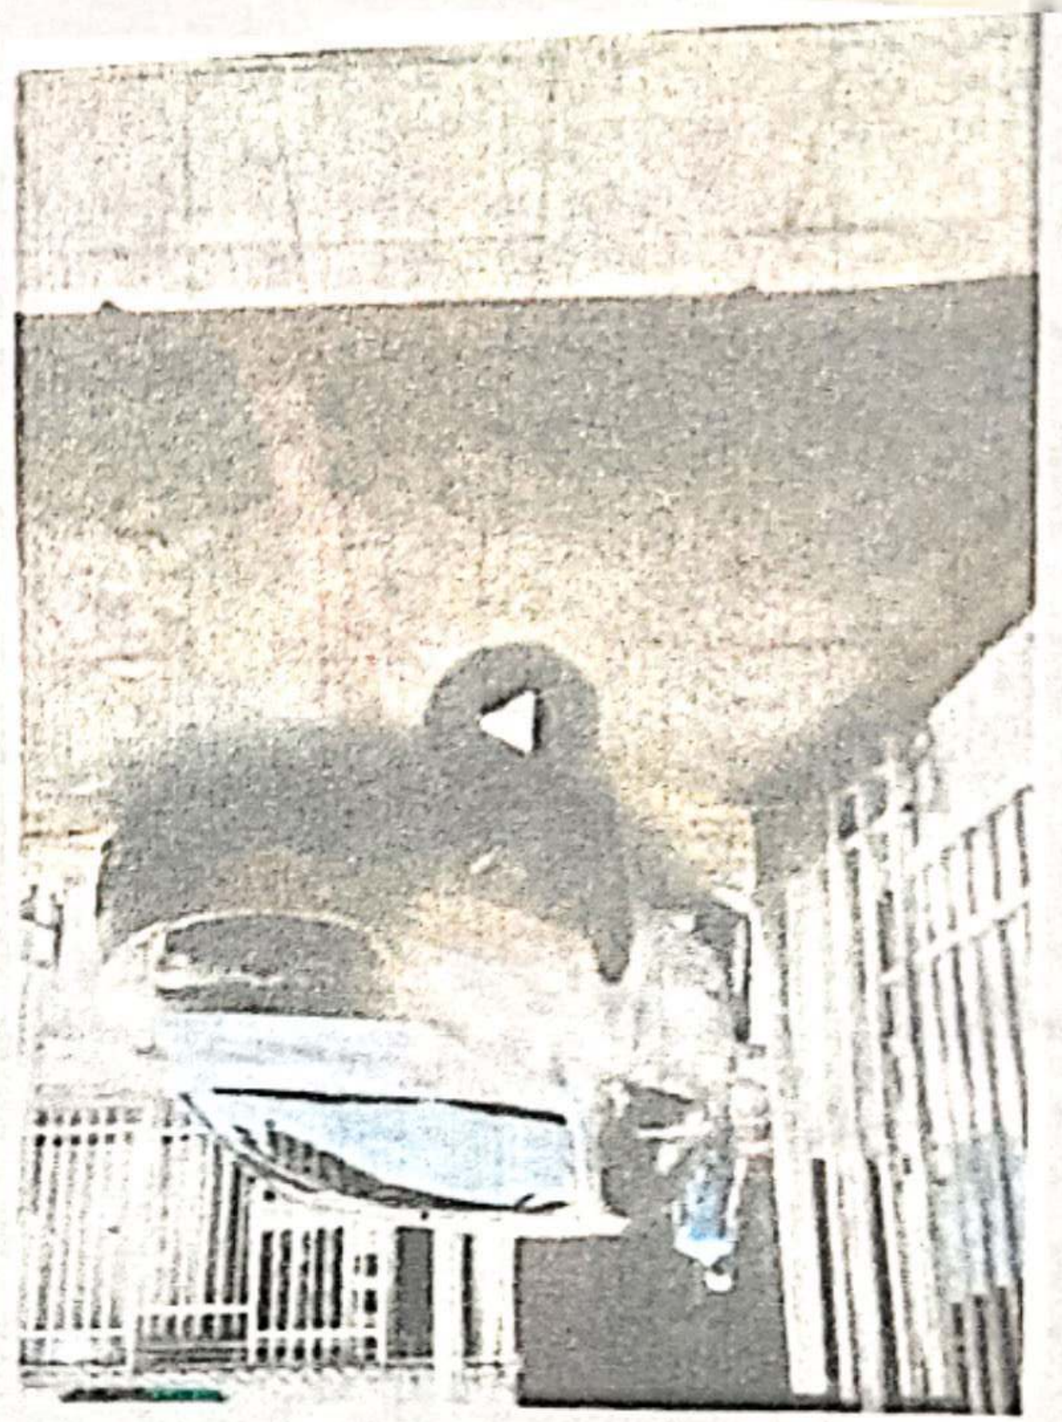

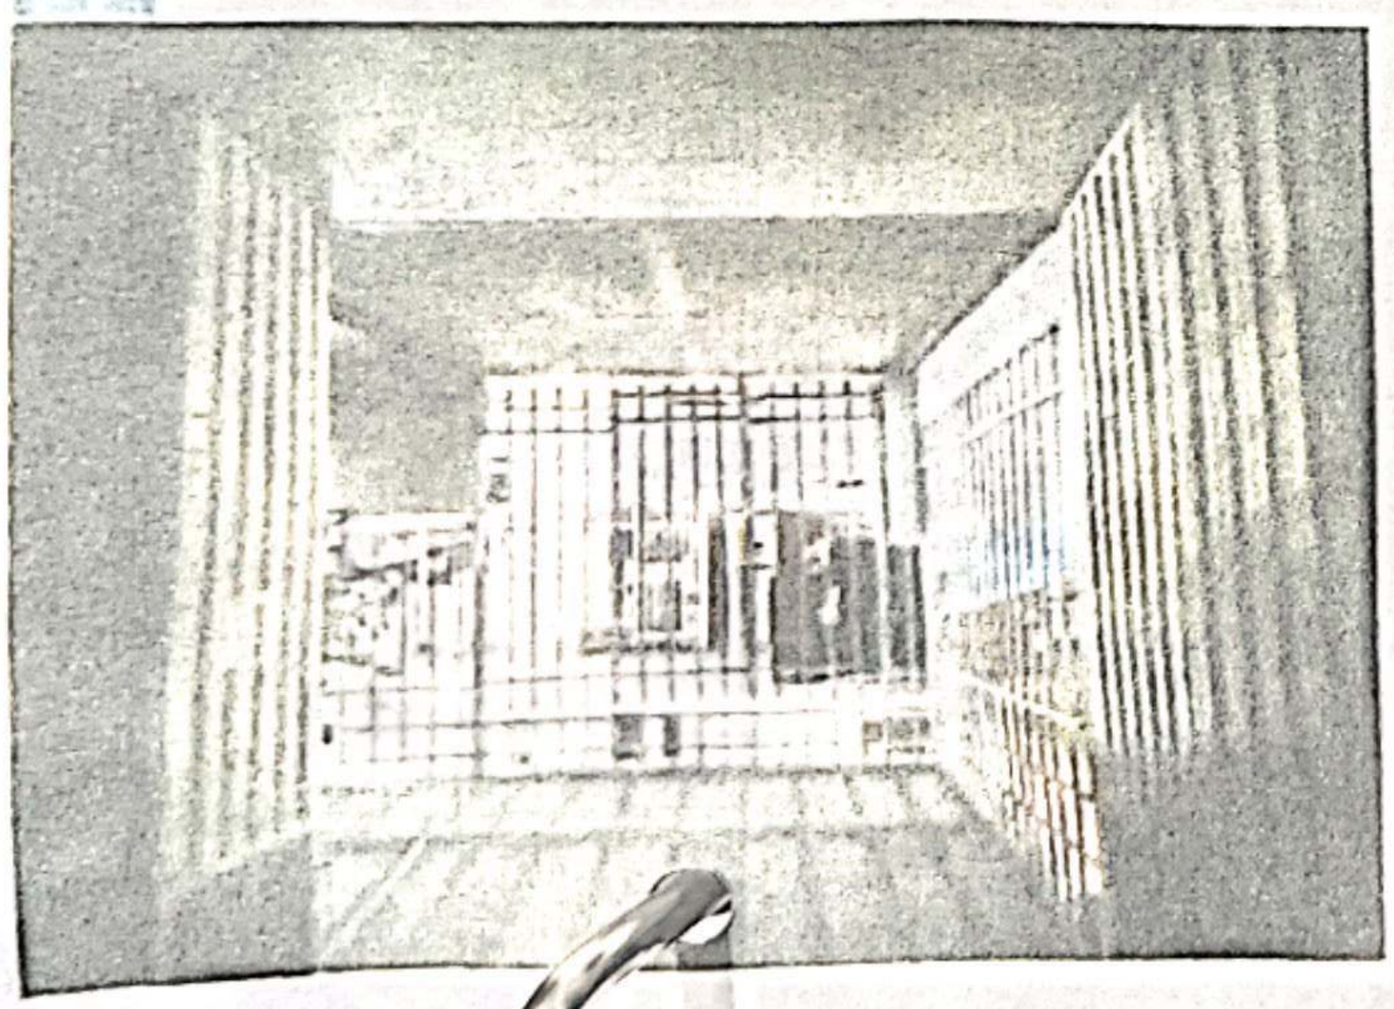



Powered by CamScanner

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 062

Bogotá D C, 09 de junio 2023

Señor
DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
1.100.890.054
Propietario casa Calle 9ª #24-75

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la universidad emitida el 31 de mayo

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la universidad acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 9ª #24-75 el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido por: Daniel Pedraza
1100890054
15/junio/2023
9:10AM

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: OAP

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: Junio 01 | 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Nancy Sanchez Duarte
Número del documento de Identidad	63362773 Blmanga
Dirección	Calle 9A # 24-17
Número(s) de teléfono(s)	3187121112 - 3168430404
Correo electrónico	nancysanchezduarte217@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Muy amablemente solicito dejar acceso para entrada del vehiculo Placas IPR531. El cual se utilita para asistencia y traslado de la sra. María Duarte de Sanchez persona mayor de edad y con muchos quebrantos de salud.
Agradezco la atención.

Firma del peticionario:

Nancy Sanchez Duarte


Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



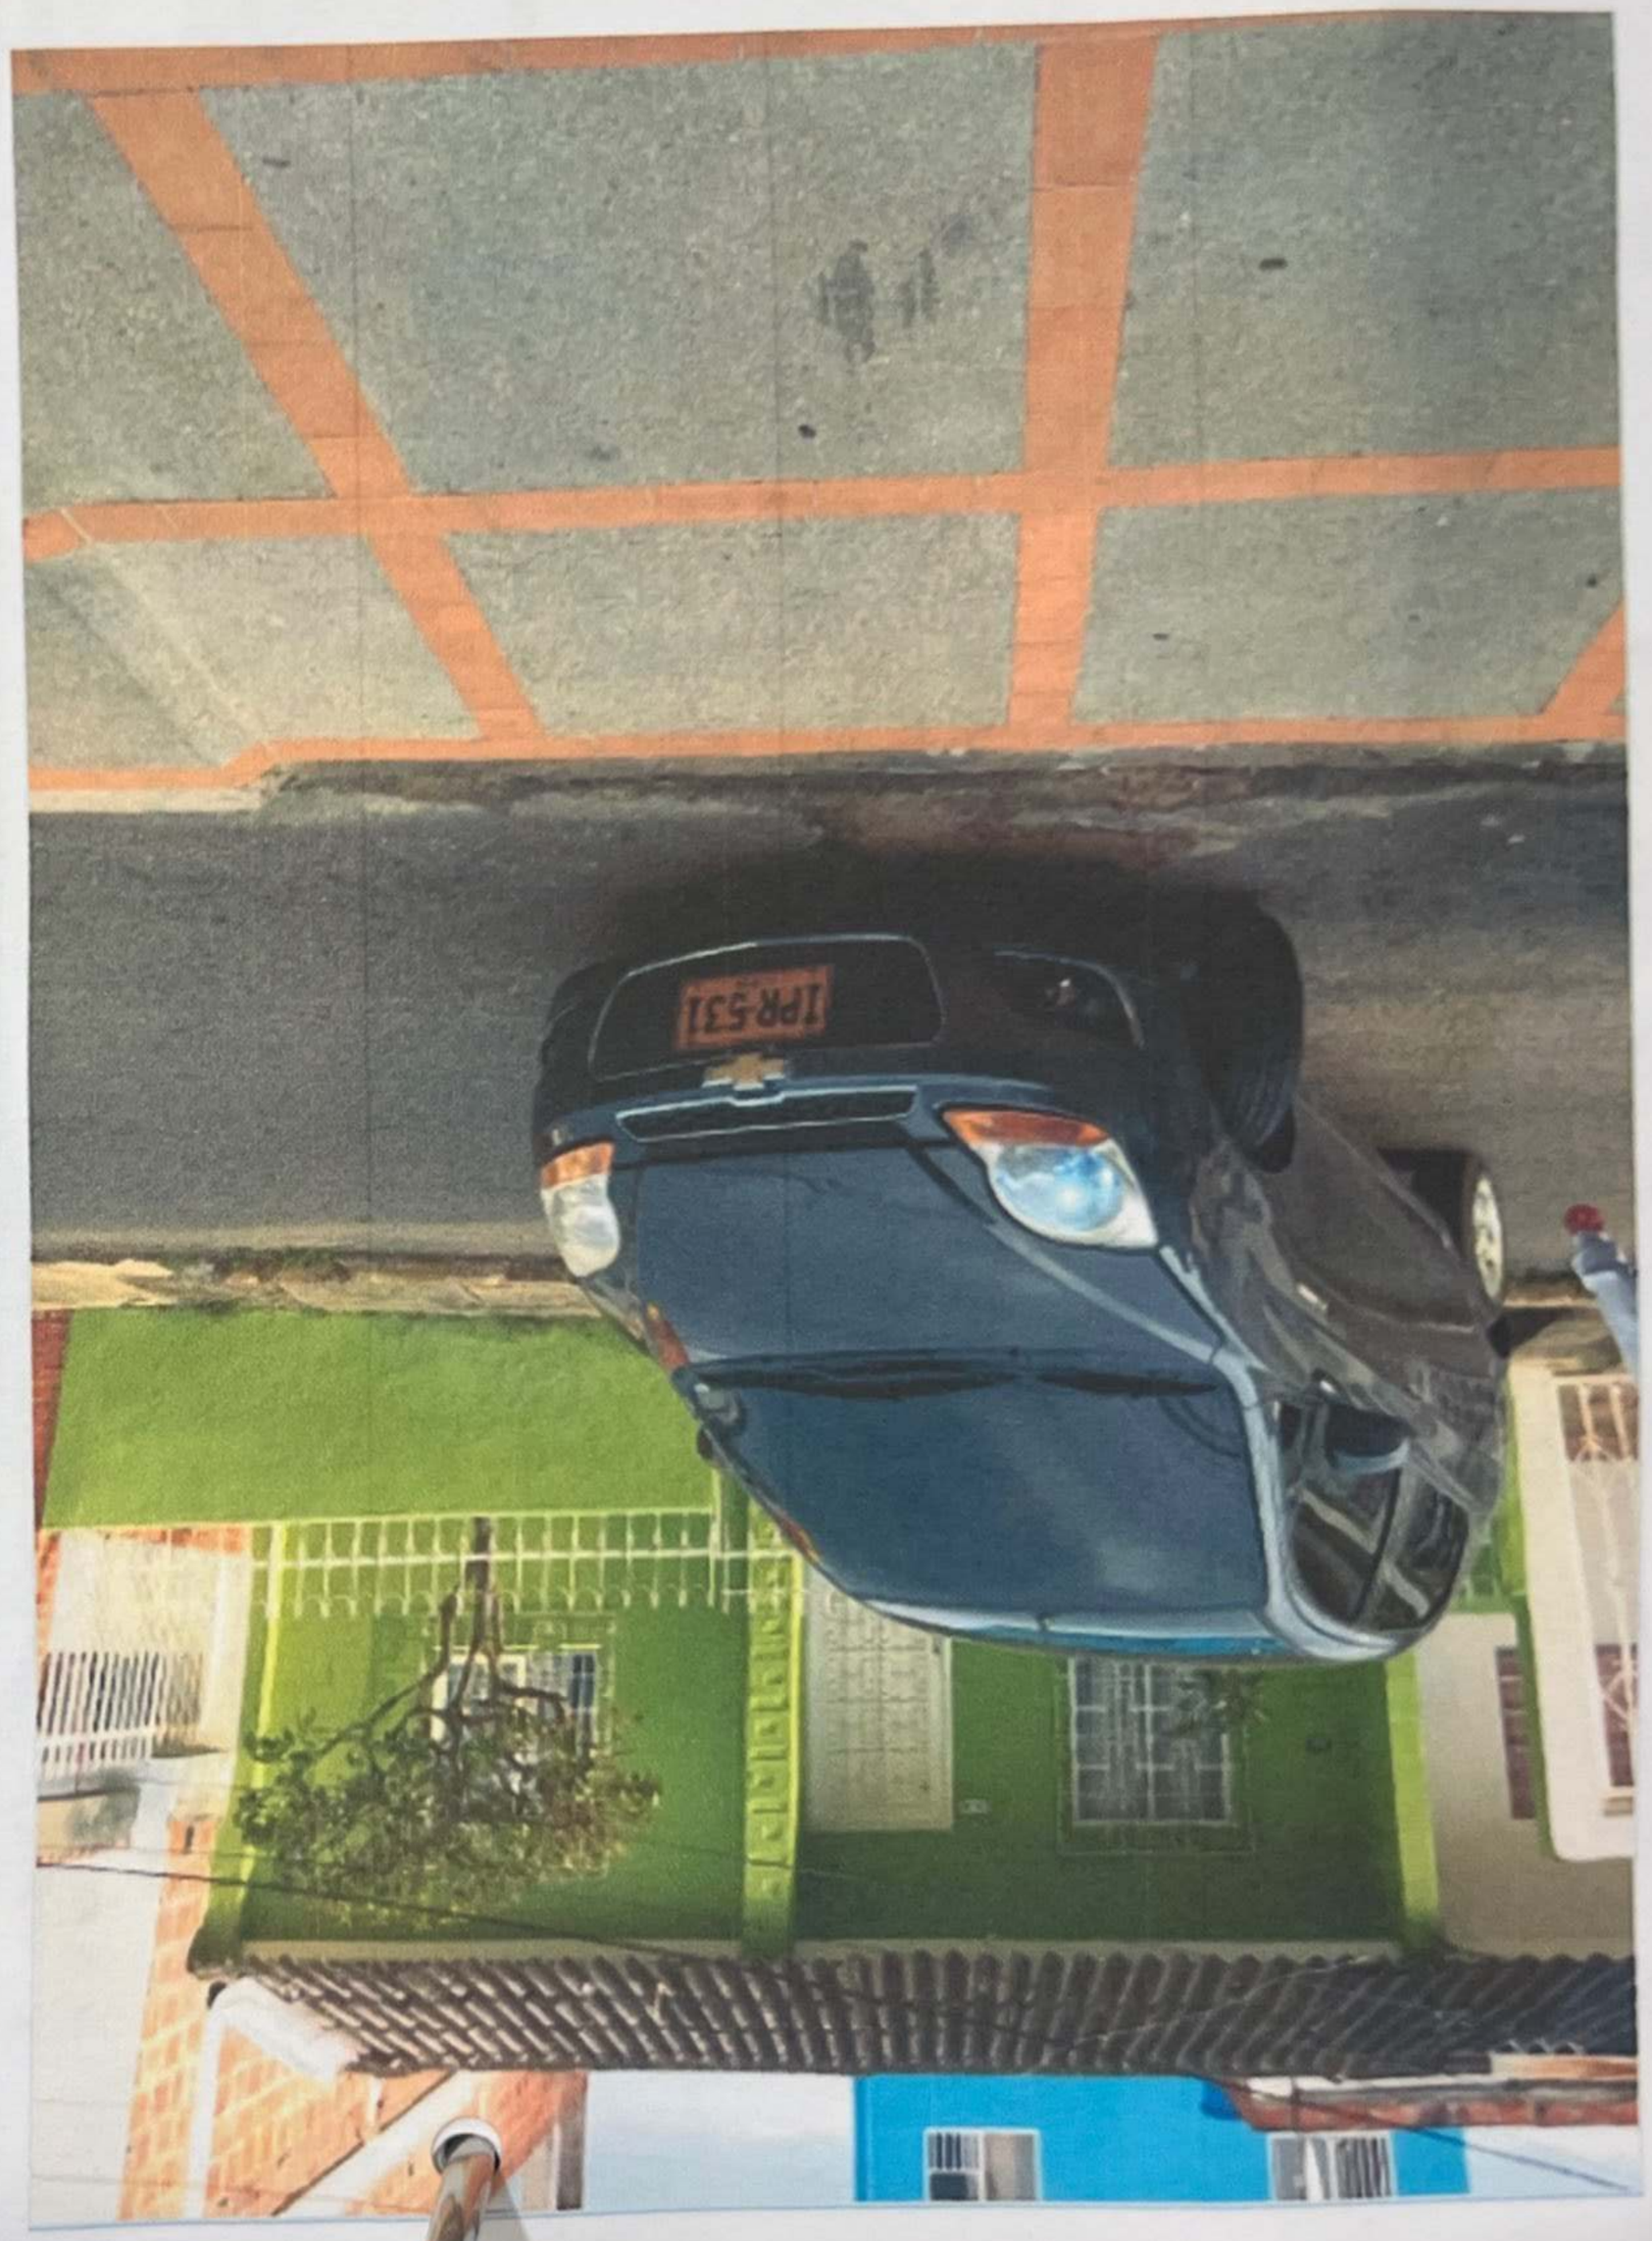

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 064

Bogotá D C, 09 de junio 2023

Señor
NANCY SANCHEZ DUARTE
63.362.778
Propietario casa Calle 9ª #24-17

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la universidad emitida el 01 de junio

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la universidad acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 9ª #24-17 el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

Recibido por: [signature]

15/junio/2023
9:30AM

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: OAP

Powered by CamScanner

Alcaldia de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 08 - 06 - 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	☐	Queja	☐	Reclamo	☐	Sugerencia	☒	Denuncia	☐

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	GERMAN DARIO BARRERA ORDOÑEZ.
Número del documento de Identidad	C.C. 13.510.533. B/GA
Dirección	CALLE 9A 24-59
Número(s) de teléfono(s)	3164938511
Correo electrónico	DARIO0527@HOTMAIL.COM

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

SOLICITUD DE RAMPA DE INGRES PARA EL FRENTE EL DOMICILIO EL CUAL SE GUARDAN 3 VEICULOS AUTOMOTES LA CUAL SON MOTO POR TAL MOTIVO PIDO LA SUGERENCIA DE UN INGRESO MINIMO DE 70 CM DE ANCHO PARA ASI PODER HACER UN INGRESO COMODO Y NO TENER DENOS EN LOS AUTOMOTORES Y ASI MISMO EN LOS SARDINELES PUESTO AGRADESCO SU COMPRESION Y COLABORACION PARA UNA RESPUSTA SATISFACTORIA

Firma del peticionario:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 064

Bogotá D C, 09 de junio 2023

Señor
GERMAN DARIO BARRERA ORDOÑEZ
13.510.533
Propietario casa Calle 9ª #24-59

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la universidad emitida el 08 junio

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la universidad acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 9ª #24-59 el consorcio Santander se permite comunicar que no se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría en visita a la propiedad mencionada anterior mente se evidencia que es una entrada peatonal mas no una entrada vehicular.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.



Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido por: Cecilia Ordoñez C
37.799.76
15/junio/2023
9:00AM

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: OAP

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: Junio 02 de 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Fabian Gonzalo Arenas Florez
Número del documento de Identidad	1.098.605.042 de Bucaromanga.
Dirección	Calle 9A # 24-31. Barrio la Universidad.
Número(s) de teléfono(s)	3132589742 - 3176356405 - 3158844503.
Correo electrónico	Fabianarenas_col@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Debido a la restructuración de los andenes; de manera atenta Solicitamos se haga una rampa de acceso como anteriormente la tenia; la casa ubicada en la calle 9A # 24-31. Barrio la Universidad; para el ingreso del vehiculo marca Skoda Felicia con placas CXA116, lo anterior debido a que el vehiculo se guarda en el garage todos los dias en las noches, hace 10 años.
Anexo fotografias del vehiculo en mención guardado en el garage.

Firma del peticionario:


Fabian Arenas R.

Powered by CamScanner







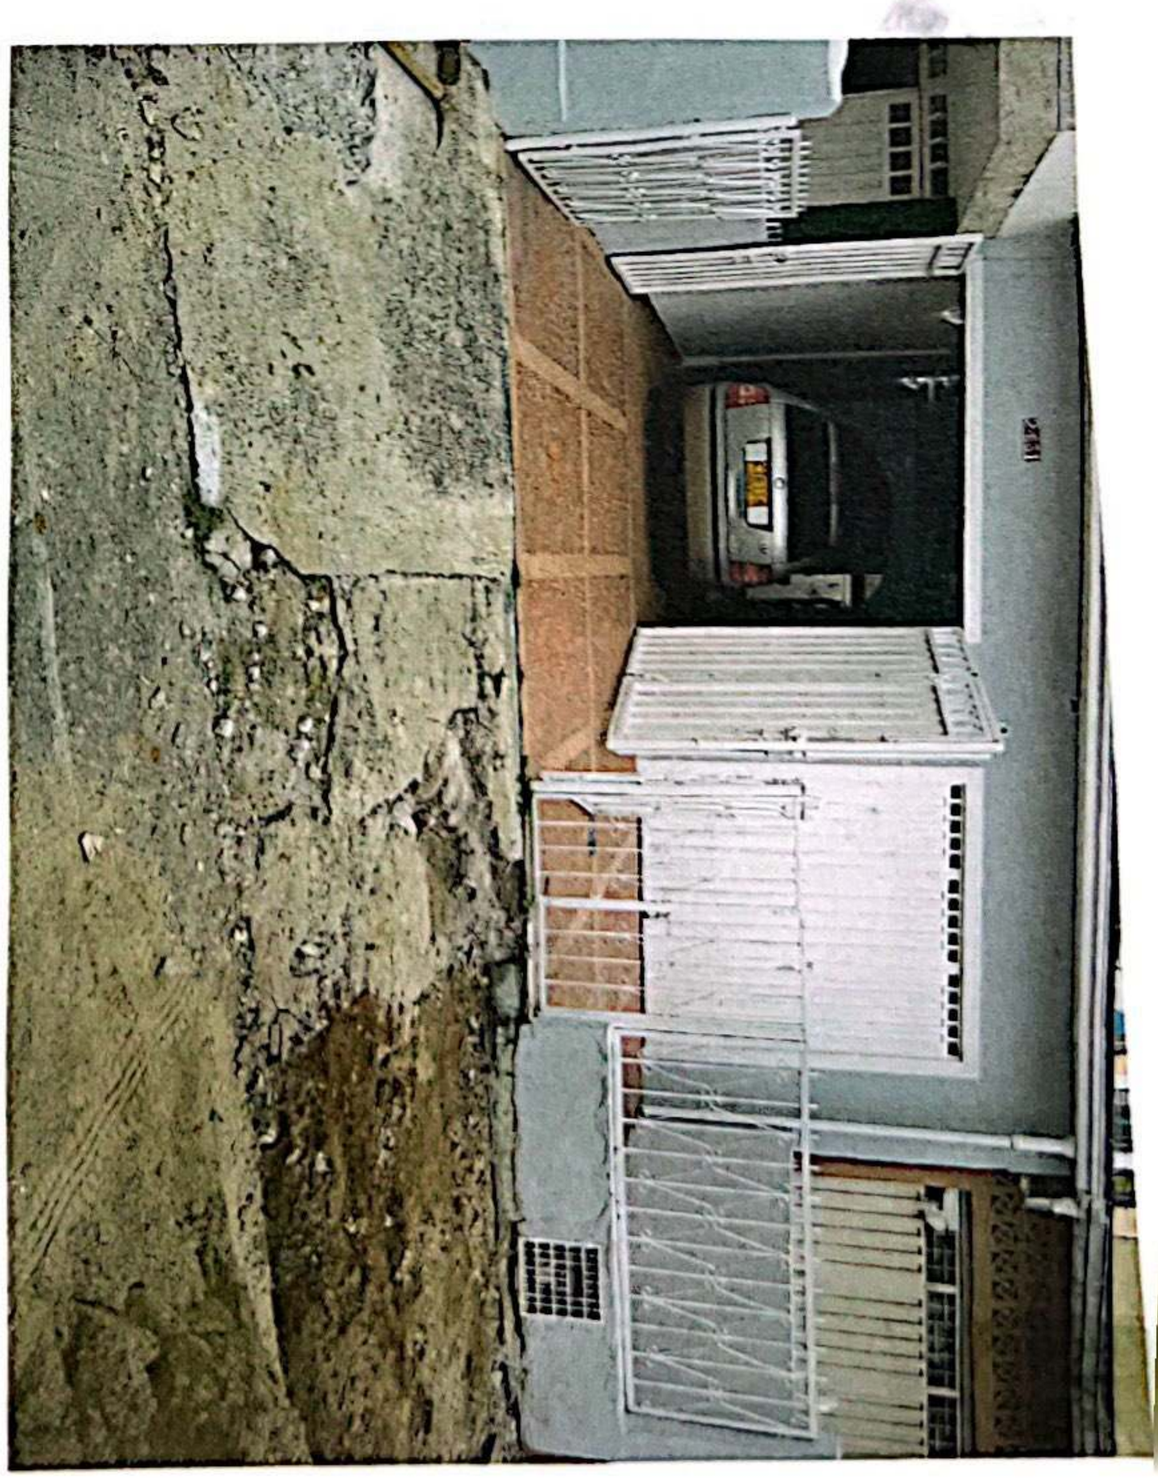

Powered by CamScanner

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 063

Bogotá D C, 09 de junio 2023

Señor
FABIAN GONZALO ARENAS FLOREZ
1.098.605.042
Propietario casa Calle 9ª #24-31

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la universidad emitida el 02 de junio

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la universidad acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 9ª #24-31 el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido: Yolanda Edgar.
3783881 B/ga.
15/junio/2023
9:15am

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: OAP

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**REUNIONES COMITÉ VEEDOR**	Código	CS-FO-SOC-004
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 07/junio/2023

TEMA: comite veeda las vegas de Morrorco.

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	**CARGO / ROL**	**FIRMA**
Alcance Duarte Duarte	Veedor Vegas	Alcance Dut Duv
Diego Ivan Anguita Aldana	Presidente JAC	
Estendy Cortes Aguilar	Prof Social Interventoria	
Bernardo Sierra Cuervo	HSEQ	
Andrea Ayala	Social	

Se deja constancia, que cada 26 días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR	Código	CS-FO-SOC-004
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 28/Enero/2023

TEMA: Socialización Inicio de obra Campo Madrid

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Yeimy [illegible]	3164738817	Juzmyla Velásquez Loza
Liz Mera Velasquez	3153159066	[illegible]
Wilson Caballero	3176562744	
Yesica Rodriguez		
Sara Martinez		

Se deja constancia, que cada 15 dias estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR**	Código	CS-FO-SOC-004
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 23/jun/2023

TEMA: conformacion comite veedor juventud

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	**CARGO / ROL**	**FIRMA**
victor manuel cabrera	3153993989	
Mary luz ordoz	3186455950	
Sandra Milena Ardila	3233576140	
Eliecer Jaime	3144456477	

Se deja constancia, que cada 20 días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR**	Código	CS-FO-SOC-010
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 09/ Junio /2023

TEMA: Socalizacion Inicio de obra barrio el Rosal

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	**CARGO / ROL**	**FIRMA**
Ovidio Vargas	3184162256	
Ubaldo Castillo Jimenez	3212381260	
Alfredo Ramirez duque	3173215477	
[illegible]	3173215417	

Se deja constancia, que cada 20 días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código**	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	**Versión**	1
		Pagina	Página **1** de **3**

FECHA: 07 / Junio /2023	**HORA INICIO: 7:30 AM**	**ACTA N°: #12**
LUGAR: Calle 10 entrada las vegas de morrorico	**HORA FIN: 8: 30 PM**	

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido con el grupo de veedores sector las vegas de Morrorico
- Explicación del área técnica y social de la ejecución y avance de la obra
- Resolver preguntas, dudas e inquietudes

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de avance de obra, con el acompañamiento del inspector de obra Amaury Mendoza, la profesional social de interventoría Eslendy corzo, el profesional HSEQ Bernardo Suarez del contratista, se le agradece por el tiempo prestado a las personas que asistieron, se inicia el recorrido por la obra, se le explica al grupo de veedores el atraso y los inconvenientes que se han presentado durante la ejecución del objeto contractual en el sector de la calle 10 vegas de Morrorico, entre ellos el traslado de las palmas con su respectiva autorización, el proceso de construcción donde se creó un borde de ajuste de contención, se realizó la poda aérea y radicular para poder intervenir en el terreno y proyectarle a 29 metros de franja peatonal, además según el perfil vial se amplió dos metros para una mejor circulación de la franja peatonal, se tomaron en cuenta las observaciones de parte de la comunidad para mantener el espacio de la zona verde y preservar la seguridad de los peatones.

Se le informa a los veedores el avance que se ha tenido hasta la fecha y está pendiente la fecha para el cierre de la misma.


Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar finalización de obra	**Área social- Consorcio Santander**	**JULIO**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	

ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**REUNIONES COMITÉ VEEDOR**	Código	CS-FO-SOC-004
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 09/junio/2023

TEMA: comite veedo los vegas de Morrorico.

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	**CARGO / ROL**	**FIRMA**
Arcenz Duark Acuña	Veedor Vegas	Arcenz Duark Acuña
Diego Ivan Angarita Alcaraz	Presidente COMITE	
Estendy Cortes Aguilar	Prof Social Interventoria	
Bernardo Sierra Cenero	HSEQ	
Andrea Ayala	Social	

Se deja constancia, que cada 26 días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

FECHA: 02/ Junio / 2023	**HORA INICIO: 3:00 pm**	**ACTA N°: #10**
LUGAR: Salón comunal Cra 50 #32-48	**HORA FIN: 5:00 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, se muestra evidencia fotográfica del estado de los andenes, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio al tráfico de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se reitera a la comunidad el valor total del presupuesto asignado para el barrio Albania y el origen de cada uno de los recursos, se dan las direcciones exactas de los tramos a intervenir y el valor de ejecución.

Se le explica a la comunidad el perfil vial de la zona, en el cual especifica que la vía es peatonal mas no vehicular, la comunidad en general no está de acuerdo que se quite acceso a los vehículos ya que esto generaría un impacto social entre ellos, no obstante, la ingeniera Iliana velandia contratista expone que el objetivo del proyecto es adecuar y recuperar el espacio público.

La comunidad pide que se haga una socialización puerta a puerta explicándole a cada persona lo que se a hacer, ya que fue muy pocas las personas que asistieron a la reunión el día 02 de junio.



Teniendo en cuenta la solicitud de algunos participantes a la reunión se les reitera que al momento que se vayan a realizar las actas de vecindad de inicio se brindará nuevamente la información adecuada en relación al alcance del contrato 022-2023 Adecuación de Andenes, Escaleras y Pasamanos del municipio de Bucaramanga con la finalidad de despejar y aclarar dudas.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**JUNIO**
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	**Área social- infraestructura**	**JUNIO-JULIO**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




2/6/23 15:40
socialización inicio de obra ALBANIA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CS




2/6/23 15:52
Comuna 14 Morronco


2/6/23 15:40
7°7'44,46253"N -73°6'19,68764"W ±7,06m
socialización inicio de obra ALBANIA
CS

INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

COMUNA 14 - BARRIO ALBANIA

Fecha: 02 de Junio 2023

Lugar: Salon comunal cra 50 #32-48

Hora: 3:00pm

CONSORCIO SANTANDER

Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com

INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #1

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 26 / mayo / 2023

TEMA DE REUNIÓN: SOCIALIZACION INICIO DE OBRA BARRIO Albania

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Elizabeth Dajudo Raquel	63512311	3017384212	
Martha Sepulveda	63359571	3157965255	Martha S.
Pablo CASARES	7881095	3169206865	
Elsy Ramirez	63277997	3177988518	Elsy Ramirez
Fanny Herrera	63276708	3165625933	
Diocelina Rivera	28279736	3132710052	
Carmen Cecilia Contreras	63320044	3168148928	
Liced Guevara Lamus	37894957	3177166788	
Yon Sanchez Torres	1098236217	2236091 17	
Elodia Torres Caceres	63312121	3202926402	
Estefy Goltz Aguilar	63532661	3107622107	
HELI VILLAMIZAR CONDE	91.255190	3175736468	
Vladimir Figueroa Quintero	91287182	3043649667	
Abidis Castro Hernandez	5156360	3178660887	
Elbar Nes Romero M.	1.5462796	3165142118	
Andrea Avila S.	7099925	3223094	
Layde Iliana Velandia Torres	1070363692	3204438835	
Nathalie Quintero Suarez	1098688397	3008415407	
Santiago Basto Espinosa	1095818253	3118737775	Santiago Basto.
Juan Jose S	5561383		Juan Jose S

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

FECHA: 09/ Junio /2023	**HORA INICIO: 3:30 pm**	**ACTA N°: #11**
LUGAR: Cancha de tierra el Rosal	**HORA FIN: 5:00 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, se muestra evidencia fotográfica del estado de los andenes, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio al tráfico de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se reitera a la comunidad el valor total del presupuesto asignado para el barrio el Rosal y el origen de cada uno de los recursos, se dan las direcciones exactas de los tramos a intervenir y el valor de ejecución.



Se resuelven dudas, preguntas e inquietudes que se presentaron respecto al tramo a intervenir, la comunidad refiere que hay otros sitios que debieron de ser priorizados, no obstante, se aclara que el sector elegido fue por votación de la comunidad y la junta de acción comunal.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**JULIO**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

COMUNA 1 NORTE -BARRIO EL ROSAL

Fecha: 09 de junio 2023

Lugar: Cancha de tierra el Rosal

Hora: 3:00pm

CONSORCIO SANTANDER

Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com

INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #1

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**LISTADO DE ASISTENCIA**	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

FECHA: 09/Jun/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Reunion Inicio de obra barro el Rosal

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Elizer Ibarra Morillo	6864777		
Guido vargas G.	91252264	3184162756	
Johana Jimenez	1063487158	3202719473	
Libia Rosa Castillo Jimenez	1063980732	3212381260	
JESSICA PAOLA DOTA M.	1118869977	3223416204	
Jordanmauricio Guevara Alvarez	1005248526	3140965337	
Carmen Correa Gutierrez	63512535	3133879154	
Maria Alejandra Vera Gutierrez	1098701441	3182517240	
Maria Isabel carreno	37746304	3185797494	
Laura Sanchez A.	91220407	3157448041	
Claudia Almeida Quintero	1003340582	3204312357	
[illegible]	1245678	3173215417	
Sandra Milena ramirez Real	37510237	3183790296	
Estefy Cano Aguilar	63532661	3107622197	
RAUL 1/01/1945	91.500.142	2119216099	
Karen Astrid Gomez Ortiz	63550013	3165782447	
Jose de la cruz Suarez	91176135	3183756259	
Bernardo Sierra Carreño	1098620599	3164966325	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

FECHA: 23 / Junio / 2023	**HORA INICIO: 3:00 pm**	**ACTA N°: #13**
LUGAR: Caseta comunal	**HORA FIN: 5:00 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, se muestra evidencia fotográfica del estado de los senderos peatonales, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio al tráfico de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se reitera a la comunidad el valor total del presupuesto asignado para el barrio la juventud dándose un promedio de 613 metros cuadrados y el origen de cada uno de esos recursos, se dan las direcciones exactas de los tramos a intervenir y el valor de ejecución.

La comunidad manifiesta que no están de acuerdo que se intervenga la calle 1N entre carreras 21BB hasta la cra 20 A ya que se encuentra en buen estado y hay otros andenes que requieren ser priorizados, se entrega formato de

PQRS para que pasen la solicitud de cuales senderos se encuentran en mal estado con el fin de pasar la solicitud a la entidad correspondiente y que ellos sean los que determinen.
No obstante, resaltan que no es el tramo completo ya que una parte si está en buen estado y otra no.



Se le agradece a la comunidad por la acogida y el acompañamiento prestado.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**JULIO**
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	**Área social- infraestructura**	**JULIO**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




23/6/23 15:30
7°8'38,58752"N -73°7'44,270"W ±9,94m
Altitud:842.0m
socialización inicio de obra la juventud
Número de índice: 4
JUVENTUD
CS


23/6/23 15:29
Altitud:842.4m
socialización inicio de obra la juventud
Número de índice: 3
CS


23/6/23 15:31
7°8'38,57622"N -73°7'44,27008"W ±9,94m
Altitud:842.5m
socialización inicio de obra la juventud
Número de índice: 5
CS

INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

COMUNA 2 NOR-ORIENTAL BARRIO LA JUVENTUD

Fecha: 23 de junio 2023

Lugar: Caseta comunal

Hora: 3:00pm

CONSORCIO SANTANDER

Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com

INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #1

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**LISTADO DE ASISTENCIA**	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 23/junio/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Socialización Inicio de obra la Juventud

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Rosa María Celis	41481807	6409959	
Mireya Calderón Díaz	63.545.989	3173870248	
Hermes Gonzales	13.833.919	3583195GO	
Azucena Obando	63285432	3177521674	
Mary luz ardila	63347046	318 64 64950	
Victor M Cabrera U.	91'249.626	3153983989	
Martin Román perez	13.847363 20448 03	3185690236	
Sandra Milena Ardila	63561207	3223976140	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Blanca Aguilar Sot	63337584	3234029777	
[illegible]	55584430	3178453415	
ANITA GALLO REY	63399651	3118546364	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

FECHA: 28 / Junio / 2023	**HORA INICIO: 3:00 pm**	**ACTA N°: #13**
LUGAR: CDI CAMPO MADRID	**HORA FIN: 5:00 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, se muestra evidencia fotográfica del estado de los pasamanos, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio a las personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se reitera a la comunidad el valor total del presupuesto asignado para el barrio campo Madrid dándose un promedio de 340 metros cuadrados y el origen de cada uno de esos recursos, se dan las direcciones exactas de los tramos a intervenir y el valor de ejecución.

La comunidad solicita que por medio de la alcaldía de Bucaramanga se revise el tema de unos bolardos que hay existentes en las torres grises y que la comunidad solicita sean instalados en las torres amarillas del otro costado, con el fin de impedir el ingreso de las motos, respetando el espacio público y la prioridad de esos espacios sean para las personas en estado de discapacidad.

Además, manifiestan en la reunión que las barandas existentes que se retiren sean entregadas a la junta de acción comunal para darles otro uso, por lo cual la profesional social de la alcaldía Ania les informa que son ellos como comunidad son los que deben hacer la propuesta a la alcaldía explicando para que las necesitan y es la misma alcaldía quien determina si se lleva a un lugar de acopio o si se le entrega a la comunidad en representación de la junta de acción comunal.

Por otro lado, la señora Isidora Galvis edil de la comuna 1, muestra el acta donde le fue aprobado el presupuesto participativo en el año 2021 por un valor de $275.000.000 el cual explica que no coincide con el presupuesto dado por el contratista en la socialización de inicio de obra. Por consiguiente, la líder comunitaria se encargará de hacer la consulta ante la entidad para que le den claridad frente al tema y de esta manera compartir la información a toda la comunidad.



Se le agradece a la comunidad por la acogida y el acompañamiento prestado.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**JULIO**
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	**Área social- infraestructura**	**JULIO**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO


28/6/23 10:17
Altitud:712.0m
socialización inicio de obra
campo Madrid
Número de índice: 37
CS


CS


28/6/23 10:00
7°9'6,05891"N -73°8'27,3435"W ±9,94m
Altitud:726.6m
socialización inicio de obra
campo Madrid
Número de índice: 30
CS



INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

COMUNA 1 NORTE -CAMPO MADRID

Fecha: 28 de junio

Lugar: CDI

Hora: 9:00am

CONSORCIO SANTANDER

Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com

INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #1

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-SOC-001
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

FECHA: 28/ junio / 2023

TEMA DE REUNIÓN:

Socialnacion inicio obra barrio Campo Madrid

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Luzmila Velasquez Loza	63364297	3164238817	Luzmila Velasquez Loza Ed1 Comuna 1
Martha Cecilia Garcia	36436554	3156754121	Martha C Garcia
Alfredo villamizar	91299884		Alfredo villamizar
	13745[illegible]	3004354763	
Luis Remolino	9[illegible]		
Julia Patricia Martinez	63.490[illegible]	3194326743	Julia Patricia M
Cisley Jose Osorio	1[illegible]	3103293[illegible]	Cisley Jose Osorio
Leonor Sandoval	63.3[illegible]	3112[illegible]	Leonor S
Yessica Rodriguez	1227100	3176562746	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Martha Barbara	63.530.02[illegible]	3188727765	
Edymer Suarez			
[illegible]	10148[illegible]96	3[illegible]	
Jose Arturo Cehuzaman	109856159-3	3188[illegible]3353 - Jose	
[illegible]	1[illegible]	3152[illegible]	
Felix Bolaños sala de pizo	2071[illegible]		Felix Bolaños sala de pizo
Luz Marina [illegible]	28[illegible]	3158[illegible]	
Lina Gutierrez	28334395	3176867702	Lina Gutierrez
Alfonso Garcia Montilla	13.837611.	3158126774	Alfonso Garcia M.
A Parrino Delgado	2209417	3167[illegible]	A Parrino D
Esleidy Cuto Aguilar	63532664	3104[illegible]	
LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	1090363691	3204438635	
Edward [illegible]	1073[illegible]	3185[illegible]	
ANIA GALLO REY	63339651	3118546364	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 21/junio/2023 **HORA INICIO:** 11:00 Am **ACTA N°:** 1

LUGAR: Calle 31 #28-24 **HORA FIN:** 11:30 Am

1. TEMAS A TRATAR

① Arriendo bodega para Campamento
② Prestación de servicios de agua
③ Pago anticipado de las items mencionados anteriormente

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se realiza acuerdo con el propietario de la bodega calle 31 #28-24 que el valor a cancelar es de $450.000 mil pesos por el servicio de arriendo de un espacio aproximadamente de 10X12, servicio ilimitado de agua desde el 13 junio 2023 hasta el 13 de julio se paga mes adelantado, se anexa recibo de consignación por cuenta de negoci.

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago bodega	Oscar parada	13/junio
Pago de agua	Oscar Parada	13/junio

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Cindy Andrea Mala S.	Profesional social	
Oscar Parada	Ingeniero civil	
Jaro Barrera	arrendatario	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 21/junio/2023 **HORA INICIO:** 1:30pm **ACTA N°:** 1

LUGAR: Calle 31 # 28-17 **HORA FIN:** 2:00pm

1. TEMAS A TRATAR

① Servicios de luz

② Pago antiapado del Hems Mencionado anteriormente.

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se realiza acuerdo con el propietario de las servicios de luz en la calle 31 # 28-17 que el valor a cancelar es de $250000 mil pesos, servicio que se presta desde el 22 Enio, se paga mes adelantado, se anexa recibo de consignación por cuenta:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago servicio Uz	Oscar Parada	22/Junio

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Leidy Andrea Ayala	Profesional Social	
Camilo Rangel	Propietario	Camilo Rangel
Oscar parada	Ingeniero civil	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 23/junio/2023 **HORA INICIO:** 9:30 AM **ACTA N°:** 1

LUGAR: Centro clinico veterinario **HORA FIN:** 10:00 AM

1. TEMAS A TRATAR

1. Servicio de luz
2. Pago anticipado del items mencionado anteriormente

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se realiza acuerdo con el propietario de los servicios de luz en el centro clinico veterinario, que el valor a cancelar es de $170.000 mil pesos, servicio que se presta desde el 24 de junio, se paga mes adelantado, se anexa recibo de consignacion por cuenta.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago Reabo Luz	Oscar parada	23/junio

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Leidy Andrea Acala S	Profesional Social	
Oscar parada	Ingeniero Contratista	
Centro clinico veterinario		

Powered by CamScanner
















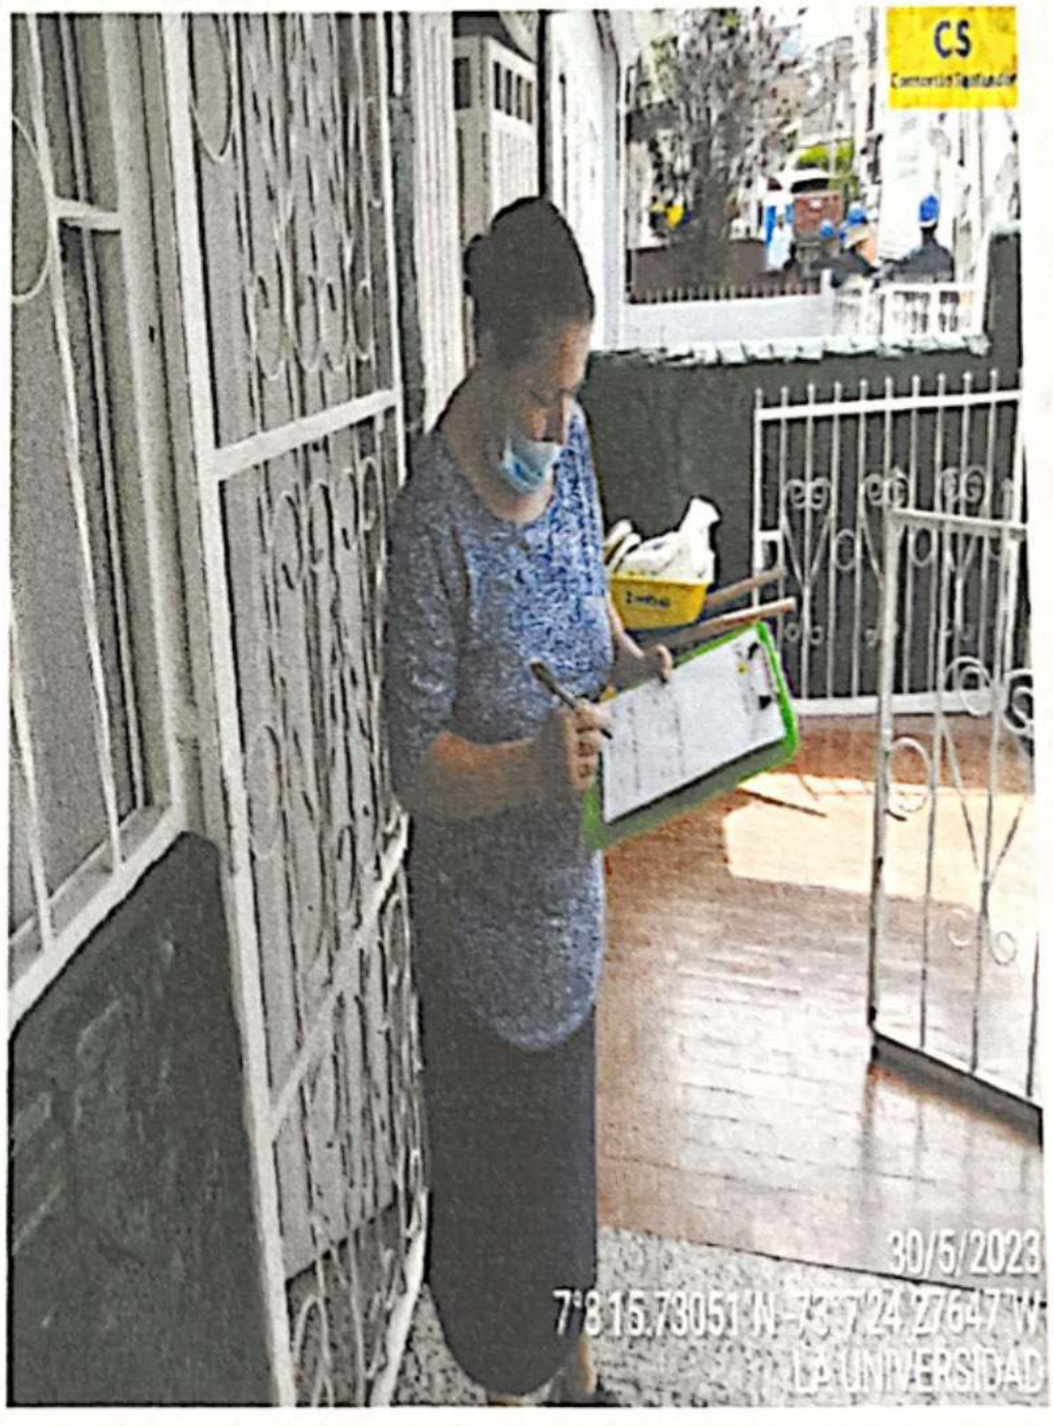

Powered by CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 067

Bogotá D C, 14 de junio de 2023

Señores
JESAK
Att// VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal
Interventoría del contrato.
jesak429grupo1@gmail.com

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: RADICACION MAO Y PLAN SOCIAL.

De manera atenta me permito anexar a este documento 2 cd´s, uno con el componente ambiental "mao" de la obra y el otro con el componente social para dar radicación en la secretaria administrativa de la alcaldía de Bucaramanga.

Cordial saludo,

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Aprobó: OAP

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 14-06-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Avenida Suba No. 106A-28 Oficina 202 Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601 5339575 - 601 9370295
buzon@mymingenieros.com

COMITE DE SEGUIMIENTO

Alcaldía de Bucaramanga

02 / Junio / 2023

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ___ DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander.

LUGAR:			FECHA:	HORA:	
CONTROL DE ASISTENCIA					
NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Edwar J. Vera R.	Jesak SAS	Pres. Inter.	—	3135424445	
Beatriz León Suárez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatriz.leon3@hotmail.com	3022315706	
Lady Andrea Alala S.	consorcio santander	Prof. Social	—	3223094703	
Estefany Cotto Aguilar	Jesak SAS	Prof. Social		3109622104	
Oscar Parada	Consorcio santander	Inspector	—	3172858384	
Layde Iliana Velandia	Consorcio Santander	Residente		3204138635	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 02 / Junio / 2023

Compromisos.

→ Se Solicita al ing Daniel Montiel el alcance de Barrio Albania y San cristobal para la socializacion del dia 02/Junio/2023, a las 3:00 pm., el ing Daniel hace saber que se va a instalar loseta Solicitando levantamiento en campo para definir

Componente Social.

Se realizo reunion de socializacion de inicio en el barrio la independencia y se obtuvo respuesta para realizar la Socializacion de inicio en el barrio albania., Se realizo Actas de vecindad de Limoncito San Alonso, la Aurora, la universidad. Esta pendiente Actas de vecindad de chupinero y la independencia. para la siguiente semana, Esta pendiente socializar San cristobal, campo madrid, Rosal y juventud. Se solicita la entrega del informe social#3 para el dia 05 de Junio de 2023 Para el dia martes 06 de Junio se Solicita la respuesta de los PQR del barrio universidad.

HSEQ

Se cumplieron los compromisos pactados en el comite anterior, el contratista ha venido trabajando en el seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la Interventoria solicita la entrega del Informe #3 componete HSEQ para el dia 05 de Junio de 2023., la interventoria envio oficio de Implementacion Señalizacion vial, el contratista cumple con las Afiliaciones y seguridad del personal_

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 02 / Junio / 23.

Componente Tecnico.

% programado: 25,20%.

% Ejecutado. 15, 43%.

Retraso: 9,77%.

→ la interventoria solicita la solicitud de Adicion y prorroga para el dia 05 de mayo de 2023.

- Se realiza seguimiento al plan de contingencia en cada uno de los frentes de trabajo. con 36 personal en 6 frentes de trabajo., se cuenta con sardinel, loseta sub base. y todo lo necesario.

la vega: - loseta 100% → 03 Junio
- Sardinel costado occ → 06 Junio

Pinos - Detalles y entrega - 03 Junio.

San Alonso - 17 y 18 - Sardinel - 100% - 05 Junio
Sub base - 100% 06 Junio.
loseta - 100% 09 Junio
Adoquin - 100% 09 Junio

Universidad - cr 29 Terminado - 10 Junio

9 A. Terminado - 17 Junio

Frentes por iniciar.

San Alonso 18 y 19 → 05 Junio 2023.

Aurora calle 31 carrera 28 y 29 → 07 Junio 2023.

San Alonso calle 20 carrera 29 y 30 → 07 Junio 2023.

- Se solicita la entrega de informe componente tecnico # 3 para el dia 05 de Junio de 2023.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Hacer el levantamiento en Campo de Albania para definir la distribución del sedero Peatonal	Contratista e Interventoría	08/06/2023.
Actas de vecindad Chapinero y la Independencia	Contratista	15/06/2023
Reunión de Socialización de Inicio Campo Madrid y el Rosal	Contratista	08, 09/06/2023
Socialización del Inicio San Cristobal y Juventud	Contratista	16/06/2023
Entrega del Informe Social Mensual #3. Con anexos	Contratista	05/06/2023
Entrega del Informe HSEQ #3	Contratista	05/06/2023
Solicitud de adición y prorroga	Contratista	05/06/2023
Entrega del frente Vega de Morrillo	Contratista	08/06/2023
Entrega de Planos	Contratista	05/06/2023
Entrega del frente San Alonso entre Calles 19 y 18 y la Universidad Cra 29	Contratista	10/06/2023
Informe Tecnico	Contratista	05/06/2023

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

15/JUN/2023

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ___ DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander.

LUGAR: Campamento Contratista **FECHA:** 15/JUN/23 **HORA:** 8:00Am

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Eslendy Cairo Aguilar	Interventoria Jesak	Prof Social		3104627104	
Vladimir Polo Paz	JESAK SAS	Director I/ria		3108117774	
Lady Andrea Arala Sanmiguel	Consorcio Santander	Prof. Social		3223094703	
LAYDE ELIANA VELANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	INF. RESIDENTE		3204438635	
Beatriz Leon Suarez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatrizleonsa@hotmail	3022315206	Beatriz León
Bernardo Suárez Garcia	Consorcio Santander	HSEQ		3164986325	
Oscar Payada	CS	Inspector	———	3178580384	
Eduard Rivera R	Residente Interventoria	JESAK SAS	———	3185484445	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/jun/2023

Compromisos:
- Oficio al supervisor Barrio albania.

Social:

Están pendientes reuniones de socialización en San cristobal Campo madrid, y la Juventud. Se va a realizar visita técnica con ediles de campo madrid para definir alcance. Estan pendientes actas de vecindad en chapinero, albania, la independencia y el rosal. Se inicia chapinero el 20 jun/23. Se recibió el informe técnico No 3 y fue aprobado.

HSEQ:

Se han venido subsanando las observaciones que se han realizado en obra; se aprobó y radicó el MAO en la alcaldía. Esta pendiente completar el informe 2 y entregar el informe #3; sigue pendiente la entrega del cuadro de control de seg. social. Se aclara el cuadro de seg. social del informe #1 corresponde al pago de seg. social Marz-Abril. El del informe #2 es del periodo Abril-Mayo. Sigue pendiente el comite para control de PMT (con movilidad-transito). Se deben presentar con los informes mensuales los certificados de cantidad de material depositado en escombreras y de material recibido de canteras (subbases) adicionalmente el certificado de calidad de material prefabricado.

Técnico:

Se han presentado no conformidades end proceso constructivo de las franjas peatonales en los frentes Pinos y San alonzo. Adicionalmente se han encontrado prefabricados deficientes en su calidad y acabado. Se requiere al contratista tomar medidas correctivas para evitar estos retrabajos a futuro. La interventoria ha dado instruccion a los inspectores para que realicen el

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/jun/23

Control de calidad y rechacen el material no conforme de inmediato, de igual forma se siguen dejando anotaciones en bitacora de las no conformidades y de los tramos que no pueden ser recibidos.

Frentes nuevos a intervenir:

* Aurora; Se inició, con Instalacion de Pmte, demolicy excavación
* 2 Frentes nuevos en San Alonzo en la c/le 20 entre 29 y 30 se inician Jueves 22/jun/23
* Chapinero: Se Prevé inicio el 26/jun/23

El contratista manifiesta que va a trabajar en el Frente San alonzo cra 33A entre 17 y 19 el Fin de semana incluyendo Festivo. Por lo cual se espera entregarla primera cuadra el miercoles 21/jun.

Se están ejecutando las no conformidades en los Pinos y en la universidad.

los APU's nuevos no previstos fueron aprobados.

El contratista debe presentar acta de modificacion.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Oficio al supervisor para definir alcance en el barrio Albania	Interventoria Jesak SAS	15 de Junio de 2023
Reunion de socialización de inicio la Juventud y campo Madrid	Contratista	Del 20 al 23 de Junio de 2023.
Oficio solicitando alcance en El Rosal y San Cristobal	Contratista	16 de Junio de 2023.
Entrega del informe HSEQ #243	Contratista	20 de Junio de 2023
Ejecución actividades no conformes Pinos y San Alonso	Contratista	20 de Junio de 2023
Actas de reunidad Chapinero	Contratista.	20 de Junio de 2023
Cuadro de seguridad Social a 30 de Abril y el pago a Mayo	Contratista	15 de Junio de 2023
Comité de Trafico Mensual	Contratista	17 de Junio de 2023.
Certificado de material de escombreras	Contratista	23 de Junio de 2023
Certificado de material de Canteras	Contratista	23 de Junio de 2023.
Certificado de calidad de materiales certificados	Contratista	23 de Junio de 2023

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

30 Junio 2023.

JESAK
NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y CONSORCIO SANTANDER.

LUGAR: Campamento Contratista. **FECHA:** 30/06/23 **HORA:** 10:00 A.M.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Edward R Vera P	JESAK SAS.	Residente IAHSE	edvar_vera@hot	3185484445	
Oscar Parada	CS	Inspector	———	3197858385	
Eslendy Cotto Aguilar	Jesak SAS	Prof Social	———	3104622104	
Beatriz Leon Suárez	Jesak SAS	Prof. HSEQ	beatrizleon87@hotmail.com	3022315206	Beatriz León
Bernardo Suárez Cariño	Consorcio Santander	HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com	3012767950	Bernardo Suárez
LAYDE LILIANA VELANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	ING. RESIDENTE		3204438635	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 30/Jun/23.

Compromisos.

- Se radico oficio de necesidad para el barrio alemania lo cual se espera respuesta de este Frente.

Social

En la parte Social se realiza Socializacion de inicio del Frente Juventud y campo Madrid, Esta pendiente el Barrio San cristobal debido a la falta de Definicion de ubicacion en este frente., se Solicita programar reunion de Socializacion en el barrio Alemania teniendo en cuenta trasmitir la informacion del nuevo alcance, el dia 29 de Junio se realiza reunion Social con la entidad. teniendo enfasis en el cumplimiento de los alcances propuestos en las Socializaciones como iniciar Frentes (limoncito y chapinero) Se debe programar Socializacion de cierre de Frentes de la (vega, Pinos, universidad cr 29), Acompañamiento de la parte tecnica para realizar Cierre de Aceta vecinal; se solicita el informe mensual #4 para el dia miercoles 05 de Julio de 2023.

HSEQ

El contratista Entrega el informe mensual #2 y es aprobado por la interventoria, pendiente de la entrega del informe #3, Se entrego el cuadro de seguridad al 30 de Abril y el pago de seguridad de mayo, realizaron la Conformacion del comite de trafico y se realizó el Comite de trafico #1., Entregaron el certificado de Escombrera del mes de Abril y mayo, NO se entregaron los certificados de material de cantera queda pendiente para el dia 07 de Julio de 2023., se entregaron el certificado de calidad de materiales de Abril, pendiente el del mes de mayo. y Junio.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 30 Junio · 2023.

El profesional HSEQ se compromete a entregar los informes 3 y 4 el dia 05 de Julio de 2023, se programa visita con la Ing Ambiental NIDIA CENTENO el dia 05 Julio 2023 para revision de manejos Ambiental en chupinero Se solicita los nuevos frentes a iniciar el uso adecuado del PMT., se debe presentar Seguridad Social del Frente Chupinero

TECNICO

- El Frente de vega ya esta totalmente terminado
- Pinos: se entrega el dia 04 de Julio. a la interventoria para hacer entrega a la comunidad.
- San Alonso 33A: se entrega el tramo de la 17 a 18 el dia 07 de Julio de 2023, y el tramo 18 a 19 el dia 15 Julio.
- Aurora: Se debe entregar terminado el dia 15 de Julio
- Universidad: C24 totalmente terminado, calle 9A para el dia 07 de Julio de 2023.
- Chupinero: este Frente inicia el dia Martes 04 de Julio 2023
- Limoncito: Se prevee el inicio de este frente para el dia 10 de Julio de 2023

Esta pendiente definir los barrios Alboania, chupinero, San Cristobal para que el contratista continue con la ejecucion del Contrato, la interventoria solicita plan de Contingencia para los atrasos representativos que se han venido presentando y estan Aumentando dia a dia, lo cual afecta la ejecucion y el cumplimiento contractual.

Se Solicita el Informe # 3,4 para el dia 05 de Julio con la preacta # 2, con cada una de las Actividades ejecutadas a la fecha

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Definir de forma exacta el alcance de los Sectores de Albania, el Rosal y San Cristobal	Interventoría	06 de Julio de 2023
Iniciar los frentes de Chapinero y tinamasto	Contratista	04 de Julio de 2023 15 de Julio de 2023
Programar Reunión de socialización de Cierre de los Pinos y Cra 29 este 10-11 (la Universidad	Contratista	05 de Julio de 2023
Realizar Actas de Levantamiento de Cierre a los Sectores finalizados (Programación)	Contratista	05 de Julio de 2023
Entrega de Informe Social Mensual #4 con sus respectivos anexos	Contratista	05 de Julio de 2023
Entrega del Informe HSEQ #3 junto con sus Informes anexos e Informe #4	Contratista	05 de Julio de 2023
Cotizado de Material de Cunetas y prefabricados del mes de mayo y Junio	Contratista	07 de Julio de 2023
Informe 3 y 4 del area tecnica	Contratista	05 de Julio de 2023
Definir el portal vial de chapinero	Interventoría	04 de Julio de 2023

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238,37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 1 de 2

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
2:00pm		Alcaldía Bga	29/06/2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Xiomara Tarazona	Trab. Social Sec. Infraest.
Eslendy Corzo Aguilar	Prof Social Interventoria
Natalia Lopez	Prof. Social Tec. Sup.
Leidy Andrea Ayala S.	Prof. Social Consorcio Santander
Laura Yolleth Parra Villalba	Prof Social Con Ade Santander

OBJETIVO

Realizar seguimiento social a las obras de mejoramiento de anderes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con profesionales sociales de los equipos contratista e interventoria de las obras de Mejoramiento de Anderes.

Grupo 1.

11 Barrios en los que se han realizado socialización de inicio de obra.
Pendiente San Cristobal - pendiente definir la ubicación exacta.
7 frentes activos actualmente
3 por abrir la proxima semana
No se han entregado frentes terminados.
Programada socialización de entrega frente a La Vega/Morrorico, Martes 04 de Julio 3pm.
Ginonatos: Frente aún no abierto a pesar de haber realizado socialización y levantamiento de actas.

*Se solicita a interventoria reconocer continuar trabajos en los barrios que ya cuentan con socialización y actas de vecindad.

Barrio Albania, anderes en concreto con daño funcionalidad (peatones-vehiculos), se programara socialización con los cambios.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Grupo 2
9 Barrios con socialización - pendiente socialización 6a fase
6 Gradut terminado - pendiente programar socialización cierre - cerrar actas
9 frentes abiertos actualmente - 2 frentes próximos a iniciar.

Grupo 3.
10 Barrios con socialización: 2 no se ejecutaron sanciones - Pruebas del metro
5 frentes abiertos actualmente

*Recomendación para el cierre de actas de veracidad, un operario quedo en el registro fotografico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Siendo las _____ se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (29) días del mes de JUNIO de 2023 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Xiomara Tarazona	XIOMARA TARAZONA
Estudy Cortes Aguilar.	
Natalia López	
Leidy Andrea Ayala S.	
Laura Yoleth Parra Villalba	

El **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ÍTEM	JESAK NIT. 901320986-8 Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	MES DE JUNIO				Calificación mes
		100%	0,00%					
Talento humano para el diálogo ciudadano y la comunicación estratégica				1 AL 10 DE JUNIO	12 AL 17 DE JUNIO	19 AL 24 DE JUNIO	26 AL 30 DE JUNIO	
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	Cumplió	No cumplió	NA	100	NA	100	100
5	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
Línea estratégica: Diálogo Ciudadano								
Programa Servicio a la Ciudadanía								
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por la Oficina de Atención al Ciudadano.	Cumplió	No cumplió	NA	100	100	100	100
4	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Durante la ejecucion del contrato el punto atención al ciudadano conto con la dotación exigida para su funcionamiento.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
8	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
9	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	NA	NA	100	100
10	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana								
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
3	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
4	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	NA	NA
5	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA

6	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
9	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio y finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
10	Conformó el número de comité , de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Cumplió	No cumplió	NA	N/A	NA	NA	NA
11	El Comité se reunió el número de veces establecidas cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	Cumplió	No cumplió	NA	N/A	NA	NA	NA
12	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité cumpliendo con lo establecido en el manual de identidad visual del IDU, tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Programa Acompañamiento Actividades Técnicas								
1	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
8	Entregó copias de las actas de vecindad a la Comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	100	100	100
9	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	NA	100	100
10	Entrego las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoria de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apendice	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	N/A	100
11	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
12	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
13	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
14	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
15	el contratista cumplio con los compromisos establecidos en las actas de compromiso en condiciones de oportunidad y calidad.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Programa de Gobernanza para la Movilidad								
1	Entregó una metodología del proceso de gestión y articulación interinstitucional.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Desarrollo Económico								
1	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en la localidad (es) de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal de MONC y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	Cumplió	No Cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
4	Cumplió con los parametros establecidos en la metodologia para ser un seguimiento al comportamiento de la actividad de vendedores informales.	Cumplió	No Cumplió	100	NA	NA	100	100
5	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Educación								
1	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal necesarias y de coordinación.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Programa de Cultura Ciudadana								
1	el contratista cumplio con las acciones de formación para la prevención de accidentes de obra cuando se requirio	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	el contratista ejecuto las acciones de formacion a empleados de obra y subcontratista de acuerdo a los requisitosdel presente apendice	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Línea estratégica: comunicación estratégica								
Programa de información para el desarrollo del proyecto								
1	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	Elaboró y distribuyó predio a predio las piezas de comunicación de Inicio de obra y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Atención al Ciudadano, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100

8	Instaló el (los) Punto(s) Satélite(s) de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
9	Realizó mantenimiento a (los) punto(s) satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
REPORTES								
1	Proporcionó a la Interventoría la información social del proyecto cuando se le solicitó.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Tiene a disponibilidad la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
4	Registró y entregó a la Interventoría y la información mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, en el aplicativo BACHUE, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	El contratista entrego a la interventoría el informe de preliminares de acuerdo con las especificaciones del apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado adelantada durante todo el contrato, con criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			TOTAL GENERAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

ESLENDY CORZO AGUILAR

PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA

ANDREA AYALA

PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
