SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PERIODO DEL 01 al 30 DE JUNIO DE 2023



FIRMA		
NOMBRE	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA	VLADIMIR POLO PAZ
CARGO	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORO	APROBO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. NFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 4

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4

1.1.2 Recursos Humanos del contrato de interventoría 4

1.2 CONTRATO DE OBRA 4

1.2.2 Recursos Físicos 5

1.2.3 Recursos Humanos 5

1.2.4 PRESUPUESTO DE OBRA 5

2 EJECUCIÓN DE OBRA 7

2.1 Obras ejecutadas 7

2.1.1 LOCALIDAD DE MUTIS. 10

..... 10

2. LOCALIDAD DE CIUDADELA 25

..... 25

2.1.2 BARRIO REAL DE MINAS 25

2.1.4 LOCALIDAD DE MUTIS 38

2.1.5 BARRIO LA NUEVA GRANADA 49

2.2 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO 51

3. PLAN MANEJO DE TRAFICO (PMT). 51

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 52

LISTADO DE ANEXOS

1. **Bitácora de Obra**
2. **Registro fotográfico**
3. **Actas de Comité**
4. **Lista de chequeo PMT**
5. **Densidades**
6. **Acta de precios no previstos N°1**
7. **Acta de cobro No. 2 y memorias**

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga – secretaria de Infraestructura suscribió los contratos, así: 22-2023 del 22 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; 28-2023 del 02 de marzo de 2023 con la firma **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER,** 417-2022 del 27 de diciembre de 2022 con la firma **7G7SAS;** cuyos objetos establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 1, GRUPO 2" y GRUPO 3**

De igual forma mediante proceso de concurso de méritos, se contrató a la firma **JESAK S.A.S.** para adelantar la interventoría a los contratos de obra arriba mencionados, suscribiendo el 29 de diciembre de 2022, el contrato de interventoría No. 429 de 2022, cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**
El presente informe de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por los Contratistas entre el 01 al 30 de junio de 2023. Se realiza también el resumen las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso secuencias constructivo que contempla el proyecto durante el mismo periodo.

El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte de los contratistas a partir de la iniciación de los contratos, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y financiero de los contratos de obra.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio del mismo.

1. NFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1.2 Recursos Humanos del contrato de interventoría

GRUPO 3	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE	ARQ JUAN CARLOS VITOLA URZOLA
PROFESIONAL SOCIAL	ESLENDY CORZO AGUILAR
PROFESIONAL HSEQ	MARIA FERNANDA MARTINEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS HERNANDEZ

1.2 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	**417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 3.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	ING EDGAR BAYONA FLOREZ
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE ($ 1.949.858.621,00)
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30 CENTAVOS M/CTE. ($584.957.586,30)
CONTRATISTA:	7G7SAS
NIT:	901120358-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RL:ANDREA CASTAÑEDA ARBOLEDA APODERADO: EDGAR ALONSO QUESADA
INTERVENTOR:	JESAK SAS R/L VLADIMIR POLO PAZ
FIRMA CONTRATO:	27 DICIEMBRE 2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
PERÍODO EJECUTADO	01/06/2023 A 30/06/2023

% DE AVANCE EN TIEMPO	87,50 %

1.2.2 Recursos Físicos

- Maquinaria: Para la ejecución de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en el periodo contractual, el contratista ha evidenciado con el equipo necesario para la ejecución de las mismas, tales como volquetas, martillo neumático y cargador mecánico.

-Material de oficina: Al igual que el personal de interventoría, el personal administrativo del contratista de obra, cuenta con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas, linterna, flexómetro.

1.2.3 Recursos Humanos

GRUPO 3- CTO 417 7G7SAS	
GERENTE DE PROYECTOS	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
DIRECTOR DE OBRA	VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO
RESIDENTE DE OBRA	MONICA LILIANA QUINTERO CARVAJAL
PROFESIONAL HSEQ	CARMEN ROSA CACERES BAYONA
PROFESIONAL SOCIAL	NATALIA LÓPEZ RUALES
INSPECTOR DE OBRA 1	MARIO ESTEBAN HERNANDEZ
INSPECTOR DE OBRA 2	HELVER MORENO BARRIOS
INSPECTOR DE OBRA 3	ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA

1.2.4 PRESUPUESTO DE OBRA


GRUPO	COMUNA	BARRIO	DIRECCIONES	ORIGEN RECURSOS	AREA CONTRACTUALM2	NUEVA AREA M2	% DE EJECUACIÓN POR FRENTE	ESTADO DE LA OBRA	VALOR ESTIMADO EJECUCION
3	6 LA CONCORDIA	LA VICTORIA	Cll 67 entre Cra 18 y Cra 21	RP	325	**1015,9**	**5%**	LOCALIZACION, SOCIALIZACION DEL PROYECTO, DEMOLICION DE ANDEN EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBRO,EXCAVACION Y COLOCACION DEL SARDINEL A10	$ 69.095.396,00
	7 LA CIUDADELA	REAL DE MINAS	Ambos costados de la cra 8 entre calles 61 y 64	PP	608	**1062,2**	**65%**	LOCALIZACION Y SOCIALIZACION, EL CONTRATISTA DEL CONTRATO N° 414 DE 2022, DEMOLICION SARDINEL,EXCAVACION , CERRAMIENTO PERIMETRAL, EXCAVACIONES E INSTALACION DE SARDINELES, RELLENO DE SUBBASE Y FRANJAS DE CONCRETO, ANDENES PUESTOS EN SERVICIO	$ 170.316.328,00
	8 SUR OCCIDENTE	CORDONCILLO II	Cll 65 C N° 2C-31 (Pasamanos)	PP	305		**0%**	SE REALIZO VISITA AL FRENTE EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAEDGAR BAYONA	
			Cll 65 C entre Cra 2C y 3 (Pasamanos)	PP			**0%**		
			Cra 3C desde la Cll 65 C bajando la Quebrada la Hoyadita hasta colindar con la ultima vivienda (Pasmanos)	PP			**0%**		
			Rampa ubicación: Cll 65 C frente a la vivienda N° 2C-24	PP			**0%**	EN STANBAY	$ 76.616.785,00
	9 LA PEDREGOSA	NUEVA GRANADA	Cra 19 # 70 Nueva Granada.	RP	412		**0%**	SE REALIZO VISITA AL FRENTE EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAEDGAR BAYONA	$ 45.315.881,00
		LA PEDREGOSA	Mejoramiento de peatonales iniciando costado occidental de la cra 33 con clle 94A (parqueadero), hasta finalizar el edificio portal del vivero en la cra 33 # 95-20	PP			**0%**	SE REALIZO VISITA AL FRENTE EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAEDGAR BAYONA	
		LA LIBERTAD	Mejoramiento de peatonales ubicado en el Costado Norte de la Cll 100 entre cra 33 y cra 32	PP			**0%**	EN STANBAY	$ 147.625.637,00
			Mejoramiento de peatonales ubicado en el Costado Sur de la Cll 98 entre cra 33 y cra 32	PP			**0%**	EN STANBAY	
	10 PROVENZA	DIAMANTE I	Calle 105 con Carrera 33 vía florida blanca	PP	200		**5%**	PUENTE ANDEN, SOCIALIZACION DEL PROYECTOCON LA COMUNIDAD, NO SEHA INICIADO OBRAS	
		DIAMANTE II	Ambos costados Cll 89 entre Cra 24 y Cra 25	PP	645	**740,6**	**25%**	LOCALIZACION, SOCIALIZACION, SE EMPEZO HACER LAS ACTAS DE VECINDAD, SE COMENZARON LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA LOS SARDINELES Y LA COLOCACION DE LA SUBBASE, CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL, INSTALACION DE SARDINELES PREFABRICADOS, INSTALACION DE LOSETAS, RAMPAS VEHICULARES	$ 155.236.261,00
		SAN LUIS	Cra 17B desde la Cll 90 hasta la Cll 89B	PP	622	**670,92**	**0%**	LOCALIZACION	$ 107.827.435,00
			Cll 89B desde la Cra 17B hasta la Cra 17D	PP			**0%**	LOCALIZACION	
			Cra 17D desde la Cll 89B hasta la Cll 90	PP			**0%**	LOCALIZACION	
			Cll 89ª desde la Cra 17 hasta la Cra 16	PP			**0%**	LOCALIZACION, SOCIALIZACION,NO SE VA A EJECUTAR	
	11 SUR	VILLA ALICIA	Cll 103 C desde Cra 16 hasta Cra 16ª	PP	352	**312,79**	**0%**	LOCALIZACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO.	$ 151.242.207,00
			Cra 16A dede Cll 103C hasta Cll 104	PP			**0%**	LOCALIZACION	
			Cll 104 desde Cra 16A hasta Cra 16	PP			**0%**	LOCALIZACION	
			Cra 16 desde Cll 104 hasta Cll 103C	PP			**0%**	LOCALIZACION	
	12 CABECERA DEL LLANO	PUERTA DEL SOL	Costado Oriental Cra 28 entre Cll 65 y Cll 66	PP	445	**647,03**	**0%**	LOCALIZACION SOCIALIZACION	$ 209.927.350,00
			Ambos costados Cll 66 entre Cra 28 y Cra 29	PP			**0%**	LOCALIZACION SOCIALIZACION	
			Costado Occidental Cra 29 entre Cll 65 y Cll 67	PP			**0%**	LOCALIZACION SOCIALIZACION	
			Costado Sur Cll 65 entre Cra 28 y Cra 29	PP			**0%**	LOCALIZACION SOCIALIZACION	
	14 CIUDADELAS	LOS SAUCES	Calle 63ª entre carreras 1 y 3 Frente al conjunto residencial los Sauces	RP	469	**321,82**	**80%**	LOCALIZACION Y SOCIALIZACION, DEMOLICION, EXCAVACION Y COLOCACION DE SARDINELES Y BORDILLOS, LOSETAS, GUIAS Y TABLETAS AMARILLAS, VADO. ANDENES PUESTOS EN SERVICIO	$ 59.297.794,00
		ESTORAQUES	Cll 59 con Cra 47A.	RP	433	**435,66**	**80%**	LOCALIZACION, SOCIALIZACION, DEMOLICION DE ANDENES Y EXCAVACIONES	$ 54.355.370,00
			Cll 59B con Cra 47ª Occidente	RP			**100%**	SOCIALIZACION, LOCALIZACION , DEMOLICIONES ANDENES Y COLOCACION DE SUBBASE, LOSETAS, ANDEN PUESTO EN SERVICIO	$ 55.671.634,00
			Cll 60 con Cra 46W-48W	RP			**98%**	SOCIALIZACION, LOCALIZACION, DEMOLICION DE PISOS, SARDINELES, RELLENO EN SUB-BASE, COLOCACION DE LOSETAS, GUIAS, TABLETAS Y BORDILLOS A80, ANDENES PUESTOS AL SERVICIO	$ 66.022.987,00
		MUTIS	Cra 1W con Cll 57	RP	342	**1239,86**	**0%**	LOCALIZACION Y SOCIALIZACION	$ 66.285.647,00
			Cra 2W con Cll 56 y Cll 57	RP			**100%**	LOCALIZACION, DEMOLICION, EXCAVACION, SARDINELES Y RELLENOS SUB-BASE, LOSETA DE ESPACIO PUBLICO	$ 73.183.498,00
			Cra 2W con Cll 57 y Cll 58	RP			**100%**	LOCALIZACION, DEMOLICION, EXCAVACION, SARDINELES Y RELLENOS SUB-BASE, LOSETA DE ESPACIO PUBLICO	$ 43.313.256,00
			Cra 2W con Cll 58 y Cll 59	RP			**100%**	LOCALIZACION, DEMOLICION, EXCAVACION, SARDINELES Y RELLENOS SUB-BASE, LOSETA DE ESPACIO PUBLICO	$ 47.732.670,00
			Costado Sur de la Cll 56 entre Cra 2W y 3W	PP			**99%**	ESCAVACIÓN-SARDINELES, BORDILLOS, LOSETAS ESPACIO PUBLICO-TABLETAS -RAMPA -SEÑALIZACIÓN VERTICAL	$ 145.978.251,00
			Costado Oriental de la Cra 2W entre Cll 56 y Cll 61	PP			**10%**	LOCALIZACION Y SOCIALIZACION, DEMOLICION DE ANDENES , EXCAVACIONES,RELLENOS SUBABASE, SARDINELES Y LOSETAS ESPACIO PUBLICO	

2 EJECUCIÓN DE OBRA


2.1 Obras ejecutadas


Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta los perfiles viales comprendido en el POT, se realizaron las siguientes actividades en los siguientes frentes de obra a continuación:

PERFIL VIAL FRENTE DIAMANTES II

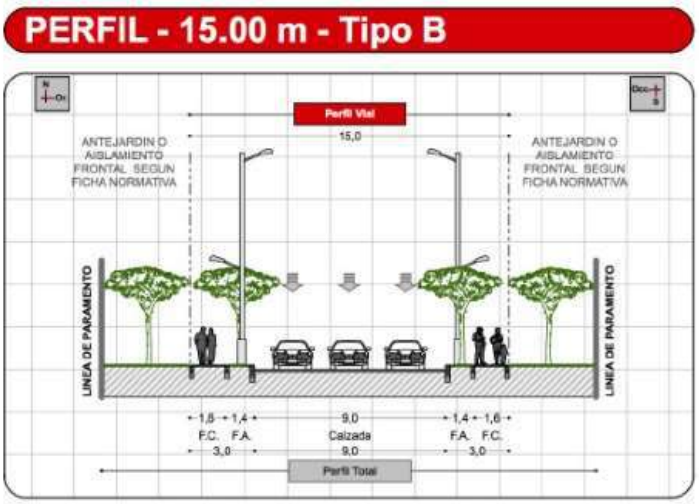



PERFIL VIAL FRENTE ESTORAQUES

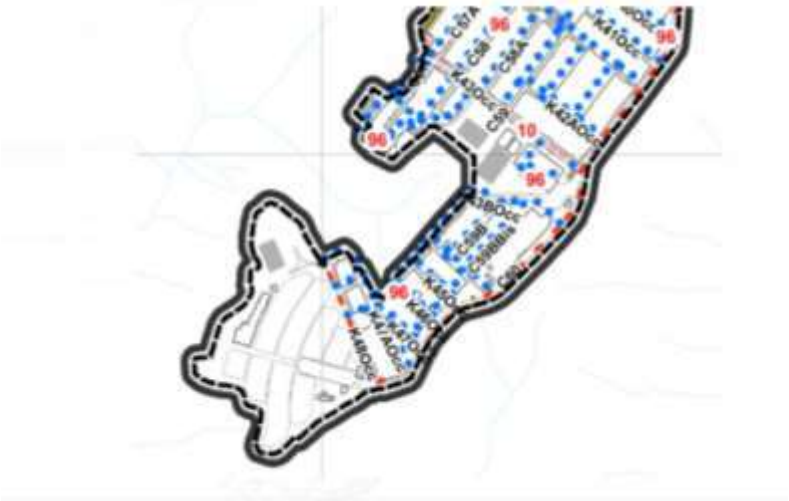

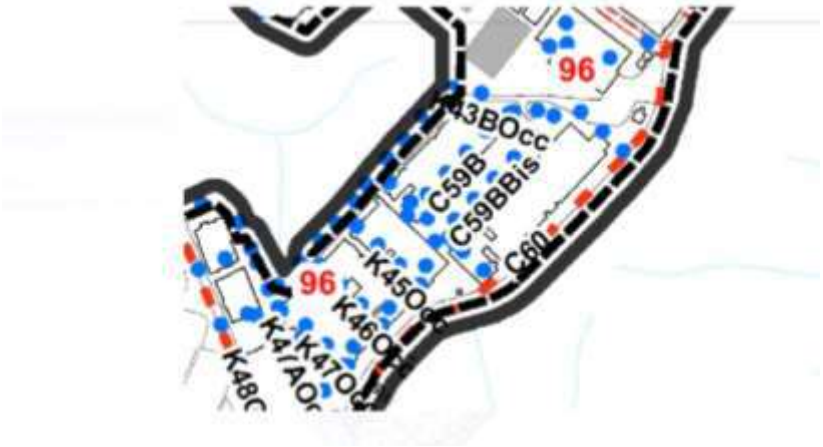


PERFIL VIAL LOS SAUCES

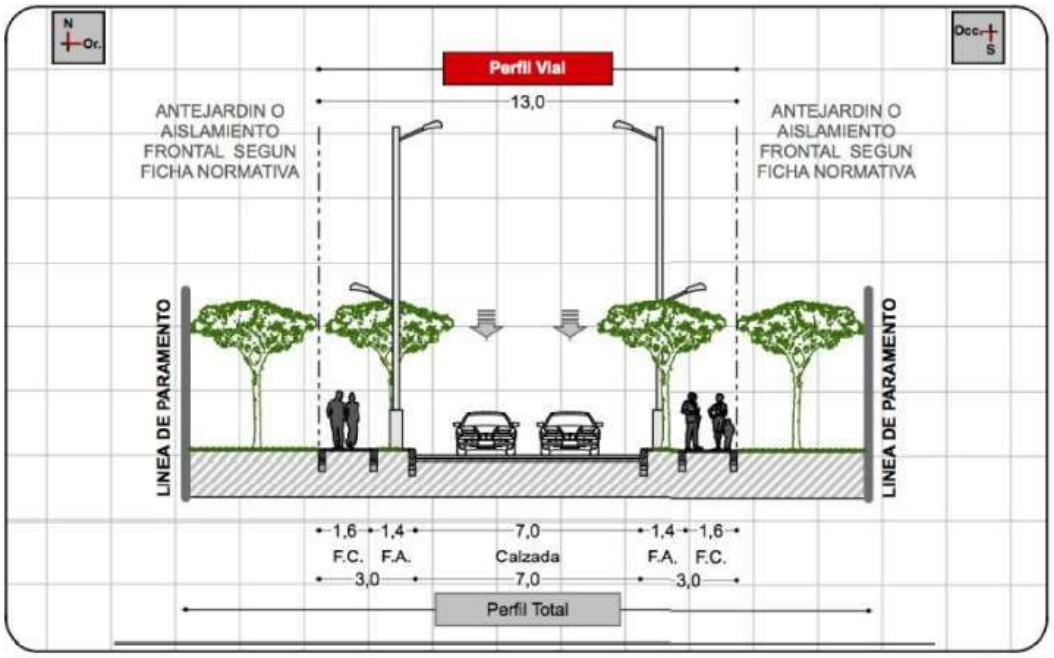

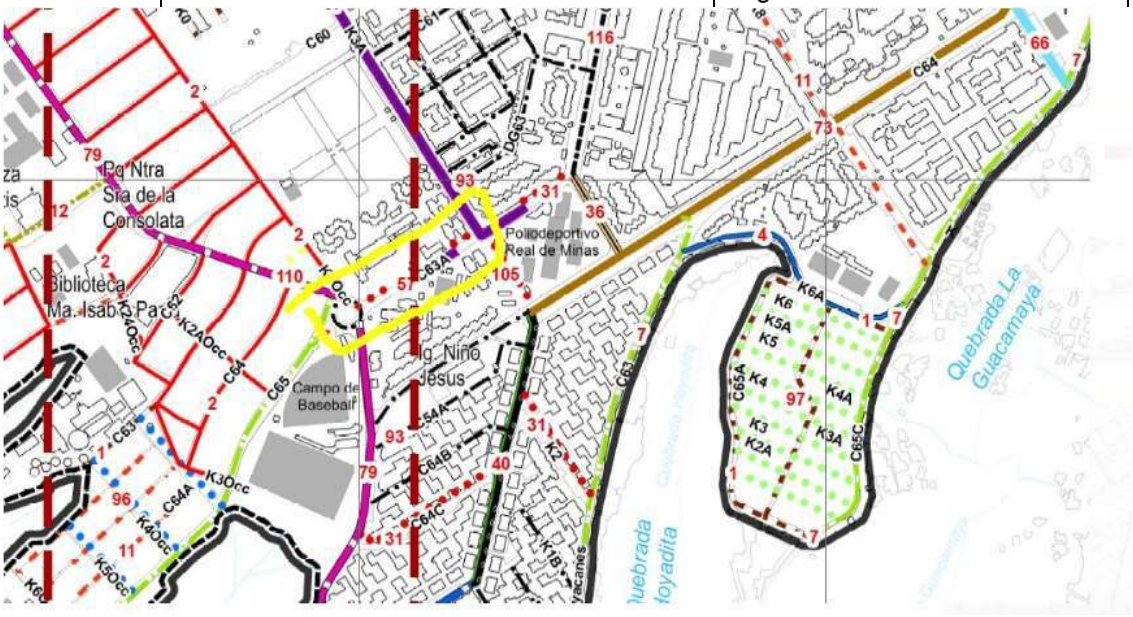


PERFIL VIAL LA VICTORIA

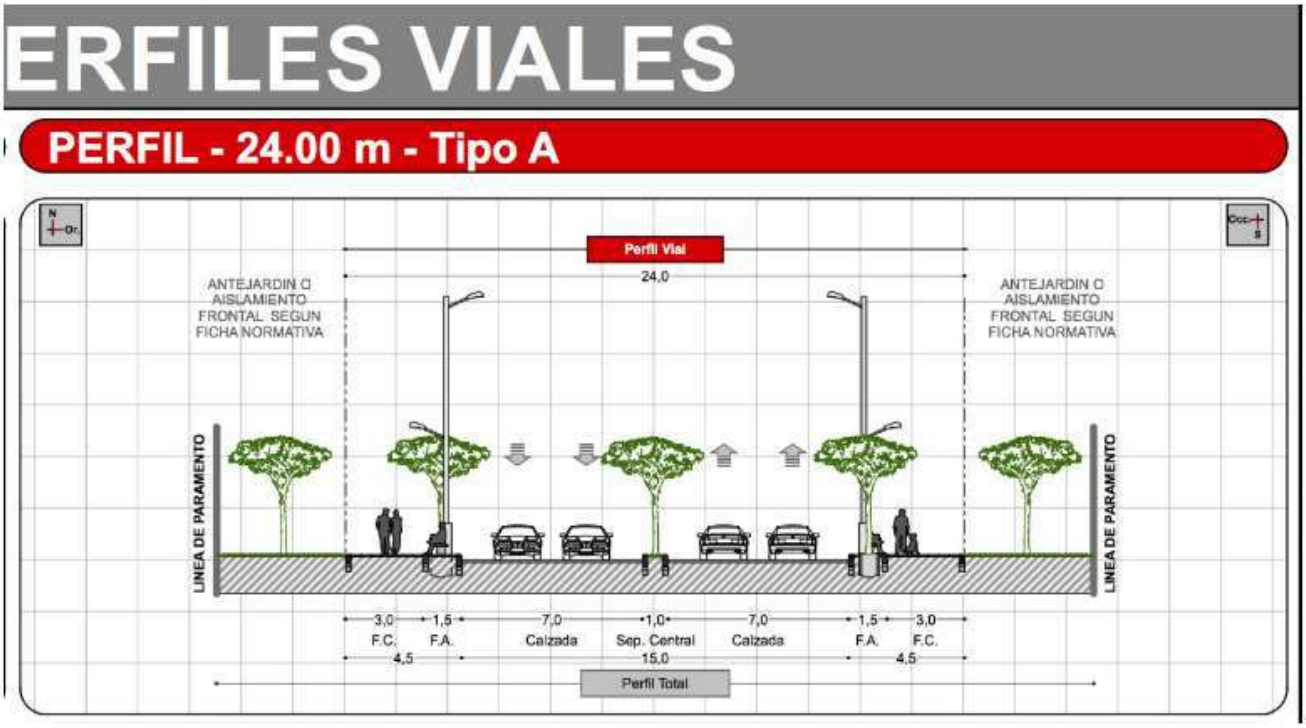

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades en los siguientes frentes de obra a continuación:


2.1.1 LOCALIDAD DE MUTIS.

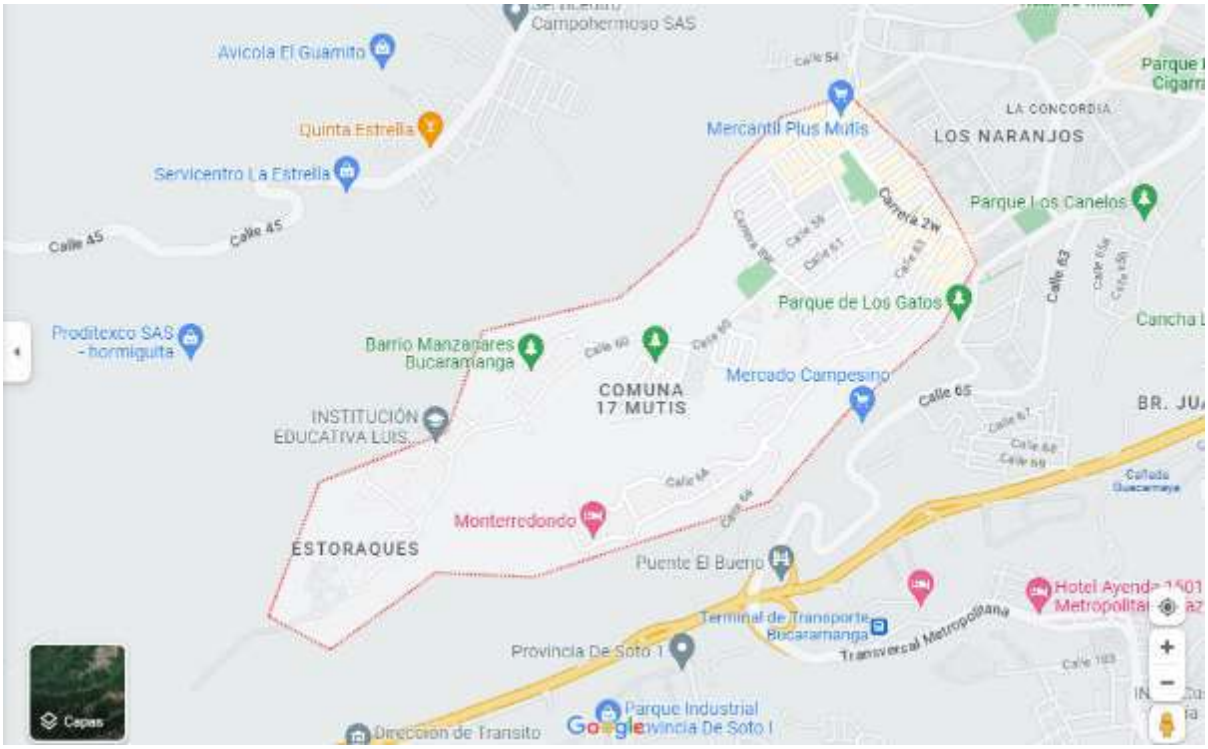

En la localidad de Mutis en el municipio de Bucaramanga Santander, se tiene proyectado o estimado intervenir 10 frente de obras en los próximos días, de los cuales se encuentran en ejecución actualmente 6 frentes, en los barrios de Mutis, Estoraques, Los Sauces y Real de Minas, en el cual el contratista 7G/ SAS tiene un lapso de tiempo de 4 meses, para su culminación una vez que ha sido aprobada el acta de inicio de obra, con fecha de 16 marzo de 2023 hasta el 15 de Julio de 2023.

LOCALIZACION DEL FRENTE DE OBRA

CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 61 COSTADO SUR OCCIDENTE

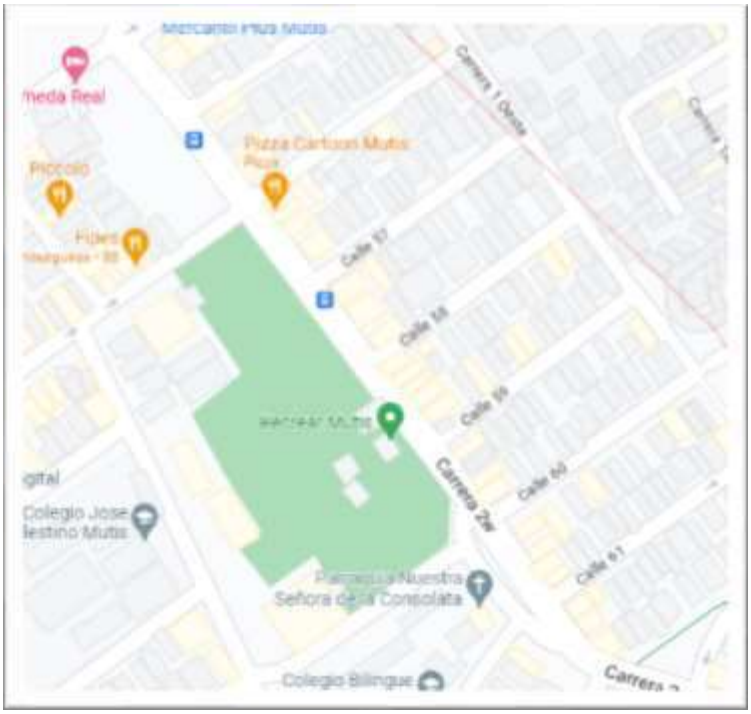

Actualmente se está interviniendo el costado del polideportivo recrear, por parte del contratista 7G7 SAS, con recursos propios de la entidad.

PRESUPUESTO DE OBRAS

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 417 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.949.858.620,24	VALOR ADICIONAL:	

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
		PRELIMINARES				
1.1		Localización y replanteo manual	M2	5.123,35	$ 2.230,00	$ 11.425.070,50
					SUBTOTAL	**$ 11.425.070,50**
		DEMOLICIONES				
2.1		Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1.206,73	$ 201.900,00	$ 243.638.787,00
					SUBTOTAL	**$ 243.638.787,00**
		EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3.1		Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	968,08	$ 74.600,00	$ 72.218.768,00
3.2		Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	1.099,07	204.800,00	$ 225.089.536,00
					SUBTOTAL	**$ 297.308.304,00**
		ESPACIO PUBLICO				
4.1		Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	M2	1.192,67	134.200,00	$ 160.056.751,09
4.2		Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	M	2.248,66	82.300,00	$ 185.064.718,00
4.3		Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	UND	149,42	364.600,00	$ 54.478.532,00
4.4		Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	UND	129,48	258.100,00	$ 33.418.788,00
4.5		Franja de ajuste al predio	M	2.101,59	13.900,00	$ 29.212.101,00
4.6		Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	M3	118,00	953.400,00	$ 112.501.200,00
4.7		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	M2	2.142,88	152.500,00	$ 326.789.200,00
4.8		Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	M3	290,54	800.000,00	$ 232.432.000,00
					SUBTOTAL	**$ 1.133.953.290,09**
		OBRAS COMPLEMENTARIAS				
5.1		Realce cajas de servicios publicos	UND	202,44	140.000,00	$ 28.341.600,00
5.2		Realce pozos EMPAS	UND	47,95	237.400,00	$ 11.383.330,00
5.3		Traslado Señales de Tránsito	UND	47,42	133.000,00	$ 6.306.860,00
					SUBTOTAL	**$ 46.031.790,00**
		CARPINTERIA METALICA				
6.1		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	M	157,70	380.400,00	$ 59.989.080,00
					SUBTOTAL	**$ 59.989.080,00**
		ASEO Y LIMPIEZA				
7.1		Aseo y limpieza general	M2	5.223,54	3.700,00	$ 19.327.098,00
					SUBTOTAL	**$ 19.327.098,00**
		PLAN DE MANEJO				
8.1		Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	10.190.000,00	$ 10.190.000,00
8.2		Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	60.610.000,00	$ 60.610.000,00
					SUBTOTAL	**$ 70.800.000,00**
		NO PREVISTOS				

TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**1.364.111.173,62**
Administración 33%	$	450.156.687,29
Imprevistos 0%		
Utilidad 5%	$	68.205.558,68
Costos Indirectos (AIU 38%)	**$**	**518.362.245,97**
VALOR COSTO TOTAL	**$**	**1.882.473.419,59**
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	**$**	**67.385.200,65**
VALOR TOTAL OBRA	**$**	**1.949.858.620,24**

ENSAYO DE LABORATORIO

El contratista realiza el ensayo de laboratorio de la sub base colocada y compactada con rana vibro compactadora y la toma de las densidades manuales en el mes de Junio/2023, en donde la interventoría estuvo presente en este proceso de las tomas para verificar el estado de la compactación en donde las pruebas de laboratorio arrojaron buenos resultados y densidades positivas para que se procediera a continuar con las actividades programadas, mayor al 95% de compactación.

El contratista utilizo para la compactación la rana vibro compactadora sobre la capa de sub base sobre las áreas del espacio público intervenido.

Ver anexos.

BALANCE FINANCIERO GENERAL

BALANCE FINANCIERO GENERAL

$ 1.949.858.621

	PERIODO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% PROGR, ACUM.	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1	16 AL 22 MARZO	$ 1.784.117	$ -	0,09%	0,00%	-0,09%
S2	23 AL 22 MARZO	$ 17.296.201	$ 7.092.070	0,89%	0,36%	-0,52%
S3	24 AL 22 MARZO	$ 37.258.920	$ 13.415.234	1,91%	0,69%	-1,22%
S4	25 AL 22 MARZO	$ 96.006.593	$ 22.091.037	4,92%	1,13%	-3,79%
S5	26 AL 22 MARZO	$ 174.567.827	$ 73.313.411	8,95%	3,76%	-5,19%
S6	27 AL 22 MARZO	$ 283.707.512	$ 162.826.854	14,55%	8,35%	-6,20%
S7	28 AL 22 MARZO	$ 312.952.309	$ 176.137.736	16,05%	9,03%	-7,02%
S8	29 AL 22 MARZO	$ 363.258.661	$ 198.033.265	18,63%	10,16%	-8,47%
S9	30 AL 22 MARZO	$ 423.899.264	$ 234.516.835	21,74%	12,03%	-9,71%
S10	31 AL 22 MARZO	$ 504.818.397	$ 318.013.791	25,89%	16,31%	-9,58%
S11	32 AL 22 MARZO	$ 619.080.112	$ 348.836.391	31,75%	17,89%	-13,86%
S12	1 AL 7 JUNIO	$ 692.878.944	$ 424.567.090	35,53%	21,77%	-13,76%
S13	8 AL 14 JUNIO	$ 766.559.621				
S14	15 AL 21 JUNIO	$ 894.101.514				
S15	22 AL 28 JUNIO	$ 1.113.233.582				
S16	29 JUNIO AL 5 JULIO	$ 1.463.359.082				

LLUVIAS BARRIO MUTIS

Durante el presente mes de Junio/2023 no se presentaron mayores lluvias durante las horas laborables entre las 7:00 am y 5:00 pm, las escasas lluvias se dieron en las horas de la tarde, y posiblemente en las noche y madrugadas.

JESAK NIT. 901320986-8

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO GR3


PROYECTO: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

NOMBRE DEL FRENTE DE OBRA : MUTIS, MES DE JUNIO 2023

No.	FECHA	SIN LLUVIA DÍA	HORAS LLUVIA DIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1/06/2023	1,00				
2	2/06/2023	1,00				
3	3/06/2023	1,00				
4	4/06/2023	1,00				
5	5/06/2023	1,00				
6	6/06/2023	1,00				
7	7/06/2023	1,00				
8	8/06/2023	1,00				
9	9/06/2023	1,00				
10	10/06/2023	1,00				
11	11/06/2023	1,00				
12	12/06/2023	1,00				
13	13/06/2023	1,00				
14	14/06/2023	1,00				
15	15/06/2023	1,00				
16	16/06/2023	1,00	1,00			Llvias durante la tarde
17	17/06/2023	1,00				
18	18/06/2023	1,00				
19	19/06/2023	1,00				
20	20/06/2023	1,00	1,00			Llvias durante la tarde
21	21/06/2023	1,00				
22	22/06/2023	1,00				
23	23/06/2023	1,00				
24	24/06/2023	1,00				
25	25/06/2023	1,00				
26	26/06/2023	1,00				
27	27/06/2023	1,00				
28	28/06/2023	1,00				
29	29/06/2023	1,00				
30	30/06/2023	1,00				

LLUVIA
SIN LLUVIA


DATOS VISUALES DE LA INTERVENTORIA




REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE MUTIS

1. FRENTE DE LA CRA 2W ENTRE LAS CALLES 56 Y 59	
	
Estado inicial en el barrio Mutis en la Localidad de Mutis, Marzo16 de 2023	Señalización en el barrio Mutis en la cra 2 W y calles 56 y 59 costado sur occidente en la Localidad de Mutis
	
Demolición de andenes con maquinaria pesada para mejorar los rendimientos.	Vista del espacio publico ejecutado durante el presente mes de junio.

	
Demolición de andenes en concreto realizada en la cra 2W costado sur occidente	Instalación de losetas 40x40 con guía para invidente.
	
Estado inicial en el barrio Mutis en la Localidad de Mutis, Marzo16 de 2023	Avance de espacio público urbano en el costado occidental de la cra 2W recrear de Mutis.
	

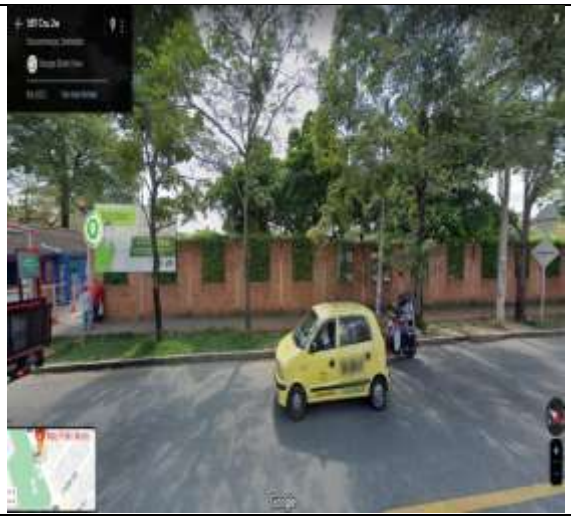Estado inicial en el barrio Mutis en la Localidad de Mutis, Marzo16 de 2023	Avance del Espacio público en Mutis cra 2W calle 56 y 57 oriental
	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Avance del Espacio público en Mutis cra 2W calle 56 y 59
	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Vista del frente de obra, durante el mes de junio 2023.

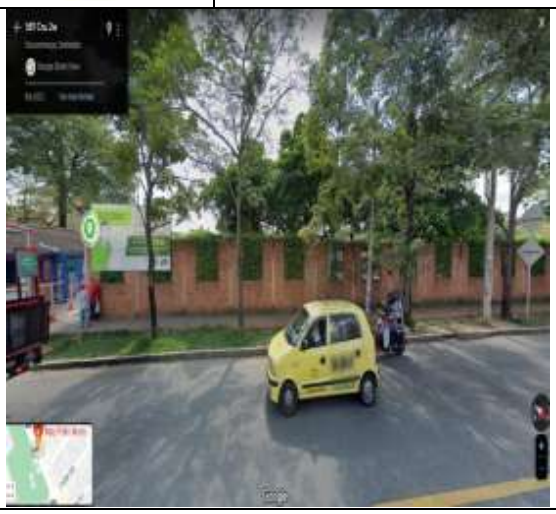	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Señalización implementada en el frente de obra, durante el mes de junio 2023.
	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Vista actual del frente de la cra 2w calle 56 y 59 en su estado final puesta en servicio al público.

	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Vista actual del frente de la cra 2w calle 56 y 59 en su estado final para ponerlo al servicio al público.
	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Vista actual del frente de la cra 2w calle 56 y 59 en su estado final para ponerlo al servicio al público.
	

Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Señalización vial y peatonal de a cra 2w entre calle 56 y 59
	
Cra 2W con calles 56 y 59 estado inicial costado sur occidental	Estado actual en la cra 2W en la calle 56.

FRENTE CALLE 56 CON CRA 2W Y 3W EN LA LOCALIDAD DE MUTIS EN EL BARRIO MUTIS.

	
Calle 56 con cras 2W y 3W costado sur Estado inicial.	Anden en servicio en la calle 56 entre cras 2W y 3W

	
Calle 56 con cras 2W y 3W costado sur Estado inicial.	Estado actual del espacio público, se deja la observación que esta zona
	
Calle 56 con cras 2W y 3W costado sur Estado inicial.	Estado actual en la calle 56 cra 2W y 3W

	 
Calle 56 con cras 2W y 3W costado sur Estado inicial.	Estado actual del frente Calle 56 entre cras 2w y 3w.
	 
CALLE 56 ENTRE CRA 2W Y 3W	Vista de la intervención en la calle 56 entre la cra 2w y 3w.



Calle 56 con cras 2W y 3W costado sur Estado inicial.



Estado final del frente de obra del barrio Mutis calle 56 cras 2w y 3w



Estado inicial en la Calle 56 entre cras 2W y 3W






Intervención en la calle 56 entre cras 2W y 3W






Estado inicial en la Calle 56 entre cras 2W y 3W	Estado final del frente de obra del barrio Mutis calle 56 cras 2w y 3w
	
Estado inicial del frente de obra en la Calle 56 con cras 2W y 3W	Estado final del frente de obra del barrio Mutis calle 56 cras 2w y 3w
	
Estado inicial del frente de obra en la Calle 56 con cras 2W y 3W	Estado final del frente de obra del barrio Mutis calle 56 cras 2w y 3w

2. LOCALIDAD DE CIUDADELA

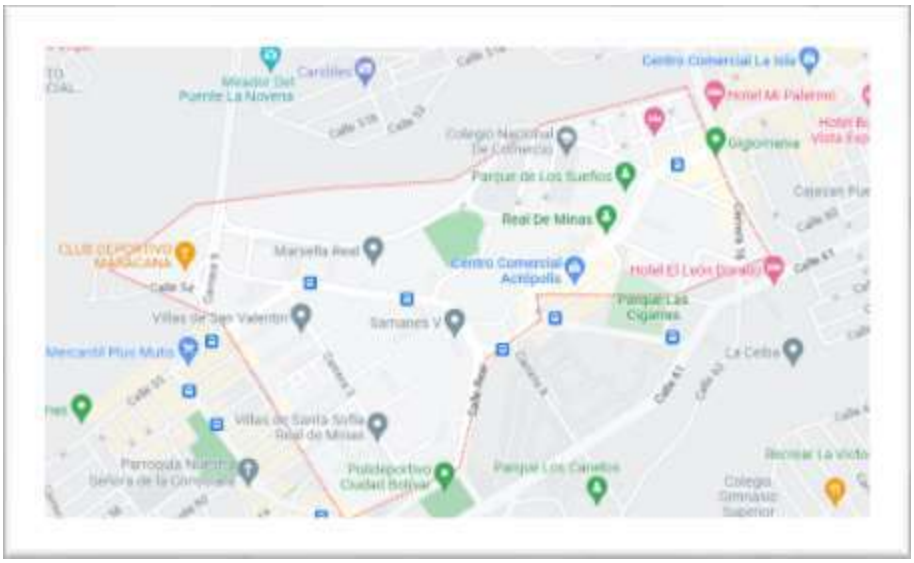

2.1.2 BARRIO REAL DE MINAS

Se inicia labores el día 15 de junio de 2023 en el frente del barrio Real de Minas por parte del contratista 7G7 SAS, una vez entregado el frente por parque del contratista del alumbrado público cuyo contrato es el 4141 del 2022.

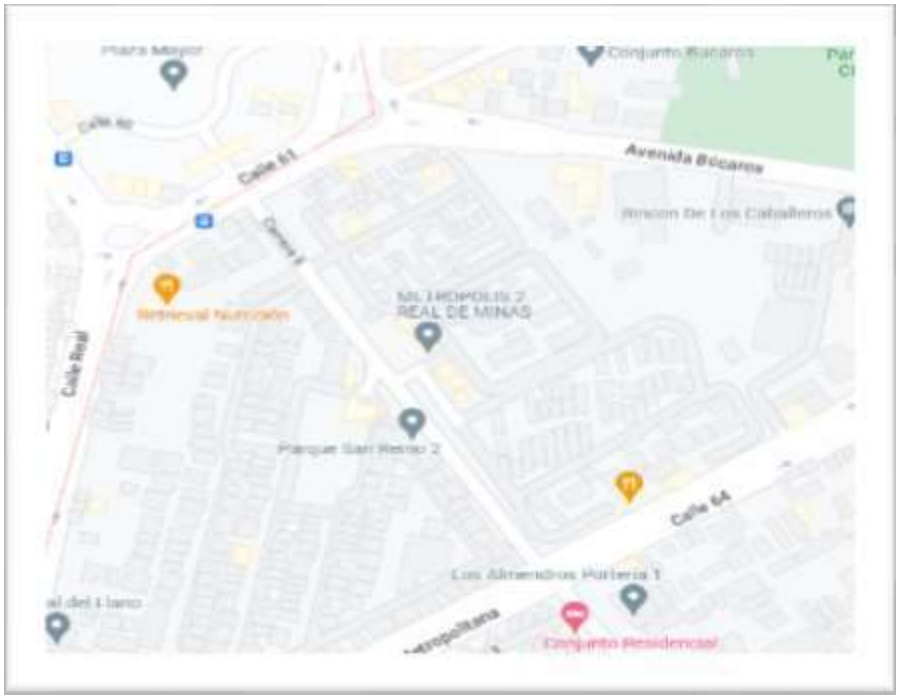

LLUVIAS DE REAL DE MINAS

JESAK NIT. 901320986-8

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO GR3


PROYECTO: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

NOMBRE DEL FRENTE DE OBRA: REAL DE MINAS, MES DE JUNIO 2023

No.	FECHA	SIN LLUVIA DÍA	HORAS LLUVIA DIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	2/06/2023	1,00				
2	3/06/2023	1,00				
3	4/06/2023	1,00				
4	5/06/2023	1,00				
5	6/06/2023	1,00				
6	7/06/2023	1,00				
7	8/06/2023	1,00				
8	9/06/2023	1,00				
9	10/06/2023	1,00				
10	11/06/2023	1,00				
11	12/06/2023	1,00				
12	13/06/2023	1,00				
13	14/06/2023	1,00				
14	15/06/2023	1,00				
15	16/06/2023	1,00				
16	17/06/2023	1,00				
17	18/06/2023	1,00				
18	19/06/2023	1,00				
19	20/06/2023	1,00				
20	21/06/2023	1,00				
21	22/06/2023	1,00				
22	23/06/2023	1,00				
23	24/06/2023	1,00				
24	25/06/2023	1,00				
25	26/06/2023	1,00	3,00			Llovio durante toda la noche
26	27/06/2023	1,00				
27	28/06/2023	1,00				
28	29/06/2023	1,00				
29	30/06/2023	1,00				
30	1/07/2023	1,00				

LLUVIA
SIN LLUVIA

DATOS VISUALES DE LA INTERVENTORIA



DENSIDADES EN REAL DE MINAS

Se realizaron las tomas de las densidades el día 02 de junio en el frente de real de minas en la franja hacia la calle 61, con resultados positivos, mayores de 95% de compactación para que se pudieran continuar las actividades programadas para la colocación del espacio público

COLSUELOS S.A.S

PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO
(MÉTODO DEL CONO DE ARENA)
NORMA I.N.V. E - 161

CÓD.: NRJ-010
FECHA: 2-jun-23

CLIENTE : 7G7 S.A.S. NIT N° 901120358-4

CONTRATO : N° 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
PROYECTO : ADECUACION DE ANDENES , ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
MATERIAL: SUBBASE GRANULAR DE PESCADERO INSTALADA EN SNA REMO
DESCRIPCION : GRAVA ARENOSA COLOR GRIS NO PLASTICA

TOMADAS EL DIA 02-06-23

	ENSAYO No	1	2	3	4	5	6
	ORIENTACION EN EL SITIO	REAL DE MINAS					
	RASANTE	BASE	BASE	BASE			
	PROFUNDIDAD	**12cm**	**12cm**	**12cm**			
	DENSIDAD DE LA ARENA (gr / cm³)	1.410	1.410	1.410			
	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gf)	7118	7140	7145			
	PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gf)	3481	3469	3561			
	PESO ARENA CONO Y HUECO (gf)	3637	3671	3584			
	CONSTANTE DEL CONO (gf)	1641.0	1641.0	1641.0			
	PESO DE ARENA EN EL HUECO (gf)	1996.0	2030.0	1943.0			
	VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (cm³)	1415.6	1439.7	1378.0			
	PESO MATERIAL RETENIDO EN 3/4	581.0	1240.0	1034.0			
	PESO MATERIALEXTRAIDO DEL HUECO 3 / 4" (gf)	2627.0	2209.0	2257.0			
	% RETENIDO EN 3/4	**18.0**	**36.0**	**31.0**			
20	CONTENIDO DE HUMEDAD %	5.5	5.3	5.1			
21	PESO UNITARIO HUMEDO (gf/cm³)	**2.259**	**2.396**	**2.388**			
	PESO UNITARIO SECO (gf/cm³)	2.251	2.275	2.272			
22	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA EN CAMPO (gf / cm³)	2.290	2.356	2.338			
	HUMEDAD OPTIMA EN LABORATORIO (%)	5.0	5.0	5.0			
	% DE COMPACTACIÓN TERRENO	98.3	96.6	97.2			

OBSERVACIONES : BASE GRANULAR
1- PORTAL SDAN SEBASTIAN
2- METROPOLIS 1 CARRERA 18 N° 61-53
3- PORTERIA SAN REMO 1

JOSE VICENTE PAEZ
LABORATORISTA

MONICA CASTRO
REVISO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE REAL DE MINAS

	
Vista del estado inicial del frente en el barrio Real de minas antes de su intervención.	Vista del estado actual del frente en el barrio Real de minas antes de su intervención.
	
Vista del estado inicial del frente en el barrio Real de minas antes de su intervención.	Vista del estado actual del frente en el barrio Real de minas antes de su intervención.
	
Vista del estado inicial del frente en el barrio Real de minas antes de su intervención.	Vista del estado actual del separador ambiental frente a San Remo1 y 2.

	
Vista del estado inicial del espacio público de los andenes en el barrio Real de minas	Vista del separador intervenido por parte del contratista.
	
Vista del estado inicial del espacio público de los andenes en el barrio Real de minas	Vista de la intervención del separador por parte del contratista.
	
Estado inicial del frente del Barrio real de minas	Estado actual intervenido por el contratista 7G7 en Real de Minas



Estado inicial de los dos costados en el Barrio Real de Minas.



Estado actual, por la intervención del contratista del alumbrado ~~publico~~público N° 414 de 2022



~~ESTADO INICIAL BARRIO LOS SAUCES~~Estado inicial del barrio Real de Minas



~~ESTADO INICIAL ANTES DE LA INTERVENCION DEL CONTRATISTA 7G7 SAS~~Estado de entrega del contratista de alumbrado público a 7G7 SAS



Vista de Señalización vial en el frente de obra



Vista de la señalización vial en el frente de obra en San Remo 1 y 2 en el separador vial.

	
Señalización vial utilizado en el frente de Real de minas.	Vista de la señalización vial colocada en el frente de obra por parte del contratista.
	
Señalización vial y peatonal implementado.	Señalización vial en el Separador vial en San Remo 1 y 2.
	
Vista de la colocación de Sardineles y Bordillos en el espacio público.	Vista del espacio publico intervenido con sardineles y bordillos.





Vista del espacio público intervenido en el frente de obra.





Vista de espacio público intervenido a la fecha.





Cerramiento perimetral de protección en Real de minas



Separador en proceso de intervención por parte del contratista.




Vista del espacio público terminado y puesto en servicio a la comunidad.



Vista del espacio público terminado y puesto en servicio a la comunidad.

BARRIO LOS SAUCES

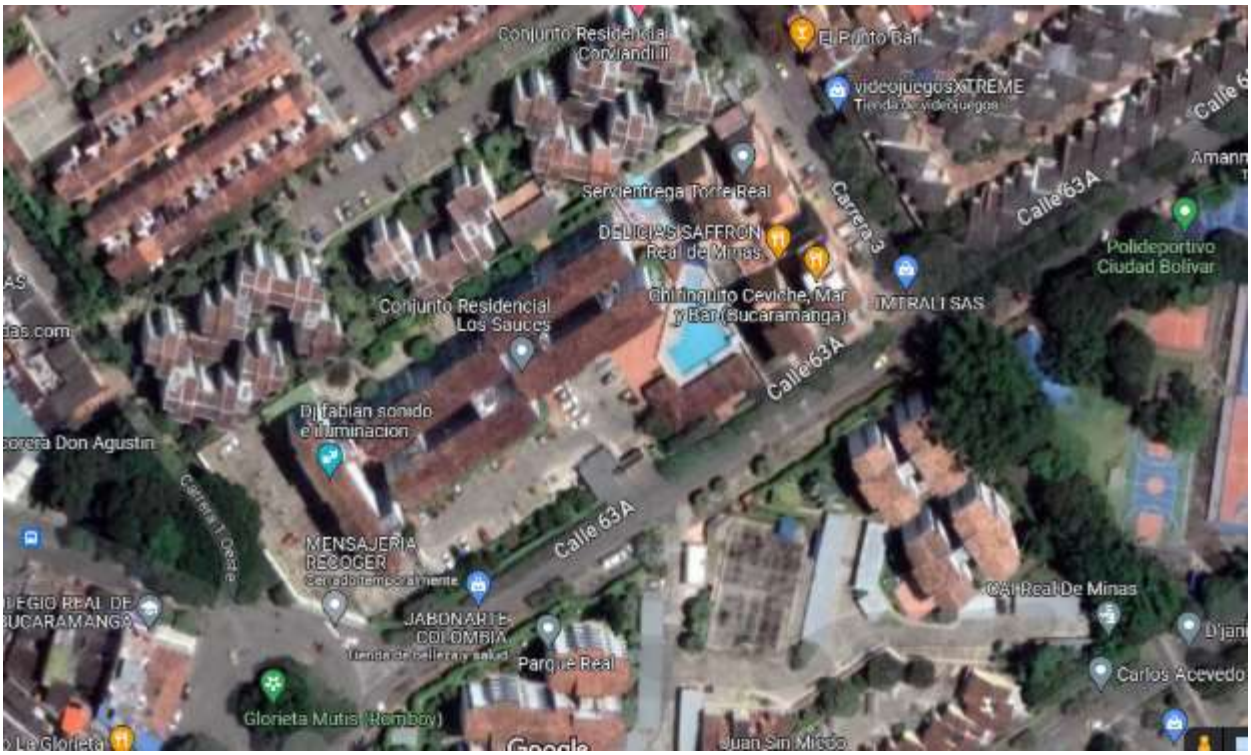

El día 8 de mayo/2023 se inició obras en el frente de Los sauces por parte del contratista 7G/7 SAS en donde se realizó un avance de obra muy importante, ya que cuenta con toda la logística y las herramientas necesarias para avanzar desde el primer día de trabajo.
El subcontratista da muy buenos rendimientos en la colocación de las losetas del espacio público, hecho que se evidencia ya que termino parte del frente en 3 semanas.

En este frente se autorizó la construcción de un resalto o pompeyano en el acceso del conjunto residencial, por parte del supervisor de obras Ing. Edgar Bayona, pero este será realizado en la etapa final de la entrega de este frente de obra por parte del contratista, para tener los niveles totalmente definidos.
Durante el presente mes de junio las actividades avanzaron considerablemente.

CRONOGRAMA DE LLUVIAS, LOS SAUCES

JESAK NIT. 901320986-8

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO GR3


PROYECTO: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

NOMBRE DEL FRENTE DE OBRA : LOS SAUCES MES DE JUNIO 2023


No.	FECHA	SIN LLUVIA DÍA	HORAS LLUVIA DIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1/06/2023	1,00				
2	2/06/2023	1,00				
3	3/06/2023	1,00				
4	4/06/2023	1,00				
5	5/06/2023	1,00				
6	6/06/2023	1,00				
7	7/06/2023	1,00				
8	8/06/2023	1,00				
9	9/06/2023	1,00				
10	10/06/2023	1,00				
11	11/06/2023	1,00				
12	12/06/2023	1,00				
13	13/06/2023	1,00				
14	14/06/2023	1,00				
15	15/06/2023	1,00				
16	16/06/2023	1,00	1,00			Lluvias en horas de la tarde
17	17/06/2023	1,00				
18	18/06/2023	1,00				
19	19/06/2023	1,00				
20	20/06/2023	1,00	1,00			Lluvias en horas de la tarde
21	21/06/2023	1,00				
22	22/06/2023	1,00				
23	23/06/2023	1,00				
24	24/06/2023	1,00				
25	25/06/2023	1,00				
26	26/06/2023	1,00				
27	27/06/2023	1,00				
28	28/06/2023	1,00				
29	29/06/2023	1,00				
30	30/06/2023	1,00				

LLUVIA
SIN LLUVIA


DATOS VISUALES DE LA INTERVENTORIA



REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LOS SAUCES

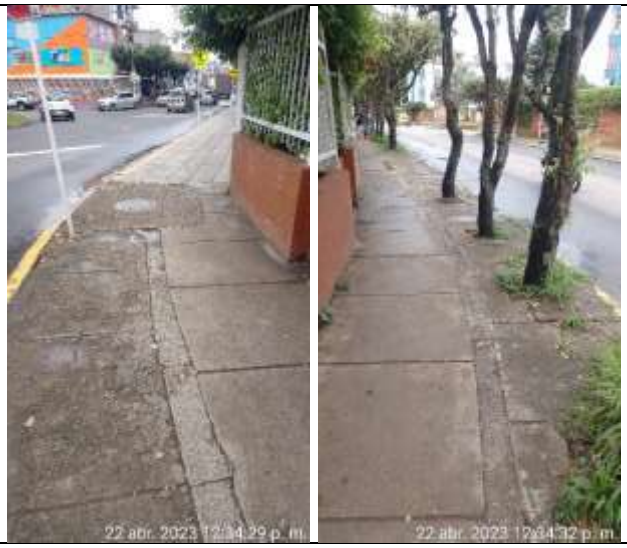	
Estado inicial,del espacio publico existente.	Demoliciones en concreto del espacio publico de Sauces.
	
Estado inicial del tramo de Sauces, antes de su intervención.	Demoliciones del espacio publico por parte del contratista 7G7 SAS.



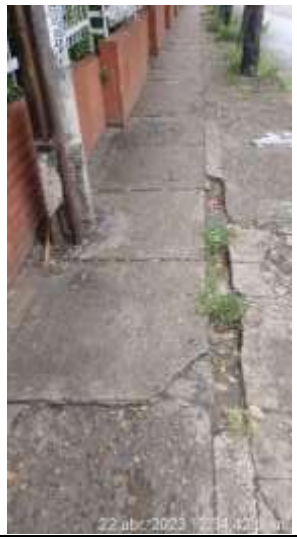

Estado inicial



Demolición del anden existente





Señalizacion vial en Sauce







Instalacion de Sardinel prefabricado A10









Estado inicial del acceso a Los Sauces.



Espacio publico intervenido.




Estado final del espacio publico





Estado final del espacio publico

2.1.4 LOCALIDAD DE MUTIS

Se comenzó la intervención del espacio público, durante el presente mes de abril de 2023, en la localidad de Mutis en el Barrio Estoraques.



BARRIO ESTORAQUES

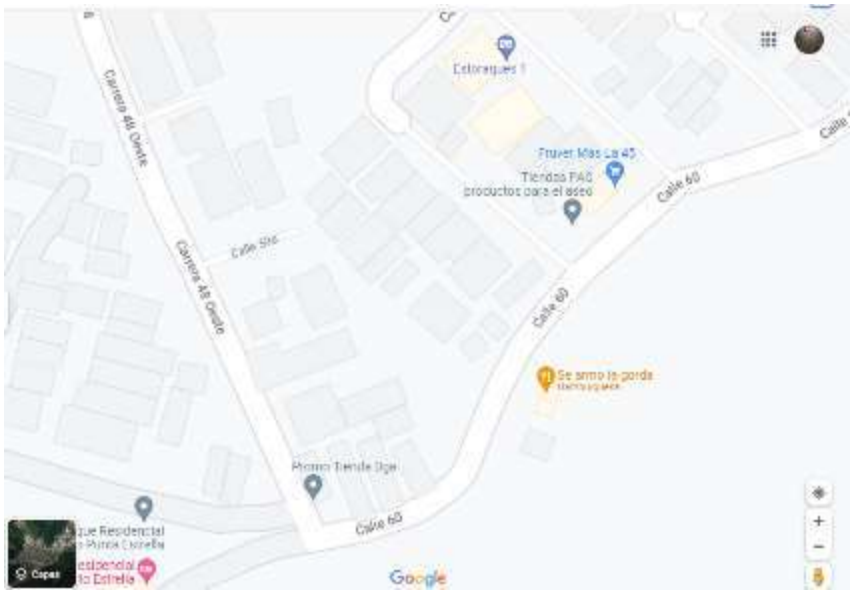

Se tiene previsto intervenir el espacio público de andenes por estar en muy mal estado y no se está cumpliendo con la nueva reglamentación urbana de la ciudad según él nuevo POT, en la calle 60 entre las carreras 46 y 48w, como también la calle 59 con cra 47A, la calle 59B con cra 47ª occidental en el costado oriental del barrio Estoraques.

CUADRO DE LLUVIAS

JESAK NIT. 901320986-8

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO GR3


PROYECTO: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

NOMBRE DEL FRENTE DE OBRA : ESTORAQUES,MES DE JUNIO 2023

No.	FECHA	SIN LLUVIA DÍA	HORAS LLUVIA DIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	2/06/2023	1,00			X	
2	3/06/2023	1,00			X	
3	4/06/2023	1,00			X	
4	5/06/2023	1,00			X	
5	6/06/2023	1,00			X	
6	7/06/2023	1,00			X	
7	8/06/2023	1,00			X	
8	9/06/2023	1,00			X	
9	10/06/2023	1,00			X	
10	11/06/2023	1,00			X	
11	12/06/2023	1,00			X	
12	13/06/2023	1,00			X	
13	14/06/2023	1,00			X	
14	15/06/2023	1,00			X	
15	16/06/2023	1,00			X	
16	17/06/2023	1,00			X	
17	18/06/2023	1,00			X	
18	19/06/2023	1,00			X	
19	20/06/2023	1,00			X	
20	21/06/2023	1,00	1,00			Lluvia en horas de la tarde
21	22/06/2023	1,00	2,00		X	Lluvia en horas de la tarde
22	23/06/2023	1,00			X	
23	24/06/2023	1,00			X	
24	25/06/2023	1,00			X	
25	26/06/2023	1,00			X	
26	27/06/2023	1,00			X	
27	28/06/2023	1,00			X	
28	29/06/2023	1,00			X	
29	30/06/2023	1,00			X	
30	1/07/2023	1,00			X	

LLUVIA
SIN LLUVIA

DATOS VISUALES DE LA INTERVENTORIA



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL BARRIO ESTORAQUES

	
Vista de recorrido de obra al frente del barrio estoraque el día marzo 16/2023	Vista del proceso constructivo del andén en la zona de Bahía de Estoraques
	
Estado inicial del andén en la calle 60 con cras 46 y 48w	Avance del Proceso constructivo del espacio público de Bucaramanga.



Vista de recorrido de obra al frente del barrio estoraque el día marzo 16/2023





Vista del espacio público intervenido en el barrio de Estoraques.



Vista de recorrido de obra inicial al frente del barrio estoraque el día marzo 16/2023





Estado final en la calle 60 entre carrera 46 y 48w



Vista de recorrido de obra al frente del barrio estoraque el día 16 marzo /2023



Estado final del espacio público y puesta en servicio para la comunidad



Vista de recorrido de obra al frente del barrio estoraque el día marzo 16/2023



Vista del frente intervenido por parte del contratista 7G7 SAS a la fecha.





Estado inicial y actual de la intervención de obra en Estoraques.	Espacio público intervenido en la calle 60 entre cras 46 y 48w del barrio de Estoraques.
	
Estado inicial en la calle 60 con cra 48 Barrio Estoraques	Vista del frente terminado y puesta en servicio en la cra 48w y la calle 60
 	 
Estado inicial de frente de obra en la calle 59B con cra 47w en estoraque	Vista del proceso constructivo del andén en la calle 59B en Estoraques.



Estado inicial del andén en la calle 60 con cra 48W en Estoraques.



Espacio público intervenido en Estoraques.



Estado inicial en la calle 59 con cra 47 y 48 vía principal



Intervención de la calle 59 con cra 48w en Estoraques





Demolición de la placa de piso en la calle 59 con cra 47	Intervención en la calle 59 con cra 47,por parte del contratista
	 
Estado final del espacio público en el barrio Estoraques	Estado del antes y después de los andenes realizadas por el contratista 7G7 SAS.
	
Estado inicial de la calle 60 con cra 47 y 48	Intervención del espacio público en la Bahía del Barrio Estoraques.



Estado inicial en la calle 60 cra 47 y 48 Barrio Estoraques.



Vista en la bahía en el nuevo anden en Estoraques



Estado final del andén en la calle 59B con cra 8w, en el barrio Estoraques.



Estado final del anden en la calle 60 entre las cras 46 y 47W






Espacio público terminado en la calle 59B con cra 47w en Estoraques.	. Espacio público terminado en la calle 59B con cra 47w en Estoraques.


BARRIO DIAMANTE I

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SOCIALIZACION DE OBRA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, EN EL BARRIO DIAMANTES I.


	
Se realizo socialización en el barrio Diamante I, de la recuperación del acceso peatonal en Lacalle 105 con cra 33 via a Floridablanca.	Exposición por parte del contratista 7G7 SAS, a la comunidad que asistió a la reunión.
	
Socialización en Diamante I, por parte de 7G7 SAS y de Interventoría JESAK SAS	Socialización en Diamante I, por parte de 7G7 SAS y de Interventoría JESAK SAS

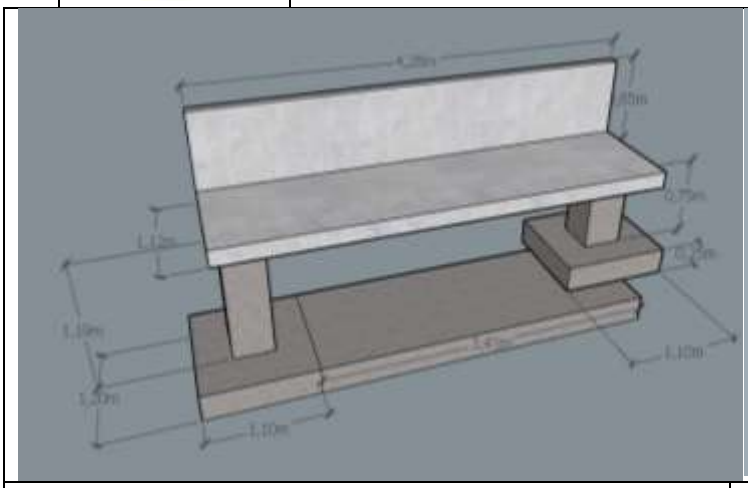


Esquema estructural entregado por la secretaria de infraestructura

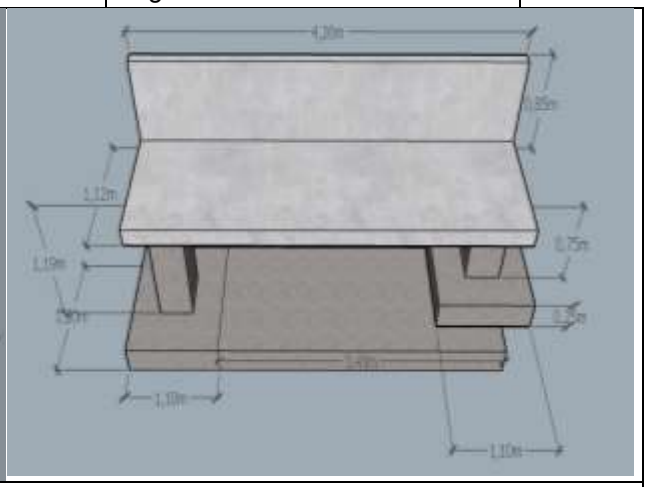

Se recomienda restructurar este diseño estructural porque no es el más indicado para su ejecución en el sitio.

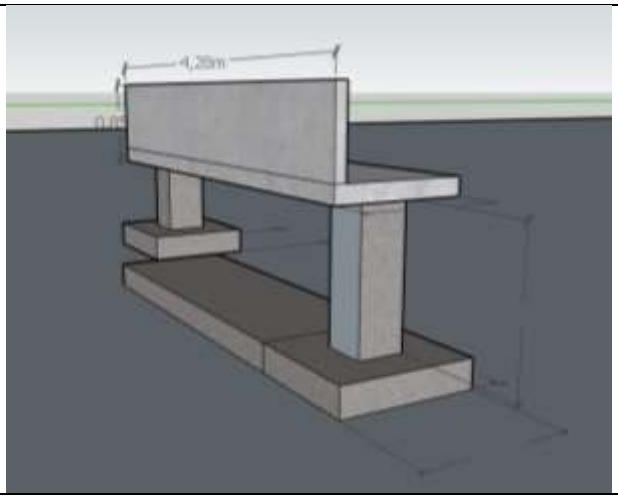

Vista de 3d de la nueva estructura

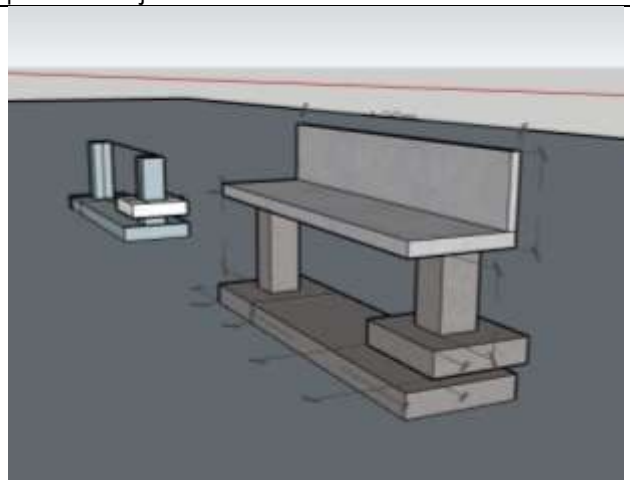

Vista de 3d de la nueva estructura







Estado actual del frente que hay que intervenir	Entorno de la zona de intervención de obras
	
Estado actual del frente de obra, en Diamantes I	Estado actual del frente de obra, antes de la intervención en Diamantes I

2.1.5 BARRIO LA NUEVA GRANADA

El día 29 de junio de 2023 se realizó la visita de obra al frente de Nueva Granada con la ingeniera residente de contratista con el fin de verificar el estado actual del problema de humedad al predio colindante a la zona de espacio público.

VISITA DE OBRA AL FRENTE DE OBRA.

	
Se realiza visita al predio en nueva Granada, con la residente del contratista.	Se continua con las filtraciones del nivel freático en el predio a intervenir.



Localización del predio por intervenir en Nueva Granada



Espacio público que se debe intervenir en Nueva Granada.



Predio afectado por manantial del nivel freático existente.





Vista de los apozamientos de las aguas a causa del nivel freático.

2.2 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

CTO 417 DE 2022						
	PERIODO	PROG ACUML	EJECUTADO ACUMULADO	% PROG. ACUM.	% EJEC. ACUM.	DIF.
S1	16 AL 22 MARZO	1.784.117	-	0,09%	0,00%	-0,09%
S2	23 AL 29 MARZO	17.296.201	7.092.070	0,89%	0,36%	-0,52%
S3	30 MARZO AL 5 ABRIL	37.258.920	13.415.234	1,91%	0,69%	-1,22%
S4	6 AL 12 ABRIL	96.006.593	22.091.037	4,92%	1,13%	-3,79%
S5	13 AL 19 ABRIL	174.567.827	73.313.411	8,95%	3,76%	-5,19%
S6	20 AL 26 ABRIL	283.707.512	162.826.854	14,55%	8,35%	-6,20%
S7	27 ABRIL AL 3 MAYO	312.952.309	176.137.736	16,05%	9,03%	-7,02%
S8	4 AL 10 MAYO	363.258.661	198.033.265	18,63%	10,16%	-8,47%
S9	11 AL 17 MAYO	423.899.264	234.516.835	21,74%	12,03%	-9,71%
S10	18 AL 24 MAYO	504.818.397	318.013.791	25,89%	16,31%	-9,58%
S11	25 AL 31 MAYO	619.080.112	348.836.391	31,75%	17,89%	-13,86%
S12	1 AL 7 JUNIO	692.878.944	424.567.090	35,53%	21,77%	-13,76%
S13	8 AL 14 JUNIO	766.559.621	460.372.574	39,31%	23,61%	-15,70%
S14	15 AL 21 JUNIO	894.101.514	495.993.923	45,85%	25,44%	-20,42%
S15	22 AL 28 JUNIO	1.113.233.583	562.044.533	57,09%	28,82%	-28,27%
S16	29 JUNIO AL 5 JULIO	1.463.359.082	665.545.425	75,05%	34,13%	-40,92%
S17	6 AL 12 JULIO	1.822.170.727		93,45%		
S18	13 AL 15 JULIO	1.949.858.620		100,00%		

3. PLAN MANEJO DE TRAFICO (PMT).

La interventoría realiza el seguimiento en cada uno de los frentes donde se está realizando la intervención (Diamante II, Barrio real de minas, Los Sauces, Estoraques, Mutis), donde se evidencia el uso adecuado del plan obteniendo una ponderación del 100% en la implementación del plan de manejo de tráfico. La calificación de PMT, se anexa en el presente informe la Matriz de evaluación de cumplimiento del plan de manejo de transito dando una calificación del 100%.

El contratista hace entrega a la interventoría de la certificación aprobada y expedida por la secretaria de movilidad de la ciudad de Bucaramanga para su implementación en todos los frentes de obra.

El contratista implementa el PMT de acuerdo a las normas básicas, aprobadas por la secretaria de movilidad.

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

GRUPO 3

- Durante el presente mes de junio de 2023, se intervinieron los frentes de Mutis, Estoraques, Real de Minas, Los Sauces y Diamantes II.
- Los frentes más avanzados son los de Mutis, Estoraques y los Sauces, en donde se ve el avance de obra más representativo.
- Se informa a través del ing. Edgar Bayona que el frente de san Luis no se va a intervenir porque se evidencia que el perfil vial no coincide con lo existente, teniendo en cuenta que la vía peatonal solo tiene 3 metros de ancho y no tiene los 6 metros que aparecen en los registros viales.
- Se realizan los comités de obra en el presente mes de junio como se tenía programo, para analizar y tomar los correctivos necesarios para la buena calidad de los trabajos que se vienen realizando.
- Se viene cumpliendo la implementación del PMT aprobado para los diferentes frentes de obra, por parte del contratista de obra.
- Se dio inicio de obra en el costado oriental de la cra 2W entre calles 56 y 57, y se continuo con la terminación del frente de la calle 56 entre cras 2W y 3W a finales del mes de junio.
- El contratista 7G7 SAS realizo la toma de las densidades de la sub Base granular para la colocación de la loseta y tabletas del espacio público por parte del contratista, en el barrio Real de minas, los sauces, la interventoría siempre estuvo atenta a estas tomas de densidades.
- Esta interventoría ha supervisado las tomas de las densidades, en los frentes de obras en donde sean requerido, pero en el frente de Los Sauce, una muestra dio baja densidad, y se le solicito al contratista tomar dos muestras más, luego de pasarle más vibro compactación, las cuales pasaron las pruebas mínimas del 95%, como se puede evidenciar en los resultados del laboratorio.
- Durante este mes de junio/2023 se llegó al acuerdo de dejar la cerca viva de la cerca viva de la Sungla en la fachada del conjunto residencia de San Remo 1 y San Remo 2 entre la comunidad y la entidad de secretaria de infraestructura, por tal motivo el contratista no retirara esta Sungla y continuara con sus labores contractuales.
- Debido a que el contratista 7G7 SAS cambio todo el personal de obra, se ha visto mayor rendimiento en los frentes de Mutis, Real de Minas y los Sauces.
- En el frente de obra en el barrio Diamantes II, se continuaron las actividades de acuerdo a lo programado, por parte del contratista, los trabajos han avanzado normalmente y el rendimiento ha sido bueno durante el presente mes de ejecución de obra.
- Se realizaron los comités de obra en la oficina de la Interventoría en el barrio Cabecera Calle 48 con cra 29 el día 8 de junio/2023, como también en el campamento del contratista el día 3 de junio/2023, en donde se llegaron a unos acuerdos y compromisos para sacar adelante los proyectos en el espacio público de la ciudad de Bucaramanga en los tiempos establecidos del presente contrato de obra.
- Se realizó la socialización de obra en el barrio Diamantes I, el día 30 de junio en las horas de la noche en el parque del barrio con los líderes del barrio, para tratar de explicar lo que se va a realizar en la calle 105 con cra 33, vía vieja a Floridablanca.
- Durante este mes de junio no presentaron muchas lluvias en las jornadas laboral, sino en las horas de la noche, pero que no afectaron en nada a la programación de obra presentada por el contratista.

- Las actividades de las demoliciones que se han venido ejecutando con el martillo de Bobcat, para mayor rendimiento en donde se ha podido verificar que los espesores son variables y muy resistentes, una vez demolido se procede a retirar el material sobrante con las volquetas certificadas y aprobadas por la HSEQ y el componente ambiental, y llevados a un botadero oficial previamente aprobado como está estipulado.
- Se tiene programado intervenir los frentes de La Victoria, Diamantes I, para los próximos días del mes de Julio/2023 por parte del contratista, para continuar con su programación de obra.
- El contratista realiza las excavaciones manuales y procede a colocar la capa de sub base de acuerdo a la rasante encontrada, en los frentes intervenidos de Los Sauces, Real de Minas, mutis y Estoraques. y se compacta con una rana vibro compactadora, y posteriormente se realizan las tomas de las densidades con el laboratorio de suelos.
- En el frente de Estoraques la interventoría utilizo la comisión topografía para definir los niveles finales de los acabados de los andenes, debido a que en la curva de la calle 60 con cra 48w, se presentaba unos bajos niveles que hacían que las aguas lluvias inundaban los andenes. Una vez trazado los niveles se procedió a intervenir los andenes y se solucionó definitivamente el problema de las aguas lluvias que se ingresaban a las viviendas del frente.

" ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER "

LOCALIDAD DE MUTIS
BARRIO ESTORAQUES

CONTRATO DE OBRA Nº 417 DE 2022
PLAZO : 4 MESES
INICIO DE OBRA : MARZO 16 DE 2023
FIN DE OBRA : JULIO 15 DE 2023

CONTRATISTA : 757 SAS
DIRECTOR DE OBRA : ING. JORGE H. PINZON
RESIDENTE DE OBRA : ING. MONICA LILIANA QUINTERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 429 DE 2022
CONTRATISTA INTERVENTORIA JESAK SAS
DIRECTOR INTERVENTORIA : ING. VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE INTERVENTORIA : ARQ. JUAN CARLOS VITOLA URZOLA
INSPECTOR DE OBRAS : ING. YINI ZOYDITH GARCIA F.
ARQ. CARLOS ANDRES HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. EDGAR BAYONA.
AUXILIAR DE APOYO : ARQ. ALEXANDER ROJELO

Actividad en obra: rayuste del espacio publico, Se realiza instalacion de espacio publico, se continua Se con instalacion de pasos de adoquin En Franja ambiental ubicacion en el tramo de la calle 60 # 4

R. Interventoria | Residente obra | Inspector obra

Jueves 1 de Junio de 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde

Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm

Personal de obra: Residente de obra, inspetor de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes.

Herramientas y Equipos: Herramienta menor, vibro-Compactador.

Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio Publico, Se realiza instalacion de bordillo, Se realiza mantenimiento de sardinel peatonal. Ubicado en el tramo de la calle 60 # 46 - 48

R. Interventoria | Residente obra | Inspector obra

Viernes 2 de Junio de 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana - en la tarde.

Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 p

Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, inspector de obra, inspetor de interventoria 2 oficiales, 4 ayudantes.

Herramienta, y Equipo: Herramienta menor, planta de energia, vibrocompactador.

Actividad de obra: Se continua con la instalacion de espacio publico, Se continua con la instalacion de pasos de adoquin en franja ambiental en tramo de la calle 60 # 47

R. Interventoria | Residente Obra | Inspector obra

Sabado 3 de Junio de 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana
Horario de trabajo 7:00 A 12:00
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, Planta de energia, Vibrocompactador.
Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio publico, Se realiza instalacion de piso de adoquin en franja ambiental, se realiza excavacion para la instalacion de sumidero, Se realiza mantenimiento de sendero peatonal sobre el frente de la calle 60 entre 47 - 48.

Residente obra
Inspector obra

Lunes 5 de Junio de 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, planta de energia vibro compactador.
Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio publico Se realiza construccion de vados peatonal, se realiza mantenimiento de sendero peatonal.

Inspector obra
Residente obra

Martes 6 de Junio de 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde
Horario de trabajo 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra Inspectorr de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, planta de energia, Vibro compactador

020

Actividad en obra: Se realiza instalacion de espacio Publico Se realiza Construccion de vados peatonales, instalacion de Sardinel Sobre la calle 60 # 48

R. Interventoria - Inspector obra - Residente obra

Miercolos 7 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana — Tarde

Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm

Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales 4 ayudantes.

Herramienta y Equipo: Herramienta menor, planta de energia vibrocompactador.

Actividad de obra: Se realizo instalacion de espacio publico Se realizo instalacion de Sardinele calle 60 # 48

Inspector obra - Residente obra - R. Interventoria

Jueves 8 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana, llovia en la Tarde.

Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm

Personal de obra: Residente de interventoria, Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria 2 oficiales, 4 ayudantes.

Actividad de obra: Se realizo localizacion y replanteo Se realizo instalacion de espacio publico, se realizo instalacion sobrase granular y compactacion mecanica Sobre la calle 56 # 47 - 48.

Residente Obra - R. Interventoria - Inspector obra

Viernes 9 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana y tarde

Horario de trabgo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00

Personal de obra: Residente de obra,

Residente de interventoria, Inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes,
Herramienta y Equipo: Herramienta menor, Vibrocompactador
Actividad de obra: Se realizo instalacion de espacio publico Se realiza instalacion de Sardinel, Se realiza instalacion de Subbase granular y compactacion mecanica sobre Calle 56 # 47-48

Residente obra R. Interventoria Inspector obra

Sabado 10 de Junio 2023
Estado de tiempo: Soleado en la mañana
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00
Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, inspector de obra, Inspector de interventoria 2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividad de obra: Se realizo instalacion de Sardinel Se realizo intalacion de espacio publico. Calle 56 # 47-48

Residente obra R. Interventoria Inspector obra

Lunes 12 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana-tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra: Residente de interventoria, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Actividad de obra, No Se realizo actividades por Ser dia Festivo.

Inspector obra Residente Obra R. Interventoria

Martes 13 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana-tarde

Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Maestro de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Herramienta y Equipo: planta electrica, vibro compactador, Herramienta menor.
Actividades de obra: Se realizo instalacion de espacio publico, instalacion sardinel, Se realizo limpieza en espacio publico y sendero peatonal.

Inspector obra Residente obra Interventoria

Miercoles 14 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana-Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00pm
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Herramienta y Equipo: planta electrica, vibro compactador, Herramienta menor.
Actividad en obra: Se realizo localizacion y Replanteo Se realizo instalacion de Subbase granular, Compactacion de la subbase, Se realizo instalacion de espacio publico sobre Calle 60 # 48

Inspector obra Residente obra Interventoria

Jueves 15 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana-Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00pm
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 4 ayudantes
Herramienta y Equipo: planta electrica, vibro compactador, Herramienta mayor.
Actividad de obra: Se realizo instalacion de espacio Publico, Se realizo limpieza en espacio publico y retiro de ayudas sobre la calle 60 # 48

Interventoria Residente

Viernes 16 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - lluvia tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Personal de obra: inspector de obra, inspector de interventoria 2 oficiales, 4 ayudantes.
Herramienta y Equipo: planta de energia, Herramienta menor.
Actividades de obra: Se realizo demolicion de losas de concreto, Se realizo retiro de escombros, Se realizo instalacion de bordillos en trinja ambiental.

Inspector obra Residente Interventoria

Sabado 17 de Junio 2023
Estado del tiempo:
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00
Personal de obra: 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, INSPECTOR DE INTERVENTORIA, PROFESIONAL SOCIAL.
ACTIVIDADES EN OBRA: SE CONTINUA CON INSTALACION DE LOSETAS DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA CRA 48 EN JUNTO CON LA CALLE 60, SE FINALIZA CON LIMPIEZA DE OBRA.

R. Interventoria Residente INSP. INT.

lunes 19 de Junio 2023
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Actividad en obra: no se realizo actividades

Inspector obra Residente obra R. Interventoria

Martes 20 de Junio 2023
Hora de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Personal de obra: 2 oficiales 4 ayudantes, Residente de obra Residente interventoria, inspector de obra

Estado del tiempo soleado en la mañana - Tarde, Vi
Actividad en obra Se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo instalacion de Subbase granular Sobre la calle 58B con 47AW, Se realizo Demolicion sobre la calle 58B con 47AW

Inspector obra Residente Obra R. Interventoria

Miercoles 21 de Junio 2023

Estado del tiempo: soleado en la mañana-Tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00pm
Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, Inspecto de interventoria, 2oficiales, 4 ayudantes.
Actividad en obra: Se realizo instalacion de bordillo Se realizo Instalacion de Subbase granular, Se realizo compactacion de la Subbase, Se realizo retiro de escombros, Se realizo mantenimiento senderos peatonales.

Inspector de obra Residente obra R. Interventoria

Jueves 22 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana, lluvia en la tarde.
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00pm
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Rana vibro compactadora.
Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, 2 Oficiales, 4 ayudantes.
Actividad en obra: Se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo fabricacion de sumideros sobre la calle 60 # 48

Residente Obra Inspector obra R. INTERVENTORIA

Viernes 23 de Junio 2023


Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde

Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm

Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Vibrocompactador

Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, inspector de obra, 2 oficiall, 4 ayudantes, Director de obra,

Actividad de obra: Se define con interventoria la intervención en la zona de bahia o parqueadero sobre la calle 60 con 47AA, cuyo ancho de espacio público sesta de 2m de ancho, la construcción de 3 vados y el confinamiento con bordillo de 20 cm de espesor. Se anexa esquema.

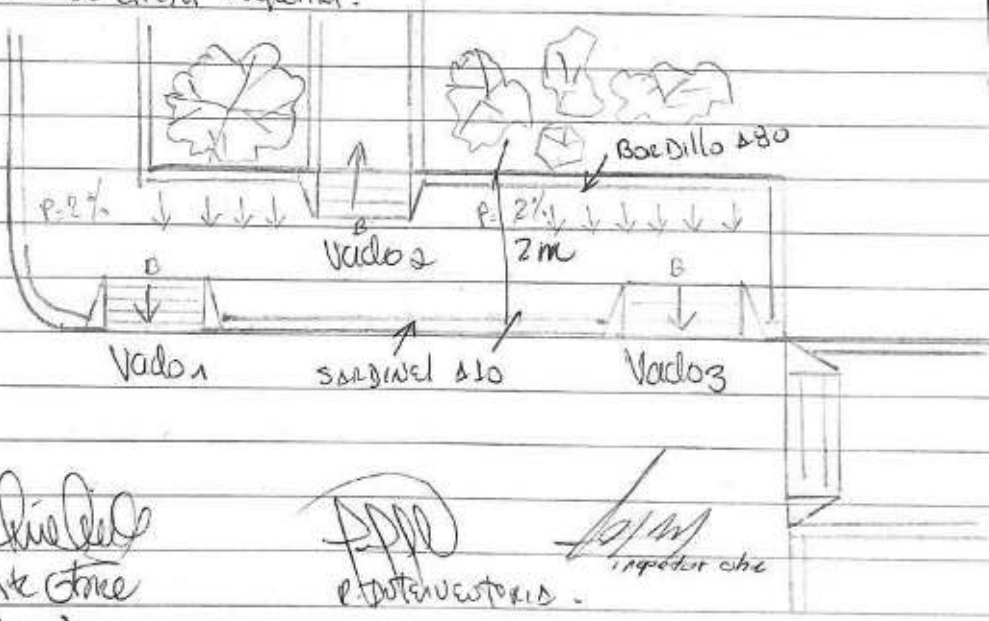

Residente Obra | P. Interventoria. | Inspector obra

Sabado 24 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana

Horario de trabajo: 7:00 a 12:00

Equipo y maquinaria: Herramienta menor

Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, inspector de obra, 2 oficiales, 4 ayudante

Actividad de obra: Se realizo instalacion de espacio publico Se realiza instalacion bordillo. Se realiza fabricacion de Sumidero.

Se le solicito al contratista intervenir la calle 59 y la zona de la BAHIA para asi poder terminar este frente de obras, solo se esta interviniendo la calle 59B y la curva de la cra 47W en la tapa del sumidero de

AGUAS LLUVIAS.
SE ORDENO REALIZAR 3 PASOS O PELDAÑOS A TRES VIVIENDAS YA QUE EL ACCESO QUEDO MUY ALTO Y POR SOLICITUD DE LOS DUEÑOS DELOS PREDIOS, TOCO HACER PARA MAYOR FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR DE LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS.

INTERVENTORIA. INSPECTOR OBRA RES. OBRA

lunes 26 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00pm
Personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Residente de Interventoria, 2 Oficiales, 4 ayudantes.
Equipo y maquinaria: Herramienta menor
Actividad de obra: Se realiza Excavacion en la zona de la Bahia de la calle 60 y localizacion y Replanteo, Se realizo instalacion de bordillos en franja ambiental sobre la bahia, se realizo instalacion de espacio publico sobre la calle 59B, Se realizo Demolicion sobre la bahia de la calle 60 # 48.

INTER. INSPECTOR OBRA RES OBRA

Martes 27 de Junio 2023

Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde
horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00pm
Personal de obra: Inspector de obra, Residente de Interventoria, 2 Oficiales, 4 ayudantes, Residente de Obra
Equipo y maquinaria: Herramienta menor.
Actividad de obra: Se realiza Instalacion de espacio publico en Calle 59B, se realiza Instalacion de Sardinel en la zona Bahia calle 60.

INTERVENTORIA INSPECTOR OBRA RES OBRA

Miercoles 28 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana. Tarde
Horario de trabajo: 9:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, inspector obra, 2 oficiales, 4 ayudantes
Equipo y maquinaria: Herramienta menor.
Actividad obra: Se realiza instalación de Sardinel en la Rotilla de la calle 60. Se realiza instalacion de espaldo Publico y cintas de ajuste sobre la calle 54B.

Asistente obra | Inspector obra | Res. obra

Jueves 29 de Junio 2023
Estado del tiempo: soleado en la mañana-Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, 2oficiales y ayudantes.
Equipo y maquinaria: Herramienta menor
Actividad Obra: Se realiza instalacion de Subbase granular sobre la rasia en la calle 60, Se realiza Demolicion sobre la calle 59.

Asistente obra | Inspector obra | Residente obra

Viernes 30 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor, mini cargador
Actividad de Obra: Se realiza localizacion y Replanteo Se realiza Compactacion de Subbase granular sobre la rasia en la calle 60. Se realiza Excavacion Sobre la calle 59, Se realiza retiro de escombros. Se le recomienda al contratista suspender bien los niveles en la calle 59, para evitar problemas con la comunidad.

Inspector obra | Asistente obra | Residente obra

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

LOCALIDAD LA CONCORDIA
BARRIO LA VICTORIA

CONTRATO DE OBRA Nº 417 DE 2022
PLAZO : 4 MESES
INICIO DE OBRA : MARZO 16 DE 2023
FIN DE OBRA : JULIO 15 DE 2023

CONTRATISTA : 7G7 SAS
DIRECTOR : ARQ. VICTOR MEJIA
RESIDENTE DE OBRA : ING. MONICA LILIANA QUINTERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 429 DE 2022
CONTRATISTA INTERVENTORIA IESAK SAS.
DIRECTOR : ING. VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE : ARQ. JUAN CARLOS VITOLA URZOLA
INSPECTOR DE OBRA : ING. YINI EDITH GARCIA
ARQ. CARLOS ANDRES HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. EDGAR BAYONA
AUXILIAR DE APOYO :

Viernes, 07 Julio 2023

Se inician actividades de cerramiento perimetral del área a intervenir, se inicia demolición con minicargador cat 236B y martillo Bobcat B-350 hidráulico.

Estado de tiempo: Soleado

Horario de trabajo: 7-12 / 1-5 pm

Personal: Director de obra, residente de obra, inspector 1 oficial, 1 ayudante, profesional SST, 1 operador equipo 1 brigadista, Inspector interventoría.

Maquinaria y equipo: Minicargador con martillo, herramienta menor.

Residente de obra

Residente Interventoría

Sábado, 08 Julio 2023

Estado del tiempo: Llovizna constante

Horario de trabajo: 7-12 pm

Personal: Director obra, residente obra, inspector obra, inspector interventoría, 1 oficial, 1 ayudante, 1 brigadista 1 operador maquinaria.

Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor.

Actividades de obra: Se realiza retiro de escombro producto de demoliciones. Se continúa instalación de cerramiento perimetral en área a intervenir.

Residente de obra

M. Interventoría D.

"ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

LOCALIDAD MUTIS
BARRIO MUTIS

CONTRATO DE OBRA N° 417 DE 2022
PLAZO : 4 MESES
INICIO DE OBRA : MARZO 16 DE 2023
FIN DE OBRA: JULIO 15 DE 2023

CONTRATISTA : 767 SAS
DIRECTOR DE OBRA : ING. JORGE H. PINZON
RESIDENTE DE OBRA : ING. MONICA LILIANA QUINTERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 429 DE 2022
CONTRATISTA INTERVENTORIA JESAK SAS
DIRECTOR : ING. VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE : ARQ. JUAN CARLOS VITOLA URZOLA
INSPECTOR DE OBRA : ING. YINI ZAYDITH GARCIA F.
ARQ. CARLOS ANDRES HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA: ING. EDGAR BAYONA
AUXILIAR DE APOYO : ARQ. ALEXANDER RAVELO.

Powered by CamScanner

Martes	30 de mayo 2023
	Estado del tiempo: Soleado
	Horario de trabajo: 7-12 1-5 PM
	Equipos y maquinaria: Herramienta menor, Minicargador, Volqueta
	Personal: 1 director de obra, 1 Inspector de obra, 2 oficial, 2 ayudante y operador, 1 Inspector de Interventoria, 1 UESA
	Actividades de obra
	Se realiza instalacion de bordo para conformacion del espacio publico, se realiza instalacion de bordo Calle 56 Cra 2W y 3W
	Mario Urrutia Inspector de obra — Residente obra — Interventoria — Interventoria
Miercoles	31 de mayo 2023
	Estado del tiempo: Soleado
	Horario de trabajo: 7-12 1-5 PM
	Equipos y maquinaria: Herramienta menor, Mo
	Personal: 1 Inspector de obra, 2 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector de Interventoria, 1 UESA Interventoria, 1 UESA de obra, 1 residente de Interventoria
	Actividades de obra:
	Se realiza excavacion para instalacion de bordillo, Calle 56 Cra 2W y 3W, Se realiza aseo del espacio publico y adoquin Cra 2W con Calle 56-59
	Mario Urrutia Inspector de obra — Residente — Interventoria
Jueves	01 de junio 2023
	Estado del tiempo: Soleado
	Horario de trabajo: 7-12 1-5 PM
	Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Minicargador
	Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Profesional UESA de obra, 2 oficial, 4 ayudantes, 1 Inspector de Interventoria, 1 residente de Interventoria, 2 Caladores trafico

Powered by CamScanner

	Actividades de obra
	Se realiza excavacion para instalacion bordillo y sardinel, Se realiza instalacion de adoquin. Se realiza traslado de material para punto de acopio, Se realiza instalacion sardinel y bordillo Calle 56 Cra 2W y 3W
	Mario Hernandez Inspector obra — Interventoria — Residente Obra — Interventoria
Viernes	02 de Junio Junio de 2023
	Estado de tiempo: Soleado
	Horario de trabajo: 7-12 1-5 PM
	Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Minicargador
	Personal: 1 residente de obra, 1 Inspector de obra, 2 oficial, 4 ayudantes, 1 operador, 2 Contadores trafico, 1 Inspector de interventoria, 1 residente de interventoria, 1 HSEQ de obra
	Actividades de obra
	Se realiza excavacion de bordillos, Se realiza instalacion de bordillo y sardinel, Se realiza traslado de material para punto de acopio Calle 56 Cra 2W y 3W. Se realiza inicio cerramiento de arboles Carrera calle 56-59
	Interventoria. — Mario Hernandez Inspector obra — Residente Obra — Interventoria
Sabado	03 de Junio de 2023
	Estado del tiempo: Soleado
	Horario de trabajo: 7-12
	Equipos y maquinaria: Herramienta menor, Minicargador
	Personal 1 Inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 2 contratados de trafico, 1 operador maquinaria, 1 HSEQ de obra, 1 residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria
	Actividades de obra
	Se realiza excavacion Para Conformacion del espacio publico
	Se realiza extendida de Sub base Calle 56 cra 2W y 3W
	Inspector — Mario Hernandez Inspector de obra — Res. Obra — Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes	5 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal: Residente de obra, Residente de interventoria, 2Oficiales, 3 ayudantes, inspector de obra, inspector de interventoria. Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio Publico Se realiza instalacion de vado Calle 56 Cra 2W Residente Obra — Residente interventoria — Inspector de obra
Martes	6 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal: Residente de obra, Residente de interventoria inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 ayudantes. Actividade de obra: Se realiza instalacion de espacio publico, Se realiza instalacion de franjas de ajuste, instalacion de bordillos para franja ambiental. Calle 56 cera 2W Residente Obra — Residente interventoria — Inspector obra
Miercoles	7 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta manor, vibro compactador Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio Publico, Se realiza Realce de pozos y cajas, Se realiza mantenimiento a espacio publico. Calle 56 cra 2W.

Powered by CamScanner

Jueves	8 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado mañana y lluvia tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor, vibrocompactador Personal: Residente de obra, Residente de interventoria Inspector de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales 3 ayudantes. Actividad de obra: Se realiza instalacion de espacio Publico, Se realiza instalacion de Subbase granular y compactacion mecanica con vibrocompactador, se realiza instalacion de sardinel sobre la calle 56 cra 2w Residente obra · Residente interventoria · Inspector obra
Viernes	9 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado mañana y Tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal: Residente de obra, Residente de interventoria Inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales 3 Ayudantes, Actividad de obra: Se realizan instalacion de cunetas de ajustes, se realiza instalacion de espacio publico, se realiza instalacion de Sardinel y instalacion de adoquin Prefabricado. Sobre la calle 56 Cra 2w. Residente obra · Inspector obra · Residente interventoria
Sabado	10 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 Equipo y maquinaria: Herramienta menor, mini cargador Personal: Residente de obra, Residente de interventoria Inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 ayuda

Powered by CamScanner

	Actividades de obra: Se realiza instalacion de espacio publico, Se realizo instalacion de bordillo en franja ambiental sobre la calle 56 cra 2W. Residente Obra / Inspector obra / Interventoria
lunes	12 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 a 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes Actividades de obra: No se realizo actividades por ser dia festivo. Inspector obra / Interventoria / Residente obra
Martes	13 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 a 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 ayudantes. Actividad de obra: Instalacion de bordillos, Se realizo instalacion de espacio publico. Se realizo realce de tapas Calle 56 entre 2W - 3W Inspector obra / Interventoria / Residente obra
Miercoles	14 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Vibro compactador

Powered by CamScanner

	Personal de obra: Residente de obra, Residente interventoria inspector de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes.
	Actividad de obra: Se realizo riego de Subbase granular Se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo instalacion de bordillos sobre la calle 56 entre carrera 2w-3w
	Inspector obra Residente Interventoria
Jueves	15 de Junio 2023
	Estado del tiempo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
	Horario de trabajo: Soleado en la mañana - tarde
	Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Vibrocompactador
	Personal de obra: Residente de interventoria, Residente de obra Inspector de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 operario de maquinaria.
	Actividad de obra: Se realizo retiro de escombro, Se realizo construccion de vados peatonales, Se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo limpieza en Senderos peatonales y espacio publico sobre la calle 56 con carrera 2w-3w. Se realizo retiro de material escombro.
	Inspector obra Residente Interventoria
Viernes	16 de Junio 2023
	Estado del tiempo: Soleado en la mañana - lluvia en la tarde
	Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
	Equipo y maquinaria: Herramienta Menor, Vibrocompactador
	Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Inspector de obra, Inspector de Interventoria 2 oficiales, 3 Ayudantes
	Actividad de obra: Se realizo retiro de escombros, Se realizo instalacion de Subbase granular, se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo

Powered by CamScanner

	realce de tapas y pozos de servicios publicos, se realizo Cintas de ajuste, se realizo limpieza y mantenimiento Senderos peatonales.
	R. Interventoria Residente obra Inspector obra
Sabado	17 de Junio 2023
	Estado del tiempo: Soleado en la mañana
	Horario de trabajo: 7:00 A 12:00
	Equipo y maquinaria: Herramienta menor
	Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspectora de obra, Inspector de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes.
	Actividad obra: Realce de tapas, Instalacion de espacio publico, limpieza de sendero peatonal.
	R. Interventoria Residente obra
Lunes	19 de Junio 2023
	No se realizaron actividades
	Inspector obra Residente obra R. Interventoria
Martes	20 de Junio 2023
	Estado del tiempo. Soleado en la mañana - tarde
	Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
	Equipo y maquinaria: Herramienta menor
	Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, 2 oficiales 3 Ayudante
	Actividad de obra: Se realizo instalacion de Sardinal, Se realizo instalacion de espacio Publico
	R. Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles	21 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Vibrocompactador Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, 2 oficiales, 3 Ayudantes, inspector de obras. Actividad de obra: se realizo instalacion de espacio publico, se realizo mantenimiento de espacio peatonal, se realizo instalacion de subbase granular, y compactacion de subbase. Inspector obra — Residente obra — R. Interventoria
Jueves	22 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - lluvia tarde Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, 2 oficiales, 2 ayudantes, inspector de obra. Actividad de obra: Se realizo instalacion de subbase granular, Se realizo instalacion de espacio publico, Se realizo instalacion de sardinel. Inspector obra — Residente obra — R. Interventoria
Viernes	23 de Junio 2023 Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm Equipo y maquinaria: Herramienta menor Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes, inspector de obra Actividad de obra: Se realizo instalacion espacio publico Se realizo ensayo de densidades, Inspector obra — Residente obra — R. Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado 24 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00
Equipo y maquinaria: Herramienta menor
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Actividad en obra: Instalacion de espacio Publico, Realce de pozos.

Inspector obra Residente obra R. Interventoria.

Lunes 26 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Equipo y maquinaria: Herramienta menor.
Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 HSEQ en obra.
Actividad en obra: Se realizo instalacion y cintas de ajuste calle 56 # 2w - 3w, se realizo Cerramiento y senderos peatonales.

R. Interventoria Inspector obra Residente obra

Martes 27 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - tarde
Horario de trabajo: 7:00 A 12:00 y 1:00 A 5:00 pm
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, mini cargador
Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra 2 oficiales, 3 Ayudantes, operador maquinaria, 2 auxiliares
Actividad en obra: Se realizo Demolicion de placas en concreto y Sardinel sobre la carrera 2w #56, llegada de Sardinel, Arena gruesa y Subbase.

R. Interventoria Res obra

Powered by CamScanner

Miercoles 28 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5.00pm
Personal en obra: Residente obra, inspector obra, 2 OF. civiles, 3 ayudantes, operador maquinaria, 2 trafico
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Mini cargador
Actividad en obra: Se realizo demolicion de placas en concreto y Sardinel.

R. Interventoria — Inspector civ — Residente obra

Jueves 29 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00pm
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, mini cargador
Actividad en obra: Se realizo excavacion y instalacion de Sardinel Sobre la calle 56 # 24, Se realizo Mantenimiento a Senderos peatonales y retiro de escombros, Se realiza trasiego de material con el minicargador.

Director Obra — R. Interventoria — Resid. Obra

Viernes 30 de Junio 2023
Estado del tiempo: Soleado en la mañana - Tarde
Horario de trabajo: 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00 pm
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, Minicargador
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra 2 oficiales, 3 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, 1 HSEQ
Actividad en Obra: Se realizo instalacion de Sardinel, Se realizo trasiego de material, se realizo mantenimiento en sendero peatonal, Se realizo excavacion de bordillos.

R. Interventoria — Inspector obra — Res. Obra

Powered by CamScanner

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

LOCALIDAD CIUDADELA
BARRIO REAL DE MINAS

CONTRATO DE OBRA Nº 417 DE 2022
PLAZO : 4 MESES
INICIO DE OBRA : MARZO 16 DE 2023
FIN DE OBRA : JULIO 15 DE 2023

CONTRATISTA : 757 SAS
DIRECTOR DE OBRA : ING JORGE H. PINZON
RESIDENTE DE OBRA : ING. MONICA LILIANA QUINTERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 429 DE 2022
CONTRATISTA INTERVENTORIA JESSK SAS
DIRECTOR : ING. VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE : ARQ. JUAN CARLOS VITOLA HERZOG
INSPECTOR DE OBRA : ING YINI ZAIDITH GARCIA F.
ARQ. CARLOS ANDRES HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA : ING EDGAR BAYONA
AUXILIAR DE APOYO : ARQ. ALEXANDER ROJELO

2023
BUCARAMANGA - SANTANDER

Equipos y maquinaria Herramienta menor, 1 planta electrica
1 Rilidora 1 minicargador, 1 volqueta
Actividades de obra
Se inicia con la excavacion para instalación del bordillo para confinamiento entre el espacio público y la cerca viva de sunglia se inicia hasta el dia de hoy ya que hasta el dia de ayer se definio con el subsecretario de infraestructura, interventoria y la administracion del conjunto san remo como se iba a proceder respecto a la cerca viva de sunglia, la cual nos genero retrasos en la ejecución, se inicia instalación de espacio público Se le vuelve a solicitar al contratista la intervencion del separador, ya que no se esta interviniendo en un 100%, ademas la secretaria de infraestructura, esta presionando, para que se intervenga lo mas pronto posible, esto zona, para evitar conflicto con la comunidad. La linea amarilla va por todo el borde del sardinel y del contenedor de raices, de acuerdo a la instruccion dada la secretaria de infraestructura de acuerdo al POT y al perfil vial.
El contratista tiene via libre para empezar el otro tramo Hacia la calle 61, se le solicita mayor rendimiento al subcontratista porque va muy lento, y se requiere andar con mas rapidez las actividades, que se urgen ejecutando. Se realiza retiro de escombros

R. Interventoria

Residente obra

Jueves 1 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia Nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 supervisor de obra, 2 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 Director de obra, 1 operador de minicargador 1 controlador de trafico
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica

1 pulidora, 1 mini cargador, 1 volqueta
Actividades de obra
Se continua con la instalación de espacio público, instalación de sardinel, se realiza retiro de escombros
Se le solicita al contratista que la huseta quede bien alineada a la hora de instalarla, se puede apreciar algunas curvas y desniveles en el espacio público que ya se lleva instalado hasta el momento.

R. Interventoría

Residente Obra

Viernes

2 de Junio del 2023
Estado del clima: Día nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspecta de obra, 1 inspector de interventoría, 1 supervisor de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 Residente de interventoría, 1 HSEQ de obra.
Equipos y maquinarias: Herramienta menor, 1 planta eléctrica 1 pulidora
Actividades de obra
se continua con la instalación de espacio público: instalación de sardinel, se continua con la demolición de sunglia y sardinel del separador ubicado en san remo 1 y san remo 2. Llegada de espacio publico, se realiza excavación para instalación de bordillo junto a la cacu viva de sunglia

R. Interventoría

Residente obra

Sábado

3 de Junio del 2023
Estado del clima Día Soleado
Personal 1 Residente de obra, 1 inspector de obra 1 inspector de interventoría 1 oficial, 1 ayudante, 1 HSEQ de obra 1 maestro de obra.
Equipos y maquinaria Herramienta menor

Actividades de obra
Se continua con la instalacion de espacio público
Se le solicita mas personal en el frente de obra ya que los rendimientos no son los mas optimos, se requiere corregir la junta de la bordillos de la contrapendiente de pisos, lo mas pronto posible, ya que los tiempos estan avanzando, generando retrasos
No hay suficiente personal en OBRA, el DIA DE HOY
Se espera que el DIA LUNES, entre mas personal para poder continuar y recuperar los tiempos atrasados.

R. Residente obra

Residente obra

Lunes
5 de Junio del 2023
Estado del clima: Día nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 controlador de tráfico.
Actividades de obra.
Se continua con la instalacion del espacio público, se inicia la instalacion de bordillo para confinamiento, se inica la instalacion de la cinta de ajuste con el predio, llegada de sardinel, se funde rampa de acceso peatonal.
Equipos y maquinaria: Herramienta menor.

R. Interventoria

Residente obra

Maites
6 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra
Equipos y maquinaria: Herramienta menor
Actividades de obra.
Se continuo con la instalacion de bordillo para confinamiento

continua con la cinta de ajuste al predio, se continua con la instalación de sardinel

R. Interventoría

Residente obra

Miercoles 7 de Junio del 2023

Estado del clima: Dia nublado Lluvias (7:30 - 8:00)

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 HSEQ de obra 1 Residente de interventoria, 1 HSEQ de interventoria.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la instalación de bordillo de confinamiento, se reajusta la excavación para los contenedores de los árboles, se instalan bordillos para contenedores.

R. Interventoría

Residente obra

Jueves 8 de Junio del 2023

Estado del clima: Dia soleado Fuertes Lluvias (3:30 - 5:00 pm)

Personal 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora

Actividades de obra

Se continua con la instalación de espacio público, se continua con la instalación de bordillos para contenedores

R. Interventoría

Residente obra

Viernes 9 de Junio del 2023

Estado del clima: Día soleado
Personal: Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramiento menor, 1 planta eléctrica, 1 pulidora
Actividades de obra.
Se continua con la instalación de espacio público y la instalación de bordillos para contenedores.

Residente Obra

Sábado 10 de Junio del 2023
Estado del clima: Día soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrico, 1 pulidora
Actividades de obra
Se continua con la instalación de espacio público y la instalación de bordillos para contenedores
El contratista del contrato 414 esta INTERVINIENDO el separador frente SAN REMO 1 y SAN REMO 2, Y AUN NO HAN TERMINADO, MOTIVO por el cual al contratista 767 SAS NO HA PODIDO INTERVENIR ESTE AREA ESPERANDO QUE TERMINE el contratista del alumbrado publico, para ellos INGRESAR.

Residente Obra

Lunes

12 de Junio del 2023
Estado del clima: Día soleado
Personal 1 maestro de obra, 3 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 Pulidora.
Actividades de obra
Se continua con la instalación del espacio público, se realiza la cinta de ajuste con el predro, se realiza el realce de las tapas de las luminarias.

R. INTERVENTORÍA

Martes

13 de Junio del 2023
Estado del clima: Día soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Director de obra, 1 Inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 Operador de minicargador
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 minicargador
Actividades de obra
Se continua con la excavación para la instalación de bordillo de confinamiento, instalación de bordillo de confinamiento
Interventoría no autoriza la apertura del frente que el contratista tiene pensado abrir hasta que se realicen todas las adecuaciones a las cajas de servicios públicos, las cintas de ajuste queden terminadas, el sellado del espacio público quede bien y por último hasta que no se realice aseo y limpieza en el frente. Se le indica al contratista que debe instalar tapeol para darle continuidad a la guía con el anden anterior. Llegada de espacio publico.

INSP. INTERVENTORÍA

R. INTERVENTORÍA

Miercoles 14 de Junio del 2023

Estado del clima: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la excavación para instalación de bordillo de confinamiento, Se realiza limpieza general, se rellenan los contenedores a nivel, instalación de bordillo para confinamiento

Jueves 15 de Junio del 2023

Estado del clima: Día soleado

Personal: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la excavación para instalación de bordillo de confinamiento, la excavación para contenedores, con la instalación instalación de bordillos en los contenedores

Viernes 16 de Junio del 2023

Estado del clima: Día soleado

Personal: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 operador de minicargador 1 social de obra.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora, 1 minicargador, 1 volqueta.
Actividades de obra
Se continua con la instalación de bordillo de confinamiento, instalacion de bordillo para contenedores, relleno y compactacion de subbase granular, se realiza el cerramiento y sendero peatonal para la fase 2 del frente real de minas, se inicia con la demolicion del sardinel y el anden, se realiza el retiro de escombros.

Sábado
17 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 Director de obra, 1 Residente de interventoria, 1 HSEQ de obra, 1 Social de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 operador de minicargador.
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora, 1 minicargador, Volqueta
Actividades de obra
Se continua con la instalacion de bordillo para contenedores, se continua con el relleno y compactacion de subbase granular, se realiza retiro de escombros

Residente obra

Lunes
19 de Junio del 2023
No se realizaron actividades

Martes
20 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia soleado
Personal: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de

obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 HSEQ de obra, 1 HSEQ de interventoria, 1 operador de minicargador
Equipos y maquinaria: Herramiento menor, 1 minicargador, Volqueta, 1 vibro
Actividades de obra
Se continua con el relleno y compactacion de subbase granular, con la excavacion para instalacion de bordillo de confinamiento, se inicia la excavación para instalación de sardinel en la fase dos de real de minas. llegada de sardinel. se realizo retiro de escombros, instalacion de espacio público

Interventoria Residente obra

Miercoles 21 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor
Actividades de obra
se continua con la instalación de espacio público, con la excavación para instalación de bordillo de confinamiento, con la excavación para instalacion de sardinel en la fase dos.

Interventoria Residente obra

Jueves 22 de Junio del 2022
Estado del clima: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor
Actividades de obra

Se continua con la cinta de ajuste con el predio, se continua con la excavacion para instalacion de sardinel y se inicia con la instalacion de sardinel en la fase dos. llegada de sardinel

R. Interventoras. Residente obra

Viernes

23 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspectora de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora
Actividades de obra
Se continua con la excavacion para la instalacion de sardinel, con la instalacion de sardinel con la excavación para la instalacion de bordillo contenedor. se realiza el realce de caja para servicios públicos. llegada de bordillo para contenedores y espacio publico.

R. Interventoras. Residente obra

Sábado

24 de Junio del 2023
Estado del clima: Dia Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria.
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 pulidora
Actividades de obra
Se continua con la excavación para instalacion de sardinel

también con la instalación de sardinel en la fase dos se realiza la instalación de bordillo contenedor. Llegada de subbase granular. Se la solicita al contratista denuncian con la cumbre la nueva modificación que hay que realizar para la definición del acceso vehicular al conjunto residencial SAN REMO 2 y SAN REMO 1, para la ejecución del pompeyano y las zonas verdes que propone el ING. EDGAR BAYONA suspensión del contrato, en este sector de la cra 8 entre calle 61 y 64.
En las horas de la noche anterior, se presentaron lluvias pero que no afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas por el contratista.

Interventoría Residente Obra

Lunes 26 de Junio del 2023
Estado del clima: Día soleado Lluvias (1:00 - 3:00)
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 rana
Actividades de obra
Se continua con la excavación para instalación de sardinel, con la instalación de sardinel, con la instalación de espacio público, llegada de arena

Interventoría Residente Obra

Martes 27 de Junio del 2023
Estado del clima: Día soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 HSEQ de interventoría, 1 sonsor de obra
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica

1 taladro demoledor

Actividades de obra

Se continua con la instalacion de la cinta de ajuste con el predio, con la instalacion de sardinel, se realza la tapa del sumidero

R. Interventoria

Residente obra

Miércoles 28 de Junio del 2023

Estado del clima: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la instalación de sardinel, se inicia la excavación para la instalacion de bordillo de confinamiento se continua con la cinta de ajuste de la vía con el sardinel, se inicia con la instalación del bordillo de confinamiento en la fase 2, se hace entrega parcial de la fase 1 con la autorización de la interventoria.

R. Interventoria

Residente obra

Jueves 29 de Junio del 2023

Estado del clima: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la excavacion para instalacion de bordillo de confinamiento, se instalan los bordillos de confinamiento conforme a las especificaciones técnicas de proyecto en el

ítem 7.1 Aseo y limpieza; indica que las áreas que lo requieran deberán ser lavadas, así mismo como el barrido y limpieza de las áreas ocupadas temporalmente en la obra, con el fin de entregarlas con un aseo nítido según especificaciones técnicas. Por esta razón hasta que el contratista no realice dicha actividad no se le aprobará y no se les tendrá en cuenta para recibo parcial.

INSP. INTERVENTORIA.

R. Interventoria.

Residente Obra

TENIENDO EN CUENTA QUE SE ABRIO Y SE PUSO EN SERVICIO EL SUDEN TERMINADO, SE SOLICITO AL CONTRATISTA RETIRAR LO MAS BREVE POSIBLE EL MATERIAL SOBRANTE DE OBRA PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y MATERIAL DESECHABLE.

Llegada de soldinel y bordillo.

R. Interventoria.

Viernes 30 de Junio del 2023

Estado del clima: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Director de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria

Equipos y maquinaria: Herramienta menor.

Actividades de obra

Se continua con la excavación para instalacion de bordillo de confinamiento con la instalación de bordillo de confinamiento se inicia con el replanteo y excavación del terreno, tambien con la excavación para instalación de bordillas para contenedores

Residente Obra

R. Interventoria

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER.

LOCALIDAD CIUDADELA
BARRIO LOS SAUCES

CONTRATO DE OBRA N° 417 DE 2022
PLAZO: 4 MESES
INICIO DE OBRA: MARZO 16 DE 2023
FIN DE OBRA: JULIO 15 DE 2023

CONTRATISTA: 7G7 SAS
DIRECTOR DE OBRA: ING. JORGE H. PINZON
RESIDENTE DE OBRA: ING. MONICA LILIANA QUINTERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 429 DE 2022
CONTRATISTA INTERVENTORIA JESAR SAS.
DIRECTOR: ING. VLADIMIR POLO PAZ
RESIDENTE: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA URZOLA
INSPECTOR DE OBRA: ING YINI ZOYDITH GARCIA F.
ARQ. CARLOS ANDRES HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA: ING. EDGAR BAYONA
AUXILIAR DE APOYO: ARQ. ALEXANDER RAVELO

2023.

Personal 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 1 ayudante de obra, 2 controladores de trafico, 1 Operador de minicargador, 1 social de obra, 1 HSEQ de interventoria.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica 1 pulidora.

Actividades de obra.

Finalización de cinta de ajuste con el predio, instalacion de sardinel faltante, retiro de escombros y aseo y limpieza general. Retiro de cerramiento y señalizacion, abertura del frente.

Se le solicita al contratista ir entregando todos los frentes terminados en espacio publico, y dar servicio a la mayor brevedad a la poblacion flotante para su circulacion y protección del parque automotor.

Se debe revisar el presupuesto real y estimado, para tener mejor control financiero, y saber que falta pendiente queda para ver si se puede seguir gestionando mas recursos propios por parte de la entidad contratante.

Interventoria

Residente Obra

Jueves 1 de junio del 2023

Estado del tiempo: Dia nublado

Personal: 1 Residente obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 1 ayudante de obra

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 Rana

Actividades de obra

Finalizacion instalacion de sardinel, instalacion de cinta de ajuste del sardinel con la via, relleno y compactacion de subbase en el area de la curva con direccion al barco naranjos, se deja señalizada el area mencionada con

Obstrucciones.

V. Residente de obra. Residente obra

Viernes 2 de junio del 2023

Estado del tiempo: Dia nublado

Personal 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra

Equipos y maquinaria: Herramienta menor.

Actividades de obra.

Se da inicio a la parte dos, con la realizacion del cerramiento con lona verde y malla de proteccion, se instala el sendero peatonal con cinta peligro y cinta reflectiva, se inicia la demolicion manual de la placa del anden.

V. Residente obra Residente obra

Sabado 3 de junio del 2023

Estado del tiempo Dia soleado

Personal 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 1 ayudante de obra, 1 Director de obra.

Equipos y maquinaria Herramienta menor

Actividades de obra.

Se continua con la demolicion manual de la placa del anden

Residente obra Residente obra

Lunes 5 de junio del 2023

Estado del tiempo: Dia nublado

Personal 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 oficial

de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 operador minicargador.
Equipos y maquinaria. Herramienta menor, 1 minicargador, 1 volqueta
Actividades de obra
Demolicion de sardinel y placa de anden, llegada de sardinel, se realiza retiro de escombros, se inicia excavacion para instalacion de sardinel

R. Interventoria | Residente Obra

Martes | 6 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Día nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 HSEQ de obra
Equipos y herramientas; maquinaria Herramienta menor, 1 minicargador, 1 volqueta
Actividades de obra
Se continua con la excavacion para instalacion de sardinel, se realiza retiro de escombros.

R. Interventoria | Residente Obra

Miercoles | 7 de junio del 2023
Estado del tiempo: Día nublado lluvias (9:30 - 2:00)
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 Residente de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor
Actividades de obra
Se continua con la excavacion para instalacion de sardinel

R. Interventoria | Residente Obra

Jueves

8 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado Jueves Viernes (7:30 - 5:00 p.m.)

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 operador de minicargador

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 minicargador 1 volqueta

Actividades de obra

Se termina la excavacion para instalacrón de sardinel, se inicia la instalacrón de sardinel, se realiza retiro de escombros

Residente obra

Viernes

9 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Director de obra, 1 inspector de obra, 1 Inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 social de interventoria, 1 social de obra

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la instalacrón de sardinel, se inicia con la instalacrón de cinta de ajuste de sardinel con la vía, llegada de sardinel y bordillo

Se realiza reunión de seguimiento con vecinos ciudadanos del Frente Sauces en compañía del area tecnica y social del contratista e interventoria donde se muestran los avances de obra, se hace una entrega parcial de la fase 1 dando recomendaciones del cuidado para su preservación, ademas se recibe por parte de los participantes de la reunion algunas observaciones respecto a la tobería visual y lisa que tiene algunos [illegible] se

Contratista que no haga parte de las garantías ya que a la falta no se le realizará entrega parcial a la interventoría.

Prof Social Interventoría Profesional Social 767

Se le solicita al contratista realizar el sellado de la loseta del espacio público ya que se observa que en algunas partes ésta no quedó bien sellada, además se le solicita que arreglen algunas fisuras que se presentan tanto en la loseta como en los contenedores.

INSP. INTERVENTORÍA. R. INTERVENTORÍA

Residente Obra

Sábado 10 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra.

Se continua con la instalación de sardinel, la instalación de la cinta de ajuste del sardinel con la vía, se inicia la excavación para la instalación de bordillos contenedores.

SE DEJA LA OBSERVACION QUE ANTES DE IMPLEMENTAR EL ESPACIO PUBLICO, SE DEBE TENER LA APROBACION DE LA INTERVENTORIA, CON RELACION AL TEMA DE LOS JARDINERAS SE DEBE TENER UN DISEÑO PREVIAMENTE APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA SU EJECUCION EN SITIO, DE NO TENER LA APROBACION NO SE TENDRA EN CUENTA PARA SU PAGO EN EL CORTE DE OBRA; ANTE ESTA SITUACION SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL ESQUEMA O GRAFICO PARA SU APROBACION ANTES DE SU EJECUCION.

Residente Obra R. Interventoría

Lunes	12 de Junio del 2023 No se realizaron actividades.
Martes	13 de Junio del 2023 Estado del tiempo: Día soleado Personal: 1 Residente de obra, 1 Director de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico. Equipos y maquinaria: Herramienta menor 1 planta eléctrica, 1 pulidora Actividades de obra Se finaliza la instalación de sardinel, se continua con la excavación para los contenedores, se inicia instalación de bordillo para contenedores. Residente obra — R. Interventoría
Miercoles	14 de Junio del 2023 Estado del tiempo: Día soleado Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 controlador de tráfico, 1 HSEQ de obra, 1 HSEQ de interventoría Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 pulidora. Actividades de obra Se continua con la excavación para los contenedores y con la instalación de bordillo para contenedores. Residente Obra — R. Interventoría
Jueves	15 de Junio del 2023 Estado del tiempo: Día soleado Personal: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector

de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 HSEQ de obra

Equipos y maquinaria Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 pulidora

Actividades de obra

Se continua con la excavación para los contenedores y con la instalación de bordillos para contenedores. Se realiza el replanteo para instalación de subbase. llegada de bordillos para contenedores.

Residente obra

Inspector

Viernes 16 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 4 ayudantes de obra, 1 HSEQ de obra.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la excavación para los contenedores, con la instalación de bordillos para contenedores, se inicia con el relleno y compactacion de subbase granular. Llegada de subbase granular.

Residente obra

Inspector

Sábado 17 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 4 ayudantes de obra, 1 HSEQ de obra

Equipos y maquinaria: Herramienta menor

Actividades de obra

Se continua con la excavación para los contenedores, con la

instalacion de bordillos para contenedores, se continua con la relleno y compactacion de subbase granular.

R. Interventoria Residente obra

Jueves
16 de Junio del 2023
No se realizaron actividades.

R. Interventoria

Martes
20 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra. 1 HSEQ de Interventoria
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica, 1 Rana 1 pulidora
Actividades de obra.
Se continua con el relleno y compactacrón de subbase granular, con la instalacrón de bordillo para contenedores, llegada de espacio público y bordillo para contenedores.

R. Interventoria.

Residente obra

Miercoles
21 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria.
Equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrico, 1 pulidora,
Actividades de obra
Se continua con el relleno y compactacrón de subbase granular, con la instalacion de bordillo para contenedores. se inicia con la instalacrón de espacio público
Se le solicita al contratista la toma de densidades de la

subbase granular, el dia de hoy se inició con la actividad de la instalación de espacio público y a la fecha no se han tomado las densidades. INSP. INTERVENTORIA.
Interventoria suspende la actividad de instalación de espacio público ya que el contratista el dia de hoy no realizó los ensayos de densidades, una vez se realicen las densidades podrán continuar con la instalación del espacio público. INSP. INTERVENTORIA.

Residente obra

Jueves 22 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria, 1 controlador de tráfico

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 rano, 1 planta electrica 1 pulidora.

Actividades de obra.

Se continua con la instalación de bordillo contenedor, con relleno y compactacion de subbase granular, se realizan densidades de campo, llegada de arena, se presento fuente [illegible] de la tarde - 4 a 6 P.M.

Residente obra

Viernes 23 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 Rano

Actividades de obra

Se continua con la colocacion de la losetas del espacio

público, el contratista se compromete a terminar este frente la próxima semana, quedando pendiente hacer el pompeyano en el acceso al conjunto residencial los sauces.-
Se continua con el relleno y compactación de subbase granular.

Residente

Interventoría

Pendiente

Sábado 24 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 4 ayudantes de obra. 1 controlador de tráfico, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria, 1 Residente de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 pulidora, 1 planta electrica.
Actividades de obra.
Se continua con la instalación de espacio público, y con el relleno y compactación de subbase granular. En la zona # 2 del frente, se deja la observación que toco hacer JARDINERAS DOBLES, TRIPLES, porque los ARBOLES estaban muy PEGADO UNOS A OTROS, HACIENDO QUE el ESPACIO PUBLICO SE VIERA MUY AJUSTADO, TENIENDO EN CUENTA QUE HAY UNA DIRECTRIZ, DE SALVAR CUALQUIER TIPO DE ARBOL DE SU TALA y BUSCAR la MEJOR SOLUCION en el SITIO del FRENTE, BUSCANDO la ARMONIA, BIENESTAR y VISUAL-POSIBLE.

Residente

Interventoría

Pendiente

Lunes 26 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia nublado Nubes (1.00 - 3.00)

Personal 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de obra, 1 HSEQ de interventoria, 1 social de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra

Equipos y maquinaria Herramienta menor, 1 rana

Actividades de obra

Se continua con la instalación de espacio público, con el relleno y compactación de la subbase.

Residente interventoria.

Residente obra

Martes 27 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 HSEQ de interventoria

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora

Actividades de obra

Se continua con la instalación de espacio público y se inicia con la cinta de ajuste con el predio

Residente interventoria

Residente obra

Miercoles 28 de Junio del 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 ayudantes de obra, 1 HSEQ de interventoria, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria.

Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta eléctrica 1 pulidora

Actividades de obra

Se continua con la instalación de espacio público y se continua con la cinta de ajuste. con el predio

Jueves

29 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra. 1 maestro de obra. 2 oficiales de obra. 2 ayudantes de obra. 1 inspector de interventoria, 1 HSEQ de interventoria.
Equipos y maquinaria: Herramienta menor. 1 planta electrica
1 Pulidora
Actividades de obra
Se continua con la instalación de espacio público y con la cinta de ajuste con el predio.

Interventoria

Residente Obra

Viernes

30 de Junio del 2023
Estado del tiempo: Dia soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Director de obra, 1 inspector de obra, 1 HSEQ de obra, 1 maestro de obra. 2 oficiales de obra, 1 inspector de interventoria
Equipos y maquinaria: Herramienta menor, 1 planta electrica, 1 pulidora
Actividades de obra
Se continua con la instalación de espacio público y con la cinta de ajuste con el predio, se demuele tapa de pozo
SE CONTINUA COGIENDO LOS DETALLES DEL ESPACIO PUBLICO COLOCADO EN EL ANDEN QUE SE VIENE INTERVINIENDO. ESTA PENDIENTE POR EJECUTAR EL VADO AL LADO DE LA CURVA FRENTE A LA GLORIETA, SE RECUERDA QUE LOS VADOS DEBEN TENDERSE EN CUANTO PERMITA LA NORMAL CIRCULACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN SILLAS DE RUEDA, EN TODOS LOS FRENTES DE OBRA.

Interventoria

Residente Obra

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				
				PAGINA ____1_____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	8	**Periodo:**	29 AL 03 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				





Localización:	CARRERA 2W ENTRE CARRERAS 56-59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	EXCAVACION E INSTALACION DE BORDILLOS DE 10





Localización:	CARRERA 2W ENTRE CARRERAS 56-59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	EXCAVACION E INSTALACION DE SARDINEL





Localización:	CARRERA 2W ENTRE CARRERAS 56-59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	INSTALACION DE ESPACIO PUBLICO





Localización:	CARRERA 2W ENTRE CARRERAS 56-59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	INSTALACION DE ADOQUIN Y APERTURA DEL TRAMO PARA TRAFICO PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ___1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	8	**Periodo:**	DEL 29 AL 03 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**	417 DE 2022		
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**	429 DE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

2



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO)

3



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

4



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO)

5



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

6



Localización:	CRA 2W ENTRE CALLES 56 Y 59 COSTADO OCCIDENTE.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO)

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ___1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	4	**Periodo:**	DEL 05 AL 10 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	INSTALACIÓN DE LOSETA PARA ESPACIO PÚBLICO.

2



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CINTA DE AJUSTE AL PREDIO.

3



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CONFORMACIÓN DE JARDINERA.

4



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	FUNDIDA DE RAMPA PEATONAL.

5



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CINTA DE AJUSTE AL PREDIO.

6



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO.

7



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	CONTENEDORES DE RAÍCES.

8



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 REAL DE MINAS
Descripción:	CINTA DE AJUSTE AL PREDIO.

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	4	**Periodo:**	DEL 05 AL 10 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

2



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

3



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

4



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

5



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

6



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

7



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

8



Localización:	REAL DE MINAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	6	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

2



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	EXCAVACIÓN PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN JARDINERA.

3



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	INSTALACIÓN DE LOSETA PARA ESPACIO PÚBLICO.

4



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	RETIRO DE ESCOMBROS PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN.

5



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	INSTALACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

6



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	EXCAVACIÓN PARA SARDINEL.

7



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CINTA DE AJUSTE AL PREDIO.

8



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO.

9



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	REALCE DE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

10



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO.

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	6	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**	417 DE 2022		
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**	429 DE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

2



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

3



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

4



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

5



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

6



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	6	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

7



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

8



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

9



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

10



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

11



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO).

12



Localización:	CARRERA 8 ENTRE CALLES 61 Y 64 COSTADO SUR, REAL DE MINAS.
Descripción:	FOTO DEL DESPUÉS (DESDE UN MISMO PUNTO).

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	7	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

2



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CONTENEDORES.

3



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CONTENEDORES.

4



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	ENSAYO DE DENSIDADES A SUBBASE GRANULAR.

5



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	INSTLACIÓN DE LOSETA PARA ESPACIO PÚBLICO.

6



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			PAGINA ___1____	DE: ____1_____
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	7	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

1



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

2



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

3



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

4



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

5



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

6



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	7	**Periodo:**	DEL 20 AL 24 DE JUNIO
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S	**CTO. OBRA No.**		417 DE 2022	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				

7



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

8



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

9



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

10



Localización:	CALLE 63A ENTRE CARRERAS 1 Y 3 COSTADO NORTE, LOS SAUCES.
Descripción:	FOTO DEL ANTES (DESDE UN MISMO PUNTO)

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: JUNIO 1/2023

- COMPROMISOS ANTERIORES"
- SE RADICÓ EL ARCHIVO EN PDF DE LOS ACTAS DE VECINDAD SOLICITADAS
- A PARTIR DE HOY SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE CARGAS DE LA PROFESIONAL SOCIAL AL 100%.
- ESTE DOCUMENTO VA EN EL INFORME CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO/23 (FORMATO DEL CUADRO DEL PAGO SALARIAL)
- SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PMT APROBADO Y SU RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN.

- COMPONENTE SOCIAL

1. SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS REUNIONES DE LAS SOCIALIZACIONES DE INICIOS (LA VICTORIA Y PUERTA DEL SOL)
2. ESTÁN PENDIENTES POR EJECUTAR LOS ACTOS DE VECINDAD EN ESTOS FRENTES DE OBRAS.
3. SE SOCIALIZA CON LA COMUNIDAD DE REAL DE MINAS, EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN DE SUNGA Y LA MODIFICACIÓN DEL ACCESO A LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LOS RESALTAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR.
4. SE HACE UNA GESTIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DEL NO RETIRO DE LA SUNGA FRENTE A LA FACHADA DEL CONJUNTO ANTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL CUAL CONLLEVÓ A UNA VISITA DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EL DÍA 30 DE MAYO, DONDE SE FIRMA UN ACTA DE

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: JUNIO 1/2023

'DE COMPROMISO DONDE LOS INDIVIDUO DE SUNGLA NO SE VAN A TALAR Y EN DONDE LA COMUNIDAD REALIZARA LA PODA DE TAL MANERA QUE EL AREA LIBRE SEA DE 2.00 MTS, PARA CUMPLIR LA NORMA DEL POT.

5. PENDIENTE POR LA ENTREGA DEL INFORME SOCIAL MENSUAL NO 3 Y ARCHIVO EN PDF DE LAS ACTAS DE VECINDAD.

← COMPONENTE HSEQ.

1. SE DIO VISTO BUENO DE LAS ACTUALIZACIONES DEL MAO Y FUE ENTREGADO AL AREA AMBIENTAL DE LA ALCALDIA PARA SU REVISION.
2. SE REALIZA VISITA DE CDMB, EL DIA 30 MAYO, SE REALIZA INSPECCION TECNICA PARA LA REVISION DE LAS ESPECIES ARBORIA Y DE LOS INDIVIDUOS DE SUNGLA EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA.
3. PENDIENTE DE LA ENTREGA DEL INFORME Y DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTE.
4. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE SE MEJORE LA IMPLEMENTACION DEL PMT Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PUNTO DE EMERGENCIA, PUNTO ECOLOGICO, LA DOTACION DE BOTIQUINES EN LOS NUEVOS FRENTES A INTERVENIR.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: JUNIO 1/2023

5. Se solicita el certificado de la cantidad de material suministrado por la cantera CHICAMOCHA.

- COMPONENTE TECNICO.

1. FRENTE REAL DE MINAS
El contratista se compromete a entregar totalmente despejado el separador del acceso para la proxima semana teniendo en cuenta que el contratista va ingresar mas personal operativo para este frente, para poder avanzar lo mas posible en la programacion.
Actualmente se trabaja en colocacion de bordillos, losetas lisas, losetas guias y tabletas amarillas.
El contratista informa que da inicio al tramo de la calle 64 el dia 7 de junio/2023.

2. LOS SAUCES.
Se recibe a satisfaccion el tramo intervenido por parte del contratista, y queda pendiente por la continuacion del proximo tramo y el pompeyano.

3. MOTIS.
- Se le solicita que se debe abrir el frente terminado en la cra 2W con el fin de que la poblacion flotante circule por los andenes y asi evitan problemas sociales con los comerciantes del sector proximo a intervenir

FECHA: Junio 1/2023

- El contratista se compromete entregar el tramo de la calle 56 entre 2W y 3W el día 13 de junio, completamente terminado.

4. Estoraque.

El contratista se compromete entregar completamente terminado el frente de la calle 60 entre la cra 46 y 48 para el día 10 junio/2023, quedando pendiente los frentes de la calle 59, 59B y adicion.-

5. La Victoria

El día 5 de junio/2023 se da apertura al inicio del frente de obra, por parte del contratista.
Se le informa al contratista tener claro presupuesto, esquemas, balance puntual de obra, PMT y señalizaciones.

6. Diamante II

El contratista informa que da inicio el día 12 de junio/2023, en este frente de obra, con todos los documentos anteriormente solicitado mencionados.

El día 31 de Mayo, se realizo recorrido de obras con el Ing. Edgar Reyna, a los barrios Condoncillo 1, Nueva Granada y la Libertad, el contratista debera hacer el estudio y balance financiero, de este frente para su posterior solucion.-

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Entrega del informe mensual social y archivo en PDF de actas de vecindad.	Contratista 767. S.A.S	05-06-2023
Entrega del informe mensual HSEQ con todos los anexos pendientes y las evidencias del mes.	Contratista 767. S.A.S.	05-06-2023.
Contratista se compromete a despejar el área del separador del conjunto San Remo 1 y 2 Real de Minas	Contratista 767. S.A.S.	09-06-2023
se debera dar inicio a la intervención entre en conjunto San Remo y La 64.	Contratista 767. S.AS.	07-06-2023
Se debera abrir la franja terminada en la cra 2 w occidente zona recrear Barrio Mutis.	Contratista 767 S.A.S	02-06-2023
El contratista se compromete entregar completamente terminado el frente de la calle 58, entre Cras. 2W y 3W Barrio Mutis	Contratista 767 S.A.S.	13-06-2023
El contratista se compromete a entregar completamente terminado el frente de la calle 60 entre Cra 46 y 48W. (F. Estorugues)	Contratista 767. SA.S.	10-06-2023
Se compromete a entregar los Balances Financieros para el dia de incio de obra de los frentes a intervenir.	Contratista 767. S.AS.	05-06-2023
Se compromeeta a dar Inicio de obra frente La Victoria	Contratista 767. S.AS	05-06-2023
Se compromete a dar Inicio de obra frente Diamante	Contratista 767 S.AS.	12-06-2023

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 417 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y _____.

LUGAR: Mutis	FECHA: 1 JUNIO 23	HORA:

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Jose Carlos Vitola Urrego	JESAK SAS	Residente Dot	—	3177154819	
Monica Cristina Cervera	767 SAS	Residente Obra	—	3105855573	
Carmen Rosa Caceres B.	767 SAS	Residente HSEQ	—	3186581642	
Natalia López	767 SAS	Profesional social	—	3238153258	
María Fernanda Martinez C.	Jesak S.A.S	Residente HSEQ Int	—	3212488480	
Eslendy Cortes Aguilar	Jesak SAS	Prof Social	—	3104622104	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

#4

TEMA: COMITE No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 417 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 767 SAS.

LUGAR: Campamento mutis contratista	FECHA: 15/jun/23	HORA: 2:00PM

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Vladimir Polo Paz	Jesak SAS	Director I/nia	———	3108118774	
Maria fernanda Martinez	Jesak SAS	Prof. HSEQ Inter.	———	3212488480	
Estenly Cotta Aguilar	Jesak SAS	Prof HSEQ Inter		3104622104	
Jose Carlos Pitalua Urrutia	JESAK SAS	RESIDENTE	—	3177154819	
CARMEN ROSA CACERES BAYONA	767 SAS	Prof. HSEQ		3186581642	
VICTOR E. MRAD T.	767 SAS.	DIRECTOR	victoremrad@yahoo.com.mx	3129191734.	
Monica Liliana Quintero	767 SAS	Residente obra	—	3105855573	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

#1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/jun/23

Compromisos Anteriores

-Se cumplieron los compromisos

Social

Se recibió el informe mensual #3, está pendiente de aprobación. Ya fue revisado y se está a la espera de radicación. Se realizó socialización en villa alicia y Puerta de Sol, pendientes las actas de Vecindad. En Villa alicia la comunidad solicitó que se enviaran volantes indicando la fecha en la cual se va a realizar las actas de vecindad. Se repartiran Volantes el día Sabado 17/jun/23. Se van a realizar actas de vecindad en real de minas- segundo tramo entre hoy y mañana. Se prevé iniciar el segundo tramo mañana 16/jun/23.
Se sugiere al contratista programar socializacion en: Cordoncillo 1, la libertad, nueva granada y Diamante 1.
Se recomienda que se informe a la interventoría oportunamente sobre daños a los predios durante la ejecucion de las obras.

HSEQ

Se recibío informe mensual #3 y ya se aprobó. El contratista manifiesta presentarlo mañana formalmente. Se debe programar comite de transito para verificación de PMT. Se requiere al Contratista no depositar materiales de construcion en los senderos peatonales. Se debe mejorar la ~~señalizacion~~ señalización de las cajas de acueducto y alumbrado para evitar accidentes. Se radicó el MAD a la entidad. se debe revisar la lista de chequeo antes de iniciar un Frente nuevo.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

#2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 15/Jun/23.

Frentes en intervencion.

- Estoraques: clle 60 en un 80% de ejecución.
  - Se iniciaron 2 frentes adicionales clk 59 y 59b.
- Mutis clle 56 ente 2w y 3w: 70%.
- Mutis cra 2w costado Occidental = 70%
- Mutis cra 2w costado Oriental = Se Prevé iniciar 21/jun/23
- Sauces: ejecutado 100% el primer tramo, el 2do tramo en 50%
- Real de minas: Cra 8a.
  - 1er tramo desde la clle 61 hasta san remo1 occidental 80%
  - 2do tramo desde san remo2 Hasta la 64 occidental = Se inicia el 16/jun.
  - 3er tramo Cra 8a desde la 61 Hasta metropolis 3. Oriental = inicia el 20/jun.
  - 4to tramo de metropolis 3 a clle 64 = 1semana de julio
- Diamante 2; clle 89 entre 24-25 se está ejecutando costado Norte. se preve iniciar el costado sur el 26/junio/23
- la victoria: se inicia mañana, se está instalando PMT hoy.

Se solicita al contratista priorizar el inicio del frente Diamante 1. Posteriormente se abre los frentes villa alicia y Puerta de sol.

Powered by CamScanner

Alcaldia de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

#3

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Cuadro de Control de Seguridad Social del mes de mayo	Contratista	16 de Junio de 2023
Radicado con oficio de los informes #3 Social y HSEQ	Contratista	16 de Junio de 2023
Programar socialización de Diamante 1 y Actas de veredad. o entorno.	Contratista	23 de Junio de 2023
Programación del comité de tópico mensual	Contratista	23 de Junio de 2023

Powered by CamScanner

COMITE DE SEGUIMIENTO

JUNIO 29/2023

COMPROMISOS ANTERIORES.

SOCIAL

1. SE APROBO EL INFORME SOCIAL MENSUAL
2. SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACTAS DE VECINDAD PARA LOS FRENTE DE VILLA ALICIA Y ACTAS DE ENTORNO EN LOS CONJUNTOS METROPOLIS.
3. SE HARA LA SOCIALIZACION DE INICIO DEL FRENTE DIAMANTE 1, EL DIA DE HOY.
4. EL DIA 30 DE JUNIO, SE INICIARAN LAS ACTAS DE VECINDAD DE PUERTA DEL SOL.
5. PENDIENTES POR SOCIALIZAR LOS FRENTES DE CORDONCILLO, LA LIBERTAD, NUEVA GRANADA, Y LA PEDREGOSA
6. SE REALIZARON REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS VECEDORES EN TODO LOS FRENTE QUE SE VIENEN. INTERVINIENDO.

HSEQ

1. SE REVISO Y APROBO EL INFORME N°3 DE HSEQ.
2. SE PROGRAMO COMITE DE TRAFICO, CON EL REPRESENTANTE TRANSITO, SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA Y ASESOR DE TRAFICO Y PMT, Y SUPERVISION DEL CONTRATISTA.
3. SE CUMPLIO CON LAS RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EN LOS FRENTES DE OBR

Se solicita por parte del componente HSEQ, el retiro del RCD, en todos los frentes que se vieren intervinviendo. De manera rapida y eficaz.
Se deberá disponer de áreas de acopio de materiales, en donde no se interficiera con el paso peatonal, y se deberá señalizar y cobrir con plastico.
Se solicita que en los accesos a las viviendas y áreas comerciales, queden completamente libre de obstaculos, para asi evitarnos problemas con la comunidad.
Se recibio respuesta de CDMB. en donde se autoriza, la poda radicular y aereas, que se debe contar la sungia, a partir de un metro de altura, dejandole a ras de la cerca perimetral. NO se autoriza ningona tala, en los frentes intervenidos.
Se solicita que antes de inician cualquier frente de obra, verificar en sitio la lista de chequeo para su aprobacion por parte de la interventoria y se cuente con todos los elementos como punto de emergencias, punto ecologico, punto de hidratacion.
Se requiere el envio de la documentacion para el ingreso del personal, el dia anterior a su ingreso.

TECNICO

1. NO SE HA DADO INICIO EL FRENTE DE OBRA DEL BARRIO VICTORIA, ESTA PENDIENTE DE SU INTERVENCION.
2. EL FRENTE DE ESTANQUES TIENE UN AVANCE ESTIMADO DE UN 90% DE TERMINADO, FALTA TERMINAR LA ZONA DE LA BAHIA Y LA CALLE 59.
3. DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE ABRIO EL FRENTE DE OBRA COSTADO RIENTAL EN EL BARRIO MUTIS, CALLE 56 Y CALLE 57 CON CARRERA 2 W.
4. LA CALLE 56 CON CRAS 2W Y 3W, ESTA EN UN 95% TERMINADA FALTA UNA RAMPA PEATONAL EN LA ESQUINA Y REMATES FINALES DE ANDEN
5. EL FRENTE DE LOS SAUCES, VA BASTANTE ADELANTADO, LA PROXIMA SEMANA SE PONDRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, PENDIENTE POR EJECUTAR EL POMPEYANO DE ACCESO Y ACCESO A LA PORTERIA DEL CONJUNTO LOS SAUCES.
6. EL FRENTE DE REAL DE MINAS SE PUSO EN PUESTA DE SERVICIO LA ZONA INICIALMENTE INTERVENIDA, QUEDA PENDIENTE POR INTERVENIR LA ZONA DEL SEPARADOR CENTRAL, Y SE CONTINUA CON LA COLOCACION DEL SARDINEL PREFABRICADO AHO EN EL COSTADO SUR HACIA LA CALLE 64, LOS TRABAJOS AVANZAN A BUEN RITMO, SE ESPERA QUE EN LOS PROXIMOS DIAS SE PUEDA TERMINAR EL COSTADO DE LA CONJUNTOS SAN REMO 1 Y SAN REMO 2, PARA EMPALMAR LOS DOS FRENTES CON LOS DOS POMPEYANOS PENDIENTES POR EJECUTAR.

Powered by CamScanner

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

Junio 29/2023

No. ____DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 417 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y _____.

	FECHA:	HORA:

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Juan Carlos Ortola U.	Jesak SAS	Residente	———	3177154819	
Maria fernanda Martinez	JESAK S.AS.	R. HSEQ Interv.	———	3212488480	
Carmen Rosa Caceres Bayona	767 SAS	P. HSEQ Contratista	———	3186581642	
Monica Castro	767 SAS	Residente obra	———	3105855573	

Powered by CamScanner

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
ENTREGA DE PRESUPUESTO ACTUALIZADOS	ING. MONICA	Julio 5/2023
ENTREGA DE ACTAS DE PUESTAS EN SERVICIO	ING. MONICA	Julio 5/2023

Powered by CamScanner

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
FRENTE DE OBRA :	**BARRIO DIAMANTES II**					
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30/ 2023					
RESIDENTE INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA					
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**aplicabilidad**	**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%				**100%**
1	**Señalización general frente**	**33%**				**33%**
	Señales fijas	10%		100%	NINGUNA	10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%		100%	NINGUNA	20,00%
	Señalización luminosa	3%		100%	NINGUNA	3,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%		100%	NINGUNA	10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**				**45%**
	Estado de Señalización	12%		100%	NINGUNA	12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%		100%	NINGUNA	25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Barricadas y/o maletines	4%		100%	NINGUNA	4,00%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**				**18%**
	Asesor de transito	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Pmt vigente aprobado	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%		100%	NINGUNA	10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**				**4%**
	Atención oportuna	4%		100%	NINGUNA	4,00%


Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma: ING. MONICA LILIANA QUINTERO

Residente de Obra



Firma: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA

Residente de interventoria

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
FRENTE DE OBRA :	**BARRIO REAL DE MINAS**					
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30/ 2023					
RESIDENTE INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA					
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**aplicabilidad**	**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%				**100%**
1	**Señalización general frente**	**33%**				**33%**
	Señales fijas	10%		100%	NINGUNA	10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%		100%	NINGUNA	20,00%
	Señalización luminosa	3%		100%	NINGUNA	3,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%		100%	NINGUNA	10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**				**45%**
	Estado de Señalización	12%		100%	NINGUNA	12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%		100%	NINGUNA	25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Barricadas y/o maletines	4%		100%	NINGUNA	4,00%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**				**18%**
	Asesor de transito	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Pmt vigente aprobado	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%		100%	NINGUNA	10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**				**4%**
	Atención oportuna	4%		100%	NINGUNA	4,00%


Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma: ING. MONICA LILIANA QUINTERO

Residente de Obra



Firma: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA

Residente de interventoria

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
FRENTE DE OBRA :	**BARRIO LOS SAUCES**					
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30/ 2023					
RESIDENTE INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA					
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**aplicabilidad**	**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%				**100%**
1	**Señalización general frente**	**33%**				**33%**
	Señales fijas	10%		100%	NINGUNA	10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%		100%	NINGUNA	20,00%
	Señalización luminosa	3%		100%	NINGUNA	3,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%		100%	NINGUNA	10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**				**45%**
	Estado de Señalización	12%		100%	NINGUNA	12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%		100%	NINGUNA	25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Barricadas y/o maletines	4%		100%	NINGUNA	4,00%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**				**18%**
	Asesor de transito	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Pmt vigente aprobado	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%		100%	NINGUNA	10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**				**4%**
	Atención oportuna	4%		100%	NINGUNA	4,00%


Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma: ING. MONICA LILIANA QUINTERO

Residente de Obra



Firma: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA

Residente de interventoria


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
FRENTE DE OBRA :	**BARRIO ESTORAQUES**					
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30/ 2023					
RESIDENTE INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA					
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**aplicabilidad**	**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%				**100%**
1	**Señalización general frente**	**33%**				**33%**
	Señales fijas	10%		100%	NINGUNA	10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%		100%	NINGUNA	20,00%
	Señalización luminosa	3%		100%	NINGUNA	3,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%		100%	NINGUNA	10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**				**45%**
	Estado de Señalización	12%		100%	NINGUNA	12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%		100%	NINGUNA	25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Barricadas y/o maletines	4%		100%	NINGUNA	4,00%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**				**18%**
	Asesor de transito	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Pmt vigente aprobado	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%		100%	NINGUNA	10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**				**4%**
	Atención oportuna	4%		100%	NINGUNA	4,00%

Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma: ING. MONICA LILIANA QUINTERO
Residente de Obra



Firma: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA
Residente de interventoria

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
FRENTE DE OBRA :	**BARRIO MUTIS**					
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30/ 2023					
RESIDENTE INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS VITOLA URZOLA					
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**aplicabilidad**	**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%				**100%**
1	**Señalización general frente**	**33%**				**33%**
	Señales fijas	10%		100%	NINGUNA	10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%		100%	NINGUNA	20,00%
	Señalización luminosa	3%		100%	NINGUNA	3,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%		100%	NINGUNA	10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**				**45%**
	Estado de Señalización	12%		100%	NINGUNA	12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%		100%	NINGUNA	25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Barricadas y/o maletines	4%		100%	NINGUNA	4,00%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**				**18%**
	Asesor de transito	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Pmt vigente aprobado	4%		100%	NINGUNA	4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%		100%	NINGUNA	10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**				**4%**
	Atención oportuna	4%		100%	NINGUNA	4,00%


Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma: ING. MONICA LILIANA QUINTERO

Residente de Obra



Firma: ARQ. JUAN CARLOS VITOLA

Residente de interventoria

COLSUELOS S.A.S	**PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO** **(MÉTODO DEL CONO DE ARENA)** NORMA I.N.V. E - 161	CÓD. : **NRJ-010** FECHA: 2-jun-23

CLIENTE : 7G7 S.A.S. NIT N° 901120358-4

CONTRATO : N° 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROYECTO : ADECUACION DE ANDENES , ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

MATERIAL: SUBBASE GRANULAR DE PESCADERO INSTALADA EN SNA REMO

DESCRIPCION : GRAVA ARENOSA COLOR GRIS NO PLASTICA

TOMADAS EL DIA 02-06-23

	ENSAYO No	1	2	3	4	5	6
	ORIENTACION EN EL SITIO	ANDENES ESTORAQUES II					
	RASANTE	BASE	BASE	BASE			
	PROFUNDIDAD	**12cm**	**12cm**	**12cm**			
	DENSIDAD DE LA ARENA (gr / cm³)	1.410	1.410	1.410			
	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gf)	7118	7140	7145			
	PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gf)	3481	3469	3561			
	PESO ARENA CONO Y HUECO (gf)	3637	3671	3584			
	CONSTANTE DEL CONO (gf)	1641.0	1641.0	1641.0			
	PESO DE ARENA EN EL HUECO (gf)	1996.0	2030.0	1943.0			
	VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (cm³)	1415.6	1439.7	1378.0			
	PESO MATERIAL RETENIDO EN 3/4	581.0	1240.0	1034.0			
	PESO MATERIALEXTRAIDO DEL HUECO 3 / 4" (gf)	2627.0	2209.0	2257.0			
	% RETENIDO EN 3/4	**18.0**	**36.0**	**31.0**			
20	CONTENIDO DE HUMEDAD %	5.5	5.3	5.1			
21	PESO UNITARIO HUMEDO (gf/cm³)	**2.259**	**2.396**	**2.388**			
	PESO UNITARIO SECO (gf/cm³)	2.251	2.275	2.272			
22	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA EN CAMPO (gf / cm³)	2.290	2.356	2.338			
	HUMEDAD OPTIMA EN LABORATORIO (%)	5.0	5.0	5.0			
	% DE COMPACTACIÓN TERRENO	98.3	96.6	97.2			

OBSERVACIONES : BASE GRANULAR

1- PORTAL SDAN SEBASTIAN

2- METROPOLIS 1 CARRERA 18 N° 61-53

3- PORTERIA SAN REMO 1

JOSE VICENTE PAEZ
LABORATORISTA

MONICA CASTRO
REVISO

COLSUELOS S.A.S	**PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO** **(MÉTODO DEL CONO DE ARENA)** NORMA I.N.V. E - 161	CÓD. : **NRJ-013** FECHA: **29-jun-23**

CLIENTE : 7G7 S.A.S. NIT N° 901120358-4

CONTRATO : N° 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROYECTO : ADECUACION DE ANDENES , ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

MATERIAL: GRANULAR DE PESCADERO INSTALADA SAUSES

DESCRIPCION : GRAVA ARENOSA COLOR GRIS NO PLASTICA

TOMADAS EL DIA 22-06-23

	ENSAYO No	1	2	3	4	5	6
	ORIENTACION EN EL SITIO	SAUSES					
	RASANTE	ARENOSO	ARENOSO	ARENOSO			
	PROFUNDIDAD	**12cm**	**12cm**	**12cm**			
	DENSIDAD DE LA ARENA (gr / cm³)	1.410	1.410	1.410			
	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gf)	6810	6828	6838			
	PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gf)	3102	2224	2404			
	PESO ARENA CONO Y HUECO (gf)	3708	4604	4434			
	CONSTANTE DEL CONO (gf)	1641.0	1641.0	1641.0			
	PESO DE ARENA EN EL HUECO (gf)	2067.0	2963.0	2793.0			
	VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (cm³)	1466.0	2101.4	1980.9			
	PESO MATERIAL RETENIDO EN 3/4	305.0	400.0	1033.0			
	PESO MATERIALEXTRAIDO DEL HUECO 3 / 4" (gf)	2639.0	4400.0	3103.0			
	% RETENIDO EN 3/4	**10.0**	**8.0**	**25.0**			
20	CONTENIDO DE HUMEDAD %	5.5	5.5	5.5			
21	PESO UNITARIO HUMEDO (gf/cm³)	**2.008**	**2.284**	**2.088**			
	PESO UNITARIO SECO (gf/cm³)	1.903	2.165	1.979			
22	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA EN CAMPO (gf / cm³)	2.073	2.073	2.073			
	HUMEDAD OPTIMA EN LABORATORIO (%)	5.0	5.0	5.0			
	% DE COMPACTACIÓN TERRENO	91.8	104.4	95.5			

OBSERVACIONES : BASE GRANULAR

1- FACE 2 CONTENEDOR # 6

2- FACE 2 CONTENEDOR 8

3- FACE 2 CONTENEDOR 2

JOSE VICENTE PAEZ
LABORATORISTA

MONICA CASTRO
REVISO

COLSUELOS S.A.S	**PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO** **(MÉTODO DEL CONO DE ARENA)** NORMA I.N.V. E - 161	CÓD. : **NRJ-013** FECHA: **29-jun-23**

CLIENTE : 7G7 S.A.S. NIT N° 901120358-4

CONTRATO : N° 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROYECTO : ADECUACION DE ANDENES , ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

MATERIAL: GRANULAR DE PESCADERO INSTALADA EN EL MUTIA Y EL DIAMANTE

DESCRIPCION : GRAVA ARENOSA COLOR GRIS NO PLASTICA

TOMADAS EL DIA 22-06-23

	ENSAYO No	1	2	3	4	5	6
	ORIENTACION EN EL SITIO	**MUTIS**	**DIAMANTE**				
	RASANTE	ARENOSO	ARENOSO	ARENOSO			
	PROFUNDIDAD	**12cm**	**12cm**	**12cm**			
	DENSIDAD DE LA ARENA (gr / cm³)	1.410	1.410	1.410			
	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gf)	6836	6829	6831			
	PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gf)	2721	2547	3193			
	PESO ARENA CONO Y HUECO (gf)	4115	4282	3638			
	CONSTANTE DEL CONO (gf)	1641.0	1641.0	1641.0			
	PESO DE ARENA EN EL HUECO (gf)	2474.0	2641.0	1997.0			
	VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (cm³)	1754.6	1873.0	1416.3			
	PESO MATERIAL RETENIDO EN 3/4	1380.0	704.0	975.0			
	PESO MATERIALEXTRAIDO DEL HUECO 3 / 4" (gf)	2456.0	3501.0	2239.0			
	% RETENIDO EN 3/4	**36.0**	**16.0**	**30.0**			
20	CONTENIDO DE HUMEDAD %	5.8	5.9	5.5			
21	PESO UNITARIO HUMEDO (gf/cm³)	**2.186**	**2.245**	**2.269**			
	PESO UNITARIO SECO (gf/cm³)	2.066	2.120	2.151			
22	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA EN CAMPO (gf / cm³)	2.073	2.073	2.073			
	HUMEDAD OPTIMA EN LABORATORIO (%)	5.0	5.0	5.0			
	% DE COMPACTACIÓN TERRENO	99.7	102.3	103.7			

OBSERVACIONES : BASE GRANULAR

1- CARRERA 56 # 03 W MUTIS

2- DIAMANTE CALLE 89 # 24-25

3- DIAMANTE CALLE 89 # 24-15

JOSE VICENTE PAEZ
LABORATORISTA

MONICA CASTRO
REVISO

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA:	417 del 27 de diciembre de 2022
OBJETO:	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander.
CONTRATISTA:	7G7 S.A.S
CÉDULA O NIT:	901.120.358-4
INTERVENTOR:	JESAK SAS
VALOR FISCAL:	$1.949.858.621,00 (Mil novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiún pesos (M.L). incluido AIU del 38,00%.
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO ACTUAL:	Cuatro (4) meses.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio de 2023.
GARANTÍAS	Póliza cumplimiento No. 3525432-3 Aseguradora SURAMERICANA
PRESUPUESTO:	RP 1123 DEL 22/01/2023

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS #1

En Bucaramanga, a los siete (7) días del mes de junio de dos mil veinte tres (2023), se reunieron, **IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS**, Secretario de Infraestructura, **VLADIMIR POLO PAZ** en representación de JESAK SAS como interventor, **EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA** como apoderado en representación de 7G7 SAS como contratista de obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERANDO

- Que entre el MUNICIPIO y 7G7 SAS se suscribió el veinte siete (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022) el contrato de obra No. 417-2022 con el siguiente objeto: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", grupo III, por valor inicial de $1.949.858.621,00 (Mil novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos

cincuenta y ocho mil seiscientos veintiún pesos (M.L). incluido AIU del 38,00%., y un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses.

- Que el contrato de obra No 417 de 2022, inicio actividades constructivas el día diez y seis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), programando la terminación el día quince (15) de julio de dos mil veintitrés (2023).

- Que durante los recorridos, valoración preliminar de los tramos y una vez iniciada la ejecución de las se puede apreciar que existen actividades que no están incluidas dentro del presupuesto contractual y son necesarias para el normal desarrollo de las obras.

- Que los items no previstos presentados obedecen a necesidades definidas en campo directamente con interventoría y socializadas con la supervisión en comités y visitas de obra.

- Que en oficio CO-7G7-417-2023-0049 de fecha 19 de abril de 2023 se radica ante interventoría los documentos y soportes del Análisis de Precios Unitarios No Previstos NP-1 a NP-16

- Que en oficio JSK-MB-429-159 del 1 de mayo de 2023 se recibe observaciones por parte de interventoría de los Análisis de Precios Unitarios No Previstos, para que sean ajustados por el contratista de obra.

- Que en oficio CO-7G7-417-2023-0057 de fecha 3 de mayo de 2023 se radica ante interventoría los documentos y soportes del Análisis de Precios Unitarios No Previstos con las correcciones y ajustes solicitados por interventoría según oficio JSK-MB-429-159 del 3 de mayo de 2023.

- Que en oficio JSK-MB-429-175 del 10 de mayo de 2023 se recibe aprobación por parte de interventoría de los Análisis de Precios Unitarios No Previstos.

- Que cada actividad adicional y/o no prevista, cuenta con cotizaciones de sus insumos y materiales discriminados en los análisis de precios unitarios, que no existían en la propuesta inicial y sus especificaciones técnicas particulares.

ACUERDAN:

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas particulares.

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (incluido AIU 38%)
NP-1	Bordillo prefabricado UC-B20 para confinamiento zonas verdes (80*20*35) o similar	M	$ 84.836,00
NP-2	Bordillo en concreto reforzado fundido en sitio (concreto de 3000 PSI, malla de refuerzo de 7mm *15 *15) de 10*30 cm.	M	$ 74.735,00
NP-3	Bordillo en concreto de 3000 PSI, mezclado en sitio, de 10 * 30 cm.	M	$ 41.414,00
NP-4	Acero de refuerzo PDR - 60	Kg	$ 11.928,00
NP-5	Malla electro soldada de 7mm, separación entre varillas 15cm * 15cm.	Kg	$ 13.111,00
NP-6	Construcción de placa superior de sumidero en concreto reforzado con doble parrilla, de 0,70m de ancho por 0,10m de espesor, según esquema CDMB adjunto.	M	$ 321.443,00
NP-7	Franja de resanes o ajustes en concreto de 3000 PSI en zona vía-sardinel, anchos menores a 5 cm.	M	$ 16.207,00
NP-8	Retiro y reinstalación de anclaje de tensores de postes de redes aéreas	Unid.	$ 145.533,00
NP-9	Suministro e instalación de bolardo metálico según norma del MEPB.	Unid.	$ 611.574,00
NP-10	Suministro e instalación de Caja en concreto con marco y tapa en hierro dúctil para acometida domiciliaria de 1/2", según norma AMB	Unid.	$ 379.805,00
NP-11	Construcción de sumidero SL-200, según norma CDMB.	Unid.	$ 7.699.615,00
NP-12	Bordillo prefabricado para confinamiento zonas verdes (100*10*30) o similar.	M	$ 61.658,00
NP-13	Reparaciones domiciliarias de red acueducto de ½" para ajustes a nuevos niveles de andén.	Unid.	$ 70.684,00

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (incluido AIU 38%)
NP-14	Corte de pavimento y estructuras en concreto.	M	$ 18.598,00
NP-15	Tratamiento de raíces menores, corte y sellado con cicatrizante.	Unid.	$ 32.502,00

Para constancia y prueba se firma por los que en ella intervinieron, en dos (2) originales, con destino a la Entidad contratante y una copia, para el contratista.

Vladimir Polo Paz
R.L. JESAK S.A.S
Interventor

Edgar Alonso Quesada Orejarena
Apoderado 7G7 S.A.S
Contratista de Obra

IVAN JOSE VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

V.o.B.

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	002			
FECHA DEL ACTA	16 / 06 /2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	417 del 27 de diciembre de 2022			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo III			
CONTRATISTA	NOMBRE	7G7 SAS		
	C.C/ NIT	9 0 1 1 2 0 3 5 8-4		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANDREA CASTAÑEDA ARBOLEDA		
	C.C	1.039.455.281		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$1.949.858.621,00	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ 584.957.586,30			
CDP	NÚMERO: 1515			
	FECHA: 22 ENERO DE 2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A			
	FECHA: N/A			
RP	NÚMERO: 1123			
	FECHA: 22/01/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A			
	FECHA: N/A			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Fecha de Finalización:	15/07/2023		
	Nueva fecha de terminación:	N/A		
	Duración:	4 MESES		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0890680-6	13/04/2023	15/07/2023	348.000.000,00
SURAMERICANA	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3525432-3	16/03/2023	15/11/2023	584.957.586,00
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3525432-3	16/03/2023	15/11/2023	389.971.724,20
SURAMERICANA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	3525432-3	15/07/2023	15/07/2028	389.971.724,20
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	3525432-3	16/03/2023	15/07/2026	196.985.862,10

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**14 ABRIL DE 2023**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS A COBRAR (Contrato)	**NA**
PERIODO DE COBRO	**01/05/2023 A 30/05/2023**
VALOR A COBRAR	**$313.090.160,64**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$93.927.048,19**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	15/05/2023	7880496923	$16.303.334,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD EPS COOSALUD ESS NUEVA EPS EPS SANITAS SALUD TOTAL	PORVENIR COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $652.200	VR PAGADO $ 2.608.600	VR PAGADO $ 1.134.800

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA** quien comparece en representación de 7G7 según poder del 25/03/2023 (Adjunto) como Contratista. **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$313.090.160,64**
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo	**$93.927.048,19**
Valor a Pagar	**$219.163.112,45**

SON : DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota: Páguese a INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUPLEX S.A.S identificada con Nit No. 901081355-4 de conformidad con la Resolución No. 53 del 17 de mayo de 2023, por medio de la cual se aprueba la cesión de derechos económicos entre 7G7 S.A.S e INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUPLEX S.A.S. (Se anexa copia de Cesión de derechos económicos).

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300292720	$4.290

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ

INTERVENTOR

ING EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA

CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ

SUPERVISOR

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 417 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___X___ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

VALOR INICIAL (incl. AIU) :	$ 1.949.858.620,24	VALOR ADICIONAL:						$ 1.949.858.620,24	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	23,21%

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N°1		EJECUTADO PRESENTE ACTA N°2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		PRELIMINARES														
1.1		Localización y replanteo manual	M2	5.123,35	$ 2.230,00	$ 11.425.070,50	0,00	$ 0,00	5123,35	$ 11.425.070,50	607,71	$ 1.355.193,30	1.763,15	$ 3.931.824,50	2.370,86	$ 5.287.017,80
					SUBTOTAL	$ 11.425.070,50		$ 0,00		$ 11.425.070,50	SUBTOTAL	$ 1.355.193,30	SUBTOTAL	$ 3.931.824,50	SUBTOTAL	$ 5.287.017,80
		DEMOLICIONES														
2.1		Demolición de vías en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1.206,73	$ 201.000,00	$ 243.638.787,00	-28,00	($ 5.249.400,00)	1180,73	$ 238.389.387,00	87,28	$ 17.621.832,00	164,45	$ 33.202.455,00	251,73	$ 50.824.287,00
					SUBTOTAL	$ 243.638.787,00		($ 5.249.400,00)		$ 238.389.387,00	SUBTOTAL	$ 17.621.832,00	SUBTOTAL	$ 33.202.455,00	SUBTOTAL	$ 50.824.287,00
		EXCAVACIONES Y RELLENOS														
3.1		Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	968,08	$ 74.600,00	$ 72.218.768,00	0,00	$ 0,00	968,08	$ 72.218.768,00	90,78	$ 6.772.188,00	232,52	$ 17.345.092,00	323,30	$ 24.116.180,00
3.2		Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	1.099,07	204.600,00	$ 225.089.536,00	0,00	$ 0,00	1099,07	$ 225.089.536,00	123,04	$ 25.198.592,00	195,78	$ 40.095.744,00	318,82	$ 65.294.336,00
					SUBTOTAL	$ 297.308.304,00		$ 0,00		$ 297.308.304,00	SUBTOTAL	$ 31.970.780,00	SUBTOTAL	$ 57.441.736,00	SUBTOTAL	$ 89.412.516,00
		ESPACIO PUBLICO														
4.1		Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	M2	1.192,67	134.200,00	$ 160.056.751,09	1500,00	$ 201.300.000,00	2692,67	$ 361.356.751,09	312,07	$ 41.879.784,00	880,60	$ 118.176.520,00	1.192,67	$ 160.056.314,00
4.2		Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	M	2.240,66	82.300,00	$ 185.064.718,00	0,00	$ 0,00	2240,66	$ 185.064.718,00	146,53	$ 12.059.419,00	504,47	$ 41.517.861,00	651,00	$ 53.577.300,00
4.3		Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	UND	149,42	364.600,00	$ 54.478.532,00	0,00	$ 0,00	149,42	$ 54.478.532,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 4.739.800,00	13,00	$ 4.739.800,00
4.4		Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	UND	129,48	258.100,00	$ 33.418.788,00	0,00	$ 0,00	129,48	$ 33.418.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5		Franja de ajuste al predio	M	2.101,59	13.900,00	$ 29.212.101,00	0,00	$ 0,00	2101,59	$ 29.212.101,00	146,53	$ 2.036.767,00	423,05	$ 5.882.905,00	570,48	$ 7.929.672,00
4.6		Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	M3	118,00	953.400,00	$ 112.501.200,00	-50,00	($ 47.670.000,00)	68,00	$ 64.831.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.7		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	M2	2.142,83	152.500,00	$ 326.769.200,00	-816,37	($ 124.497.035,00)	1326,51	$ 202.292.165,00	103,65	$ 15.806.625,00	23,33	$ 3.557.823,00	126,98	$ 19.364.450,00
4.8		Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio, Acabado con llana de madera	M3	280,54	800.000,00	$ 232.432.000,00	-200,00	($ 160.000.000,00)	80,54	$ 72.432.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.133.953.290,09		($ 130.867.035,00)		$ 1.003.086.255,09	SUBTOTAL	$ 71.762.695,00	SUBTOTAL	$ 173.384.931,00	SUBTOTAL	$ 245.667.536,00
		OBRAS COMPLEMENTARIAS														
5.1		Realce cajas de servicios publicos	UND	202,44	140.600,00	$ 28.341.600,00	-100,00	($ 14.000.000,00)	102,44	$ 14.341.600,00	33,00	$ 4.620.000,00	15,00	$ 2.100.000,00	48,00	$ 6.720.000,00
5.2		Realce pozos EMPAS	UND	47,95	237.400,00	$ 11.383.330,00	0,00	$ 0,00	47,95	$ 11.383.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3		Traslado Señales de Tránsito	UND	47,42	133.000,00	$ 6.308.860,00	0,00	$ 0,00	47,42	$ 6.308.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 46.031.790,00		($ 14.000.000,00)		$ 32.031.790,00	SUBTOTAL	$ 4.620.000,00	SUBTOTAL	$ 2.100.000,00	SUBTOTAL	$ 6.720.000,00
		CARPINTERIA METALICA														
6.1		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	M	157,70	380.400,00	$ 59.969.080,00	-70,00	($ 26.628.000,00)	87,70	$ 33.341.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 59.969.080,00		($ 26.628.000,00)		$ 33.341.080,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00
		ASEO Y LIMPIEZA														
7.1		Aseo y limpieza general	M2	5.223,54	3.700,00	$ 19.327.098,00	0,00	$ 0,00	5223,54	$ 19.327.098,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 19.327.098,00		$ 0,00		$ 19.327.098,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00
		PLAN DE MANEJO														
8.1		Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	10.190.000,00	$ 10.190.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.190.000,00	0,226	$ 2.323.320,00	0,23	$ 2.369.175,00	0,461	$ 4.692.495,00
8.2		Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	60.610.000,00	$ 60.610.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 60.610.000,00	0,574	$ 34.790.140,00	0,25	$ 15.124.427,00	0,824	$ 49.914.567,00
					SUBTOTAL	$ 70.800.000,00		$ 0,00		$ 70.800.000,00	SUBTOTAL	$ 37.113.460,00	SUBTOTAL	$ 17.493.602,00	SUBTOTAL	$ 54.607.062,00
		NO PREVISTOS														
NP-1		Bordillo prefabricado UC-B20 para confinamiento zonas verdes (80*20*35) o similar	m		$ 84.836,00	$ 0,00	400,00	$ 33.934.400,00	400,00	$ 33.934.400,00	0,00	$ 0,00	178,21	$ 15.118.538,72	178,21	$ 15.118.538,72
NP-2		Bordillo en concreto reforzado fundido en sitio (concreto 3000 psi, malla de refuerzo de 7mm * 15 * 15cm, de 20*30cm.	m		$ 74.735,00	$ 0,00	20,00	$ 1.494.700,00	20,00	$ 1.494.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-3		Bordillo e en concreto de 3000 PSI, mezclado en sitio, de 10 * 30 cm.	m		$ 41.414,00	$ 0,00	20,00	$ 828.280,00	20,00	$ 828.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-4		Acero de refuerzo PBR 60	Kg		$ 11.928,00	$ 0,00	1000,01	$ 11.928.119,28	1000,01	$ 11.928.119,28	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-5		Malla electro soldada de 7mm, separación entre varillas 15cm * 15cm	Kg		$ 13.111,00	$ 0,00	500,00	$ 6.555.500,00	500,00	$ 6.555.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-6		Construcción placa superior de sumidero en concreto reforzado con doble parrilla, de 0,70m de ancho por 0,10m de espesor, según esquema CDMB adjunto.	m		$ 321.443,00	$ 0,00	20,00	$ 6.428.860,00	20,00	$ 6.428.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-7		Franja de resane o ajustes en concreto de 3000 PSI en zona vía sardinel, anchos menores a 5 cm.	m		$ 16.207,00	$ 0,00	2.000,43	$ 32.420.903,72	2000,43	$ 32.420.903,72	0,00	$ 0,00	169,22	$ 2.742.548,54	169,22	$ 2.742.548,54
NP-8		Retiro y reinstalación de anclaje de tensores de redes aéreas	Unid.		$ 145.533,00	$ 0,00	1,00	$ 145.533,00	1,00	$ 145.533,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238.37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 417 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.949.858.620,24	VALOR ADICIONAL:								$ 1.949.858.620,24	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		23,21%

NP-9		Suministro e instalacción de bolardo metálico según norma del MEPB.	Unid.		$ 611.574,00	$ 0,00	26,00	$ 15.900.924,00	26,00	$ 15.900.924,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-10		Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro dúctil para acometida domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	Unid.		$ 379.805,00	$ 0,00	100,00	$ 37.980.500,00	100,00	$ 37.980.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-11		Construcción sumidero SL-200 Según norma CDMB.	Unid.		$ 7.699.615,00	$ 0,00	1,00	$ 7.699.615,00	1,00	$ 7.699.615,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12		Bordillo prefabricado para confinamiento zonas verdes (160*10*30) o similar	M		$ 61.658,00	$ 0,00	150,00	$ 9.248.700,00	150,00	$ 9.248.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13		Reparaciones domiciliarias de red de acueducto de 1/2" para ajuste a nuevos niveles de anden.	Unid.		$ 70.684,00	$ 0,00	100,00	$ 7.068.400,00	100,00	$ 7.068.400,00	0,00	$ 0,00	116,36	$ 7.174.524,88	116,36	$ 7.174.524,88
NP-14		Corte de pavimento y estructuras en concreto	M		$ 18.598,00	$ 0,00	100,00	$ 1.859.800,00	100,00	$ 1.859.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
np-15		Tratamiento de raíces menores, corte y sellado con cicatrizante.	Unid.		$ 32.502,00	$ 0,00	100,00	$ 3.250.200,00	100,00	$ 3.250.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 0,00		$ 176.744.435,00		$ 176.744.435,00		$ 0,00		$ 25.035.612,14		$ 25.035.612,14

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.364.111.173,62	$ -	$ 1.364.111.173,62	$ 119.176.717,61	$ 226.876.928,09	$ 327.911.857,69
Administración 33%	$ 450.156.687,29	$ -	$ 450.156.687,29	$ 39.328.316,61	$ 74.869.356,24	$ 108.210.928,23
Imprevistos 0%						
Utilidad 5%	$ 68.205.558,68	$ -	$ 68.205.558,68	$ 5.958.835,88	$ 11.343.846,40	$ 16.395.594,88
Costos Indirectos (AIU 38%)	$ 518.362.245,97	$ -	$ 518.362.245,97	$ 45.287.162,69	$ 86.213.232,64	$ 124.606.521,11
VALOR COSTO TOTAL	$ 1.882.473.419,59	$ -	$ 1.882.473.419,59	$ 164.463.870,30	$ 313.080.160,64	$ 452.518.418,80
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 67.385.200,65	$ 67.385.200,65	$ 67.385.200,65			
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.949.858.620,24	$ 67.385.200,65	$ 1.949.858.620,24	$ 164.463.870,30	$ 313.080.160,64	$ 452.518.418,80
SALDO POR EJECUTAR:						$ 1.497.340.201,44

VALOR PRESENTE ACTA	$313.080.160,64
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$93.927.048,19
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$219.163.112,45

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
Contratista 707 SAS

Firma:
Nombre : VLADIMIR POLO PAZ
Interventor JEBAK SAS

VoBo:
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor del contrato de interventoria

Nota: No se cobra reajuste de las actividades ejecutadas en el periodo porque no ha salido el indice del DANE del mes de abril. El reajuste de estas actividades se cobrarán en el acta siguiente.

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068	
		Versión: 1.0	
		Fecha aprobación:	
		Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	1,0	PRELIMINARES	ITEM	1.1	Localización y replanteo manual	UNID.	M2

Observación:


ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria


REGISTRO FOTOGRAFICO

AREA TOTAL ACTA No. 1 = 160.95 M2 CALLE 56 ENTRE CRAS 2W - 3W MUTIS





AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

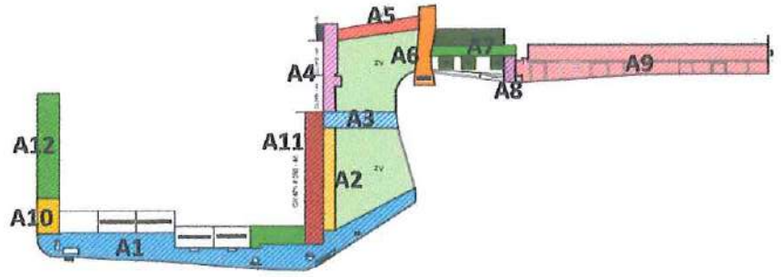

AREA CRA 2W CALLE 56 - 59 ORIENTAL MUTIS

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Zona 1		45,01	3,48		1,00	156,68
ACTA 1	Curva Cra 2W Cll 56		3,10	2,10		1,00	6,51
ACTA 1	Descuento caja eléctrica		0,90	0,40		-1,00	-0,36
ACTA 1	Descuento de Zona de árbol		1,25	1,50		-1,00	-1,88
ACTA 1	Carrera 2W Calle 56 - 57		47,76	3,42		1,00	163,33
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-6,00	-11,25
ACTA 1	Carrera 2W Calle 57 - 58		45,35	3,52		1,00	159,63
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-8,00	-15,00
ACTA 1	Carrera 2W Calle 58 - 59		18,94	3,54		1,00	67,05
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-4,00	-7,50
	ESTORAQUES II						
ACTA 1	Calle 60 Cra 48W - 46W		3,41	2,11		1,00	7,20
ACTA 1			12,20	2,98		1,00	36,36
ACTA 1			15,76	2,04		1,00	32,15
ACTA 1			9,86	1,50		1,00	14,79
	BARRIO MUTIS						
	Cra 2W Calle 56-57						
ACTA 2	Area de Jardineras		1,22	1,25		6,00	9,15
	Cra 2W Calle 57-58						
ACTA 2	Area de Jardineras		1,22	1,25		9,00	13,73
	Cra 2W Calle 58-59						
ACTA 2	Area de Jardineras		1,22	1,25		3,00	4,58
	Zona después de entrada al Recrear		84,85	1,00		1,00	84,85
	Cra 2W Calle 56 - 61 Oriental						
ACTA 2	Cra 2W Calle 56 - 57 Oriental Area 1		126,86	1,00		1,00	126,86

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL


OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

CAPÍTULO	1,0	PRELIMINARES	ITEM	1.1	Localización y replanteo manual	UNID.	M2

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria



AREA 1 = 126.86 M2 AREA 2 = 126.76 M2 AREA 3 = 126.94 M2

AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



AREA 1 = 181.74 M2 AREA 2 = 164.67 M2

AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



AREA CALLE 89 CRA 24 - 25 NORTE DIAMANTE II



AREA 1 = 258.49 M2 AREA 2 = 165.84 M2

ACTA 2	Cra 2W Calle 57 - 58 Oriental Area 2		126,76	1,00		1,00	126,76
ACTA 2	Cra 2W Calle 58 - 59 Oriental Area 3		126,94	1,00		1,00	126,94
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 1		79,17	2,08		1,00	164,67
	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 2		71,27	2,55		1,00	181,74
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		98,15	2,54		1,00	249,30
	DIAMANTE II						
ACTA 2	Calle 89 entre Cra 24 y cra 25 Norte		258,49	1,00		1,00	258,49
ACTA 2			165,84	1,00		1,00	165,84
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 2	Area No. 2		11,79	1,35		1,00	15,92
ACTA 2	Area No. 5		10,88	1,00		1,00	10,88
ACTA 2	Area No. 4		17,13	1,00		1,00	17,13
ACTA 2	Area No. 3		14,08	1,00		1,00	14,08
ACTA 2	Area No. 6		11,78	1,00		1,00	11,78
ACTA 2	Area No. 7		9,39	1,00		1,00	9,39
ACTA 2	Area No. 8		2,99	1,00		1,00	2,99
ACTA 2	Area No. 9		84,98	1,00		1,00	84,98
ACTA 2	Area No. 10		12,00	2,40		1,00	28,80
ACTA 2	Area No. 11		12,00	1,96		1,00	23,52
ACTA 2	Area No. 12		8,15	2,40		1,00	19,56
ACTA 2	Area No. 13		5,90	1,90		1,00	11,21
		PAGADO EN ACTA No1					- 607,71
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	1.763,15
						Cantidad	
						TOTAL	1.763,15

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 1 de 3	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MONICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		


CAPÍTULO	2,0	DEMOLICIONES	ITEM	2,1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

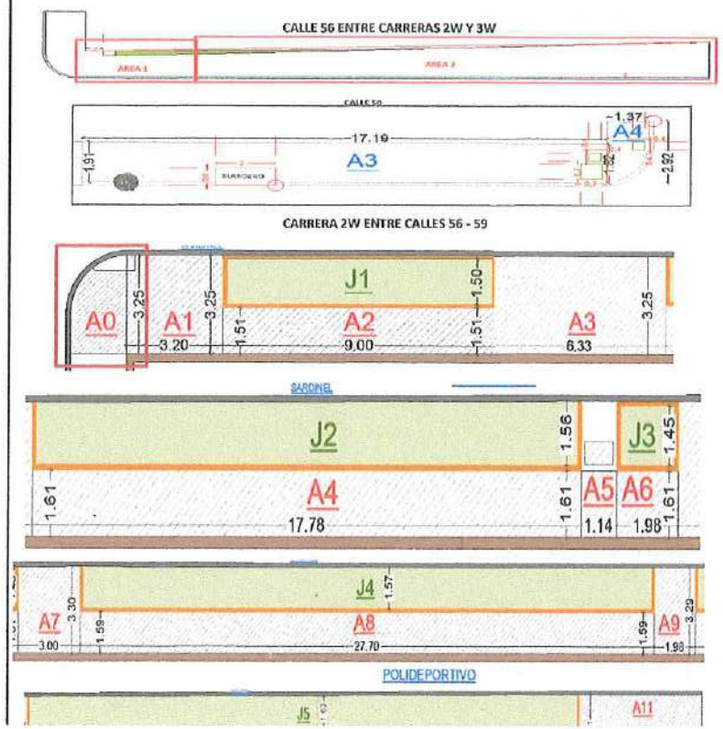

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	Cantidad	
	BARRIO NUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Area No. 1		8,00	1,97	0,18	1,00	2,76
ACTA 1	Area No. 2		37,10	2,58	0,18	1,00	18,75
ACTA 1	Area No. 3		17,19	1,75	0,18	1,00	5,28
ACTA 1	Area No. 4		2,92	1,11	0,18	1,00	0,57
ACTA 1	Demolición de Sardinel		18,55	0,16	0,50	1,00	1,48
	Costado Occidente Cra 2W Calles 56-59						
	Carrera 2W Calle 56-57						
ACTA 1	Area No. 0		3,25	0,84	0,17	1,00	0,46
ACTA 1	Jardinera No. 1		21,00	0,12	0,17	1,00	0,43
ACTA 1	Area No. 2		9,00	1,51	0,17	1,00	2,31
ACTA 1	Jardinera No. 2		20,90	0,12	0,17	1,00	0,43
ACTA 1	Area No. 3		6,33	3,25	0,17	1,00	3,50
ACTA 1	Jardinera No. 3		6,66	0,12	0,17	1,00	0,14
ACTA 1	Area No. 4		17,78	1,61	0,17	1,00	4,72
ACTA 1	Area No. 5 y 6		3,12	1,61	0,20	1,00	1,00
ACTA 1	Area No. 7		3,00	3,30	0,20	1,00	1,98
ACTA 1	Demolición de Sardinel		40,84	0,16	0,50	1,00	3,26
	Carrera 2W Calle 57-58						
ACTA 1	Area No. 8		27,70	1,59	0,16	1,00	7,05
ACTA 1	Area No. 9		1,98	3,29	0,16	1,00	1,04
ACTA 1	Area No. 10 Parte 1		16,14	1,60	0,16	1,00	4,13
ACTA 1	Jardinera No. 4		30,84	0,12	0,16	1,00	0,59
ACTA 1	Jardinera No. 5 Parte 1		16,14	0,12	0,20	1,00	0,39
ACTA 1	Demolición de Sardinel		45,35	0,16	0,50	1,00	3,63
	Carrera 2W Calle 58-59						
ACTA 1	Area No. 10 Parte 2		21,66	1,60	0,16	1,00	6,24
ACTA 1	Jardinera No. 5 Parte 2		26,92	0,12	0,20	1,00	0,65
ACTA 1	Demolición de Sardinel		21,74	0,16	0,50	1,00	1,74
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 1	Calle 60 Cra 46W - 48W		3,41	2,11	0,19	1,00	1,33
ACTA 1			12,20	2,08	0,19	1,00	6,73
ACTA 1			15,76	2,04	0,19	1,00	5,95
ACTA 1			9,89	1,59	0,19	1,00	2,74

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 2 de 3	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	2,0	DEMOLICIONES	ITEM	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria



AREA TOTAL ACTA No. 1 = 160.95 M2 CALLE 56 ENTRE CRAS 2W - 3W MUTIS



LONG. SARDINEL = 36,30 M ACTA No. 1 LONG. SARDINEL = 18.55 M

AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES




LONG. SARDINEL = 63.70 M LONG. SARDINEL = 76.87 M

AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



LONG. SARDINEL = 96,15 M

AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

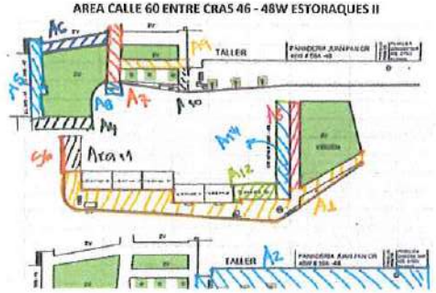

	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 2	Demolición de Sardinel		36,30	0,20	0,42	1,00	3,05
	Costado Occidente Cra 2W Calles 56-59						
	Carrera 2W Calle 56-57						
ACTA 2	Area No. 1		3,20	3,25	0,12	1,00	1,25
	SAUCES						
	Calle 63A entre Cra 1 - 3						
ACTA 2	Demolición Area No. 1		79,17	1,70	0,12	1,00	17,01
ACTA 2	Demolición de Sardinel		79,17	0,20	0,30	1,00	4,75
ACTA 2	Demolición Area No. 2		71,27	2,13	0,12	1,00	18,22
ACTA 2	Demolición de Sardinel		71,27	0,20	0,40	1,00	5,70
	REAL DE MINAS						
	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental						
ACTA 2	Area No. 1		7,20	1,52	0,12	1,00	1,31
ACTA 2	Area No. 2		15,00	1,41	0,12	1,00	2,54
ACTA 2	Area No. 3		17,10	1,34	0,12	1,00	2,75
ACTA 2	Area No. 4		6,20	1,28	0,12	1,00	0,95
ACTA 2	Area No. 5		2,45	0,76	0,12	1,00	0,22
ACTA 2	Demolición de Sardinel		96,15	0,20	0,35	1,00	6,73
ACTA 2	Demolición de Jardinera		60,70	0,40	0,12	1,00	2,91
	BARRIO ESTORAQUES II						
	Calle 60 entre Cras 46W - 48W						
ACTA 2	Demolición de Sardinel S1		33,62	0,20	0,36	1,00	2,42
ACTA 2	Demolición de Sardinel S2		11,99	0,20	0,36	1,00	0,86
ACTA 2	Demolición de Sardinel S3		1,80	0,20	0,36	1,00	0,13
ACTA 2	Demolición de Sardinel S4		6,48	0,20	0,36	1,00	0,47
ACTA 2	Demolición de Sardinel S5		28,30	0,20	0,36	1,00	2,04
ACTA 2	Area No. 2		83,87	1,00	0,12	1,00	10,06
ACTA 2	Area No. 4		7,82	1,80	0,12	1,00	1,69
ACTA 2	Area No. 5		17,13	1,00	0,12	1,00	2,06
ACTA 2	Area No. 6		10,88	1,00	0,12	1,00	1,31
ACTA 2	Area No. 7		11,76	1,00	0,12	1,00	1,41

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	GOBERNAR ES HACER	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 3 de 3	


FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	2,0	DEMOLICIONES	ITEM	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Viola
Firma Residente de interventoria



AREA CALLE 89 CRA 24 - 25 NORTE DIAMANTE II



AREA 1 = 258.49 M2 AREA 2 = 165.84 M2

ACTA 2	Rampa A8		3,00	1,00	0,12	1,00	0,36
ACTA 2	Area No. 9		9,39	1,00	0,12	1,00	1,13
ACTA 2	Area No. 10		2,99	1,00	0,12	1,00	0,36
ACTA 2	Area No. 11		12,00	2,22	0,12	1,00	3,20
ACTA 2	Demolición de Sardinel S8		8,65	0,16	0,36	1,00	0,50
ACTA 2	Area 12		5,90	1,90	0,12	1,00	1,35
ACTA 2	Area 13		8,15	2,40	0,12	1,00	2,35
ACTA 2	Area 14		12,00	1,96	0,12	1,00	2,82
ACTA 2	Demolición de Sardinel S7		11,70	0,20	0,36	1,00	0,84
	BARRIO DIAMANTE						
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE						
ACTA 2	Espacio público Area 1		258,49		0,12	1,00	31,02
ACTA 2	Espacio público Area 2		165,84		0,12	1,00	19,90
ACTA 2	Sardinel		134,70	0,20	0,40	1,00	10,78
		PAGADO EN ACTA No1					- 87,28
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	164,45
						Cantidad	
						TOTAL	164,45

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / 7G7 S.A.S Construcción y Consultoría	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 1 de 3	

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	3,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 56 ENTRE CARRERAS 2W Y 3W



ACTA 2 = LONG. SARDINEL = 36.30 M

LONG. SARDINEL = 52.5 M

AREA TOTAL CRA 2W CALLE 56 - 59 OCCIDENTAL MUTIS




AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES


NARANJOS - SAUCES



MUTIS -SAUCES



AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Excavación para Sardinel						
ACTA 1	Area 1		18,55	0,27	0,50	1,00	2,50
ACTA 1	Area 2		8,00	1,97	0,15	1,00	2,36
ACTA 1	Area 3		37,10	2,58	0,15	1,00	14,36
ACTA 1	Area 4		17,19	1,75	0,15	1,00	4,51
			2,92	1,11	0,15	1,00	0,49
	Costado Occidente Cra 2W Calles 56-59						
	Carrera 2W Calle 56 - 57						
ACTA 1	Excavación para tableta						
ACTA 1	Excavación para Sardinel		40,94	2,97	0,15	1,00	18,24
	Carrera 2W Calle 57 - 58		40,94	0,19	0,15	1,00	1,17
ACTA 1	Excavación para tableta						
ACTA 1	Excavación para Sardinel		45,35	2,97	0,15	1,00	20,20
	Carrera 2W Calle 58 - 59		45,35	0,19	0,15	1,00	1,29
ACTA 1	Excavación para tableta						
ACTA 1	Excavación para Sardinel		25,74	2,97	0,15	1,00	11,47
			21,74	0,19	0,15	1,00	0,62
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 1							
ACTA 1	Calle 60 Cra 46W - 48W		3,41	2,11	0,15	1,00	1,08
ACTA 1			12,20	2,98	0,15	1,00	5,45
ACTA 1			15,76	2,04	0,15	1,00	4,82
			9,86	1,50	0,15	1,00	2,22
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 2	Excavación para Sardinel						
ACTA 2	Excavación para Bordillo		36,30	0,30	0,40	1,00	4,36
			16,00	0,30	0,30	1,00	1,44
	Costado Occidente Cra 2W Calles 56-59						
	Carrera 2W Calle 56 - 57						

Alcaldía de Bucaramanga	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 2 de 3	


FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	3,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria



AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

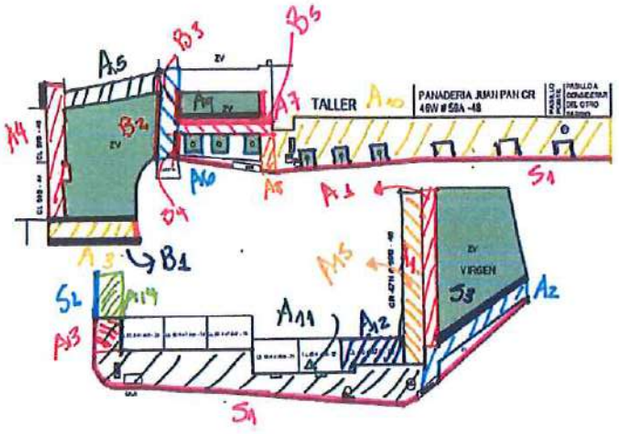

ACTA 2	Excavación Jardineras		4,70	0,40	0,30	6,00	3,38
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 2	Excavación Jardineras		4,70	0,40	0,30	9,00	5,08
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 2	Excavación Jardineras		4,60	0,40	0,30	3,00	1,66
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 1		79,17	2,08	0,10	1,00	16,47
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 2		71,27	2,55	0,10	1,00	18,17
ACTA 2	Excavación Sardinel S1		76,87	0,30	0,25	1,00	5,77
ACTA 2	Excavación contenedores de raices Parte 1		3,52	0,30	0,25	12,00	3,17
ACTA 2	Excavación Sardinel S2		63,70	0,20	0,46	1,00	5,88
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Excavación Sardinel S1		96,15	0,30	0,40	1,00	11,54
ACTA 2	Excavación Tableta Area 1		92,05	2,15	0,10	1,00	19,79
ACTA 2	Excavación contenedores C1		2,64	0,30	0,35	11,00	3,05
ACTA 2	Excavación bordillo confinamiento B1		60,70	0,30	0,35	1,00	6,37
	BARRIO ESTORAQUES II						
	Calle 60 entre Cras 46W - 48W						
ACTA 2	Area No. 8		2,99	1,00	0,20	1,00	0,60
ACTA 2	Area No. 9		7,70	0,50	0,20	1,00	0,77
ACTA 2	Excavación Sardinel S1		82,87	0,35	0,40	1,00	11,60
ACTA 2	Excavación Sardinel S2		8,65	0,35	0,40	1,00	1,21
ACTA 2	Excavación Sardinel S3		9,50	0,30	0,40	1,00	1,14
ACTA 2	Area No. 10		91,86	1,00	0,20	1,00	18,37
ACTA 2	Area No. 11		72,33	1,00	0,20	1,00	14,47
ACTA 2	Excavación Jardineras 1-6		31,97	0,35	0,35	1,00	3,92
ACTA 2	Excavación Bordillo B1		6,80	0,30	0,20	2,00	0,82
ACTA 2	Excavación Bordillo B2		4,70	0,30	0,25	1,00	0,35
ACTA 2	Excavación Bordillo B3		9,90	0,30	0,25	1,00	0,74
ACTA 2	Excavación Bordillo B4		1,80	0,30	0,25	1,00	0,14
ACTA 2	Excavación Jardineras 1-3		11,10	0,30	0,25	1,00	0,83
ACTA 2	Area No. 12		5,90	1,90	0,10	1,00	1,12
ACTA 2	Area No. 13		12,00	2,26	0,10	1,00	2,71
ACTA 2	Area No. 14		8,15	2,26	0,10	1,00	1,84
ACTA 2	Excavación Sardinel S4		20,35	0,30	0,45	1,00	2,75
ACTA 2	Area No. 15		12,00	1,96	0,10	1,00	2,35

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / 7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 3 de 3		

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		


CAPÍTULO	3,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	UNID.	M3

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

AREA CALLE 89 CRA 24 - 25 NORTE DIAMANTE II



	BARRIO DIAMANTE						
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE						
ACTA 2	Calle 89 entre Cra 24 y cra 25 Norte Area 1		258,49		0,10	1,00	25,85
ACTA 2	Calle 89 entre Cra 24 y cra 25 Norte Area 2		165,84		0,10	1,00	16,58
ACTA 2	Sardinel S1		69,93	0,30	0,40	1,00	8,39
ACTA 2	Sardinel S2		82,20	0,30	0,40	1,00	9,86
		PAGADO EN ACTA No1					- 90,78
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	232,52
						Cantidad	
						TOTAL	232,52

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / 7G7 S.A.S Construcción y Consultoría	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 1 de 2	

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		


CAPÍTULO	3,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	UNID.	M3


Observación:


ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO



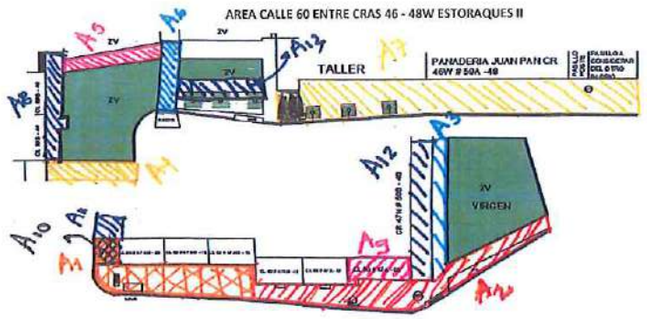



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Area 1	SubBase para anden	8,00	1,97	0,15	1,00	2,36
ACTA 1	Area 1	Recuperacion de subrasante	8,00	1,97	0,10	1,00	1,58
ACTA 1	Area 2	SubBase para anden	37,10	2,58	0,15	1,00	14,36
ACTA 1	Area 2	Recuperacion de subrasante	37,10	2,58	0,10	1,00	9,57
ACTA 1	Area 3	SubBase para anden	17,19	1,75	0,15	1,00	4,51
ACTA 1	Area 3	Recuperacion de subrasante	17,19	1,75	0,10	1,00	3,01
ACTA 1	Area 4	SubBase para anden	2,92	1,11	0,15	1,00	0,49
ACTA 1	Area 4	Recuperacion de subrasante	2,92	1,11	0,10	1,00	0,32
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 1	Area para tableta	SubBase para anden	8,57	3,66	0,15	1,00	4,70
ACTA 1	Area para tableta	Recuperacion de subrasante	8,57	3,66	0,10	1,00	3,14
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 1	Area para tableta	SubBase para anden	25,74	3,66	0,15	1,00	14,13
ACTA 1	Area para tableta	Recuperacion de subrasante	25,74	3,66	0,10	1,00	9,42
	Carrera 2W Calle 56 - 57		Area		Espesor		
ACTA 1	Area para tableta	SubBase para anden	131,29		0,15	1,00	19,69
ACTA 1	Area para tableta	Recuperacion de subrasante	131,29		0,10	1,00	13,13
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 1		SubBase para anden	3,41	2,11	0,15	1,00	1,08
ACTA 1		Recuperacion de subrasante	3,41	2,11	0,10	1,00	0,72
ACTA 1		SubBase para anden	12,20	2,98	0,15	1,00	5,45
ACTA 1	Calle 60 Cra 46W - 48W	Recuperacion de subrasante	12,20	2,98	0,10	1,00	3,64
ACTA 1		SubBase para anden	15,76	2,04	0,15	1,00	4,82
ACTA 1		Recuperacion de subrasante	15,76	2,04	0,10	1,00	3,22
ACTA 1		SubBase para anden	9,86	1,50	0,15	1,00	2,22
ACTA 1		Recuperacion de subrasante	9,86	1,50	0,10	1,00	1,48
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 2	Relleno de Sardinel		41,40	0,10	0,35	1,00	1,45
	Carrera 2W Calle 56 - 57						
ACTA 2	Relleno Sardinel		36,36	0,10	0,35	1,00	1,27
ACTA 2	Relleno Contenedores		4,70	0,15	0,40	6,00	1,69
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 2	Relleno Sardinel		28,25	0,10	0,35	1,00	0,99
ACTA 2	Relleno Contenedores		4,70	0,15	0,40	9,00	2,54

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068	
		Versión: 1.0	
		Fecha aprobación:	
		Página 2 de 2	

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL


OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

CAPÍTULO	3,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	UNID.	M3


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria




AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



AREA CALLE 89 CRA 24 - 25 NORTE DIAMANTE II



	Carrera 2W Calle 58 - 59								
ACTA 2	Relleno Sardinel		16,42	0,10	0,35	1,00	0,57		
ACTA 2	Relleno Contenedores		4,70	0,15	0,40	3,00	0,85		
	SAUCES								
	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 1								
ACTA 2	Relleno Area No. 1		66,40	1,71	0,15	1,00	17,03		
ACTA 2	Relleno Sardinel S1		76,87	0,15	0,35	1,00	4,04		
ACTA 2	Subbase contenedores		39,66	0,15	0,30	1,00	1,78		
	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 2								
ACTA 2	Relleno Area No. 2		63,40	2,55	0,15	1,00	24,25		
ACTA 2	Relleno Sardinel S2		68,00	0,15	0,37	1,00	3,77		
	BARRIO ESTORAQUES II								
	Calle 60 Cra 46W - 48W								
ACTA 2	Area No. 6		10,75	1,00	0,15	1,00	1,61		
ACTA 2	Area No. 7		72,59	1,00	0,20	1,00	14,52		
ACTA 2	Area No. 8		17,25	1,00	0,15	1,00	2,59		
ACTA 2	Sardinel S1		82,67	0,15	0,30	1,00	3,73		
ACTA 2	Area No. 9		5,90	1,90	0,10	1,00	1,12		
ACTA 2	Area No. 10		12,00	2,26	0,15	1,00	4,07		
ACTA 2	Area No. 11		8,15	2,26	0,15	1,00	2,76		
ACTA 2	Area No. 12		12,00	1,86	0,14	1,00	3,29		
ACTA 2	Area No. 13		9,39	1,00	0,13	1,00	1,22		
	REAL DE MINAS								
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		92,35	1,59	0,13	1,00	23,69		
ACTA 2	Sardinel S1		71,68	0,20	0,35	1,00	5,02		
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE								
ACTA 2	Area Parte 1		258,40		0,15	1,00	38,77		
ACTA 2	Area Parte 2		165,84		0,15	1,00	24,88		
ACTA 2	Sardinel S1		52,50	0,20	0,30	1,00	3,15		
ACTA 2	Sardinel S2		82,20	0,20	0,30	1,00	4,93		
		PAGADO EN ACTA No1						-	123,04
		PAGADO EN ACTA No2							-
		PAGADO EN ACTA No3							-
		PAGADO EN ACTA No4							-
							Subtotal		195,78
							Cantidad		
							TOTAL		195,78

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 1 de 2	

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	UNID.	M2

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra


ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

AREA TOTAL ACTA No. 1 = 160.95 M2 CALLE 56 ENTRE CRAS 2W - 3W MUTIS



AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

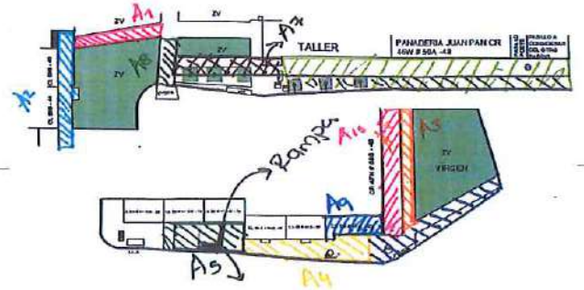

AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
ACTA 1	Carrera 2W Calle 56 - 57		47,76	3,42		1,00	163,33
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-6,00	-11,25
ACTA 1	Descuento de Sardinel		47,76	0,20		-1,00	-9,55
ACTA 1	Descuento de Franja ambiental		42,38	1,25		-1,00	-52,98
ACTA 1	Carrera 2W Calle 57 - 58		45,35	3,52		1,00	159,63
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-8,00	-15,00
ACTA 1	Descuento de Sardinel		45,35	0,20		-1,00	-9,07
ACTA 1	Descuento de Franja ambiental		45,35	1,25		-1,00	-56,69
ACTA 1	Carrera 2W Calle 58 - 59		38,82	3,54		1,00	137,41
ACTA 1	Descuento de jardineras		1,25	1,50		-4,00	-7,50
ACTA 1	Descuento de Sardinel		18,94	0,20		-1,00	-3,79
ACTA 1	Descuento de Franja ambiental		22,18	1,25		-1,00	-27,73
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 1	Calle 60 Cra 46W - 48W		3,41	2,11		0,50	3,60
ACTA 1			12,20	2,96		0,50	18,18
ACTA 1			15,78	2,04		0,50	16,08
ACTA 1			9,86	1,50		0,50	7,40
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 2	Areas No. 1 y No. 2		45,10	2,83		1,00	127,63
ACTA 2	Areas No. 4		10,00	1,75		1,00	17,50
	BARRIO ESTORAQUES II						
ACTA 2	Calle 60 Cra 46W - 48W						
ACTA 2	Area No. 1		8,74	1,12		1,00	9,79
ACTA 2	Area No. 2		15,51	1,00		1,00	15,51
ACTA 2	Area No. 3		15,08	1,00		1,00	15,08
ACTA 2	Area No. 6		23,64	1,60		1,00	37,82
ACTA 2	Area No. 7		10,40	1,40		1,00	14,56
ACTA 2	Area No. 8		3,70	1,60		1,00	5,92
ACTA 2	Area No. 9		5,90	1,90		1,00	11,21
ACTA 2	Area No. 10		12,00	1,96		1,00	23,52
ACTA 2			3,41	2,11		0,50	3,60
ACTA 2	Calle 60 Cra 46W - 48W		12,20	2,96		0,50	18,18

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página 2 de 2	

FECHA	20/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	UNID.	M2

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria



ACTA 2			15,76	2,04		0,50	16,08
ACTA 2			9,86	1,50		0,50	7,40
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Zona 1		66,40	1,71		1,00	113,54
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Zona 2		63,70	1,85		1,00	117,85
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		37,35	2,13		1,00	79,56
ACTA 2			60,80	2,09		1,00	127,07
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE						
ACTA 2	Espacio publico Area 1		131,11	1,00		0,40	52,44
ACTA 2	Espacio publico Area 2		169,84	1,00		0,40	66,34
		PAGADO EN ACTA No1					- 312,07
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	880,60
						Cantidad	
						TOTAL	880,60

	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	UNID.	M


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 56 ENTRE CARRERAS 2W Y 3W



CARRERA 2W ENTRE CALLES 56 - 57




CARRERA 2W ENTRE CALLES 57 - 58




CARRERA 2W ENTRE CALLES 58 - 59



AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

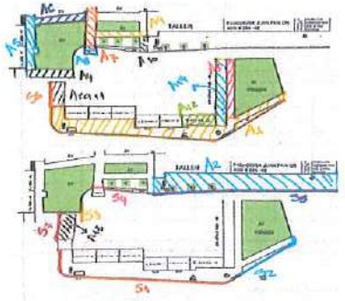

NARANJOS - SAUCES



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	Cantidad	
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Instalación de Sardinel		12,30				12,30
	Estoraques						
	Calle 60 Cra 46W - 48W						
	BARRIO MUTIS						
ACTA 1	Instalación de Sardinel		34,00				34,00
	Carrera 2W Calle 56 - 57						
ACTA 1	Instalación de Sardinel		33,14				33,14
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 1	Instalación de Sardinel		45,35				45,35
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 1	Instalación de Sardinel		21,74				21,74
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 2	Instalación de Sardinel Zona No. 1		29,10				29,10
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 2	Instalación de Sardinel		7,80				7,80
	ESTORAQUES II						
ACTA 2	Sardinel S1		34,30				34,30
ACTA 2	Sardinel S2		11,99				11,99
ACTA 2	Sardinel S3		1,80				1,80
ACTA 2	Sardinel S4		6,48				6,48
ACTA 2	Sardinel S5		28,30				28,30
ACTA 2	Sardinel S6		8,65				8,65
ACTA 2	Sardinel S7		11,70				11,70
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 S1		73,60				73,60
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 S2		63,70				63,70
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		92,35				92,35
	CALLE 69 ENTRE CARRERA 24 Y 28 COSTADO NORTE						
ACTA 2	Espacio publico		134,70				134,70

Alcaldía de Bucaramanga	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	UNID.	M

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vilota
Firma Residente de interventoria



	PAGADO EN ACTA No1		- 146,53
	PAGADO EN ACTA No2		-
	PAGADO EN ACTA No3		-
	PAGADO EN ACTA No4		-
		Subtotal	504,47
		Cantidad	
		TOTAL	504,47

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	UNID.	UND

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra


ARQ. Juan Carlos Viola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

AREA TOTAL CRA 2W CALLE 56 - 59 OCCIDENTAL MUTIS




CALLE 56 ENTRE CRAS 2W - 3W MUTIS




AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



AREA CALLE 89 CRA 24 - 25 NORTE DIAMANTE II



AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	ESTORAQUES						
ACTA 2	Calle 60 Cra 46W - 48W					3,00	3,00
	BARRIO MUTIS						
ACTA 2	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W					2,00	2,00
ACTA 2	Carrera 2W Calle 56 - 57					1,00	1,00
ACTA 2	Carrera 2W Calle 57 - 58					1,00	1,00
ACTA 2	Carrera 2W Calle 58 - 59					1,00	1,00
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental					2,00	2,00
	DIAMANTE II						
ACTA 2	Calle 89 entre Cra 24 - 25 Norte					2,00	2,00
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Area 1					1,00	1,00
		PAGADO EN ACTA No1					-
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	13,00
						Cantidad	
						TOTAL	13,00

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4,5	Franja de ajuste al predio	UNID.	M

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 56 ENTRE CARRERAS 2W Y 3W



CARRERA 2W ENTRE CALLES 56 - 57



CARRERA 2W ENTRE CALLES 57 - 58



CARRERA 2W ENTRE CALLES 58 - 59



AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
	Costado sur de la calle 58 entre Cra 2W y 3W						
ACTA 1	Franka de ajuste		12,30				12,30
	Calle 60 Cra 46W - 48W						
ACTA 1	Franka de ajuste		34,00				34,00
	Carrera 2W Calle 55 - 57						
ACTA 1	Franka de ajuste		33,14				33,14
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 1	Franka de ajuste		45,35				45,35
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 1	Franka de ajuste		21,74				21,74
	BARRIO MUTIS						
	Carrera 2W Calle 56 - 57						
ACTA 2	Area No. 1		3,84				3,84
ACTA 2	Area No. 2		2,16				2,16
ACTA 2	Area No. 3		2,52				2,52
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 2	Area No. 4		2,83				2,83
ACTA 2	Area No. 5		5,11				5,11
ACTA 2	Area No. 7		1,66				1,66
ACTA 2	Area No. 8		2,62				2,62
ACTA 2	Area No. 9		3,60				3,60
ACTA 2	Area No. 10		9,47				9,47
ACTA 2	Area No. 4.1		4,40				4,40
ACTA 2	Area No. 6.1		2,59				2,59
ACTA 2	Area No. 11		1,81				1,81
ACTA 2	Area No. 12		2,10				2,10
ACTA 2	Area No. 13		3,80				3,80
ACTA 2	Area No. 14		3,64				3,64
ACTA 2	Area No. 15		3,25				3,25
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		98,15				98,15

	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4,5	Franja de ajuste al predio	UNID.	M

Observación:


ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria



AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES

F1



	SAUCES							
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Pared 1		66,40					66,40
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Pared 2		60,00					60,00
	CALLE 69 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE							
ACTA 2	Espacio publico		144,00					144,00
		PAGADO EN ACTA No1						- 146,53
		PAGADO EN ACTA No2						-
		PAGADO EN ACTA No3						-
		PAGADO EN ACTA No4						-
							Subtotal	423,95
							Cantidad	
							TOTAL	423,95

Alcaldía de Bucaramanga	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	4,0	ESPACIO PUBLICO	ITEM	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	UNID.	M2

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO


CARRERA 2W ENTRE CALLES 56 - 57




CARRERA 2W ENTRE CALLES 57 - 58



CARRERA 2W ENTRE CALLES 58 - 59



AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
	Carrera 2W Calle 56 - 57						
ACTA 1	Zona franja Ambiental		42,38	1,25		1,00	52,98
ACTA 1	Descuento de Jardineras		1,25	1,50		-6,00	-11,25
	Carrera 2W Calle 57 - 58						
ACTA 1	Zona franja Ambiental		45,35	1,25		1,00	56,69
ACTA 1	Descuento de Jardineras		1,25	1,50		-8,00	-15,00
	Carrera 2W Calle 58 - 59						
ACTA 1	Zona franja Ambiental		22,18	1,25		1,00	27,73
ACTA 1	Descuento de Jardineras		1,25	1,50		-4,00	-7,50
	BARRIO ESTORAQUES II						
	Calle 60 entre Cras 46W - 48W						
ACTA 2	Area No. 1		19,84	1,00		1,00	19,84
ACTA 2	Area No. 2		3,49	1,00		1,00	3,49
		PAGADO EN ACTA No1					-103,65
		PAGADO EN ACTA No2					0,00
		PAGADO EN ACTA No3					0,00
		PAGADO EN ACTA No4					0,00
						Subtotal	23,33
						Cantidad	
						TOTAL	23,33

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO	5,1	OBRAS COMPLEMENTARIAS	ITEM	5.1	Realce cajas de servicios publicos	UNID.	UND


Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 56 ENTRE CARRERAS 2W Y 3W



ESTORAQUES



CARRERA 2W ENTRE CALLES 56 - 57



CARRERA 2W ENTRE CALLES 57 - 58



CARRERA 2W ENTRE CALLES 58 - 59



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	BARRIO MUTIS						
ACTA 1	Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W		8,00				8,00
ACTA 1	Carrera 2W Calle 56 - 57		4,00				4,00
ACTA 1	Carrera 2W Calle 57 - 58		1,00				1,00
ACTA 1	Carrera 2W Calle 58 - 59		4,00				4,00
	ESTORAQUES						
ACTA 1	Calle 60 Cra 46W - 46W		16,00				16,00
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO SUR						
ACTA 2	Espacio publico		7,00				7,00
	CALLE 89 ENTRE CARRERA 24 Y 25 COSTADO NORTE						
ACTA 2	Espacio publico		8,00				8,00
		PAGADO EN ACTA No1					
		PAGADO EN ACTA No2					- 33,00
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	15,00
						Cantidad	
						TOTAL	15,00

7G7 S.A.S

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESRUCTURA
PLAN DE MANEO AMBIENTAL

GOBIERNAR ES HACER

ANEXO MAO ACTA DE OBRA #1

CONTRATO: 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3

PERÍODO FACTURADO: Marzo 16 de 2023 a abril 30 de 2023 **FECHA PRESENTE ACTA:** 2 de mayo de 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	UND.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
Manejo de Residuos Sólidos								
Bolsas de colores de 70 X 100 Cm rollo por 100 Un	Rollo	4	$ 79.800	$ 319.200	1	$ 79.800	1	$ 79.800
Plástico negro calibre 4 ancho de 3 m (para el cubrimiento de materiales)	Rollo	2	$ 473.236	$ 946.472	1	$ 473.236	1	$ 473.236
Kit Control De Derrames de sustancias químicas	UND	1	$ 159.000	$ 159.000	1	$ 159.000	1	$ 159.000
Estibas almacenamiento de sustancias químicas	UND	2	$ 35.000	$ 70.000		$ 0	0	$ 0
Buggy metálico	UND	1	$ 281.900	$ 281.900	1	$ 281.900	1	$ 281.900
Dispositivos para canalizar el tránsito								
Baliza o delineador tubular, con 3 bandas reflectivas blancas grado diamante (zonas de almacenamiento de materiales de construcción, residuos de construcción y demoliciones)	UND	30	$ 52.000	$ 1.560.000	30	$ 1.560.000	30	$ 1.560.000
Ubicación y dotación de campamentos								
Señales de campamento - avisos en poliestileno de 30 x 50 cm (uso de EPP, extintor, camilla, botiquín, salida de evacuación, sustancias peligrosas, etc.)	UND	6	$ 11.900	$ 71.400		$ 0	0	$ 0
Extintor ABC 20 LB (más dos recargas)	UND	3	$ 115.900	$ 347.700	1	$ 115.900	1	$ 115.900
Botiquín cruz roja de primeros auxilios	UND	3	$ 110.000	$ 330.000	3	$ 330.000	3	$ 330.000
Baños portátiles	UND	2	$ 750.000	$ 1.500.000	0,5	$ 375.000	0,5	$ 375.000
Demarcación del área de trabajos								
Tela verde para protección 2.10mt x 100 mt	Rollo	3	$ 282.900	$ 848.700	2	$ 565.800	2	$ 565.800
Malla naranja para cerramiento 1m * 45m	Rollo	6	$ 120.000	$ 720.000	4	$ 480.000	4	$ 480.000
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, 12 cm de alto, color naranja - blanco o amarillo- negro).	Rollo	6	$ 38.281	$ 229.686	4	$ 153.124	4	$ 153.124
VALOR TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL				7.384.058		4.573.760		4.573.760
			ADMINISTRACION 33%	$ 2.436.739		$ 1.509.341		$ 1.509.341
			UTILIDAD 5%	$ 369.203		$ 228.688		$ 228.688
			COSTO TOTAL	$ 10.190.000		$ 6.311.789		$ 6.311.789
VALOR AUTORIZADO A COBRAR PRESENTE ACTA (25% DEL PRESUPUESTO TOTAL MAO)						$ 2.547.500		$ 2.547.500
CALIFICACIÓN						93%		93%
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA						$ 2.369.175		$ 2.369.175
								0,2330

Firma: _____
Nombre: MONICA LILIANA QUINTERO
Contratista 7G7 SAS

Firma: _____
Nombre : JUAN CARLOS VITOLA
Interventor JESAK SAS

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAN MANEJO TRANSITO

GOBERNAR ES HACER

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

No.	Descripción	UNIDAD	Cant.	Dedicación (%) O %	Sueldo o Valor U.	% Prest.	Plazo (Meses)	Valor Parcial
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO**							
1,01	ASESOR DE TRANSITO	UND	1,00	50,00%	$ 4.950.000,00	54,00%	1,0	$ 3.811.500,00
1.02	INSPECTOR RECORREDOR DE TRAFICO	UND	0,00	100,00%	$ 1.200.000,00	54,00%	1,0	$ 0,00
1.03	CONTROLADOR TRAFICO (PALETEROS)	UND	3,00	100,00%	$ 1.050.000,00	54,00%	1,0	$ 4.851.000,00
	SUBTOTAL 1 PLAN DE MANEJO (PERSONAL)							**$ 8.662.500,00**
2,00	**PLAN MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVO SEÑALIZACION)**							
2.01	DISPOSITIVOS DE CONTROL							
2.02	ALQUILER BARRICADAS	UND	3		$ 416.500			$ 1.249.500,00
2.03	ALQUILER FLECHAS LUMINOSAS	UND	0		$ 620.000			$ 0,00
2.04	ALQUILER LINTERNAS REGULACION	UND	0		$ 75.000			$ 0,00
2.05	ALQUILER PALETAS PARE SIGA 45 cm	UND	4		$ 38.500			$ 154.000,00
2.06	ALQUILER DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS)	UND	0		$ 33.320			$ 0,00
2.07	ALQUILER BARRERAS PLASTICAS (MALETINES TIPO NEWJERSEY)	UND	0		$ 286.600			$ 0,00
2.08	CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE"	ML	6000		$ 55			$ 330.000,00
2.09	ALQUILER FLASHER LUMINOSO	UND	0		$ 92.937			$ 0,00
	SEÑALIZACION							
2,10	ALQUILER SEÑALIZACIÓN DE PRIMER NIVEL (PASAVIAS EN TELA 6 MTS X 0.90 MTS, incluye instalación)	UND	0	100,00%	$ 214.200			$ 0,00
2,11	ALQUILER SEÑAL VERTICAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL (FIJAS) SR - SP DE 60 CM	UND	0	100,00%	$ 190.400			$ 0,00
2,12	ALQUILER SEÑALES MOVILES DE APROXIMACIÓN DE 60 CM	UND	5	100,00%	$ 154.700			$ 773.500,00
	DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO							
	DERECHOS DTB PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ALTO IMPACTO	UNID.	0	100,00%	$ 945.000			$ 0,00
	ELABORACION PLAN DE MANEJO DE TRANSIDO	UNID.	0		$ 2.500.000			$ 0,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SEGUIMIENTO	UNID.	1	100,00%	$ 62.900			$ 62.900,00
	SUBTOTAL 2 PLAN MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVO CONTROL, SEÑALIZACION Y DERECHOS DE TRANSITO)							**$ 2.569.900,00**
							SUBTOTAL 1 + 2	**$ 11.232.400,00**
							ADMINISTRACION 33%	**$ 3.706.692,00**
							UTILIDAD 5%	**$ 185.334,60**
							COSTO TOTAL	**$ 15.124.427,00**
								0,25000

Firma:
Nombre: MONICA LILIANA QUINTERO
Contratista 7G7 SAS

Firma:
Nombre : JUAN CARLOS VITOLA
Interventor JESAK SAS

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO			ITEM	NP-1	Bordillo prefabricado UC-B20 para confinamiento zonas verdes (80*20*35) o similar	UNID.	M

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra


ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO


AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



AREA TOTAL CRA 2W CALLE 56 - 59 OCCIDENTAL MUTIS



AREA CALLE 60 ENTRE CRAS 46 - 48W ESTORAQUES II

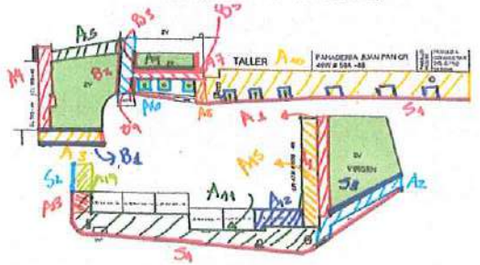

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	SAUCES						
ACTA 2	Contenedor del 1 al 10		3,26			10,00	32,60
ACTA 2	Contenedor 11		3,46			1,00	3,46
ACTA 2	Contenedor 12		3,60			1,00	3,60
	BARRIO MUTIS						
ACTA 2	Carrera 2W Calle 56 - 57		4,70			6,00	28,20
ACTA 2	Carrera 2W Calle 57 - 58		4,70			9,00	42,30
ACTA 2	Carrera 2W Calle 58 - 59		4,70			3,00	14,10
	BARRIO ESTORAQUES II						
	Calle 60 Cra 46W - 48W						
ACTA 2	Bordillo de Jardineras		2,86			9,00	25,75
ACTA 2	Bordillo Contención B1		18,30			1,00	18,30
ACTA 2	Bordillo Contención B2		2,00			1,00	2,00
ACTA 2	Bordillo Contención B3		7,30			1,00	7,30
ACTA 2	Bordillo Contención B4		0,60			1,00	0,60
		PAGADO EN ACTA No1					-
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	178,21
						Cantidad	
						TOTAL	178,21

7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página	

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO			ITEM	NP-7	Franja de resane o ajustes en concreto de 3000 PSI en zona vía-sardinel, anchos menores a 5 cm.	UNID.	M

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra

ARQ. Juan Carlos Vitola
Firma Residente de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



AREA CALLE 63A ENTRE CRAS 1 - 3 SAUCES



F1

ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Area 1 Cra 8 entre Calle 61 - 62 Occidental		92,35			1,00	92,35
	SAUCES						
ACTA 2	Calle 63A entre Cra 1 - 3 Parte 1		76,87			1,00	76,87
		PAGADO EN ACTA No1					
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	169,22
						Cantidad	
						TOTAL	169,22

Alcaldía de Bucaramanga	GOBERNAR ES HACER	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	16/06/2023	ELABORO	ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III		

CAPÍTULO			ITEM	NP-12	Bordillo prefabricado para confinamiento zonas verdes (100*10*30) o similar	UNID.	M

Observación:

ING MÓNICA QUINTERO CARVAJAL
Firma Residente de obra


ARQ. Juan Carlos Viola
Firma Residente de interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO

AREA CRA 8 ENTRE CALLES 61 - 62 REAL DE MINAS



AREA TOTAL ACTA No. 1 = 160.95 M2 CALLE 56 ENTRE CRAS 2W - 3W MUTIS



ACTA	Direccion	DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	REAL DE MINAS						
ACTA 2	Contenedor del 1 al 10		3,26			10,00	32,60
ACTA 2	Contenedor 11		3,46			1,00	3,46
ACTA 2	Contenedor 12		3,60			1,00	3,60
ACTA 2	Bordillo contención Area 1		60,70			1,00	60,70
	MUTIS						
ACTA 2	Bordillo Costado sur de la calle 56 entre Cra 2W y 3W		16,00			1,00	16,00
		PAGADO EN ACTA No1					-
		PAGADO EN ACTA No2					-
		PAGADO EN ACTA No3					-
		PAGADO EN ACTA No4					-
						Subtotal	116,36
						Cantidad	
						TOTAL	116,36

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 429 de 2022
INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3”

INFORME HSEQ No.3 INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Firma Nombre	 Ing. María Fernanda Martínez	
Nombre	**Ing. María Fernanda Martínez**	**Ing. Vladimir Polo Paz**
Cargo	**Profesional HSEQ**	**Director de Interventoría**
	Elaboró	**Aprobó**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 4
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. MARCO NORMATIVO 5
4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 6
4.1 Recurso Humano Interventoría. 6
4.2 Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 6
5.1 Componente A – Cumplimiento a obligaciones A&SST contractuales 7
5.2 Componente B – Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas. 10
5.2.1 Manejo de Campamentos Fijos y/o Temporales. 10
5.2.2 Manejo materiales de construcción. 10
5.2.3 Manejo integral de residuos sólidos. 10
5.2.4 Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites. 12
5.2.5 Control de emisiones atmosféricas. 13
5.2.6 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 13
5.3 Componente C – Manejo de vegetación y paisajismo. 13
5.4 Componente D – Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14
5.4.1 Seguridad y Salud Laboral 14
5.4.2 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. 17
5.5 Componente E – Programa de señalización de Seguridad. 18
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A&SST 18
7. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 19
8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 20
9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE A&SST. 20
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
REGISTRO FOTOGRÁFICO 24

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra. 4
Tabla 2. Personal de Interventoría – Grupo 3. 6
Tabla 3. Relación Personal Profesionales – Contratista de Obra. 7
Tabla 4. Relación Personal Operativo. 8
Tabla 5. Relación Proveedores Maquinaria y Vehículos. 9
Tabla 6. Relación Personal del proyecto. 9
Tabla 7. Lista de proveedores para materiales pétreos para el contrato. 10
Tabla 8. Balance de residuos ordinarios generados en obra. 11
Tabla 9. Lista de proveedores /Gestores de RCD. 12
Tabla 10. Balance de RCD generados en el periodo. 12
Tabla 11. Residuos de Construcción y Demolición. 12
Tabla 12. Manejo de residuos líquidos. 13
Tabla 13. Verificación exámenes Médicos Ocupacionales. 14
Tabla 14. Registro de Charlas y Capacitaciones. 16
Tabla 15. Inspecciones y pre-operacionales. 16
Tabla 16. Registro de ausentismo, incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 17
Tabla 17. Seguimientos indicadores de accidentalidad. 17
Tabla 18. Relación herramientas, equipos mínimos. 17
Tabla 19. Vehículo y/o maquinaria aprobada. 18
Tabla 20. Atención de emergencias. 20

Tabla 21. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo. 20
Tabla 22. Indicadores de seguimiento al componente A&SST. 21

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Reporte del Personal. 9
Figura 2. Clasificación de Residuos sólidos 11
Figura 3. Residuos sólidos generados en obra. 11
Figura 4. Verificación Exámenes médicos. 15
Figura 5. Seguimiento ausentismo, incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 17

INTRODUCCION

La Secretaría de Infraestructura elaboró el proyecto cuyo objeto es la "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" como resultado de la utilización de recursos propios y de la implementación de la estrategia general de los Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto municipal 0159 de 2021 trazando los lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó.

Por lo anterior, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA suscribió mediante el Contrato de Interventoría No. 429 de 2022, se adjudicó a la firma JESAK S.A.S., la "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", EL cual tiene como finalidad controlar, asegurar, apoyar y verificar la ejecución y cumplimiento del contratista frente a las obligaciones contractuales y legales del Contrato de obra 417 de 2022 cuyo objeto contractual es la "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3" por parte del contratista 7G7 S.A.S.

El siguiente informe mensual HSEQ que constituye el No. 4 elaborado por la interventoría de la etapa de construcción, enfocado en la coordinación, acompañamiento y supervisión frente a las diferentes actividades y métodos en la gestión HSEQ que el Contratista estableció para el desarrollo del proyecto, de tal manera que se controle el cumplimiento y la gestión realizada de los componentes establecidos en el contrato y el Apéndice I. Lineamientos para la elaboración, implementación, seguimiento y control del componente ambiental y seguridad y salud en el trabajo durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

1. OBJETIVO

Verificar y realizar seguimiento de todas las actividades HSEQ realizadas por el contratista 7G7 S.A.S., derivadas del contrato de obra No. 417 de 2022, conforme a la normatividad legal vigente y lineamientos del componente ambiental y seguridad y salud en el trabajo del municipio de Bucaramanga.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el área HSEQ de la Interventoría JESAK SAS, a las actividades desarrolladas por el contratista 7G7 S.A.S., en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, bajo el marco de la gestión HSEQ en la ejecución de los procesos constructivos que se realizan para el proyecto denominado "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3.

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra.

GRUPO	EQUIPAMIENTO	BARRIO	ESPACIO INTERVENIDO (m^2)
GRUPO 3	6 LA CONCORDIA	LA VICTORIA	325
	7 LA CIUDADELA	REAL DE MINAS	608
	8 SUR OCCIDENTE	CORDONCILLO II	305
	9 PEDREGOSA	NUEVA GRANADA	412
	10 PROVENZA	DIAMANTE II	645
		SAN LUIS	622
	11 SUR	VILLA ALICIA	352
	12 CABECERA DEL LLANO	PUERTA DEL SOL	445
		CONUCOS	405
	14 MORRORICO	LOS SAUCES	469

GRUPO	EQUIPAMIENTO	BARRIO	ESPACIO INTERVENIDO (m^2)
	17 MUTIS	MANZANARES	418
		ESTORAQUES	433
		MUTIS	342

Fuente. Anexo técnico.

3. MARCO NORMATIVO

Constitución Nacional de Colombia 1991 - Congreso Nacional de Colombia - Rescata temas relacionados con la protección del medio ambiente y el derecho de la comunidad de gozar de un ambiente sano. Contiene la prohibición expresa de introducir al territorio Nacional sustancias Tóxicas o peligrosas.

Decreto Ley 2811 de 1974 - Presidencia de la República - *Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual se regula el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.*

Ley 99 de 1993 - Congreso Nacional de Colombia - Ley General Ambiental de Colombia. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.

Resolución 541 de 1994 - Ministerio del Medio Ambiente - Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y carga orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto 948 de 1994 - Presidencia de la República - Prohíbe el uso de combustibles contaminantes, particularmente de aceites lubricantes gastados y otros residuos considerados peligrosos.

Decreto 4741 de 2005 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT - *Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.*

Decreto 1072 de 2015 - Ministerio del Trabajo, *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.*

Decreto 1076 de 2015 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

Resolución 472 de 2017 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - *Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.*

Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 "*Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".*

Decreto 052 de 2017 - Ministerio del Trabajo - *Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).*

Resolución 0312 de 2019 - Ministerio del Trabajo - *Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.*

4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

4.1 Recurso Humano Interventoría.

La interventoría actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas especificadas de seguimiento al contratista. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales:

Tabla 2. Personal de Interventoría – Grupo 3.

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO
1	73.153.848	Vladimir Polo Paz	Director de Obra
2	8.730.310	Juan Carlos Vitola	Residente de Obra
3	1.098.679.650	María Fernanda Martínez Camaro	Profesional HSEQ
4	63.532.664	Eslendy Corzo Aguilar	Trabajador Social
5	1.098.721.930	Carlos Andrés Hernández	Inspector de Obra
6	1.098.719.251	Yini Zaidyn García Figueroa	Inspector de Obra

4.2 Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa JESAK S.A.S., a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ, lo reglamentado en la normatividad legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 1076 de 2015) realizó las siguientes actividades:

1.Exámenes médicos de ingreso.
2.Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF).
3.Proceso de Capacitación e Inducción.
4.Entrega de EPPs a su personal incluyendo mascarilla.

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, la interventoría realizó actividades de control y supervisión de las diferentes medidas ejecutadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

Para la elaboración del presente informe, esta interventoría se basó en los insumos entregados por el contratista 7G7 S.A.S., referentes a la gestión realizada durante el presente periodo, y otros tomados por esta misma interventoría para su valoración se trabajó con la metodología de identificación y valoración establecido en el numeral 4.2.4 Metodología para la evaluación de la gestión A&SST, en donde se establece que corresponde a la Interventoría evaluar, calificar el desempeño A&SST del contratista, mediante índices de cumplimiento a través de las fichas de seguimiento de labores ambientales en la fase de construcción de obra, teniendo en cuenta que se deben realizar consolidados semanales resultado de las inspecciones diarias y que la evaluación de los valores asignados de acuerdo con la importancia de los componentes ambientales se encuentran ponderados bajo el numeral 4.2.4.2 Ponderación ítems fichas de seguimiento de labores A&SST del **APENDICE I LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, es la siguiente tabla:

Tabla 3. Índice de cumplimiento por componentes.

Componente		Índice de Cumplimiento
Componente A	Cumplimiento de Obligaciones ambientales y SST contractuales.	13%
Componente B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas.	35%
Componente C	Manejo de la vegetación y el Paisajismo.	8%
Componente D	Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	39%
Componente E	Programa de Señalización en Seguridad.	5%
Total		**100%**

Anexo. Ficha de Seguimiento Labores Ambientales.

A continuación, se realiza un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos por el contratista para el manejo del componente Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la supervisión de la interventoría.

5.1 Componente A – Cumplimiento a obligaciones A&SST contractuales.

Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, el Contratista debe diligenciar y tener actualizados los formatos relacionados con la gestión A&SST y los que sean solicitados en pliego de condiciones, contar con todo el personal requerido según pliegos de condiciones, tenerla totalidad de los permisos, lineamientos, y/o autorizaciones requeridas por la AAC y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos.

Por lo cual, se realiza seguimiento y control del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra, durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, y los cuales fueron aprobados por esta interventoría.

Tabla 4. Relación Personal Profesionales – Contratista de Obra.

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Estado	Fecha Retiro
1	5653444	Jorge Humberto Pinzón Quiroga	Director de Obra	**Retirado**	**06/06/2023**
2	91207013	Victor Elias Mrad Trujillo	Director de Obra	Activo	---
3	1092341010	Mónica Liliana Quintero Carvajal	Residente de Obra	Activo	---
4	63483364	Carmen Rosa Cáceres Bayona	Profesional HSEQ	Activo	---
5	1122784042	Maryuri Natalia López Rúales	Trabajador Social	Activo	---
6	1098739789	Helver Moreno Barrios	Inspector de Obra	Activo	---
7	1098786049	Mario Esteban Hernández Fajardo	Inspector de Obra	Activo	---
8	1098783060	Angie Nicoll Tarazona Becerra	Inspector de Obra	**Retirado**	**30/06/2023**
9	91293585	Edgar Alonso Quesada	Gerente de Proyectos	Activo	---

El contratista envía documentación pendiente de los profesionales requeridos y que están aprobados por esta interventoría, se realiza el seguimiento y verificación a las afiliaciones al sistema de seguridad social integral de todo el personal de obra, esto incluye personal técnico, administrativo, operativo y proveedores.

Tabla 5. Relación Personal Operativo Activo – Retirado en el periodo.

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Estado	Fecha Ingreso	Fecha Retiro
1	1.007.189.705	Jhon Eiver Serrano León	Ayudante	Activo	10/04/2023	----
2	91.178.662	Freddy Cuadros Bastidas	Ayudante	Activo	17/04/2023	----
3	1.097.489.030	Miguel Ángel Méndez Rangel	Conductor	Activo	19/04/2023	----
4	10.077.373.421	Javier Serrano León	Ayudante	Activo	21/04/2023	----
5	1.049.023.361	Yonier Chacón Carrillo	Ayudante	Activo	21/04/2023	----
6	1.004.823.100	Jesús Alfonso Pérez Rojas	Ayudante	Activo	26/04/2023	----
7	1.134.330.000	Juan Camilo González Garisado	Ayudante	Activo	28/04/2023	----
8	13.642.925	Natanael Fonseca Quintero	Ayudante	Activo	02/05/2023	----
9	6.391.750	Yrwin Gabriel García Martinez	Ayudante	Activo	05/05/2023	----
10	91.526.196	Cesar Augusto Guevara Blanco	Maestro	Activo	08/05/2023	----
11	19.775.275	Henry Manuel Jiménez Turizo	Oficial	Activo	08/05/2023	----
12	9.694.296	Jesy Chinchilla García	Oficial	Activo	08/05/2023	----
13	1.234.339.663	Jonathan Villamizar Urbina	Ayudante	Activo	08/05/2023	----
14	1.098.633.200	Junior Santiago Benavides Ramos	Ayudante	Activo	08/05/2023	----
15	91.298.595	Wilson Cáceres Ramírez	Ayudante	Activo	08/05/2023	----
16	91.273.197	Jaime Orlando Castro Obregón	Ayudante	Activo	11/05/2023	----
17	1.095.952.201	Jhon Sebastián Aparicio Solano	Ayudante	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
18	79642430	Luis Humberto Durán Gamboa	Ayudante	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
19	91158202	Marlon Yesid Navarro Sánchez	Ayudante	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
20	11229818	Omar Andrés Pinzón Bernal	Oficial	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
21	1095822185	Oscar Javier Aparicio Solano	Ayudante	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
22	1094808657	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Supervisor	**Retirado**	**15/05/2023**	**02/06/2023**
23	1265121	Naudys Mendoza	Ayudante	Activo	17/05/2023	----
24	91531063	Omar Josué Hernández Rodríguez	Ayudante	Activo	23/05/2023	----
25	91265913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante	**Retirado**	**23/05/2023**	**02/06/2023**
26	37729364	Mary Nelsi Pallares Chogo	Auxiliar Tráfico	Activo	30/05/2023	----
27	5722582	Benjamín Román	Auxiliar Tráfico	Activo	31/05/2023	----
28	1007536608	Nicolas Eduardo Basto Torres	Ayudante	**Retirado**	**2/06/2023**	**13/06/2023**
29	91542547	Sergio Giovany Uribe Pérez	Oficial	**Retirado**	**2/06/2023**	**30/06/2023**
30	13743013	Hugo Armando Torres Barrios	Ayudante	Activo	5/06/2023	----
31	91509636	Jhon Nelson González Sánchez	Oficial	Activo	5/06/2023	----
32	1098633835	José Nicolas González Sánchez	Oficial	**Retirado**	**5/06/2023**	**17/06/2023**
33	1095954572	Kevin Andrés Ramírez Camargo	Ayudante	**Retirado**	**5/06/2023**	**21/06/2023**

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Estado	Fecha Ingreso	Fecha Retiro
34	1095912491	Yudy Verónica Pinzón Mendoza	Auxiliar Tráfico	Activo	5/06/2023	----
35	91479291	Erwing Rodríguez Duran	Ayudante	**Retirado**	**5/06/2023**	**30/06/2023**
36	13746472	John Fredy Martinez Velásquez	Maestro	**Retirado**	**5/06/2023**	**30/06/2023**
37	1090508289	Andrés Humberto Arciniegas	Oficial	**Retirado**	**9/06/2023**	**09/06/2023**
38	1096212895	Darío Andrés Peña Pérez	Ayudante	**Retirado**	**9/06/2023**	**15/06/2023**
39	91183717	Deybi Fabian Toloza Galvis	Oficial	**Retirado**	**9/06/2023**	**16/06/2023**
40	13874786	Jhon Mauricio Camero Parra	Ayudante	**Retirado**	**9/06/2023**	**30/06/2023**
41	13720381	Joan Manuel Villabona Ramos	Ayudante	Activo	9/06/2023	----
42	79188719	Juan Mauricio Posada León	Oficial	Activo	9/06/2023	----
43	13716316	Armando Jaimes Rodríguez	Oficial	**Retirado**	**15/06/2023**	**16/06/2023**
44	91004194	Bernavides Lemus Carrascal	Oficial	Activo	16/06/2023	----
45	6858633	Daniel Ulises Caldero	Ayudante	Activo	22/06/2023	----
46	91487798	Luis García Mendoza	Maestro	Activo	26/06/2023	----
47	5726793	José Sadid Santos Ortiz	Ayudante	Activo	28/06/2023	----
48	91004284	Ludwing Lemus Carrascal	Ayudante	Activo	28/06/2023	----
49	96121956	Yuver Yesid Hernández Muñoz	Oficial	Activo	28/06/2023	----
50	PPT 5.122.684	José Antonio Rodríguez Camargo	Ayudante	Activo	29/06/2023	----
51	1095828212	Rubén Darío Mariño Blanco	Oficial	Activo	29/06/2023	----

Tabla 6. Relación Proveedores Maquinaria y Vehículos.


No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	Fecha Ingreso	Empresa
1	1.095.953.393	Dionit Fernando Suarez Vargas	Operador Minicargador	29/04/2023	Inversiones Ivanesca S.A.S.
2	1.100.812.999	Mario Triana	Operador Minicargador	27/06/2023	Inversiones Ivanesca S.A.S.

Tabla 7. Relación Personal del proyecto.

PERIODO	CANTIDAD	CONTRATISTA	PROVEEDORES
Del 01 al 30 de junio de 2023	Trabajadores Activos	7	37
	No. de Ingresos	1	25
	No. de Retiros	2	18
	Total	**7**	**37**

Nota. EL contratista a la fecha de corte tiene pendiente paz y salvos de personal que se ha retirado de obra, se le solicite que esta documentación sea enviad a la interventoría, para su correcta revisión y seguimiento.

Figura 1. Reporte del Personal.

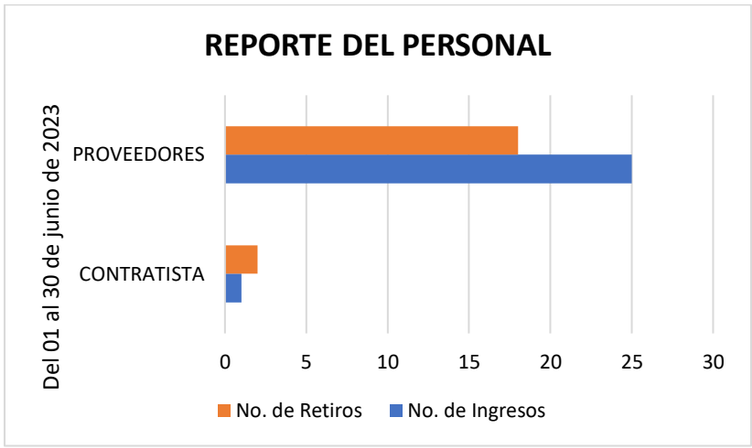

El contratista a la fecha de corte del presente periodo da cumplimiento y mantiene actualizado lo estipulado en el APENDICE I LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, donde se especifica los entregables frente la documentación como el MAO (Manejo Ambiental de Obra), Cronograma de actividades, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

5.2 Componente B – Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas.

Este componente permitirá desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir compensar los posibles impactos y riesgos generados por las obras constructivas.

5.2.1 Manejo de Campamentos Fijos y/o Temporales. En el presente periodo el contratista cuenta con un campamento temporal en sitio cercano a frente de obra Barrio Mutis el cual cuenta con espacio para el almacenamiento de materiales y de oficina temporal administrativa, además de contar con una oficina principal ubicada en la calle 23 # 9 -44 del barrio Girardot, en donde se realizará labores administrativas del proyecto.

5.2.2 Manejo materiales de construcción. En este programa se realiza verificación de las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales por el manejo de arenas, agregados, concretos, prefabricados, ladrillos, materiales pétreos para la construcción, en el periodo reportado el contratista presento documentos minero ambientales de la empresa ARENERA CHICAMOCHA S.A.S, como comercializador de Minerales para el contrato. Dichos documentos fueron revisados por la interventoría. Contratista adjunta el certificado de materiales expedidos por este proveedor de los materiales proporcionados para el presente periodo.

Tabla 8. Lista de proveedores para materiales pétreos para el contrato.

FUENTES DE MATERIALES			
NOMBRE	**UBICACIÓN**	**PERMISO MINERO**	**LICENCIA AMBIENTAL/AUTORIZACIÓN AMBIENTAL**
ARENERA CHICAMOCHA S.A.S	Pescadero, jurisdicción de Aratoca y Piedecuesta	FA7-081 Y FA7-082	0000223 del 6 de marzo de 2009

5.2.3 Manejo integral de residuos sólidos. En este programa se realiza seguimiento a los aspectos que garanticen el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), además de la clasificación de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra.

1. Manejo de Residuos sólidos: De acuerdo con las características de los residuos y bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo

código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** para depositar los residuos aprovechables como el plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

Figura 2. Clasificación de Residuos sólidos



Fuente. Resolución 2184 de 2019.


El contratista mantuvo en los frentes de obra la instalación de bolsas de colores para la clasificación de los residuos sólidos, la disposición final de los residuos No aprovechables se realizó con la empresa municipal de servicio de aseo EMAB S.A. E.S.P., cuya periodicidad de recolección es de 3 veces por semana y esta depende de la ruta de recolección de cada uno de los frentes de obra activos.

En la siguiente tabla se presenta el balance de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del contrato:

Tabla 9. Balance de residuos ordinarios generados en obra.

BALANCE DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
0 kg	0 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo
4 kg	2 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril
10 kg	4 kg	0 kg	Del 01 al 31 de mayo
20 kg	9 kg	0 kg	Del 01 al 30 de junio

Figura 3. Residuos sólidos generados en obra.

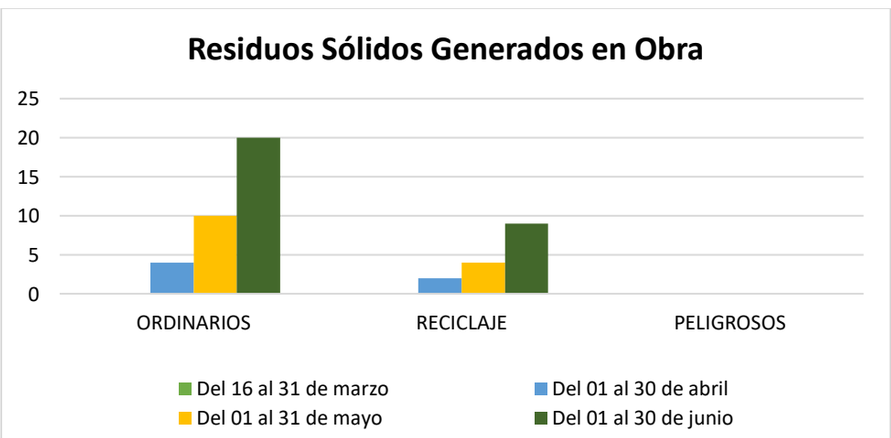

2. Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): Durante el periodo del presente informe, interventoría evidencia la recolección, el retiro y transporte del material de demolición y excavación al Botadero El Parque o PROPARK (lugar que cuenta con autorización del ente ambiental). Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

Para el desarrollo del contrato se verificó a través de los recibos de botadero de tierra el Parque o actualmente PROPARK, la disposición final de los RCD, sean dispuestos en los sitios autorizados por la autoridad ambiental igualmente se verifico que, los residuos de construcción y demolición (RCD) no permanecieran por más de 24 horas, para lo cual se solicitaba constantemente la evacuación de estos residuos. A continuación, se presenta los datos del gestor de RCD utilizado durante la ejecución del contrato:


Tabla 10. Lista de proveedores /Gestores de RCD.

GESTOR DE RCD	DOCUMENTO QUE PRESENTA	ENTIDAD
BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE ACTUALMENTE PROPARK	Autorización vigente para funcionamiento de escombrera otorgada por la CDMB mediante documento 19888 de 13/10/2006	Según respuesta de radicado CDMB 8836 del 27 de junio de 2019.

Tabla 11. Balance de RCD generados en el periodo.

BALANCE RCD DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo	**0 m^3**
144 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril	**144 m^3**
160 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de mayo	**160 m^3**
272 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de junio	**272 m^3**

Tabla 12. Residuos de Construcción y Demolición.

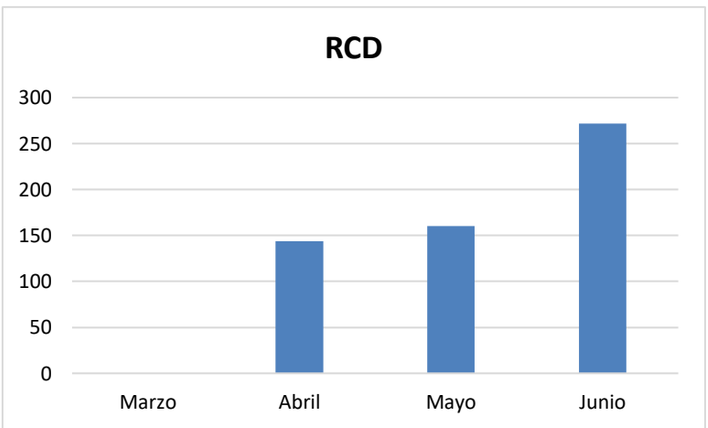

5.2.4 Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites. En este programa se realiza seguimiento a los aspectos que garanticen el manejo de los Residuos líquidos domésticos e industriales que puedan generarse por las actividades del proyecto, entre ellos medidas de saneamiento (baños portátiles) y manejo de sustancias químicas, por lo cual se tendrá en cuenta que su manejo sea bajo lo estipulado por la normatividad legal vigente bajo el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Las baterías sanitarias (Baños) utilizados para el servicio de los trabajadores, contratista adjunta certificado de disposición final de estos residuos líquidos del mes de abril, se encuentra pendiente el presente periodo.

Tabla 13. Manejo de residuos líquidos.

Frentes de Obra	GESTIÓN REALIZADA
Barrio Mutis	Se verificó la disponibilidad del servicio de baño para los trabajadores, mediante batería sanitaria fija ubicada en nuevo campamento temporal.
Barrio Estoraques	Se verificó el baño para los trabajadores en vivienda donde se solicita al contratista que se deje por escrito el acuerdo o contrato establecido con los propietarios.
Barrio Sauces	Se verificó la disponibilidad del servicio de baño para los trabajadores, mediante baño portátil proporcionado por la empresa ASSEAR la cual realiza 2 veces por semana limpieza.
Barrio Real de Minas	Se verificó la disponibilidad del servicio de baño para los trabajadores, mediante baño portátil proporcionado por la empresa ASSEAR la cual realiza 2 veces por semana limpieza.
Barrio Diamante 2	Se verificó el baño para los trabajadores en vivienda donde se solicita al contratista que se deje por escrito el acuerdo o contrato establecido con los propietarios.

Durante el desarrollo de las actividades de obra, no se evidenció el acopio de combustibles ni derrames de residuos líquidos.

5.2.5 Control de emisiones atmosféricas. En este programa se realiza seguimiento a las medidas requeridas para prevenir, mitigar y corregir la generación de emisiones atmosféricas como gases, material particulado y generación de ruido, por las actividades constructivas.

En el presente periodo el contratista envía documentación de vehículos y maquinaria mínima aprobados por la interventoría, en donde se verifico la vigencia de certificado técnico mecánica de los vehículos. Igualmente se verificó que, las volquetas contaran con su carpado, con el fin de mitigar las emisiones de material particulado generadas durante la evacuación de los RCD.

El contratista realiza instalación de un cerramiento perimetral en cada uno de los frentes de obra activos (Barrio Mutis, Barrio Estoraques 2, Sauces, Real de Minas), el cual consta de tela verde con una altura de 1 metro y malla naranja a una altura de 1 metro, apoyada delineador de tubular, separados cada 3 metros aproximadamente, este cerramiento tiene como finalidad mitigar las emisiones de material particulado y ruido hacia la comunidad aledaña a obra.

5.2.6 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. En este programa se realiza seguimiento a las medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden ser afectadas por la construcción de las obras. En el presente periodo se verifico por parte de la interventoría que el contratista realizará protección de sumideros con malla para evitar que residuos lleguen a las redes de alcantarillado y que la brigada BOAL realizará jornadas de orden y limpieza de la malla. El contratista entrega inventario de sumideros presentes en la zona de influencia directa del proyecto de los frentes activos dentro del documento actualizado del MAO.

5.3 Componente C – Manejo de vegetación y paisajismo.

Este componente permitirá verificar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir compensar los posibles impactos ambientales que puedan afectar la vegetación, el contratista ejecuta actividades de este componente como el inventario de las especies arbóreas como soporte del MAO, de acuerdo con la visita técnica de la profesional ambiental de la alcaldía de Bucaramanga Ing. Nidia Centeno el día 18 de abril de 2023, se tomaron en cuentas sus recomendaciones para el manejo de la vegetación en los corredores de intervención de obra.

De igual manera el contratista envía requerimiento de visita para aprobación de poda radicular de especies que deben ser intervenidas ante la autoridad ambiental CDMB (Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga), por lo cual, el día 30 de mayo funcionario de la entidad ambiental realizó inspección técnica para la revisión de la cerca viva de los individuos de swinglea ubicada en el frente Real de Minas. El día 23/06/2023 se emite concepto técnico por parte de la CDMB en donde se autoriza la poda radicular y poda de formación, gajos y reducción de copa en un 30 % de noventa y ocho (98) especies en los corredores de obra y una poda sanitaria para las especies de swinglea.

5.4 Componente D – Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este componente permitirá realizar un seguimiento a las medidas necesarias frente a los riesgos de origen laboral a los que están expuestos los trabajadores, y que aseguren el bienestar de todas las partes interesadas, por lo cual el contratista debe contar con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, enmarcado en un proceso de mejora continua bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

5.4.1 Seguridad y Salud Laboral. En este programa se tendrá en cuenta el seguimiento realizado al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), propuesto por el contratista teniendo en cuenta los siguientes ítems:

- **Seguridad Social.** Se solicito al contratista el envió de cada una de las copias de afiliaciones al sistema general de seguridad social: ARL, EPS, CCF, PENSIÓN, antes del ingreso de cada trabajador al proyecto. A fecha del periodo el contratista envía la documentación de afiliaciones y copia de las planillas del aporte al sistema de seguridad social del personal administrativo y operativo dando cumplimiento al requerimiento.

De acuerdo con requerimientos por parte de esta interventoría mediante el comunicado JSK-MB-429-098 enviado el 03 de abril de 2023, se solicitó al contratista información completa y detallada del personal vinculado al proyecto en donde se aportara los documentos contractuales respectivos con los que acredite su vínculo con Ingeniería y Construcciones Dúplex S.A.S, empresa a través de la cual se encuentra vinculado el personal operativo de obra. Reiteración del compromiso que se realizó mediante el comunicado JSK-MB-429-098 enviado el 11 de abril de 2023 y de igual manera compromiso que se reiteró en el comité de obra realizado el 19 de abril de 2023.

El día 25 de abril de 2023 el contratista envía documento para revisión de la interventoría mediante el comunicado CO-7G7-417-2023-0052, a la fecha de corte del presente informe se acreditó el vínculo entre las empresas, para la continuación de las actividades de obra.

- **Exámenes médicos ocupacionales.** Dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 el contratista realizó los exámenes médicos de ingreso al personal administrativo que ingresa al proyecto, y estos fueron enviados para la respectiva revisión por parte de esta interventoría.


Los exámenes médicos de ingreso del personal del Contratista, los realizó en RVG IPS S.A.S., quien cumple con toda la documentación requerida según la Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 y la Resolución 1918 de 2009.

Tabla 14. Verificación exámenes Médicos Ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONTRATISTA		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	25	0	20
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0
TOTAL	**25**	**0**	**20**

Nota. Se encuentra pendiente examen médicos de egreso o carta de notificación de exámenes de retirados hasta la fecha de corte, se solicita al contratista que se envié esta documentación completa en el próximo periodo, de acuerdo con fechas de retiro o egreso del personal.

Figura 4. Verificación Exámenes médicos.

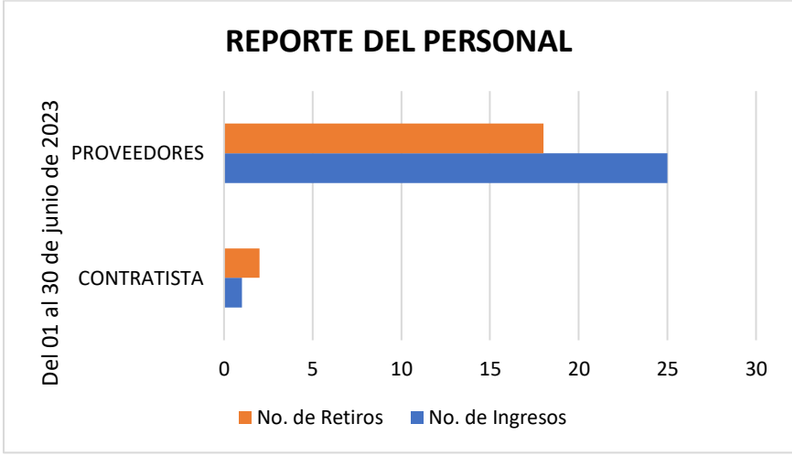

- **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).** Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y el Decreto Único del sector Trabajo 1072 de 2015 el contratista realiza la elección y conformación de los miembros del COPASST el día 29 de marzo de 2023, la interventoría verifico la presente acta de conformación, de acuerdo con lo reglamentado en la normatividad legal vigente.

De 10 a 49 Trabajadores: Un (1) representante por cada una de las partes.
De 50 a 499 Trabajadores: Dos (2) representantes por cada una de las partes
De 500 a 999 Trabajadores: Tres (3) representantes por cada una de las partes.
De 1000 o más trabajadores: Cuatro (4) representantes por cada una de las partes.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación COPASST	29-03-2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	29-04-2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	31-05-2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	30-06-2023	Actividad Ejecutada

- **Comité de Convivencia Laboral (COCOLA).** Dando cumplimiento a la Resolución 1356 de 2012 art 1 y el Decreto Único del sector Trabajo 1072 de 2015 el contratista realiza la elección y conformación de los miembros del COCOLA el día 30 de marzo de 2023, la interventoría verifico la presente acta de conformación, de acuerdo con lo reglamentado en la normatividad legal vigente.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación COCOLA	30-03-2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	Trimestral 29-06-2023	Actividad Ejecutada

- **Registro de charlas/inducción/capacitación.** Durante el presente periodo, el contratista realizo charlas y capacitaciones de seguridad en temas HSEQ a los trabajadores vinculados a la fecha de corte del presente informe, adicionalmente, se verificó el proceso de inducción realizado al personal, el contratista anexo los registros de las charlas e inducción dentro del informe mensual HSEQ.

Tabla 15. Registro de Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMATICA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
05-06-2023	Resolución de conflictos.	28	20 min
06-06-2023	Señalización de obra y de tránsito.	28	20 min
07-06-2023	Higiene postural, posturas prolongadas, mantenidas, movimientos repetitivos.	27	20 min
08-06-2023	Uso de la dotación en obra y los EPPs.	28	20 min
09-06-2023	Cuidado y protección de la piel.	26	20 min
13-06-2023	Autocuidado durante la jornada laboral	35	20 min
14-06-2023	Prevención de accidentes laborales con atención y cuidado.	35	20 min
16-06-2023	Caída de materiales sobre el cuerpo.	36	20 min
20-06-2023	Relaciones interpersonales.	33	20 min
22-06-2023	Lesiones de la columna cuidado en posturas al usar el celular	32	30 min
22-06-2023	Normas de seguridad en obra.	33	20 min
23-06-2023	Buen uso de las herramientas utilizadas durante la jornada laboral.	33	20 min
26-06-2023	Cuidado y protección en las manos.	30	20 min
27-06-2023	Condiciones de seguridad: Riesgo de tránsito.	31	20 min
28-06-2023	Orden y Limpieza en los frentes de obra, despeje de materiales.	30	20 min

- **Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP).** Durante el presente periodo, el contratista entrega de dotación y EPP a todos los trabajadores que ingresaron al proyecto, la interventoría verifica mediante el registro proporcionado la entrega de los mismo.

El contratista envío la matriz de EPP actualizada para las actividades a ejecutar en el proyecto, como anexo al MAO.

- **Inspecciones, preoperacionales y análisis de trabajo seguro.** Durante el presente periodo, el contratista realiza inspecciones y preoperacionales a vehículos y maquinaria esto con el fin de identificar condiciones inseguras y evaluar los riesgos antes que ocurran.

Tabla 16. Inspecciones y pre-operacionales.

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección							
	Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra Barrio Mutis, Barrio Estoraques 2, Sauces, Real de Minas, Diamante 2.	---	X	X	---	---	---	---	---

De igual manera se evidencia de diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo con las actividades de obra en los diferentes frentes activos.

- **Ausentismo, Incidentes, accidentes y enfermedades laborales.** La interventoría realiza seguimiento a los indicadores de accidentalidad y casis de ausentismo acorde con el personal administrativo y operativo por parte del contratista.


Tabla 17. Registro de ausentismo, incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

TIPO DE ATENCIÓN	CONTRATISTA	PROVEEDORES
Atención por primeros auxilios	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	4
Remisión ARL	1	0
TOTAL	**1**	**4**

Tabla 18. Seguimientos indicadores de accidentalidad.

MES	N° ACCIDENTES			N° TRABAJ	TOTAL DIAS INCAPACIDAD	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES	
	SI	CI	TOTAL				TASA DE AT	ILI
Marzo	0	0	0	6	0	1.368	0	0
Abril	0	0	0	27	0	6.669	0	0
Mayo	0	0	0	35	0	8.645	0	0
Junio	1	0	1	43	0	9.804	0	0

Figura 5. Seguimiento ausentismo, incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

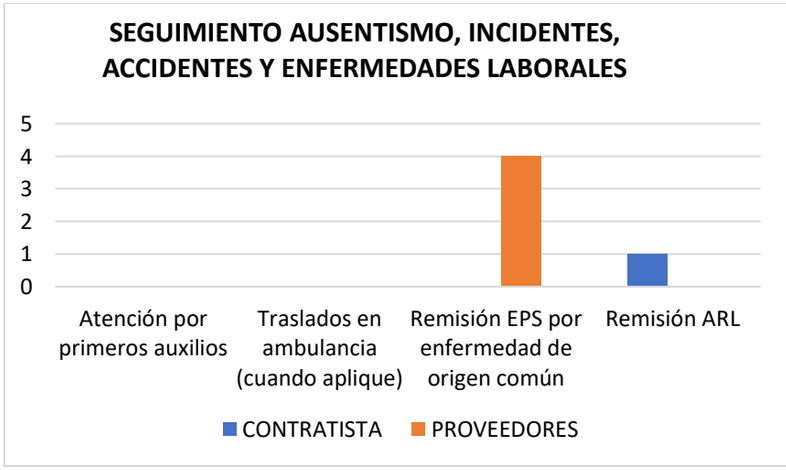

5.4.2 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. En este programa se realiza seguimiento a los lineamientos que faciliten la implementación de medidas para mitigar los impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados por la ejecución de actividades operativas.

De acuerdo con el anexo técnico el contratista radica carta de disponibilidad de la maquinaria, equipo y vehículos necesarios para el desarrollo del proyecto, contratista envía documentación para la verificación por parte de la interventoría en lo referente a: SOAT, revisión técnico mecánica, tarjeta de propiedad, fichas técnicas, Licencia de conducción, etc.

Tabla 19. Relación herramientas, equipos mínimos.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL		
DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	CANTIDAD
Volquetas	Capacidad mínima de 6 metros cúbicos	3
Mezcladora Concreto	Capacidad Mínimo de un (01) Bulto	3
Vibrador de Concreto	Eléctrico tipo aguja	3
Compactador Manual tipo rana	Compactador manual (saltarín) peso de operación mayor de 52 (Kg).	3
Martillo demoledor	Demoledor hexagonal mínimo 30Jls	3
Pulidora	Manual de 7 a 9 pulgadas	6

Fuente. Anexo técnico.

De acuerdo con la revisión de la documentación por parte de la interventoría, se tienen aprobados los siguientes equipos y maquinaria:

Tabla 20. Vehículo y/o maquinaria aprobada.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA		ESTADO EN OBRA		SOAT	TECNICO - MECANICA
		PLACA/ REF	TIPO	ACT	NO ACT		
1	CHEVROLET	KUL197	VOLQUETA (10.000)		X	25/05/2023	17/10/2023
2	CHEVROLET	ICD520	VOLQUETA (7.000)	X		1/02/2024	21/09/2023
3	FREIGHTLINER	SRS034	VOLQUETA (10.000)	X		16/02/2024	12/09/2023
4	DODGE	UGB240	VOLQUETA (7.000)	X		8/08/2023	7/07/2023
5	CHEVROLET	TTL359	VOLQUETA (12.090)	X		29/07/2023	29/08/2023
6	CHEVROLET	SKX824	VOLQUETA (8220)	X		18/07/2023	2/05/2024
7	CHEVROLET	CAL066	VOLQUETA (7.000)		X	22/06/2023	11/07/2023
8	CHEVROLET	BCE443	VOLQUETA (8.000)	X		1/06/2024	25/07/2023
9	DODGE	RAD307	VOLQUETA (7.000)	X		3/10/2023	29/08/2023
10	CATERPILLAR	236B3	MINICARGADOR	X		No Aplica	No Aplica
11	CATERPILLAR	236B	MINICARGADOR	X		No Aplica	No Aplica

5.5 Componente E – Programa de señalización de Seguridad.

Este componente la interventoría realizará el seguimiento a la señalización mínima requerida para el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad integral de los peatones y de los trabajadores en los espacios de obra, de igual manera se deberá tener en cuenta lo estipulado en el PMT, en donde se establecen acciones para el cerramiento perimetral de los frentes de obra y senderos peatonales.

De acuerdo con el PMT aprobado por la dirección de tránsito del municipio con una categoría de Alto Impacto de acuerdo con la movilidad del sector y su zona de influencia, con un tiempo de autorización de 6 meses, el contratista cuenta con un comité de tráfico con participación de un representante de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, un representante del nivel directivo del contratista, un representante de la interventoría y el supervisor de implementación del PMT.

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A&SST

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades A&SST realizadas por el Contratista durante el presente periodo, a las cuales se les realiza el respectivo seguimiento por parte de la interventoría:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Divulgación de la política de SST y Medio Ambiente según ingreso de personal	100 %	Se evidencia divulgación en proceso de inducción al ingreso del personal.
Inducción a todo el personal	100 %	Se evidencia proceso de inducción al ingreso del personal.
Estadísticas de primeros auxilios, ausentismo laboral, accidentes, incidentes, etc.	100 %	Se evidencia reporte de estadísticas de ausentismo, incidentes y accidentes.
Reunión periódica del COPASST	100 %	Se evidencia acta de reunión mensual del COPASST
Conformación del COCOLA	100 %	Se evidencia acta de conformación del COCOLA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Evaluación médica de ingreso	100 %	El contratista entrega exámenes médicos de ingresos de acuerdo con ingreso de personal.
Medición de indicadores de ausentismo por enfermedad común y por enfermedad profesional	100 %	Se evidencia reporte de estadísticas de ausentismo por enfermedad común.
Realizar inspecciones y preoperacionales de acuerdo con cronograma	100 %	Se evidencia realización de inspecciones a vehículos y maquinaria.
Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	100 %	Se evidencia registro de entrega de EPP al ingreso de personal
Realización de capacitaciones y charlas	100 %	Se evidencia registro de capacitaciones y charlas de acuerdo con cronograma.
Desarrollo de actividades de promoción y prevención de alcoholismo y farmacodependencia	100 %	Se evidencia sensibilización frente a la promoción y prevención de alcoholismo y sustancias psicoactivas.
Actualización de inventario de los individuos y especies arbóreas en la zona de influencia del proyecto.	100 %	Se evidencia listado de individuos de acuerdo con frentes activos de obra.
Actualización de listado de sumideros.	100 %	Se evidencia listado de sumideros de acuerdo con frentes activos de obra.
Capacitación a BOAL de acuerdo con Cronograma de Capacitaciones	100 %	Se evidencia registro de capacitaciones y charlas de acuerdo con cronograma.
Instalación de punto ecológico en frentes de obra de acuerdo con activación.	60 %	Se deberá realizar mantenimiento de punto ecológico en todos los frentes de obra activos.
Jornadas de orden y aseo	70 %	Se evidencia jornada de orden y aseo por parte de BOAL, sin embargo, se deberá programas jornadas con más frecuencia.
Clasificación y control de residuos de acuerdo con generación y normatividad legal vigente.	70 %	Se deberá realizar mantenimiento de punto ecológico en todos los frentes de obra activos.
Protección de sumideros de acuerdo con áreas de intervención.	100 %	Se evidencia protección de sumideros de acuerdo con áreas de intervención de obra
Verificación de documentación de maquinaria, equipo y vehículos, cumplimiento de normatividad.	80 %	Contratista no envía completa la documentación de nuevos vehículos para la revisión.
Divulgación del Plan de Emergencias (Inducción y Reinducción) Según ingreso de personal	100 %	Se evidencia divulgación en proceso de inducción al ingreso del personal.
Conformación de Brigadas de emergencias	100 %	Se evidencia conformación de brigadas de emergencias.
Inspecciones de elementos de respuesta a emergencia	90 %	Se evidencia inspección de punto de primeros auxilios.

7. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El consorcio presentó el plan de emergencias para revisión por parte de la interventoría, en donde se realizaron observaciones en el componente de atención a emergencias, de igual manera la interventoría una vez se de inicio a las actividades de obra constatara el cumplimiento de las medidas presentadas en el plan, la instalación del punto de primeros auxilios como botiquín, camilla, extintor.

La interventoría evidencia el acta de conformación de brigadas de emergencia el día 31 de marzo de 2023 por parte del contratista. A continuación, se presenta la ubicación del equipo básico de atención de emergencias del contratista:

Ubicación	Gestión Evidenciada
Frente Mutis	El contratista cuenta con Extintor, botiquín y Camilla.
Frente Estoraques 2	Extintor, Botiquín, Camilla
Frente Real de Minas	Botiquín, Camilla
Frente Sauces	Botiquín
Frente Diamante 2	Botiquín, Camilla, Extintor.

Tabla 21. Atención de emergencias.

Tipo de Atención	Fecha	Tiempo	Asistentes	Observaciones
Conformación brigada de emergencias	31-03-2023	1 hora	4	Actividad ejecutada.
Emergencias reportadas en el periodo	---	---	---	No se reportaron emergencias.
Simulacros	N.A.	N.A.	N.A.	No se tiene programado simulacro de emergencias

Por parte de la interventoría se realiza inspección a botiquín de obra en frente Barrio Mutis, en donde se solicita al contratista la dotación del mismo de acuerdo con requerimientos de la Resolución 0705 de 2007, actividad que ha sido ejecutada parcialmente.

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Mediante el comunicado JSK-MB-429GR3-001 enviado el día 20 de enero de 2023, en donde se solicitan al contratista allegar a la interventoría, el protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, el cual se aplicará durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con la Resolución 1238 de 2022. En la siguiente tabla se realiza el seguimiento a los casos reportados, durante el periodo reportado el contratista no reportó ningún caso positivo para COVID-19:

Tabla 22. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo.

CASOS COVID-19 REPORTADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE A&SST.

A continuación, se presenta los indicadores de seguimiento por parte de la interventoría para el componente A&SST.

Tabla 23. Indicadores de seguimiento al componente A&SST.

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Manejo de campamento e instalaciones provisionales	0 % deficiente 50 % regular 100 % adecuado.	100 %
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	100 %
Implementación del componente A&SST	ICA&SST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con cronograma de actividades.	94 %
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Trabajadores usan correctamente los EPP})}{(\#\ \text{Total Trabajadores})}$	= (34 / 36) *100 = 94
Requerimientos mínimos del plan de emergencias	Elementos SST- IES Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99 %	90 %
Capacitaciones	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Capacitaciones realizadas})}{(\#\ \text{Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(15)}{(15)}$ **= 100 %**
Residuos sólidos	IRS = 100 * (Vol. Residuos reciclados / Vol. Residuos reciclados generado)	= (9 / 29) = 31,04 %
Residuos sólidos peligrosos	IRSP = 100 * (Vol. Residuos peligrosos entregados / Vol. Residuos peligrosos generados)	No aplica para el periodo
Establecimiento y manejo adecuado de los residuos solidos	0 % deficiente, 50 % regular, 100 % adecuado	65 %
Baterías Sanitarias requeridas	B = 100 * (# Baños disponibles / #. Baños requeridos)	IRS = 100 * (5 / 5) = 100 %
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	70 %
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Actividades ejecutadas})}{(\#\ \text{Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100\ \text{X}\ \frac{(3)}{(3)}$ **= 100 %**
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	70 %
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\#\ \text{Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	IIP = (5 / 5) *100 = 100 %
Vehículos Certificados tecno mecánico	IVC = 100 * (# vehículos certificados / total de vehículos).	= (7 / 7 *100) =100 %
Sumideros	(# de sumideros protegidos / # sumideros existentes en obra)	= (10 / 10) *100 = 100 %
Mantenimientos realizados	MR = 100 * (# de mantenimientos realizados/#. de mantenimientos programados)	No aplica para el periodo
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	100 %
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	FA = (1 / 43) *100= 2.3 %
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + Número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes) * 100	SA =0 DÍAS / 43 = 0 %

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/ Total, de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	PAM = 0 / 0 = 0 %
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	PEL = 0 / 43 = 0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	IEL = 0 / 43 = 0
Ausentismo causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	ACM = (36 / 24) = 150 %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante este periodo, la Interventoría ha velado para que la gestión HSEQ, y se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente y los planes diseñados por el contratista. Por otro lado, se ha dado acompañamiento y se ha hecho seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por el contratista y los proveedores durante la etapa de ejecución de obra.

- Se verifica la documentación de ingreso del personal, como: Afiliaciones a Seguridad Social (EPS, AFP, ARL, CCF), Exámenes médicos de Ingreso, inducción, notificación de los riesgos, de cada uno de los colaboradores que ingresan al proyecto, sigue pendiente examen de ingreso de Gerente de Proyectos.

- En el presente periodo se registró un accidente laboral, el cual se encuentra pendiente su investigación para el siguiente periodo dando cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007, cero casos COVID-19 positivos en el personal administrativo y operativo de obra.

- Dentro del periodo la interventoría ha solicitado al contratista la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo de la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo, áreas temporales y/o acopios de materiales, en cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias y/o incidentes con la comunidad, las cuales han sido atendidas de forma parcialmente por parte del mismo, en algunos frentes de obra, por lo cual se le ha dejado anotación en bitácora A&SST, para su cumplimiento.

- La interventoría realiza revisión del informe mensual presentado por el contratista en la gestión del componente A&SST, en el cual se remite observaciones para ajustar y ser aplicadas para su correspondiente aprobación.

- Se ha solicitado al contratista la adecuación y mantenimiento del punto de primeros auxilios y punto ecológico en todos los frentes de obra activos, para dar cumplimiento a las medidas preventivas del MAO, a fecha de corte se ha realizado esta actividad de forma parcial en algunos de los frentes activos.

- El día 30 de mayo funcionario de la entidad ambiental realizó inspección técnica para la revisión de la cerca viva de los individuos de swinglea ubicada en el frente Real de Minas. El día 23/06/2023 se emite concepto técnico por parte de la CDMB en donde se autoriza la poda radicular y poda de formación, gajos y reducción de copa en un 30 % de noventa y ocho (98) especies en los corredores de obra y una poda sanitaria para las especies de swinglea de un metro respetando la zona de circulación peatonal.

- El certificado de disposición de residuos líquidos generados por la limpieza de batería sanitaria, de la empresa ASSEAR se encuentra pendiente en el periodo correspondiente al mes de mayo y junio respectivamente.

- De acuerdo con las actividades de seguimiento de esta interventoría se emite las fichas de Seguimiento ambiental propuesta de las actividades ejecutadas por el contratista dando una calificación de 91 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 1
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 1. Sensibilización y capacitación al personal.



Figura 2. Proceso de inducción y notificación de riesgos al personal.





Figura 3. Charlas 5 minutos y/o Pausas Activas inicio de jornada laboral.





Figura 4. Cerramiento perimetral de obra.

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 2
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 5. Cubrimiento de materiales de obra.





Figura 6. Residuos de Construcción Generado de actividades demolición y excavación**.**





Figura 7. Actividades de evacuación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)





Figura 8. Comité de Obra.

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 3
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 9. Entrega de EPP y Dotación





Figura 10. Baterias Sanitarias.





Figura 11. Jornada de orden y limpieza por parte de BOAL.





Figura 12. Control de herramientas y equipos.

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 4
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 13. Sendero Peatonal.





Figura 14. Señalización de áreas.





Figura 15. Control de Vehículos.



Figura 16. Auxiliares de tráfico.



Figura 17. Punto de Hidratación**.**

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 5
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 18. Protección y Mantenimiento de sumideros en los frentes de obra.





Figura 19. Punto Ecológico





Figura 20. Señalización Interna de obra.





Figura 21. Acompañamiento actividades HSEQ.

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	Pág. 6
Contrato: No. 417 de 2022	**Periodo:** Del 01 al 30 de junio de 2023	





Figura 22. Punto de Emergencias.





Figura 23. Señalización Vial Instalada.





Figura 24. Verificación de ATS, preoperacionales.





Figura 25. Seguimiento y acompañamiento actividades de obra.

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: 7G7 SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 DE 2022

CONTRATO DE OBRA N° 417 DE 2022

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3

PERIODO					
ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%	Se verificaron las carpetas de acuerdo con lo estipulado del MAO.	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el municipio de Bucaramanga mediante la secretaria de infraestructura en el desarrollo de las actividades del proyecto.	**2,0%**	Aplica	100%	De acuerdo con visita técnica el 18 de abril de 2023 por parte de Profesional Ambiental de la Alcaldía el contratista, acata requerimientos de medidas ambientales.	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	Contratista envia documentación de procedencia de materiales y de sitio de disposición final de acuerdo con normatividad legal en materia ambiental.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%	Contratista actualiza el documento MAO	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	Se realiza protección de sumideros	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	Se tiene zona temporal para el almacenamiento de los materiales, dentro de área de obra.	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	Se cuenta con instalaciones temporales en donde se mantiene materiales y oficinas administrativas en frente Mutis.	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	0%		**31%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	Los residuos son cubiertos para minimizar emisiones de polvo y evitar caida de materiales en la vía.	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%	Jornada de orden y limpieza.	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	Se ejecutar actividades para el control de emisiones como cubrimiento de materiales.	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**3,0%**	Aplica	100%		
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**3,0%**	Aplica	100%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	Aplica	100%	Se da cumplimiento de acuerdo con el concepto técnico emitido por la CDMB	

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	GOBERNAR ES HACER Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: 7G7 SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 DE 2022

CONTRATO DE OBRA N° 417 DE 2022

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3

PERIODO					
ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica	0%	No aplica esta actividad.	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	Se cuenta con 5 baterias sanitarias.	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	Aplica	100%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	Se evidencia cumplimiento de actividad.	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra.	**2,0%**	Aplica	0%	No se tiene completo el botiquín.	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%		**34%**
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	Se evidencia públicación de la política en campamento temporal.	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	Se evidencia cumplimiento de actividad.	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	Aplica	100%		

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: 7G7 SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 DE 2022

CONTRATO DE OBRA N° 417 DE 2022

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 3

PERIODO					
ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	0%	No se tiene evidencia programa de mantemiento.	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	Se tiene conformada brigada de emergencias, se realizara seguimiento de acuerdo con cronograma de trabajo para la ejecución de simulacro de emergencias.	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Contratista mantiene cerramiento perimetral de obra y señalización de acuerdo con PMT.	5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO			91%

MARÍA FERNANDA MARTINEZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORÍA

CARMEN ROSA CACERES
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista

JESAK
NIT. 901320986-8

Bucaramanga, 10 de julio de 2023

CERTIFICACIÓN

REVISIÒN Y APROBACIÒN PAGOS SALARIALES Y SGSSI

Una vez revisada la documentación allegada por el contratista y dando cumplimiento al anexo técnico Ítem 5 Información Ambiental y SST numeral 16, por medio de la presente la profesional HSEQ de la interventoría JESAK S.A.S. cuyo Contrato N° **429 DE 2022** "INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" **GRUPO 1-2-3,** para el Contrato de Obra No. 417 de 2022 ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER, Grupo 3, se da constancia de la revisión detallada y visto bueno de los documentos que soportan el pago salaria y del control SGSSI remitidos por el contratista 7G7 S.A.S. en el respectivo informe mensual HSEQ No. 4, correspondiente al periodo de junio.

Cordialmente



Nombre: María Fernanda Martinez
Cargo: Profesional HSEQ Grupo 3
Interventoría JESAK SAS

	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: F-GDI-5000-238,37-097 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

CONTRATISTA: 7G7 SAS
NIT:901,120,358-4
CONTRATO DE OBRA N° 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO:"Adecuación de andenes,

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro)	SALARIO ($)	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
JORGE HUMBERTO PINZÓN QUIROGA	56.534.444	DIRECTOR	Nomina	**$ 4.000.000**	100%	15-mar-23	30	Mayo	$ 4.000.000,00	7884233651	$ 4.000.000,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	$ 278.400,00	$ 160.000,00	$ 1.238.400,00
MONICA LILIANA QUINTERO	1.092.341.010	RESIDENTE	Nomina	**$ 3.000.000**	100%	15-mar-23	30	Mayo	$ 3.000.000,00	7884233651	$ 3.000.000,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00	$ 208.800,00	$ 120.000,00	$ 928.800,00
MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES	1.122.784.042	PROFESION AL SOCIAL	Nomina	**$ 2.000.000**	100%	18-mar-23	30	Mayo	$ 2.000.000,00	7884233651	$ 2.000.000,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	$ 139.200,00	$ 80.000,00	$ 619.200,00
MARIO ESTEBAN HERNANDEZ	1.098.786.049	INSPECTOR	Nomina	**$ 1.800.000**	100%	18-mar-23	30	Mayo	$ 1.800.000,00	7884233651	$ 1.800.000,00	$ 72.000,00	$ 288.000,00	$ 125.300,00	$ 72.000,00	$ 557.300,00
HELVER MORENO BARRIOS	1.098.739.789	INSPECTOR	Nomina	**$ 1.800.000**	100%	22-mar-23	30	Mayo	$ 1.800.000,00	7884233651	$ 1.800.000,00	$ 72.000,00	$ 288.000,00	$ 125.300,00	$ 72.000,00	$ 557.300,00
CARMEN ROSA CACERES BAYONA	63.843.364	PROFESION AL HSQ	Nomina	**$ 2.000.000**	100%	24-mar-23	30	Mayo	$ 2.000.000,00	7884233651	$ 2.000.000,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	$ 139.200,00	$ 80.000,00	$ 619.200,00
TARAZONA BECERRA ANGIE NICOLL	63.843.364	PROFESION AL HSQ	Nomina	**$ 2.000.000**	100%	13-abr-23	30	Mayo	$ 1.800.000,00	7884233651	$ 1.800.000,00	$ 72.000,00	$ 288.000,00	$ 125.300,00	$ 72.000,00	$ 557.300,00
QUESADA OREJARENA EDGAR ALONSO	91.293.585	GERENTE	Nomina	**$ 1.700.000**	100%	20-abr-23	30	Mayo	$ 1.700.000,00	7884233651	$ 1.700.000,00	$ 68.000,00	$ 272.000,00	$ 118.400,00	$ 68.000,00	$ 526.400,00
IBC: Ingreso base de cotizacion									$ 18.100.000,00							$ 5.603.900,00

CARMEN ROSA CACERES
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA
7G7 SAS

MARIA FERNANDA MARTINEZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA
JESAK SAS

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

junio 1, 2023 — junio 15, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	LEY 50	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	5.653.444	JORGE HUMBERTO PINZÓN QUIROGA	DIRECTOR	133.333	6	800.000	120.000	80.000	1.000.000	64.000	64.000	936.000	
2	1.092.341.010	MONICA LILIANA QUINTERO	RESIDENTE	100.000	15	1.500.000	500.000	-	2.000.000	120.000	120.000	1.880.000	
3	1.122.784.042	MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	66.667	15	1.000.000	500.000	-	1.500.000	60.000	60.000	1.440.000	
4	1.098.786.049	MARIO ESTEBAN HERNANDEZ	INSPECTOR	60.000	15	900.000		-	900.000	72.000	72.000	828.000	
5	1.098.739.789	HELVER MORENO BARRIOS	INSPECTOR	60.000	15	900.000		-	900.000	72.000	72.000	828.000	
6	63.483.364	CARMEN ROSA CACERES BAYONA	PROFESIONAL HSQ	66.667	15	1.000.000	300.000	200.000	1.500.000	80.000	80.000	1.420.000	
7	1.098.783.060	ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA	INSPECTOR	60.000	15	900.000		-	900.000	72.000	72.000	828.000	
8	91.207.013	VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO	DIRECTOR	133.333	6	800.000	240.000	160.000	1.200.000	64.000	64.000	1.136.000	
		TOTALES			102	$ 7.800.000	$ 1.660.000	$ 440.000	$ 9.900.000	$ 604.000	$ 604.000	$ 9.296.000	

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

PERIODO DEL junio 16, 2023 ADMON junio 30, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	LEY 50	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.092.341.010	MONICA LILIANA QUINTERO CARVAJAL	RESIDENTE	100.000	15	1.500.000			1.500.000	120.000	120.000	1.380.000	
2	1.122.784.042	MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES	PROFESIONAL SOCIAL	66.667	15	1.000.000			1.000.000	80.000	80.000	920.000	
3	1.098.786.049	MARIO ESTEBAN HERNANDEZ FAJARDO	INSPECTOR	60.000	15	900.000			970.303	72.000	72.000	898.303	
4	1.098.739.789	HELVER MORENO BARRIOS	INSPECTOR	60.000	15	900.000			970.303	72.000	72.000	898.303	
5	63.483.364	CARMEN ROSA CACERES BAYONA	PROFESIONAL HSQ	66.667	15	1.000.000			1.000.000	80.000	80.000	920.000	
6	1.098.783.060	ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA	INSPECTOR	60.000	15	900.000			970.303	72.000	72.000	898.303	
7	91.207.013	VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO	DIRECTOR	133.333	15	2.000.000			2.000.000	160.000	160.000	1.840.000	
		TOTALES			105	$ 8.200.000	$ -	$ -	$ 8.410.909	$ 656.000	$ 656.000	$ 7.754.909	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

ADM junio 1, 2023 junio 15, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	LEY 50	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.097.489.030	MIGUEL ANGEL MENDEZ RANGEL	CONDUCTOR	38.667	15	580.000	4.687	70.303	100.000	750.303	46.400	46.400	703.903	
2	91.178.662	FREDDY CUADROS BASTIDAS	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
3	37.729.364	MARY NELSI PALLARES CHOGO	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
4	5.722.562	BENJAMIN ROMAN	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
5	1.095.912.491	YUDY VERONICA PINZON MENDOZA	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	11	425.333	4.687	51.556		476.889	34.027	34.027	442.862	
		TOTALES			**71**	**$ 2.745.333**	**$ 23.434**	**$ 332.768**	**$ 100.000**	**$ 3.178.101**	**$ 219.627**	**$ 219.627**	**$ 2.958.474**	

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES
IDENTIFICACION			1.122.784.042
CARGO			PROFESIONAL SOCIAL
SALARIO DIARIO			50.000
FECHA DE INGRESO			18-mar-22
FECHA DE RETIRO			30-may-23
	TOTAL DÍAS	72	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		72	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			50.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**50.000**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			300.000
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$300.000**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**300.000**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$300.000**

Con la anterior liquidación yo, **MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES** Identificado con cédula **1.122.784.042** Declaro que he recibido de 7G7 SAS , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA:

HUELLA

MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES
1.122.784.042

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS

NOMBRE DELTRABAJADOR:			MONICA LILIANA QUINTERO
IDENTIFICACION			1.092.341.010
CARGO			RESIDENTE
SALARIO DIARIO			133.333
FECHA DE INGRESO			15-mar-22
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DÍAS	**106**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		106	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			133.333
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**133.333**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			1.177.778
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$1.177.778**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**1.177.778**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$1.177.778**

Con la anterior liquidación yo, **MONICA LILIANA QUINTERO** identificado con cédula **1.092.341.010** Declaro que he recibido de **7G7 SAS** , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA:

HUELLA

MONICA LILIANA QUINTERO
1.092.341.010

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			CARMEN ROSA CACERES BAYONA
IDENTIFICACION			63.483.364
CARGO			PROFESIONAL HSEQ
SALARIO DIARIO			100.000
FECHA DE INGRESO			24-mar-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DIAS	**96**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		96	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			100.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**100.000**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			800.000
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$800.000**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**800.000**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$800.000**

Con la anterior liquidación yo, **CARMEN ROSA CACERES BAYONA** Identificado con cédula **63.483.364** Declaro que he recibido de **7G7 SAS** , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA:

CARMEN ROSA CACERES BAYONA
63.483.364

HUELLA

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			MARIO ESTEBAN HERNANDEZ
IDENTIFICACION			1.098.786.049
CARGO			INSPECTOR
SALARIO DIARIO			60.000
FECHA DE INGRESO			18-mar-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DÍAS	**102**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		102	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			60.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	4.687
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**64.687**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			549.839
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$549.839**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**549.839**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$549.839**

Con la anterior liquidación yo, **MARIO ESTEBAN HERNANDEZ** Identificado con cédula **1.098.786.049** Declaro que he recibido de 7G7 SAS , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA: HUELLA

MARIO ESTEBAN HERNANDEZ
1.098.786.049

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			HELVER MORENO BARRIOS
IDENTIFICACION			1.098.739.789
CARGO			INSPECTOR
SALARIO DIARIO			60.000
FECHA DE INGRESO			22-mar-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DÍAS	**98**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		98	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			60.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	4.687
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**64.687**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			528.277
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$528.277**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**528.277**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$528.277**

Con la anterior liquidación yo, **HELVER MORENO BARRIOS** identificado con cédula **1.098.739.789** Declaro que he recibido de **7G7 SAS**, los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA: HUELLA

HELVER MORENO BARRIOS
1.098.739.789

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA
IDENTIFICACION			1.098.783.060
CARGO			INSPECTOR
SALARIO DIARIO			60.000
FECHA DE INGRESO			13-abr-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DÍAS	**77**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		77	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			60.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	4.687
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**64.687**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			415.075
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$415.075**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**415.075**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$415.075**

Con la anterior liquidación yo, **ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA** identificado con cédula **1.098.783.060** Declaro que he recibido de **7G7 SAS** , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA: HUELLA

ANGIE NICOLL TARAZONA BECERRA
1.098.783.060

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS

NOMBRE DELTRABAJADOR:			MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES
IDENTIFICACION			1.122.784.042
CARGO			PROFESIONAL SOCIAL
SALARIO DIARIO			100.000
FECHA DE INGRESO			01-jun-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
	TOTAL DÍAS	30	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		30	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			100.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**100.000**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			250.000
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$250.000**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**250.000**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$250.000**

Con la anterior liquidación yo, **MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES** identificado con cédula **1.122.784.042** Declaro que he recibido de 7G7 SAS , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA:

HUELLA

MARYURI NATALIA LÓPEZ RUALES
1.122.784.042

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

7G7 SAS
NIT: 901120358- 4

LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS			
NOMBRE DELTRABAJADOR:			VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO
IDENTIFICACION			91.207.013
CARGO			DIRECTOR
SALARIO DIARIO			200.000
FECHA DE INGRESO			09-jun-23
FECHA DE RETIRO			30-jun-23
TOTAL DÍAS		**21**	
SALARIOS PENDIENTES:			
TIEMPO ORDINARIO		21	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	0
HORAS ORDINARIAS	100%	0	0
HORAS EXTRAS DIURNAS	125%	0	0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	175%	0	0
DOMINICALES Y FESTIVOS	175%	0	0
HORAS EXT. DIU.DOM. Y FESTIVO	225%	0	0
HORAS EXT. NOCT. DOM. Y FESTIVO	275%	0	0
a. TOTAL SALARIOS PENDIENTES			**$0**
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:			
SUELDO BASICO			200.000
SOBRETIEMPO PROMEDIO			0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		4.687	
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**200.000**
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES:			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			350.000
CESANTIAS			0
INTERESES A LA CESANTIAS			0
b. TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$350.000**
			$0
TOTAL SALARIOS MAS PRESTACIONES SOCIALES (a+b)			**350.000**
c. DEDUCCIONES:			
ISS			0
PRESTAMOS			0
TOTAL A PAGAR (a+b+-c)			**$350.000**

Con la anterior liquidación yo, **VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO** Identificado con cédula **91.207.013** , Declaro que he recibido de 7G7 SAS , los valores correspondientes a mi salarios, prestaciones sociales, extralegales, compensación e Indemnizaciones causadas como trabajador de esta empresa por consiguiente, el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo, por todos los conceptos antes mencionados.

FIRMA:

HUELLA

VÍCTOR ELÍAS MRAD TRUJILLO
91.207.013

DUPLEX
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

ADM junio 16, 2023 junio 30, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	LEY 50	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.097.489.030	MIGUEL ANGEL MENDEZ RANGEL	CONDUCTOR	38.667	15	580.000	4.687	70.303	100.000	750.303	46.400	46.400	703.903	
2	91.178.662	FREDDY CUADROS BASTIDAS	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
3	37.729.364	MARY NELSI PALLARES CHOGO	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
4	5.722.582	BENJAMIN ROMAN	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
5	1.095.912.491	YUDY VERONICA PINZON MENDOZA	AUXILIAR DE TRAFICO	38.667	15	580.000	4.687	70.303		650.303	46.400	46.400	603.903	
		TOTALES			75	$ 2.900.000	$ 23.434	$ 351.515	$ 100.000	$ 3.351.515	$ 232.000	$ 232.000	$ 3.119.515	

DUPLEX
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

RUBEN junio 16, 2023 junio 30, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.007.189.705	JHON EIVER SERRANO LEÓN	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
2	1.007.373.421	JAVIER SERRANO LEÓN	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
3	1.049.023.361	YOINER CHACON CARRILLO	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687		580.000	46.400	46.400	533.600	
4	1.004.823.100	JESUS ALFONSO PEREZ ROJAS	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
5	1.134.330.000	JUAN CAMILO GONZALEZ GARISADO	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
6	PTP 6391750	YRWIN GABRIEL GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	675.678	48.430	48.430	627.248	
7	13.642.925	NATANAEL FONSECA QUINTERO	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	667.220	47.753	47.753	619.466	
8	91.273.197	JAIME ORLANDO CASTRO OBREGÓN	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
					120	**$ 4.640.000**	**$ 37.495**	**$ 492.121**	**$ 5.174.413**	**$ 374.583**	**$ 374.583**	**$ 4.799.829**	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

CESAR junio 16, 2023 junio 30, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.098.633.200	JUNIOR SANTIAGO BENAVIDES RAMOS	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	686.553	49.300	49.300	637.253	
2	91.526.196	CESAR AUGUSTO GUEVARA BLANCO	MAESTRO	38.667	15	580.000	4.687	70.303	744.053	53.900	53.900	690.153	
3	9.694.296	JESY CHINCHILLA GARCIA	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
4	19.775.275	HENRY MANUEL JIMENEZ TURIZO	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	706.553	50.900	50.900	655.653	
5	1.234.339.663	JONATHAN VILLAMIZAR URBINA	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	686.553	49.300	49.300	637.253	
6	91.298.595	WILSON CACEREZ RAMIREZ	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
7	91.531.063	OMAR JOSUÉ HERNANDEZ RODRIGUEZ	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
8	PTP 1265121	NAUDYS MENDOZA	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
9	13.874.786	JHON MAURICIO CAMERO PARRA	AYUDANTE	38.667	14	541.333	4.687	65.616	631.116	45.240	45.240	585.876	
10	91.509.636	JHON NELSON GONZALEZ SANCHEZ	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	811.553	59.300	59.300	752.253	
11	13.743.013	HUGO ARMANDO TORRES BARRIOS	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	686.553	49.300	49.300	637.253	
12	6.858.633	DANIEL ULICES CALDERO MACIAS	AYUDANTE	38.667	8	309.333	4.687	37.495	346.828	24.747	24.747	322.082	
13	96.121.956	YUVER YESID HERNANDEZ MUÑOZ	OFICIAL	38.667	3	116.000	4.687	14.061	130.061	9.280	9.280	120.781	
14	1.095.828.212	RUBEN DARIO MARIÑO BLANCO	OFICIAL	38.667	2	77.333	4.687	9.374	86.707	6.187	6.187	80.520	
15	1.095.954.572	KEVIN ANDRÉS RAMÍREZ CAMARGO	AYUDANTE	38.667	5	193.333	4.687	23.434	216.768	15.467	15.467	201.301	
					182	$ 7.037.333	$ 51.556	$ 768.646	$ 7.554.146	$ 542.840	$ 542.840	$ 7.735.990	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER" LOTE 3."

PERIOI OSCAR junio 16, 2023 junio 30, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	91.542.547	SERGIO GIOVANY URIBE PEREZ	AYUDANTE	38.667	11	425.333	4.687	51.556	476.889	34.027	34.027	442.862	
2	13.746.472	JOHN FREDY MARTINEZ VELASQUEZ	OFICIAL	38.667	11	425.333	4.687	51.556	476.889	34.027	34.027	442.862	
3	91.479.291	ERWING RODRIGUEZ DURAN	OFICIAL	38.667	11	425.333	4.687	51.556	493.806	35.380	35.380	458.426	
4	79.188.719	JUAN MAURICIO POSADA	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
5	13.720.381	JOAN MANUEL VILLABONA RAMOS	AYUDANTE	38.667	10	386.667	4.687	46.869	433.535	30.933	30.933	402.602	
6	91.487.798	LUIS GARCIA MENDOZA	MAESTRO	38.667	5	193.333	4.687	23.434	216.768	15.467	15.467	201.301	
7	5.726.793	JOSE SADIS SANTOS ORTIZ	AYUDANTE	38.667	3	116.000	4.687	14.061	130.061	9.280	9.280	120.781	
8	91.004.284	LUDWING LEMUS CARRASCA	OFICIAL	38.667	3	116.000	4.687	14.061	130.061	9.280	9.280	120.781	
9	5.122.684	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CAMARGO	AYUDANTE	38.667	2	77.333	4.687	9.374	86.707	6.187	6.187	80.520	
10	91.004.194	BERNAVIDES LEMUS CARRASCAL	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
					58	$ 2.242.667	$ 23.434	$ 271.838	$ 2.531.422	$ 180.767	$ 180.767	$ 3.477.941	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

RUBEN junio 1, 2023 junio 15, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.007.189.705	JHON EIVER SERRANO LEÓN	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
2	1.007.373.421	JAVIER SERRANO LEÓN	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
3	1.049.023.361	YOINER CHACON CARRILLO	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687		580.000	46.400	46.400	533.600	YoinerChaconCarrillo
4	1.004.823.100	JESUS ALFONSO PEREZ ROJAS	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
5	1.134.330.000	JUAN CAMILO GONZALEZ GARISADO	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
6	PTP 6391750	YRWIN GABRIEL GARCIA MARTINEZ	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
7	13.642.925	NATANAEL FONSECA QUINTERO	OFICIAL	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	Natanael
8	91.273.197	JAIME ORLANDO CASTRO OBREGÓN	AYUDANTE	38.667	15	580.000	4.687	70.303	650.303	46.400	46.400	603.903	
					120	**$ 4.640.000**	**$ 37.495**	**$ 492.121**	**$ 5.132.121**	**$ 371.200**	**$ 371.200**	**$ 4.760.921**	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."

PERIODO DEL CESAR junio 1, 2023 junio 15, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO						DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	RECARGO NOCTURNO	TOTAL RECARGO NOCTURNO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	1.096.633.200	JUNIOR SANTIAGO BENAVIDES RAMOS	AYUDANTE	38.667	12	464.000			4.687	56.242	520.242	37.120	37.120	483.122	
2	91.526.196	CESAR AUGUSTO GUEVARA BLANCO	MAESTRO	38.667	15	580.000			4.687	70.303	930.303	68.800	68.800	861.503	
3	9.694.296	JESY CHINCHILLA GARCIA	OFICIAL	38.667	15	580.000			4.687	70.303	755.303	54.800	54.800	700.503	
4	19.775.275	HENRY MANUEL JIMENEZ TURIZO	OFICIAL	38.667	15	580.000			4.687	70.303	849.053	62.300	62.300	786.753	
5	1.234.339.663	JONATHAN VILLAMIZAR URBINA	AYUDANTE	38.667	15	580.000			4.687	70.303	778.387	56.647	56.647	721.740	
6	91.298.595	WILSON CACEREZ RAMIREZ	AYUDANTE	38.667	15	580.000			4.687	70.303	717.970	51.813	51.813	666.157	
7	91.531.063	OMAR JOSUÉ HERNANDEZ RODRIGUEZ	OFICIAL	38.667	15	580.000			4.687	70.303	755.303	54.800	54.800	700.503	
8	PTP 1265121	NAUDYS MENDOZA	AYUDANTE	38.667	15	580.000			4.687	70.303	717.970	51.813	51.813	666.157	
9	91.265.913	OSWAL REYES RUIZ	OFICIAL	38.667	4	154.667			4.687	18.747	173.414	12.373	12.373	161.041	
10	1.095.954.572	KEVIN ANDRÉS RAMÍREZ CAMARGO	AYUDANTE	38.667	7	270.667			4.687	32.808	303.475	21.653	21.653	281.821	
11	13.874.786	JHON MAURICIO CAMARO PARRA	AYUDANTE	38.667	7	270.667			4.687	32.808	303.475	21.653	21.653	281.821	
12	91.509.636	JHON NELSON GONZALEZ SANCHEZ	OFICIAL	38.667	10	386.667			4.687	46.869	433.535	30.933	30.933	402.602	
13	13.743.013	HUGO ARMANDO TORRES BARRIOS	AYUDANTE	38.667	10	386.667			4.687	46.869	433.535	30.933	30.933	402.602	
14	1.096.212.895	DARIO ANDRES PEÑA PEREZ	AYUDANTE	38.667	6	232.000			4.687	28.121	260.121	18.560	18.560	241.561	
15	91.183.717	DEYBI FABIAN TOLOZA GALVIS	OFICIAL	38.667	7	270.667			4.687	32.808	303.475	10.827	10.827	292.648	
					168	$ 6.496.000	$ -	$ -	$ 70.303	$ 787.394	$ 8.235.561	$ 585.027	$ 585.027	$ 7.650.534	

DUPLEX
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER" LOTE 3."

OSCAR junio 1, 2023 junio 15, 2023

N	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
						BASICO	SUBSIDIOS	TOTAL SUBSIDIOS	TOTAL DEVENGADO	APORTES	TOTAL DEDUCIDO		
1	91.542.547	SERGIO GIOVANY URIBE PEREZ	AYUDANTE	38.667	13	502.667	4.687	60.929	576.283	41.228	41.228	535.055	
2	100.753.660	NICOLAS EDUARDO BASTO TORRES	AYUDANTE	38.667	13	502.667	4.687	60.929	576.283	41.228	41.228	535.055	
3	13.746.472	JOHN FREDY MARTINEZ VELASQUEZ	OFICIAL	38.667	8	309.333	4.687	37.495	359.516	25.762	25.762	333.754	
4	91.479.291	ERWING RODRIGUEZ DURAN	OFICIAL	38.667	7	270.667	4.687	32.808	311.933	22.330	22.330	289.603	
5	79.188.719	JUAN MAURICIO POSADA	OFICIAL	38.667	6	232.000	4.687	28.121	268.580	19.237	19.237	249.343	
6	13.720.381	JOAN MANUEL VILLABONA RAMOS	AYUDANTE	38.667	6	232.000	4.687	28.121	272.809	19.575	19.575	253.234	
7	13.716.316	ARMANDO JAIMES RODRIGUEZ	OFICIAL	38.667	1	38.667	4.687	4.687	43.354	3.093	3.093	40.260	
					54	$ 2.088.000	$ 32.808	$ 253.091	$ 2.408.757	$ 172.453	$ 172.453	$ 2.236.304	

JESAK
NIT. 901320986-8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato 429 de 2022

"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER" GRUPO 3

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME SOCIAL MENSUAL No 4

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Estado de revisión y aprobación

Elaboró	Aprobó
ESLENDY CORZO AGUILAR	
ESLENDY CORZO AGUILAR	ING. VLADIMIR POLO PAZ
Profesional Social de Interventoría	Director de Interventoría

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
JUNIO 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN……..... Pág. 3

2. OBJETIVOS…… Pág. 4

2.1 Objetivo General…… Pág. 4

2.2 Objetivos Específicos……... Pág. 4

3. DESCRPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO…… Pág. 5

3.1 Contrato de Interventoría Pág. 5

4. LINEA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA…… Pág. 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLAN DE DIALOGO CIUDADANO…….. Pág. 5

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía…… Pág. 5

4.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana……... Pág. 11

4.3 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas…… Pág. 13

4.4 Acciones de Formación a Empleados de Obra……..... Pág. 15

4.5 Programa de Gobernanza para la Movilidad……. Pág. 15

4.6 Línea Estratégica: Comunicación Estratégica…..…… Pág. 16

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA……..... Pág. 18

5.1 Informe de Gestión……..... Pág. 18

6. CONCLUSIONES…… Pág. 21

7. ANEXOS…… Pág. 22

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales del Contrato de Interventoría **5**

Tabla 2. Participantes de Comités Veedores.....**10**

Tabla 3. Reuniones de Socialización de Inicio.....**11**

Tabla 4. Actas de Vecindad, de Entorno.....**13**

Tabla 5. Personal Mano de Obra No Calificada MONC **16**

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al contrato 429 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, se describe a continuación el Plan de Acción para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el cual tiene como propósito establecer los lineamientos, estrategias, instrumentos y periodicidad de las acciones que la Interventoría aplicará para el seguimiento y verificación de todas las actividades contractuales de orden social, de acuerdo al apéndice J de la Alcaldía de Bucaramanga.

Este informe presenta la recopilación de las responsabilidades concretas dentro del componente de Gestión Social y los programas establecidos para la ejecución del mismo durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, en base en la etapa que cursa el Proyecto y la consolidación puntual de las tareas realizadas en cada uno de sus programas con el grupo 3.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Supervisar, asesorar y controlar de forma oportuna las acciones y avances del contratista, garantizando su cumplimiento en las obligaciones del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, las cuales están descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes que contribuyen en el desarrollo de las actividades comprendidas para la ejecución del componente de Gestión Social.

2.2. Objetivos Específicos

- Revisar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del contratista, conforme a los documentos contractuales.
- Elaborar y desarrollar el Plan de Acción atendiendo a los procesos y lineamientos que hacen parte del componente de gestión social.

- Auditar y garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la interventoría para el desarrollo del Contrato de obra.

- Presentar los informes correspondientes a las obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.

- Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por el Contratista para el desarrollo del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1. Contrato de Interventoría

Tabla 1: *Datos Generales del Contrato de Interventoría*

CONTRATO	**429 de 2022**
OBJETO	**"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"**
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.470.935.00
INTERVENTORÍA	JESAK S.A.S.
SUPERVISOR	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA (Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ)
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2023
PERIODO EJECUTADO	01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
POR EJECUTAR	QUINCE (15) DÍAS

4. LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA DE PLAN DE DIALOGO CIUDADANO

La Interventoría realiza seguimiento a cada una de las actividades del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual se divide en 3 líneas estratégicas, que agrupan los programas y acciones enfocadas a maximizar los beneficios del proyecto y mitigar los impactos sociales producidos por el mismo, los cuales se mencionan a continuación:

4.1. Programa De Servicio A La Ciudadanía

Este programa busca crear un espacio entre las entidades involucradas en el desarrollo del contrato y la comunidad beneficiada del mismo con el fin de ser un puente de comunicación entre las partes, para esto es necesario que el contratista cumpla con ciertos requerimientos así:

- **Punto De Atención al Ciudadano**

En el desarrollo del contrato se implementan Puntos de Atención al Ciudadano PAC, según lo estipulado en el Apéndice J del componente de gestión social, en el cual, para su adecuado funcionamiento el contratista estableció un espacio, horarios y formatos para registrar gestionar y tramitar las diferentes **PQRSD** de manera oportuna y promover un dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del contrato, se cuenta con el apoyo de la Junta de Acción Comunal JAC y ediles.

En el mes de junio el contratista 7G7 ha creo un (1) punto más de atención a la ciudadanía el cual se encuentra ubicado en el Diamante 1:

Fotografía 1: *Puntos de Atención al Ciudadano*

PUNTO A INTERVENIR	PUNTO PAC
COMUNA 9 **B/ Diamante I** ➢ Costado occidental Carrera 33 convergencia Calle 105 **Horario de atención** **Día:** Viernes **Hora:** 8:00 am a 10:00 am	 **BARRIO DIAMANTE I**

A la fecha ya se han creado 9 puntos de atención a la ciudadanía los cuales operan de la siguiente manera:

Fotografías 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: *Puntos de Atención al Ciudadano*

PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			
BARRIO	**UBICACIÓN PAC**	**HORARIO DE ATENCIÓN**	
		DÍA	**HORA**
Mutis	 Oficina salón comunal B/ Mutis	Lunes	8:00 am - 10:00 am
Real de Minas (unidad residencial Los Sauces)	 Lovvy unidad residencial Los Sauces	Lunes	10:00 am - 12:00 m

Estoraques II	 Cra 47ª N° 59b-48 B/ Estoraques II (costado de la plazoleta)	Martes	8:00 am - 10:00 am
Real de Minas (Carrera 8)	 Tienda Conjunto Residencial San Remo II	Martes	10:00 am - 12:00 m
Diamante II	 Esquina tienda La Luna B/Diamante II	Miércoles	8:00 am - 10:00 am
La Victoria	 Cra 19 n° 65-133 Restaurante Carnes Prada	Miércoles	10:00 am - 12:00 m
Villa Alicia	 Plazoleta Villa Alicia	Jueves	8:00 am - 10:00 am

Puerta del Sol	 Entrada conjunto Salle Plaza	Jueves	10:00 am - 12:00 m

- **Gestionar y Tramitar Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de Manera Eficaz y Oportuna.**

Para garantizar una adecuada atención a la comunidad se creó un formato de PQRSD en el cual los beneficiarios puedan registrar sus Inquietudes, Quejas y Reclamos directamente relacionados con el proyecto y el cual encontraran en los puntos PAC, teniendo en cuenta los horarios establecidos por la profesional social que ya fueron socializados con la población aferente del proyecto, además la profesional social del contratista 7G7 SAS compartió el número de contacto 323 8153258, con el fin de brindar una comunicación directa y poder resolver situaciones a tiempo, igualmente se creó un correo electrónico pqr7g7sas@gmail.com, al cual tienen acceso para cualquier solicitud. El buzón será administrado por el área y revisado cada semana, las respuestas a las PQRSD que se generen se darán en el menor tiempo posible o en la medida en que las posibilidades lo permitan, teniendo informada a la comunidad frente al proceso de la misma.

Mensualmente se realiza un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron durante el período reportado, con base en lo anterior; del formato ya diligenciado se realizará un balance del estado en el que se encuentran cada PQRSD mediante informe, dando así seguimiento y verificación al proceso de atención a estas solicitudes.

En el mes de junio la profesional social del contratista realizó la respectiva revisión del correo electrónico, igualmente la atención a la ciudadanía en los puntos PAC, se recibieron cuatro PQRSD, de las cuales 3 fueron atendidas y subsanada y la cuarta se encuentra en proceso **(Ver Anexo 1)**.

- El día 6/06/2023 se recibe PQRSD por parte de las personas que conforman la veeduría ciudadana del frente de obra en Diamante II, comentando que al momento de dar apertura a este frente no se cuentan con todos los elementos requerido, como punto ecológico, punto de emergencia, servicio de agua potable y unidad sanitaria, igualmente que se presenta carencia de señalización y cerramiento en obra; la empresa contratista 7G7 SAS frente a la situación presentada realiza los ajustes pertinentes al día siguiente, teniendo en cuenta el plan de maneja de trafico previniendo accidentes en la zona que se está interviniendo, además se envía respuesta a la PQRSD de manera formal el día 16/06/2023.

- El día 7/06/2023 se reciba PQRSD por parte de la señora Janeth del Valle responsable de la vivienda ubicada en la Calle 89 N° 24-85 B/Diamante II informando que al realizar la demolición del andén se ocasionaron daños en su vivienda, donde se rompieron 7 baldosas, se afectó la columna que sostienen la reja y por ende al cerrar o abrir esta se cae, por el momento el inspector de obra procede a amarrar la reja a la columna para evitar que se caiga completamente; a la fecha se realizó un resane a la columna y se soldó la reja para subsanar este problema, aún está pendiente reponer las 7 baldosas que fueron partidas, las cuales el contratista se hace responsable y se compromete en solucionar lo más pronto posible.

- El día 10/06/2023 se realiza una conciliación con el señor Ángelo Manrique propietario de la vivienda ubicada en la Calle 59 N° 47 aw-16 B/Estoraques II, en donde se le explica la importancia de quitar una matera que se encuentra sobre el andén y el paramento de su vivienda y ya que esta se encuentra sobre el espacio público, se ve la necesidad de quitarla y recuperar este especio facilitando la movilidad de todos los peatones, especialmente de adultos mayores, personas en sillas de ruedas y personas con dificultad visual.

- El día 14/06/2023 se recibe PQRSD del propietario de la vivienda ubicada en la Calle 89 N°24-15 del B/Diamante II ya que el día sábado 10/06/2023 se generó un daño en la tubería del agua el cual pudo evidenciar en horas de la tarde donde ya no se encontraba personal de obra, por ende, llamo a un tercero para solucionar el problema y el cual le cobro la suma de $50.000 mil pesos, los cuales ya fueron cancelados al propietario el día 20/06/2023.

Fotografías 10 y 11: *Recepción de PQRSD*





- **Recorridos Urbanos**

Los recorridos urbanos permiten identificar acciones que puedan afectar a la comunidad, minimizando situaciones que interfieran para el óptimo desarrollo del contrato.

Para llevar a cabo estos recorridos la interventoría programará en conjunto con la profesional social de la firma contratista, las fechas y hora de esta actividad.

La interventoría en el mes de junio hizo acompañamiento a la profesional social del contratista para identificar y reconocer las zonas a intervenir, los actores importantes como Ediles, líderes comunitarios y la junta de acción comunal, quienes apoyaron el proceso de invitación a la socialización de inicio del proyecto a ejecutar, lo cual permite continuar alimentando el directorio de actores principales de las comunas y barrios que hacen parte de este contrato.

Igualmente, en el transcurso de las semanas se realizan recorridos por los diferentes frentes de obras las cuales se encuentran en proceso de ejecución con el fin de evidenciar el avance y escuchar las sugerencias y opiniones de la comunidad aferente a la zona de intervención.

Fotografías 12 y 13: *Recorridos Sociales*





- **Conformación de Comités de Veeduría**

La interventoría verifica la conformación de los comités de veeduría y participación ciudadana con el fin de promover la importancia de las obras, sus cuidados y el buen uso para la sostenibilidad de las mismas y realizará seguimiento a la información que se solicite.

En la reunión de socialización de inicio realizada en este mes, fue posible conformar la veeduría ciudadana en el barrio Diamante I, las personas inscritas en el comité de participación y veedurías se pueden observar en el siguiente cuadro. **(Ver Anexo 2)**

Tabla 2: *Participantes de Comité Veedor*

COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA	
Diamante I	Luis José Monsalve Néstor Carreño Juan Fernando Guerrero William Estévez

Además en el mes de junio dando cumplimiento al Plan de Dialogo y Comunicación Estratégica se realizaron las reuniones de seguimiento con los comités de veeduría ciudadana de los tramos que se encuentran en proceso de intervención, como lo son: barrio Mutis, Estoraques II, Sauces, Real de Minas y Diamante I, donde se contó con los participantes de los comités veedores conformado, personal del área técnica y social del contratista e interventoría, donde se les da a conocer el proceso de ejecución a la fecha y las dificultades que se han encontrado, igualmente se reciben las observaciones que surgen en la reunión con el fin de subsanarlas o mejorarlas. **(Ver Anexo 3)**

Fotografías 14 y 15: *Recorridos Sociales*





4.2. Programa De Dialogo Y Participación Ciudadana

Este programa se define por la necesidad de establecer el buen manejo de la información en relación con la comunidad y el desarrollo de la obra.

Por medio de la interventoría social se realizó la verificación de los diferentes momentos informativos así:

- **Reunión de Inicio**

Se programó 1 reunión de inicio, para esta actividad fueron convocados presidente de la Junta de Acción Comunal JAC, Ediles, líderes comunitarios, representantes de la entidad contratante, interventoría, contratista y comunidad en general. **(Ver Anexo 4)**

Se realizó una invitación por medio de volantes informativos puerta a puerta con el fin de que la comunidad pueda asistir a la socialización y conozcan aspectos importantes respecto a la ejecución del contrato.

Tablas 3: *Reuniones de Socialización de Inicio*

FECHA HORA	DESCRIPCIÓN	ASISTENTES
DIAMANTE 1 29/06/2023 6:30 pm	La interventoría realiza acompañamiento en el mes de junio a una (1) reunión de socialización de inicio del grupo 3. Se hace la presentación de los asistentes y por medio de diapositivas los profesionales encargados del área técnica, ambiental, SST y social brindan información relacionada con el contrato, se despejan las dudas y se resuelven inquietudes de la comunidad respecto al proyecto.	**11**

Fotografías 16 y 17: *Reuniones de Socialización de Inicio*





Hasta la fecha del presente informe el contratista 7G7 S.A.S. lleva un total de diez (10) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se van a intervenir.

- **Reunión de Avance**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se ejecute el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha ejecutado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades.

Para el periodo del presente informe se realizó reunión de avance en el frente Sauces donde asistió el comité veedor, comunidad del sector, interventoría Jesak y profesional social y técnico de la empresa contratista 7G7, con el fin de dar un informe del avance de obra a la fecha, igualmente se respondieron preguntas relacionadas a retrasos y plan de trabajo a implementados para generar el menos impacto negativo.

- **Reunión de Finalización:**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se presente el 100% de la obra física terminada, es decir finalizada la etapa de construcción.

- **Actas de socialización, volantes informativos, registro fotográfico, formato de entrega de piezas divulgativas.**

El contratista creo un modelo de volante informativo el cual fue aprobado por la interventoría y entregado en la zona donde se realizaron las reuniones de socialización de inicio, esta actividad se ejecutó puerta a puerta, además esta misma información se le compartió vía WhatsApp a los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC, ediles y líderes comunitarios del barrio Diamante 1 y en donde se hacen reuniones de avance.

Adicional a esto se hizo entrega de las actas de reunión levantadas en cada una de las socializaciones, formatos que estarán anexos al presente informe. En estas reuniones se explica el diseño, el tiempo de ejecución y las actividades propias de la obra.

Fotografía 18: *Volantes de Invitación*



Hasta el momento del presente informe 7G7 SAS lleva un total de 10 reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada uno de las comunas que se va a intervenir.

4.3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Actas de Vecindad y/o Entorno**

Con el fin de conocer el estado de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tendrá en cuenta el criterio técnico que permite ubicar las zonas que posiblemente puedan verse afectadas con los trabajos que se van a realizar. Adicional a lo anterior se levantó el formato acta de vecindad de inicio registrando de manera detallada el estado inicial de las áreas susceptibles de ser afectadas con la construcción.

El area de gestión social realizo acompañamiento los días 15, 16 y 26 de junio al area técnica para el levantamiento de las Actas de Vecindad de Inicio a cargo del contratista, se conto con la presencia de la interventoría, esta actividad se realiza con el fin de conocer el estado actual de cada una de las viviendas ubicadas frente a la obra para evitar futuras reclamaciones, pero en el caso de que exista algun daño o afectación el contratista debera dejar igual o en mejores condiciones de como se encontraba. **(Los archivos se entregaran en un documento PDF al presente informe).**

Dicha actividad fue informada a los propietarios o arrendatarios por medio del sistema de cornetas y colaboración del comité veedor creado el día de la socialización del proyecto, con el fin de contar con la disponibilidad y permiso para tomar el respectivo registro fotográfico y la información detallada del estado actual de la vivienda.

Tabla 4: *Actas de Vecindad y/o Entorno*

Frente		Dirección	Fecha
Real de Minas (Conjunto Parque San Remo II)	ACTAS DE VECINDAD	Casa 53	15/06/2023
		Casa 54	
		Casa 55	
		Casa 56	
		Casa 57	
		Casa 58	
		Casa 45	16/06/2023
		Casa 46	
		Casa 47	
		Casa 49	
		Casa 50	
		Casa 51	
		Casa 52	
Diamante I	ACTAS DE VECINDAD	Cll 104 N° 16-39	26/06/2023
		Cll 104 N° 16-63	
		Cll 104 N° 16-43	
		Cll 104 N° 16-13	
		Cll 104 N° 16-19	
		Cll 104 N° 16-39	
		Cll 103 C 04	
		Cll 103 C 08	
		Cll 103 C 14	
		Cll 103 C 18	
		Cll 103 C 19	
		Cll 103 C 09	
		Cll 103 C N° 16-60	
		Cll 103 C N° 16-52	
		Cll 103 C N° 16-50	

Para este informe la interventoría recibe un archivo PDF de los formatos anteriormente mencionados.

Fotografías 19 y 20: *Actas de Vecindad*





Los días 2 y 27 de junio se realizó el levantamiento de 5 actas de entorno en el conjunto Parque San Remo II, Metrópolis I, II y III y Recrear e iglesia B/La Victoria, en compañía del área técnica.

- **Actas de Compromiso**

La interventoría veló por que el contratista, en caso de requerirse, firmara acuerdos con los propietarios de predios, que permita el normal desarrollo de las actividades de obra programadas.

En el tiempo comprendido del presente informe no se realizaron actas de compromiso.

- **Otras Actividades**

Teniendo en cuenta que para la correcta ejecución de la obra se debe contar con servicios como agua, electricidad, unidad sanitaria, espacios para acopio de material y guardar herramientas de uso menor y señalizaciones, la profesional social realiza un acercamiento en la zona a intervenir y con colaboración de la comunidad se buscan los espacios los cuales puedan brindar este servicio por el tiempo de ejecución de la obra, generando un compromiso en donde la empresa contratista cuidadora y ara buen uso de los servicios prestados. **(Ver Anexo 5)**.

El día 28 de Junio del 2023 la profesional social de la interventoría Jesak hace entrega de una notificación al señor Jairo Duarte propietario de la vivienda N° 52 del conjunto San Remo II, ya que se encuentra realizando una actividad en el muro colindante con el área de intervención, dando claridad que ni el contratista ni la interventoría permite el ingreso de personal ajeno a la obra ya que representa un riesgo para la integridad de las personas y que es directamente sería directamente el propietario quien asumirá toda la responsabilidad en caso de ocurrir alguna situación. **(Ver anexo 6)**

Fotografías 21 y 22: *Actividades Sociales*





4.4. Acciones de Formación a Empleados de Obra

Se verificará el cumplimiento de un plan pedagógico con los trabajadores que ejecutan actividades en el desarrollo del contrato por medio de charlas preventivas.

En el mes de junio el contratista realizó capacitación al personal de obra en cada uno de los frentes, Sauces, Mutis y Estoraques II, dando a conocer el manejo del estrés además se realizó una actividad lúdica que permitió crear una reflexión sobre el tema tratado. **(Ver Anexo 7)**.

Fotografías 23 y 24: *Capacitación a Mano de Obra No Calificada MONC*





4.5. Programa de Gobernanza para la Movilidad

- **Articulaciones Interinstitucionales**

A la fecha no se han realizado actividades de gestión y articulación institucional pero el contratista tendrá en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto, logrando un trabajo articulado con cada una de las entidades o instituciones.

- **Generación de Empleo**

Este programa busca vincular a personal, brindando oportunidades que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas de los habitantes de la localidad.

En las reuniones de socialización inicial se ha informado a la comunidad sobre la recepción de hojas de vida, con el fin de vincular laboralmente al proyecto hombres y mujeres que residan en el sector, aportando al desarrollo económico de la zona, logrando vincular a la fecha 36 trabajadores, de las cuales 3 son mujeres realizando la actividad de control de tráfico, dando cumplimiento a la contratación de mano de obra no calificada femenina que está estipulada en el apéndice j con un porcentaje de 30 %; la profesional HSEQ lleva un registro detallado del personal del sector que se ha vinculado el cual se anexara en el presente informe.

Tabla 5: *Personal Mano de Obra No Calificada MONC*

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	
NOMBRES Y APELLIDOS	**DIRECCCION**
Nancy Pallares Chogo	Calle 29 # 5 - 57 B.Centro
Jhon Eiver Serrano Leon	Calle 8 An # 19 - 54 Casa 2 M33
Fredy Cuadros Bastidas	Calle 64 # 1 W -07 B Mutis
Juan Luis Sabalza Fontalvo	Calle 38 # 24 - 40 B Colorados La Fortuna
Miguel Mendez Rangel	Cra 11 # 12-32 Florida
Javier Serrano Rangel	Casa 220 Nogal 2 B Colorados
Yoiner Chacon Carrillo	Transv 144 # 76 2° Piso B. La Cumbre
Jesus Alfonso Perez Rojas	Calle 104 # 6-33 Porvenir
Juan Camilo Gonzalez Garisado	Manz 10 Casa 2 Colorados
Diego Armando Rojas	Cra 24 # 46 - 03 Campestre Norte Colorados
Natanael Fonseca Quintero	Conjunto Altos De Betania Norte Torre 5 Apart 101
Yrwin Gabriel Garcia Martinez	Cra 45 W # 59 - 20 Estoraques
Cesar Augusto Guevara Blanco	Secto 7 Casa 33 Asomiflor
Henry Manuel Jimenez Turizo	Sector Casa 28 A Asomiflor
Yesid Chinchilla Garcia	Km 6 2- 46 Colorados
Jhonathan Villamizar Urbina	Bucarica Blo 17 18 Ap 501
Junior Santiago Benavides	Cra 47 # 141 B -26 B. Juan Pablo Ii
Wilson Caceres Ramirez	Manz 29 # 18-42 Casa 2b Villarosa
Jaime Orlando Castro Obregon	Cra 35w # 64- 28 Monterredondo
Duvan Trujillo Cortes	Calle 28 # 10-46 10 De Mayo
Jhon Sebastian Aparicio Serrano	Vrda Santa Barbara La Despensa F/Da
Luis Humberto Duran Gamboa	Cl 104 # 30 31 B. Diamante 1
Marlon Yesid Navarro Sanchez	Calle 43 # 7 - 88 B. 10 De Mayo
Omar Andres Pinzon Bernal	Call 29 # 5 18
Julian Andres Aparicio Solano	Vrda Santa Barbara La Despensa F/Da
Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Calle 45 # 9-63 B Garcia Rovira
Oscar Javier Aparicio Solano	Vrda Santa Barbara La Despensa F/Da
Nancy Vasquez Torres	Calle 30 N 8-05 Las Hamacas Norte
Naurys Mendoza	Calle 15 A Peatonal 13-92 Puerto Madero Giron
Jhon Fredy Gutierrez Guarin	Km 7 V Al Mar Vrda Vijagual Finca Paraguitas Casa 7
Omar Josue Hernandez Rodriguez	Cra 8 W # 35 - 14 La Joya
Oswal Reyes Ruiz	Cra 17 # 70 105 B. San Gerardo
Benjamin Roman	Casa 85 B. Santos Via A Matanza
Mary Nalsi Pallares Chogo	Villas De Girardot Casa 136
Nicolas Eduardo Basto Torres	Cra 18 A # 60 49 B. Trinidad
Sergio Giovany Uribe Perez	Cra 17 # 63 105 B. San Expedito

4.6. LÍNEA ESTRATÉGICA: Comunicación Estratégica

La interventoría verificó la entrega de las piezas generales de divulgación como herramientas de información que describen aspectos de la obra los cuales serán distribuidos a los residentes del área de influencia.

El contratista por medio de la profesional social propicia canales de información claros, veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto; Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos. Además, para la segunda fase de inicio se busca sensibilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, por lo tanto, se da a conocer que todas estas adecuaciones son incluyentes porque tienen en cuenta a la población en condición de discapacidad.

Para el logro de lo anterior se ha hecho uso de las siguientes estrategias de comunicación

- Volantes Informativos
- Sistema de Cornetas
- Voz a Voz
- Grupos Whatsapp de la Comunidad

- **Piezas Informativas**

La profesional social del contratista hizo entrega de las piezas de divulgación para su respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría.

- **Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto**

En el mes de junio se hizo acompañamiento social a la profesional del contratista en diferentes actividades que fortalecen el trabajo con la comunidad.

Fotografía 25: *Reunión Gestión Social*



- **Valla Informativa**

Se envió la información solicitada con relación a la valla a utilizar durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos requeridos por la oficina de prensa de la alcaldía municipal, una vez aprobada será ubicada en un punto estratégico de la obra.

Fotografía 26: *Imagen de la Valla Informativa*



- **Divulgación de información PMT**

Se dio a conocer a la comunidad información relacionada al plan de manejo de transito PMT, para dicha actividad se dispone de una (1) cartelera informativa, en el punto PAC de los barrios Mutis, Estoraques II, Real de Minas, Los Sauces y Diamante II, donde la comunidad puede evidenciar los parámetros básicos del control de tránsito.

- **Controlador de Trafico:**

En el mes de junio se ha implementado esta medida con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el tráfico y transporte terrestre. El contratista 7G7 SAS dentro del personal tiene contratado a dos mujeres que realizan está actividad y de esta manera está apoyando a mujeres de la zona de influencia.

- **Tecnologías de la Información y Comunicación:**

Por medio de este ítem se hizo relevancia en la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información por medio de:

- Mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico
- Imágenes, folletos, avisos o carteles en físico o digital

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

5.1. Informes de Gestión

- **Informe Mensual.**

Con el fin de dar cumplimiento al ítem de entrega informes mensuales la interventoría recibió el informe mensual social No 4 de la firma contratista, el cual fue revisado y aprobado por esta interventoría, de la misma manera se presenta el informe mensual social de la interventoría No 4 para su revisión y aprobación.

Además, se dio cumplimento a la entrega en físico del documento correspondiente al componente de Gestión social el “Plan de Dialogo y Comunicación Estratégica”, dicho documento fue radicado en la secretaria administrativa de la alcaldía de Bucaramanga el 15/0672023. **(Ver Anexo 8)**.

- **Inspección de Campo.**

Los criterios que sigue la interventoría para valorar el desempeño social del contratista están basados en los acompañamientos y resultados de las inspecciones semanales realizados en el proyecto.

- **Bitácora Social**

La profesional social del contratista registra en la bitácora social información del componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica lo cual permite tener claridad en cada una de las actividades realizadas en campo y la cual es revisada y firmada por la profesional social de la interventoría.

- **Comités Integrales.**

El área social estará presente en las reuniones en las que sea convocada y/o pertinente la participación, brindando información relacionada y actualizada en el tema del componente de gestión social.

Se propone realizar reuniones y acompañamientos desde el área social de la interventoría al grupo 3 del contratista para conocer el trabajo desarrollado, los avances, aciertos e inconvenientes identificados durante la ejecución de las obligaciones estipuladas desde el componente de gestión social.

Los días 01/06/2023, 15/06/2023 y 29/06/2023 se llevaron a acabo los comités técnicos con el contratista 7G7 SAS, la interventoría Jesak SAS donde se habló sobre las actividades realizadas a la fecha desde el área técnica y social, igualmente dificultades presentadas en obra, además se adquieren unos compromisos con el fin de mejorar la ejecución del contrato. **(Ver Anexo 9)**

Fotografías 27 y 28: *Reunión de Acompañamiento Social a Comité Técnico*





El día jueves 29 de junio se realizó una reunión en las instalaciones de la alcaldía municipal con la trabajadora social Xiomara de la secretaria de infraestructura, la profesional social de la interventoría JESAK SAS y las 3 profesionales sociales de los grupos contratistas del proyecto, en donde se realizó una rendición de las actividades realizadas y por realizar a la fecha, así como también las dificultades encontradas, las pqrs y sus respectivas respuestas. **(Ver Anexo 10)**

Fotografías 29 y 30: *Reunión de Acompañamiento Social a Comité tecnico*





- **Calificación del Componente de Gestión Social**

Durante el mes de junio se diligencia el Excel correspondiente a la lista de chequeo que permite evidenciar de manera detallada el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista Consorcio Santander. **(Ver Anexo 11)**

6. CONCLUSIONES

El contratista dio alcance a las actividades del componente social que se ha venido desarrollando en esta etapa del contrato y a las actividades descritas en el Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

Es fundamental seguir contando con el acompañamiento por parte de las profesionales sociales de la Alcaldía en las diferentes reuniones y socializaciones que se desarrollen con la comunidad ya que son las persona que representan en el área social a la entidad contratante durante la ejecución del proyecto.

El lineamiento para el componente de Gestión Social se propone a los contratistas teniendo en cuenta el apéndice J y se está implementado tal y como se muestra en el presente informe.

Se está dando cumplimiento al Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para mitigar los impactos que se ocasionan en la ejecución del contrato y de esta manera generar apropiación y sostenibilidad en las comunidades que garantice el adecuado desarrollo del proyecto.

7. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATOS DE PQRS Y RESPUESTAS

ANEXO 2: ACTA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VEEDURÍAS

ANEXO 3: ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTOS VEEDURIAS

ANEXO 4: ACTAS DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO

ANEXO 5: ACTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO 6: OFICIO PROPIETARIO SAN REMO

ANEXO 7: CAPACITACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

ANEXO 8: OFICIO CON RADICADO DEL DOCUMENTO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 9: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 10: ACTA DE REUNIÓN SOCIAL

ANEXO 11: CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL





Adalberto Veedor Diamante II

Buenos días, en el día de ayer visitamos la obra de mejoramiento de andenes ubicado en la calle 87 con carrera 24 y 25, fuimos atendidos por el Ing. Mario Hernández, las personas que asistieron a la visita de inspección fueron: Cesar Augusto Aguilar y Adalberto Gutierrez B. Hallazgos: se evidencio carencia de señalización no se observo avisos de prevención de inicio y fin de obra, precaución, señalética importante en la prevención de accidentes de acuerdo a la mitigación urbana de prevención accidentes que se debe tener. la demarcación presenta deficiencia en su zona peatonal esta solo se ubicó sobre la calle y el comienzo de la carrera expone directamente al transeúnte al riesgo de transito, ver imágenes, los postes utilizados para la demarcación que llevan la cinta de prevención carecen de las franjas amarillas y negras que indican prevención de acuerdo a lo recomendado por la resolución 2400 de 1979, el vehículo cargador utilizado en la obra carece de señal lumínica que indique su funcionamiento en vía,



06:05 84 %

VEEDURIA CIUDAD...
Adalberto, Cesar, José , Mart...

normalidad posible. cordila saludo
Adalberto Gutierrez B dignatario
JAC. 11:07

Adalberto Veedor Diamante II



Muy buenos días muchas gracias
señor Alberto por sus observaciones
ya empezamos a trabajar en subsanar
las situaciones presentadas y así evitar
situaciones de posibles accidentes tanto
para peatones, residentes, vehículos y
personal en obra en la zona. 11:13

Reenviado



Mensaje

CO-7G7-417-2023-0088

Bucaramanga, 16 de Junio de 2023

Señores
Cesar Augusto Aguilar
Adalberto Gutiérrez
Veedores proyecto 417
Frente Diamante II Calle 89
Teléfono: 3166151986-3147390453
Email: adaguzura@gmail.com

Referencia: **CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3."**

Asunto: Respuesta PQRSD frente Diamante II CALLE 89 radicado el 6/06/2023

Cordial saludo,

Exaltando de antemano su loable labor de veeduría, con la presente damos respuesta a su petición del asunto, informando que una vez recibida se acató la orden de suspensión de actividades por parte de la interventoría y procedió acuciantemente a verificar y realizar los ajustes respectivos así:

En atención al asunto, se informa lo siguiente:

1. Respecto a la señalización y cerramiento perimetral de las áreas a intervenir, se realizaron los ajustes pertinentes teniendo en cuenta el plan de manejo de tráfico (PMT) el cual cuenta con habilitación de Dirección de tránsito de Bucaramanga, con el fin de prevenir accidentes en la zona donde se está interviniendo, de acuerdo con el esquema de señalización planteado, donde se incluyé:

- Señalizaciones: -Inicio de obra
  -Reducción de carril
  -Controlador de tráfico
  -Sendero peatonal
  -Aproximación a obra en la vía


- Cerramiento: -Perimetral 45 delineadores tubulares, lona verde y malla naranja
  -Peatonal 39 delineadores tubulares demarcados con cinta peligro


Señalización





Cerramiento

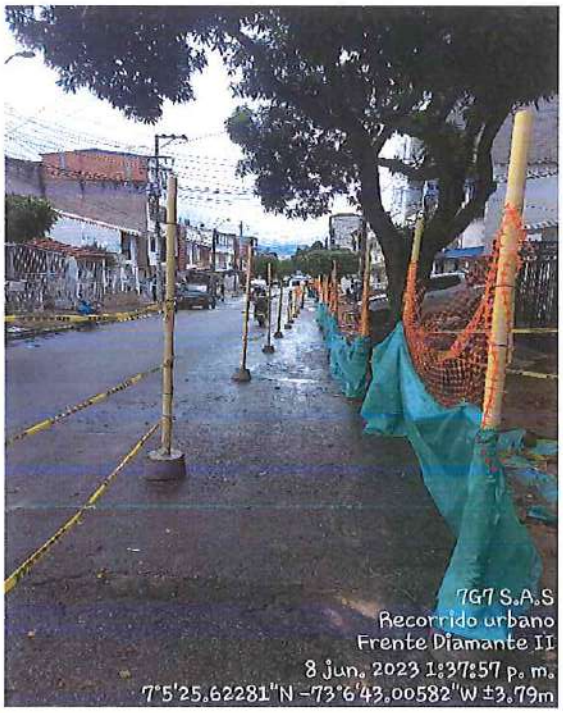

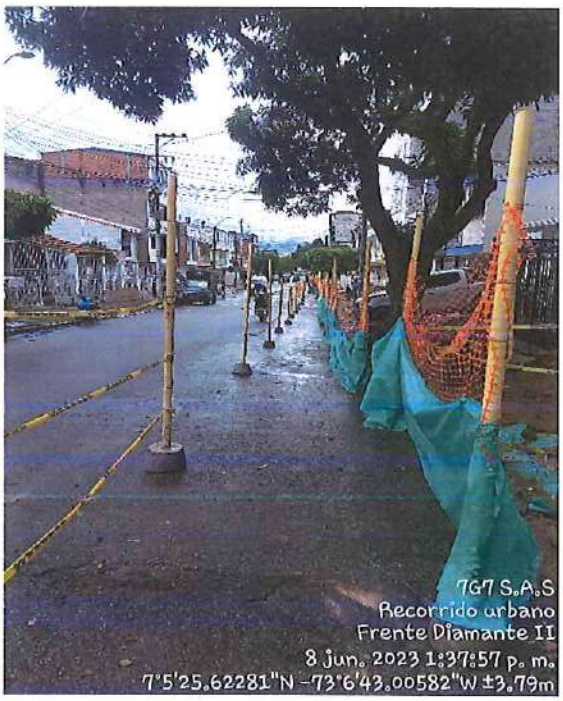

2. En cuanto al punto de emergencia este se encuentra ubicado en la Cll 89 N° 24-81 donde se encuentra camilla, botiquín de primeros auxilios y extintor contra incendios Multipropósito (polvo químico seco), igualmente en esta dirección se encuentra el punto ecológico contando con el adecuado uso de los residuos sólidos, se cuenta con bolsa blanca de residuos aprovechables para papel, cartón, plástico vidrio y metales, bolsa verde de residuos orgánicos aprovechables restos de comida y desechos agrícolas y bolsa negra de residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas papeles y cartones contaminados, bajo la Resolución 2184 de 2019.


Punto de emergencia





Punto ecológico



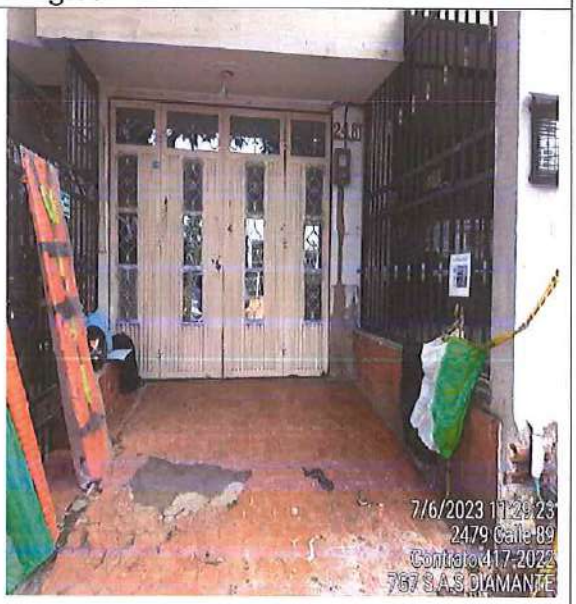

3. En relación al uso de agua potable in-situ, el servicio es suministrado en la vivienda ubicada en la Cll 89 N 24-69, en cuanto al punto de hidratación se cuenta con termo en área de obra para el uso del personal.

PUNTO DE HIDRATACIÓN


4. El personal contratado cuenta con las siguientes capacitaciones de acuerdo al cronograma bajo el SGSST, Decreto 1072 de 2015:

-Inducción en seguridad y salud en el trabajo
- Uso de dotación en obra y elementos de protección
-Autocuidado durante la jornada laboral
-Importancia de la señalización de obra y de transito
-Higiene postural manejo de cargas
-Resolución de conflictos
-Cuidado y protección de la piel

Capacitación personal de obra	
	

5. En cuanto al manual de prevención de impactos y aspectos ambientales, es pertinente aclarar que el contratista se encuentra implementando el MAO Manual Ambiental de Obra aprobado, en donde se estables medidas ambientales dentro de fichas y programas.

Cordialmente,

EDGAR ALONSO QUESADA O.
Apoderado
7G7 S.A.S

C.C oficina 7G7 SAS
Elaboro: Natalia López - Profesional Social
Carmen Cáceres - Profesional HSEQ

Anexo: PQRSD veedores Diamante II

Alcaldía de Bucaramanga	**FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"**	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

NOMBRE DEL PROYECTO: Contrato 417 de 2022, "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander" grupo 3.

Fecha: 7/06/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
   Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
☐	☒	☐	☐	☐

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Janath del Valle
Número del documento de Identidad	63306706
Dirección	Cll 89 24-85
Número(s) de teléfono(s)	3203894059
Correo electrónico	No tiene

3. DESCRIPCIÓN:
   Relate los motivos de su PQRSD

El día jueves 7/06/2023 la empresa contratista del proyecto de andenes, al realizar la demolición del anden de la vivienda en la que habito en la cll 89 Nº 24-25 realizaron el rompimiento de 7 baldosas, ademas la columna a mano izquierda que sostiene la reja presenta un daño causando que no se pueda cerrar la reja, al ingeniero encargado amarro con un alambre la reja al columna para evitar que se caiga, solicito que puedan solucionar este problema lo mas pronto posible y puedan dejar la vivienda en las condiciones en las cuales se encuentran. Se anexan fotografias de los daños realizados.

Firma del peticionario:

Janath del Valle Castro

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
Alcaldía de Bucaramanga 7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S NIT: 901120358-4	VERSIÓN: 01
	Fecha : 10/06/2023	Hora inicio:
	Lugar : Cll 59 Nº 47aw-16	Hora finalización:
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3	Acta NO :_____ Pág.
OBJETIVO DE LA REUNION	Conciliar con el propietario de la vivienda ubicada en la Cll 59 Nº 47aw-16 B/ Eloraque con el fin de poder ejecutar e intervenir el anden.	

TEMAS A TRATAR

Conciliar con el propietario de la vivienda ubicada en la Cll 59 Nº 47aw-16 del B/ Eloraque II

DESARROLLO DEL TEMA

El dia sabado 10/06/2023 la profesional social de la empresa contratista 7G7 se acerca a la vivienda ubicada en la Cll 59 Nº 47aw-16 B/ Eloraque habla con el señor Angelo Manrique quien manifiesta su inconformidad por quitar una matera de aproximadamente cm que se encuentra sobre el anden existente y al paramento de su vivienda; se le explica al propietario la necesidad de quitarla del sitio ya que esta se encuentra sobre el espacio publico y al momento de realizar la adecuación del anden no contaríamos con el perfil vial requerido, ademas que al realizar el proyecto de adecuación estaríamos recuperando el espacio publico y facilitando la movilidad de todos los peatones, especialmente de adultos mayores, personas en sillas de ruedas y personas con dificultades visuales,

Se logra conciliar con el joven Angelo quien autoriza quitar la mafafa existente y permitir la intervención del Andén.

COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**
Natalia López	Profesional Social IGT	
Angelo Gabriel M A		

Alcaldía de Bucaramanga	**FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"**	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

NOMBRE DEL PROYECTO: Contrato 417 de 2022, "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander" grupo 3.

Fecha: 14/06/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
   Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja	X	Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Andelfo Forero Rojas
Número del documento de Identidad	91211041
Dirección	cll 89 Nº 24-75 Piso 1
Número(s) de teléfono(s)	3166754262
Correo electrónico	andelfoforero@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
   Relate los motivos de su PQRSD

El dia sabado 10/06/2023 la empresa contratista que se encuentra realizando los andenes rompieron el tubo de suministro de agua causando empozamiento y filtración de agua a lo cual al ser ya medio dia procedi a llamar un plomero para arreglar el daño ya que ha esa hora ya no se encontraba personal de la obra. El arreglo de este daño genero un costo de $50.000 mil pesos lo cual solicito a la empresa contratista pueda reponer el costo generado

Firma del peticionario:

91.211.041 Bga

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
Alcaldía de Bucaramanga / 7G7 S.A.S Construcción y Consultoría	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S NIT: 901120358-4	VERSIÓN: 01
	Fecha : 20/06/2023	Hora inicio: 11:00 am
	Lugar : Casa 24-15 B/ Diamante II	Hora finalización: 11:10 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3	Acta NO :_____ Pág.
OBJETIVO DE LA REUNION	Respuesta PQRSD y firma de acta de conformidad	

TEMAS A TRATAR


Dar respuesta a la PQRSD recibida al 7/06/2023

DESARROLLO DEL TEMA

El dia 20/06/2023 se realiza el pago al señor propietario de la vivienda 24-15 del B/ Diamante II por un valor de $50.000 mil pesos por daños causados a la tuberia, al cual lo recibe a conformidad firmando la presente acta y dando respuesta a PQRSD recibida el 7/06/2023.

CC # 91211041 Bga

Anexo: Recibo de caja menor

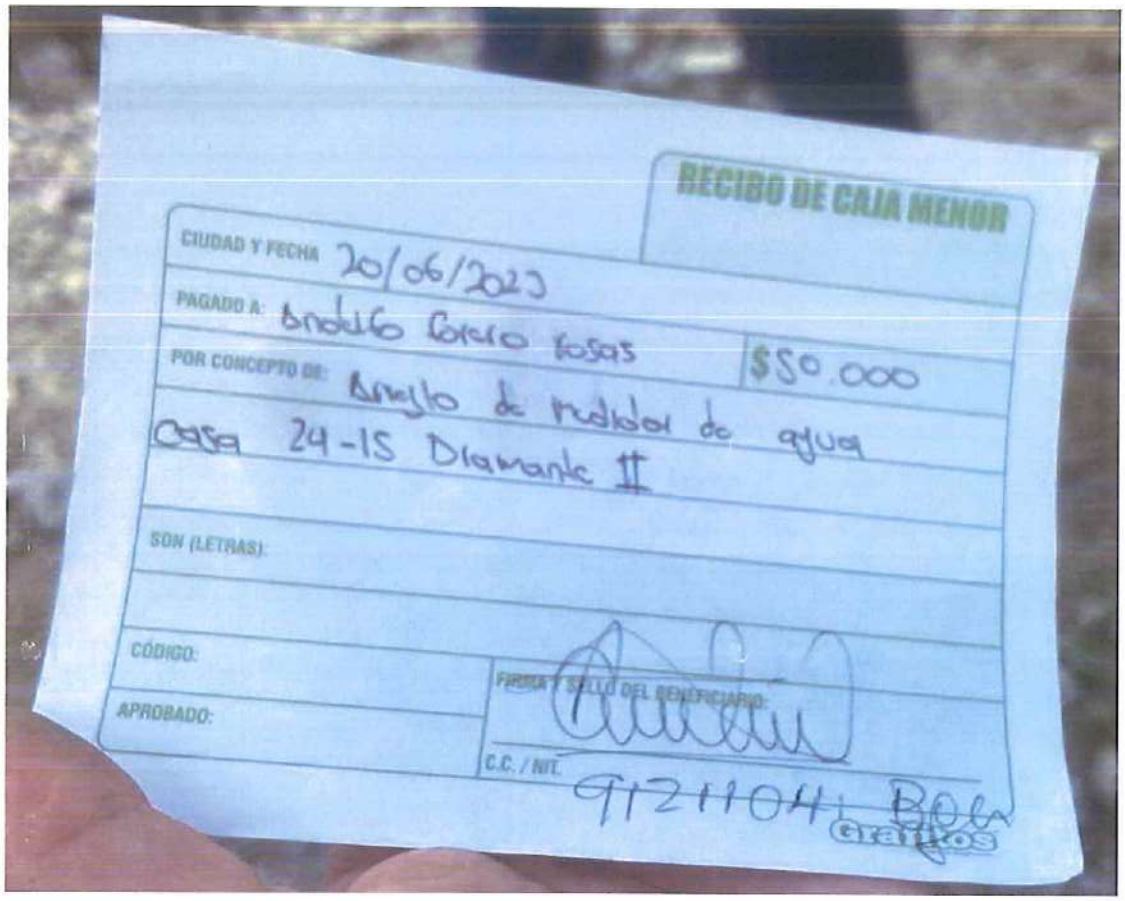

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA 20/06/2023

PAGADO A: Andres Correa Rosas $50.000

POR CONCEPTO DE: Arreglo de medidor de agua Casa 24-15 Diamante II

SON (LETRAS):

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / NIT. 9121104 BOG

Alcaldía de Bucaramanga	**CONFORMACIÒN COMITÉ VEEDOR**	7G7 S.A.S CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

FECHA: 29/06/2023
TEMA: Conformación de comité de veeduría ciudadana

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conformaran el comité veedor correspondiente al barrio Diamante I del proyecto correspondiente al contrato 417 de 2022, **"Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander"** grupo 3.

PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR		
Nombre y apellido	**Cargo/Rol**	**Firma**
William Estevez H	Edil comuna 9	
Luis José Monsalve	JAC	
Nestor Correa	JAC	
Juan F Guerrero	JAC. DTE 1	

Se deja constancia que cada 30 días, estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado.

NATALIA LÒPEZ RUALES
PROFESIONAL SOCIAL
7G7 S.A.S

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 14/06/2023	**Hora inicio:** 9:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Estoraques II	**Hora finalización:** 10:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Estoraques II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.
2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad, respecto al seguimiento de la obra.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL TEMA

Siendo las 9:00 am del día miércoles 14 de junio del 2023, se da inicio a la reunión de seguimiento en desarrollo a las siguientes actividades:

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.

La profesional social Natalia Lopez de la empresa contratista 7G7 SAS, expresa un saludo de bienvenida a los asistentes, veedores del B/ Estoraques II, dándoles a conocer el objetivo de la reunión el cual consiste en realizar seguimiento al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3, frente de obra B/ Estoraques II.

A continuación se presenta al inspector de obra a cargo de este frente, el ingeniero Helver Moreno quien extiende un saludo cordial a los asistentes.

2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad respecto al avance de la obra.

A la reunión asisten los veedores del proyecto y ediles de la comuna quienes manifiestan estar agradecidos por el trabajo realizado, igualmente sobre los adicionales que se han tenido en cuenta.

El arquitecto Carlos Andrés de la interventoría Jesak, resalta que se han tenido en cuenten las necesidades de la comunidad y se han aprobado presupuestos adicionales que han permitido intervenir algo más de lo que se encuentra contractualmente estipulado, igualmente que en 15 días ya se va a empezar a intervenir las siguientes 2 cuadras y poder entregarle a la comunidad el cumplimento de la obra.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 14/06/2023	**Hora inicio:** 9:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Estoraques II	**Hora finalización:** 10:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Estoraques II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

La señora Blanca comenta que ha estado muy pendiente de la obra y ha tratado de colaborar, igualmente que la empresa contratista 7G7 SAS siempre ha estado presta a dialogar con la comunidad, que se presentaron unos atrasos pero en el momento se sienten muy contestos por el trabajo realizado.

El señor Jhoan y Omar igualmente comentan tener en cuenta los detalles que pueden quedar en la obra igualmente lo del brechado.

La profesional social comenta que la obra aún no ha sido entregada a interventoría quien igualmente realizara las observaciones y se realizan las adecuaciones necesarias igualmente teniendo en cuenta a la comunidad.

4. COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Continuar realizando las reuniones de seguimiento de manera mensual	Contratista 7G7	En el mes de julio se informara fecha y hora de la próxima reunión de seguimiento.

5. Cierre de la reunión.

Se agradece la participación de la comunidad en estos espacios y siendo la 10:00 am del día miércoles 14 de junio del 2023 se da por terminada la reunión de seguimiento con el comité veedor y contratista 7G7, con la novedad de haberse cumplido con el objetivo propuesto.

Anexos: Registro fotográfico y registro de asistencia.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 14/06/2023	**Hora inicio:** 9:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Estoraques II	**Hora finalización:** 10:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Estoraques II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 14/06/2023	**Hora inicio:** 9:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Estoraques II	**Hora finalización:** 10:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Estoraques II reunión de seguimiento del proyecto "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander", Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3.

LUGAR:	FECHA:	HORA:
B/Estoraques II	14/06/2023	9:00 am

OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento con los veedores del proyecto de adecuación de andenes

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Ludwing Pérez Co.	91216	3135721974	
Aurelio Vargas	13838527	3142720095	
Jhoan Figueroa	915708	3176689168	
	41242	3160	
Blanca Nieves Pinzon	6330	3163	
Ruth Barajas	0328	3142	
Natalia López	1122	3238	

	ACTA DE REUNION	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 13/06/2023	**Hora inicio:** 2:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 3:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Mutis reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.
2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad, respecto al seguimiento de la obra.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL TEMA

Siendo las 2:00 pm del día martes 13 de junio del 2023, se da inicio a la reunión de seguimiento en desarrollo a las siguientes actividades:

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.

La profesional social Natalia Lopez de la empresa contratista 7G7 SAS, expresa un saludo de bienvenida a los asistentes, veedores del B/ Mutis, dándoles a conocer el objetivo de la reunión el cual consiste en realizar seguimiento al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3, frente de obra B/ Mutis.

A continuación se presenta al inspector de obra a cargo de este frente, el ingeniero Helver Moreno quien extiende un saludo cordial a los asistentes.

2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad respecto al avance de la obra.

A la reunión asisten los veedores del proyecto quienes manifiestan su preocupación ya que se lleva mucho tiempo interviniendo solo el lado de recrear.

El ingeniero Helver comenta las dificultades que se han presentado, pero refiere que ya se está implementando un plan de contingencia que permite muy próximamente terminar este tramo y comenzar por el sector comercial.

El señor Jhoan igualmente al realizar el recorrido comenta que se mejoren ciertos acabados de los alcorques igualmente que se realice el brechado ya que se ven unas franjas entre las losetas.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 13/06/2023	**Hora inicio:** 2:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 3:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Mutis reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

El ingeniero Helver comenta que la obra aún no ha sido entregada a interventoría con quien se revisara y se tendrán en cuenta lo comentado por la comunidad y así poder realizar una entrega a satisfacción de la obra realizada.

El señor Carlos recuerda el compromiso pactado con los comerciantes en realizar la intervención por cuadras y apenas se termine una dar continuidad a la siguiente.

La profesional social comenta que ese compromiso se lo tendrá en cuenta, igualmente que la intervención de esta zona se la pueda realizar en el menor tiempo posible minimizando los afectos negativos de la obra en las ventas del sector.

Además los veedores agradecen la disposición que ha tenido la empresa contratista 7G7 SAS ante las sugerencias recibidas por la comunidad.

4. COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Continuar realizando las reuniones de seguimiento de manera mensual	Contratista 7G7	En el mes de julio se informara fecha y hora de la próxima reunión de seguimiento.

5. Cierre de la reunión.

Se agradece la participación de la comunidad en estos espacios y siendo la 3:00 pm del día martes 13 de junio del 2023 se da por terminada la reunión de seguimiento con el comité veedor y contratista 7G7, con la novedad de haberse cumplido con el objetivo propuesto.

Anexos: Registro fotográfico y registro de asistencia.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 13/06/2023	**Hora inicio:** 2:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 3:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Mutis reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 13/06/2023	**Hora inicio:** 2:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 3:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Mutis reunión de seguimiento del proyecto "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander", Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3.

LUGAR:	FECHA:	HORA:
Frente Mutis	13/06/2023	2:30 pm

OBJETIVO:
Realizar reunión de seguimiento veedor de la obra que se ejecuta en el B/ Mutis

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Ruth Borjaco	63285488	3172273021	
[illegible]	91242[illegible]	3160107[illegible]	
Jhoan Figueroa	91570826	3176689168	
Aurelio Vargas	13838527	3427200975	
Carlos Arturo Stanco	13835146	3152209251	
Natalia López	1122384[illegible]	3238153258	

	ACTA DE REUNION	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 20/06/2023	**Hora inicio:** 4:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Real de Minas	**Hora finalización:** 5:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 5**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Real de Minas reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.
2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad, respecto al seguimiento de la obra.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL TEMA

Siendo las 4:00 pm del día martes 20 de junio del 2023, se da inicio a la reunión de seguimiento en desarrollo a las siguientes actividades:

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.

La profesional social Natalia Lopez de la empresa contratista 7G7 SAS, expresa un saludo de bienvenida a los asistentes, veedores del B/ Real de Minas, dándoles a conocer el objetivo de la reunión el cual consiste en realizar seguimiento al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3, frente de obra B/ Real de Minas.

A continuación se presenta a la inspectora de obra a cargo de este frente, la ingeniera Nicoll Tarazona quien extiende un saludo cordial a los asistentes.

2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad respecto al avance de la obra.

A la reunión asisten los veedores del proyecto, quienes manifiestan estar satisfechos con la intervención, además que fue respectada la decisión de la comunidad en mantener la sunglia que se encuentran en los conjuntos de San Remo I y II

La ingeniera Nicoll comenta que se llegó a un acuerdo entre la secretaria de infraestructura y la comunidad en realizar cada 20 días una poda de la sunglia y mantenerle a una altura de 2 mts, igualmente menciona que el proceso de las actividades técnicas continúan avanzando, que la última actividad a realizar seria el paso a nivel estilo pompeyano el cual aún no se cuenta con aprobación de la secretaria de infraestructura.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 20/06/2023	**Hora inicio:** 4:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Real de Minas	**Hora finalización:** 5:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 5**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Real de Minas reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

El señor Oscar al respecto menciona importante comentarle a la comunidad sobre el diseño final del estilo pompeyano o lo que se vaya a realizar.

La profesional social comenta que al terminar la intervención de los andenes de San Remo I y II se continuara con la intervención del andén que se encuentra en los conjuntos Metrópolis I, I y III.

Igualmente los veedores comentan que al momento de realizar la entrega final se tenga en cuenta y se corrijan algunos detalles como el brechado en donde aún se ven unas franjas muy pronunciadas entre las losetas.

La ingeniera Nicoll menciona que se está teniendo en cuenta esta observación y que la obra aún no ha sido recibida formalmente a la interventoría quienes también realizaran las observaciones y se corregirán para entregar a satisfacción la obra a la comunidad.

Además los veedores agradecen la disposición que ha tenido la empresa contratista 7G7 SAS ante las sugerencias recibidas por la comunidad.

4. COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Continuar realizando las reuniones de seguimiento de manera mensual	Contratista 7G7	En el mes de julio se informara fecha y hora de la próxima reunión de seguimiento.

5. Cierre de la reunión.

Se agradece la participación de la comunidad en estos espacios y siendo la 5:00 pm del día martes 20 de junio del 2023 se da por terminada la reunión de seguimiento con el comité veedor y contratista 7G7, con la novedad de haberse cumplido con el objetivo propuesto.

Anexos: Registro fotográfico y registro de asistencia.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
Alcaldía de Bucaramanga 7G7 S.A.S	**CONTRATISTA: 7G7 S.A.S** **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 20/06/2023	**Hora inicio:** 4:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Real de Minas	**Hora finalización:** 5:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 5**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Real de Minas reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 20/06/2023	**Hora inicio:** 4:00 pm
	Lugar : Frente de obra B/Real de Minas	**Hora finalización:** 5:00 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 5**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Real de Minas reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3.

LUGAR:	FECHA:	HORA:
Real de Minas Cra Octava	20/06/2023	4:00 pm

OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento con la veeduría del Ba. Ja de Real de Minas de la Cra 8

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Teresa Fiallo Chaparro	63281076	3144952496	
Oscar Hernandez B	13887133	3124970157	
Angie Nicol Tarazona B	1098783060	3183009935	
Natalia López	1122384042	3C38152158	

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 28/06/2023	**Hora inicio:** 10:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 11:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Diamante II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.
2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad, respecto al seguimiento de la obra.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL TEMA

Siendo las 10:00 am del día miércoles 28 de junio del 2023, se da inicio a la reunión de seguimiento en desarrollo a las siguientes actividades:

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS.

La profesional social Natalia Lopez de la empresa contratista 7G7 SAS, expresa un saludo de bienvenida a los asistentes, veedores del B/Diamante II, dándoles a conocer el objetivo de la reunión el cual consiste en realizar seguimiento al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3, frente de obra B/ Diamante II.

A continuación se presenta al inspector de obra a cargo de este frente, el ingeniero Mario Hernández quien extiende un saludo cordial a los asistentes.

2. Escuchar las inquietudes o sugerencias de la comunidad respecto al avance de la obra.

A la reunión asisten los veedores del proyecto quienes manifiestan que la obra ha avanzado que han recibido algunos comentarios de la comunidad sobre el proceso constructivo el cual ha sido muy lento, pero que les parece que en obra se presentan muchas situaciones y hasta el momento les parece que el contratista se encuentra cumpliendo.

El ingeniero Mario comenta que se lleva un 20% del proceso que se cuenta con una buena mano de obra la cual se está reforzando para hacer las actividades un poco más rápidas.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 28/06/2023	**Hora inicio:** 10:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 11:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Diamante II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

El señor Adalberto igualmente agradece por tener en cuenta las observaciones realizadas en cuanto al punto de emergencia, ecológico, sendero peatonal y señalización.

La profesional social comenta que de manera inmediata se tuvo en cuenta las observaciones con el fin de evitar accidentes tanto a las personas que trabajan en la obra como las personas que transitan por la obra.

Igualmente se entrega al grupo veedor formatos de PQRSD para ser dejados en el punto de atención al ciudadano y la comunidad pueda contar con esta herramienta.

Además los veedores agradecen la disposición que ha tenido la empresa contratista 7G7 SAS ante las sugerencias recibidas por la comunidad.

4. COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Continuar realizando las reuniones de seguimiento de manera mensual	Contratista 7G7	En el mes de julio se informara fecha y hora de la próxima reunión de seguimiento.

5. Cierre de la reunión.

Se agradece la participación de la comunidad en estos espacios y siendo la 11:00 am del día miércoles 28 de junio del 2023 se da por terminada la reunión de seguimiento con el comité veedor y contratista 7G7, con la novedad de haberse cumplido con el objetivo propuesto.

Anexos: Registro fotográfico y registro de asistencia.

Alcaldía de Bucaramanga 7G7 S.A.S	**ACTA DE REUNION**	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 28/06/2023	**Hora inicio:** 10:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 11:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Diamante II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Alcaldía de Bucaramanga 7G7 S.A.S	**ACTA DE REUNION**	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 28/06/2023	**Hora inicio:** 10:00 am
	Lugar : Frente de obra B/Mutis	**Hora finalización:** 11:00 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** **Págs. 4**
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar con el comité de veeduría ciudadana del B/ Diamante II reunión de seguimiento del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

	ACTA DE REUNION	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS y personal de la interventoría Jesak SAS.
2. Socialización aspectos generales del proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander” bajo el Contrato 417 de 2022 - grupo 3.
3. Socialización componente técnico (ubicación del proyecto, puntos a intervenir, fuente del recurso y fotografías de la situación actual).
4. Atender las preguntas, inquietudes y observaciones de la comunidad en relación a la parte técnica del proyecto.
5. Socialización componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica. (programas: información y divulgación, dialogo y participación ciudadana, servicio a la ciudadanía, conformación de veeduría, acompañamiento a actividades técnicas, gobernanza para la movilidad).
6. Conformación veeduría ciudadana.
7. Compromisos.
8. Cierre de la socialización.

DESARROLLO DEL TEMA

Siendo las 7:00 pm del día jueves 29 de mayo del 2023, se da inicio a la socialización en desarrollo a las siguientes actividades:

1. **Saludo y presentación por parte de los profesionales de la empresa contratista 7G7 SAS y personal de la interventoría Jesak SAS.**

La profesional social de la empresa contratista 7G7 SAS, expresa un saludo de bienvenida a los asistentes, comunidad del B/ Diamante I, dándoles a conocer la importancia de la participación de la comunidad en estos proyectos, así como el objetivo de la reunión.

A continuación se presenta el equipo de trabajo que se encuentra en la reunión de la siguiente manera:

Arquitecto Víctor, Director del proyecto a intervenir, empresa contratista 7G7 SAS.

Natalia López Ruales, profesional social empresa Contratista 7G7 SAS.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

Arquitecto Juan Carlos Vitola, Interventoría Jesak SAS.

Los cuales brindan un saludo cordial a la comunidad e invitan a realizar un trabajo mancomunado con el fin de cumplir de manera satisfactoria con el objetivo del proyecto.

2. **Socialización aspectos generales del proyecto “Adecuación de Andenes, Escaleras y Pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander” bajo el Contrato 417 de 2022 - grupo 3.**

Seguidamente la profesional Social Natalia López da a conocer aspectos generales del proyecto, el cual tiene como actores principales para su ejecución a la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Bucaramanga, como contratista a la empresa 7G7 SAS grupo 3 y a la interventoría Jesak SAS, con el fin de cumplir con el alcance del proyecto el cual consiste en la “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, previendo recuperar **5.781** metros cuadrados (m2), materializados en **8** comunas del Municipio, por un valor total de **$ 1.949.858.621,00**, recursos correspondientes a los Deberes Urbanísticos Vigencia Anterior y Recursos Propios Presupuestos Participativos 289, en un plazo de 4 meses, aclarando que estos datos solo corresponden al contrato a ejecutar por el grupo 3 de la empresa 7G7 S.A.S.

3. **Socialización componente técnico (ubicación del proyecto, puntos a intervenir, fuente del recurso y fotografías de la situación actual)**

El arquitecto Víctor, director del proyecto de la empresa contratista 7G7 SAS, da a conocer a la comunidad el trabajo que se va a realizar, el cual consiste en mejorar este paso y cambiar las barandas que se encuentran ubicadas en el costado occidental Cra 33 convergencia Cll 105 y las cuales están en muy malas condiciones, igualmente se muestra una registro fotográfico de la situación actual del punto a intervenir.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

4. Atender las preguntas, inquietudes y observaciones de la comunidad en relación a la parte técnica del proyecto.

La comunidad manifiesta la necesidad de intervenir este paso ya que está en muy malas condiciones, además que se pueda tener en cuenta la alcantarilla que se encuentra en el lugar y la cual no funciona de manera óptima, ya que toda el agua cae por el muro que se encuentra ahí y por el mal manejo de basuras terminan en este punto.

El arquitecto Víctor manifiesta que se están haciendo las visitas previas a la intervención con el fin de evaluar la situación del punto a intervenir igualmente que se evaluar el tema del sistema de alcantarillado con la interventoría y supervisor de la alcaldía.

La profesional social Eslendy de la interventoría Jesak, comenta la importancia de estos espacios los cuales permiten conocer otras situaciones y las verdaderas necesidades que tiene la comunidad y que estas sean evaluadas de la mano a la secretaria de infraestructura con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto y que el punto a intervenir quede funcionando de manera óptima.

La comunidad comenta estar atenta a cualquier información de la intervención a realizar, igualmente agradecen por el trabajo que se va a realizar ya que es una petición que vienen solicitando hace un tiempo atrás.

5. Socialización componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica. (programas: información y divulgación, dialogo y participación ciudadana, servicio a la ciudadanía, conformación de veeduría, acompañamiento a actividades técnicas, gobernanza para la movilidad).

La profesional social Natalia López da a conocer el objetivo del componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, el cual corresponde a informar, reducir, mitigar y compensar los impactos de las obras en las comunas del área de influencia directa a través de los actores intervinientes en la ejecución del proyecto, así mismo da a conocer los programas que hacen parte del componente:

- Información y Divulgación: Se entregará material de divulgación a la comunidad beneficiaria con el fin de que puedan estar informados a las diferentes actividades a desarrollar, esta actividad se hará a través de volantes informativos, carteleras, perifoneo, sistema de cornetas u otros.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

- Dialogo y participación Ciudadana: Contar con la participación de la comunidad en las reuniones realizadas al inicio, seguimiento y cierre de la obra.
- Servicio a la ciudadanía: Se contará con un punto de atención a la comunidad PAC con el fin de recepcionar PQRSD o resolver dudas frente al proyecto que se encuentra ejecutando, igualmente se comparte correo donde la comunidad podrá enviar sus PQRSD y contacto de la profesional social.
- Conformación del comité de participación comunitaria: En la reunión de socialización se conformará el comité de participación comunitaria de forma voluntaria como mínimo 3 personas que ejercerán el control social de la obra a ejecutar.
- Acompañamiento a actividades técnicas: se realizara acompañamiento social para la realización de actas de vecindad de inicio y cierre en donde por medio de visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra; en ésta se registra el estado físico y estructural del predio, para que, en caso de presentarse alguna reclamación por daños a este, se pueda identificar si el contratista es responsable o no, además si en el sitio a intervenir no se encuentran viviendas se realizara actas de entorno.

La profesional social, comenta que en esta zona a intervenir se realizara un acta de entorno, en donde se tomara un registro fotográfico y las observaciones de las condiciones actuales de la zona con el fin de si se llega a presentar algún daño o afectación, el contratista está en la obligación de responder, dicha acta se realiza en compañía de la parte técnica y social del contratista como de la interventoría.

6. Conformación Comité de veeduría ciudadana.

Una vez socializado el componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, se procede a la postulación de los miembros para la conformación del comité de veeduría ciudadana así:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ROL
William Estévez	Edil Comuna 9
Luis José Monsalve	JAC

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

Néstor Carreño	JAC
Juan Guerrero	JAC

Se firma acta de conformación de la veeduría ciudadana.

La profesional social comenta al comité que se realizaran reuniones de seguimiento a la obra con el fin de subsanar o mejorar situaciones que se puedan presentar igualmente que la comunidad cuente con la información necesaria del trabajo que se está realizando en su barrio.

7. COMPROMISOS		
DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Informar a la comunidad la fecha en que se dará inicio a la obra.	7G7 SAS	Antes de dar inicio a las actividades técnicas en el punto a intervenir.

8. Cierre de la Socialización.

Se agradece la participación de la comunidad en estos espacios y siendo las 7:30 pm del día 29 de junio del 2023 se da por terminada la reunión de socialización, con la novedad de haberse cumplido con el objetivo propuesto.

Anexos: Registro fotográfico, volante informativo, presentación Power Point, registro de asistencia y acta conformación Comité de veeduría ciudadana.

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

VOLANTE INFORMATIVO



PRESENTACIÓN POWERPOINT



	ACTA DE REUNION	CODIGO:
Alcaldía de Bucaramanga 7G7 S.A.S	**CONTRATISTA: 7G7 S.A.S** **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	



	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	





	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander", Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3.

LUGAR: Cancha deportiva B/ Diamante I | **FECHA:** 29/06/2023 | **HORA:** 7:00 pm

OBJETIVO: Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander" Contrato 417 de 2022-grupo 3.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
William Gutierrez H.	91220738	3112356458	
Juan F Guerrero	91 270116	3222240871	
Nestor Correa V.	91210458	3188324120	
Luis José Monsalve	13846380	3125635469	
Aquiles Maldonado P.	3730742	3167700111	
Elver Aguilar	91070947	3162482301	
Ramiro Cristian	91 290 140	3177389778	
Edwin Cano A	63532664	3044211194	
Juan Carlos Vitola D.	8.730.310	3177154819	
Victor E. Mead T.	91207093	3182192734	
Natalia Lepesa	1122781047	3238173158	

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, protección de datos personales, la empresa 7G7 S.A.S, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

	ACTA DE REUNION	CODIGO:
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 29/06/2023	**Hora inicio:** 7:00 pm
	Lugar : Cancha Deportiva B/Diamante I	**Hora finalización:** 7:40 pm
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO 417 de 2022 “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” GRUPO 3	**Acta N°:** 11 **Págs.** 11
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar socialización de inicio de obra en el B/Diamante I, correspondiente al proyecto “Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del Municipio de Bucaramanga – Santander”, Contrato 417 de 2022-grupo 3.	

	CONFORMACIÒN COMITÉ VEEDOR	

FECHA: 29/06/2023

TEMA: Conformación de comité de veeduría ciudadana

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conformaran el comité veedor correspondiente al barrio Diamante I del proyecto correspondiente al contrato 417 de 2022, **"Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander"** grupo 3.

PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR		
Nombre y apellido	Cargo/Rol	Firma
William Estupiñan H	Edil comuna 9	
Luis José Hernández	JAC	
Nestor Correa	JAC	
Juan F Guerrero	JAC. DTE 1	

Se deja constancia que cada 30 días, estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado.

NATALIA LÒPEZ RUALES
PROFESIONAL SOCIAL
7G7 S.A.S

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

CO-7G7-417-2023-0085

Bucaramanga, 17 de Junio de 2023

Señor.
DIEGO MEDINA
Administrador Conjunto Metrópolis III
Bucaramanga

Referencia: **CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3."**

Asunto: Solicitud de suministro de agua, energía y servicio para acopio de materiales para la obra de espacio público en la carrera 8 entre calles 61 y 64.

Cordial saludo.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitarle su colaboración con el suministro de agua, energía y el uso del área de estacionamiento que esta fuera de servicio para acopio de materiales, para el personal de obra de la empresa contratista 7G7 S.A.S, el cual se encuentra laborando en la carrera 8 entre calles 61 y 64, ejecutando el proyecto de "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga-Santander" en los horarios de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y el día sábado de 7:00 am a 12:00 md.

Nos comprometemos a responsabilizarnos por el buen uso de los servicios prestados y agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
Apoderado
7G7 S.A.S

Conjunto Residencial Metrópolis III
Nit. 804.001.560-4
Fecha:
Hora:
Recibido: Herrera
Portería

C.C oficina 7G7 SAS
Elaboro: Natalia López- Profesional Social
3238153258

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

CO-7G7-417-2023-0089

Bucaramanga, 17 de Junio de 2023

Sacerdote.
VICENTE DUARTE
Iglesia La Victoria
Bucaramanga

Referencia: **CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3."**

Asunto: Solicitud de suministro de agua, energía, sitio para guardar herramienta menor y servicio de unidad sanitaria para la obra de espacio público a ejecutar en la Calle 67 entre Cra 18 y Cra 21.

Cordial saludo.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitarle su colaboración con el suministro de agua, energía, sitio para guardar herramienta menor y servicio de unidad sanitaria, para el personal de obra de la empresa contratista 7G7 S.A.S, el cual se encuentra laborando en la calle 67 entre Cra 18 y Cra 21, ejecutando el proyecto de "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga-Santander" en los horarios de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y el día sábado de 7:00 am a 12:00 md.

Nos comprometemos a responsabilizarnos por el buen uso de los servicios prestados y agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
Apoderado
7G7 S.A.S

ARQUIDIOCESIS DE BUCARAMANGA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS

Recibido 20/06/23
Pendiente autorización
Guarda Unidad Sanitaria

C.C oficina 7G7 SAS
Elaboro: Natalia López- Profesional Social
3238153258

7G7 S.A.S
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

CO-7G7-417-2023-0093

Bucaramanga, 29 de Junio de 2023

Señora.
LEIDY
Administradora Unidad Residencial "Los Sauces"
Bucaramanga

Referencia: **CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3."**

Asunto: Solicitud de suministro de agua, para la obra de espacio público en la Cll 63A entre Cra 1 y 3.

Cordial saludo.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitarle su colaboración con el suministro de agua, para el personal de obra de la empresa contratista 7G7 S.A.S, el cual se encuentra laborando en la carrera Cll 63ª entre Cra 1 y 3, ejecutando el proyecto de "Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga-Santander" en los horarios de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y el día sábado de 7:00 am a 12:00 md.

Nos comprometemos a responsabilizarnos por el buen uso de los servicios prestados y agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
Apoderado
7G7 S.A.S

C.C oficina 7G7 SAS
Elaboro: Natalia López- Profesional Social
3238153258

Bucaramanga 28 de Junio de 2023.

Señor
Jairo Duarte
Propietario
Cra 8 # 61-152 Casa 52

Cordial Saludo

Con todo respeto me dirijo a usted para informar que el contratista 767 SAS esta realizando intervención en el espacio público frente al conjunto San Remo 2 por lo tanto se da respuesta a la petición realizada por usted donde solicita el permiso para llevar a cabo una actividad en el mismo colindante con el área de intervención.

Es importante dejar claridad que ni el contratista, ni la interventoría permiten el ingreso de personal ajeno a la obra porque eso representa un riesgo para la integridad de las personas, teniendo en cuenta que no se tiene afiliación a seguridad social, ARL. ni elementos de protección personal.

Sin embargo se informa que las actividades constructivas finalizan a las 5 de la tarde y en ese horario pueden realizar los trabajos mencionados.

Se informa que si se ingresa en un horario diferente el propietario deberá asumir toda la responsabilidad en caso de ocurrir algún evento o situación que afecte a estas personas.

Att:

Jairo Duarte C
91239172
Cra 8 # 61-152 Casa 52

Estudy Coito Aguilar
CC: 63532664 de Bga
Profesional Social
Interventoria.

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNION	**CODIGO:**
	CONTRATISTA: 7G7 S.A.S **NIT: 901120358-4**	**VERSIÓN: 01**
	Fecha : 9 y 10 de Junio del 2023	**Hora inicio:** 7:00 am
	Lugar : Frentes Mutis y Estoraques II	**Hora finalización:** 7:20 am
NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONTRATO 417 de 2022** **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"** **GRUPO 3**	**Acta NO :_____** **Pág.** 5
OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar capacitación al personal de obra de los frentes Mutis y Estoraques II sobre el tema del manejo del estrés con el fin de prevenir afectaciones de salud.	

TEMAS A TRATAR

1. Saludo por parte de la profesional social de la empresa contratista 7G7.
2. Dar a conocer que es el estrés
3. Causas, consecuencias y como prevenir el estrés
4. Dinámica "cuidando mi piel"
5. Cierre

DESARROLLO DEL TEMA

Los días 9 y 10 de Junio del 2023 se realiza capacitación al personal de obra de los diferentes frentes Mutis y Estoraques II, la profesional social se desplaza a cada uno de ellos y realiza capacitación de 20 minutos aproximadamente sobre el tema del manejo del estrés con el fin de prevenir afectaciones de salud.

1. Saludo por parte de la profesional social de la empresa contratista 7G7.

La profesional social extiende un saludo cordial al personal de obra de los frentes de Sauces, Mutis y Estoraques, explica el objetivo de la capacitación e invita a estar atentos.

2. Dar a conocer que es el estrés

A continuación se da a conocer que el estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral (también propia) y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente. Aunque en ocasiones, también puede originarse por factores completamente ajenos al trabajador. Los síntomas pueden ir desde un ligero mal humor hasta graves depresiones, y casi siempre suelen ir acompañadas de un cierto agotamiento y debilidad física.

3. Causas, consecuencias y como prevenir el estrés

Dentro de las causas se encuentran:

- Excesiva responsabilidad en el trabajo.

- Demasiada carga de trabajo.
- Relaciones humanas problemáticas.
- Condiciones laborales insatisfactorias.

Desde el punto de vista de la persona afectada, el estrés laboral puede ocasionar:

- Enfermedades y patologías.
- Problemas motores y cognitivos.
- Trastornos variados, desde inmunológicos hasta sexuales.
- Trastornos psicológicos graves que, en ocasiones, puede llevar al suicidio.

Igualmente se indica al personal de obra la importancia de liberar el estrés y se mencionan algunas actividades que podrían realizar:

- Dieta equilibrada. Esto es imprescindible.
- Ejercicio físico regular.
- Desconectar completamente del trabajo una vez que salimos del sito de trabajo.
- Tratar de acostarse siempre a la misma hora y no dormir menos de seis horas.
- Siempre que se pueda, tomarse un respiro, por medio de unas vacaciones. Pueden ser cortas, puede tratarse de una escapada de la ciudad cualquier fin de semana.

4. Dinámica “Cuidando mi piel”

Para esta actividad una empresa brindo sus servicios en donde realizaron una jornada de bienestar para el cuidado de la piel, teniendo en cuenta la arduo labor que realizan nuestros trabajadores al aire libre, igualmente el principal objetivo de la actividad era despejar un poco la mente y empezar la jornada tomando conciencia de la importancia de pensar en nosotros y liberarnos del estrés.

5. Cierre

Se da cierre a la actividad y se agradece al personal de obra por la disposición en escuchar y participar de la actividad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Estoraques II	Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Mutis
	
Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Estoraques II	Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Mutis
	
Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Estoraques II	Actividad: Capacitación personal de obra Lugar: Frente Mutis

	FORMATO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN		
7G7 S.A.S	Código: FAC-7G7-SAS	Versión: 01	Página 3 de 3

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3.					
PROGRAMACIÓN:					
FECHA:	9/06/2023	EXPOSITOR:	Natalia Lopez	DURACIÓN:	15 Min
OBJETIVO:	Manejo del arbol				

ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Wilson Caceres R.	ayudante	Wilson Caceres
Natanael Fonseca	Ayudante	natanael
Ivan Mauricio Gomez	ATU	
Mauricio Rueda	Ofic Plomero	
Omar Hernandez	oficial	omar Hernandez
Dario Peña	AYUDANTE	Dario Peña
Deyci Toloza	oficial	
Andres Arciniegas	oficial	

NOMBRE EXPOSITOR	FIRMA
Natalia Lopez R.	

7G7 S.A.S	FORMATO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN		
	Código: FAC-7G7-SAS	Versión: 01	Página 3 de 3

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO 417 de 2022, "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 3.			
PROGRAMACIÓN:			
FECHA: 10/08/2023	EXPOSITOR: Natalia López	DURACIÓN: 15 hrs.	
OBJETIVO: Charla del estrés			

ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yaqueline Cabrera García	Aprendiz	
Juan Camilo Lizcano	Ayudante	
Javier Serrano	Ayudante	
Jaime Ballesteros	Ayudante	
Jesus Alfonso perez	oficial	
Jhon Elver Serrano	oficial	

NOMBRE EXPOSITOR	FIRMA
Natalia López	

CO-7G7-417-2023-0084

Bucaramanga, 15 de Junio 2023

Señor (a).
Secretaria Administrativa
Alcaldía de Bucaramanga

Referencia: **CONTRATO 417 DEL 27/12/2022 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" LOTE 3."**

Asunto: Entrega Componente de Gestión Social "Plan de Dialogo Ciudadano y comunicación estratégica"

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio realizo entrega en físico del documento correspondiente al Componente de Gestión Social "Plan de Dialogo Ciudadano y comunicación estratégica", de la empresa contratista 7G7 SAS

Cordialmente,

EDGAR ALONSO QUESADA O.
Apoderado
7G7 S.A.S

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE EDUCACION
Y [illegible] CION DE
[illegible]
6/15/23
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

C.C:
ING. EDGAR BAYONA
Supervisor
Alcaldía de Bucaramanga

Anexo: 20 Folios

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238,37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 1 de 2

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
2:00pm		Alcaldía Bga	29/06/2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Xiomara Tarazona	Trab. Social Sec. Infraest.
Eslendy Corto Aguilar	Prof Social Interventoria
Natalia López	Prof. Social Tec. Sup.
Leidy Andrea Ayala S.	Prof. Social Consorcio Santander
Laura Yolleth Parra Villalba	Prof Social Con Ade. Santander

OBJETIVO

Realizar seguimiento social a las obras de mejoramiento de andenes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con profesionales sociales de los equipos contratista e interventoria de las obras de Mejoramiento de Andenes.

Grupo 1.

11 Barrios en los que se han realizado socialización de inicio de obra.
Pendiente San Cristobal - pendiente definir la ubicación exacta.
7 frentes activos actualmente
3 por abrir la proxima semana
No se han entregado frentes terminados.
Programada socialización de entrega frente a La Vega/Morrorico, Martes 04 de Julio 3pm.
Gmonatos: frente aún no abierto a pesar de haber realizado socialización y levantamiento de actas.

*Se solicita a interventoria reconsiderar continuar trabajos en los barrios que ya cuentan con socialización y actas de vecindad.

Barrio Albania, andenes en concreto con doble funcionalidad (peatones-vehiculos), se programara socialización con los cambios.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238,37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 2 de 2

CONCLUSIONES

Grupo 2
9 Barrios con socialización - pendiente socialización La Feria
Girardot terminado - pendiente programar socialización cierre - cerrar actas
9 frentes abiertos actualmente - 2 frentes próximos a iniciar.

Grupo 3.
10 Barrios con socialización: 2 no se ejecutaron sanciones - Pactos del metro
5 frentes abiertos actualmente

*Recomendación para el cierre de actas de veracidad, un operario suscrito en el registro fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Siendo las _____ se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (29) días del mes de Junio de 2023 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Xiomara Tarazona	XIOMARA TARAZONA
Estudy Cortes Aguilar.	
Natalia López	
Cindy Andrea Ayala S.	
Laura Yohana Parra Villalba	

El **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ÍTEM	JESAK NIT. 901320986-8 Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	MES DE JUNIO				Calificación mes
		100%	0,00%					
Talento humano para el diálogo ciudadano y la comunicación estratégica				**1 AL 10 DE JUNIO**	**12 AL 17 DE JUNIO**	**19 AL 24 DE JUNIO**	**26 AL 30 DE JUNIO**	
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	Cumplió	No cumplió	NA	100	NA	100	100
5	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
Línea estratégica: Diálogo Ciudadano								
Programa Servicio a la Ciudadanía								
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por la Oficina de Atención al Ciudadano.	Cumplió	No cumplió	NA	100	100	100	100
4	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Durante la ejecucion del contrato el punto atención al ciudadano conto con la dotación exigida para su funcionamiento.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
8	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
9	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	NA	NA	100	100
10	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana								
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
3	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
4	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	NA	NA
5	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA

6	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
9	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio y finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
10	Conformó el número de comité , de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Cumplió	No cumplió	NA	N/A	NA	NA	NA
11	El Comité se reunió el número de veces establecidas cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	Cumplió	No cumplió	NA	N/A	NA	NA	NA
12	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité cumpliendo con lo establecido en el manual de identidad visual del IDU, tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Programa Acompañamiento Actividades Técnicas								
1	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
8	Entregó copias de las actas de vecindad a la Comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	100	100	100
9	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	NA	100	100
10	Entrego las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoria de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apendice	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	N/A	100
11	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
12	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
13	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
14	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
15	el contratista cumplio con los compromisos establecidos en las actas de compromiso en condiciones de oportunidad y calidad.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Programa de Gobernanza para la Movilidad								
1	Entregó una metodología del proceso de gestión y articulación interinstitucional.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Desarrollo Económico								
1	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en la localidad (es) de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal de MONC y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	Cumplió	No Cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
4	Cumplió con los parametros establecidos en la metodologia para ser un seguimiento al comportamiento de la actividad de vendedores informales.	Cumplió	No Cumplió	100	NA	NA	100	100
5	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Educación								
1	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal necesarias y de coordinación.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Programa de Cultura Ciudadana								
1	el contratista cumplio con las acciones de formación para la prevención de accidentes de obra cuando se requirio	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	el contratista ejecuto las acciones de formacion a empleados de obra y subcontratista de acuerdo a los requisitosdel presente apendice	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Línea estratégica: comunicación estratégica								
Programa de información para el desarrollo del proyecto								
1	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	Elaboró y distribuyó predio a predio las piezas de comunicación de Inicio de obra y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Atención al Ciudadano, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
7	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100

8	Instaló el (los) Punto(s) Satélite(s) de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
9	Realizó mantenimiento a (los) punto(s) satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
REPORTES								
1	Proporcionó a la Interventoría la información social del proyecto cuando se le solicitó.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Tiene a disponibilidad la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
4	Registró y entregó a la Interventoría y la información mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, en el aplicativo BACHUE, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	El contratista entrego a la interventoría el informe de preliminares de acuerdo con las especificaciones del apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado adelantada durante todo el contrato, con criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			TOTAL GENERAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**



ESLENDY CORZO AGUILAR

PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA



NATALIA LÓPEZ

PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

INFORME TOPOGRAFICO MENSUAL DE INTERVENTORIA

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429 DE 2022 – JESAK SAS
CONTRATISTA: 7G7 S.A.S



firma		
Nombre	DARWIN FERNEY BUITRAGO MARTINEZ	VLADIMIR POLO PAZ
Cargo	**TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	ELABORÓ	APROBÓ

Bucaramanga, junio de 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 2

OBJETIVO 2

ALCANCE DEL TRABAJO 2

METODOLOGÍA 3

UBICACIÓN DEL PROYECTO 3

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 4

PLANOS Y CARTERAS DE CAMPO 5, 6

- PERSONAL 4
- EQUIPOS 4

RELACIÓN DE EQUIPOS 6

INTRODUCCION

En el presente informe se consigna el procedimiento, control e inspección de la topografía que corresponde a la ejecución planimétrica y altimétricas necesarias para la entrega de información recolectada en campo y oficina y cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

OBJETIVO

Realizar interventoría topográfica detallada para el desarrollo de estudios y diseños de obras civiles a ejecutarse, ajustado a coordenadas magna-sirgas.

ALCANCE DEL TRABAJO

Levantamiento planimétrico y altimétrico del área de afectación de los proyectos detallando todas las estructuras, espacio público y redes de servicios encontradas, para la elaboración de plano en planta, curvas de nivel y urbanísticos.

Los trabajos realizados comprenden:

- Control y levantamiento topográfico de la zona afectada sobre las áreas mencionadas antes y después de su ejecución.
- Revisión y replanteo de zonas duras, zonas verdes, ubicación de elementos hidráulicos y pluviales como cajas y pozos.
- Elementos eléctricos como postes, cajas y acometidas.
- Límites, medidas y áreas a intervenir de cada uno de los elementos, como andenes, sardineles, jardineras, zonas duras, parqueaderos, muros, cerramientos, paramentos, acceso a viviendas o edificios etc.
- Localización de ejes, trazados, niveles y medidas en adoquín, loza, control de rellenos en base etc.

- Volúmenes de acuerdo a perfiles de terminado (corte y rellenos) para construcción de espacio publico.
- Identificación de obstáculos y posibles soluciones con el grupo de trabajo.

METODOLOGÍA

- Visita y reconocimiento del área de afectación.
- Toma de registro fotográfico.
- Amarre Geodésico al sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS mediante GPS o amarres iniciales ya conocidos entregados por la alcaldía.
- Levantamiento topográfico detallado de estructuras, vías, redes de servicio, mobiliario urbano, terrenos naturales, zonas duras, pozos, cerramientos, vías existentes, paramentos etc. para verificar y complementar información existente.
- Descarga de información tomada en campo para desarrollo de trabajo de oficina.
- Digitalización de planos en **AutoCAD civil 3D**.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el Municipio de Bucaramanga, Santander y consiste en LA ADECUACIÓN ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Barrio Estoraques, Calle 60 Con Carrera 38 Oeste Esquina



7°05'20.53" N 73°08'40.82" O

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Se toman (2) amarres Georreferenciados al sistema MAGNA-SIRGAS ubicados inicialmente por levantamientos de la alcaldía: se ubicaron más puntos en el sector puntos estratégicos en el proyecto para ajustar y enriquecer la información existente.
- Levantamiento altimétrico de las áreas afectadas anexas, detallando paramentos, sardineles, zonas verdes, redes de servicios y todas las estructuras existentes.
- Deltas: Los puntos de reflexión (∆) usados para los levantamientos topográficos son situados estratégicamente en partes donde sean fáciles de identificar y además que perduren hasta el inicio de las obras civiles y así poder trabajar los replanteos topográficos como ejes de vías, traslado de redes eléctricas, puestos nuevos, etc. En anexos se envía una lista de estos puntos dejados en campo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **PERSONAL**

  - 1 topógrafo: Darwin F Buitrago M.
  - 1 cadenero: Gonzalo Orozco

- **EQUIPOS**

  - Nivel de precisión Geomax
  - Herramientas menores
  - Vehículos para transporte de personal y equipos.
  - Computador con software Topcon link para descarga de datos, AutoCAD civil 3D para digitalización de planos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se procede hacer la visita de campo y realizar verificación de actividades realizadas en el proyecto.

Levantamiento altimétrico en la zona mencionada donde se toman niveles a partir del borde de la vía hasta el paramento para definir localización de rampas y recorrido de aguas lluvias y así evitar inundaciones o agua empozada en sectores de flujo de personas.
Se toma como BM para iniciar nivelación un elemento que permanezca fijo en la zona, en este caso un hidrante ubicado frente al conjunto residencial punta estrella y a partir de ahí se le empiezan a dar cotas a borde de vía, sardinel, jardinera, escaleras, acceso a viviendas.
Al terminar el levantamiento se trasladan los datos de la cartera al computador para procesar la información y dibujar los niveles y perfiles en el software AutoCAD.
Se crean tres alineamientos (paramento, sardinel y borde de vía).

REGISTRO FOTOGRAFICO










PLANO

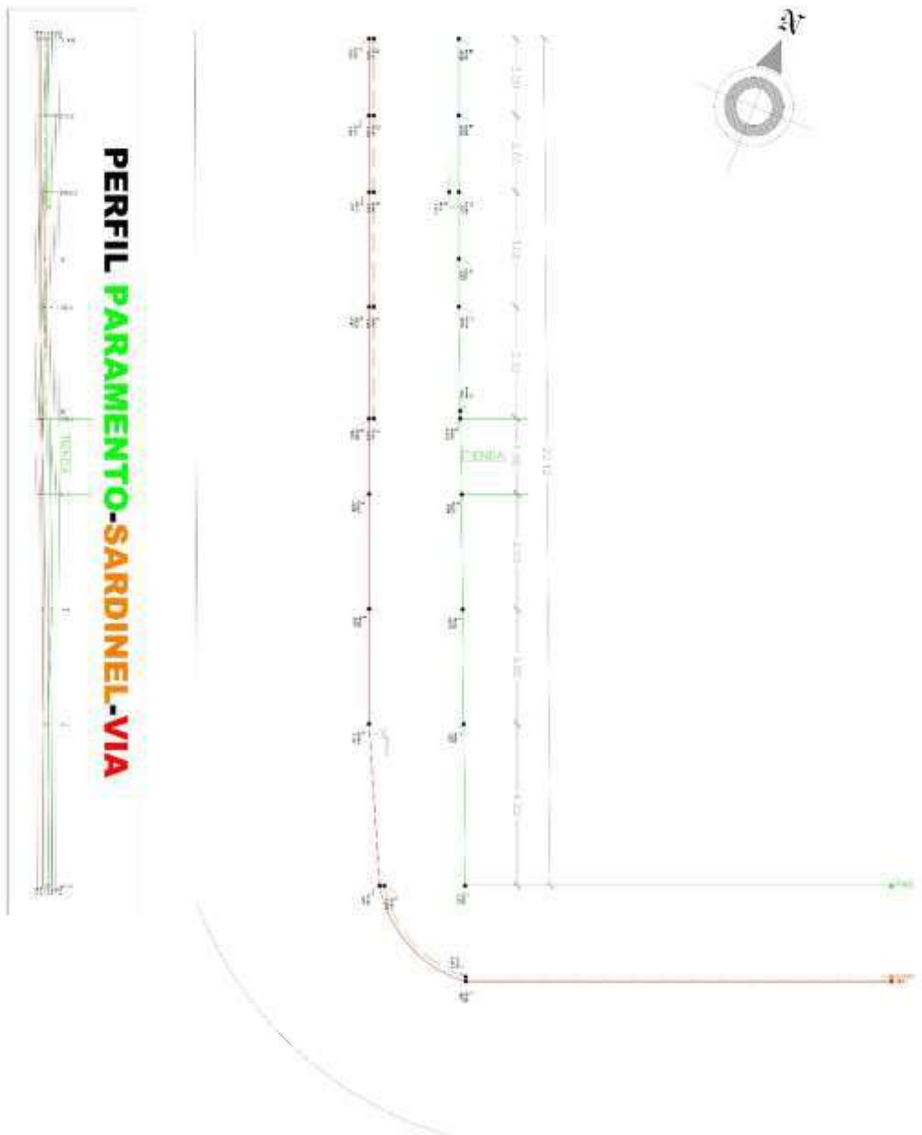

NOTAS

RELACIÓN DE EQUIPOS

Los equipos empleados para realizar las mediciones en terreno correspondientes a levantamientos planimétricos como altimétricos, corresponden a equipos ópticos mecánicos de campo como estaciones totales con un alto grado de precisión de para la toma de información y cálculo de coordenadas.
