CCASAS_CSJ.MC.021.2022-006/2023

Pereira Risaralda, 30 de enero de 2023

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA – RISARALDA
Ing. IVAN MATURANA CORDOBA
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor.
Carrera 5B No. 39 - 08 Piso 1 Pereira, Risaralda

REFERENCIA: Aceptación de Oferta Proceso de Contratación Mínima Cuantía MC-21-2022", oficio DESAJPEO22-453, de fecha 9 de diciembre de 2022 "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el servicio de Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental; para el contrato que realizará "el mantenimiento y adecuación de las Sedes Judiciales del Distrito de Pereira – Risaralda"

ASUNTO: Informe Quincenal Periodo del 15 enero al 30 de enero de 2023

Cordial Saludo,


Con base en lo mencionado en el asunto y referencia, adjunto envío para su gestión y trámite correspondiente, el documento en mención.


Atentamente,

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS
RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTORIA

1. Avance por Porcentaje de la Obra

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 diciembre de 2022	MESES	0,5	DIAS	90,0	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	miércoles, 14 de diciembre de 2022	DOCUMENTO	Acta de inicio			
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	N.A.					
FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO:	N.A					
PLAZO ADICIONAL (PRORROGA 1)	NOVENTA (90) DIAS	DOCUMENTO	Otro si			
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO	CIENTO OCHO (108) DIAS	MESES		DIAS	108,0	
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	viernes, 31 de marzo de 2023					
PLAZO EJECUTADO	martes, 31 de enero de 2023	MESES		DIAS	45,0	

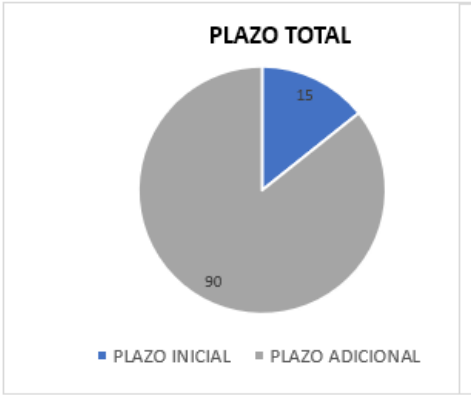

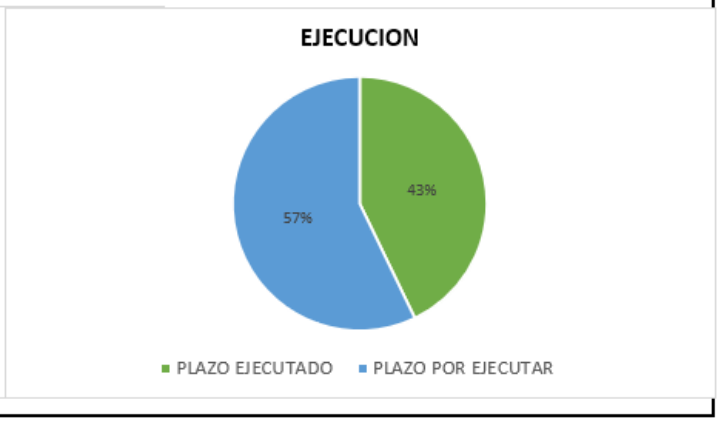

CIVILES ASOCIADOS SAS


	CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS **NIT. 900.132.794-0**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA N° 1	**DESDE**	15	12	2022
	HASTA	31	1	2023

ENTIDAD CONTRATATANTE:	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA – RISARALDA					
SUPERVISION:	ING. IVAN MATURANA CORDOBA	Coordinador Administrativo y Financiero				
CONTRATO INTERVENTORIA:	MC-021-2022	**FECHA**	9	12	2022	
OBJETO DEL CONTRATO.	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental; para el contrato que realizará "el mantenimiento y adecuación de las Sedes Judiciales del Distrito de Pereira – Risaralda					
INTERVENTOR:	CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS	RL Jairo Humberto Sandoval Tovar				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE	$	24.990.000,00			
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	N.A.	$	-			
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE	$	24.990.000,00			
CONTRATO DE OBRA No.:	CE-SA-MC-06-2022	**FECHA**	7	12	2022	
OBJETO DEL CONTRATO.	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura el Mantenimiento y Adecuación de las Sedes Judiciales del Distrito.					
CONTRATISTA DE OBRA:	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	RL Luis Fernando Morales Restrepo				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	$	455.342.994,00			
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	N.A.	$	-			
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	$	455.342.994,00			

1. CONDICIONES DE PLAZO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 diciembre de 2022	**MESES**	0,5	**DIAS**	0,0	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	miércoles, 14 de diciembre de 2022	**DOCUMENTO**	Acta de inicio			
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	N.A.					
FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO:	N.A					
PLAZO ADICIONAL (PRORROGA 1)	NOVENTA (90) DIAS	**DOCUMENTO**	Otro si 1			
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO	CIENTO CINCO (105) DIAS	**MESES**		**DIAS**	105,0	
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	viernes, 31 de marzo de 2023					
PLAZO EJECUTADO	martes, 31 de enero de 2023	**MESES**		**DIAS**	45,0	

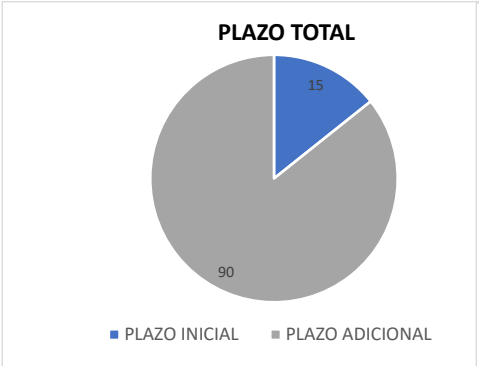

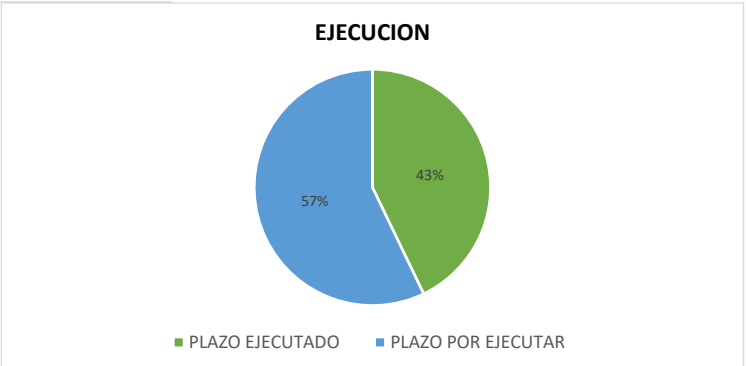

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1				
		DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

2. PERSONAL Y EQUIPO DE APOYO

PERSONAL Y EQUIPO DE APOYO INTERVENTORIA		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	Ingeniero Civil
C.C. No.:	CC.79.244.696	MP 25202-82033CND
RESIDENTE DE APOYO	HUVARLEY ZAPATA CASTRILLON	Arquitecto
C.C. No.:	CC. 1´088.348.451	MP
PERSONAL Y EQUIPO DE APOYO OBRA		
DIRECTOR DE OBRA		Ingeniero Civil
C.C. No.:	CC.	MP
RESIDENTE DE OBRA		Arquitecto
C.C. No.:	CC.	MP

3. EJECUCION DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

GENERALES	FINANCIEROS		CONSTRACTUALES	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS- CONSTRUINTEL	**Valor Inicial**	$ 455.342.993,56	**Prorroga 1 (Dias)**	90
CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración distrito Judicial de Pereira - Risaralda	**Adicion**	$ -	**Prorroga 2 (Dias)**	0
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDES JUDICIALES 2022	**Valor Final**	$ 455.342.993,56	**Prorroga Total (Dias)**	195

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CORTE No. 01		% INVERSION
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO	
1	**Palacio de Justicia de Pereira**							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA **N° 1**

DESDE	15	1	2023
HASTA	31	1	2023

1.1	**Torre (A) Manteniendo manto de terrazas.**							
1.2	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1015,00	$ 2.983	$ 3.027.745,00	1207,31	$ 900.348,75	30%
1.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	1015,00	$ 77.712	$ 78.877.680,00	1207,31	$ 23.455.550,75	30%
1.4	**Piso 6 torre (A) - Humedades Gimnasio**							
1.5	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	15,00	$ 13.095	$ 196.425,00	31,00	$ 101.502,00	52%
1.6	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	15,00	$ 31.181	$ 467.715,00	18,78	$ 146.374,50	31%
1.7	**Baños hombres piso 6 torre (A) Sellar entrada de palomas**							
1.8	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	MT2	1,68	$ 69.573	$ 117.160,93	2,05	$ 35.656,25	30%
1.9	**Baños hombres piso 6 torre (A) Humedad**							
1.10	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	25,00	$ 13.095	$ 327.375,00	37,77	$ 123.645,00	38%
1.11	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	M2	25,00	$ 31.181	$ 779.525,00	18,86	$ 146.987,25	19%
1.12	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	40,00	$ 6.660	$ 266.400,00	34,75	$ 57.858,75	22%
1.13	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	1,00	$ 48.474	$ 48.474,00		$ -	0%
1.14	**Gimnasio arreglo de ventana**							
1.15	Mantenimiento ventana de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios	M2	2,25	$ 80.750	$ 181.687,50		$ -	0%
1.16	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 1 pequeñas causas cielo raso**							
1.17	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,75	$ 62.327	$ 171.399,25	4,32	$ 67.313,25	39%
1.18	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 1 pequeñas causas puerta**							
1.19	Mantenimiento puerta de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios	UND	1,00	$ 95.000	$ 95.000,00	1,00	$ 23.750,00	25%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

1.20	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 4 civil municipal humedad jardinel**							
1.21	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	8,00	$ 13.095	$ 104.760,00		$ -	0%
1.22	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	8,00	$ 31.181	$ 249.448,00		$ -	0%
1.23	**Piso 5 torre A - Juzgado 4 civil municipal humedad fachada Cra 7**							
1.24	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	10,00	$ 13.095	$ 130.950,00		$ -	0%
1.25	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	Mt2	10,00	$ 31.181	$ 311.810,00		$ -	0%
1.26	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 2 pequeñas causas cielo raso**							
1.27	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	4,25	$ 64.295	$ 273.253,75	4,32	$ 69.438,50	25%
1.28	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 2 pequeñas causas puerta**							
1.29	Mantenimiento puerta de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios	UND	1,00	$ 95.000	$ 95.000,00	1,00	$ 23.750,00	25%
1.30	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 3 civil municipal cielo raso**							
1.31	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	3,00	$ 45.916	$ 137.748,00		$ -	0%
1.32	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 1 civil municipal ventana**							
1.33	Mantenimiento ventana de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios	M2	4,00	$ 80.750	$ 323.000,00		$ -	0%
1.34	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 1 civil municipal cielo raso**							
1.35	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	2,00	$ 45.916	$ 91.832,00		$ -	0%
1.36	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 8 civil municipal cielo raso**							
1.37	Reparación Cielo raso en Drywall junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. malla, cinta papel, pintura)	ML	4,00	$ 45.916	$ 183.664,00		$ -	0%
1.38	**Piso 5 torre (A) - Juzgado 7 civil municipal cielo raso**							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

1.39	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	8,40	$ 45.916	$ 385.694,40		$ -	0%
1.40	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 6 civil municipal cielo raso**							
1.41	Reparación Cielo raso en Drywall junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. malla, cinta papel, pintura)	ML	4,00	$ 45.916	$ 183.664,00		$ -	0%
1.42	**Piso 5 torre (A) -Pasillo cielo raso**							
1.43	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	50,00	$ 47.366	$ 2.368.300,00	127,68	$ 1.511.863,50	64%
1.44	**Piso 4 torre (A) -Pasillo cielo raso**							
1.45	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	10,00	$ 45.916	$ 459.160,00	0,00	$ -	0%
1.46	**Piso 4 torre (A) - Juzgado 1 pequeñas causas cielo raso**							
1.47	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,00	$ 62.327	$ 124.654,00	3,24	$ 50.484,75	40%
1.48	**Piso 4 torre (A) - Juzgado 1 pequeñas causas Humedad columna**							
1.49	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	3,00	$ 13.095	$ 39.285,00		$ -	0%
1.50	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	Mt2	3,00	$ 31.181	$ 93.543,00		$ -	0%
1.51	**Piso 4 torre (A) - Juzgado 2 penal del circuito cielo raso**							
1.52	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	8,00	$ 62.327	$ 498.616,00	14,40	$ 224.377,25	45%
1.53	**Piso 4 torre (A) - Juzgado 4 civil del circuito Puerta**							
1.54	Mantenimiento puerta de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación,	UND	1,00	$ 95.000	$ 95.000,00	1,00	$ 23.750,00	25%
1.55	**Piso 4 torre (A) - Juzgado 2 civil del circuito Puerta**							
1.56	Mantenimiento puerta de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación,	UND	1,00	$ 95.000	$ 95.000,00	1,00	$ 23.750,00	25%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA **N° 1**

DESDE	15	1	2023
HASTA	31	1	2023

1.57	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 2 laboral del circuito cielo raso**							
1.58	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	4,32	$ 67.313,25	108%
1.59	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 7 penal del circuito cielo raso**							
1.60	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	2,16	$ 33.656,50	54%
1.61	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 3 penal municipal cielo raso**							
1.62	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,00	$ 62.327	$ 124.654,00	4,32	$ 67.313,25	54%
1.63	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 1 penal municipal cielo raso**							
1.64	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	0,72	$ 2.804,69	4%
1.65	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 3 penal municipal cielo raso**							
1.66	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	1,80	$ 28.047,25	45%
1.67	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 6 penal de garantías cielo raso**							
1.68	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	1,08	$ 16.828,25	27%
1.69	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 6 penal de garantías cielo raso**							
1.70	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	1,08	$ 16.828,25	27%
1.71	**Piso 3 torre (A) - Juzgado 2 penal municipal cielo raso**							
1.72	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,00	$ 62.327	$ 124.654,00	0,00	$ -	0%
1.73	**Piso 2 torre (A) - Juzgado 4 administrativo cielo raso**							
1.74	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,00	$ 62.327	$ 124.654,00	1,08	$ 16.828,25	13%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA **N° 1**

DESDE	15	1	2023
HASTA	31	1	2023

1.75	**Piso 2 torre (A) - Juzgado 6 administrativo cielo raso**							
1.76	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	2,00	$ 62.327	$ 124.654,00	2,16	$ 33.656,50	27%
1.77	**Piso 2 torre (A) - Juzgado 4 penal municipal cielo raso**							
1.78	Lamina cielo falso en panel de yeso, Incluye , des instalación instalación y pintura	M2	1,00	$ 62.327	$ 62.327,00	1,08	$ 16.828,25	27%
1.79	**Piso 1 Torre (A) Centro de Servicios**							
1.80	**Desinstalación Archivo rodante**	**UND**	**1,00**	$ 285.000	$ 285.000,00	0,00	$ -	0%
1.81	**Instalación Archivo rodante**	**UND**	**1,00**	$ 285.000	$ 285.000,00	0,00	$ -	0%
1.82	**Piso 1 Torre (A) Centro de Servicios Judiciales puerta**							
1.83	**Mantenimiento puerta de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios**	**UND**	**2,00**	$ 95.000	$ 190.000,00	2,00	$ 47.500,00	25%
1.84	**Piso -1 Torre (A) - Archivo de suspenso humedad**							
1.85	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	30,00	$ 13.095	$ 392.850,00		$ -	0%
1.86	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	30,00	$ 31.181	$ 935.430,00		$ -	0%
1.87	Estructura metálica para cubierta incluye columnas, vigas, correas, platinas, templetes, pernos, soldadura, acabado una capa de anticorrosivo y dos capas de esmalte para exteriores.	KG	40,00	$ 15.382	$ 615.280,00		$ -	0%
1.88	Teja Tipo Sándwich pre pintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en poliuretano. (Suministro e instalación. Incluye equipos, remates, accesorios)	M2	15,00	$ 183.839	$ 2.757.585,00		$ -	0%
1.89	**Piso 7 Torre (B) - Terraza**							
1.90	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	294,48	$ 2.983	$ 878.433,84	228,20	$ 170.180,25	19%
1.91	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	294,48	$ 77.712	$ 22.884.629,76	228,20	$ 4.433.469,50	19%
1.92	**Piso 7 Torre (B) - Pasillo Ascensor**							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

1.93	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel,	M2	30,00	$ 45.916	$ 1.377.480,00		$ -	0%
1.94	**Piso 7 Torre (B) - Sala de Reuniones**							
1.95	Desmonte y retiro de Piso en madera laminada . (Incluye trasiego y disposición final)	Ml	2,00	$ 11.826	$ 23.652,00	0,00	$ -	0%
1.96	Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)	M2	2,00	$ 94.167	$ 188.334,00	0,00	$ -	0%
1.97	**Piso 6 Torre (B) - Sala de audiencias disciplinaria #2 Humedad**							
1.98	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	20,00	$ 13.095	$ 261.900,00		$ -	0%
1.99	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	Mt2	20,00	$ 31.181	$ 623.620,00		$ -	0%
1.100	**Piso 6 Torre (B) - Sala de audiencias disciplinaria #2 Cielo raso**							
1.101	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	40,00	$ 45.916	$ 1.836.640,00		$ -	0%
1.102	**Piso 6 Torre (B) - Sala de audiencias disciplinaria #1 Cielo raso**							
1.103	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	40,00	$ 45.916	$ 1.836.640,00		$ -	0%
1.104	**Piso 6 Torre (B) - Sala de audiencias disciplinaria #2 Humedad**							
1.105	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	20,00	$ 13.095	$ 261.900,00		$ -	0%
1.106	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	Mt2	20,00	$ 31.181	$ 623.620,00		$ -	0%
1.107	**Piso 6 Torre (B) - Cocina cielo raso**							
1.108	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	3,00	$ 45.916	$ 137.748,00		$ -	0%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

1.109	Ventana de inspección en cielo raso Drywall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 201.606	$ 201.606,00		$ -	0%
1.110	**Piso 6 Torre (C) - Despacho # 2 Sala de Juntas**							
1.111	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	6,00	$ 45.916	$ 275.496,00		$ -	0%
1.112	**Piso 6 Torre (C) - Oficina Magistrada Beatriz Ángel**							
1.113	Cielo falso en icopor perlita lisa Lamina Incluye , des instalación instalación	M2	2,16	$ 28.299	$ 61.125,84		$ -	0%
1.114	**Piso 5 Torre (B) - Cocina cielo raso**							
1.115	Ventana de inspección en cielo raso Drywall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 201.606	$ 201.606,00		$ -	0%
1.116	**Piso 5 Torre (B) - Secretaria Tribunal Señal ventanas**							
1.117	Mantenimiento ventana de aluminio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación, accesorios necesarios	M2	20,00	$ 80.750	$ 1.615.000,00		$ -	0%
1.118	**Piso 5 Torre (B) - Secretaria Tribunal Puertas**							
1.119	Mantenimiento puerta en vidrio. Incluye des instalación e instalación, ajuste, reparación,	UND	2,00	$ 190.000	$ 380.000,00		$ -	0%
1.120	**Piso 5 Torre (B) - Secretaria Tribunal Alrededor de las Ventanas**							
1.121	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	15,00	$ 13.095	$ 196.425,00		$ -	0%
1.122	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	15,00	$ 31.181	$ 467.715,00		$ -	0%
1.123	**Torre C Mantenimiento manto de terrazas.**							
1.124	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	208,00	$ 2.983	$ 620.464,00	268,80	$ 200.457,50	32%
1.125	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	208,00	$ 75.333	$ 15.669.264,00	268,80	$ 5.062.377,50	32%
1.126	**Ascensor y terraza escalera central torre C Mantenimiento manto de terrazas.**							
1.127	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	39,00	$ 2.983	$ 116.337,00	39,00	$ 29.084,25	25%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA **N° 1**

DESDE	15	1	2023
HASTA	31	1	2023

1.128	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	39,00	$ 75.333	$ 2.937.987,00	39,00	$ 734.496,75	25%
1.129	**Cambio de piso entrada principal**							
1.130	Cerramiento Provisional Sectorizado.	MT2	250,00	$ 10.902	$ 2.725.500,00	442,00	$ 1.204.671,00	44%
1.131	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	MT2	870,88	$ 10.093	$ 8.789.791,84	1.438,08	$ 3.628.632,50	41%
1.132	Suministros e instalación de concreto de 3000 PSI preparado en obra inc. Formaleta y malla electro soldada para plazoletas planas y escaleras. Incluye (instalación de acabado para plazoletas planas y escaleras. tipo concreto estampado incluye. moldes, endurecedor de cuarzo, desmoldante, sellante semi lustre y dilataciones necesarias. Diseño y color a definir.)	MT2	2100,00	$ 81.595	$ 171.349.500,00		$ -	0%
1.133	**Bodega de Administración**							
1.134	Kit Cantonera Eléctrica Larga 12V (Suministro e instalación. Incluye configuración, caja, tubería, accesorios necesarios)	UND	1,00	$ 238.028	$ 238.028,00		$ -	0%
1.135	Video Portero 4 Pulgadas C/ Audífono (Suministro e instalación. Incluye configuración, caja, tubería, accesorios necesarios)	UND	1,00	$ 665.000	$ 665.000,00		$ -	0%
1.136	**Sala de Audiencias Principal**							
1.137	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	118,00	$ 6.427	$ 758.386,00	61,56	$ 98.911,50	13%
1.138	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	118,00	$ 61.413	$ 7.246.734,00		$ -	0%
1.139	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	107,00	$ 13.990	$ 1.496.930,00		$ -	0%
1.140	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND	15,00	$ 256.727	$ 3.850.905,00		$ -	0%
2	**Sede Judicial de Balboa**							
2.1	**Mantenimiento de techos y canales.**							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

2.2	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	60,00	$	6.838	$	410.280,00	$	-	0%
2.3	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	25,00	$	6.660	$	166.500,00	$	-	0%
2.4	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	2,00	$	48.474	$	96.948,00	$	-	0%
2.5	**Arreglo de Humedades**									
2.6	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	Mt2	20,00	$	13.095	$	261.900,00	$	-	0%
2.7	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	20,00	$	31.181	$	623.620,00	$	-	0%
3	**Palacio de Justicia Mistrato**									
3.1	**Mantenimiento de cubierta**									
3.2	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	60,00	$	6.838	$	410.280,00	$	-	0%
3.3	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	25,00	$	6.660	$	166.500,00	$	-	0%
3.4	Techo en teja ondulada transparente de	M2	15,00	$	80.180	$	1.202.700,00	$	-	0%
3.5	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	2,00	$	48.474	$	96.948,00	$	-	0%
3.6	**Arreglo de Humedades**									
3.7	Estuco y pintura muros 3 manos	Mt2	50,00	$	13.095	$	654.750,00	$	-	0%
3.8	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos.	Mt2	50,00	$	31.181	$	1.559.050,00	$	-	0%
3.9	**Punto Eléctrico Cocineta**									
3.10	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,00	$	86.273	$	86.273,00	$	-	0%
4	**Palacio de Justicia de Gúatica**									
4.1	**Tanques de reserva**									
4.2	Des instalación tanques de reserva	UND	2,00	$	95.000	$	190.000,00	$	-	0%
4.3	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	4,00	$	60.619	$	242.476,00	$	-	0%
4.4	Instalación tanque de reserva	UND	2,00	$	142.500	$	285.000,00	$	-	0%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA **N° 1**

DESDE	15	1	2023
HASTA	31	1	2023

4.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UND	1,00	$ 1.157.846	$ 1.157.846,00		$ -	0%
4.6	**Cuarto tecnico**							
4.7	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	6,30	$ 75.771	$ 477.357,30		$ -	0%
4.8	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	18,00	$ 13.990	$ 251.820,00		$ -	0%
4.9	Puerta metálica en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UND	1,00	$ 769.476	$ 769.476,00		$ -	0%
4.10	Acometida Bifásica 220V #6 (Fases Neutro) + 1x10 Tierra. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios	ML	12,00	$ 66.050	$ 792.600,00		$ -	0%
4.11	Acometida en cable de cobre aislado 4x2/0 + 1x2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	12,00	$ 167.136	$ 2.005.632,00		$ -	0%
4.12	Cables y accesorios para alimentador a UPS 4 N.8 8-Cu.THHN. (Suministro e instalación)	ML	12,00	$ 21.217	$ 254.604,00		$ -	0%
4.13	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UND	1,00	$ 123.803	$ 123.803,00		$ -	0%
4.14	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND	2,00	$ 253.429	$ 506.858,00		$ -	0%
4.15	**Mantenimiento de cubierta**							
4.16	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	80,00	$ 6.838	$ 547.040,00		$ -	0%
4.17	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	40,00	$ 6.660	$ 266.400,00		$ -	0%
4.18	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	1,00	$ 48.474	$ 48.474,00		$ -	0%
5	**Sede Judicial la Celia**							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

5.1	**Cuarto tecnico**							
5.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	5,00	$ 75.771	$ 378.855,00		$ -	0%
5.3	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	15,00	$ 13.990	$ 209.850,00		$ -	0%
5.4	Puerta metálica en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UND	1,00	$ 769.476	$ 769.476,00		$ -	0%
5.5	Acometida Bifásica 220V #6 (Fases Neutro) + 1x10 Tierra. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios	ML	12,00	$ 66.050	$ 792.600,00		$ -	0%
5.6	Acometida en cable de cobre aislado 4x2/0 + 1x2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	12,00	$ 167.136	$ 2.005.632,00		$ -	0%
5.7	Cables y accesorios para alimentador a UPS 4 N.8 8-Cu.THHN. (Suministro e instalación)	ML	12,00	$ 21.217	$ 254.604,00		$ -	0%
5.8	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UND	1,00	$ 123.803	$ 123.803,00		$ -	0%
5.9	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND	1,00	$ 253.429	$ 253.429,00		$ -	0%
6	**Palacio de Justicia La virginia**							
6.1	**Mantenimiento de cubierta**							
6.2	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	240,00	$ 6.474	$ 1.553.760,00		$ -	0%
6.3	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	25,00	$ 6.306	$ 157.650,00		$ -	0%
6.4	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	M2	10,00	$ 114.928	$ 1.149.280,00		$ -	0%
6.5	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	3,00	$ 48.474	$ 145.422,00		$ -	0%
6.6								

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1	DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

6.7	Asiento Sanitario Caida Lenta Blanco	UND	4,00	$	94.905	$	379.620,00	$ -	0%
6.8	Llave terminal cromada de 1/2"	UND	2,00	$	39.169	$	78.338,00	$ -	0%
6.9	**Lamparas**								
6.10	Lámpara bala tipo LED 20 W. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND	4,00	$	101.289	$	405.156,00	$ -	0%
7	**Palacio de Justicia Quinchia**								
7.1	**Reja de Seguridad**								
7.2	Reja metálica de seguridad de 1/2" , con puerta, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura	M2	70,00	$	190.999	$	13.369.930,00	$ -	0%
7.3	**Cambio de cerraduras**								
7.4	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e	UND	1,00	$	159.322	$	159.322,00	$ -	0%
7.5	Cerradura tipo puerta principal	UND	15,00	$	192.165	$	2.882.475,00	$ -	0%
7.6	**Pelicula Opalizada**								
7.7	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	40,00	$	41.261	$	1.650.440,00	$ -	0%
7.9	Recorrido de techos , incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	295,00	$	6.838	$	2.017.210,00	$ -	0%
7.10	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	80,00	$	6.660	$	532.800,00	$ -	0%
7.11	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	6,00	$	48.474	$	290.844,00	$ -	0%
7.12	Suministro e instalación de Bordillo en concreto (bloque de cemento para uso peatonal) anden plazoleta de 20*30*80 cm, incluye transporte y la preparación de la superficie de apoyo	ML	22,00	$	47.932	$	1.054.504,00	$ -	0%
8	**Palacio de Justicia de Pueblo Rico.**								
8.1	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos	M2	60,00	$	6.838	$	410.280,00	$ -	0%
8.2	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	12,00	$	6.660	$	79.920,00	$ -	0%
8.3	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	3,00	$	48.474	$	145.422,00	$ -	0%
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$**	**392.901.174,41**	**$ 42.896.285,69**	
	ADMINISTRACION			**15%**		**$**	**58.935.176,16**	**15% $ 6.434.443,00**	
	UTILIDAD			**5%**		**$**	**2.946.758,81**	**5% $ 321.722,00**	**10,92%**
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**		**$**	**559.884,17**	**19% $ 61.127,00**	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA	N° 1				
		DESDE	15	1	2023
		HASTA	31	1	2023

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA	$ 455.342.993,56	$ 49.713.577,7

RESUMEN DEL CONTRATO	PRESUPUESTO	ACTAS
Vr contrato	$ 455.342.993,56	
Vr adición		
Vr acta N° 1		
Vr acta N° 2		
Vr acta N° 3		
Vr acta N° 4		
Saldo por ejecutar		$ 455.342.993,56
Sumas iguales	$ 455.342.993,56	$ 455.342.993,56

CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900132794-0

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA 1

DESDE	15	12	2022
HASTA	30	1	2023

5. INVERSION PRESUPUESTAL - FACTURACION CONSOLIDADO

5.1 CONDICIONES DEL PRESUPUESTO


	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO			
PRESUPUESTO	$ 455.342.994						

5.2 CONDICIONES DE INVERSION DEL PRESUPUESTO

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO			
INVERSION PROGRAMADA	$ -	$ 151.780.998	$ 151.780.998	$ 151.780.998			
INVERSION EJECUTADA	$ -	$ 66.297.772					
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA	$ -	$ 66.297.772					
TOTAL POR INVERTIR	$ 455.342.994	$ 389.045.222					

CONTROL INVERSION MENSUAL		ene-23
INVERSION PROGRAMADA	$ 151.780.998	100%
INVERSION EJECUTADA	$ 66.297.772	44%
INVERSION POR EJECUTAR	-$ 85.483.226	-56%

CONTROL INVERSION ACUMULADA A		ene-23
INVERSION PROGRAMADA CTO.	$ 151.780.998	100%
INVERSION EJECUTADA	$ -	0%
INVERSION POR EJECUTAR	-$ 455.342.994	-100%

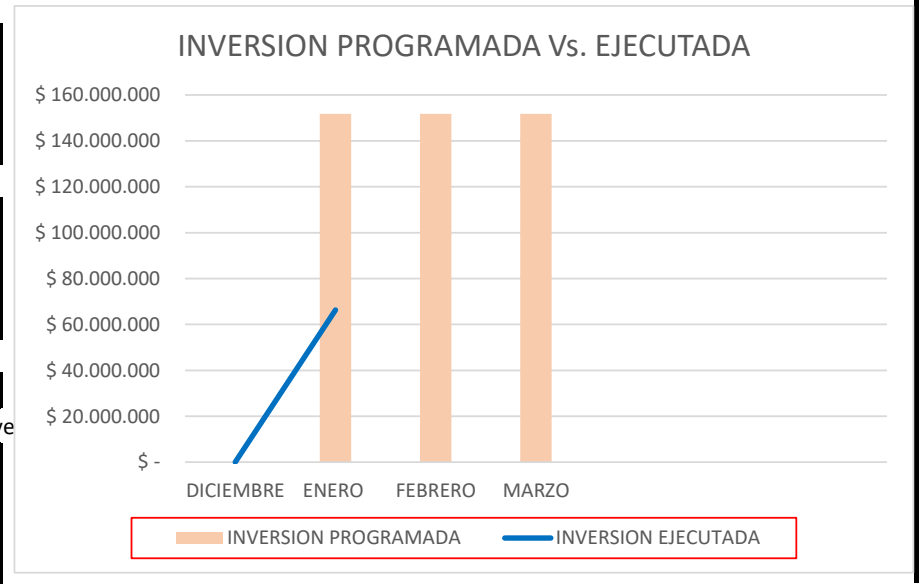

OBSERVACIONES:

Para el mes del presente informe la inversion realizada, acorde con la inve

programada mensual es del	-56%	inferior
La inversion total del proyecto pa	ene-23	se encuentra
según la programada, ejecutada e	0%	del Proyecto

Quedan observaciones en campo por subsanar.

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

NIT. 900.132.794-0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE OBRA 1

DESDE	15	12	2022
HASTA	30	1	2023

5. INVERSION PRESUPUESTAL - FACTURACION CONSOLIDADO


5.3 CONDICIONES DE FACTURACION

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO			
FACTURACION	$ -	$ -					
FACTURACION ACUMULADA	$ -	$ -	$ -	$ -			
TOTAL POR FACTURAR	$ 455.342.994	$ 455.342.994					

CONTROL FACTURACION MENSUAL		ene-23
FACTURACION PROGRAMADA	$ 151.780.998	100%
FACTURACION EJECUTADA MES	$ -	0%
FACTURACION NO EJECUTADA	-$ 151.780.998	-100%

CONTROL FACTURACION ACUMULADA A		ene-23
FACTURACION PROGRAMADA CT	$ 151.780.998	33%
FACTURACION ACUMULADA	$ -	0%
FACTURACION PENDIENTE	$ 455.342.994	100%

OBSERVACIONES:		
Para el mes del presente informe la facturacion realiz		ene-23
corresponde con relacion al total	0%	del Vr. Total.
la facturacion pendiente es del	100%	del Vr. Total.
Esta Facturacion se ejecutara con	Acta 1 Parcial	del Proyecto
Quedan observaciones en campo por subsanar.		

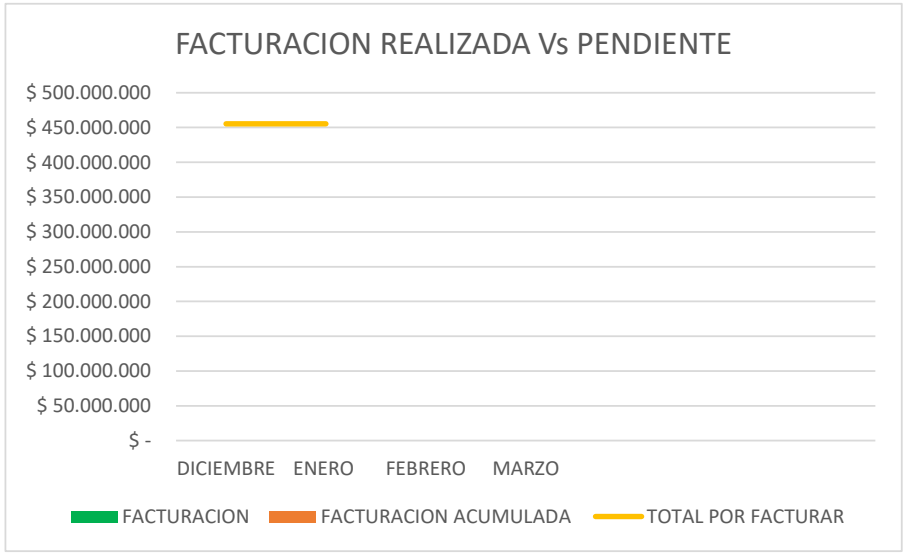

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE PEREIRA


"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO DE PEREIRA - RISARALDA"

CONSTRUINTEL


CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	AO-MC-21-2022	CCA CONTRATISTA CIVILES SAS	CONTRATO DE OBRA No:	CE-SA-MC-06-2022	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	N°	DIA	MES	AÑO
						1	25	1	2023



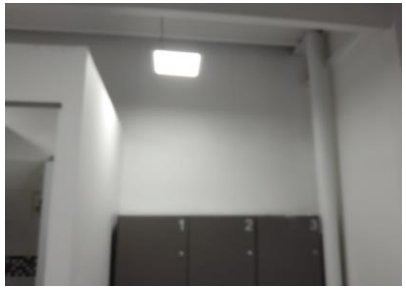



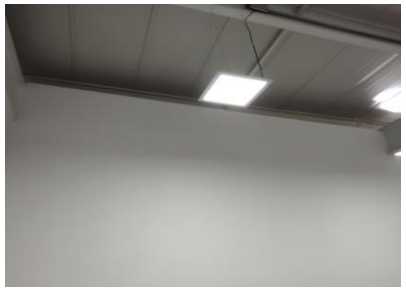

FIRMAS:

Representante de la Interventoría
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL

Representante interventor residente
Nombre: HUVARLEY ZAPATA CASTRILLON

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL; PARA EL CONTRATO DE "PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE PEREIRA

CONSTRUINTEL Grupo Construcciones Inteligentes S.A.S.

CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		CONTRATO DE OBRA No:		N°	DIA	MES	AÑO
AO-MC-21-2022	CCA CONTRATISTA CIVILES SAS	CE-SA-MC-06-2022	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	1	30	1	2023

SEDE	TORRE: A	PISO: 7	ITEM 1,4



Se lijo el mastic y se elaboro los filos



Filos elaborados en las primeras ventanas, faltaria pintar



Falta por lijar y elaborar filos



Al hacer el raspado, se encontro una hoja en mal estado se procedio al retiro para instalar una nueva, se hacer el refuerzo con omegas



FIRMAS:

Representante de la Interventoría
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL

Representante interventor residente
Nombre: HUVARLEY ZAPATA CASTRILLON

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE PEREIRA


"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO DE PEREIRA - RISARALDA"

CONSTRUINTEL

CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	AO-MC-21-2022	CCA CONTRATISTA CIVILES SAS	CONTRATO DE OBRA No:	CE-SA-MC-06-2022	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	N°	DIA	MES	AÑO
						2	25	1	2023



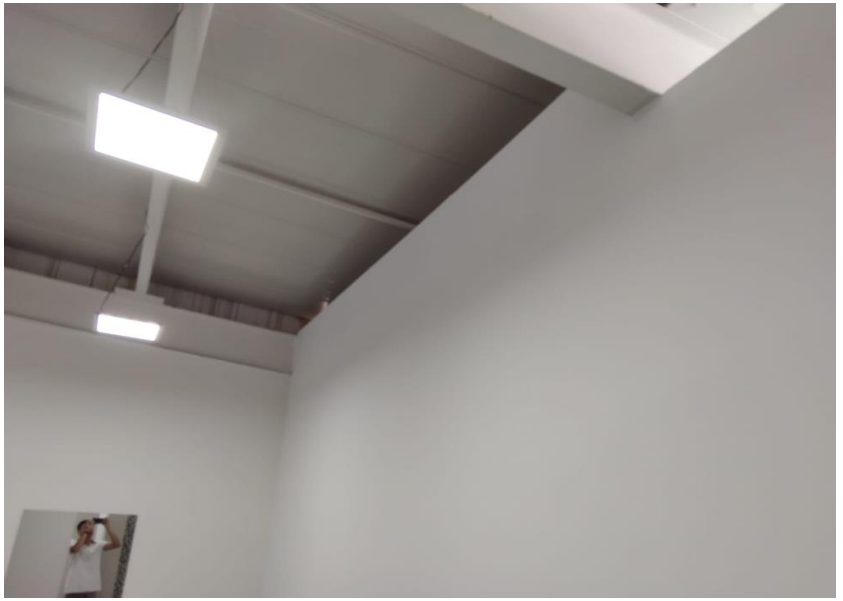

FIRMAS:

Representante de la Interventoría
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL

Representante interventor residente
Nombre: HUVARLEY ZAPATA CASTRILLON

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL; PARA EL CONTRATO DE "PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE PEREIRA

CONSTRUINTEL Grupo Construcciones Inteligentes S.A.S.

CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		CONTRATO DE OBRA No:		N°	DIA	MES	AÑO
AO-MC-21-2022	CCA CONTRATISTA CIVILES SAS	CE-SA-MC-06-2022	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	1	30	1	2023

SEDE	TORRE: A	PISO: 7	ITEM 1,4



Se lijo el mastic y se elaboro los filos



Filos elaborados en las primeras ventanas, faltaria pintar



Falta por lijar y elaborar filos



Al hacer el raspado, se encontro una hoja en mal estado se procedio al retiro para instalar una nueva, se hacer el refuerzo con omegas



FIRMAS:

Representante de la Interventoría
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL

Representante interventor residente
Nombre: HUVARLEY ZAPATA CASTRILLON
