ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2

## DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022

## CONTRATO DE OBRA Nº 394 DE 2022

**OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.**

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 419 DE 2022

**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"**

**CONTRATISTA: JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN**

**CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA**

**PAIPA, DICIEMBRE DE 2022**

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

# TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 4
2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA ..... 4
2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 4
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO ..... 5
3. ESTADO DEL CONTRATO ..... 5
4. REVISIÓN DE PLANOS ..... 6
5. COMITES DE OBRA ..... 6
6. BITÁCORA DE OBRA ..... 6
7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA ..... 7
7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 7
7.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 7
7.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA ..... 8
8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS ..... 9
9. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA ..... 10
9.1 PERSONAL EN OBRA ..... 10
9.2 EQUIPO Y HERRAMIENTA: ..... 11
10. CONCLUSIONES ..... 12

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance del contrato de obra No. 394 de 2022 cuyo objeto es "**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**" del periodo comprendido entre el día 1 de diciembre de 2022 y el día 22 de diciembre de 2022. Dentro de este periodo de tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

Demolición de muros en ladrillo, ensamblaje y montaje de estructura metálica, instalación de muros en eterboard y drywall, aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros, ajustes a las puertas de zonas de consultorios y terapia.

# 2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

## 2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA N° 394 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA |
| CONTRATISTA: | ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. |
| INTERVENTOR: | JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA |
| VALOR INCIAL DEL CONTRATO: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($279.273.656,00) M/CTE. |
| PLAZO INICIAL DE CONTRATO: | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |
| ACTA DE INICIO | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 1 | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A 22 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 DE ENERO DEL 2023 |

## 2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El lote del proyecto está ubicado a 4 kilómetros del casco urbano del municipio de Paipa (Boyacá), vía monumento a los lanceros del pantano de Vargas.



**Figura 1. Localización general del proyecto**

## 2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la remodelación y adecuación de una edificación de dos (02) pisos, con un área en planta de 776.65 m² aproximadamente, la cual consta de sala de espera, consultorios, unidades sanitarias, cuarto de aseo, auditorio, terraza, áreas de circulación, salas de terapia en camilla, vestier, sauna, turco, jacuzzi, piscinas.

Las adecuaciones se han realizado para el mejoramiento de las instalaciones del Instituto Termal de Paipa, debido al daño ocasionado por humedades, goteras y falta de iluminación; así mismo, se realiza mejoramiento a las instalaciones de zonas húmedas utilizando los equipos y materiales convenientes para la prevención y no reincidencia de los mismos daños.

## 3. ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato de obra se encuentra EN SUSPENSIÓN, a razón del documento presentado el día 20 de diciembre del 2022 en donde se solicita la suspensión de obra por parte del contratista, teniendo en cuenta que los materiales requeridos para la impermeabilización e instalación del nuevo enchape, son comercializados por empresas que por fechas de festividades de fin de año se dan un margen de receso, motivo por el cual no es posible dar continuidad a las actividades propuestas.

## 4. REVISIÓN DE PLANOS

A partir de la remisión de la documentación técnica remitida por la entidad contratante, se realizó la revisión de la misma con una observación. En reunión entre el gerente del ITP, el secretario de infraestructura y contratista de interventoría, se evidencio una falla en el diseño original de las plataformas de acceso a los usuarios, que estaban planteadas en la piscina. Teniendo en cuenta lo observado se concluyó que se debe realizar una modificación en los grados de inclinación de dicha rampla para mejorar el acceso de los usuarios.

## 5. COMITES DE OBRA

Durante el periodo comprendido en el informe, se realizó el comité de obra No. 1 generando su respectiva acta (Acta No. 1).

## 6. BITÁCORA DE OBRA

Se ha suscrito la bitácora de obra desde el 1 de diciembre hasta la fecha de corte del presente informe.

# 7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

## 7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del periodo comprendido entre los días 1 de diciembre de 2022 y el día 22 de diciembre de 2022. Dentro de este periodo de tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

Demolición de muros en ladrillo, ensamblaje y montaje de estructura metálica, instalación de muros en eterboard y drywall, aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros, ajustes a las puertas de zonas de consultorios y terapia. Dichas actividades se realizaron bajo normas de seguridad y teniendo en cuenta todo el proceso constructivo de cada una de ellas, asegurando la calidad de trabajo.

## 7.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se hace una relación de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe y el avance financiero que representa la ejecución de las mismas en relación con el presupuesto de obra.

| No. | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. | Metro Cuadrado | 5,10 | $ 52.285,00 |
| 3,04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | Kilogramo | 446,29 | $ 8.001.533,41 |
| 4,02 | MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM | Metro Cuadrado | 3,61 | $ 519.219,00 |
| 4,03 | MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 M | Metro Cuadrado | 19,07 | $ 1.071.620,00 |

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

| DESCRIPCION | VALOR INICIAL | VALOR ACUMULADO AL 22-12-22 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 22-12-22 |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. 394 DE 2022 OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA | $ 279.273.656,00 | $ 94.982.685,00 | 34.01% |

### 7.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con el plazo actualizado del contrato de obra (Dos (02) meses calendario), ha trascurrido a la fecha de corte del presente informe, CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS CALENDARIO que equivalen a un 96.66% del tiempo destinado para la ejecución de presupuesto actualizado del contrato de obra.

En relación con la programación de obra remitida por el contratista de obra a la interventoría, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado de obra de 34.01% que equivale a $ 94.982.685,00, en relación con el presupuesto oficial por un valor de $ 279.273.656,00.

## 8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas del presente contrato de obra:

| INFORMACION PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | POLIZA O CERT MODIFICA No. | RIESGO | V/R. ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | DESDE | HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-40-101037766 ANEXO 1 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | $ 200.000.000,00 | 12/10/2022 | 20/12/2022 |
| | 39-44-101143254 ANEXO 2 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | $ 125.673.145,20 | 12/10/2022 | 12/10/2027 |

# 9. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA

## 9.1 PERSONAL EN OBRA

Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra, hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha mantenido de forma permanente en obra el siguiente personal, debidamente afiliado y al día a los sistemas de seguridad social y parafiscales:

| ID | NOMBRES Y APELLIDOS | No IDENTIFICACIÓN | CARGO | FECHA INGRESO | FECHA EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATIVOS** | | | | | |
| 1 | Jhon Carlos Camargo | 74812787 | Director de obra | 25/10/2022 | |
| 2 | Jhon Carlos Camargo | 74812787 | Residente de obra | 25/10/2022 | |
| 3 | Hernan Libardo Mora Alcantar | 1049637745 | Auxiliar | 01/11/2022 | |
| **SUB-CONTRATISTA** | | | | | |
| 3 | Judimar del Valle Bravo Alcala | 7454545 | Sub-Contratista | 01/11/2022 | |
| 4 | Jhoan Wolmer Gonzalez Yendiz | PT 1186597 | Ayudante | 01/11/2022 | |
| 5 | Ramon Jorge Cabello | PT 7130958 | Oficial | 01/11/2022 | |
| 6 | Sirio Miguel Gonzalez Sanaz | PT 5948752 | Oficial | 01/11/2022 | |
| 7 | Johan Bruzual Vargas | PT 1255337 | Ayudante | 01/11/2022 | |

## 9.2 EQUIPO Y HERRAMIENTA

Dentro del equipo utilizado por el contratista de obra para la ejecución del proyecto durante el periodo comprendido en el presente informe se relaciona el siguiente:

| EQUIPO Y HERRAMIENTA |
|---|
| HERRAMIENTA MENOR (PALAS, MAZOS, MARTILLOS, MACETAS, PUNTEROS, SEGUETA, CARRETILLAS, ETC.) |
| PULIDORA DE MANO |
| ANDAMIOS TUBULARES |
| TALADRO PERCUTOR |
| ROTOMARTILLOS |
| NIVEL LASER |

## 10. CONCLUSIONES

- En relación con la programación de obra remitida por el contratista de obra a la interventoría, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado de obra de 34.01%. Este valor de avance se relaciona con el presupuesto del contrato de obra ($ 125.673.145,20)

- Durante el periodo del presente informe se realizó la demolición de muros en ladrillo, el ensamblaje y montaje de estructura metálica en zona de piscina, la instalación de muros en eterboard y drywall, la aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros y los ajustes a las puertas de zonas de consultorios y terapia.

- Se continúa con el desarrollo del proyecto de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas remitidas por la entidad contratante.

- El contratista a la fecha ha cumplido con lo estipulado contractualmente con respecto a las afiliaciones de sus trabajadores a las EPS, ARP, AFP, y parafiscales tal como exige la ley.

- A la fecha se presenta suspensión en el presente contrato de obra, teniendo en cuenta que los materiales requeridos para la impermeabilización e instalación del nuevo enchape, son comercializados por empresas que por fechas de festividades de fin de año se dan un margen de receso, motivo por el cual no es posible dar continuidad a las actividades propuestas.

**JOHN CARLOS CAMARGO AVILA**
R/L ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
Nit. No. 900.505.216-7
CONTRATISTA DE OBRA 001 DE 2021

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

| | |
|---|---|
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S | REGISTRO FOTOGRAFICO |

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

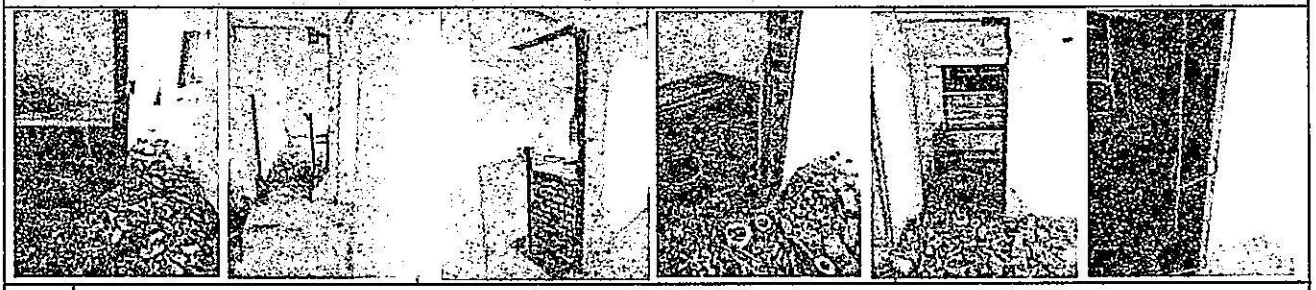
FECHA: 22-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

**ACTIVIDADES**

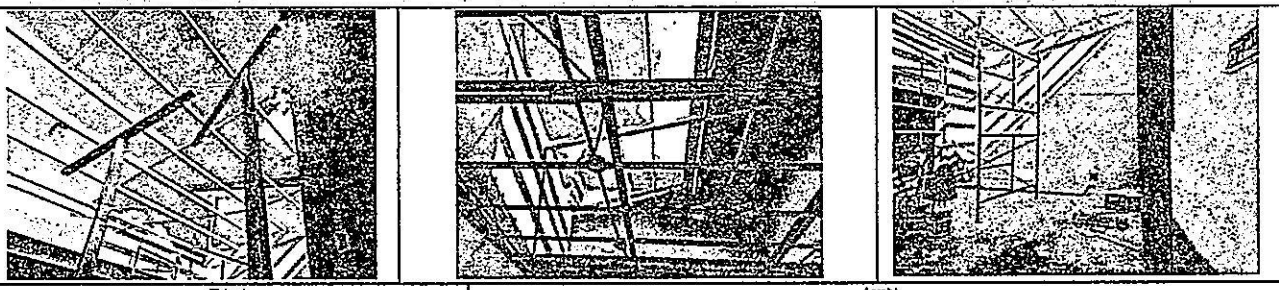
| | |
|---|---|
| 1,05 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| | |
|---|---|
| 3,04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>Rit. JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>Rit. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

| | |
|---|---|
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S | REGISTRO FOTOGRAFICO |

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA




FECHA: 22-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

**ACTIVIDADES**

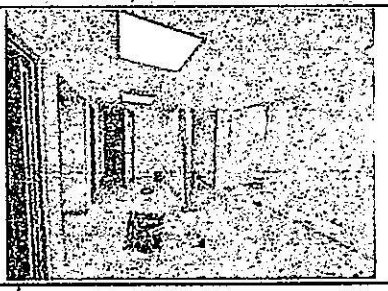
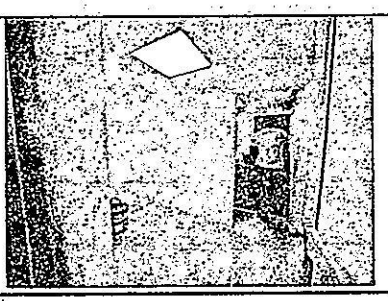
| | |
|---|---|
| 4,02 | MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| 4,03 | MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 M |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

# BITACORA DE OBRA

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 01-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN UBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

Se inicia las adecuaciones solicitadas por el doctor Richard gerente del ITP el cual es realizar los ajustes a las puerta de terapias y consultorio

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S<br>RL. JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>RL. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 02-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN UBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

Se continua con las adecuaciones solicitadas por el doctor Richard gerente del ITP el cual es realizar los ajustes a las puerta de teraplas y consultorio

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOSE DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 03-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 12:00p. m. |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 12:00p. m |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 12:00p. m. |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00p. m. |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 12:00p. m |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 12:00p. m. |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00p. m. |

## ACTIVIDADES

se realiza orden y aseo en todo la obra

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>RL JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>RL JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

| | |
|---|---|
| ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. | BITACORA - DIARIA |

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 05-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

Se inicila a pañetar las adecuaciones las puerta de terapias y consultorio

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

| ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. | BITACORA - DIARIA |
|---|---|

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 06-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

**REPORTE DE TIEMPO**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

**ACTIVIDADES**

se inicia a realizar muros de estructura ligera (drywall)

**HERRAMIENTA UTILIZADA**

HERRAMINETA MENOR

**ESTADO CLIMÁTICO**

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES UNTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 07-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN UBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se continual con la realizar muros de estructura ligera (drywall) en cuarto de aseo

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R.L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

| ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. | BITACORA - DIARIA |
|---|---|

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMÉDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 07-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

**REPORTE DE TIEMPO**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

**ACTIVIDADES**

se continual con la realizar muros de estructura ligera (drywall) y estuco en cuarto de aseo

**HERRAMIENTA UTILIZADA**

HERRAMINETA MENOR

**ESTADO CLIMÁTICO**

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOSE DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 03-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| SIRID MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 12:00:p. m. |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00:p. m. |

## ACTIVIDADES

se realiza orden y aseo en todo la obra

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R.L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 12-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se inicia con la realizar muros de estructura ligera (drywall) almacenamiento

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró<br>CONTRATISTA | Aprobó<br>INTERVENTORIA |
|---|---|
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 13-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN UBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se continua con la realizar muros de estructura ligera (drywall) almacenamiento

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 14-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se continua con la realizar muros de estructura ligera (drywall) almacenamiento

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 15-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se continua con la realizar muros de estructura ligera (drywall) y estuco en el area dealmacenamiento

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

ALCA
INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

**FECHA: 16-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se inicia el desmontar policarbonato en el area de piscina

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOSE DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 17-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 12:00p. m. |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 12:00p. m. |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 12:00p. m. |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00p. m. |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 12:00p m |
| SIRID MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 12:00p. m. |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 12:00p. m. |

## ACTIVIDADES

se continua con el desmontar policarbonato en el area de piscina

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

**OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**

**FECHA: 19-12-2022**

**ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA**

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se inicia el desmontar perfiles metalicos en el area de piscina

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 20-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se inicia a montar perfiles metalicos en el area de piscina

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 21-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se continua con la montar perfiles metalicos en el area de piscina

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R.L. JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R.L. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de interventoria |

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

# BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 22-12-2022

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

## REPORTE DE TIEMPO

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | HORA INICIO | HORA FINAL |
|---|---|---|---|
| JOHN CAMARGO AVILA | ENCARGADO | 07:00AM | 17:00 PM |
| HERNAN UBARDO MORA ALCANTAR | AUXILIAR | 07:00AM | 17:00 PM |
| JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA | SUB-CONTRATISTA | 07:00AM | 17:00 PM |
| JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |
| RAMON JORGE CABELLO | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ | OFICIAL | 07:00AM | 17:00 PM |
| JOHAN BRUZUAL VARGAS | AYUDANTE | 07:00AM | 17:00 PM |

## ACTIVIDADES

se cubre con plastico negro el area de piscina
se suspende la obra por 30 dias por falta de sumistro de materiales por parte de los proveedores

## HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAAMINETA MENOR

## ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

| Elaboró | Aprobó |
|---|---|
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S<br>R/L JOHN CAMARGO AVILA<br>Residente de obra | JOS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES<br>R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN<br>Residente de Interventoria |
