ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 3

DEL 06 DE FEBRERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATO DE OBRA Nº 394 DE 2022

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 419 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"

CONTRATISTA: JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA

PAIPA, FEBRERO DE 2023

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5
3. ESTADO DEL CONTRATO 5
4. REVISIÓN DE PLANOS 6
5. COMITES DE OBRA 6
6. BITÁCORA DE OBRA 6
7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 7
7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
7.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 7
7.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 11
8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS 11
9. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 12
9.1 PERSONAL EN OBRA 12
9.2 EQUIPO Y HERRAMIENTA: 12
10. CONCLUSIONES 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance del contrato de obra No. 394 de 2022 cuyo objeto es "**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**" del periodo comprendido entre el día 06 de febrero de 2023 y el día 22 de febrero de 2023. Dentro de este periodo de tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

Desmonte de policarbonato, cielo falso, aparatos sanitarios, luminarias, divisiones en vidrio templado; demolición de guardaescoba, enchape cerámico, muros en ladrillo y pañetes; cargue manual de escombros, instalaciones de puntos de desagües, ensamblaje y montaje de estructura metálica, instalación de muros en eterboard y drywall, construcción de pañetes, filos y dilataciones, instalaciones hidráulicas, aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros, instalación de cielo raso, instalación de pisos, guardaescoba, media caña, baranda de acero inoxidable; limpieza de canales y aseo general en las instalaciones intervenidas.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA N° 394 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
CONTRATISTA:	ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.
INTERVENTOR:	JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($279.273.656,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL DE CONTRATO:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 1	22 DE DICIEMBRE DE 2022 A 22 DE ENERO DE 2023
PRORROGA A SUSPENCIÓN No. 1	25 DE ENERO DE 2023 A 06 DE FERERO DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	6 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA No. 2	07 DE FEBRERO DE 2023 A 22 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	22 DE FEBRERO DE 2023

2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El lote del proyecto está ubicado a 4 kilómetros del casco urbano del municipio de Paipa (Boyacá), vía monumento a los lanceros del pantano de Vargas.

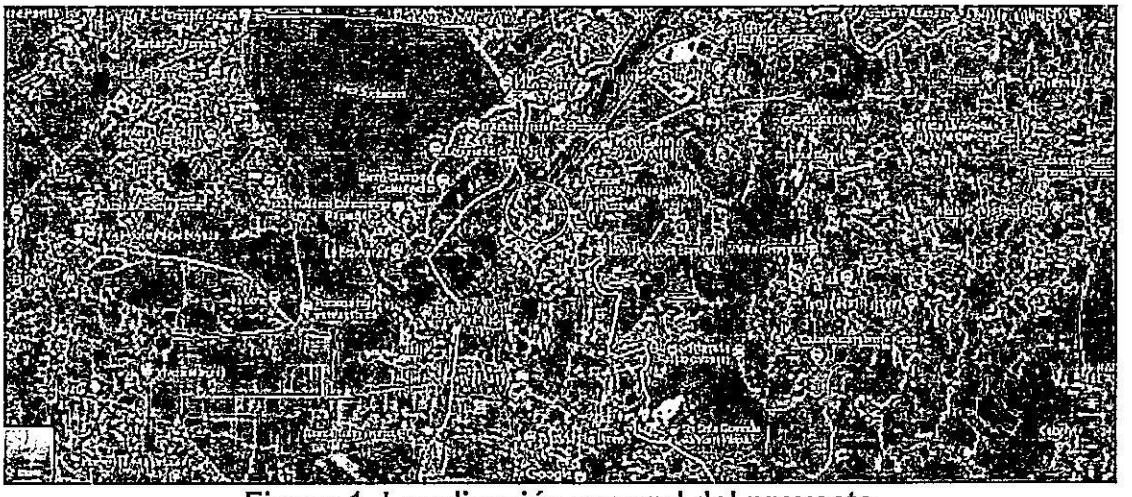


Figura 1. Localización general del proyecto

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la remodelación y adecuación de una edificación de dos (02) pisos, con un área en planta de 776.65 m^2 aproximadamente, la cual consta de sala de espera, consultorios, unidades sanitarias, cuarto de aseo, auditorio, terraza, áreas de circulación, salas de terapia en camilla, vestier, sauna, turco, jacuzzi, piscinas.

Las adecuaciones se han realizado para el mejoramiento de las instalaciones del Instituto Termal de Paipa, debido al daño ocasionado por humedades, goteras y falta de iluminación; así mismo, se realiza mejoramiento a las instalaciones de zonas húmedas utilizando los equipos y materiales convenientes para la prevención y no reincidencia de los mismos daños.

3. ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato de obra se encuentra VIGENTE, teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe se encuentra en terminación la ejecución de actividades de obra.

4. REVISIÓN DE PLANOS

A partir de la remisión de la documentación técnica remitida por la entidad contratante, se realizó la revisión de la misma con una observación. En reunión entre el gerente del ITP, el secretario de infraestructura y contratista de interventoría. se evidencio una falla en el diseño original de las plataformas de acceso a los usuarios, que estaban planteadas en la piscina. Teniendo en cuenta lo observado se concluyó que se debe realizar una modificación en los grados de inclinación de dicha rampla para mejorar el acceso de los usuarios.

5. COMITES DE OBRA

Durante el periodo comprendido en el informe, se realizó el comité de obra No. 1 generando su respectiva acta (Acta No. 1).

6. BITÁCORA DE OBRA

Se ha suscrito la bitácora de obra desde el 06 de febrero de 2023 hasta la fecha de corte del presente informe.

7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del periodo comprendido entre los días 06 de febrero de 2023 y el día 22 de febrero de 2023. Dentro de este periodo de tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

Desmonte de policarbonato, cielo falso, aparatos sanitarios, luminarias, divisiones en vidrio templado; demolición de guardaescoba, enchape cerámico, muros en ladrillo y pañetes; cargue manual de escombros, instalaciones de puntos de desagües, ensamblaje y montaje de estructura metálica, instalación de muros en eterboard y drywall, construcción de pañetes, filos y dilataciones, instalaciones hidráulicas, aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros, instalación de cielo raso, instalación de pisos, guardaescoba, media caña, baranda de acero inoxidable; limpieza de canales y aseo general en las instalaciones intervenidas.

7.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se hace una relación de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe y el avance financiero que representa la ejecución de estas en relación con el presupuesto de obra.

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/TOTAL
1,01	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE CORTE Y TRASIEGO)	Metro Cuadrado	147,88	1.245.889,00
1,02	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	Metro lineal	60,04	109.153,00
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Metro Cuadrado	30,21	217.633,00
1,05	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	Metro Cuadrado	5,10	52.285,00

1,06	DEMOLICIÓN PAÑETES	Metro Cuadrado	69,06	317.331,00
1,08	DESMONTE APARATO SANITARIO	Unidad	3,00	53.292,00
1,10	DESMONTE DE LUMINARIAS	Unidad	37,00	311.355,00
1,11	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	Metro lineal	15,02	932.667,00
1,14	CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 Km)	Metro Cúbico	105,00	3.507.000,00
2,01	TAPONAMIENTO DE PUNTO SANITARIO	Unidad	4,00	102.080,00
2,02	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Unidad	5,00	219.650,00
3,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	446,29	8.001.533,41
4,02	MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM	Metro Cuadrado	3,61	519.219,00
4,03	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 M	Metro Cuadrado	20,65	1.160.406,00
5,02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	7,25	57.848,00
5,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	73,44	1.737.370,00
5,04	PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ANCHOS MENORES A 0,60 METROS	Metro lineal	11,50	138.776,00
6,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Unidad	3,00	249.666,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Unidad	4,00	696.830,00
7,01	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	256,10	3.237.360,00
7,02	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	134,44	935.837,00

7,03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	Metro Cuadrado	43,86	977.727,00
7,04	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Metro Cuadrado	252,50	3.544.090,00
7,05	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS PARA ANCHOS MENORES A 0,60 METROS	Metro lineal	138,80	1.052.520,00
9,02	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro lineal	18,54	3.595.907,00
10,01	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Metro Cuadrado	122,09	7.332.237,00
11,01	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	Unidad	3,00	401.754,00
11,02	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	Unidad	7,00	1.260.560,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL CUADRADO LED 48 W	Unidad	3,00	619.518,00
12,01	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	753,55	4.066.909,00
13,01	DESMONTE DE POLICARBONATO INCLUYE DESMONTE DE PERFILES ALTURA MAYOR A 4 M	Metro Cuadrado	120,99	1.669.662,00
13,02	LIMPIEZA DE CANALES	Metro lineal	22,72	170.663,00
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARA PISCINA DE PISO 0.305X0.305 CM	Metro Cuadrado	104,50	19.711.417,00
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARED 0.3X0.60CM	Metro Cuadrado	177,66	16.851.051,00
13,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PISOS DE BAÑO 0.40X0.40 CM	Metro Cuadrado	37,57	3.952.364,00
13,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PISOS DE GIMNASIO 0.90X.0.24 CM	Metro Cuadrado	59,26	9.985.073,00
13,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 8 mm ALTA RESISTENCIA CON FILTRO UV INCLUYE CONECTORES HCP	Metro Cuadrado	120,99	19.600.380,00
13,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN LACA PARA MADERA INCLUYE RESANES	Metro Cuadrado	4,58	102.409,00

13,09	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1 1/2'' CON TRES ENTREPAÑOS	Metro lineal	18,58	8.918.400,00
13,1	MEDIA CAÑA EN CONCRETO	Metro lineal	8,52	384.252,00
13,11	PISO EN MADERA SPC CON ESTRUCTURA INCLUYE REMATES DE BORDES	Metro Cuadrado	5,84	1.343.200,00
13,12	GUARDA ESCOBA EN SPC	Metro lineal	81,01	5.265.650,00
13,13	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIÁTICO Y RESANES	Metro Cuadrado	17,16	120.034,00
13,14	GUARDAESCOBA ENCHAPE	Metro lineal	56,70	2.267.988,00
13,15	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal	9,15	561.252,00
13,16	PUERTA EN ALUMINIO 50% ACRILICO Y 50% PERSIANA INCLUYE MARCO	Metro Cuadrado	13,72	12.283.516,00

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS AL 22 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACUMULADO AL 22-02-2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 22-02-2023
CONTRATO DE OBRA No. 394 DE 2022 OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	$ 279.273.656,00	$ 277.238.889,00	99,27%

7.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con el plazo actualizado del contrato de obra, ha trascurrido a la fecha de corte del presente informe, CIENTO VEINTIÚN (121) DIAS CALENDARIO que equivalen a un 100% del tiempo destinado para la ejecución de presupuesto actualizado del contrato de obra.

En relación con la programación de obra remitida por el contratista de obra a la interventoría, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado de obra de 99,27% que equivale a $ 277.238.889,00, en relación con el presupuesto oficial por un valor de $ 279.273.656,00.

8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas del presente contrato de obra:

INFORMACION PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2021					
COMPAÑÍA	POLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	39-40-101037766 ANEXO 1	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	$ 200.000.000,00	12/10/2022	20/12/2022
	39-44-101143254 ANEXO 2	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	$ 125.673.145,20	12/10/2022	12/10/2027

9. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA

9.1 PERSONAL EN OBRA

Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra, hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha mantenido de forma permanente en obra el siguiente personal, debidamente afiliado y al día a los sistemas de seguridad social y parafiscales:

ID	NOMBRES Y APELLIDOS	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO
ADMINISTRATIVOS				
1	Jhon Carlos Camargo	74812787	Director de obra	25/10/2022
2	Jhon Carlos Camargo	74812787	Residente de obra	25/10/2022
3	Hernan Libardo Mora Alcantar	1049637745	Auxiliar	01/11/2022
SUB-CONTRATISTA				
3	Judimar del Valle Bravo Alcala	7454545	Sub-Contratista	01/11/2022
4	Jhoan Wolmer Gonzalez Yendiz	PT 1186597	Ayudante	01/11/2022
5	Ramon Jorge Cabello	PT 7130958	Oficial	01/11/2022
6	Sirio Miguel Gonzalez Sanaz	PT 5948752	Oficial	01/11/2022
7	Johan Bruzual Vargas	PT 1255337	Ayudante	01/11/2022

9.2 EQUIPO Y HERRAMIENTA

Dentro del equipo utilizado por el contratista de obra para la ejecución del proyecto durante el periodo comprendido en el presente informe se relaciona el siguiente:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, MAZOS, MARTILLOS, MACETAS, PUNTEROS, SEGUETA, CARRETILLAS, ETC.)
PULIDORA DE MANO
ANDAMIOS TUBULARES
TALADRO PERCUTOR
ROTOMARTILLOS
NIVEL LASER

10. CONCLUSIONES

- En relación con la programación de obra remitida por el contratista de obra a la interventoría, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado de obra de 99.27%. Este valor de avance se relaciona con el presupuesto del contrato de obra ($ 279.273.656,00)

- Durante el periodo del presente informe se realizó el desmonte de policarbonato, cielo falso, aparatos sanitarios, luminarias, divisiones en vidrio templado; demolición de guardaescoba, enchape cerámico, muros en ladrillo y pañetes; cargue manual de escombros, instalaciones de puntos de desagües, ensamblaje y montaje de estructura metálica, instalación de muros en eterboard y drywall, construcción de pañetes, filos y dilataciones, instalaciones hidráulicas, aplicación de estuco y vinilo a tres manos en muros, instalación de cielo raso, instalación de pisos, guardaescoba, media caña, baranda de acero inoxidable; limpieza de canales y aseo general en las instalaciones intervenidas.

- El proyecto se desarrolló de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas remitidas por la entidad contratante.

- El contratista a la fecha ha cumplido con lo estipulado contractualmente con respecto a las afiliaciones de sus trabajadores a las EPS, ARP, AFP, y parafiscales tal como exige la ley.

- A la fecha del presente informe, el contrato de obra se encuentra en estado vigente y así mismo se da finalización a la ejecución de las actividades de obra por parte del contratista, cumpliendo a cabalidad con el tiempo de ejecución del contrato.

JOHN CARLOS CAMARGO AVILA
R/L ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
Nit. No. 900.505.216-7
CONTRATISTA DE OBRA 894 de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA



FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES


1,01	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE CORTE Y TRASIEGO)

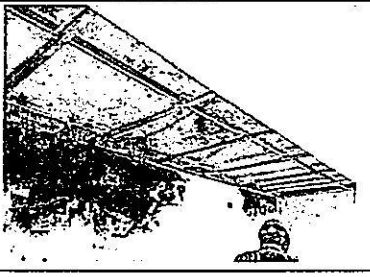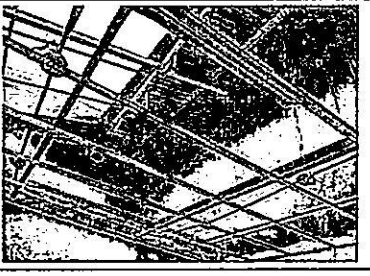REGISTRO FOTOGRÁFICO.


1,02	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO


1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboro	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA



FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

1,05	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.


REGISTRO FOTOGRÁFICO


1,06	DEMOLICIÓN PAÑETES

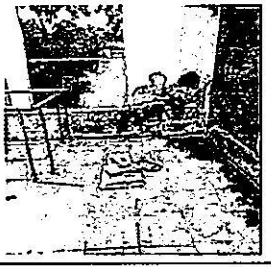
REGISTRO FOTOGRÁFICO





1,08	DESMONTE APARATO SANITARIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA



FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

1,10	DESMONTE DE LUMINARIAS

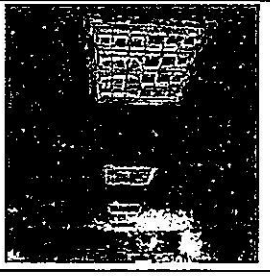REGISTRO FOTOGRÁFICO



1,11	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




1,14	CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 Km)

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA

INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023


ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

2,01	TAPONAMIENTO DE PUNTO SANITARIO


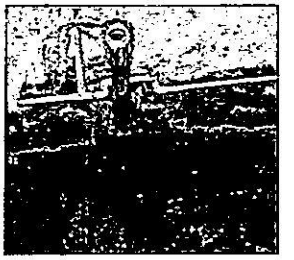
REGISTRO FOTOGRÁFICO







2,02	PUNTO DE DESAGUES D=2"

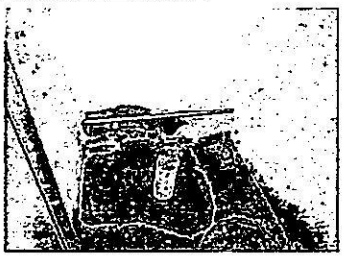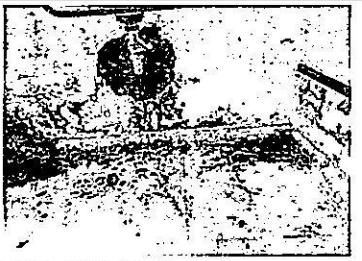REGISTRO FOTOGRÁFICO


3,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

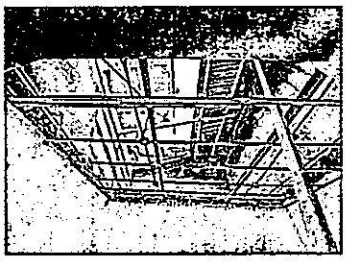
Elaboró
CONTRATISTA

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
R/L JOHN CAMARGO AVILA
Residente de obra

Aprobó
INTERVENTORIA

JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023


ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

4,02	MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM

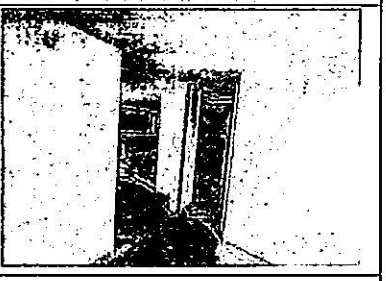REGISTRO FOTOGRÁFICO





4,03	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 M


REGISTRO FOTOGRÁFICO





5,02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Elaboro CONTRATISTA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	Aprobó INTERVENTORIA JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA

INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

5,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3



REGISTRO FOTOGRÁFICO







5,04	PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ANCHOS MENORES A 0,60 METROS

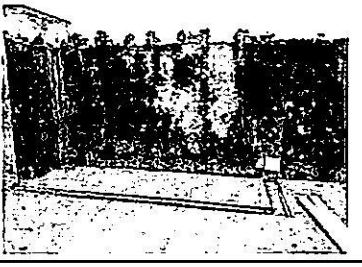REGISTRO FOTOGRÁFICO

6,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
RA. JOHN CAMARGO AVILA	RA. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

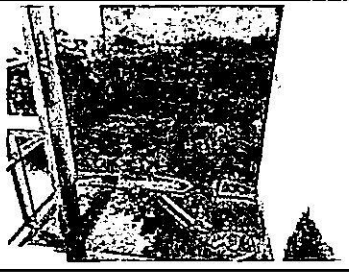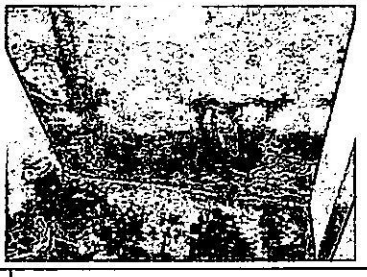ALCA INGENIERIA + DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

7,01	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS


REGISTRO FOTOGRÁFICO





7,02	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elabora	Aprobo
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023


ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

7,03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA

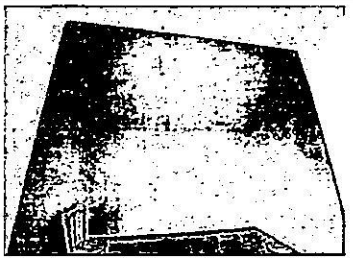
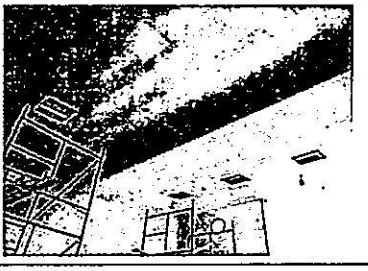
REGISTRO FOTOGRÁFICO






7,04	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

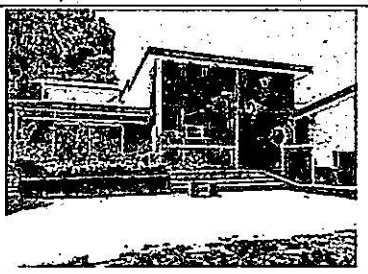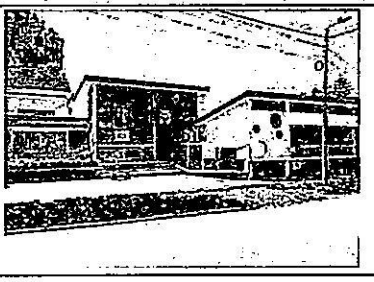
REGISTRO FOTOGRÁFICO

7,05	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS PARA ANCHOS MENORES A 0,60 METROS

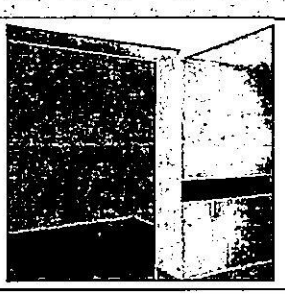REGISTRO FOTOGRÁFICO






Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

9,02	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)

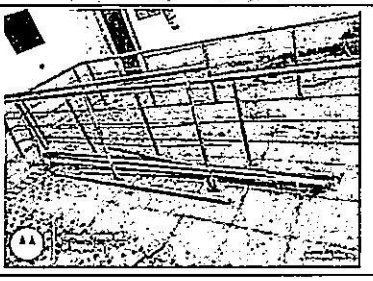
REGISTRO FOTOGRÁFICO




10,01	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

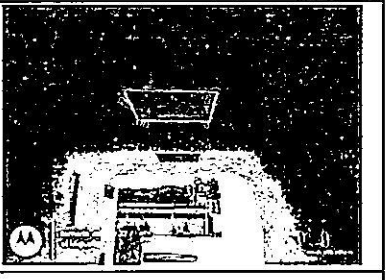REGISTRO FOTOGRÁFICO









11,01	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

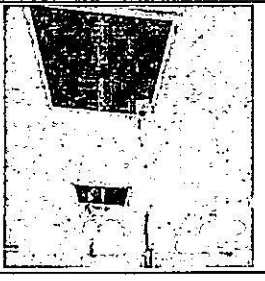REGISTRO FOTOGRÁFICO







Elaboró
CONTRATISTA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
R/L JOHN CAMARGO AVILA
Residente de obra

Aprobó
INTERVENTORIA
JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES


11,02	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL CUADRADO LED 48 W



REGISTRO FOTOGRÁFICO





12,01	ASEO GENERAL ENTREGA

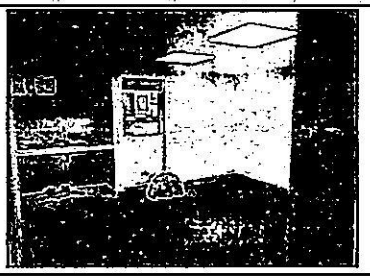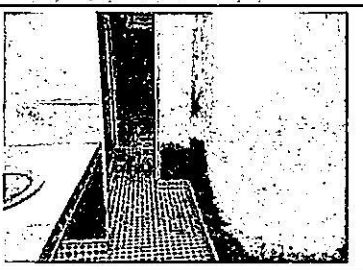REGISTRO FOTOGRÁFICO


Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA



FECHA: 22-02-2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES


13,01	DESMONTE DE POLICARBONATO INCLUYE DESMONTE DE PERFILES ALTURA MAYOR A 4 M

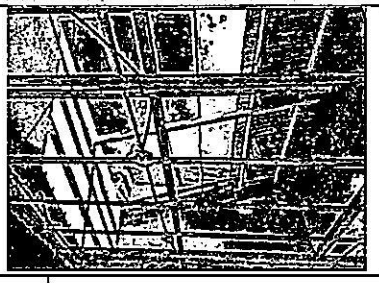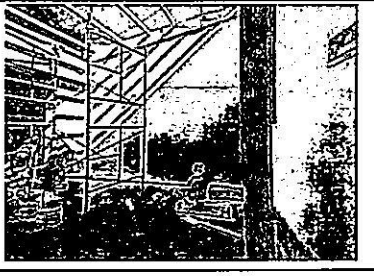
REGISTRO FOTOGRÁFICO


13,02	LIMPIEZA DE CANALES




REGISTRO FOTOGRÁFICO





13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARA PISCINA DE PISO 0.305X0.305 CM

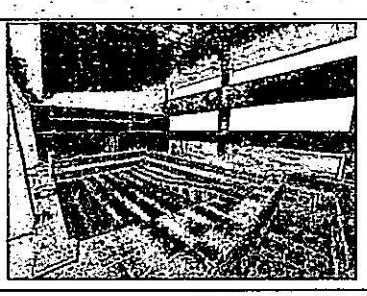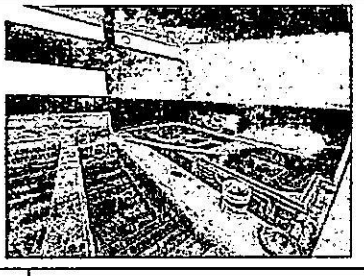REGISTRO FOTOGRÁFICO

Elaboró
CONTRATISTA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
R/L JOHN CAMARGO AVILA
Residente de obra

Aprobó
INTERVENTORIA
JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de Interventoria

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023


ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARED 0.3X0.60CM


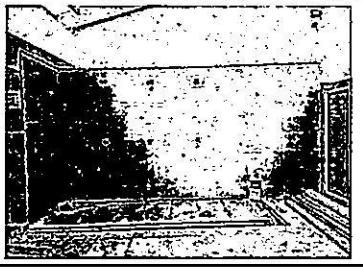
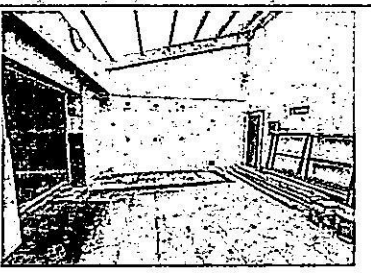
REGISTRO FOTOGRÁFICO








13,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PISOS DE BAÑO 0.40X0.40 CM

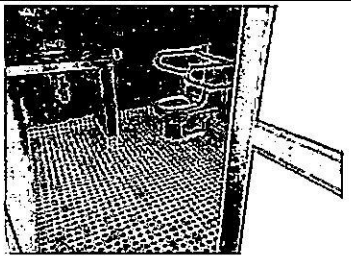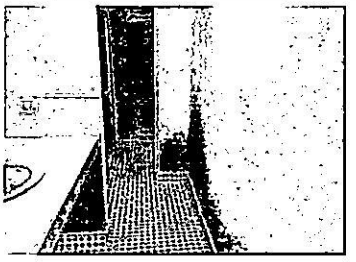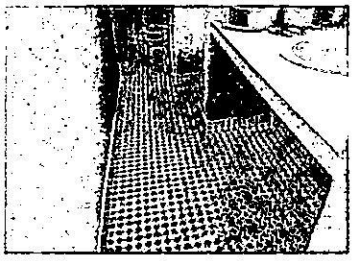REGISTRO FOTOGRÁFICO

13,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PISOS DE GIMNASIO 0.90X.0.24 CM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

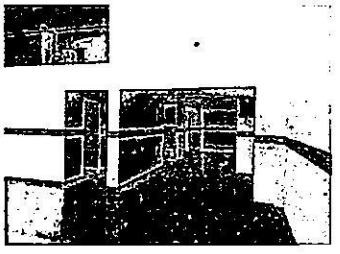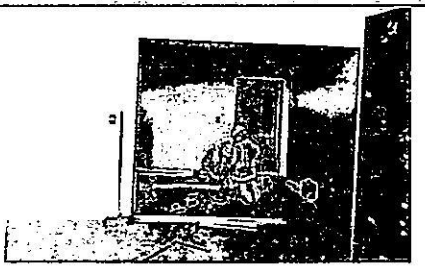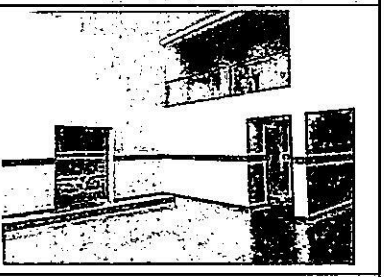ALCA	REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA


FECHA: 22-02-2023


ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

ACTIVIDADES

13,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 8 mm ALTA RESISTENCIA CON FILTRO UV INCLUYE CONECTORES HCP

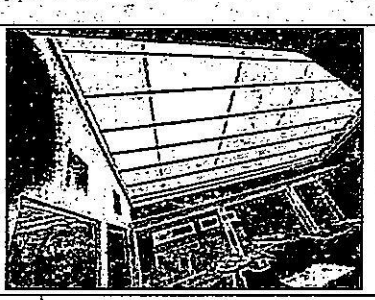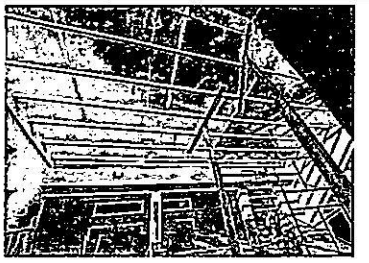
REGISTRO FOTOGRÁFICO





13,09	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1 1/2´´ CON TRES ENTREPAÑOS

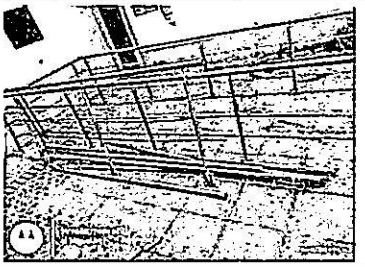REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboro	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de interventoria

BITACORA DE OBRA

Correo Electrónico: alcaingesas@gmail.com

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 06/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE GUARDAESCOBA, ENCHAPE CERAMICO, MUROS EN LADRILLO Y PAÑETES
SE REALIZA CARGUE MANUAL DE MATERIALES SUELTOS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JOHN CAMARGO AVILA	R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 07/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LUMINARIAS
SE REALIZA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DESAGÜES
DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO
SE REALIZA EL TAPONAMIENTO DE PUNTOS SANITARIOS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 08/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE CIELO FALSO
SE REALIZA CARGUE MANUAL DE MATERIALES SUELTOS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JOHN CAMARGO AVILA	R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 09/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA INSTALACIÓN DE MUROS EN ETERBOARD Y DRYWALL
SE INICIA LA INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 10/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R.L. JOHN CAMARGO AVILA	R.L. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 11/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	12:00 p.m
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	12:00 p.m
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	12:00 p.m
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	12:00 p.m
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	12:00 p.m
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	12:00 p.m
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	12:00 p.m

ACTIVIDADES

SE REALIZAN LAS SALIDAS PARA LAMPARAS TIPO PANEL Y TOMAS
SE APLICA ESTUCO BAJO PLACA Y EN MUROS
SE REALIZAN FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboro	Aprobo
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R.L JOHN CAMARGO AVILA	R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 13/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07.00AM	17.00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07.00AM	17.00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07.00AM	17.00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07.00AM	17.00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07.00AM	17.00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07.00AM	17.00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07.00AM	17.00 PM

ACTIVIDADES

SE APLICA VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA Y EN MUROS
SE INICIA LA REALIZACION DE PAÑETES, PAÑETES IMPERMEABLIZADOS, FILOS Y DILATACIONES

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R/L JOHN CAMARGO AVILA	R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 14/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON LA REALIZACIÓN DE PAÑETES, PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, FILOS Y DILATACIONES.
SE APLICA VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA Y EN MUROS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 15/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA DESMONTE DE POLICARBONATO Y PERFILES
SE REALIZA ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO CON FILTRO
SE REALIZA LIMPIEZA DE CANALES

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 16/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SERIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PISCINA Y BAÑOS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R.L. JOHN CAMARGO AVILA	R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 17/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07.00AM	17.00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07.00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07.00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07.00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07.00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN EL PISO DEL GIMNASIO Y ALGUNAS PAREDES CERCANAS A LA ZONA DE PISCINA
SE INSTALA GUARDAESCOBA EN ENCHAPE Y SPC
SE REALIZA INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y PERSIANA

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 18/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	18:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	18:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	18:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	18:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	18:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	18:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	18:00 PM

ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL
SE REALIZA MEDIA CAÑA EN CONCRETO Y BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO
SE REALIZA INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SPC
SE REALIZA LAVADA DE FACHADA Y RESANES

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIVA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

ALCA
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 20/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM
RAMON JORGE CABELLO	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
SIRIO MIGUEL GONZALEZ SANAZ	OFICIAL	07:00AM	17:00 PM
JOHAN BRUZUAL VARGAS	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE APLICA PINTURA EN FACHADA CON VINILO PARA EXTERIORES
SE REALIZAN RESANES Y APLIQUE DE PINTURAS EN LACA PARA MADERA

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMINETA MENOR

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R/L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R/L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.

BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 21/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE INSTALA BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA Y BARANDA EN ACERO INOXIDABLE
SE INICIA ASEO GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

HERRAMIENTA UTILIZADA

HERRAMIENTA MENOR, INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES
R.L. JOHN CAMARGO AVILA	R.L. JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra	Residente de Interventoria

ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.	BITACORA - DIARIA

OBJETO DE CONTRATO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO BIOMEDICO PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPEUTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

FECHA: 22/02/2023

ELABORADO POR: JOHN CAMARGO AVILA

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JOHN CAMARGO AVILA	ENCARGADO	07:00AM	17:00 PM
HERNAN LIBARDO MORA ALCANTAR	AUXILIAR	07:00AM	17:00 PM
JUDIMAR DEL VALLE BRAVO ALCALA	SUB-CONTRATISTA	07:00AM	17:00 PM
JHOAN WOLMER GONZALEZ YENDIZ	AYUDANTE	07:00AM	17:00 PM

ACTIVIDADES

SE REALIZA ASEO GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

HERRAMIENTA UTILIZADA

INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO

ESTADO CLIMÁTICO

BUEN ESTADO DE CLIMA NO AFECTA ACTIVIDADES INTERNAS

Observaciones

Elaboró	Aprobó
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S R.L JOHN CAMARGO AVILA Residente de obra	JDS DAVID SARMIENTO CONSTRUCCIONES R.L JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de Interventoria

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	TRV 5 N 66-12	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914839645	9446829684	E	2023/02/06	2023/02/13	BANCO DE BOGOTA	7	$3,960,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ext	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CENTRO (5 Afiliados)																						$13,260,000	$2,121,600			$13,260,000	$530,400			$13,260,000	$530,400			$13,260,000		$745,100			$0	$0		$3,927,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$110,400			$2,760,000	$110,400			$2,760,000		$14,500			$0	$0		$676,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$110,400			$2,760,000	$110,400			$2,760,000		$14,500			$0	$0		$676,900
1	CC	33368906	MARTINEZ YANQUEN YULI MILENA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF10	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
2	CC	1052412904	SACHICA LOZANO LUIS ALEJANDRO							x											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																						$10,500,000	$1,680,000			$10,500,000	$420,000			$10,500,000	$420,000			$10,500,000		$730,800			$0	$0		$3,250,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																						$10,500,000	$1,680,000			$10,500,000	$420,000			$10,500,000	$420,000			$10,500,000		$730,800			$0	$0		$3,250,800
3	CC	1049642802	ALCANTAR SALAZAR HEIDI KATHERINE																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
4	CC	1049619205	ALCANTAR SALAZAR JULIAN DANIEL																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
5	CC	74812787	CAMARGO AVILA JHON CARLOS																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
Total Afiliados(5)																						$13,260,000	$2,121,600			$13,260,000	$530,400			$13,260,000	$530,400			$13,260,000		$745,100			$0	$0		$3,927,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	TRV 5 N 66-12	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914839645	9446829684	E	2023/02/06	2023/02/13	BANCO DE BOGOTA	7	$3,960,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,121,600	$17,800	$0	$2,139,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,600	$0	$187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$896,000	$7,500	$0	$903,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,040,000	$8,700	$0	$1,048,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$745,300	$6,200	$0	$751,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$745,300	$6,200	$0	$751,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$530,400	$4,400	$0	$534,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$530,400	$4,400	$0	$534,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$530,400	$4,600	$0	$535,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,000	$600	$0	$64,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$146,400	$1,300	$0	$147,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$320,000	$2,700	$0	$322,700
TOTALES				5	$3,927,700	$33,000	$0	$3,960,700
