DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	4	
FECHA DEL ACTA	11/08/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 - 26/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4
	C.C./NIT	901662105
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
	C.C./NIT	1098662022
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
	C.C./NIT:	810002747
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.165.900.979,00	
VALOR ADICIONADO	$ 926.864.974,19	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 649.770.293,70	
CDP	NÚMERO:	6597, 1518
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	6042, 6015
	FECHA:	19/07/2023, 18/07/2023
RP	NÚMERO:	12535, 1126
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9112, 9120
	FECHA:	27/07/2023, 27/07/2023
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización	23/08/2023
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SIETE (7) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	27/07/2023	$ 926.864.974,19	$ 3.092.765.953,19

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 649.770.293,70
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 649.770.293,70

		INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	$ 649.770.293,70
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	$ 300.000.000,00
			96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	$ 216.590.097,90
			96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	$ 216.590.097,90
			96-44-101178227-3	24/01/2023	24/08/2026	$ 309.276.595,32
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2025	$ 618.553.190,64
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	$ 618.553.190,64
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2028	$ 618.553.190,64
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		GASTOS MEDICOS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023, 17/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023, 09/08/2023, 09/08/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/06/2023
	HASTA: 30/06/2023
VALOR A COBRAR	$ 150.654.513,00
ANTICIPO AMORTIZADO	30.00 % Valor a amortizar: $ 45.196.353,90

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Junio	07/07/2023	9453363631	$ 38.878.676,00
Junio	07/07/2023	9453096101	$ 1.160.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.602.600,00	**VR PAGADO $** 6.221.400,00	**VR PAGADO $** 2.638.400,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra LINA MARCELA SABOGAL quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO V4, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 4	$ 150.654.513,00
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 45.196.353,90
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 105.458.159,10

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300384320	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300384320	$ 390,00

6. RP # 00001126 Valor a gastar: $150.654.513,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 11 de Agosto de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventor

Contratista

LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
RL- CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ
Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO
Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACHE
Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA

CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 04 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 04 del contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022			
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	2.3.2.02.02 .005 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.165.900.979,00			
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70			
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	$ 926.864.974,19			
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	-			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 3.092.765.953,19			
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70			
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES			
PLAZO ADICIONAL No1:	-			
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	SIETE (7) MESES			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE C.C. 1.098.662.022			
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437			
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN - - - -	-	-	-	-
ACTA DE REINICIACIÓN - - - -	-	-	-	-
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-			
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	09/08/2023 ADICIONAL 01	
N° DE CDP Y FECHA	00006597 29/09/2022 INICIAL	00001518 22/01/2023 RESERVA	00006042 19/07/2023 INICIAL	00006015 18/07/2023 INICIAL
VALOR DE CDP	$ 13.883.717.658,77	$ 2.165.900.979,00	$ 886.864.974,19	$40.000.000,00
N° DE RP Y FECHA	00012535 27/12/2022 INICIAL	0001126 22/01/2023 RESERVA	00009112 27/07/2023 INICIAL	00009120 27/07/2023 INICIAL

VALOR DE RP	$ 2.165.900.979,00	$ 2.165.900.979,00	$ 886.864.974,19	$40.000.000,00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	-	00001126 22/01/2023	-	
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO			

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) de junio de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los ocho (08) días del mes de Agosto de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 4

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO			
ACTA No.	4			
FECHA DEL ACTA	08/08/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA			
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA			
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3			
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4		
	C.C	901.662.105-3		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE		
	C.C	1.098.662.022		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS		
	C.C	810.002.747-0		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.165.900.979,00	APORTE MUNICIPIO	NA	
		APORTE CONVENIDO	NA	
VALOR ADICIONADO 01	$ 926.864.974,19	APORTE MUNICIPIO	NA	
		APORTE CONVENIDO	NA	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 649.770.293,70			
CDP	NÚMERO: 00006597	NÚMERO: 00001518		
	FECHA: 29/09/2022	FECHA: 22/01/2023		
CDP ADICIONAL 01	NÚMERO: 00006042	NÚMERO: 00006015		
	FECHA: 19/07/2023	FECHA: 18/07/2023		
RP	NÚMERO: 00012535	NÚMERO: 00001126		
	FECHA: 27/12/2022	FECHA: 22/01/2023		
RP ADICIONAL 01	NÚMERO: 00009112	NÚMERO: 00009120		
	FECHA: 27/07/2023	FECHA: 27/07/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023		
	Fecha de Finalización:	23/08/2023		
	Nueva fecha de terminación:	-		
	Duración:	7 MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	-	-	-	-
Prórrogas	-	-	-	-

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	01	27/07/2023	$ 926.864.974,19	$ 3.092.765.953,19

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosi/ Aclaraciones	-	-	-

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$433.180.195,80
		96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	$618.553.190,64
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$649.770.293,70
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$649.770.293,70
		96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	$649.770.293,70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	$216.590.097,90
		96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	$216.590.097,90
		96-44-101178227-3	24/01/2023	24/08/2026	$309.276.595,32
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	$433.180.195,80
		96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2028	$618.553.190,64
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	$433.180.195,80
		96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2025	$618.553.190,64
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	$300.000.000,00
		96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	$348.000.000,00
		96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	$348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		
	Principal	17/01/2023
	Acta de Inicio	17/02/2023
	Adicional 01	09/08/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01/06/2023
	HASTA: 30/06/2023
VALOR A COBRAR (Contrato)	$150.654.513,00
ANTICIPO AMORTIZADO	$ 45.196.353,90

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2023	07/07/2023 07/07/2023	9453363631 9453096101	$38.878.676 $1.160.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
ASMET SALUD EPS SAS COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR MUTUAL SER NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION	POSITIVA ARL
VR PAGADO	**VR PAGADO**	**VR PAGADO**
$1.556.200 $46.400	$6.035.800 $185.600	$2.632.300 $6.100

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS en calidad de Interventor, y por la otra LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO ALUMBRADO V4 en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. CONSORCIO ALUMBRADO V4 acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas relacionadas.
3. CONSORCIO ALUMBRADO V4 ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 413 DE 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.
4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$150.654.513,00
Valor IVA:	N/A
Menos amortización del anticipo	$45.196.353,90
Valor bruto ejecutado a pagar	$105.458.159,10

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300384320	$ 3900
ORDENANZA	2502300384320	$ 390

6. RP # 00001126 Valor a gastar: $150.654.513,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el ocho (08) de Agosto de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventoría

Contratista

LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
RL- CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboro. Ing. Luis Alfredo Bedoya – Director de Interventoría
VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Ing. John Fernando Larrotta Peñaloza – Supervisor Alumbrado Publico

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300384320

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Fecha de Expedición 2023/07/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/27

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016621053
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230038432O(3900)000000000429O(96)20230727

0058147402
1052260894

Pagado Electronicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502300384320**

0058147402
1052260894

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9016621053
Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO V
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502300384320**

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar **$4.290**

Fecha de Expedición 2023/07/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/27

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	**$3.900**
Ordenanza 012	$390

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502300384320**

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016621053
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230038432O(3900)000000000390O(96)20230727

Fecha de Expedición 2023/07/21
Fecha Limite de Pago 2023/07/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502300384320**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016621053
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 2023/07/21

Total a Pagar **$4.290**

(415)8902012356005(8020)0250230038432O(3900)000000000390O(96)20230727

(415)8902012356006(8020)0250230038432O(3900)000000000039O(96)20230727

PRO HOSPITAL $3.900

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$3.900**
Ordenanza 012	$390

Alcaldía de Bucaramanga	**REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL**	Código: F-GDI-5200-238,37-001 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Diciembre- 13- 2022 Página 1

EMPRESA :	CONSORCIO ALUMBRADO V4	**PERIODO:**	JUNIO	**CONTRATO:**	413-2022

N	PROFESIONAL	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL DIAS	TIEMPO PRESENTADO	CARGO	NO. PLANILLA	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
1	Cristian Mateus Acevedo	6/7	30	50%	Director	9453363631	$ 3,700,000	$ 148,000	$ 592,000	$ 257,600	$ 148,000	07/07/2023	$ 1,145,600
2	Claudia Mendoza Lopez	6/7	30	50%	Social	9453363631	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 240,000	$ 104,400	$ 60,000	07/07/2023	$ 464,400
3	Javier Francisco Mora	6/7	30	100%	HSEQ	9453363631	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 400,000	$ 174,000	$ 100,000	07/07/2023	$ 774,000
4	Sergio Andres Nitola	6/7	30	100%	Electrico	9453363631	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 400,000	$ 174,000	$ 100,000	07/07/2023	$ 774,000
5	Carlos Andres Vega	6/7	30	50%	Civil	9453363631	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 240,000	$ 104,400	$ 60,000	07/07/2023	$ 464,400
6	Erika Yadira Suarez	6/7	30	100%	Control Trafico	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
7	Diana Zuleivy Lopez	6/7	30	100%	Control Trafico	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
8	Liliana Zobeida Salcedo	6/7	24	100%	Control Trafico	9453363631	$ 928,000	$ 37,200	$ 148,500	$ 64,600	$ 37,200	07/07/2023	$ 287,500
9	Hector Rangel Aldana	6/7	1	100%	Almacenista	9453363631	$ 38,667	$ 1,600	$ 6,200	$ 2,700	$ 1,600	07/07/2023	$ 12,100
10	Mario Acevedo Jaimes	6/7	30	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 173,600
11	Esneider Rincon Laguna	6/7	30	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
12	Edinson Jair Sanchez	6/7	13	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 502,667	$ 20,200	$ 80,500	$ 35,000	$ 20,200	07/07/2023	$ 155,900
13	Jean Carlos Chirino	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
14	Jairo Fidel Cuadros M	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
15	Alvaro Laguna Palomino	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
16	Dulis Rincon Martinez	6/7	20	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 773,334	$ 31,000	$ 123,800	$ 53,900	$ 31,000	07/07/2023	$ 239,700
17	Wilmer Alexis Sandoval	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
18	Edgar Parra Gomez	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
19	Yobany Ascanio Vargas	6/7	11	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 425,334	$ 17,100	$ 68,100	$ 29,700	$ 17,100	07/07/2023	$ 132,000
20	Jhonathan Cardenas	6/7	11	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 425,334	$ 17,100	$ 68,100	$ 29,700	$ 17,100	07/07/2023	$ 132,000
21	Jose Nicolas Sanchez G	6/7	17	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 657,334	$ 26,300	$ 105,200	$ 45,800	$ 26,300	07/07/2023	$ 203,600
22	Eugenio Mejia Ramirez	6/7	25	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 966,667	$ 38,700	$ 154,700	$ 67,300	$ 38,700	07/07/2023	$ 299,400
23	Eulogio Suarez Agredo	6/7	11	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 425,334	$ 17,100	$ 68,100	$ 29,700	$ 17,100	07/07/2023	$ 132,000
24	Nerio Omar Chacon	6/7	28	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,082,667	$ 43,400	$ 173,300	$ 0	$ 0	07/07/2023	$ 216,700
	Nerio Omar Chacon	6/7	2	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 77,334	$ 3,100	$ 12,400	$ 5,400	$ 3,100	07/07/2023	$ 24,000
25	Javier Antonio Crespo P	6/7	20	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 773,334	$ 31,000	$ 123,800	$ 53,900	$ 31,000	07/07/2023	$ 239,700
26	Jorge Luis Dita Noriega	6/7	25	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 966,667	$ 38,700	$ 154,700	$ 67,300	$ 38,700	07/07/2023	$ 299,400
27	Josan Humberto Luna C	6/7	26	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 1,005,334	$ 40,300	$ 160,900	$ 70,000	$ 40,300	07/07/2023	$ 311,500
28	Jaider Pacheco Martinez	6/7	30	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
29	Yeider Pacheco Florez	6/7	17	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 657,334	$ 26,300	$ 105,200	$ 45,800	$ 26,300	07/07/2023	$ 203,600
30	Samuel David Avednaño	6/7	5	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 193,334	$ 7,800	$ 31,000	$ 13,500	$ 7,800	07/07/2023	$ 60,100
31	Yonatan Ariel Avendaño	6/7	5	100%	Auxiliar Obra	9453363631	$ 193,334	$ 7,800	$ 31,000	$ 13,500	$ 7,800	07/07/2023	$ 60,100
32	Jose Alberto Lizarazo	6/7	30	100%	Oficial Obra	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
33	Alejandro Fuentes Tinoco	6/7	30	100%	Ofic. Electrico	9453363631	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 208,000	$ 90,500	$ 52,000	07/07/2023	$ 402,500
34	Ronald Rodriguez	6/7	30	100%	Ofic. Electrico	9453363631	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 224,000	$ 97,500	$ 56,000	07/07/2023	$ 433,500
35	Rolando Moreno	6/7	10	100%	Ofic. Electrico	9453363631	$ 466,667	$ 18,700	$ 74,700	$ 32,500	$ 18,700	07/07/2023	$ 144,600
36	Maicol Brokate	6/7	30	100%	Aux. Electrico	9453363631	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 80,800	$ 46,400	07/07/2023	$ 359,200
TOTAL							**$ 38,878,676**	**$ 1,556,200**	**$ 6,035,800**	**$ 2,632,300**	**$ 1,512,800**		**$ 11,737,100**

Alcaldía de Bucaramanga	**REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL**	Código: F-GDI-5200-238,37-001 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Diciembre- 13- 2022 Página 2

EMPRESA :	CONSORCIO ALUMBRADO V4	**PERIODO:**	JUNIO	**CONTRATO:**	413-2022

N	PROFESIONAL	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL DIAS	TIEMPO PRESENTADO	CARGO	NO. PLANILLA	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
1	Carlos Cardozo	6/7	30	100%	Archivo	9453096101	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 185,600	$ 6,100	$ 46,400	07/07/2023	$ 284,500
TOTAL							**$ 1,160,000**	**$ 46,400**	**$ 185,600**	**$ 6,100**	**$ 46,400**		**$ 284,500**

	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	
TOTALES	**$ 40,038,676**	**$ 1,602,600**	**$ 6,221,400**	**$ 2,638,400**	**$ 1,559,200**	**$ 12,021,600**

Ing. Francisco Mora Tamayo
Profesional HSEQ
CONSORCIO ALUMBRADO V4

Ing. Andry Julieth Rodriguez
Profesional HSEQ
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	32578098	9453363631	E	2023/07/05	2023/07/07	BANCOLOMBIA	2	$11,765,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL PROFESIONAL (6 Afiliados)																						$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,024,900
Centro de Trabajo: PERSONAL PROFESIONAL (6 Afiliados)																						$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,024,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																						$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,024,900
1	CC	1216971535	FUENTES TINOCO ALEJANDRO JUNIOR																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	91232278	MATEUS ACEVEDO CRISTIAN																		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF40	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$0	$0	Si	$1,145,600
3	CC	37841476	MENDOZA LOPEZ CLAUDIA PATRICIA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
4	CC	91532849	MORA TAMAYO JAVIER FRANCISCO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1098771455	NITOLA MARTINEZ SERGIO ANDRES																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1098774743	VEGA PEREZ CARLOS ANDRES																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL OPERATIVO (14 Afiliados)																						$11,136,004	$1,782,100			$12,296,004	$492,300			$12,296,004	$492,300			$12,296,004		$856,700		$0	$0		$3,623,400
Centro de Trabajo: PERSONAL OPERATIVO (14 Afiliados)																						$11,136,004	$1,782,100			$12,296,004	$492,300			$12,296,004	$492,300			$12,296,004		$856,700		$0	$0		$3,623,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)																						$11,136,004	$1,782,100			$12,296,004	$492,300			$12,296,004	$492,300			$12,296,004		$856,700		$0	$0		$3,623,400
7	CC	13885048	ACEVEDO JAIMES MARIO																			0	$0	$0	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
8	CC	13141077	ASCANIO VARGAS YOBANY	X																	23030 1	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF40	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
9	CC	1005327809	CARDENAS BASTO JHONATAN ALEXANDER	X	X																23030 1	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF40	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
10	PT	6054315	CHIRINO OLARA JEAN CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1005150353	CUADROS MERCADO JAIRO FIDEL																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1098633835	GONZALEZ SANCHEZ JOSE NICOLAS	X																	23030 1	17	$657,334	$105,200	EPS017	17	$657,334	$26,300	CCF40	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
13	CC	85168927	LAGUNA PALOMINO ALVARO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	91320655	MEJIA RAMIREZ EUGENIO	X																	25-14	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF40	25	$966,667	$38,700	14-23	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	Si	$299,400
15	CC	91247143	PARRA GOMEZ EDGAR																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	85166717	RINCON MARTINEZ DULIS		X																23030 1	20	$773,334	$123,800	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
17	CC	1007572304	RINCON LAGUNA ESNEIDER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	13872074	SANCHEZ CORDOBA EDINSON JAIR		X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF40	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
19	PT	1992175	SANDOVAL ARMARIO WILMER ALEXIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	1088603161	SUAREZ AGREDO EULOGIO	X																	23030 1	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF40	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000

2023/07/07 07:17 AM

en línea

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL ELECTRICISTA (3 Afiliados)																						$3,026,667	$484,300			$3,026,667	$121,100			$3,026,667	$121,100			$3,026,667		$210,800		$0	$0		$937,300
Centro de Trabajo: PERSONAL ELECTRICISTA (3 Afiliados)																						$3,026,667	$484,300			$3,026,667	$121,100			$3,026,667	$121,100			$3,026,667		$210,800		$0	$0		$937,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$3,026,667	$484,300			$3,026,667	$121,100			$3,026,667	$121,100			$3,026,667		$210,800		$0	$0		$937,300
21	CC	1005178251	BROKATE BLANCO MAICOL STEVEN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	91506174	MORENO VEGA ROLANDO		X															23030 1	10	$466,667	$74,700	EPS010	10	$466,667	$18,700	CCF40	10	$466,667	$18,700	14-23	10	$466,667	6.960%	$32,500	10	$0	$0	SI	$144,600
23	CC	1098694691	RODRIGUEZ MENDEZ RONALD ALEXIS																	23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL CIVIL GLORIETA (9 Afiliados)																						$7,269,338	$1,163,500			$7,269,338	$291,200			$6,186,671	$247,800			$7,269,338		$431,000		$0	$0		$2,133,500
Centro de Trabajo: PERSONAL CIVIL GLORIETA (9 Afiliados)																						$7,269,338	$1,163,500			$7,269,338	$291,200			$6,186,671	$247,800			$7,269,338		$431,000		$0	$0		$2,133,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																						$7,269,338	$1,163,500			$7,269,338	$291,200			$6,186,671	$247,800			$7,269,338		$431,000		$0	$0		$2,133,500
24	CC	13748195	AVENDAÑO DIAZ SAMUEL DAVID	X																23020 1	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
25	CC	1098714150	AVENDAÑO DIAZ YONATAN ARIEL	X																23020 1	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
26	PT	6868769	CHACON PEREZ NERIO OMAR																	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF40	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
27	PT	6868769	CHACON PEREZ NERIO OMAR																X	23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS017	28	$1,082,667	$43,400	CCF40	0	$0	$0	14-23	28	$1,082,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$216,700
28	PT	5836252	CRESPO PATIÑO JAVIER ANTONIO	X	X															23030 1	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
29	CC	1064709908	DITA NORIEGA JORGE LUIS	X																23030 1	25	$966,667	$154,700	ESSC24	25	$966,667	$38,700	CCF40	25	$966,667	$38,700	14-23	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	SI	$299,400
30	CC	91285078	LIZARAZO PARADA JOSE ALBERTO																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
31	PT	7109218	LUNA CACERES JOSAN HUMBERTO	X																23030 1	26	$1,005,334	$160,900	ESSC24	26	$1,005,334	$40,300	CCF40	26	$1,005,334	$40,300	14-23	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
32	CC	1192717227	PACHECO MARTINEZ JAIDER JUNIOR																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
33	CC	1081906552	PACHECO FLOREZ YEIDER DE JESUS		X															23030 1	17	$657,334	$105,200	ESSC07	17	$657,334	$26,300	CCF40	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	SI	$203,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PMT Y ALMACENISTA (4 Afiliados)																						$3,286,667	$525,900			$3,286,667	$131,600			$3,286,667	$131,600			$3,286,667		$228,900		$0	$0		$1,018,000
Centro de Trabajo: PMT Y ALMACENISTA (4 Afiliados)																						$3,286,667	$525,900			$3,286,667	$131,600			$3,286,667	$131,600			$3,286,667		$228,900		$0	$0		$1,018,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$3,286,667	$525,900			$3,286,667	$131,600			$3,286,667	$131,600			$3,286,667		$228,900		$0	$0		$1,018,000
34	CC	1232891821	LOPEZ GRATERON DIANA ZULEIVY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
35	CC	1085048523	RANGEL ALDANA HECTOR MANUEL		X															23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF40	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
36	PT	5447938	SALCEDO MERIÑO LILIANA ZOBEIDA	X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF40	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$287,500
37	CC	37901186	SUAREZ GALVIS ERIKA YADIRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total			**Afiliados(36)**																			$37,718,676	$6,035,800			$38,878,676	$1,556,200			$37,796,009	$1,512,800			$38,878,676		$2,632,300		$0	$0		$11,737,100

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	32578098	9453363631	E	2023/07/05	2023/07/07	BANCOLOMBIA	2	$11,765,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				35	$6,035,800	$14,000	$0	$6,049,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$525,900	$1,300	$0	$527,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$4,651,100	$10,700	$0	$4,661,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$858,800	$2,000	$0	$860,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,632,300	$6,100	$0	$2,638,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$2,632,300	$6,100	$0	$2,638,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,512,800	$3,500	$0	$1,516,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	36	$1,512,800	$3,500	$0	$1,516,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				36	$1,556,200	$4,300	$0	$1,560,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$179,600	$500	$0	$180,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$20,300	$100	$0	$20,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$149,900	$400	$0	$150,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$26,300	$100	$0	$26,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$174,500	$500	$0	$175,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$263,000	$700	$0	$263,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$270,500	$700	$0	$271,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$379,300	$900	$0	$380,200
TOTAL				**36**	**$11,737,100**	**$27,900**	**$0**	**$11,765,000**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	32858032	9453096101	E	2023/07/21	2023/07/07	BANCOLOMBIA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096233770	CARDOZO CARLOS																		Z5-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$284,500

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	32858032	9453096101	E	2023/07/21	2023/07/07	BANCOLOMBIA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 2 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL 4

OBJETO: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 2.165.900.979,00	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTA ACTA (%	6,96%

Fecha presente Acta: 30 de Junio de 2023

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT	VALOR PARCIAL
CAPITULO 1 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																
	1,01	Demolición de caja de inspección. Incluye relleno, retiro y disposicion final de escombros.	UND	56,00	$ 63.571,00	$ 3.559.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,02	Retiro de postes metálicos existentes. Incluye demolición de base y cimentacion en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio.	UND	48,00	$ 65.496,00	$ 3.143.808,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,03	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de acometidas aérea /subterránea en cualquier calibre.	UND	4800,00	$ 1.208,00	$ 5.798.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,04	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.	UND	125,00	$ 64.248,00	$ 8.031.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 1						$ 20.533.184,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 2 SUBESTACION																
	2,01	Suministro, transporte e instalación de transformador monofásico 200VA, 110-220-440 V.	UND	1,00	$ 3.909.184,00	$ 3.909.184,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 2						$ 3.909.184,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 3 CANALIZACION																
	3,01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	103,00	$ 320.368,00	$ 32.997.904,00	18,00	$ 5.766.624,00	0,00	$ 0,00	49,00	$ 15.698.032,00	36,00	$ 11.533.248,00	103,00	$ 32.997.904,00
	3,02	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	305,00	$ 22.637,00	$ 6.904.285,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	98,80	$ 2.236.535,60	0,00	$ 0,00	98,80	$ 2.236.535,60
	3,03	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	33,00	$ 60.924,00	$ 2.010.492,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,04	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 3x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	23,00	$ 80.494,00	$ 1.851.362,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,05	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	358,00	$ 594.407,00	$ 212.797.706,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 10.699.326,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 10.699.326,00

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT	VALOR PARCIAL
	3,06	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	454,00	$ 100.063,00	$ 45.428.602,00	0,00	$ 0,00	82,40	$ 8.245.191,20	181,20	$ 18.131.415,60	0,00	$ 0,00	263,60	$ 26.376.606,80
	3,07	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	430,00	$ 741.283,00	$ 318.751.690,00	59,50	$ 44.106.338,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	59,50	$ 44.106.338,50
	3,08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	600,00	$ 119.633,00	$ 71.779.800,00	0,00	$ 0,00	221,90	$ 26.546.562,70	61,70	$ 7.381.356,10	0,00	$ 0,00	283,60	$ 33.927.918,80
TOTAL CAPITULO 3						$ 692.521.841,00		$ 49.872.962,50		$ 45.491.079,90		$ 43.447.339,30		$ 11.533.248,00		$ 150.344.629,70
CAPITULO 4 ESTRUCTURAS																
	4,01	Suministro, transporte e instalación de caja de inspeccion de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Inlcuye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metalico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalizacion RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND	86,00	$ 1.434.988,00	$ 123.408.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4,02	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	UND	620,00	$ 51.193,00	$ 31.739.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4,03	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra compuesto por un electrodo tipo varilla de 2,4m x 5/8" y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico	UND	13,00	$ 490.741,00	$ 6.379.633,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 4						$ 161.528.261,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 5 REDES																
	5,01	Suministro,transporte e instalación de red canalizada en 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	1500,00	$ 19.271,00	$ 28.906.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,02	Suministro,transporte e instalación de red canalizada en 3 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	5100,00	$ 26.829,00	$ 136.827.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	ML	3700,00	$ 18.582,00	$ 68.753.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	907,50	$ 16.863.165,00	907,50	$ 16.863.165,00
TOTAL CAPITULO 5						$ 234.487.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 16.863.165,00		$ 16.863.165,00
CAPITULO 6 SALIDAS																
	6.01	Suministro, transporte e instalación de luminaria DECO LIRA 60 W - 32 LEDS, 8460 Lm, CCT 4000 K, 373 mA, CRI 70. CL I. Incluye soporte top post en aluminio inyectado, sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Negro Mate RAL 9005	UND	12,00	$ 5.732.623,00	$ 68.791.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND	137,00	$ 1.945.229,00	$ 266.496.373,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 97.261.450,00	50,00	$ 97.261.450,00
TOTAL CAPITULO 6						$ 335.287.849,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 97.261.450,00		$ 97.261.450,00
CAPITULO 7 POSTES																

		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT	VALOR PARCIAL
	7,01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 4.5 m de altura total, niple dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad , Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Horneado doble Laca mate y 50cm de pintura epóxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP DECO LIRA.Incluye Canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28,07Kg aprox.	UND	12,00	$ 1.491.880,00	$ 17.902.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 17.902.560,00	12,00	$ 17.902.560,00
	7,02	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 4"/3" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47,17Kg.	UND	6,00	$ 4.250.873,00	$ 25.505.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 25.505.238,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 25.505.238,00
	7,03	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 6"/ 2 1/2" Brazo Doble curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 202,90 Kg.	UND	39,00	$ 6.637.808,00	$ 258.874.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93,94Kg.	UND	15,00	$ 3.547.045,00	$ 53.205.675,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.094.090,00	2,00	$ 7.094.090,00
TOTAL CAPITULO 7						$ 355.487.985,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 25.505.238,00		$ 24.996.650,00		$ 50.501.888,00
CAPITULO 8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS																
	8,01	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	1577,00	$ 2.112,00	$ 3.330.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,02	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	87,00	$ 72.911,00	$ 6.343.257,00	76,67	$ 5.590.086,37	0,00	$ 0,00	8,60	$ 627.034,60	0,00	$ 0,00	85,27	$ 6.217.120,97
	8,03	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	68,00	$ 180.666,00	$ 12.285.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,28	$ 2.037.912,48	0,00	$ 0,00	11,28	$ 2.037.912,48
	8,04	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	1268,00	$ 156.206,00	$ 198.069.208,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,05	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquin táctil guia líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	28,00	$ 43.850,00	$ 1.227.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,06	Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, con espaldar en madera teka incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	33,00	$ 796.799,00	$ 26.294.367,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,07	Construcción de Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 20 cm) Tipo BS.002, incluye soldado, formaleta desdencofrante y acero de refuerzo	ML	219,00	$ 122.227,00	$ 26.767.713,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,08	Construcción de piso en concreto de 3000 psi mezclado en sitio. Acabado rayado con cepillo metálico texturizador.	M3	6,00	$ 1.193.241,00	$ 7.159.446,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,09	Suministro e Instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m. incluye sello de juntas	ML	141,00	$ 102.860,00	$ 14.503.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	141,00	$ 14.503.260,00	0,00	$ 0,00	141,00	$ 14.503.260,00
TOTAL CAPITULO 8						$ 295.980.963,00		$ 5.590.086,37		$ 0,00		$ 17.168.207,08		$ 0,00		$ 22.758.293,45

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT	VALOR PARCIAL
CAPITULO 9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																
	9,01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulacion, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (maletines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND	1,00	$ 55.389.647,00	$ 55.389.647,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 33.233.788,20	0,00	$ 0,00	0,60	$ 33.233.788,20
TOTAL CAPITULO 9						$ 55.389.647,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 33.233.788,20		$ 0,00		$ 33.233.788,20
CAPITULO 10 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.																
	10,01	Elaboración de planos y memorias de calculo AS Build.	UND	1,00	$ 1.540.565,00	$ 1.540.565,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10,02	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1,00	$ 4.704.422,00	$ 4.704.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10,03	Certificación plena de conformidad con RETILAP expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1,00	$ 4.529.278,00	$ 4.529.278,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 10						$ 10.774.265,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 2.165.900.979,00		$ 55.463.048,87		$ 45.491.079,90		$ 119.354.572,58		$ 150.654.513,00		$ 370.963.214,35
SALDO POR EJECUTAR:																$ 1.794.937.764,65

	ACTA No 1	ACTA No 2	ACTA No 3	ACTA No 4
VALOR PRESENTE ACTA	$55.463.048,87	$45.491.079,90	$119.354.572,58	$150.654.513,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$16.638.914,66	$13.647.323,97	$35.806.371,77	$45.196.353,90
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$38.824.134,21	$31.843.755,93	$83.548.200,81	$105.458.159,10

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
RL CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Firma: _____
Nombre : ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Interventor

Revisó. Ing. Luis Bedoya - Director Interventoria

Vo. Bo. Ing. Carlos Pino - Apoyo a la supervision

Vo. Bo. Arq. Libardo Mejia - Apoyo a la supervision

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACION			REF.	Contractual
ITEM: 3.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Blvr Stder con Carrera 15										
Caja 35 - Caja 36					18,00					18,00
Caja 36 - Caja 39					18,00					18,00
TOTAL										36,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3


FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACION			REF.	Contractual
ITEM: 3.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



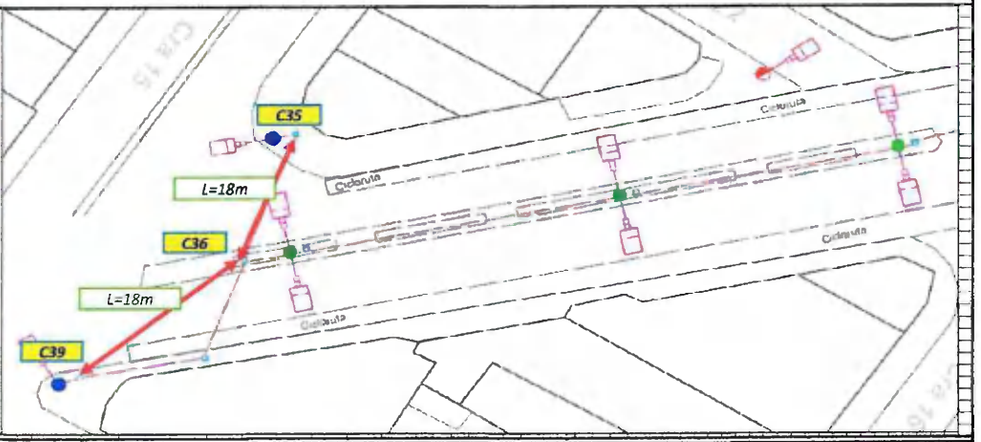

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Glorieta estadio alfonso lopez										
P1 - Caja 85	21,00				1,00					21,00
P2 - Caja 88	16,00				1,00					16,00
P3 - Caja 87	16,00				1,00					16,00
P4 - Caja 86	15,00				1,00					15,00
P5 - Caja 83	14,00				1,00					14,00
P6 - Caja 86	16,00				1,00					16,00
Calle 14 entre Carrera 30 y Carrera 28										
P19 - Caja 81	12,75				2,00					25,50
P20 - Caja 80	13,75				2,00					27,50
P22 - Caja 78	12,75				2,00					25,50
Calle 14 entre Carrera 28 y Carrera 27										
P24 - Caja 73	12,75				2,00					25,50
P25 - Caja 73	12,50				2,00					25,00
Calle 14 entre Carrera 27 y Carrera 26										
P28 - Caja 71	13,50				2,00					27,00
P29 - Caja 70	12,50				2,00					25,00
P30 - Caja 69	13,00				2,00					26,00
Calle 14 entre Carrera 26 y Carrera 25										
P33 - Caja 66	13,50				2,00					27,00
SUBTOTAL 1										332,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.


CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CANT. PARCIAL	VANOS LARGO	ANCHO	ALTO	% Desperd.	TOTAL
Calle 14 entre Carrera 25 y Carrera 24										
P35 - Caja 62	13,50				2,00					27,00
P36 - Caja 61	13,50				2,00					27,00
P37 - Caja 60	15,00				2,00					30,00
Blvr Santander entre Carrera 24 y Carrera 23										
P38 - Caja 56	13,50				2,00					27,00
P39 - Caja 55	12,50				2,00					25,00
P40 - Caja 53	13,00				2,00					26,00
Blvr Santander entre Carrera 23 y Carrera 22										
P41 - Caja 49	14,50				2,00					29,00
P43 - Caja 47	16,50				2,00					33,00
Blvr Santander entre Blvr Bolivar y Carrera 20										
P46 - Caja 6	12,50				2,00					25,00
P47 - Caja 7	12,50				2,00					25,00
P48 - Caja 8	14,00				1,00					14,00
Blvr Santander entre Carrera 20 y Carrera 19										
P49 - Caja 12	14,00				1,00					14,00
P50 - Caja 11	12,50				2,00					25,00
P53 - Caja 14	19,50				2,00					39,00
SUBTOTAL 2										366,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CANT. PARCIAL	VANOS LARGO	ANCHO	ALTO	% Desperd.	TOTAL
Glorieta estadio alfonso lopez										
P7 - Caja 83	14,50				1,00					14,50
P8 - Caja 84	23,00				1,00					23,00
P9 - Caja 84	16,00				1,00					16,00
P10 - Caja 85	17,00				1,00					17,00
P11 - Caja 85	13,50				1,00					13,50
P12 - Caja 88	20,00				1,00					20,00
P13 - Caja 88	23,00				1,00					23,00
P14 - Caja 88	21,00				1,00					21,00
P15 - Caja 86	21,00				1,00					21,00
P16 - Caja 87	18,00				1,00					18,00
P17 - Caja 87	11,00				1,00					11,00
P18 - Caja 86	11,50				1,00					11,50
SUBTOTAL 1										*332,00*
SUBTOTAL 2										*366,00*
TOTAL										907,50

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

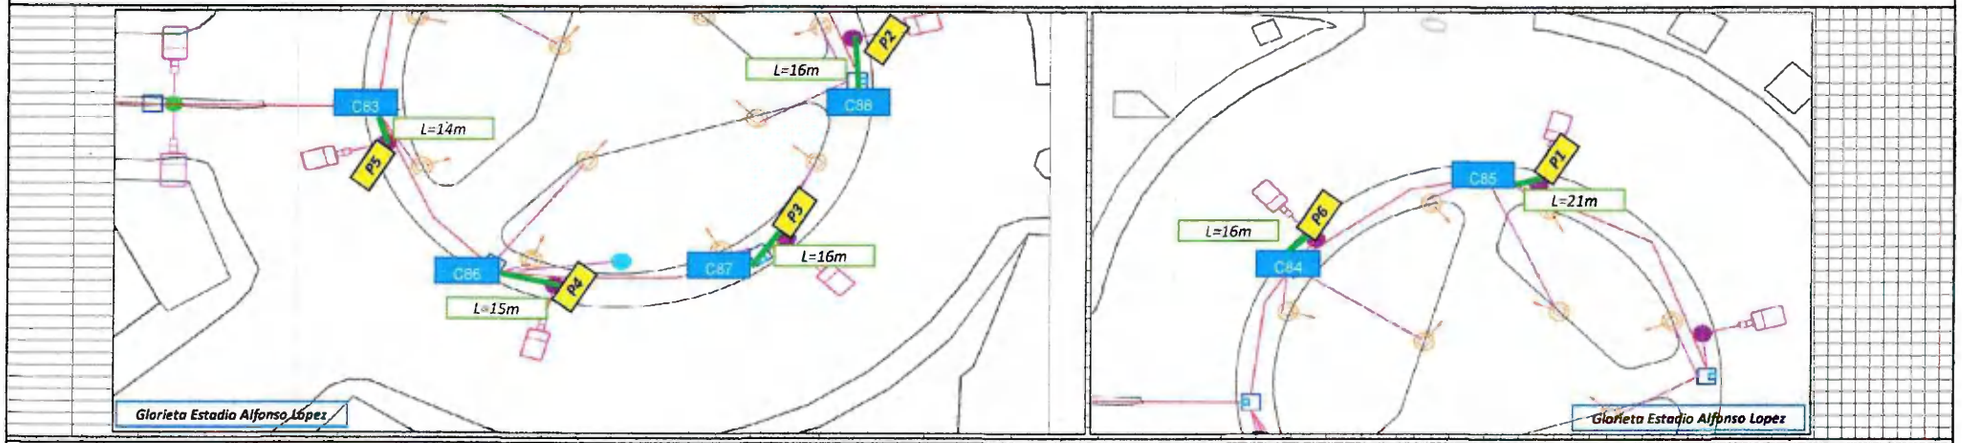

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

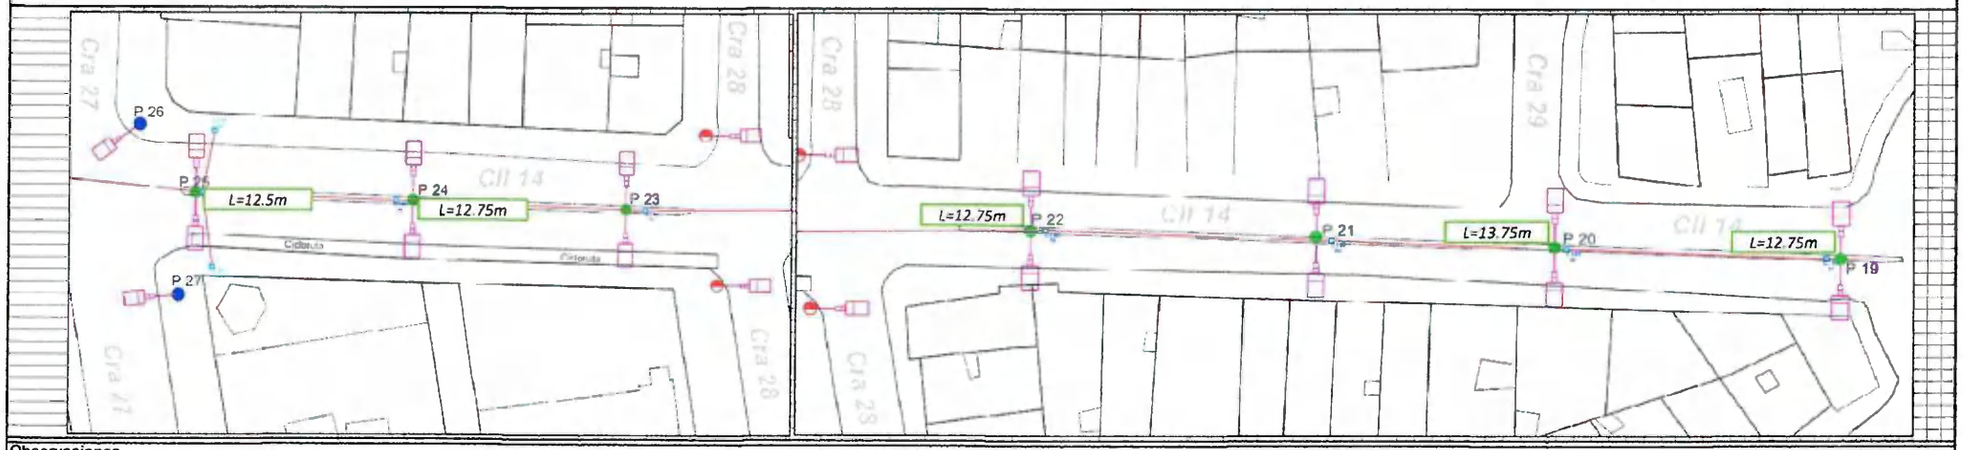

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORÍA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

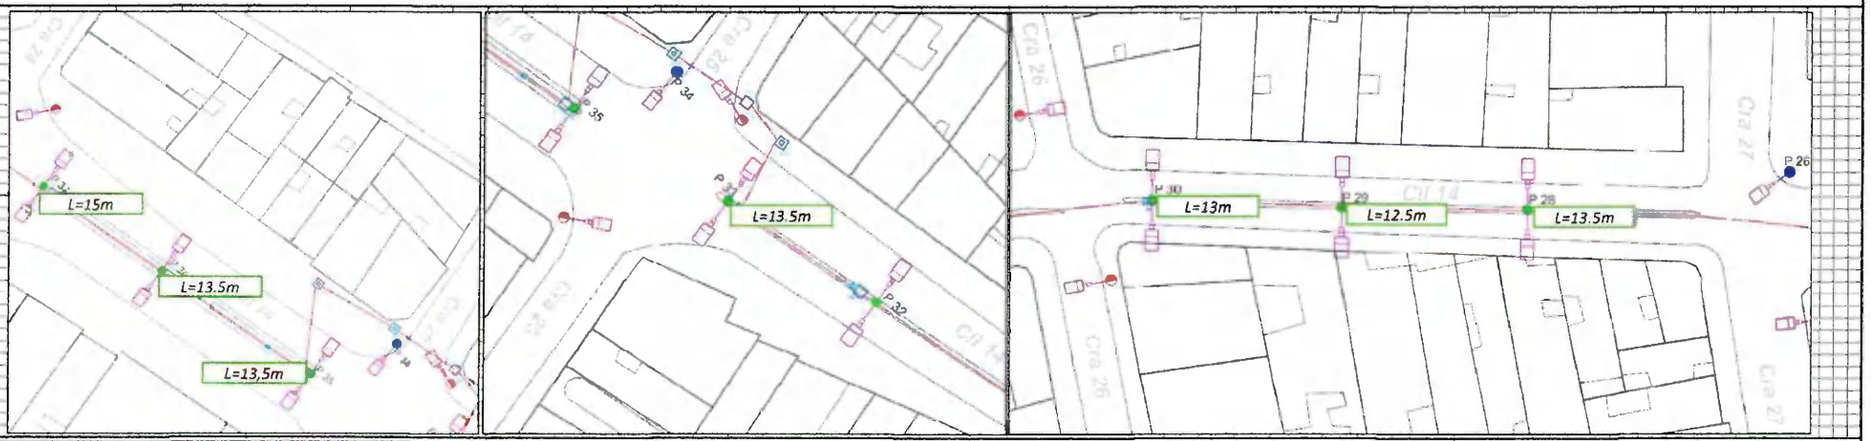

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

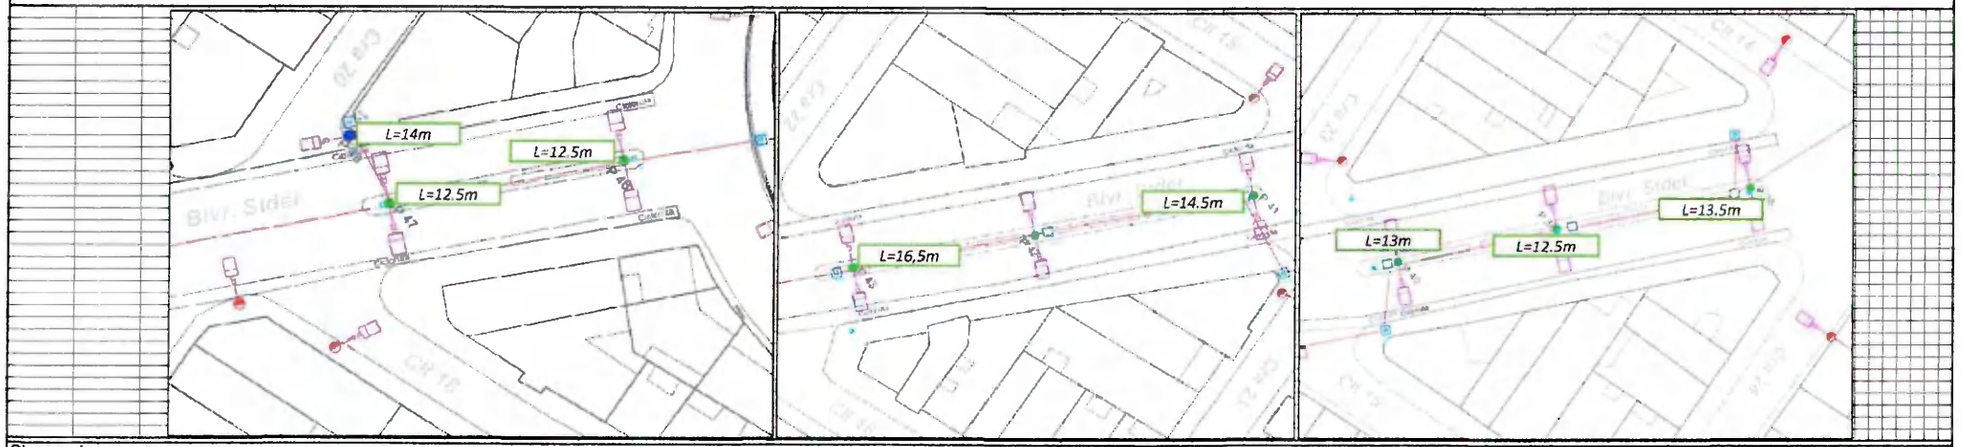

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022


SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

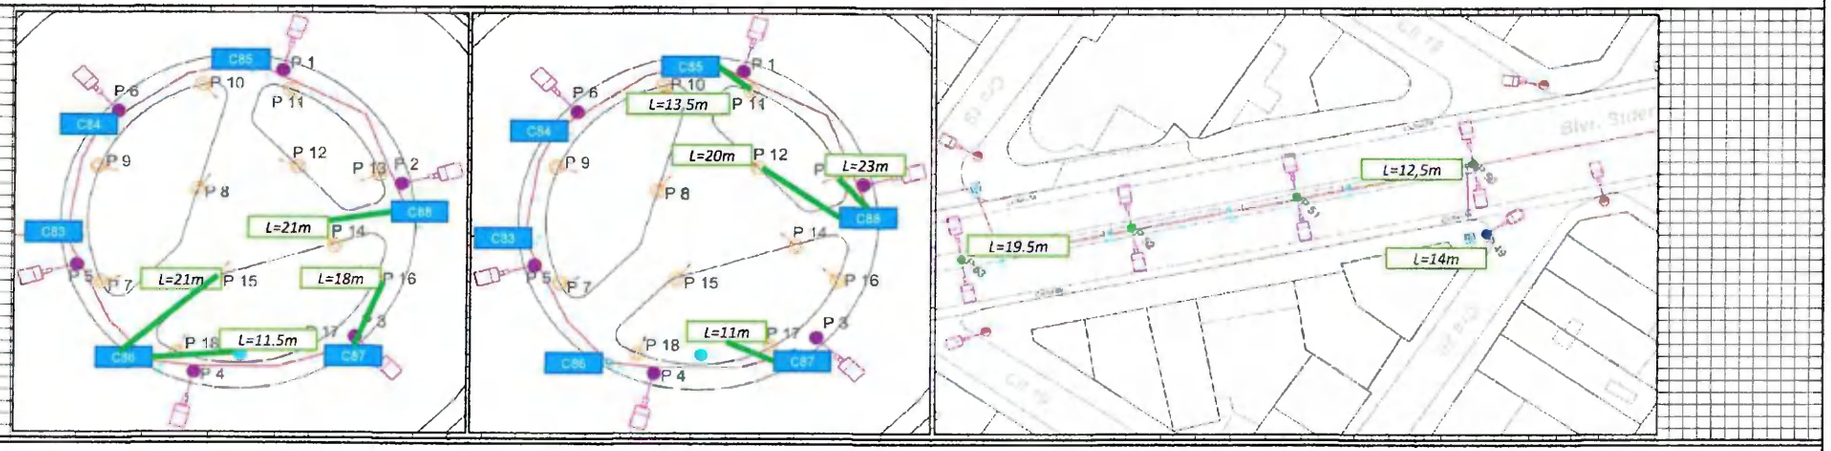

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA


INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	5 REDES			REF.	Contractual
ITEM: 5.03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

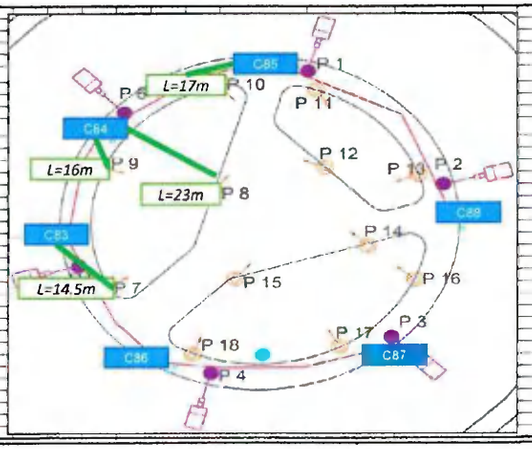

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS		REF.	Contractual
ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT.	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL	LARGO	ANCHO	ALTO		
Calle 14 entre Carrera 30 y Carrera 28										
P19					2,00					2,00
P20					2,00					2,00
P22					2,00					2,00
Calle 14 entre Carrera 28 y Carrera 27										
P24					2,00					2,00
P25					2,00					2,00
Calle 14 entre Carrera 27 y Carrera 26										
P28					2,00					2,00
P29					2,00					2,00
P30					2,00					2,00
Calle 14 entre Carrera 26 y Carrera 25										
P33					2,00					2,00
Bulevar Santander entre Carrera 24 y Carrera 23										
P38					2,00					2,00
P39					2,00					2,00
P40					2,00					2,00
P41					2,00					2,00
Bulevar Santander entre Carrera 23 y Carrera 22										
P43					2,00					2,00
SUBTOTAL 1										28,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS	REF.	Contractual

ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Bulevar Santander entre Carrera 20 y Carrera 19										
P46					2,00					2,00
P47					2,00					2,00
P48					1,00					1,00
P49					1,00					1,00
P50					2,00					2,00
P53					2,00					2,00
Glorieta Estadio Alfonso Lopez										
P1					1,00					1,00
P2					1,00					1,00
P3					1,00					1,00
P4					1,00					1,00
P5					1,00					1,00
P6					1,00					1,00
Bulevar Santander entre Carrera 25 y Carrera 24										
P35					2,00					2,00
P36					2,00					2,00
P37					2,00					2,00
SUBTOTAL 1										28,00
TOTAL										50,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS			REF.	Contractual
ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS			REF.	Contractual
ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022


SUPERVISOR INTERVENTORIA JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS			REF.	Contractual
ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

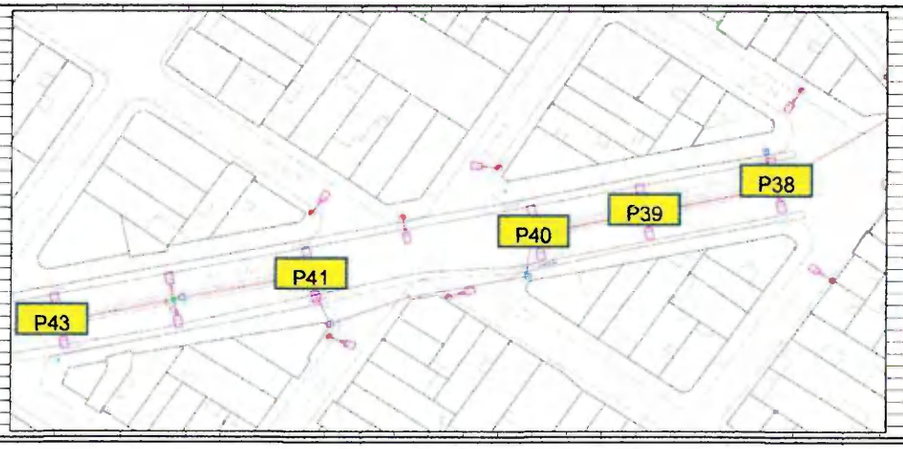





Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	SALIDAS			REF.	Contractual
ITEM: 6.02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND.	UND	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

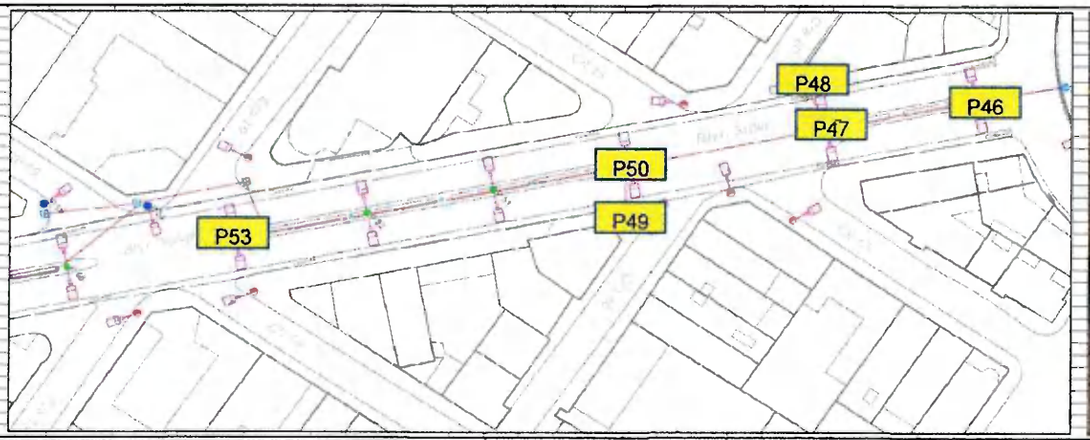





Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 4,5 m de altura total, niple dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad , Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Horneado doble Laca mate y 50cm de pintura epóxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP DECO LIRA.Incluye Canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28,07Kg aprox.	UND.	UND	REF.	Hoja 4

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Glorieta estadio alfonso lopez										
P7				1,00						1,00
P8				1,00						1,00
P9				1,00						1,00
P10				1,00						1,00
P11				1,00						1,00
P12				1,00						1,00
P13				1,00						1,00
P14				1,00						1,00
P15				1,00						1,00
P16				1,00						1,00
P17				1,00						1,00
P18				1,00						1,00
TOTAL										12,00

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3


FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 4.5 m de altura total, niple dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad , Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Horneado doble Laca mate y 50cm de pintura epóxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP DECO LIRA.Incluye Canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28,07Kg aprox.	UND.	UND	REF.	Hoja 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

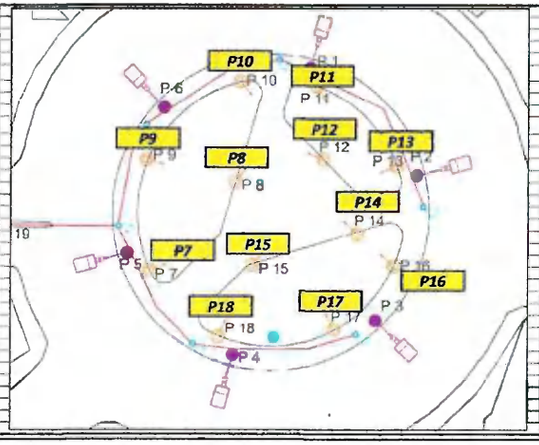

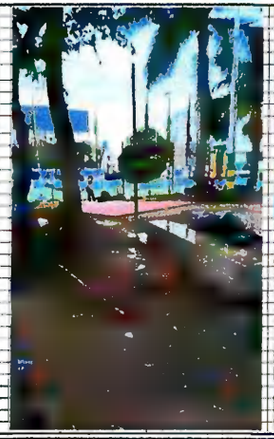





Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93,94Kg.	UND.	UND	REF.	Hoja 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO			
Bulevar Santander con Cra 20 Esquina											
P48				1,00						1,00	
P49				1,00						1,00	
TOTAL										2,00	



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022


SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA


INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93,94Kg.	UND.	UND	REF.	Hoja 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

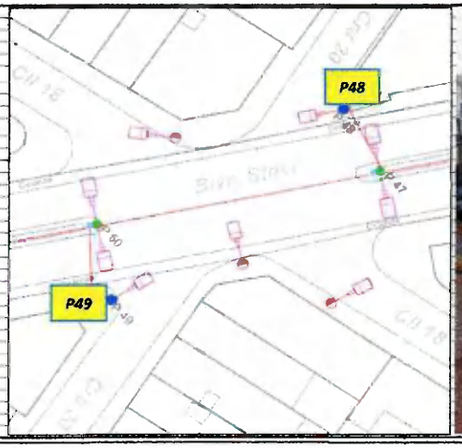

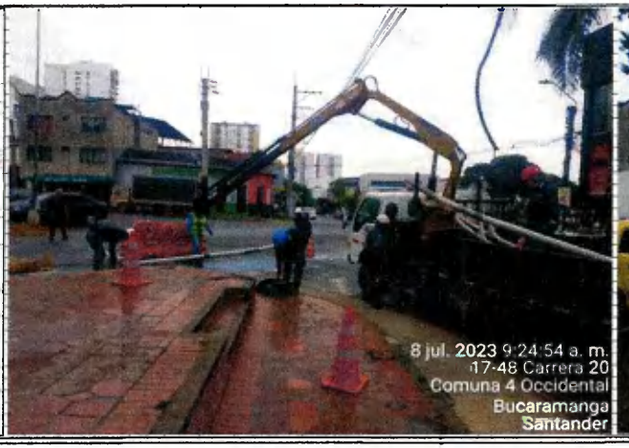



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR
