1. FECHA ELABORACIÓN:	13	8	2023	2. No. INFORME	23	3. SEMANA No.	23
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	07/08/2023 AL 13/08/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88	
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO: 12 Meses
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458	
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO: 12 Meses
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	100,00%	3,61%	39,03%	1,41%	-60,97%	-2,20%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	15,00%	4,89%	12,82%	4,18%	-2,18%	-0,71%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	27,00%	0,26%	0,00%	0,00%	-27,00%	-0,26%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	19,00%	0,26%	0,00%	0,00%	-19,00%	-0,26%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	47,07%	0,46%	47,07%	0,46%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	20,08%	11,39%	15,30%	8,41%	-4,78%	-2,97%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	15,30%	18,31%	-3,01%
Durante el periodo	0,00%	1,77%	-1,77%
Acumulado Actual	15,30%	20,08%	-4,78%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,58%	11,39%
Valor de la Obra Programada	$ 15.152.029,36	$ 299.245.739,35

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	8,41%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 0,00	$ 221.107.111,32

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

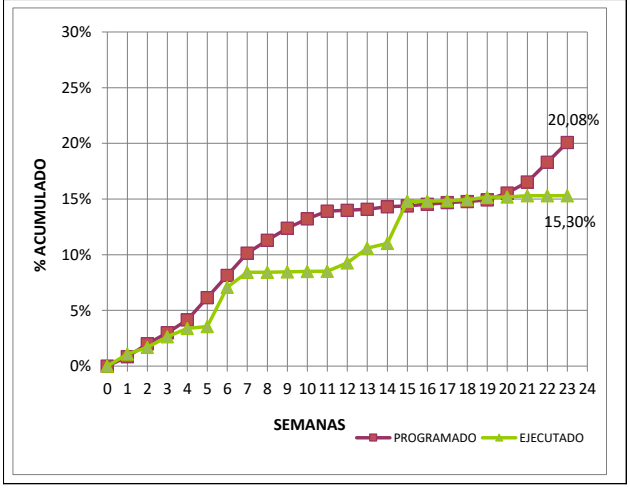

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	13	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	18	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VOLQUETA	1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Inicia la instalación de formaleta para encofrado de las vigas de cimentación.
2. Se realiza desmonte y retiro de poste en concreto que interfería con la cimentación.
3. Se realiza bombeo de agua, producto de las fuertes lluvias presentadas la noche anterior.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se continúa con la excavación manual para vigas de cimentación.
6. Ingresan a la obra las platinas y pernos para anclarlos a los pedestales.
7. Se realiza reparación de cerramiento afectado por los trabajos de la obra.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho, supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se realiza video informativo para presentar al colegio, indicando los riesgos de ingresar a la obra y tirar objetos por parte de los estudiantes.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. Se corrige la demarcación con cinta de peligro que se vio afectada por las lluvias de la noche anterior.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos.
2. Se realiza retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
3. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	13 / 8 / 2023	No. INFORME	23	SEMANA No.	23
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 08 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 09 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 10 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 11 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 08 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Limpieza de baños.



FECHA FOTO: 11 de agosto de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de poste en concreto.
