INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Santiago de Cali

Agosto 08 de 2023

OFICIO - NACION 002-2022-037A

Señores
FUNDACION EDICOL
María Margarita Zapata Paredes
INTERVENTORIA NACION 002 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. NACION 002 DE 2022 **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRIA."**


ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA No. NACION 002 DE 2022

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, se realiza la solicitud a la interventoría requerimiento de prórroga de ejecución de obra en PNN Utria desde el 30 de julio de 2023 (fecha contractual de finalización de obra) hasta el 15 de septiembre de 2023 equivalente a 30 días.

Dado lo anterior, se solicita a la entidad y a la interventoría, revisar y analizar las situaciones que conllevaron a requerir dicha ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra NACION 002 DE 2022 ya que hemos venido presentando para la finalización de la obra ya con 97% de ejecución las condiciones climatológicas no nos ha permitido tener un avance continuo de las actividades de obra en los meses de mayo, junio y los últimos días de julio con precipitaciones por encima de la climatología de referencia informativa de los años 1991-2020 de acuerdo a la predicción climatológica del IDEAM, es por esto que solicitamos nos concedan un nuevo plazo de finalización del contrato de obra para el 15 de septiembre de 2023 que corresponde a 30 días de ejecución, dicho plazo consecuente con el nuevo cronograma de obra el cual fue ajustado con el periodo de finalización , 15 de septiembre de 2023.

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

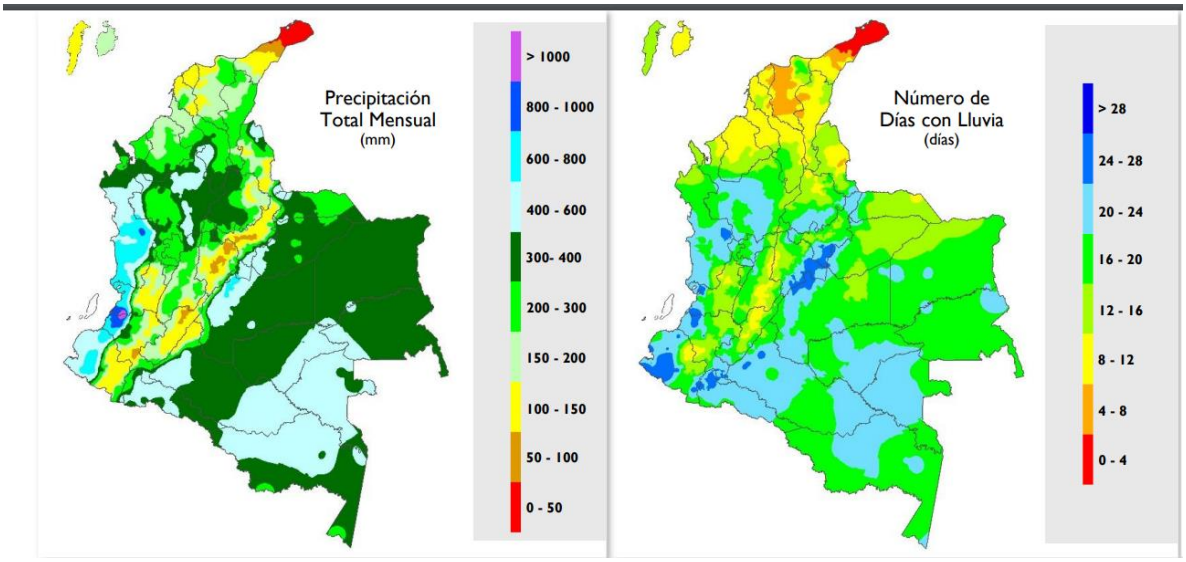

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/125463657/05_Bolet%C3%ADn_Climatol%C3%B3gico_Mayo_2023.
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/seguimiento-tiempo

adjuntamos precipitación mensual del mes de mayo-junio en zona del choco PNN Utria

Cordialmente

ING. CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ
CONTRATISTA. CONTRATO DE OBRA No. NACION 002 DE 2022
