Bogotá D.C. 04 de agosto de 2023.

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.
DR. EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
Alcalde local de Rafael Uribe Uribe.
Bogotá D.C.

Asunto. Informe mensual Técnico No.6 periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio del 2023, correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 06.

Ref: Contrato de Interventoría No. 424 de 2022 y Contrato de Obra No. 410 de 2022

Después de la revisión y ejecución de actividades en los espacios públicos priorizadas por la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, la Interventoría (INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, hace entrega del tercer Informe mensual de Interventoría contrato de obra No 410 de 2022 cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C." Derivado del proceso de la licitación pública No. FDLRUU-LP-005-2022¨.*** Bajo la ejecución del contratista Consorcio COMICROM.

La Interventoría certifica que el contratista cumple con los Aportes parafiscales, a su vez certifica que los profesionales y personal de obra que intervienen en el proyecto se encuentran cobijados por pagos de seguridad social integral (E.P.S, .A.F.P, Y A.R.P) y parafiscales (SENA, I.C.B.F Y caja de compensación familiar.) toda esta información se encuentra ampliamente soportada en el informe entregado por el contratista.

Cordialmente:

Ing. CARLOS ARAMBULA.
Representante legal de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 424 DE 2022



“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: “EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.”

INFORME LEGAL, FINANCIERO Y TECNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
BOGOTA D.C.

Contenido

1. INTRODUCCION 5

2. GENERALIDADES 7

2.1 PRECIOS NO PREVISTOS 11

2.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 14

2.3 ROLES DEL PROYECTO 16

3. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 16

3.1 ESTADO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA 17

3.2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 18

3.3 CONTROL FINANCIERO 18

3.3.1 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 410 DE 2022 – FLUJO DE INVERSION DEL PROYECTO 18

3.3.2 ACTA PARCIAL 6 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 410 DE 2022 19

3.4 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 424 DE 2022 20

3.4.1 FORMA DE PAGO 20

3.4.2 COBRO 6 DE INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S 20

4. INFORMACION TECNICA 21

4.1 ESTADO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION 21

4.2 SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA 24

5. COMITES DE SEGUIMIENTO DE OBRA 25

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE JULIO 25

6.1 RINCON DEL VALLE 26

6.2 DIANA TURBAY 1 Y 2. 28

6.3 EL TRIUNFO 29

6.4 LA MERECED 1 Y 2 31

6.5 El PLAYON 32

6.6 GRANJAS DE SAN PABLO. 33

6.7 VILLAS DEL RECUERDO 1-2-3. 34

6.8 PALERMO SUR 35
6.9 DIANA TURBAY 3 36
7. PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023. 37
7.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 37
7.2 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 37
7.2.1 EL INTERVENTOR SERA RESPONSABLE: 37
7.2.2 PRESENTAR INFORMES MENSUALES 38
7.2.3 REUNIONES DE CONTROL 38
7.2.4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO 39
7.2.5 ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 39
8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 40

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicacion localidad de Rafael Uribe Uribe 8
Ilustración 2. Gráfico de flujo de inversión 19
Ilustración 3. Programacion de obra 23
Ilustración 4. Ejecución de los contratos cop 410 de 2022 y cin 424 de 2022 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. CIV priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe 8
Tabla 2. Precios no previstos 11
Tabla 3. Especificaciones del contrato de interventoría 14
Tabla 4. Especificaciones del contrato de obra 15
Tabla 5. Roles del proyecto 16
Tabla 6. Estado de garantías Contrato de interventoría No. 424 de 2022 17
Tabla 7. Estado de garantías Contrato de obra No. 410 de 2022 17
Tabla 8. Flujo de inversión 18
Tabla 9. Detalle acta de cobro #6 19

Tabla 10. Comites de seguimiento de obra en julio de 2023 25

1. INTRODUCCION

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe (FDLRUU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Interventoría No. 424 de 2022, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
Que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO COMICROM**. Con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra No. 410 de 2022 cuyo objeto es **"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.".**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el **01 de julio al 31 de julio del 2023**, del contrato de Interventoría No. 424 de 2022 entre el FDLRUU e **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.**

En el presente documento se relaciona toda la información sobre el Contrato de Obra No. 410 de 2022 y el Contrato de Interventoría No.424 de 2022. Para ello se exponen las generalidades del proyecto, como lo es la localización del mismo, las

especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto.

Posteriormente, el informe presenta el aspecto legal y financiero de ambos contratos, en donde se expondrá un balance financiero hasta la fecha del corte No. 06 y se analiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra.

Se presenta la información técnica de cada segmento vial intervenido durante el periodo que comprende este informe y las actividades desarrolladas por la interventoría durante la ejecución del proyecto. Por último, el informe presenta las conclusiones y/o recomendaciones halladas en la ejecución de los contratos.

Este informe hace parte de los compromisos y obligaciones asumidos por la Interventoría y que están establecidos en el Contrato de Interventoría No. 424 de 2022, así como las disposiciones de la legislación vigente, el Estatuto General de Contratación Pública, así como la demás normativa que lo regule, modifique o complemente.

2. GENERALIDADES

El FDLRUU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLRUU-LP-005-2022 celebró el contrato de Obra No. 410 de 2022, que tiene como objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: “EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. para intervenir las vías de la localidad, cuyo contratista es el CONSORCIO COMICROM

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la Ciudad de Bogotá. Esta localidad es la No. 18 del Distrito Capital. La Localidad de Rafael Uribe Uribe tiene una extensión total de 1.344 hectáreas (http://www.bogota.gov.co/localidades/rafaeluribeuribe).



Ilustración 1. Ubicacion localidad de Rafael Uribe Uribe

El FDLRUU, inicialmente priorizó 39 segmentos viales, especificados en los documentos contractuales, para ser intervenidos dentro del proyecto en ejecución. Posteriormente el FDLRUU, realizo la entrega de los estudios y diseños, al contratista consorcio COMICROM de los cuales se presentaron observaciones, y se socializaron en los comités de obra llevados a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, priorizando los frentes de obra planificados para aperturarse.

Tabla 1. CIV priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe

SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR					
No.	**CIV**	**DIRECCIÓN**			
		TRAMO	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**
1	**18003148**	TV 12C BIS	CL 46A BIS SUR	CL 45 A SUR	LA MERCED SUR
2	**18002614**	KR 12G BIS A	CL 42 S	CL 41 S	GRANJAS SAN PABLO

3	**18003184**	CL 51C BIS SUR	KR 13C BIS	CL 49C SUR	ARBOLEDA SUR
4	**18003504**	CL 53B BIS SUR	KR 10H BIS	DG 48 B SUR	VILLAS DEL RECUERDO
5	**18004066**	CL 49 D BIS A SUR	TV 11D	CLL 53D SUR	EL PLAYON
6	**18004092**	CL 49 F SUR	KR 11 A	TV 11D	EL PLAYON
7	**18003873**	KR 13 C	CL 53C SUR	CL 53C BIS SUR	LA MERCED SUR
8	**18003922**	CL 53D SUR	KR 12 G	KR 13	LA MERCED SUR
9	**18003923**	KR 13	CL 53D SUR	CL 53C BIS SUR	LA MERCED SUR
10	**18008130**	TV 11 D	CLL 49D BIS A SUR	DG 49D BIS SUR	LA MERCED SUR
11	**18003472**	CL 53B SUR	KR 10H BIS	CERRADO	VILLAS DEL RECUERDO
12	**18003444**	CL 53 A SUR	TV 12	CERRADO	ARBOLEDA SUR
13	**18004554**	DG 48 H SUR	KRA 9 C	KRA 9 A	LOS MOLINOS
14	**18004551**	DG 48 H SUR	KRA 9 C	KRA 9 A	LOS MOLINOS
15	**18003918**	CL 53A SUR	KR 13 H	KR 13D BIS	EL PLAYON
16	**18007468**	KR 12BIS	CL 53A SUR	CERRADO	EL PLAYON
17	**18007467**	CL 53A SUR	KR 12 BIS	KR 12 A	EL PLAYON
18	**40002069**	CL 49 C BIS SUR	KR 3 A ESTE	KR 3 A BIS ESTE	BUENOS AIRES
19	**18005287**	KR 9A	CL 57D SUR	CL 57F SUR	DIANA TURBAY

20	**18005317**	KR 9	CL 57F SUR	CL 58 SUR	DIANA TURBAY
21	**18006358**	KR 4F BIS	CL 59 SUR	CL 5A SUR	DIANA TURBAY - LANZEROS
22	**18006207**	CL 57 SUR	KR D BIS	KR D	RINCON DEL VALLE
23	**18006965**	CL 57 SUR	KR 5C	KR 5B	RINCON DEL VALLE
24	**18006968**	CL 57 SUR	KR 5B	KR 5A	RINCON DEL VALLE
25	**18006029**	CL 57 SUR	KR 5A	KR 5	RINCON DEL VALLE
26	**18006071**	CL 57 SUR	KR 2B ESTE	KR 2 C ESTE	RINCON DEL VALLE
27	**18006123**	CL 57 SUR	KR 2 C ESTE	KR 2 D ESTE	RINCON DEL VALLE
28	**18006166**	CL 57 SUR	KR 2 D ESTE	KR 3 ESTE	RINCON DEL VALLE
29	**18005677**	CL 57 SUR	KR 5G BIS	KR 1	RINCON DEL VALLE
30	**18005709**	CL 57 SUR	KR 5G BIS	KR 5G	RINCON DEL VALLE
31	**18005862**	CL 57 SUR	KR 5G	KR 5D	RINCON DEL VALLE
32	**30000910**	CL 48 Q SUR	KR 1 D ESTE	KR 1 C ESTE	RINCON DEL VALLE
33	**18006248**	CL 57 SUR	KR 4D	KR 4A ESTE	RINCON DEL VALLE
34	**18006335**	CL 62B SUR	TV 2 G BIS	TV 2 F	PALERMO SUR
35	**18006336**	CL 62B SUR	KR 7	KR 3	PALERMO SUR
36	**18006388**	KR 4F	CL 59 SUR	CL 59A SUR	DIANA TURBAY

37	**18006168**	KR 4 H	CL 58 SUR	CL 58B SUR	ARRAYANES
38	**18007543**	KR 4 H	CL 58 SUR	CL 58B SUR	ARRAYANES
39	**18007537**	KR 3C	CL 50 A S	CL 51 S	LA PICOTA ORIENTAL

2.1 PRECIOS NO PREVISTOS

Al momento de la ejecución del contrato, surgieron actividades no previstas dentro del presupuesto contractual, los cuales son necesarios para darle una continuidad las obras y proseguir con el respectivo proceso constructivo, se observa la necesidad de incluir las siguientes actividades al contrato:

Tabla 2. Precios no previstos

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario
NP-01	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	$ 214'469.00
NP-02	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 1'093'413.00
NP-03	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 51'914
NP-04	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 72'161

NP-05	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 102'194
NP-06	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	$ 109'577
NP-07	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 5'730'876
NP-08	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	$ 1'275'359
NP-09	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	$ 249'161
NP-10	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	$ 580'878
NP-11	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2", 3", 4", 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).	ML	$ 163'968

NP-12	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 159'174
NP-13	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 32'318
NP-14	VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye Sumin., bombeo con autobomba, Formaleteo en madera, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo)	M3	$ 700'394
NP-15	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (Incluye suministro, Bombeo formaleteo en madera, colocación y curado, No incluye refuerzo).	M3	$ 726'025
NP-16	GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 518'849
NP-17	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN HECHO EN OBRA)	M2	$ 37'904
NP-18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	$ 822'193

NP-19	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA COMÚN (Incluye Sumin., Formaleteo en madera, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo ni bombeo).	M3	$ 635'774
NP-20	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 324'871
NP-21	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 40'152
NP-22	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 18'485

2.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se exponen las especificaciones generales propias de cada contrato, tanto de la interventoría como el de obra.

Tabla 3. Especificaciones del contrato de interventoría

	Contrato Interventoría
	No. 424 de 2022
OBJETO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: ": "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C." DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. FDLRUU-LP-005-2022"**
Plazo inicial	**8 meses**

Fecha de Iniciación	**30 de enero de 2023**
Fecha de Terminación inicial	**29 de septiembre de 2023**
Interventoría	**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**
Valor inicial del Contrato	**$ 727.336.120**
Prórroga 1	**4 meses**
Fecha de terminación:	**29 de enero de 2023**
Adición 1	**$ 363.668.060,00**
Valor contrato final:	**$ 1.091.004.180,00**

Tabla 4. Especificaciones del contrato de obra

	Contrato de Obra
	No. 410 de 2022
OBJETO	**EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C**
Plazo inicial	**8 meses**
Fecha de Iniciación	**30 de enero de 2023**
Fecha de Terminación inicial	**29 de septiembre de 2023**
Contratista	**CONSORCIO COMICRON**
Valor inicial del Contrato	**$ 7.627.745.600**
Prórroga 1	**4 meses**
Fecha de terminación:	**29 de enero de 2023**
Adición 1	**$ 3.804.377.660,00**

Valor contrato final:	**$ 11.432.123.260,00**

2.3 ROLES DEL PROYECTO

En la Tabla 4, se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión, “Ejecución de las obras de la malla vial local de Rafael Uribe Uribe.” A cargo de los recursos de la vigencia fiscal 2022 por parte del FDLRUU.

Tabla 5. Roles del proyecto

CARGO	NOMBRE	RESPONSABILIDAD	TELEFONO
Supervisor del proyecto	Dr. Humberto Quintana Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe	Supervisión por parte del FDLRUU a los contratos de obra e interventoría	3521466
Apoyo a la supervisión	Ing. Héctor Erira	Apoyo a la supervisión por parte del FDLRUU a los contratos de obra e interventoría	3521466
Director de interventoría	Ing. Carlos Arámbula	Director de interventoría	5257488
Residente de interventoría	Ing. Juan Pablo Lemus	Residente de interventoría	5257488
Director de obra	Ing. Emmanuel Maldonado	Director de obra	3114621690
Residente de obra	Ing. Johan Cajamarca	Residente de obra	3006712858

3. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Este capítulo presentará el estado de garantías contractual tanto del contratista como el de la interventoría, además presentará una evaluación general del cumplimiento de las obligaciones contractuales y, por último, expondrá un balance financiero general de ambos contratos.

3.1 ESTADO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA

En la Tabla 5 y la Tabla 6 se exponen el estado de garantías de cada uno de los contratos teniendo en el acta de inicio del contrato para el reajuste de la vigencia de las pólizas, cumpliendo con las especificaciones contractuales estipuladas.

Tabla 6. Estado de garantías Contrato de interventoría No. 424 de 2022

COMPAÑÍA ASEGURADORA		MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. I-100018503 Póliza RCE No. I-100004242
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato	27/12/2022	27/08/2023
Estabilidad	27/12/2022	27/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2022	27/08/2023
RCE	27/12/2022	27/08/2023

Tabla 7. Estado de garantías Contrato de obra No. 410 de 2022

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS HDI
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION	Póliza de Cumplimiento No. 4007668 Póliza RCE No. 4001518

AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	30/01/2023	29/09/2023
Estabilidad	30/01/2023	29/09/2028
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/01/2023	29/11/2023
RCE	30/01/2023	29/11/2023

3.2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de sus obligaciones contractuales generales especificadas en el contrato de obra No. 410 de 2022 hasta el momento. Ha desarrollado cada actividad siguiendo lo propuesto en la programación de obra previamente aprobada por la interventoría. Además, cumple con el personal profesional y técnico necesario para la ejecución del proyecto y, por ende, la interventoría se aseguró que el personal de obra que intervienen en el proyecto se encuentra cobijado por el pago de seguridad social integral (E.P.S, A.F.P, Y A.R.P).

3.3 CONTROL FINANCIERO

3.3.1 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 410 DE 2022 – FLUJO DE INVERSION DEL PROYECTO

A partir de la programación inicial de obra, se realizó la proyección del flujo de inversiones del proyecto, se muestra flujo de inversión del proyecto hasta el acta de corte 5, a continuación:

Tabla 8. Flujo de inversión

Descripción	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
% mensual proyectado	**4%**	8%	9%	12%	10%	20%	20%	17%
% mensual acumulado	4%	12%	21%	33%	43%	63%	83%	100%

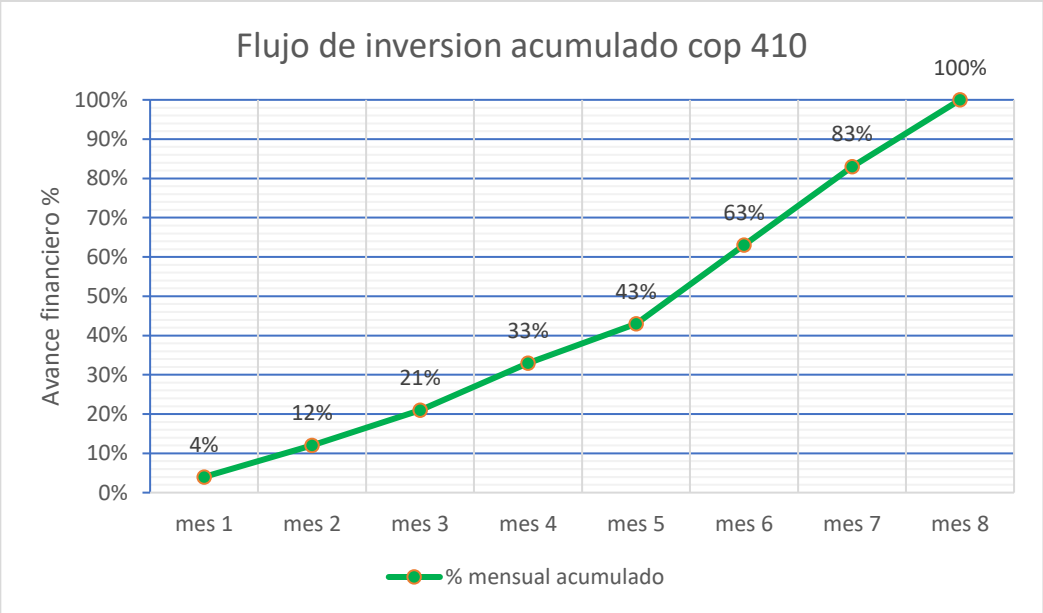


Ilustración 2. Gráfico de flujo de inversión

3.3.2 ACTA PARCIAL 6 CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 410 DE 2022

En el presente periodo se presenta el acta parcial N°6 con un porcentaje de ejecución del 8.01% el cual corresponde a un valor de $ 916.230.666 M/CTE a continuación, se presenta el detalle del acta N° 6.

Tabla 9. Detalle acta de cobro #6

Descripción	%	Valor
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (CAP 1 - 7)		**$ 629.711.798**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**220399129,2**
ADMINISTRACIÓN	**27%**	$ 170.022.185
IMPREVISTOS	**3%**	$ 18.891.354
UTILIDAD	**5%**	$ 31.485.590

IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 5.982.262
VALOR TOTAL COMPONENTES (CAP 8 - 12)		$ 66.119.739
1. GESTIÓN SOCIAL	3.5%	$ 22.039.913
2. DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	3.5%	$ 22.039.913
3, GESTION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	3.5%	$ 22.039.913
VALOR TOTAL ACTA 6:	$ 916.230.666	
PORCENTAJE:	8,01%	

3.4CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 424 DE 2022

3.4.1 FORMA DE PAGO

De acuerdo con la cláusula contractual en la que se especifica la forma de pago del Contrato de Interventoría No. 424 del 2022, “la Alcaldía Local pagará al contratista mensualmente, de conformidad con el valor mensual de personal efectivamente utilizado en cada bloque de trabajo en el mes de ejecución objeto de cobro, acorde a los valores presentados en su propuesta hasta alcanzar el 90%. Los pagos se realizarán previa presentación del informe mensual. El 10% final, será pagada una vez se complete el 100% de la obra y sea recibida a satisfacción por el supervisor de la Alcaldía Local. Previa presentación de: i) Informe mensual de actividades. ii) Factura correspondiente iii) Certificación de cumplimiento expedido por parte del supervisor sobre los informes mensuales de trabajos o cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes mensuales de trabajos o actividades realizados por el contratista y debidamente firmados por las actividades realizadas por el contratista y debidamente firmados por el mismo; iv) acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales cuando corresponda para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual de cada componente.”

3.4.2 COBRO 6 DE INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Se realizaron las actividades de interventoría en donde el corte se evaluó desde el **01 de julio al 31 de julio de 2023**, El valor cobrado es con relación al personal

efectivamente empleado para la realización de las actividades propias de la interventoría, teniendo en cuenta la dedicación ejecutada por cada profesional en el periodo que comprende este informe. La interventoría realizó el cobro del **Acta No. 6** por un valor total de $ $ 87.438.830 M/CTE correspondiente al 8.01% del total del contrato de interventoría.


CONSORCIO COMICROM a la fecha de este informe ha cobrado el 35.27% del valor total de contrato correspondiente a $ 4.032.356.136. INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. a la fecha del corte No. 06 ha cobrado el 35.25% del valor total del contrato, correspondiente a $ 384.573.885.

4. INFORMACION TECNICA


En este capítulo se presentará el estado de la obra durante el periodo que comprende este informe, en el cual se expondrá la actualización de la programación de obra, un control de avances detallado por cada frente de obra, los percances presentados y su solución, la relación de materiales utilizados y los respectivos ensayos para verificar la calidad, y la descripción de las actividades ejecutadas. Posteriormente se representará un plan de acción por parte de la interventoría.

4.1 ESTADO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION


El contratista entregó la programación de obra la cuál fue revisada y avalada por esta interventoría. Dicho documento se anexa al presente informe.
En la ilustración 3 se presenta el control de hitos correspondientes a la programación de obra presentada por el contratista. En ella se aprecia el estado de cada frente de obra con respecto a lo programado.
La interventoría avalo la programación de obra inicial, la cual debe ser actualizada de forma periódica.

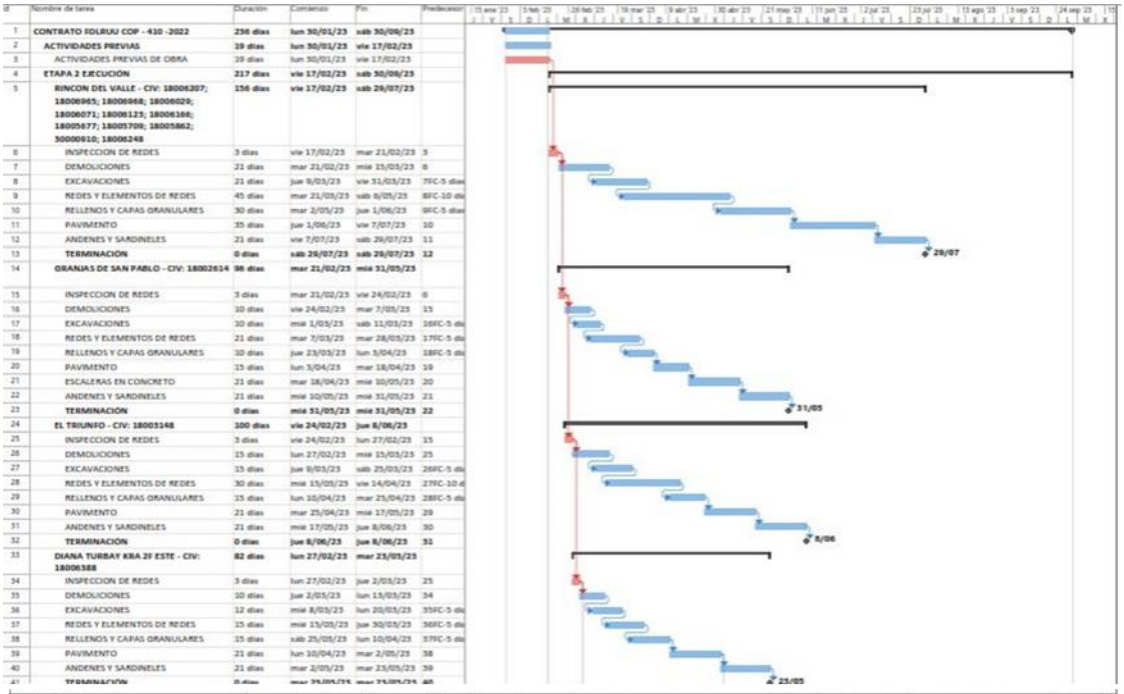

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1	**CONTRATO FOLRUU COP - 410 -2022**	**256 días**	**lun 30/01/23**	**sáb 30/09/23**	
2	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**19 días**	**lun 30/01/23**	**vie 17/02/23**	
3	ACTIVIDADES PREVIAS DE OBRA	19 días	lun 30/01/23	vie 17/02/23	
4	**ETAPA 2 EJECUCIÓN**	**217 días**	**vie 17/02/23**	**sáb 30/09/23**	
5	**RINCON DEL VALLE - CIV: 18006207; 18006965; 18006968; 18006029; 18006071; 18006123; 18006186; 18005677; 18005709; 18005862; 30000910; 18006248**	**156 días**	**vie 17/02/23**	**sáb 29/07/23**	
6	INSPECCION DE REDES	3 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	3
7	DEMOLICIONES	21 días	mar 21/02/23	mié 15/03/23	6
8	EXCAVACIONES	21 días	jue 9/03/23	vie 31/03/23	7FC-5 días
9	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	45 días	mar 21/03/23	sáb 6/05/23	8FC-10 días
10	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	30 días	mar 2/05/23	jue 1/06/23	9FC-5 días
11	PAVIMENTO	35 días	jue 1/06/23	vie 7/07/23	10
12	ANDENES Y SARDINELES	21 días	vie 7/07/23	sáb 29/07/23	11
13	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**sáb 29/07/23**	**sáb 29/07/23**	**12**
14	**GRANJAS DE SAN PABLO - CIV: 18002614**	**96 días**	**mar 21/02/23**	**mié 31/05/23**	
15	INSPECCION DE REDES	3 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23	6
16	DEMOLICIONES	10 días	vie 24/02/23	mar 7/03/23	15
17	EXCAVACIONES	10 días	mié 1/03/23	sáb 11/03/23	16FC-5 días
18	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	21 días	mar 7/03/23	mar 28/03/23	17FC-5 días
19	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	10 días	jue 23/03/23	lun 3/04/23	18FC-5 días
20	PAVIMENTO	15 días	lun 3/04/23	mar 18/04/23	19
21	ESCALERAS EN CONCRETO	21 días	mar 18/04/23	mié 10/05/23	20
22	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mié 10/05/23	mié 31/05/23	21
23	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**mié 31/05/23**	**mié 31/05/23**	**22**
24	**EL TRIUNFO - CIV: 18003148**	**100 días**	**vie 24/02/23**	**jue 8/06/23**	
25	INSPECCION DE REDES	3 días	vie 24/02/23	lun 27/02/23	15
26	DEMOLICIONES	15 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	25
27	EXCAVACIONES	15 días	jue 9/03/23	sáb 25/03/23	26FC-5 días
28	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	30 días	mié 15/03/23	vie 14/04/23	27FC-10 días
29	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	lun 10/04/23	mar 25/04/23	28FC-5 días
30	PAVIMENTO	21 días	mar 25/04/23	mié 17/05/23	29
31	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mié 17/05/23	jue 8/06/23	30
32	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**jue 8/06/23**	**jue 8/06/23**	**31**
33	**DIANA TURBAY KRA 2F ESTE - CIV: 18006588**	**82 días**	**lun 27/02/23**	**mar 23/05/23**	
34	INSPECCION DE REDES	3 días	lun 27/02/23	jue 2/03/23	25
35	DEMOLICIONES	10 días	jue 2/03/23	lun 13/03/23	34
36	EXCAVACIONES	12 días	mié 8/03/23	lun 20/03/23	35FC-5 días
37	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mié 15/03/23	jue 30/03/23	36FC-5 días
38	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	sáb 25/03/23	lun 10/04/23	37FC-5 días
39	PAVIMENTO	21 días	lun 10/04/23	mar 2/05/23	38
40	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mar 2/05/23	mar 23/05/23	39
41	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**mar 23/05/23**	**mar 23/05/23**	**40**

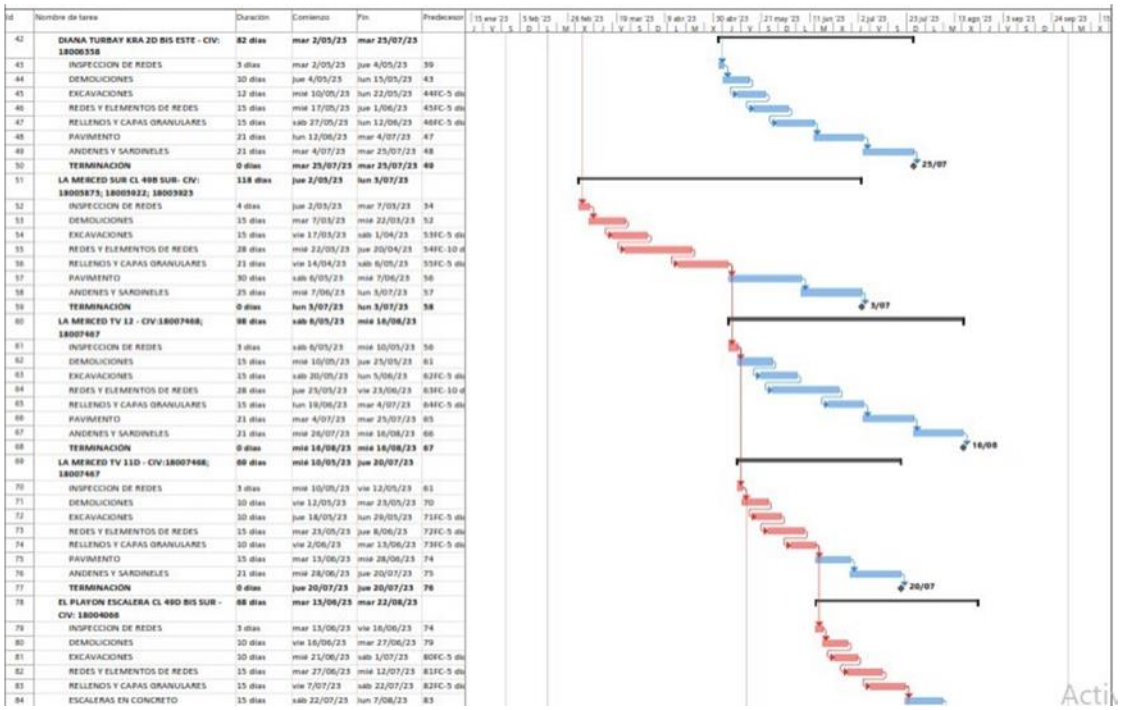

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
42	**DIANA TURBAY KRA 2D BIS ESTE - CIV: 18006558**	**82 días**	**mar 2/05/23**	**mar 25/07/23**	
43	INSPECCION DE REDES	3 días	mar 2/05/23	jue 4/05/23	39
44	DEMOLICIONES	10 días	jue 4/05/23	lun 15/05/23	43
45	EXCAVACIONES	12 días	mié 10/05/23	lun 22/05/23	44FC-5 días
46	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mié 17/05/23	jue 1/06/23	45FC-5 días
47	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	sáb 27/05/23	lun 12/06/23	46FC-5 días
48	PAVIMENTO	21 días	lun 12/06/23	mar 4/07/23	47
49	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mar 4/07/23	mar 25/07/23	48
50	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**mar 25/07/23**	**mar 25/07/23**	**49**
51	**LA MERCED SUR CL 49B SUR- CIV: 18005873; 18005922; 18003923**	**118 días**	**jue 2/03/23**	**lun 3/07/23**	
52	INSPECCION DE REDES	4 días	jue 2/03/23	mar 7/03/23	34
53	DEMOLICIONES	15 días	mar 7/03/23	mié 22/03/23	52
54	EXCAVACIONES	15 días	vie 17/03/23	sáb 1/04/23	53FC-5 días
55	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	28 días	mié 22/03/23	jue 20/04/23	54FC-10 días
56	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	21 días	vie 14/04/23	sáb 6/05/23	55FC-5 días
57	PAVIMENTO	30 días	sáb 6/05/23	mié 7/06/23	56
58	ANDENES Y SARDINELES	25 días	mié 7/06/23	lun 3/07/23	57
59	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**lun 3/07/23**	**lun 3/07/23**	**58**
60	**LA MERCED TV 12 - CIV:18007468; 18007467**	**98 días**	**sáb 6/05/23**	**mié 16/08/23**	
61	INSPECCION DE REDES	3 días	sáb 6/05/23	mié 10/05/23	50
62	DEMOLICIONES	15 días	mié 10/05/23	jue 25/05/23	61
63	EXCAVACIONES	15 días	sáb 20/05/23	lun 5/06/23	62FC-5 días
64	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	28 días	jue 25/05/23	vie 23/06/23	63FC-10 días
65	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	lun 19/06/23	mar 4/07/23	64FC-5 días
66	PAVIMENTO	21 días	mar 4/07/23	mar 25/07/23	65
67	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mié 26/07/23	mié 16/08/23	66
68	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**mié 16/08/23**	**mié 16/08/23**	**67**
69	**LA MERCED TV 11D - CIV:18007468; 18007467**	**60 días**	**mié 10/05/23**	**jue 20/07/23**	
70	INSPECCION DE REDES	3 días	mié 10/05/23	vie 12/05/23	61
71	DEMOLICIONES	10 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	70
72	EXCAVACIONES	10 días	jue 18/05/23	lun 29/05/23	71FC-5 días
73	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mar 23/05/23	jue 8/06/23	72FC-5 días
74	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	10 días	vie 2/06/23	mar 13/06/23	73FC-5 días
75	PAVIMENTO	15 días	mar 13/06/23	mié 28/06/23	74
76	ANDENES Y SARDINELES	21 días	mié 28/06/23	jue 20/07/23	75
77	**TERMINACIÓN**	**0 días**	**jue 20/07/23**	**jue 20/07/23**	**76**
78	**EL PLAYON ESCALERA CL 49D BIS SUR - CIV: 18004066**	**68 días**	**mar 13/06/23**	**mar 22/08/23**	
79	INSPECCION DE REDES	3 días	mar 13/06/23	vie 16/06/23	74
80	DEMOLICIONES	10 días	vie 16/06/23	mar 27/06/23	79
81	EXCAVACIONES	10 días	mié 21/06/23	sáb 1/07/23	80FC-5 días
82	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mar 27/06/23	mié 12/07/23	81FC-5 días
83	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	vie 7/07/23	sáb 22/07/23	82FC-5 días
84	ESCALERAS EN CONCRETO	15 días	sáb 22/07/23	lun 7/08/23	83

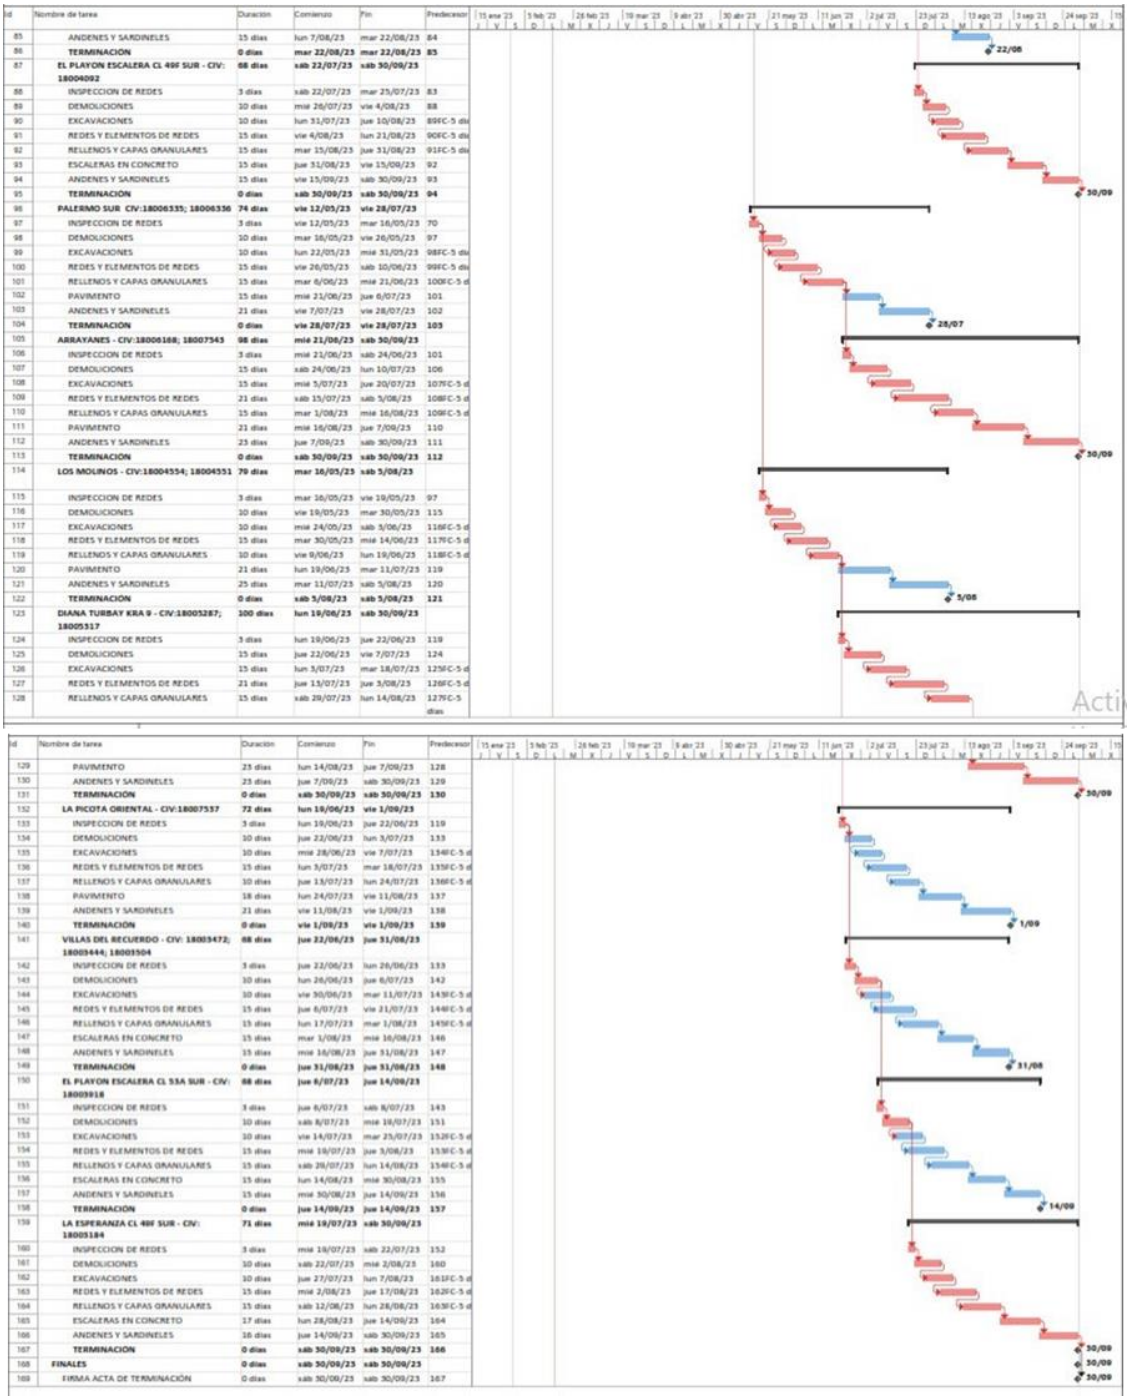


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
85	ANDENES Y SARDINELES	15 días	lun 7/08/23	mar 22/08/23	84
86	**TERMINACION**	**0 días**	**mar 22/08/23**	**mar 22/08/23**	**85**
87	**EL PLAYON ESCALERA CL 49F SUR - CIV: 18004092**	**68 días**	**sáb 22/07/23**	**sáb 30/09/23**	
88	INSPECCION DE REDES	3 días	sáb 22/07/23	mar 25/07/23	83
89	DEMOLICIONES	10 días	mié 26/07/23	vie 4/08/23	88
90	EXCAVACIONES	10 días	lun 31/07/23	jue 10/08/23	89FC-5 días
91	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	vie 4/08/23	lun 21/08/23	90FC-5 días
92	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	mar 15/08/23	jue 31/08/23	91FC-5 días
93	ESCALERAS EN CONCRETO	15 días	jue 31/08/23	vie 15/09/23	92
94	ANDENES Y SARDINELES	15 días	vie 15/09/23	sáb 30/09/23	93
95	**TERMINACION**	**0 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 30/09/23**	**94**
96	**PALERMO SUR CIV:18006335; 18006336**	**74 días**	**vie 12/05/23**	**vie 28/07/23**	
97	INSPECCION DE REDES	3 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23	70
98	DEMOLICIONES	10 días	mar 16/05/23	vie 26/05/23	97
99	EXCAVACIONES	10 días	lun 22/05/23	mié 31/05/23	98FC-5 días
100	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	vie 26/05/23	sáb 10/06/23	99FC-5 días
101	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	mar 6/06/23	mié 21/06/23	100FC-5 días
102	PAVIMENTO	15 días	mié 21/06/23	jue 6/07/23	101
103	ANDENES Y SARDINELES	21 días	vie 7/07/23	vie 28/07/23	102
104	**TERMINACION**	**0 días**	**vie 28/07/23**	**vie 28/07/23**	**103**
105	**ARRAYANES - CIV:18006108; 18007543**	**98 días**	**mié 21/06/23**	**sáb 30/09/23**	
106	INSPECCION DE REDES	3 días	mié 21/06/23	sáb 24/06/23	101
107	DEMOLICIONES	15 días	sáb 24/06/23	lun 10/07/23	106
108	EXCAVACIONES	15 días	mié 5/07/23	jue 20/07/23	107FC-5 días
109	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	21 días	sáb 15/07/23	sáb 5/08/23	108FC-5 días
110	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	109FC-5 días
111	PAVIMENTO	21 días	mié 16/08/23	jue 7/09/23	110
112	ANDENES Y SARDINELES	23 días	jue 7/09/23	sáb 30/09/23	111
113	**TERMINACION**	**0 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 30/09/23**	**112**
114	**LOS MOLINOS - CIV:18004554; 18004551**	**79 días**	**mar 16/05/23**	**sáb 5/08/23**	
115	INSPECCION DE REDES	3 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23	97
116	DEMOLICIONES	10 días	vie 19/05/23	mar 30/05/23	115
117	EXCAVACIONES	10 días	mié 24/05/23	sáb 3/06/23	116FC-5 días
118	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mar 30/05/23	mié 14/06/23	117FC-5 días
119	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	10 días	vie 9/06/23	lun 19/06/23	118FC-5 días
120	PAVIMENTO	21 días	lun 19/06/23	mar 11/07/23	119
121	ANDENES Y SARDINELES	25 días	mar 11/07/23	sáb 5/08/23	120
122	**TERMINACION**	**0 días**	**sáb 5/08/23**	**sáb 5/08/23**	**121**
123	**DIANA TURBAY KRA 9 - CIV:18005287; 18005517**	**100 días**	**lun 19/06/23**	**sáb 30/09/23**	
124	INSPECCION DE REDES	3 días	lun 19/06/23	jue 22/06/23	119
125	DEMOLICIONES	15 días	jue 22/06/23	vie 7/07/23	124
126	EXCAVACIONES	15 días	lun 3/07/23	mar 18/07/23	125FC-5 días
127	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	21 días	jue 13/07/23	jue 3/08/23	126FC-5 días
128	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	sáb 29/07/23	lun 14/08/23	127FC-5 días
129	PAVIMENTO	23 días	lun 14/08/23	jue 7/09/23	128
130	ANDENES Y SARDINELES	23 días	jue 7/09/23	sáb 30/09/23	129
131	**TERMINACION**	**0 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 30/09/23**	**130**
132	**LA PICOTA ORIENTAL - CIV:18007557**	**72 días**	**lun 19/06/23**	**vie 1/09/23**	
133	INSPECCION DE REDES	3 días	lun 19/06/23	jue 22/06/23	119
134	DEMOLICIONES	10 días	jue 22/06/23	lun 3/07/23	133
135	EXCAVACIONES	10 días	mié 28/06/23	vie 7/07/23	134FC-5 días
136	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	lun 3/07/23	mar 18/07/23	135FC-5 días
137	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	10 días	jue 13/07/23	lun 24/07/23	136FC-5 días
138	PAVIMENTO	18 días	lun 24/07/23	vie 11/08/23	137
139	ANDENES Y SARDINELES	21 días	vie 11/08/23	vie 1/09/23	138
140	**TERMINACION**	**0 días**	**vie 1/09/23**	**vie 1/09/23**	**139**
141	**VILLAS DEL RECUERDO - CIV: 18003472; 18003444; 18003504**	**68 días**	**jue 22/06/23**	**jue 31/08/23**	
142	INSPECCION DE REDES	3 días	jue 22/06/23	lun 26/06/23	133
143	DEMOLICIONES	10 días	lun 26/06/23	jue 6/07/23	142
144	EXCAVACIONES	10 días	vie 30/06/23	mar 11/07/23	143FC-5 días
145	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	jue 6/07/23	vie 21/07/23	144FC-5 días
146	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	145FC-5 días
147	ESCALERAS EN CONCRETO	15 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	146
148	ANDENES Y SARDINELES	15 días	mié 16/08/23	jue 31/08/23	147
149	**TERMINACION**	**0 días**	**jue 31/08/23**	**jue 31/08/23**	**148**
150	**EL PLAYON ESCALERA CL 53A SUR - CIV: 18003918**	**68 días**	**jue 6/07/23**	**jue 14/09/23**	
151	INSPECCION DE REDES	3 días	jue 6/07/23	sáb 8/07/23	143
152	DEMOLICIONES	10 días	sáb 8/07/23	mié 19/07/23	151
153	EXCAVACIONES	10 días	vie 14/07/23	mar 25/07/23	152FC-5 días
154	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mié 19/07/23	jue 3/08/23	153FC-5 días
155	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	sáb 29/07/23	lun 14/08/23	154FC-5 días
156	ESCALERAS EN CONCRETO	15 días	lun 14/08/23	mié 30/08/23	155
157	ANDENES Y SARDINELES	15 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	156
158	**TERMINACION**	**0 días**	**jue 14/09/23**	**jue 14/09/23**	**157**
159	**LA ESPERANZA CL 49F SUR - CIV: 18005184**	**71 días**	**mié 19/07/23**	**sáb 30/09/23**	
160	INSPECCION DE REDES	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	152
161	DEMOLICIONES	10 días	sáb 22/07/23	mié 2/08/23	160
162	EXCAVACIONES	10 días	jue 27/07/23	lun 7/08/23	161FC-5 días
163	REDES Y ELEMENTOS DE REDES	15 días	mié 2/08/23	jue 17/08/23	162FC-5 días
164	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	15 días	sáb 12/08/23	lun 28/08/23	163FC-5 días
165	ESCALERAS EN CONCRETO	17 días	lun 28/08/23	jue 14/09/23	164
166	ANDENES Y SARDINELES	16 días	jue 14/09/23	sáb 30/09/23	165
167	**TERMINACION**	**0 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 30/09/23**	**166**
168	**FINALES**	**0 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 30/09/23**	
169	FIRMA ACTA DE TERMINACIÓN	0 días	sáb 30/09/23	sáb 30/09/23	167

Ilustración 3. Programacion de obra

4.2 SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA

La interventoría de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista realiza seguimiento y control a los avances de las actividades en ejecución de los tramos intervenidos.

A la fecha se han generado retrocesos en el avance del proceso constructivo de estos segmentos viales, debido a que no se ha podido abrir de manera efectiva y simultanea todos los frentes de obra que ya se tenían socializados y con los permisos correspondientes, generados por los estudios y diseños los cuales no permiten continuar con la ejecución hasta que sean definidos, como se mencionó anteriormente, este retraso no es responsabilidad del consorcio COMICROM. A continuación se presenta grafico de ejecución de contratos hasta el acta de 5.

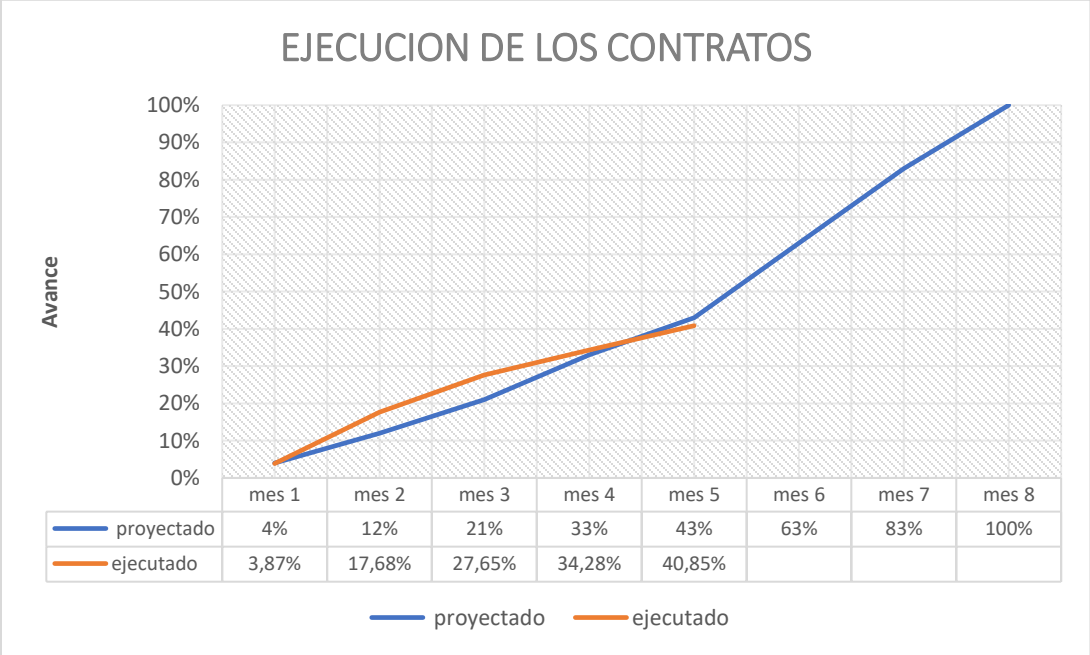

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
proyectado	4%	12%	21%	33%	43%	63%	83%	100%
ejecutado	3,87%	17,68%	27,65%	34,28%	40,85%			

Ilustración 4. Ejecución de los contratos cop 410 de 2022 y cin 424 de 2022

apertura de los nuevos frentes de obra, se espera continuar con el avance de obra programado, debido al tiempo perdido por la indefinición de diseños, se puede generar un atraso que se refleje en el siguiente periodo.

5. COMITES DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Seguimiento y control al contrato de obra No. 410 del 2022 y contrato de interventoría No. 424 del 2022 durante el mes de julio, se realizaron 2 comités de seguimiento de obra, con la participación de la interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S y contratista de obra CONSORCIO COMICROM y en de la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. La relación de fechas de estas actas se presenta a en la siguiente tabla.

Tabla 10. Comites de seguimiento de obra en julio de 2023

N°	DESCRIPCION	FECHA	LUGAR
1	Comité de seguimiento de obra	05/07/2023	ALCALDIA LOCAL
2	Comité de seguimiento de obra	12/07/2023	ALCALDIA LOCAL
3	Comité de seguimiento de obra		
4	Comité de seguimiento de obra		

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE JULIO

La interventoría en el periodo comprendido del 01 julio del 2023 al 31 de julio del 2023 ejecuto las siguientes actividades en un ámbito general, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas:

Se revisó y recomendó los ajustes al programa de ejecución del contrato No. 410 de 2022.
• Se hizo seguimiento diariamente con los profesionales a cargo de la Interventoría.
• Se entregaron los informes mensuales al supervisor del contrato por parte de la Alcaldía.
• Se autorizaron los pagos de los servicios prestados por el Contratista cumpliendo con el objeto del convenio, el presupuesto del contrato y los requerimientos enmarcados dentro de la Ley.
• Se supervisó el trámite y cumplimiento de los respectivos permisos requeridos en desarrollo del contrato No 410 de 2022.

Las actividades desarrolladas y descritas a continuación están comprendidas para el periodo desde el 01 julio del 2023 al 31 de julio del 2023.

6.1 RINCON DEL VALLE.

Durante este periodo de ejecución; el contratista realizo actividades de obra dentro las abscisas K0+230 a K0+380 las cuales se nombran a continuación.

1. Construcción de andenes costado oriental
2. Construcción y fundición de muro de contención K0+180 a la k0+235.
3. Pruebas de asentamiento del concreto
4. Construcción de sumideros 2.
5. Instalación de filtro francés ambos costados
6. Toma de densidades para andenes.
7. Concreto para fundición de andenes
8. Instalación de sardinel ambos costados.
9. Reparación de daños causados en los andenes y sardinel durante la ejecución de las actividades en obra.
10. Aseo y limpieza.

NOTA. Dentro de los días de actividad se han registrado fuertes lluvias afectando el rendimiento. A continuación, el registro *fotográfico*:



CONSTRUCCIÓN DE ANDENES COSTADO ORIENTAL





CONSTRUCCIÓN Y FUNDICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN





PRUEBAS DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO





INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS AMBOS COSTADOS






TOMA DE DENSIDADES PARA ANDENES

6.2 DIANA TURBAY 1 Y 2.

1. Fundición de Zarpas para muros confinamiento de terrazas andenes.
2. Excavación manual para andenes y terrazas.
3. Fundición de escaleras.
4. Instalación de filtro francés.
5. Pruebas de asentamiento.
6. Mampostería para Cajas de Inspección.
7. Aseo y limpieza.

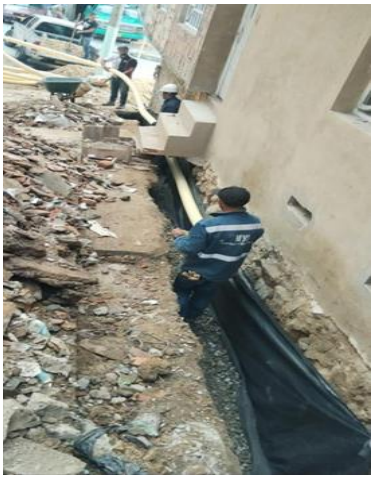



FILTRO FRANCES.





PRUEBAS DE ASENTAMIENTO

6.3 EL TRIUNFO

1. Fundición de Zarpas para muros confinamiento de terrazas andenes.
2. Excavación manual para andenes y terrazas.
3. Fundición de escaleras.
4. Pruebas de asentamiento.
5. Excavación y llenos para Traslado de Red a agua potable de 4¨.
6. Mampostería para Cajas de Inspector.
7. Aseo y limpieza.





FUNDICIÓN DE ZARPAS PARA MUROS CONFINAMIENTO DE TERRAZAS ANDENES





EXCAVACIÓN MANUAL PARA ANDENES Y TERRAZAS.





EXCAVACIÓN Y LLENOS PARA TRASLADO DE RED A AGUA POTABLE DE 4”





PRUEBAS DE ASENTAMIENTO





MAMPOSTERÍA PARA CAJAS DE INSPECTOR.

6.4 LA MERECED 1 Y 2

1. Fundición concreto para andenes.
2. Densidades para andenes.
3. Y pruebas de asentamiento.

4. Aseo y limpieza.




FUNDICIÓN CONCRETO PARA ANDENES




DENSIDADES PARA ANDENES.

6.5 El PLAYON.

1. Continuidad con la excavación mecánica para caja vía.
2. Extencion y Nivelación de rajón y sello para vía.
3. Mampostería para cajas de inspección.
4. Mampostería para pozos.
5. Nivelación para extensión de subbase





CONTINUIDAD CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJA VÍA

6.6 GRANJAS DE SAN PABLO.

1. Excavación para muro estructural.
2. Instalación de ladrillo estructural para muros.
3. Llenos para confinamiento de escaleras.





EXCAVACION PARA MURO ESTRUCTURAL.





INSTALACIÓN DE LADRILLO ESTRUCTURAL PARA MUROS

6.7 VILLAS DEL RECUERDO 1-2-3.

1. Excavación mecánica para caja vía
2. Demolición de pavimento existente.
3. Excavación Mecánica de caja vía.
4. Construcción de cárcamos para protección de la red de Aguas Negras12”.
5. Mampostería para pozos.
6. Nivelación y extensión de rajón y sello.
7. Nivelación de Subbase.
8. Se continua con la instalación de MBR.







EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJA VÍA





CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS PARA PROTECCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS 12".

6.8 PALERMO SUR

1. Demolición de pavimento existente.
2. Excavación Mecánica de caja vía.
3. Nivelación y extensión de rajón y sello.
4. Nivelación de Subbase.

5. Se continua con la instalación de MBR.




EXCAVACIÓN MECÁNICA DE CAJA VÍA Y EXTENCION DE SELLO.

6.9 DIANA TURBAY 3

1. Demolición de pavimento existente.
2. Excavación Mecánica de caja vía.
3. Nivelación y extensión de rajón y sello.
4. Nivelación de Subbase.
5. Se continua con la instalación de MBR.




EXCAVACIÓN MECÁNICA DE CAJA VÍA.

7. PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023.

Los alcances de la Interventoría son garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas para el Contrato No. 410 de 2022 entre el FDLRUU y el consorcio COMICROM, es por esto que se ha realizado la supervisión en cada una de las actividades llevadas a cabo por el contratista durante este periodo, para así dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y cumplir con las obligaciones contractuales y de ley de la Interventoría.

7.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto de interventoría están planteados de la siguiente forma:

• Se realizó el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoría oportuna y eficaz.
• Se generaron mejoras continuas en los procesos de planificación, control y vigilancia de las obras de la malla vial.
• Elaborar diagnósticos de las zonas, adicionalmente la ejecución específica del mantenimiento y recuperación de las vías.
• Se llevó un control minucioso del presupuesto determinado para el proyecto.
• Se llevó un control minucioso de los equipos de laboratorio y Topografía. Revisión y aprobación de certificados de calibración.

7.2 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

7.2.1 EL INTERVENTOR SERA RESPONSABLE:

• Realizar control, la supervisión y la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. De la misma forma, debe ejercer control técnico, ambiental, de gestión social, financiera, presupuestal, operativo y administrativo del proyecto.
• Ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con las actividades formuladas para la primera etapa, descritas en la propuesta, la cual forma parte integral del contrato.
• Mantener el personal profesional ofertados en la propuesta.

• Semanalmente o cada vez que se estime conveniente deberán celebrarse reuniones de seguimiento.
• Revisar y aprobar el plan y el programa de trabajo e inversiones dentro del plazo señalado en el cronograma de actividades.
• Elaborar diagnósticos y presupuestos de las vías a intervenir los cuales serán adelantados en el primer mes del convenio y se entregarán previo a la iniciación de las obras.
• Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del convenio, si a ello hubiere lugar.

7.2.2 PRESENTAR INFORMES MENSUALES

• De carácter Técnico y Administrativo

El interventor debe realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del convenio, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultades, el cumplimiento de obligaciones y la ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles, además de las previstas en las condiciones técnicas y todas aquellas que se desprenden del objeto del convenio de Interventoría, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

Además, tiene como obligación velar por todas las acciones encaminadas al cumplimiento del proceso de Interventoría, para llevar el acatamiento de las mejores prácticas Administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultad, el cumplimiento de obligaciones y las ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles.

• De carácter Ambiental, SISO y Social

El interventor tiene como responsabilidad vigilar, controlar e inspeccionar el cumplimiento Ambiental, Social y de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de todas las actividades que se desarrollan en el entorno de la obra.

7.2.3 REUNIONES DE CONTROL

Se han llevado a cabo reuniones de comité técnico entre el contratista, la Interventoría, el supervisor y apoyo a la supervisión del proyecto por parte de la Alcaldía según lo estipulado en los términos de referencia del proyecto. En la cuales se discuten los avances y retrasos presentados en cada uno de los ámbitos que

abarca el proyecto de obra de los segmentos viales en ejecución y además se exponen las dificultades presentadas en los procesos necesarios para dar inicio con la ejecución de nuevos CIV.

En el Anexo (1) se presenta las actas derivadas de cada uno de los comités comprendidos en el periodo que abarca este informe.

7.2.4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO

Se seguirá durante todas las fases del proyecto la normatividad vigente a saber:

• Manual / Cartilla Interventoría IDU.
• Cuadros de Seguimientos.

7.2.5 ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. y su equipo profesional realiza la Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y S&SO de las obras de la malla vial local en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C, del contrato de obra No. 410 de 2023 suscrito por CONSORCIO COMICROM. y tendrá en cuenta las siguientes acciones:

• Suministrar al FONDO informes periódicos, de forma semanal y realizar los controles en forma clara, correcta y precisa de los aspectos técnicos, administrativos, contables y las estadísticas.
• Autorizar los pagos de los servicios prestados por el Contratista cumpliendo con el objeto del contrato, el presupuesto del CONTRATO y los requerimientos enmarcados dentro de la Ley.
• Supervisar el trámite y cumplimiento de los respectivos procedimientos y normas requeridas en desarrollo del contrato 410 de 2022.
• Para lograr los objetivos señalados previamente, el FONDO apalancará la labor de la Interventoría mediante las siguientes acciones:
• Definir junto con la interventoría y el Contratista, el área de aferencia de los de los TRAMOS VIALES A INTERVENIR, los sitios y tipo de intervención para dar cumplimiento a su objeto.

• Dar aprobación al programa de ejecución, del plan de inversiones y del flujo de fondos del convenio.
• Destinar los recursos necesarios para cubrir los costos directos, indirectos y la Interventoría del CONTRATO.

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

TÉCNICAS

• Se realizó el acompañamiento de las actividades de obra realizando la verificación de la calidad de los materiales y el control del proceso constructivo.
• Se continua con la intervención del frente de obra de Rincón del Valle y Carmen del Sol, Diana Turbay 1 y 2 y posteriormente La Merced.
• El avance de la obra ha sido acorde con la programación presentada por parte del contratista

FINANCIERAS

• El contratista debe presentar el balance financiero mensual dentro del informe técnico por. De igual forma presentar un cuadro resumen de los costos ejecutados por segmento vial.

LEGAL

• Se le solicita al contratista continuar con el avance y entrega de las observaciones a los diseños de los segmentos viales a intervenir, para evitar retrocesos no solo técnicos sino también a su vez de tipo financiero, legal y administrativo durante el proceso de ejecución de la obra presentados en el mismo.

Anexo 1. Actas comité de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
FECHA: 05-07-23 **LUGAR:** ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA CONSTRUCCIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 410
HORA DE INICIO: 11:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:20 AM
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

CONSENTIMIENTO: El scrito firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMITÉ DE OBRA CONSTRUCCIÓN
Se da inicio al comité de obra con La siguiente información:
Los compromisos establecidos en el comité anterior
En Rincón del valle se continua con las actividades programadas. Es pertinente que a través de la alcaldía se tramite una visita del acueducto y consultoría para revisar el alcance de cambio de redes de agua.
En la Merced 1 se continua con espacio público, se termina de instalación de prefabricados en la merced 2 y se continua con asfalto para realizar una sola instalación para aproximadamente en 15 días.
En el triunfo se está trabajando en espacio público y rellenos en muros. Se debe definir si se continua con el diseño para el tema de redes de acueducto.
Se define reunión de inicio en los frentes de obra de Arrayanes y Palermo sur para el dia martes 11 de julio.
En granjas de san pablo se continua con excavaciones e instalación de muros, en la parte superior se cortó el flujo vehicular a un solo carril.
En Diana Turbay se están ejecutando las actividades programas de los andenes,
En Villas del Recuerdo se iniciaron actividades de excavación en el primer segmento, se continua con traslado de material de mejoramiento, se programa actividades de excavación para el segundo tramo. Se realizo reunión de inicio de obra. Se debe radicar la solicitud del PMT para la vía principal que se va a intervenir en este tramo.
En el área ambiental se debe fortalecer los cerramientos de los tramos, el contratista debe enviar los oficios correspondientes a las certificaciones, anexos de la 1257 para radicar el 15 de Julio.
En el área social se realizó la socialización de inicio de obra, levantamiento de actas de vecindad, se informo la adición para iniciar actas de vecindad de esta vía principal.
Se socializa adecuación de bajantes de aguas lluvias y levantar actas de compromisos.
En rincón del valle, en la bahía no se va a realizar ningún tipo de intervención, sin embargo, se manejará

el acceso con un bajo rampa, se debe programa reunión de socialización para el día martes.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Fijar reunión con acueducto para Rincón del Valle	FDLRUU	
2	Informe técnico semanal, presentarlo los días martes	Contratista Interventoría	
3	Respuesta formal al derecho de petición del tramo de la Merced	Contratista	05/07/2023
4	Delegar a una persona para capacitación documental	Contratista Interventoría	

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldia local de Rafael Uribe Uribe

FECHA: 12 Julio 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: comite de obra construccion - contrato de obra Nº 410

HORA DE INICIO: 2:20 P.M **HORA DE FINALIZACIÓN:** 3:00 PM.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El actibo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales. a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04
Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
1 de 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

se inicia comite con la siguiente infumacion.

Se realizo reunion de inicio en arcayunes y Rubermo Sur. se aclara que en Arcayunes se realiza la intervencion del tramo que inicialmente se socializo. inicio de obra lunes 24 de julio Arcayunes.

En Rincon del valle se debe citar reunion con acueducto. alcaldia sugiere continuar con las obras, dejando debidamente justificado tecnicamente.
En la zona donde se encuentra el muro se debe manejar mayor seguridad desde el area SST.

En el Triunfo se realizo actividad de fundir terrazas del costado derecho y se inicia excavacion del costado izquierdo.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Reunion con acueducto- oficio citando reunion	FDL RUU	
	evidencia señalizaciones en Rincon del valle	contratista.	
	plan de contingencia de los accesos (Personal - maquinaria)	contratista Interventoria	
