| | |
|---|---|
| **ACTA DE PAGO 1** | JULIO DE 2023 |
| **CONTRATO** | CO1.PCCNTR.4984001-442<br>S.A.M.C-011-2023 29/08/2022 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152 |
| **CONTRATISTA** | **JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**<br>C.C. 75.089.221 |
| **CONTRATANTE** | Administración Municipal de Chinchiná NIT. 890.801.133-8<br>**EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ**.<br>Representante Legal |
| **SUPERVISOR** | **ALBERTO URIBE VARON**<br>Jefe Oficina de Infraestructura |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | EL VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS FISCALES EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 SE ESTIMA EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ( $35.662.562,00) |
| **ADICIÓN Nº 01** | $ 4.430.586,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | EL VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS FISCALES EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 SE ESTIMA EN LA SUMA DE CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ( $ 40.093.148,00)<br><br>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 30628 del 09 de Marzo de 2023 ($ 37.320.248,00)<br><br>REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 41641 del 20 de enero de 2023 ($ 35.662.562,00)<br><br>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 31620 del 27 de Julio de 2023 ($ 2.772.900,00)<br><br>REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 42452 del 18 de septiembre de 2023 (4.430.586,00) |
| **VALOR DEL ACTA** | $ 40.085.889 |
| **FECHA DE INICIO** | 06/07/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 24/08/2023 |

El 02 de Septiembre de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y la supervisora, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de Obra Pública CO1.PCCNTR.4984001-442, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |
|---|---|
| OBLIGACION 1: Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico.<br><br>En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró.<br><br>La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión. | Se mantuvo durante la ejecución de las obras un RESIDENTE DE OBRA y una profesional SISO. |
| OBLIGACION 2: El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico. | Se entrega toda la información requerida: Hojas de vida del equipo profesional, APUS, AU y cronograma de obra, según lo requerido por la supervisión del contrato |
| OBLIGACION 3: Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. | N/A |
| OBLIGACION 4: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. | La supervisión realiza el seguimiento correspondiente y no tiene observación alguna durante la ejecución de la obra en cuanto a lo relacionado con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. |
| OBLIGACION 5: Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. | Se dispone en la obra de herramienta menor, equipo de mezclado y vibrador de concreto, además de los equipos necesarios para las |

JAGR

| | |
|---|---|
| | perforaciones y las inyecciones de los apuntalamientos. |
| OBLIGACION 6: Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente. | Los materiales utilizados para la obra fueron comprados en ferreterías distinguidas del municipio de Chinchiná y de la más alta calidad para la obra |
| OBLIGACION 7: Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato | El objeto del contrato se cumplió según las especificaciones y alcances entregados por el personal profesional del municipio de Chinchiná y la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS |
| OBLIGACION 8: Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. | N/A |
| OBLIGACION 9: Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. | Se realizo el seguimiento por parte de la supervisión y no se presentaron reprocesos requeridos por la entidad por cuenta de actividades defectuosas |
| OBLIGACION 10: Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras. | N/A |
| OBLIGACION 11: Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común. (Cuando aplique). | N/A |

JAGR

| | |
|---|---|
| OBLIGACION 12: Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas. | La profesional SISO siempre estuvo al tanto de la señalización que se requirió en obra y realizando recomendaciones a todo el personal para la seguridad de los trabajadores. |
| OBLIGACION 13: El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. | Se entrega la obra en perfectas condiciones de aseo según lo requiere la entidad |
| OBLIGACION 14: Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo:<br>• Avance de cada una de las actividades programadas.<br>• Cantidades de obra ejecutadas.<br>• Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.<br>• Resumen de las actividades realizadas.<br>• Actualización del programa de obra. | Se entrega informe a la supervisión con la información requerida:<br>• Avance de cada una de las actividades programadas.<br>• Cantidades de obra ejecutadas.<br>• Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.<br>• Resumen de las actividades realizadas.<br>• Actualización del programa de obra. |
| OBLIGACION 15: Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación. | Se realiza el acta de entrega final de obra junto con la supervisión y liquidación |

**CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018**

El supervisor del contrato da fe que el contratista JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 75.089.221 aportó para el pago de la presente acta soporte de pago correspondiente y se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de Septiembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

| | |
|---|---|
| **ALBERTO URIBE VARON**<br>**SUPERVISOR** | Julián Andrés Gómez Ramírez<br>**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**<br>**CONTRATISTA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALCALDIA DE CHINCHINA<br>DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8 | PROYECTO | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| | | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| | OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | APOYO SUPERVISIÓN | LEYDY ORTIZ CARVAJAL |
| | | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | ACTA 01 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | VALOR ACUMULADO | % GENERAL ACUMULADO |
| | **1.0** | **CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| | 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO) | M2 | 144 | $ 3.548,00 | $ 510.912 | 183,07 | $ 649.532 | 127,13% | $ 649.532 | 127,13% |
| | **2.0** | **CAPITULO 2 - EXCAVACIONES** | | | | | | | | | |
| | 2.1 | EXCAVACIONES | | | | | | | | | |
| | 2.1.2 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.3 | PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.3.1 | TIERRA | M3 | 15 | $ 27.395,00 | $ 410.925 | 60,50 | $ 1.657.398 | 403,33% | $ 1.657.398 | 403,33% |
| | 2.1.2.3.2 | CONGLOMERADO | M3 | 15 | $ 30.329,00 | $ 454.935 | 60,50 | $ 1.834.905 | 403,33% | $ 1.834.905 | 403,33% |
| | 2.1.3 | OTRAS EXCAVACIONES | | | | | | | | | |
| | 2.1.3.1 | TIERRA | M3 | 1,8 | $ 30.790,00 | $ 55.422 | | $ - | | | |
| | 2.2 | RELLENOS | | | | | | | | | |
| | 2.2.2 | RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS | M3 | 15 | $ 25.491,00 | $ 382.365 | | $ - | | | |
| | **3.0** | **CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | |
| | 3.1 | OBRAS EN CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | | |
| | 3.1.3 | MORTERO | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.4 | LECHADA DE INYECCIÓN RELACION A/C=0,45 CON BOMBA 70PSI | ML | 180 | $ 33.337,00 | $ 6.000.660 | 216 | $ 7.200.792 | 120,00% | $ 7.200.792 | 120,00% |
| | 3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO | | | | | | | | | |
| | 3.4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 280,8 | $ 8.039,00 | $ 2.257.351 | 336,96 | $ 2.708.821 | 120,00% | $ 2.708.821 | 120,00% |
| | 3.10 | ZANJAS O ACEQUIAS DE CORONA O MEDIA LADERA | | | | | | | | | |
| | 3.10.2 | SUELO CEMENTO 12:1 | M3 | 0,6 | $ 388.264,00 | $ 232.958 | | $ - | | | |
| | **6.0** | **CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO** | | | | | | | | | |
| | 6.2 | PERFORACION PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS | | | | | | | | | |
| | 6.2.2 | CON EQUIPO MECÁNICO | | | | | | | | | |
| | 6.2.2.1 | EN TIERRA | ML | 90,00 | $ 39.074,00 | $ 3.516.660 | 108 | $ 4.219.992 | 120,00% | $ 4.219.992 | 120,00% |
| | 6.2.2.2 | CONGLOMERADO | ML | 90,00 | $ 78.687,00 | $ 7.081.830 | 108 | $ 8.498.196 | 120,00% | $ 8.498.196 | 120,00% |
| | **7.0** | **CAPITULO 7 - ACARREOS** | | | | | | | | | |
| | 7.1 | SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR | | | | | | | | | |
| | 7.1.1 | CARGUE MANUAL | M3 | 16,8 | $ 40.228,00 | $ 675.830 | | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 7.2 | ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR | | | | | | | | | |
| | 7.2.1 | EN BUGGI FUERTE PENDIENTE | M3-HM | 8,4 | $ 23.928,00 | $ 200.995 | | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 7.2.2 | AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE | M3-HM | 4,5 | $ 99.702,00 | $ 448.659 | | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | **8.0** | **CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA** | | | | | | | | | |
| | 8.1 | TRINCHOS O EMPALIZADOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA | | | | | | | | | |
| | 8.1.2 | CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO | M2 | 52,5 | $ 75.699,00 | $ 3.974.198 | | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 8.5 | REVEGETALIZACIÓN CON ESTACAS VIVAS | | | | | | | | | |
| | 8.5.2 | CON ESTACAS DE MATARRATÓN. QUIEBRABARRIGO O SIMILAR | UN | 270 | $ 3.820,00 | $ 1.031.400 | | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | **9.0** | **CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | |
| | 9.7 | JORNALES | | | | | | | | | |
| | 9.7.3 | JORNAL POR ADMINISTRACIÓN OBRERO | DIA | 3 | $ 65.880,00 | $ 197.640 | 2,0 | $ 131.760 | 66,67% | $ 131.760 | 66,67% |
| | | **ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA** | | | | | | | | | |
| | **NP1** | ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt | UN | 4 | $ 107.198,00 | | 4 | $ 428.792 | 100,00% | $ 428.792 | 100,00% |
| | **NP2** | MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3 | M3 | 0,58 | $ 423.376,00 | | 0,58 | $ 245.558 | 100,00% | $ 245.558 | 100,00% |
| | **NP3** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZADO | M2 | 128 | $ 15.633,00 | | 131,82 | $ 2.060.742 | 102,98% | $ 2.060.742 | 102,98% |

TAGR.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALCALDIA DE CHINCHINA<br>DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8 | | PROYECTO | | | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ | | | | | | |
| | | | SUPERVISOR | | | ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | APOYO SUPERVISIÓN | | | LEYDY ORTIZ CARVAJAL | | | | | | |
| | | | CONTRATISTA | | | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ | | | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | ACTA 01 | | | | | |
| | NP4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS | ML | 7,20 | $ 26.571,00 | | 7,20 | $ 191.311 | 100,00% | $ 191.311 | 100,00% | |
| | NP5 | CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN | BTO | 31,00 | $ 32.500,00 | | 31 | $ 1.007.500 | 100,00% | $ 1.007.500 | 100,00% | |
| SUBTOTAL OBRAS | | | | | | $ 27.432.740 | | $ 30.835.299 | | $ 30.835.299 | | |
| | | ADMINISTRACION | | 25,00% | | $ 6.858.185 | | $ 7.708.825 | | $ 7.708.825 | | |
| | | IMPREVISTOS | | 0,00% | | $ - | | | | | | |
| | | UTILIDAD | | 5,00% | | $ 1.371.637 | | $ 1.541.765 | | $ 1.541.765 | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | | | **$ 35.662.562** | | **$ 40.085.889** | | **$ 40.085.889** | | |

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

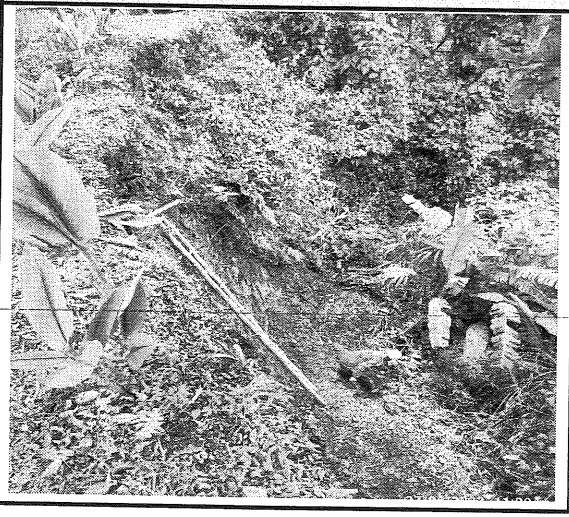
| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 7/06/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| M2 | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**1.1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | 6,43 | | 20,5 | 131,82 | 1 | 131,82 |
| | | 2,5 | | 20,5 | 51,25 | 1 | 51,25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

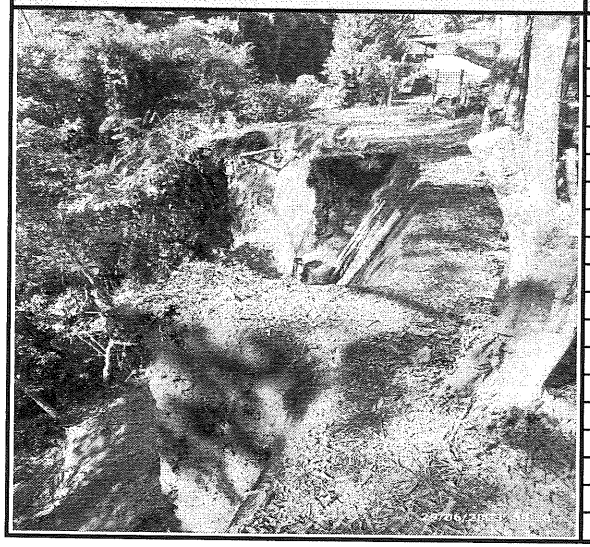
| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| M3 | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**2.1.2.3.1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL TIERRA**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | 6,43 | 0,405 | 20,5 | 53,39 | 1 | 53,39 |
| | | 0,75 | 0,55 | 2 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| | | 2,7 | 0,75 | 3,1 | 6,28 | 1 | 6,28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| M3 | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**2.1.2.3.2 Excavacion a cielo abierto para conformacion de taludes con sistema manual en Conglomerado**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | 6,43 | 0,405 | 20,5 | 53,39 | 1 | 53,39 |
| | | 0,75 | 0,55 | 2 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| | | 2,7 | 0,75 | 3,1 | 6,28 | 1 | 6,28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

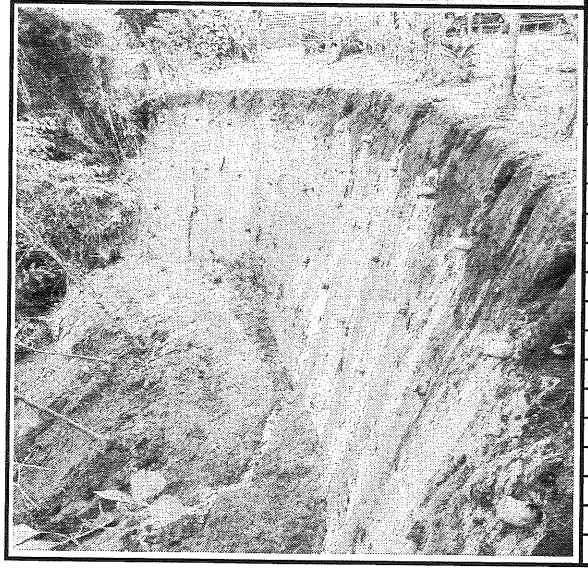
| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| ML | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**3.1.3.4 Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR | | | 6 | 6 | 12 | 72,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA | | | 6 | 6 | 12 | 72,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR | | | 6 | 6 | 12 | 72,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| KG | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**3.4.1 Suministro y colocación de acero de refuerzo**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | PESO | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR - VARILLA 5/8" | | 1,56 | 6 | 9,36 | 12 | 112,32 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA - VARILLA 5/8" | | 1,56 | 6 | 9,36 | 12 | 112,32 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR - VARILLA 5/8" | | 1,56 | 6 | 9,36 | 12 | 112,32 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 336,96 |
| | |
| TOTAL | 336,96 |

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| ML | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**6.2.2.1 Perforación para drenes y anclajes pasivos con equipo mecanico en tierra**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 108,00 |
| | |
| TOTAL | 108,00 |

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

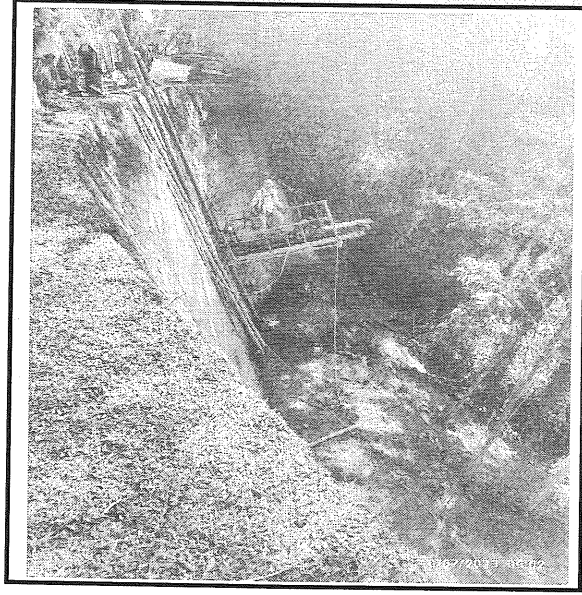
| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| ML | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**6.2.2.2 Perforación para drenes y anclajes pasivos con equipo mecanico en conglomerado**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR | | | 3 | 3 | 12 | 36,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| DIA | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| 9.7.3 Jornal por administracion Obrero | | |

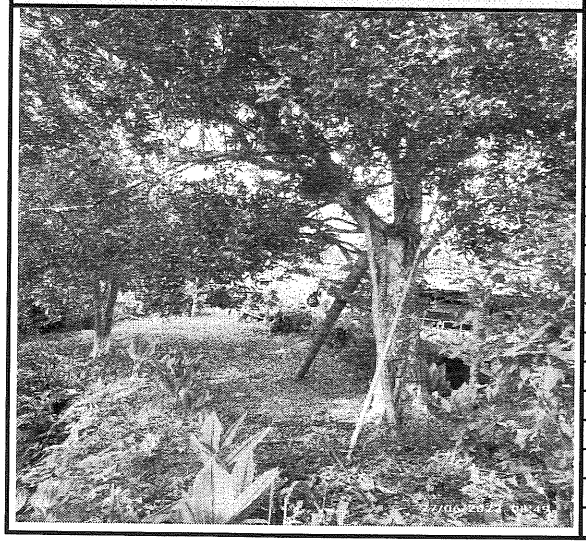
| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | DIA | | | |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA | | | 2 | 2 | 1 | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| UN | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| NP1 ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt | | |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | UN | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | | | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| M3 | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**NP2 MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | 0,08 | 0,2 | | 0,016 | 36 | 0,58 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | 0,58 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0,58 |

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

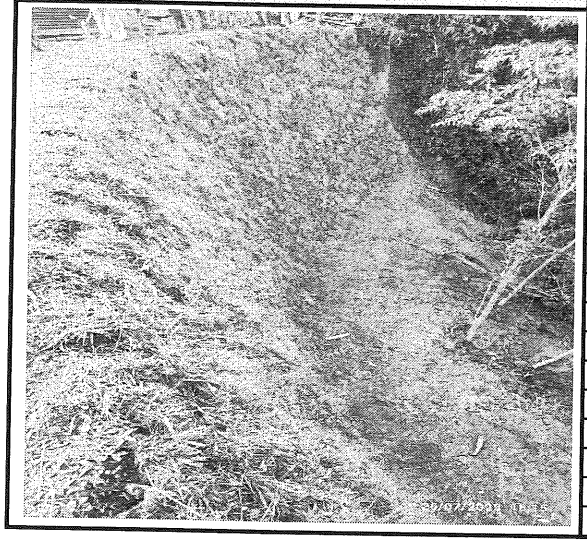
ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| M2 | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| NP3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZADO | | |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | 6,43 | | 20,5 | 131,82 | 1 | 131,82 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| ML | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |

**NP4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | LONG | | | |
|  | PREDIO FINCA BUENAVISTA | | | 0,2 | 0,2 | 36 | 7,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | 7,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 7,20 |

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

| Alcaldía de Chinchiná<br>CONSTRUYENDO REALIDADES | DEPARTAMENTO DE CALDAS<br>MUNICIPIO DE CHINCHINÁ<br>NIT-890.801.133-8<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA<br>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA. | FECHA<br>15/08/2023 | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| CONTRATISTA: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 442-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 6/07/2023 |
| PLAZO FINAL: | 24/08/2023 |

| ML | SUPERVISOR | ALBERTO URIBE VARON |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| NP5 AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN | | |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | No. DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO | ESPESOR | UN | | | |
| | PREDIO FINCA BUENAVISTA | | | 0,5 | 0,5 | 34 | 17,00 |
| | | | | 10 | 10 | 1 | 10,00 |
| | | | | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

Alcaldía Municipal de Chinchiná | CONSTRUYENDO REALIDADES

# INFORME DE OBRA

**CONTRATO 442-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152"**

**CHINCHINA, JULIO DE 2023**

## INTRODUCCIÓN

### ❖ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.**

Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la **ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN LA VEREDA GUAYABAL, PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE.**

### ❖ RESUMEN EJECUTIVO

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.**

- NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO **442-2023**
- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152
- VALOR CONTRATO: $35.662.562
- VALOR ADICIÓN: $4.430.586
- FECHA DE INICIACIÓN: 6-07-2023
- FECHA DE TERMINACIÓN: 24-08-2023
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 días

VALOR FACTURADO A LA FECHA: $0

### ❖ RESUMEN AVANCE FÍSICO.

A la fecha de corte del presente informe: 26 de julio de 2023, se da por terminadas los trabajos y se reportan las siguientes ACTIVIDADES, a saber:

Se realizó la rocería y limpieza de la zona a intervenir según indicación de la supervisión.
Se realiza la erradicación de cuatro arboles que se encuentran en la zona de influencia de la intervención y con autorización de la supervisión se procede a su corte.
Se realizan las excavaciones a cielo abierto para conformación de taludes en tierra y conglomerado, para adecuar el espacio donde se realizarán los apuntillamientos.
Se comienzan las perforaciones en 4" para los apuntillamientos del talud perfilado.
Se introduce en la perforación la varilla de 5/8" y se efectúa la inyección de lechada en relación A/C 0.45 con bomba. En esta actividad se presenta mayor consumo de cemento por las condiciones del terreno, ya que

presenta grietas que al momento de la inyección provoco un mayor consumo de la mezcla inyectada, dejando una relación de 34 perforaciones con un consumo de 0,5 bultos de cemento adicionales, otra perforación con 10 bultos adicionales y una última con un consumo adicional de 4 bultos.
Finalmente se realiza la instalación del prado para protección del talud intervenido.

Cuadro N° 01. Cantidades de obra ejecutadas en el presente informe

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MAYORES Y MENORES CANTIDADES Cant. Acum. | CANTIDAD EJECUTADA | % EJECUTADO SOBRE EL TOTAL DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro) | 144 | 183,07 | 127,13% |
| 2.1.2.3.1 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra | 15 | 60,50 | 403,33% |
| 2.1.2.3.2 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado | 15 | 60,50 | 403,33% |
| 3.1.3.4 | Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI | 180 | 216 | 120% |
| 3.4.1 | Suministro y colocación de acero de refuerzo | 280,8 | 336,96 | 120% |
| 6.2.2.1 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra | 90 | 108 | 120% |
| 6.2.2.2 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado | 90 | 108 | 120% |
| 9.7.3 | Jornal por administración obrero | 3 | 2 | 66,67% |
| | **ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA** | | | |
| NP1 | ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt | 4 | 4 | 100% |
| NP2 | MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3 | 0,58 | 0,58 | 100% |
| NP3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN | 128 | 131,82 | 102,98% |
| NP4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS | 7,2 | 7,2 | 100% |
| NP5 | AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN | 31 | 31 | 100% |

❖ **RESUMEN INVERSIONES.**

Inversión programada con corte a 26 de julio de 2023: $ 35.662.582 – 100%

Inversión ejecutada con corte 26 de julio de 2023: $ 40.085.889 – 112,4%

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

❖ **DESCRIPCIÓN GENERAL.**

| CONDICIONES INICIALES | |
|---|---|
| Número de contrato: | 442-2023 |
| Objeto: | CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152 |
| Contratista: | JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ |
| supervisor | ALBERTO URIBE VARÓN |
| Fecha del Contrato: | MAYO 18 DE 2023 |
| Plazo: | 50 DÍAS |
| Valor Inicial: | $35.662.562 |
| Fecha de Iniciación: | 6/7/2023 |
| Fecha de Terminación Contractual: | 24/08/2023 |

ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS.

Cuadro N° 02. Control de Pólizas

| GARANTÍA | NOMBRE ASEGURADORA | NUMERO POLIZA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual | SEGUROS DEL ESTADO | 42-40-101043263 | 05/07/2023 | 24/08/2023 | $232.000.000 |
| Estabilidad de la Obra | SEGUROS DEL ESTADO | 42-44-101147715 | 24/08/2023 | 24/08/2028 | $10.698.768,6 |
| Cumplimiento del Contrato | SEGUROS DEL ESTADO | 42-44-101147715 | 05/07/2023 | 24/08/2023 | $7.132.512,4 |
| Pago Salarios, prestaciones sociales | SEGUROS DEL ESTADO | 42-44-101147715 | 05/07/2023 | 24/08/2028 | $7.132.512,4 |

❖ **ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.**

A la fecha del informe no se ha presentado acta de cobro.

Cuadro N° 03. Balance del contrato de obra

| ACTA DE OBRA No. | FECHA DEL ACTA | BALANCE DEL CONTRATO | | | BALANCE DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESENTE ACTA | ACUMULADO | SALDO CONTRATO | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA | ACUMULADO | SALDO POR AMORTIZAR |
| 01 | 01-08 | $40.085.889 | $40.085.889 | $7.259 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 02 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR (Millones de $) |
|---|---|
| Valor contrato | $35.662.562 |
| Adición | $4.430.586 |
| Total Facturado | $40.085.889 |
| **Índice de Facturación** | **100%** |
| Total Pagado | $0 |
| **Índice de Pagos** | **0%** |
| Saldo por pagar a la fecha | $40.085.889 |

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Cuadro N° 04. Cantidades de obra ejecutadas acumuladas

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MAYORES Y MENORES CANTIDADES UN | Cant. Acum. | CANTIDAD ACUMULADA | % EJECUTADO SOBRE EL TOTAL DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro) | M2 | 144 | 183,07 | 127,13% |
| 2.1.2.3.1 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra | M3 | 15 | 60,50 | 403,33% |
| 2.1.2.3.2 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado | M3 | 15 | 60,50 | 403,33% |
| 3.1.3.4 | Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI | ML | 180 | 216 | 120% |
| 3.4.1 | Suministro y colocación de acero de refuerzo | KG | 280,8 | 336,96 | 120% |
| 6.2.2.1 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra | ML | 90 | 108 | 120% |
| 6.2.2.2 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado | ML | 90 | 108 | 120% |
| 9.7.3 | Jornal por administración obrero | DÍA | 3 | 2 | 66,67% |
| | **ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA** | | | | |
| NP1 | ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt | UN | 4 | 4 | 100% |
| NP2 | MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3 | M3 | 0,58 | 0,58 | 100% |
| NP3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN | M2 | 128 | 131,82 | 102,98% |
| NP4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS | ML | 7,2 | 7,2 | 100% |
| NP5 | AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN | BTO | 31 | 31 | 100% |

## AVANCE DE OBRA E INVERSIONES

Cuadro N° 05. Control de Avance Físico

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | **3,44%** | **1,58%** | **4,27%** | **22,91%** |
| | **32,20%** | | | |
| **EJECUTADO** | **100%** | | | |

Cuadro N° 06. Inversiones Realizadas

| DESCRIPCIÓN INVERSIÓN | | 26/07/2023 | JULIO |
|---|---|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA | MENSUAL | 0 | $ 11.484.840 |
| (Millones de $) | ACUMULADA | 0 | $ 11.484.840 |
| INVERSIÓN EJECUTADA | MENSUAL | 0 | $ 40.085.889 |
| (Millones de $) | ACUMULADA | 0 | $ 40.085.889 |

## CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro N° 07 Presupuesto

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD ACUMULADA | VR UNITARIO | VR. TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro) | M2 | **183,07** | **$3.548** | **$649.532** |
| 2.1.2.3.1 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra | M3 | **60,5** | **$27.395** | **$1.657.398** |
| 2.1.2.3.2 | Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado | M3 | **60,5** | **$30.329** | **$1.834.905** |
| 3.1.3.4 | Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI | ML | **216** | **$33.337** | **$7.200.792** |
| 3.4.1 | Suministro y colocación de acero de refuerzo | KG | **336,96** | **$8.039** | **$2.708.821** |
| 6.2.2.1 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra | ML | **108** | **$39.074** | **$4.219.992** |
| 6.2.2.2 | Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado | ML | **108** | **$78.687** | **$8.498.196** |
| 9.7.3 | Jornal por administración obrero | DÍA | **2** | **$65.880** | **$131.760** |

| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NP1 | ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt | UN | 4 | $107.198 | $428.792 |
| NP2 | MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3 | M3 | 0,58 | $423.376 | $245.558 |
| NP3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN | M2 | 131,82 | $15.633 | $2.060.742 |
| NP4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS | ML | 7,2 | $26.571 | $191.311 |
| NP5 | AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN | BTO | 31 | $32.500 | $1.007.500 |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO =** | **$30.835.299** |
| **ADMINISTRACIÓN =** | $7.708.825 |
| **UTILIDADES =** | $1.541.765 |
| **TOTAL =** | **$40.085.889** |

## PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

- **PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.**

| EQUIPO | |
|---|---|
| Ingeniero Residente | X |
| Ayudantes | X |
| SISO | X |

- **EQUIPOS USADOS POR EL CONTRATISTA.**

| EQUIPO | |
|---|---|
| Herramienta Menor | X |
| Equipo de perforación | X |
| Equipo de seguridad | X |
| Equipo de inyección | X |

## ESTADO DEL TIEMPO

Cuadro N° 08. Control del Estado del Tiempo

Durante el periodo de ejecución de la obra tuvimos buen estado del clima en general, solo durante algunos días se presentaron precipitaciones fuertes que no representaron retrasos en la obra.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La obra se ejecutó al 100% con un 112,4% de los recursos contratados, ya que fue necesario realizar una adición por un valor de $4.430.586.
- ✓ En el momento de la inyección por las características del terreno, se presentaron grietas que ocasionaron aumento en el consumo del cemento, situación que fue informada a la supervisión y corroborado en campo.
- ✓ Se recomienda por parte del contratista realizar una baranda o cualquier tipo de protección en la corona del talud tratado ya que, por ser un predio utilizado para el turismo y recreación, es importante velar por la seguridad de las personas que visitan la finca, teniendo en cuenta la altura del talud intervenido.
- ✓ Es importante, en una próxima intervención y cuanto antes realizar una acequia de corona para garantizar la correcta evacuación de las aguas lluvias y que corran por el predio de manera controlada. Además, le recomiendo a la entidad o al dueño del predio, según corresponda, la necesidad de revegetalizar la zona no intervenida con estacas vivas, para ir generando una cobertura vegetal que ayudara con la estabilidad de la obra entregada.
- ✓ Se recomienda no construir cerca de la zona intervenida ningún tipo de edificación ya que eso podría generar de nuevo inestabilidad en el talud reforzado.

## ANEXOS

- ➢ . REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES

Julián Andrés Gómez Ramírez

**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**
**CONTRATISTA**
**C.C 75.089.221**

# REGISTRO FOTOGRAFICO



VISITA INICIAL



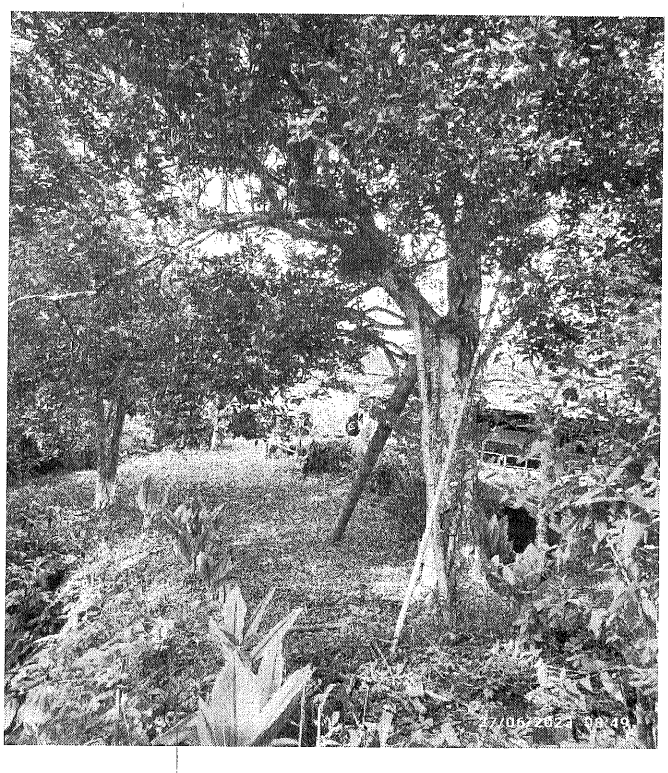
ROCERIA Y LIMPIEZA



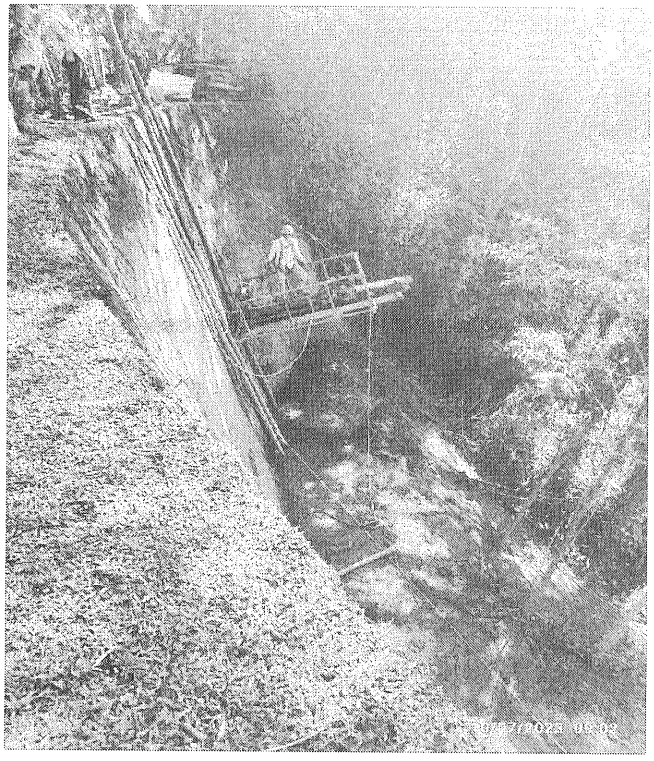



CONFORMACIÓN DE TALUDES MANUAL





ERRADICACIÓN DE ARBOLES PARA PERFILADA DE TALUD






PERFORACIONES PARA APUNTILLAMIENTOS CON EQUIPO MECANICO





INSTALACIÓN DE ACERO PARA LOS APUNTILLAMIENTOS





LECHADA DE INYECCIÓN CON BOMBA - TERMINADO DE LOS APUNTILLAMIENTOS CON TUBERIA DE 4" – MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIENTOS




SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRADO

# Certificado
# Bancario

Martes, 30 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIAN ANDRES GOMEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 75089221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 07014336383 | 2003/07/21 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14728206271

(415)7707212489984(8020) 000001472820627 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 5 0 8 9 2 2 1 | 7 | Impuestos y Aduanas de Manizales 10 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 75089221 | 1997/02/19 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Caldas 17 | Manizales 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GOMEZ | RAMIREZ | JULIAN | ANDRES |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACION

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Caldas 17 | Manizales 001 |

41. Dirección principal: CR 1 D 9 A 25 BRR VENECIA -VILLA PILAR

42. Correo electrónico: juangorra@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 | 8731601 | 8871044 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4290 | 2004/03/01 | 4210 | 2004/03/01 | 4220 | 8299 | 2142 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 18 / 09 : 55: 49

**La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.**

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14728206271

(415)7707212489984(8020) 000001472820627 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 5 0 8 9 2 2 1 | 7 | Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 79. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | | |
| 79. Ciudad/Municipio | | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 1 0 6 1 6 | | |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

**FORMATO 6**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

**(PERSONAS NATURALES)**

**REFERENCIA:** Contrato de obra No. **442-2023**.

**Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ**

Respetados Señores:

Por medio de este documento **JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ** en adelante el "Proponente" manifiesto bajo la gravedad de juramento, que he pagado los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo de Fomento a la Construcción (FIC).

A julio 31 DE 2023, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Julián Andrés Gómez Ramírez

**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

**C.C.NRO. 75.089.221**

LILIANA MARCELA CARVAJAL SALGADO

C.C. 30.230.320 DE MANIZALES

TP. 158990-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B43B50E96B18A38

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA MARCELA CARVAJAL SALGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30230320 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 158990-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

158990-T



LILIANA MARIA
CARVAJAL SANCHEZ
C.C. 30230320
RESOLUCION INSCRIPCION 149
UNIVERSIDAD [illegible]LES

FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

169601

Liliana Maria Carvajal S.

FIRMA DEL TITULAR

84932

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30230320

**CARVAJAL SALGADO**
APELLIDOS

**LILIANA MARCELA**
NOMBRES

Liliana Marcela Carvajal S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1981**
**MANIZALES**
**(CALDAS)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**F** SEXO

**28-JUN-2000 MANIZALES**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0900100-35083731-F-0030230320-20001130 **03709**00321G 02 091849822

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 75089221 | | GOMEZ RAMIREZ JULIAN ANDRES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLONIZADORES | AV BDO ARANGO 12-20 | MANIZALES-CALDAS | 8734739 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-07 | 30369678 | 9453319165 | E | 2023/07/07 | 2023/07/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $206,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $106,500 | $0 | $0 | $106,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $15,300 | $0 | $0 | $15,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $91,200 | $0 | $0 | $91,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $46,600 | $0 | $0 | $46,600 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $46,600 | $0 | $0 | $46,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $26,700 | $0 | $0 | $26,700 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 4 | $26,700 | $0 | $0 | $26,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $26,700 | $0 | $0 | $26,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $15,200 | $0 | $0 | $15,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $7,600 | $0 | $0 | $7,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $3,900 | $0 | $0 | $3,900 |
| TOTAL | | | | 4 | $206,500 | $0 | $0 | $206,500 |



2023/07/06 08:51 AM
