EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA REUVEN FEURVESTEIN No. 7**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	15	AL	21	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	4,59%	0,00%	0,00%	6	4,59%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,42%	0,66%	0,66%	7	6,42%	0,66%	$ 10.229.702	0,66%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

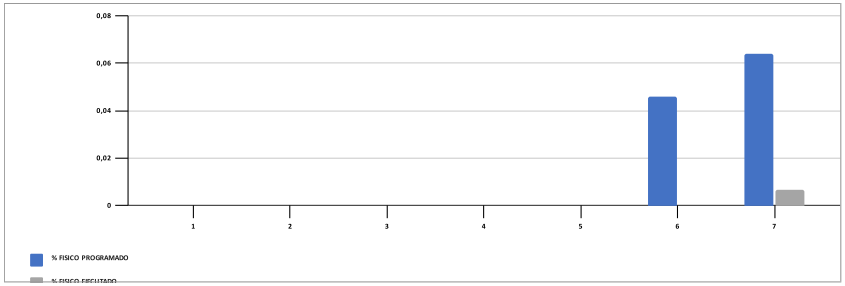

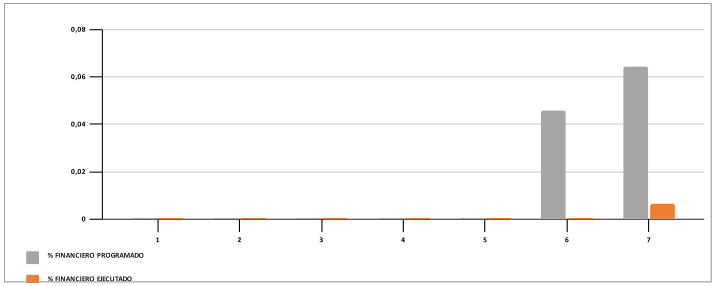

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	15/1/2023	No se ejecutaron actividades constructivas.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	16/1/2023	Se define el area a intervenir y se procede a la instalación del cerramiento provisional en laminas de zinc.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	17/1/2023	Se culminó la instalación del cerramiento provisional en laminas de zinc, posterior a esto se inició el desmonte de cielo raso.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	18/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	19/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso y demolición de muros existente, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos de demolición.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	20/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso , cubierta incluyendo su propia estructura y demolición de muros existente, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos de demolición.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA REUVEN FEURVESTEIN No. 7			Código:	IP-FM-31
				VERSION:	01
				FECHA:	6/9/2021
				Paginas:	1 de 1
REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	21/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso , cubierta incluyendo su propia estructura y demolición de muros existente, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos de demolición.	N/A	

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	67,00			26,07	$116.390	$3.034.055	26,07	40,93
3	MAMPOSTERIA									
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m.	MT2	668,57			49,62	$32.154	$1.595.353	49,62	618,95
5	CUBIERTAS									
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	427,00			102,10	$33.985	$3.469.936	102,10	324,90
6	ACABADOS									
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	456,00			102,10	$20.865	$2.130.358	102,10	353,90

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED REUVEN FEURSTEIN	Anderson Saavedra	Arq. Alexandra villareal	Herramientas menores		NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza			NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Demolicion de muros.



FOTO 2	Demolición de muros.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ALEXANDRA VILLAREAL	NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT	NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA REUVEN FEURVESTEIN** **No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	22	AL	28	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	1	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	2	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	3	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	4	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	5	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	4,59%	**0,00%**	0,00%	6	4,59%	**0,00%**	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,42%	**0,66%**	0,66%	7	6,42%	**0,66%**	$ 10.229.702	0,66%
8	22/1/2023	28/1/2023	6,42%	**0,77%**	1,43%	8	6,42%	**0,77%**	$ 11.994.084	1,43%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

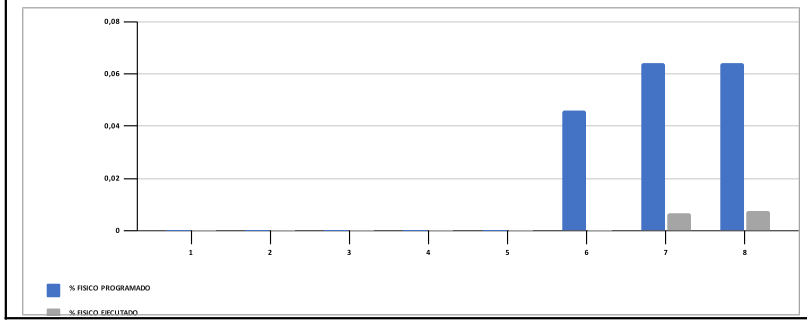

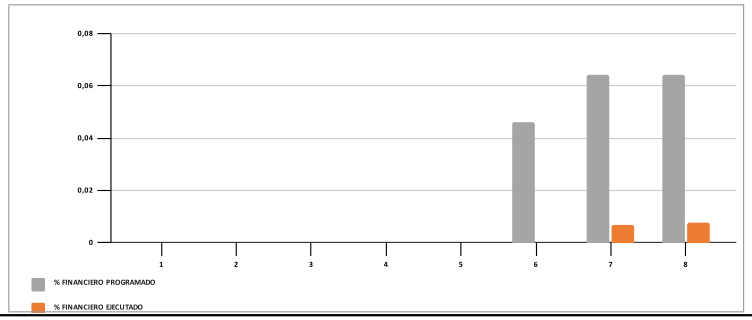

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	22/1/2023	No se ejecutaron actividades constructivas.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	**Carrera 1 B # 46 G -18**	23/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso , cubierta incluyendo su propia estructura y demolición de muros existente, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos de demolición.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA REUVEN FEURVESTEIN No. 8	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	24/1/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso , cubierta incluyendo su propia estructura y demolición de muros existente, posterior a esto se realizó limpieza y acopio de residuos de demolición.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	25/1/2023	se inició el desmonte de puertas ventanas y rejas asi como los puntos electricos existentes en la institucion educativa.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	26/1/2023	Se continuó con la demolición de vigas y columnas existentes en la estructura, paralelo a esto se realizó demolición de plantilla en concreto.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	27/1/2023	Se continuó con la demolición de vigas y columnas existentes en la estructura, paralelo a esto se realizó demolición de plantilla en concreto.	N/A
REUVEN FEUERSTEIN	Carrera 1 B # 46 G -18	28/1/2023	Se continuó con la demolición de vigas y columnas existentes en la estructura, paralelo a esto se realizó demolición de plantilla en concreto.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	67,00		26,07		$116.390	$0	26,07	40,93
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	29,78		-	2,46	$252.961	$622.284	2,46	27,32
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	570,00		-	89,43	$20.699	$1.851.112	89,43	480,57
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20,06		-	0,66	$1.894.074	$1.250.089	0,66	19,40
3	MAMPOSTERIA									
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	668,57		49,62	74,42	$32.154	$2.392.901	124,04	544,53
5	CUBIERTAS									
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	427,00		102,10	68,07	$33.985	$2.313.359	170,17	256,83
6	ACABADOS									
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	570,00		-	44,72	$16.524	$738.953	44,72	525,28
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	456,00		102,10	68,07	$20.865	$1.420.281	170,17	285,83
7	CARPINTERIA METALICA									
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15,00		-	8,00	$38.451	$307.608	8,00	7,00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15,00		-	10,00	$57.053	$570.530	10,00	5,00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	13,00		-	8,00	$32.669	$261.352	8,00	5,00
9	ELECTRICO									
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16,00		-	16,00	$16.601	$265.616	16,00	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED REUVEN FEURSTEIN	Anderson Saavedra	Arq. Alexandra villareal	Herramientas menores		NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza	Demoledor		NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA REUVEN FEURVESTEIN No. 8	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

		Andamios Certificados		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Demolición de muros en mamposteria.



FOTO 2	Desmonte de cubierta y cielo raso.



FOTO 3	Demolición de muros en mamposteria.



FOTO 4	Acopio de residuos de demolición.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ALEXANDRA VILLAREAL	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED SARID ARTETA No. 7**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	15	AL	21

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	26,32%	9,75%	9,75%	7	26,32%	9,75%	$ 2.346.442	9,75%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	15/1/2023	No se ejecutaron actividades en el frente de Obra IED SARID ARTETA	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	16/1/2023	No se ejecutaron actividades en el frente de Obra IED SARID ARTETA	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	17/1/2023	Se iniciaron actividades constructivas en la Institucion educativo, realizando limpieza general y el acopio del escombro existente, posterior a esto se procedió a la demolicion de la estructura previa al la intervencion: cuchillas de muro en sitio, plantilla en concreto, muros en mamposteria.se realizó nivelacion replanteo y señalizacion.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	18/1/2023	Se realizó el acopio del material producido durante la demolicion a la estructura existente, se inició la excavacion de zapatas.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	19/1/2023	Se continuó con la excavación para zapatas, asi como el acopio de escombros, parelo a esto se procedio a la demolicion de viga cimiento encontrada en sitio y figurado de acero	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	20/1/2023	Se culminaron las excavaciones correspondientes a las zapatas y viga de cimentacion, se realizó el acopio del material sobrante producto de las excavaciones mencionadas, paralelo a esto se continuo el figurado del acero de refuerzo para elementos estruturales (Zapatas, columnas, viga de cimentacion y vigas sobre muro), asi mismo fue producido en campo concreto limpieza (solado) para el area de las zapatas.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	21/1/2023	Limpieza de terreno, solado y armado de acero de refuerzo	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	21,00			16,60	$ 4.221	$ 70.069	16,60	4,40
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	21,00			16,00	$ 9.648	$ 154.391	16,00	5,00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	1,60			0,64	$ 252.961	$ 161.895	0,64	0,96
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	10,00			8,20	$ 20.699	$ 169.732	8,20	1,80
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	24,00			3,01	$ 93.507	$ 281.456	3,01	20,99
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	7,00			2,65	$ 54.171	$ 143.282	2,65	4,36
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	311,36			117,62	$ 9.568	$ 1.125.426	117,62	193,74

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED SARID ARTETA No. 7									Código:	IP-FM-31
										VERSION:	01
										FECHA:	6/9/2021
										Paginas:	1 de 1

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7,00			7,47	$ 32.154	$ 240.190	7,47	-	0,47

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
SARID ARTETA	Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	Demoledor	NO APLICA
		Inspector Luis Mnedoza	Tronzadora	NO APLICA
			Heramienta Menor	NO APLICA

6. RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Estado frente posterior a retiro de escombros existentes.



FOTO 2	RCD por demolicion de cuchillas de muro.



FOTO 3	Avance de obra. Estado posterior a cortes de muro y retiro de escombros y RCD



FOTO 4	Avance de excavaciones para zapatas



FOTO 5	Avance de excavaciones para zapata.



FOTO 6	Estado de avance del frente

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	NOMBRE DANIEL EBRATT	NOMBRE DANIEL EBRATT
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED SARID ARTETA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	22	AL	28	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS		AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0		0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	26,32%	9,75%	9,75%	7	26,32%	9,75%	$ 2.395.602		9,75%
8	22/1/2023	28/1/2023	30,58%	22,21%	31,96%	8	30,58%	22,21%	$ 5.454.228		31,96%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	22/1/2023	No se ejecutaron actividades en el frente de Obra IED SARID ARTETA	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	23/1/2023	Interventoria solicita hacer correctivos sobre el armado del acero dado que no fue realizado conforme a los diseños.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	24/1/2023	Se continuan los correctivos en armado del acero según indicaciones de interventoria.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	25/1/2023	Se realizó instalacion del acero de refuerzo correspondiente a la cimentacion y se procede a fundir cimentaciones tipo zapata tal como especifica en los planos aprobados por la entidad contratante. Se toman cilindros para ensayo de compresion.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	26/1/2023	Se culminó el figurado de acero para refuerzo de elementos estructurales, paralelo a esto se realizó la instalacion del acero de refuerzo para de viga de cimentacion asi como el enconfrado y posterior vaciado de concreto mezclado en obra para este elemento. Se toman nuevamente cilindros para prueba de compresion.	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	27/1/2023	Inició el levante de muro en bloque vibrado de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,4, reforzado con dovelas espaciadas un (0,8) metro..	N/A
SARID ARTETA	Carrera 18 # 47-72	28/1/2023	Se continuó con el levante de muro en bloque vibrado de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,4, reforzado con dovelas espaciadas 0,8 m.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	21,00	0,00	16,60	-	$ 4.221	-	16,60	4,40
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	21,00	0,00	16,00	-	$ 9.648	-	16,00	5,00
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	1,60	0,00	0,64	-	$ 252.961	-	0,64	0,96
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	10,00	0,00	8,20	-	$ 20.699	-	8,20	1,80
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	24,00	0,00	3,01	-	$ 93.507	-	3,01	20,99
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	7,00	0,00	2,65	2,65	$ 54.171	143.282,30	5,29	1,71
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	311,36	0,00	117,62	176,44	$ 9.568	1.688.139,65	294,06	17,30
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0,90	0,00	0,00	0,75	$ 894.392	670.794,00	0,75	0,15
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	9,60	0,00	0,00	12,60	$ 27.186	342.543,60	12,60	- 3,00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	1,34	0,00	0,00	1,00	$ 813.350	813.350,00	1,00	0,34

3	MAMPOSTERIA										
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m.	MT2	7,00	0,00	7,47	-	$	32.154	-	7,47	- 0,47
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	30,00	0,00	0,00	16,73	$	100.669	1.684.192,37	16,73	13,27

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
SARID ARTETA	Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	Trompo	NO APLICA
		Inspector Luis Mnedoza	Tronzadora	NO APLICA
			Heramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Preliminares para mezcla.



FOTO 2	Conformación de Armado estructural.



FOTO 3	Acopio de material sobrante IED SARID ARTETA y zapatas en tiempo de fraguado,



FOTO 4	Acero de Refuerzo para zapatas , viga de cimentacion y columnas.



FOTO 5	Armado de encofrado para viga de cimentación.



FOTO 6	Levante de Muro en bloque vibrado y anclaje de dovelas.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	NOMBRE DANIEL EBRATT	NOMBRE DANIEL EBRATT
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 7**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	15	AL	21	

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,98%	6,18%	6,18%	7	6,98%	6,18%	$ 18.024.405	6,18%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	15/1/2023	Levantamiento Topografico	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	16/1/2023	Levantamiento Topografico	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	17/1/2023	Levantamiento Topografico	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	18/1/2023	Levantamiento Topografico	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	19/1/2023	Levantamiento Topografico	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	20/1/2023	Se inician actividades constructivas Demolicion de muro de Cerramiento existente y delimitacion del espacio de trabajo nivelacion y replanteo.	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	21/1/2023	Se avanza con actividades de excavacion para construcción de elementos estructurales del muro y figurado de acero	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**177,00**		0	**53,10**	$ 4.221	$ 224.135	**53,10**	**123,90**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL**	DIA	**177,00**			**5,00**	$ 454.545	$ 2.272.725	**5,00**	**172,00**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**59,00**			**59,00**	$ 23.673	$ 1.396.707	**59,00**	-
2	**ESTRUCTURA**	**0**	**0**			-		**$ -**	**0**	**0**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE**	MT3	**24,33**			**4,05**	$ 93.507	$ 378.984	**4,05**	**20,28**
3	**MAMPOSTERIA**	**0**	**0**			-		**$ -**	**0**	**0**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA**	MT2	**575,25**			**118,85**	$ 32.154	$ 3.821.503	**118,85**	**456,40**
							VALOR DE OBRA	8.094.053,87		
							INCIDENCIA	6,18%		

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 7**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED INOCENCIO CHINCA	Arq. Anderson Saavedra	Arq. Alexandra Villareal	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza.		

6. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Demolicion de Muro Existente en IED Inocencio Chinca



FOTO 2	Demolicion de Muro Existente en IED Inocencio Chinca

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT	NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	22	AL	28	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,98%	6,18%	6,18%	7	6,98%	6,18%	$ 18.024.405	6,18%
8	22/1/2023	28/1/2023	16,28%	45,80%	51,98%	8	16,28%	45,80%	$ 133.611.664	51,98%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	22/1/2023	Contiuan actividades constructivas de excavacion manual y se hace construcción de cimentacion dos columnas perimetrales y se funden	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	23/1/2023	Se avanza con excavacion para cimentaciones y el figurado de acero correspondiente. Se coloca concreto de limpieza y se funde viga cimiento y se hace encofrado y fundida de dos columnas.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	24/1/2023	Se continuan excavaciones manuales y se hace demolicion de elementos estructurales de cimentacion existentes en sitio, evidenciados durante excavacion. Se avanza con figurado de acero para zapatas y columna. Se funde solado asi como la zapata 3	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	25/1/2023	Avanzan actividades de excavación para cimentación, figurado de acero, concreto de limpieza (solado) y la construcción de las mismas. Continuan las demoliciones de viga cimiento y elementos estructurales existentes y se funde tramo de viga cimiento nuevos y columna 3	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	26/1/2023	Se avanza como excavaciones manuales y se funde la cuarta zapata y viga de cimentacion entre zapata 3 y 4. Se inicia levante de muro hasta altura de viga cinta. Se funde Zapata numero 5, columna 4 y primer tramo de viga cinta.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	27/1/2023	Se avanza con la excavacion de 4 zapatas siguentes y se avanza con figurado de acero y se funden zapatas 6,7 y 8 asi como viga de cimentacion entre 5-6. Avanzan labores de levante de muro y fundida de viga cinta	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	28/1/2023	Continuan labores de excavacion para zapatas 9 y 10. Asi mismo se identifica arbol que interfiere en la construcción de muro y se comunicó al ente responsable. Se avanza con fundida de 2 columnas y viga de cimentacion entre zapatas 6 y 8	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	177		53,1	35,40	$ 4.221	$ 149.423	88,50	88,50
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	177		5	-	$ 454.545	$ -	5,00	172,00
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	59		59	-	$ 23.673	$ -	59,00	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	177		0	48,32	$ 25.396	$ 1.227.135	48,32	128,68
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	121,84		0	8,14	$ 252.961	$ 2.059.103	8,14	113,70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	24,33		4,053	22,29	$ 93.507	$ 2.084.411	26,34	- 2,01

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 8	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	5,31		0	13,59	$ 192.928	$ 2.621.988	13,59	-	8,28
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	34,7		0	18,39	$ 54.171	$ 996.313	18,39		16,31
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	6631,87		0	3.454,98	$ 9.568	$ 33.057.287	3.454,98		3.176,89
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7,08		0	3,45	$ 894.392	$ 3.085.652	3,45		3,63
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	11,02		0	2,98	$ 1.742.818	$ 5.193.598	2,98		8,04
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	5,31		0	0,66	$ 1.894.074	$ 1.245.543	0,66		4,65
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	6,8		0	3,20	$ 813.350	$ 2.602.785	3,20		3,60
3	MAMPOSTERIA										
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	575,25		118,85	-	$ 32.154	$ -	118,85		456,40
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	575,25		0	56,39	$ 100.669	$ 5.676.524	56,39		518,86
11	URBANISMO										
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	80		0	-	$ 67.760	$ -	-		80,00
								VALOR DE OBRA	$ 59.999.762		
								INCIDENCIA	45,80%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED INOCENCIO CHINCA	Arq. Anderson Saavedra	Arq. Alexandra Villareal	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza.	Trompo	NO APLICA
			Tronzadora	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Excavacion de zapatas



FOTO 2	Formaleta para columnas



FOTO 3	figuracion de acero de refuerzo.



FOTO 4	Vaciado de columnas

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 5	Excavaciones viga de cimentacion.	**FOTO 6**	Desencofrado columnas
			
FOTO 7	Vaciado viga de cimentación.	**FOTO 8**	Levante de muro en bloque liso de concreto

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	1	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	22	AL	28	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	1	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	2	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	3	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	4	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	4,31%	**0,00%**	0,00%	5	4,31%	**0,00%**	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	6,03%	**0,00%**	0,00%	6	6,03%	**0,00%**	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,03%	**0,00%**	0,00%	7	6,03%	**0,00%**	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	6,03%	0,99%	0,99%	8	6,03%	**0,99%**	$ 41.464.800	0,99%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

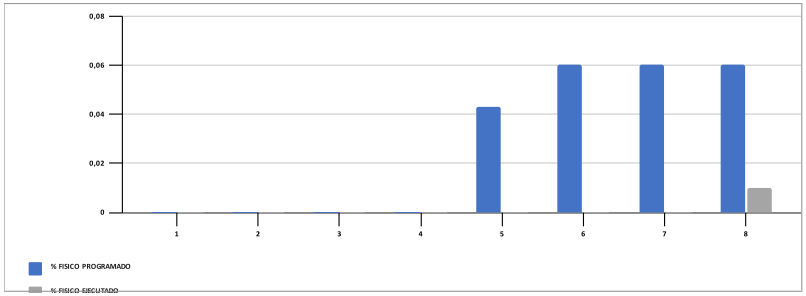

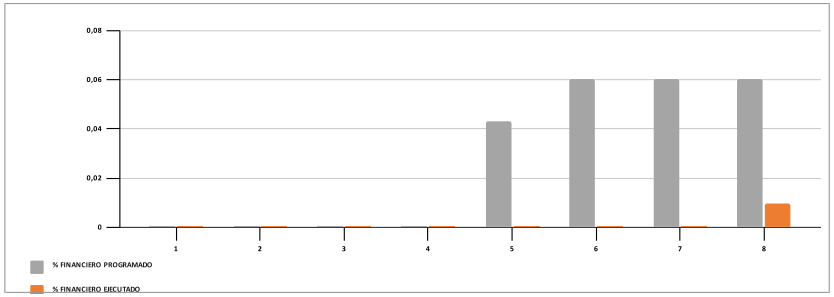

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	22/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	23/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	24/1/2023	Se inició con la delimitación y demarcación del área a intervenir. Escarificación y limpieza de muros del bloque 1	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	25/1/2023	Escarificación y limpieza de muros del bloque 2	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	26/1/2023	Limpieza de cubierta , así como Verificación de niveles de desagües	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	27/1/2023	Se continuó con limpieza de cubierta y se procedió a la imprimación de losa de cubierta para manto	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	28/1/2023	Se continuó con limpieza de cubierta y se procedió a la imprimación de losa de cubierta para manto	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013		-	2.552,76	$4.221	$10.775.200	2.552,76	- 539,76
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805,2		-	2.370,42	$9.648	$22.869.812	2.370,42	- 1.565,22
5	CUBIERTAS									
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692		-	131,98	$59.248	$7.819.788	131,98	1.560,02

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED NUEVO BOSQUE	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas Menores		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 — Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS



FOTO 2 — Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 8**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FOTO 1	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS	**FOTO 2**	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS





FOTO 3	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS	**FOTO 4**	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS





FOTO 5	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS	**FOTO 6**	Imprimacion de loza para manto IED NUEVO BOQUE PIES DESCALZOS

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE Daniel Cantillo**
CARGO Residente Interventoria	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO Director de Interventoria**

ANEXO 7 POLIZAS CIED

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.03 11:16:55 -05:00

Código de Seguridad: WMh1UMDlP3NlkWP1atCUuw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061924	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28324270	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2022	24:00 Horas Del	31/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IE DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.646.712-7
DIRECCIÓN	CARRERA 60 N 72 45	**TELÉFONO**	3209202091
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR SA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.091.140-4
DIRECCIÓN	VIA 40 N°73-290 PISO 9 CENTRO DE NEGOCIOS MIX	**TELÉFONO**	3605148
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR SA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.091.140-4
DIRECCIÓN	VIA 40 N°73-290 PISO 9 CENTRO DE NEGOCIOS MIX	**TELÉFONO**	3605148

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN PRORROGA NO. 1 DE FECHA 29/12/2022 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-EDU-0001-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 31/01/2024	269.990.532,00	367.483,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 31/07/2026	202.492.899,00	271.618,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028	269.990.532,00	363.932,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 742.473.963,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.003.033,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.003.033,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	190.576,00
TOTAL A PAGAR	$	1.193.609,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061924	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28324270	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2022	24:00 Horas Del	31/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - H.M. INGENIERÍA S.A.S NIT: 800187291 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS NIT: 901013669 (PART. 40,0 %)
INTEGRANTE 3 - HG INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S NIT: 900497862 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IE DISTRITO)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061924** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO IE DISTRITO** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR SA / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR SA** , expedida por la Compañía en **03/01/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **03** días del mes **ENERO** del año **2023.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	28324270

Fecha de Facturación	03/01/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BQ–100061924
Periodo Facturado	06/12/2022 — 31/07/2028

Fecha Límite de Pago	02/02/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	1.003.033,00
IVA	190.576,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.193.609,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO IE DISTRITO
CARRERA 60 N 72 45	901646712
Intermediario	CONASEGUROS EXPRESS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/02/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	28324270

Fecha de Facturación	03/01/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BQ–100061924
Periodo Facturado	06/12/2022 — 31/07/2028

Fecha Límite de Pago	02/02/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	1.003.033,00
IVA	190.576,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.193.609,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO IE DISTRITO
CARRERA 60 N 72 45	901646712
Intermediario	CONASEGUROS EXPRESS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000028324270(3900)000001193609(96)20230202

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990028324270(3900)000001193609(96)20230202

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.03 11:20:00 -05:00

Código de Seguridad: NCIQ2D/cjtKtBbklYRdaJg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100016492	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28324273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2022	24:00 Horas Del	31/07/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IE DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.646.712-7
DIRECCIÓN	CARRERA 60 N 72 45	**TELÉFONO**	3209202091
ASEGURADO	CONSORCIO IE DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.646.712-7
DIRECCIÓN	CARRERA 60 N 72 45	**TELÉFONO**	3209202091
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN PRORROGA NO. 1 DE FECHA 29/12/2022 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-EDU-0001-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	134,995,266.00	269,990,532.00	269.990.532,00	377.247,00
PATRONAL	80,997,159.00	80,997,159.00	80.997.159,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	80,997,159.00	80,997,159.00	80.997.159,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	80,997,159.00	80,997,159.00	80.997.159,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 269.990.532,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	377.247,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	377.247,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	71.677,00
TOTAL A PAGAR	$	448.924,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100016492	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28324273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2022	24:00 Horas Del	31/07/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - H.M. INGENIERÍA S.A.S NIT: 800187291 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS NIT: 901013669 (PART. 40,0 %)
INTEGRANTE 3 - HG INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S NIT: 900497862 (PART. 30,0 %
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IE DISTRITO) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO IE DISTRITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	28324273

Fecha de Facturación	03/01/2023		**Fecha Límite de Pago**	02/02/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	377.247,00
Póliza No.	BQ–100016492		**IVA**	71.677,00
Periodo Facturado	06/12/2022	31/07/2023	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	448.924,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO IE DISTRITO	
CARRERA 60 N 72 45		901646712
Intermediario	CONASEGUROS EXPRESS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/02/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	28324273

Fecha de Facturación	03/01/2023		**Fecha Límite de Pago**	02/02/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	377.247,00
Póliza No.	BQ–100016492		**IVA**	71.677,00
Periodo Facturado	06/12/2022	31/07/2023	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	448.924,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO IE DISTRITO	
CARRERA 60 N 72 45		901646712
Intermediario	CONASEGUROS EXPRESS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000028324273(3900)000000448924(96)20230202

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990028324273(3900)000000448924(96)20230202

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 8 RELACION DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA

Barranquilla, 3 de enero de 2023

CIED-2022-011

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Entrega de Documentos Técnicos

Respetados ingenieros:

Por medio de la presente, en seguimientos de los compromisos asumidos en el comité realizado el 26 de diciembre de 2022, les solicitamos hacer entrega de la documentación técnica acordada, diseños, presupuesto y programación de obra, de las instituciones Inocencio Chinca, Sarid Arteta, Nuevo Bosque - Pies Descalzos y Reuven F. La entrega de dicha información se fijó el viernes 30 de diciembre de 2022, no obstante, no se cuenta con la información completa de las instituciones en mención. Recordamos que esta información es indispensable para el inicio de actividades constructivas, motivo por el cual, solicitamos atender dichos compromisos y hacer entrega de Diseños, Presupuestos y Cronograma de Obra de dichas instituciones para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradecemos la celeridad en la entrega de documentos.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 5 de enero de 2023

CIED-2022-012

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Entrega de Documentos Técnicos

Cordial saludo,

Por medio de la presente en cumplimiento de las funciones y obligaciones como Interventoría asignada Contrato de Obra EDU-345-2022, cuyo objeto es AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, reiteramos la importancia del compromiso pactado en el comité del día 26 de diciembre de 2022, solicitado previamente través del comunicado CIED-2022-011. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente de la institución Inocencio Chinca, por lo tanto, les solicitamos hacer entrega de la documentación técnica acordada, diseños, presupuesto y programación de obra, de la institución. Recordamos que esta información es indispensable para el inicio de actividades constructivas, y es menester remitir la información solicitada según lo estipulado en el Contrato de Obra EDU-345-2022 a través de su CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, motivo por el cual, solicitamos atender dichos compromisos y remitir la documentación en un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su respectiva revisión y aprobación.

Para su conocimiento y fines pertinentes. Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 5 de enero de 2023 **CIED-2022-013**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud de inicio de actividades Jesús de Nazareth Sede 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos iniciar labores en la institución Jesús de Nazareth Sede 2, teniendo en cuenta que luego de múltiples visitas, estudios de viabilidad y las socializaciones, se ha dado aval de inicio de actividades en el bloque 1. Así mismo, sobre dicha institución se ha discutido reiteradamente la necesidad de atender e iniciar las labores, por lo cual en cumplimiento de las funciones y obligaciones como Interventoría asignada Contrato de Obra EDU-345-2022, les solicitamos el inicio de actividades de forma inmediata y allegar la información del personal que estará en el frente de trabajo.

Sin otro particular, agradecemos actuar con la celeridad y cuidado requerido para iniciar las intervenciones dentro de los alcances

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 5 de enero de 2023 **CIED-2022-014**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación de Actividades IED Reuven Feuerstein

Respetados ingenieros:

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra, en relación a la intervención propuesta sobre en la institución relacionada en el asunto, nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de dichos documentos de modo que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas. Adjunto a la presente, se encuentran adjuntos los documentos en mención:

- Estudio y Diseño Estructural
- Estudio de Suelos
- Presupuesto
- Cronograma de Obra

.

Sin otro particular, Cordialmente,

Marcela Patricia Blquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Estudio y Diseños estructurales. Estudio de Suelos, Programación y Presupuesto

Barranquilla, 5 de enero de 2023 **CIED-2022-015**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación de Actividades IED Nuevo Bosque Pies Descalzos

Respetados ingenieros:

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra el 4 de enero de 2023, presupuestos y cronograma de obra en relación a la intervención propuesta sobre en la institución relacionada en el asunto, en conformidad con los alcances y modificaciones discutidas en los comités de seguimiento de obra de diciembre 19 de 2022 , 26 de diciembre de 2022 y recorrido en campo el 30 de diciembre de 2022, nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de presupuesto y cronograma de obra de modo que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas. Adjunto a la presente, se encuentran adjuntos los documentos en mención.

Así mismo nos permitimos remitir la aprobación preliminar de las actividades No Previstas relacionadas en el presupuesto y alcances de obra:

NP 1	Suministro e instalación de alimentador en 3N°250(F)+1N°4/0(N)+1N°4/0(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-01. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 2	Suministro e instalación de alimentador en 3N°350(F)+1N°250(N)+1N°250(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-02. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 3	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4/0(F)+1N°2/0(N)+1N°1/0(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-03. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 4	Suministro e instalación de alimentador en 3N°12 Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 3/4" para unidades interiores de aire acondicionado. Incluye accesorios.
NP 5	Suministro e instalación de alimentador en 3N°10 Cu PE LS-FR-HF y tubería IMC de 3/4" para unidades exteriores de aire acondicionado. Incluye accesorios.
NP 6	Suministro e instalación de alimentador en 2N°6+1N°10 Cu PE LS-FR-HF y tubería IMC de 1" para unidades exteriores de aire acondicionado. Incluye accesorios.
NP 7	Suministro e instalación de alimentador en 2N°8+1N°10 Cu PE LS-FR-HF y tubería IMC de 3/4" para unidades exteriores de aire acondicionado. Incluye accesorios.
NP 8	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4+1N°8 Cu PE LS-FR-HF y tubería IMC de 1-1/2" para unidades exteriores de aire acondicionado. Incluye accesorios.

NP 9	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6+1N°8 Cu PE LS-FR-HF y tubería IMC de 1-1/2" para unidades exteriores de aire acondicionado. Incluye accesorios.
NP 10	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU
NP 11	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU
NP 12	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 24 MBH *2 - 24000 BTU
NP 13	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 24 MBH *6 - 24000 BTU
NP 14	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH - 36000 BTU
NP 15	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 - 60000 BTU
NP 16	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 30 MBH *2 - 60000 BTU
NP 17	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH *2 - 60000 BTU
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE EN TUBERIA EMT 3/4 Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 20X20X15 METALICA
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30X15 METALICA
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA TRIFASICA EN CABLE DE CU EN 3 X N 8 AWG LS-HFFR
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA TRIFASICA EN CABLE DE CU EN 3 X N 4 AWG (3 FASES)+1 N 8 AWG LS-HFFR
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA TRIFASICA EN CABLE DE CU EN 3 X N 6 AWG (3 FASES)+1 N 8 AWG LS-HFFR
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA TRIFASICA EN CABLE DE CU EN 2 X N 12 AWG (2 FASES)+1 X N 12 AWG LS-HFFR
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA TRIFASICA EN CABLE DE CU EN 2 X N 10 AWG (2 FASES)+1 X N 10 AWG LS-HFFR
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LQ 3/4" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN TUBERIA EMT 3/4, EN CABLE 3*12 AWG CU, CORAZA LQ 3/4, DEMAS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR EN TUBERIA EMT 3/4, EN CABLE 3*12 AWG CU, CAJA 4X4 RAWELT, DEMAS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
NP 30	Suministro e instalación de alimentador en 3N°250(F)+1N°4/0(N)+1N°4/0(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-01. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 31	Suministro e instalación de alimentador en 3N°350(F)+1N°250(N)+1N°250(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-02. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 32	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4/0(F)+1N°2/0(N)+1N°1/0(T) AL PE LS-FR-HF desde ML PPAL hasta TE-HVAC-03. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40 3"
NP 34	SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLEROTABLERO TE-HVAC-01
NP 35	SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLEROTABLERO TE-HVAC-02
NP 36	SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLEROTABLERO TE-HVAC-03
NP 37	PROTECTORES DE VENTANERIA EN MALLA MANUFACTURADA EN VARILLA DE 1/4", VARILLAS VERTICALES @50MM Y VARILLAS HORIZONTALES DOBLES @200MM, MARCO PERIMETRAL EN TUBERÍA DE 76MMX38MM CAL14 (2MM DE ESPESOR), DIVISIONES VERTICALES EN PLATINAS DE 3"X3/16", FIJACIONES EN ANGULOS DE 2-1/2"X3/16"X3" LONGITUD, ANCLAJES EN BARRA ROSCADA B7X150MM DE 5/8" Y ANCLAJE QUIMICO ANCHOR FIX O SIMILAR. SISTEMA DE PROTECCIÓN TIPO DUPLEX, GALVANIZADA EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y PINTADA EN BASE EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO
NP 38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONCERTINA DE 18" DE DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12
NP 39	Suministro, transporte e instalacion de LAVADO QUIRURGICO en acero inoxidable ref 3042B cal 16 de 0.56x0.90m, para griferia de pedal. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
NP 40	Suministro, transporte e instalacion de LAVA OLLAS en acero inoxidable ref 3042B cal 16 de Seccion interior 0.80x0.80 y 0.60m de altura. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

NP 41	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO 1.80X0.60M con POZUELO 0.40X0.50M en acero inoxidable ref 3042B cal16, apoyado sobre patas en acero inoxidable. Incluye Entrepaño inferior a 0.20m de altura respecto del piso acabado, frente regruesado 4cms y salpicadero de 10cms. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
NP 42	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO de 3100x600mm + salpicadero H=0.10M con entrepaño y un pozuelo semiindustrial de 650x400x170 montada 6 patas en acero inox cl16 con niveladores en acero inox ref3042B. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 43	Suministro, transporte e instalación de MESON RECTO de 4350x600mm + salpicadero H=0.10M sin pozuelo con entrepaño montada 6 patas en acero inox cl16 con niveladores en acero inox ref3042B. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 44	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO de 4350x600mm + salpicadero H=0.10M con dos pozuelos de 650x40x170 con entrepaño montada 6 patas en acero inox cl16 ref3042B con niveladores en acero inox. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 45	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO Meson de Meson de 2250X600mm con entrepaño y un pozuelo semi industrial de 650x400x170 montada 6 patas en acero inox cl16 ref3042B con niveladores en acero inox salpicadero de 10cms. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 46	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO 2.85X0.60M con POZUELO 0.40X0.50M en acero inoxidable cal 20 ref3042B, apoyado sobre Mueble inferior en madera aglomerada, incluye frente regruesado 4cms y salpicadero de 10cms. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 47	Suministro, transporte e instalación de MESON RECTO de 2100x600mm con entrepaño montada 6 patas en acero inox cl16 ref3042B con niveladores en acero inox SIN Salpicadero. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 48	Suministro, transporte e instalacion de MESON RECTO entre 1.90 y 2.00MX0.60M de ancho sin POZUELO, en acero inoxidable cal16ref3042B, apoyado sobre patas en acero inoxidable. Incluye Entrepaño inferior a 0.20m de altura respecto del piso acabado, frente regruesado 4cms y salpicadero de 10cms. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 49	Suministro, transporte e instalación de MESON RECTO1.10X0.60M sin POZUELO, en acero inoxidable cal16ref3042B, apoyado sobre patas en acero inoxidable. Incluye Entrepaño inferior a 0.20m de altura respecto del piso acabado, frente regruesado 4cms y salpicadero de 10cms. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

NP 50 Suministro, transporte e instalación de Mesón de 6.65mtsx0.50mts de largo x0.90mts de altura, con cubierta superior en lámina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE 16, con tres cubetas especial de 0.50 mts de largo x0.35mts de ancho x0.30mts de profundidad, en lámina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE 18, con estructura de doce patas en tubo ornamental de acero inoxidable de11/2" de diámetro con sistema para ajuste de nivel y entrepaño en acero Inoxidable CALIBRE20. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

NP 51 Suministro, transporte e instalación de Mesón de 6.50mtsx0.50mts de largo x0.90mts de altura, con cubierta superior en lámina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE16, con tres cubetas especial de 0.50mts de largo x0.35mts de ancho x0.30mts de profundidad, en lámina de acero inoxidable AISI TIPO 304 CALIBRE 18, con estructura de doce patas en tubo ornamental de acero inoxidable de 11/2"de diámetro con sistema para ajuste de nivel y entrepaño en acero Inoxidable CALIBRE 20. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

NP 52 Suministro, transporte e instalación de Pozuelo (Cubeta)especial para submontar en acero inoxidable Cal 18AISI304 de 0,60mtsx0,45mtsx0,30mts de profundidad medidas externas,0.56 mtsx 0.39mtsx 0.30mts de profundidad medidas internas. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

NP 53 Cárcamo en acero inoxidable. Cárcamo para interiores transitable compuesto por contenedor canoa y tapa con perforaciones en acero inoxidable AISI304. Ancho 20cm por longitud variable según planos detalle de cocina. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

NP 54 Suministro, transporte y colocación de cerramiento para canchas polideportivas con 5.5m de altura, en malla eslabonadas intética (nylón), ojo 5,5cm, estructura de soporte PTE8"x8"X5,5mm, tubería PTS calibre14, horizontales en tubería de 8cm*4cm, verticales entubería de 6cm*12cm, platinas de anclaje de 20*20cm*1/4", y platina de 1*1/4" cociendo la malla, incluye pintura anticorrosivo y esmalte. Incluye argollas para colocar malla nylon, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Sin otro particular, Cordialmente,

Marcela Patricia Buquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:Presupuesto, Programación de Obra, APUs de actividades no previstas.

Barranquilla, 5 de enero de 2023 **CIED-2022-016**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación de Actividades IED Sarid Arteta

Respetados ingenieros:

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra, en relación a la intervención propuesta sobre el tramo colapsado del muro de cerramiento en zona posterior de la institución relacionada en el asunto, nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de dichos documentos, de modo que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas. Adjunto a la presente, se encuentran adjuntos los documentos en mención como sigue:

- Diseño Propuesto para el Muro
- Presupuesto
- Cronograma de Obra

.

Sin otro particular, Cordialmente,

Marcela Patricia Buquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Diseño de Muro, Presupuesto, Cronograma

Barranquilla, 5 de enero de 2023 **CIED-2022-017**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Entrega de Información Contractual

Respetados ingenieros:

Por medio de la presente, dentro las funciones de seguimiento como Interventoria al Contrato de Obra EDU-345-2022, me permito solicitar nuevamente la entrega de documentación contractual requerida en áreas SST y Ambiental. Dichos documentos son esenciales para el desarrollo de las actividades contratadas, por lo cual, solicitamos nuevamente la entrega de la documentación relacionada a continuación:

- Documentación de gestores de residuos convencionales, peligrosos, y RCD.
- Documentos de las fuentes de materiales a utilizar el proyecto (registro minero, RUCOM, LICENCIA AMBIENTAL o aprobación del instrumento ambiental aprobado para la cantera).
- Documentación de los sitios de disposición o Receptores de RCD

- Certificado de la evaluación inicial del sistema de gestión por parte del contratista en base a la resolución 0312 del 2019 del ministerio de trabajo.
- Resolución de maquinaria y equipos a utilizar con sus respectivos documentos y hojas de vida.
- Radicado del generador de RCD y registro de vehículos a utilizar para el transporte desde la obra hacia el sitio de disposición final
- Exámenes de ingreso o periódicos de los trabajadores del proyecto.
- Certificados de afiliación al sistema de protección social (ARL-EPS-AFP)
- Documentación del responsable del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades.

Agradecemos dar respuesta a este comunicado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 05 de enero de 2023 **CIED-2022-018**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Respuesta al comunicado IP-01196

Respetados ingenieros:


Por medio de la presente, me permito hacer entrega de la siguiente información solicitada, ratificando el aval y aprobación de esta Interventoría sobre los mismos, para que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas. Adjunto a la presente, se encuentran anexos los documentos relacionados a continuación:

- Plan de Gestión Social.
- Documentación del responsable del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades.
- Matriz de identificación de peligros, evaluaci6n y controles de riesgos (IPERC).
- Diligenciamiento y remisión del perfil sociodemográfico del personal.
- Entrega de la matriz de elementos de protección personal por cargo, matriz en la cual se establezcan los E.P.I que deben ser usados como medida de intervención ante los riesgos específicos a los cuales se expondrán los trabajadores, teniendo en cuenta los tipos de actividades realizadas por cada cargo, conforme a lo definido en la Resolución 312 de 2019.

Los documentos relacionados a continuación se encuentran en revisión y corrección por parte del Contratista de Obra y se espera la entrega con las correcciones solicitadas con fecha de entrega ante Interventoría al 12/1/2023.

- Plan De Manejo De Tráfico si Aplica
- Plan de Manejo Ambiental
- Remitir el plan de gesti6n del riesgo según el Decreto 2157 de 2017 Artículo 2.3.1.5.2.1 que establece que las empresas del sector público y privado deben identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actuales y futuras) de sus instalaciones y aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno. Así mismo, este Plan les permite dar respuesta a los desastres que puedan presentarse en su organización o áreas de influencia.
- Matriz de requisitos legales

Sin otro particular, Cordialmente,



Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito:

Barranquilla, 6 de enero de 2023 **CIED-2022-019**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimento de las funciones de seguimiento de esta Interventoría asignada al Contrato de Obra EDU-345-2022, solicitamos la entrega del Informe Mensual de Obra con los respectivos anexos correspondientes al mismo. Recordamos que la entrega de dicha documentación se discutió en el comité de seguimiento realizado el 26 de diciembre del 2022, donde se convino la entrega de los informes dentro de los primeros cinco (5) días del mes y hace parte de los requisitos que se encuentran contemplados en la CLÁUSULA 7: FORMA DE PAGO del Contrato de Obra, según sigue: "Cada pago debe estar precedido de recibo a satisfacción expedido por el interventor del contrato y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: Memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultado de laboratorios realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de disposición de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos". En tal sentido, solicitamos la entrega de la información requerida en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de este comunicado.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

CIED-2023-020

Barranquilla, 13 de enero de 2023

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación de demolición y reconstrucción en Jesús de Nazareth Sede 2

Respetados Ingenieros,

Una vez revisada la información radicada por el Contratista de Obra el día 29 de diciembre de 2022, a través de su oficio CED-006-2022 relacionando la propuesta de intervención de la Institución Educativa Jesús de Nazareth Sede 2, donde se propone la demolición y reconstrucción total de bloques de aulas, conforme a lo conversado en la socialización realizada el día 6 de diciembre de 2022 y discutido a los comités de seguimiento posteriores hasta la fecha, nos permitimos remitir la aprobación de presupuestos y cronograma de obra, para que estos sean validados por la entidad y proceder a las actividades constructivas.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 13 de enero de 2023 **CIED-2023-021**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación de Actividades IED Inocencio Chinca

Respetados ingenieros:

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra a traves de su comunicado CED-003-2023 remitido el 10 de enero de 2023, relacionando la intervención propuesta sobre el muro de cerramiento afectado en la institución relacionada en el asunto, nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de diseños, presupuestos y cronograma de obra, de modo que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas.

Así mismo, se aprueba la realización de actividades No Previstas de Geotextil y actividad de Empedrado según los requerimientos recibidos en la mesa de trabajo desarrollada el 12 de diciembre de 2022. Adjunto a la presente, se encuentran los documentos en mención:

Sin otro particular, Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Diseño Estructural, Estudio de Suelos, Programación, Presupuesti

Barranquilla, 19 de enero de 2023 **CIED-2022-022**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.


Asunto: Aprobación de Actividades

Respetados ingenieros:

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra, presupuestos y cronograma de obra, entregados a la interventoria por medio de los comunicados PRESUPUESTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRANQUILLA y CED-2023-018, respectivamente, con relación a las intervenciones propuestas sobre las siguientes instituciones educativas: IED CARLOS MEISEL, IED CEB 161, IED LA LIBERTAD, IED JOSE EUSEBIO CARO, IED CASTILLO DE ALBORAYA, IED LA NORMAL SUPERIOR. Nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de toda la documentación de modo que esta sea validada por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas.
Adjunto a la presente, se encuentran adjuntos los documentos en mención.

Sin otro particular,

Cordialmente,



Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 25 de enero de 2023 **CIED-2023-024**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Informe Mensual de Interventoría No. 1

Respetados ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimento de nuestros compromisos contractuales, se hace entrega del Informe Mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Se anexan _ Folios

Barranquilla, 25 de enero de 2023 **CIED-2023-025**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Compromisos

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las funciones asignadas como interventoría al Contrato de Obra EDU-345-2022 les solicitamos tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento de los compromisos pactados. Recordamos que el cumplimiento de los estos es fundamental para el correcto desarrollo de este contrato, por lo cual les solicitamos nuevamente la entrega de los documentos técnicos pertinentes para proceder a la revisión y aprobación de estos. En tal sentido, nos permitimos relacionar los compromisos en mención con las fechas acordadas de entrega:

Entrega de APU Contractuales de Capítulos: 6. Acabados, 7. Carpintería Metálica, 8. Carpintería de madera, 9. Eléctrico, 10. Hidráulico, aguas lluvias y agua potable, 11. Urbanismo	14/Enero/2023
Estudios y Propuesta de Solución Hidráulica Inocencio Chincá	18/ Enero/ 2023
Estudios y propuesta de Solución Hidráulica Sarid Arteta	18/ Enero/2023
Entrega de Presupuestos y Cronograma José Eusebio Caro - Intervención de emergencia	23/ Enero/ 2023
Inicio de Intervención en Colegio Mayor	23/ Enero/ 2023
Entrega de Presupuestos y Cronograma Manuel Elkin Patarroyo	24/ Enero/ 2023
Estudios y Propuesta de Solución Hidráulica Eduardo Santos	25 / Enero/ 2023

Así mismo, permanecemos atentos a la entrega de los compromisos asumidos para entrega en las próximas fechas, según sigue:

Entrega de Presupuestos y Cronograma Juan de Acosta Solera	26/ Enero / 2023
Estudios y Propuesta de solución Hidráulica Nuevo Bosque	27 / Enero / 2023
Entrega de Presupuestos y Cronograma José Eusebio Caro– Fase 1 (Alcances incluidos en Comité 20/01/2023)	30/ Enero / 2023

Finalmente, recordamos la entrega del Informe Mensual del Mes de Enero con los correspondientes anexos de este (Informes Semanales, Bitácoras, Ensayos, etc.) y suministro de cotizaciones como respaldo de los APU para validación de actividades No previstas en los frentes que corresponda.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 26 de enero de 2023 **CIED-2023-026**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Aprobación de presupuesto IED LA LIBERTAD

Respetados Ingenieros;

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestra obligación como interventoría del contrato de obra EDU-345-2022. Una vez culminada la revisión de la documentación enviada por parte del contratista de obra, ratificamos la aprobación del presupuesto para la intervención de la Institución Educativa La Libertad. Anexo a la presente el presupuesto revisado y aprobado.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Presupuesto IED LA LIBERTAD

Barranquilla, 27 de enero de 2023 **CIED-2023-027**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Revisión de presupuestos entregados

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en atención a los compromisos asumidos y cumplimiento con las obligaciones y funciones de seguimiento asignadas a esta interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado CED-022-2023, ENTREGA PRESUPUESTOS EMERGENCIAS MANUEL ELKIN PATARROYO Y JOSE EUSEBIO CARO, recibido el día 26 de enero del 2023, señalando varios aspectos a considerar.

Para el caso de IED Manuel Elkin Patarroyo, en congruencia con lo conversado en el comité de seguimiento el día de ayer (26/01/2023), los alcances a contemplar incluyen las actividades propias de obra nueva de muro de cerramiento, con dimensiones estimadas de 51ml y 3,5m de alto; excluyendo actividades de intervención sobre el muro existente. Dicho alcance, sin embargo, no se identifica con claridad en las actividades relacionadas en el documento suministrado.
Así las cosas, solicitamos la entrega de levantamiento del muro en cuestión, donde se ratifique la propuesta de intervención y nuevamente la entrega de presupuestos y cronograma ajustados a esta, para proceder a la validación de este alcance y asignación de recursos.
De manera similar, y atendiendo la inquietud manifestada a través de su comunicado CED-027-2023, donde se indica *"... la importancia de realizar en cada muro de cerramiento o muro de contención un análisis estructural, ya que, las recomendaciones geotécnicas varían en cada muro de acuerdo con el tipo de suelo encontrado, teniendo variaciones en la capacidad portante del suelo, los parámetros de diseño del muro, recomendaciones del tipo de cimentación a usar y su proceso constructivo, variación en la geometría, las cargas laterales a las cuales estará sometido y variaciones en las alturas."* reiteramos la recomendación de tomar las precauciones y medidas preventivas para mantener la integridad de la infraestructura existente y asegurar la estabilidad y funcionamiento de muro por construir.

Por otra parte, sobre la intervención en la Institución José Eusebio Caro - Etapa de emergencia, les recordamos la entrega de cotizaciones de soporte de la actividad No Prevista relacionada: CONCRETO DE 4000 PSI PARA REPARACION DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKA MORTERO 122, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA, para proceder a la validación y aprobación de lo entregado.

Sin otro particular, permanecemos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 27 de enero de 2023 **CIED-2023-028**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Propuesta de Cubiertas

Respetados Ingenieros;

Por medio de la presente, en atención a los compromisos asumidos y cumplimiento con las obligaciones y funciones de seguimiento asignadas a esta interventoría, luego de validar la información recibida el 26/1/2023, a través del comunicado CED-024-2023: HOMOLOGACIÓN PARA LA TIPIFICACIÓN DE LOS PERFILES PARA LAS CUBIERTAS, y los anexos de ficha técnica del proveedor de láminas termoacústicas suministrado, Ajover Ondulada , referencia indicada para las intervenciones asignadas, nos permitimos de la manera más respetuosa remitir la aprobación de la tipificación de perfiles propuesta para cubiertas, de modo que estos sean validados por la entidad y proceder al desarrollo de las actividades constructivas.

Cabe destacar que cada diseño de cubierta está ligado especificaciones técnicas de estructura, materiales y condiciones particulares de cada institución, por lo cual la aprobación de los perfiles recomendados es válida únicamente ante el estricto cumplimiento de las condiciones contempladas en el presente ejercicio. Adjunto a la presente, se encuentran los documentos en mención.

Sin otro particular,

Cordialmente

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Ficha técnica y cotización.

Barranquilla, 31 de enero de 2023 **CIED-2023-029**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración de Compromisos

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimento de las funciones como interventoría del contrato de obra EDU-345-2022, le solicitamos dar respuesta al comunicado CIED-2023-027, enviado el 27/Enero/2023. En dicho comunicado, se relacionaron varios pendientes que se tenían a la fecha conforme a los compromisos que se asumieron durante los comités de seguimiento de obras, de los cuales no se ha recibido la documentación solicitada ni retroalimentación al respecto, por lo cual, les solicitamos responder el presente oficio relacionando los documentos requeridos o el estado de avance de los mismos. Les recordamos que esto es indispensable para proceder a la ejecución correcta de las obras contratadas, por lo que solicitamos que dicha respuesta sea enviada en un periodo no superior a tres (3) días hábiles posterior a la radicación de este comunicado. Adjunto a la presente relacionamos nuevamente los compromisos que permanecen sin respuesta:

Entrega de APU Contractuales de Capítulos:7. Carpintería Metálica, 8. Carpintería de madera, 9. Eléctrico, 10. Hidráulico, aguas lluvias y agua potable.	14/Enero/2023
José Eusebio Caro (Intervención de emergencia) – Anexo de cotizaciones de soporte para Actividades No Previstas	23/ Enero/ 2023
Inicio de Intervención en Colegio Mayor	23/ Enero/ 2023
Entrega de correcciones de presupuestos y Cronograma Manuel Elkin Patarroyo	24/ Enero/ 2023
Entrega de Presupuestos y Cronograma Juan de Acosta Solera	26/ Enero / 2023
Entrega de Presupuestos y Cronograma José Eusebio Caro– Fase(Alcances incluidos en Comité 20/01/2023)	30/ Enero / 2023
Presupuesto actualizado Castillo de la Alboraya	30/ Enero / 2023

Finalmente, recordamos la entrega del Informe Mensual del Mes de Enero con los correspondientes anexos de este (Informes Semanales, Bitácoras, Ensayos, etc.)

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Se anexan _ Folios

RECIBIDA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: **901.638.239 - 0**

Barranquilla, 24 de enero de 2023 **CED-20-2022**

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
Barranquilla

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: INFORME MENSUAL AMBIENTAL – SST, VERSIÓN 2, INFORME SOCIAL E INFORME TECNICO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de manera formal a lo correspondiente con la documentación técnica mencionada en el asunto. Posterior a esto, el informe presenta los siguientes anexos.

ANEXOS GESTIÓN AMBIENTAL

Documentación	Anexo
Informe Ambiental Mensual No.1	Anexo. Excel
Resolución 1257 de 2021.	Anexo 01. Formato único para la formulación e implementación del programade manejo ambiental de RCD
Programa de Residuos de Construcción y Demolición.	Anexo. PDF
Diligenciamiento de Formato de Inscripción de Generador de RCD a Barranquilla verde	Anexo 01. REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD

CRA 106 #50 – 67
+653093483.
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

	Anexo 02. FORMATO DE REGISTRO DE PROYECTOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
GESTOR DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD	Anexo. Resolución 2920 del 04 de noviembre de 2022. Barranquilla Verde
GESTOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS (Baños portátiles)	Anexo. Resolución Licencia Ambiental 1043 del 02 de agosto de 2018 Otros anexos.

ANEXOS SST

Documentación	Anexo
Informe Ambiental SST No.1	Anexo. Excel
Autoevaluación de estándares mínimos, Resolución 0312.	Anexo PDF – EXCEL
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	Anexo PDF.
Carta de Convocatoria con formación del comité – COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Anexo PDF
Matriz Legal	Anexo PDF.

ANEXOS SOCIAL

Informe social No. 1	Anexo. PDF - Excel

ANEXO TÉCNICO

Informe social No. 1	Anexo PDF

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 12 de enero de 2023

CED-012-2023

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
Atn. Dr. Marcela Baquero

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: INFORME No. 1 Ambiental Y SST

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega en medio digital del informe No. 1 Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al periodo comprendido del 06 de diciembre al 22 de diciembre del año 2022.

Anexo: lo anunciado.

agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 16 de enero de 2023

CED-013-2023

Señores

CONSORCIO IE DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RADICADO DE OFICIO RELACIONADO CON TRAMITE PRESENTADO A BARRANQUILLA VERDE PARA PERMISO DE TALA- REF. A JESUS DE NAZARETH SEDE 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente de manera formal hago envió del radicado relacionado con el tramite de permiso ambiental que corresponde a la tala del árbol ubicado dentro de las instalaciones del colegio Jesús de Nazareth sede 2, el cual se tramito en las entidades de la autoridad ambiental BARRANQUILLA VERDE.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Samira Elías	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 13 de enero de 2023

CED-013-2023

Señores

BARRANQUILLA VERDE

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO DE TALA. Trasplante o reubicación de árbol existente en área donde se hará actividades constructivas para ubicación de nuevos salones en la institución Jesús de Nazareth Sede 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente de manera formal solicitamos a la entidad BARRANQUILLA VERDE proceso de seguimiento y autorización para proceder con actividad de tala o poda de árboles con relación a ÁRBOL existente en área donde se deben realizar actividades constructivas para la adecuación de los nuevos salones del colegio Jesús de Nazareth sede 2, relacionada con el proyecto referenciado en este oficio, por lo cual, notificamos a la entidad BARRANQUILLA VERDE solicitando de manera amable lo requerido para tramite de lo mencionado en el asunto.

20234000010212

BARRANQUILLA VERDE

Fecha Rad: 2023-01-13 16:54 - Usu Rad: 32738507
Destino: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Rem/Des: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL CRISTIAN JIMENEZ
Asunto: SOLICITUD DE PERMISO DE
No.Folios: 2 - Desc.Anexos:

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0



Ubicación: Jesús de Nazareth Sede 2.

El árbol esta ubicado dentro del salón, lo cual obstruye con las actividades de mejoramiento que se le realizara a la zona de los salones del colegio mencionado.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Samira Elías	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: **901.638.239 - 0**

Barranquilla, 16 de enero de 2023

CED-014-2023

Señores

CONSORCIO IE DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: Entrega de APU'S

Cordial saludo,

Por medio de la presente de manera formal hago envió de lo relacionado con documentación técnica contractual del proyecto referenciado que corresponde a los APU.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Samira Elías	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CED-021-2023

Barranquilla, 25 de enero de 2022

Señores

CONSORCIO IED DISTRITO.

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: PLANOS TOPOGRAFICOS IED INOCENCIO CHINCÁ – IDE SARID ARTETA – IDE NUEVO BOSQUE – IDE EDUARDO SANTOS SEDE 2.

Cordial saludo,

Por medio la presente, se remiten los planos topográficos de las IDE Inocencio Chincá – Sarid Arteta – Nuevo Bosque – Eduardo Santos.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: **901.638.239 - 0**

Barranquilla, 24 de enero de 2023 **CED-022-2023**

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
Barranquilla

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: ENTREGA PRESUPUESTOS EMERGENCIAS MANUEL ELKIN PATARROYO Y JOSE EUSEBIO CARO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de manera formal el presupuesto de los colegios mencionados en el asunto.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
+653093483.
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 26 de enero de 2023

CED-026-2023

Señores

EDUBAR S.A.

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: HOJAS DE VIDA PROFESIONALES IED MAYOR DE BARRANQUILLA Y DEL CARIBE 1932.

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjuntamos a este documento las hojas de vida de los profesionales que desarrollaran actividades en la IED Mayor de Barranquilla y del Caribe 1932.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 30 de enero de 2023

CED-028-2023

Señores

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA BAQUERO APONTE
REPRESENTANTE LEGAL
BARRANQUILLA

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RELACIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE VECINDAD.

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan el listado de viviendas, identificadas durante los levantamientos de actas de vecindad, aledaña al Colegio Jesús de Nazareth sede 2.

Se anexa: informe general con registro fotográfico.

ITEM	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO
1	IED INOCENCIO CHINCA	cra 23 Los andes	LOS ANDES
2	IE FUNDACIÓN PIES DESCALZOS	Cra 7 con calle 75 Bosque	EL BOSQUE
3	IEJOSE EUSEBIO CARO	Cra 33 No 45-125	CHIQUINQUIRA
4	IED SARID ARTETA	Cra 18 No 47-72 El carmen	EL CARMEN
5	GABRIEL CICEDO	Calle 47B No 18-113	EL CARMEN
6	WALTER SEGUNDO DE LA HOZ	CRA 19 No 47-45	EL CARMEN
7	IED REUVEN FEUERSTEIN	CRA 1E No 46G-18	CIUDADELA 20 JULIO
8	ANGELA MERCADO FLOREZ	CL 46G No 1B 118	CIUDADELA 20 JULIO
9	DONALDO SARMIENTO RUIZ	CL 46G No 1B 12	CIUDADELA 20 JULIO
10	ENALBA MERCADO FLOREZ	CL 46G No 1B 112	CIUDADELA 20 JULIO
11	FABIO PEREZ	CL 46G No 1B 102	CIUDADELA 20 JULIO
12	HUMBERTO MERCADO	CL 46G No 1B 02	CIUDADELA 20 JULIO
13	NERYS BARROS DE LEON	CL 46G No 1B 18	CIUDADELA 20 JULIO
14	WILMER CRECIENTE DIAZ	CL 46G KRA 1B 2	CIUDADELA 20 JULIO

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

IP-00008

Barranquilla, 04 de enero del 2023

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: REITERACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE COMITÉS.

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito reiterar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante los diferentes espacios de reunión y comités de seguimiento. A la fecha, no se ha recibido la información completa necesaria para dar a inicio a las actividades en el marco del contrato de obra **No. EDU-345-2022**, en los frentes:

1. INOCENCIO CHINCÁ
2. SARID ARTETA DE VÁSQUEZ
3. REUVEN FEUERSTEIN
4. NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS

Recordamos que lo anterior es compromiso adquirido en los espacios de seguimiento antes mencionados y el no cumplimiento de estos en las fechas establecidas supone retrasos en el inicio de ejecución de las actividades de obra propias del contrato, por lo que solicitamos tomar las acciones correctivas necesarias para que la información requerida sea enviada en un término de dos (2) días hábiles.

Atenta a su respuesta y colaboración.

Cordialmente

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Supervisor
EDUBAR S.A.
Proyectó: Evert Salgado
Revisó: Santiago Jaramillo

Powered by CamScanner

ANEXO 9 ENSAYOS INTERVENTORIA

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

Barranquilla, FEBRERO 25 DE 2023

Señores
COLEGIO INOCENCIO CHINCA
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los ensayos de rotura de cilindros de concreto a la compresión de la obra, COLEGIO INOCENCIO CHINCA CALLE 53D- CARRERA 23, Estamos remitiendo (9) ensayos de rotura de cilindros.

LOCALIZACIÓN	FUNDIDO	EDAD DIAS	F ENSAYO	CARGA LBS	AREA PUL²	RESISTENCIA PSI
ZAPATA 4-5 – VIGA CIMENTACION TRAMO 3 ENTRE ZAPATAS 3 – 4, COLUMNA 4, VIGA CINTA TRAMO 1 ENTRE COLUMNA 1 - 2	01-26-23	7	02-02-23	37710	28.27	3000
ZAPATA 4-5 – VIGA CIMENTACION TRAMO 3 ENTRE ZAPATAS 3 – 4, COLUMNA 4, VIGA CINTA TRAMO 1 ENTRE COLUMNA 1 - 2	01-26-23	14	02-09-23	97531	28.27	3450
ZAPATA 4-5 – VIGA CIMENTACION TRAMO 3 ENTRE ZAPATAS 3 – 4, COLUMNA 4, VIGA CINTA TRAMO 1 ENTRE COLUMNA 1 - 2	01-26-23	28	02-23-23	52754	28.27	4200
ZAPATA 6-7-8, VIGA CIMENTACION TRAMO 4 -5, ENTRE ZAPATAS 4-5 – 5-6, VIGA CINTA TRAMO 2 C2-C3	01-27-23	7	02-03-23	120148	28.27	4250
ZAPATA 6-7-8, VIGA CIMENTACION TRAMO 4 -5, ENTRE ZAPATAS 4-5 – 5-6, VIGA CINTA TRAMO 2 C2-C3	01-27-23	14	02-10-23	101206	28.27	3580
ZAPATA 6-7-8, VIGA CIMENTACION TRAMO 4 -5, ENTRE ZAPATAS 4-5 – 5-6, VIGA CINTA TRAMO 2 C2-C3	01-27-23	28	02-24-23	52165	28.27	4150
VIGA CIMENTACION 6-7-8 ENTRE ZAPATAS 5-6-7-8, VIGA CINTA TRAMO 3-4-5-6(C3-C4-C5-C6-C7), COLUMNA 5-6-7-8	01-28-23	7	02-04-23	81903	28.27	2900
VIGA CIMENTACION 6-7-8 ENTRE ZAPATAS 5-6-7-8, VIGA CINTA TRAMO 3-4-5-6(C3-C4-C5-C6-C7), COLUMNA 5-6-7-8	01-28-23	14	02-11-23	111666	28.27	3950
VIGA CIMENTACION 6-7-8 ENTRE ZAPATAS 5-6-7-8, VIGA CINTA TRAMO 3-4-5-6(C3-C4-C5-C6-C7), COLUMNA 5-6-7-8	01-28-23	28	02-25-23	117734	28.27	4200

Nota: se requiere 4.000 PSI a la compresión a 28 días.

Atentamente,

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
C.C. No. 8.677.331 de Barranquilla
M.P. No. 08202-12555 del Atlántico

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

Barranquilla, FEBRERO 28 DE 2023

Señores
COLEGIO INOCENCIO CHINCA
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los ensayos de rotura de cilindros de concreto a la compresión de la obra, COLEGIO INOCENCIO CHINCA CALLE 53D- CARRERA 23, Estamos remitiendo (9) ensayos de rotura de cilindros.

LOCALIZACIÓN	FUNDIDO	EDAD DIAS	F ENSAYO	CARGA LBS	AREA PUL²	RESISTENCIA PSI
ZAPATA 9-10-11, VIGA CINTA TRAMO 7(C7-C8,C9),	01-29-23	7	02-05-23	86393	28.27	3056
ZAPATA 9-10-11, VIGA CINTA TRAMO 7(C7-C8,C9),	01-29-23	14	02-12-23	109489	28.27	3873
ZAPATA 9-10-11, VIGA CINTA TRAMO 7(C7-C8,C9),	01-29-23	28	02-26-23	116896	28.27	4135
COLUMNA 9-10, VIGA CINTA TRAMO 9- C9-C10, TRAMO 10-C10-C11, VIGA CIMIENTO TRAMO 9-10 (Z8-Z9-Z10)	01-30-23	7	02-06-23	86025	28.27	3043
COLUMNA 9-10, VIGA CINTA TRAMO 9- C9-C10, TRAMO 10-C10-C11, VIGA CIMIENTO TRAMO 9-10 (Z8-Z9-Z10)	01-30-23	14	02-13-23	100301	28.27	3548
COLUMNA 9-10, VIGA CINTA TRAMO 9- C9-C10, TRAMO 10-C10-C11, VIGA CIMIENTO TRAMO 9-10 (Z8-Z9-Z10)	01-30-23	28	02-27-23	116642	28.27	4126
COLUMNA # 11	01-31-23	7	02-07-23	89050	28.27	3150
COLUMNA # 11	01-31-23	14	02-14-23	103185	28.27	3650
COLUMNA # 11	01-31-23	28	02-28-23	115341	28.27	4080

Nota: se requiere 4000 PSI a la compresión a 28 días.

Atentamente,

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
C.C. No. 8.677.331 de Barranquilla
M.P. No. 08202-12555 del Atlántico

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

Barranquilla, MARZO 25 DE 2023

Señores
COLEGIO INOCENCIO CHINCA
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los ensayos de rotura de cilindros de concreto a la compresión de la obra, COLEGIO INOCENCIO CHINCA CALLE 53D- CARRERA 23, Estamos remitiendo (9) ensayos de rotura de cilindros.

LOCALIZACIÓN	FUNDIDO	EDAD DIAS	F ENSAYO	CARGA LBS	AREA PUL²	RESISTENCIA PSI
COLUMNA # 1 - 2	01-23-23	7	01-30-23	37486	28.27	2980
COLUMNA # 1 - 2	01-23-23	14	02-06-23	48394	28.27	3850
COLUMNA # 1 - 2	01-23-23	28	02-20-23	53548	28.27	4260
ZAPATA # 3	01-24-23	7	01-31-23	49525	28.27	2940
ZAPATA # 3	01-24-23	14	02-07-23	48520	28.27	3860
ZAPATA # 3	01-24-23	28	02-21-23	53422	28.27	4250
VIGA CIMENTACION TRAMO 2 ENTRE ZAPATA 2 – 3 COLUMNA # 3	02-25-23	7	03-04-23	85573	28.27	3027
VIGA CIMENTACION TRAMO 2 ENTRE ZAPATA 2 – 3 COLUMNA # 3	02-25-23	14	03-11-23	109009	28.27	3856
VIGA CIMENTACION TRAMO 2 ENTRE ZAPATA 2 – 3 COLUMNA # 3	02-25-23	28	03-25-23	115539	28.27	4087

Nota: se requiere 4.000 PSI a la compresión a 28 días.

Atentamente,


FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
C.C. No. 8.677.331 de Barranquilla
M.P. No. 08202-12555 del Atlántico

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

Fernando Fragoso Carranquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: COLEGIO INOCENCIO CHINCA *MUESTRA:* COLEGIO INOCENCIO CHINCA
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN*
LOCALIZACIÓN: *CALLE 53D- CARRERA 23 BARRANQUILLA ATLANTICO* FECHA ENERO 20 2023

PRUEBA	1	2	3	4	5
No. DE GOLPES	125	125	125		
HUMEDAD DESEADA %	6.8	9.8	12.8		
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	6.8	6.8	6.8		
HUMEDAD ADICIONAL %	—	3.0	6.0		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	2500	2500	2500		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	2340	2340	2340		
AGUA ADICIONAL C.C.	—	75	150		
MOLDE No.	1	1	1		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	3680	3860	3760		
PESO DEL MOLDE GRS	1952	1952	1952		
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	1728	1908	1808		
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	6.8	9.8	12.8		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	1617	1737	1602		
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	3.56	3.82	3.53		
VOLUMEN DEL MOLDE CM^3	940	940	940		
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM^3	1.72	1.84	1.70		

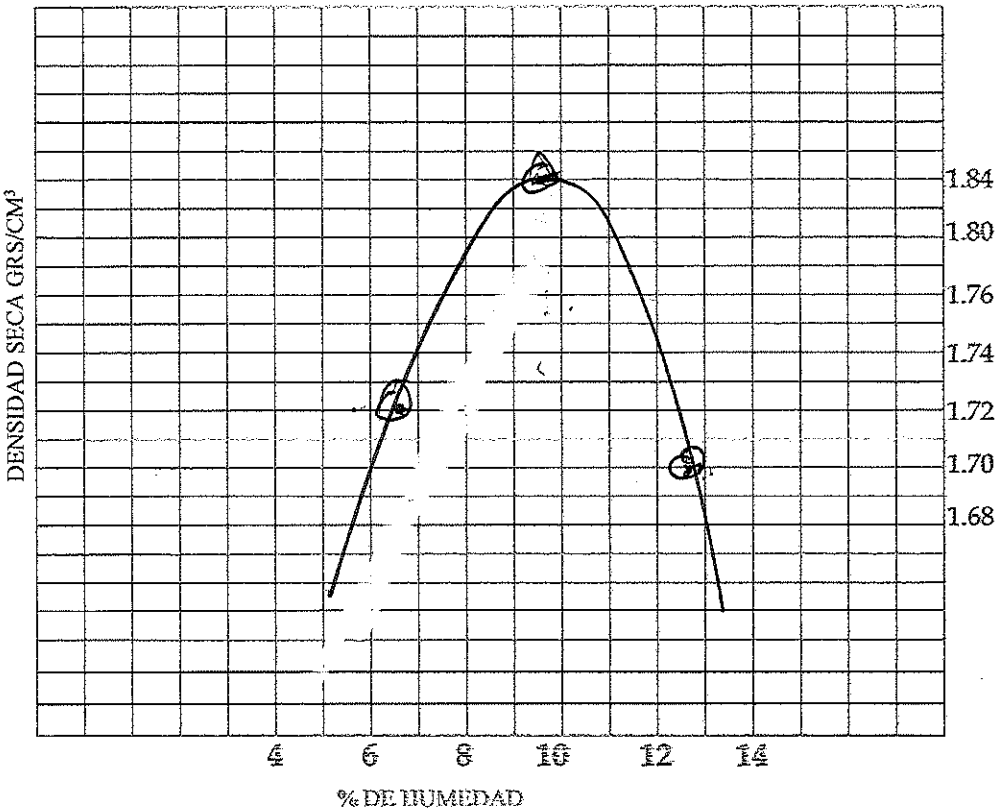

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.84 grs/cm^3

Humd. Óptima 9.8%

OBSERVACIONES

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049881

Fernando Anaya Barrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: COLEGIO INOCENCIO CHINCA *MUESTRA:* COLEGIO INOCENCIO CHINCA
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN*
LOCALIZACIÓN: CALLE 53D- CARRERA 23 BARRANQUILLA ATLANTICO *FECHA* *ENERO 20 2023*

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	----	----	----
% de humedad	----	----	----

LIMITE PLÁSTICO

No. de Recipiente	----	----	----
% de humedad	----	----	----

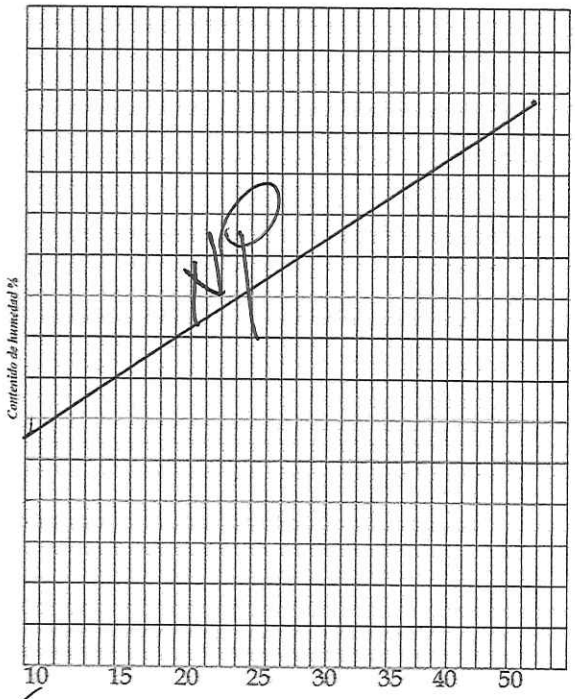


Número de golpes
RESULTADOS

PI	1187	P2			
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
11/2	72.60	6.11	93.89		
1	54.60	4.60	89.29		
¾	40.80	3.43	85.86		
3/8	62.00	5.22	80.64		
No4	64.200	5.41	75.23		
10	58.50	4.93	70.30		≤80%
40	378.8	31.91	38.39		
200	258.8	21.80	16.51		≤25%
F	196.7	16.51			

L.L ≤35%
IP ≤15%

Humedad 9.46
Límite líquido: NL
Límite plástico NP
Índice de plasticidad NP
Índice de grupo 0
U.S.C. SM
A.A.S.H.T.O. A-1-b

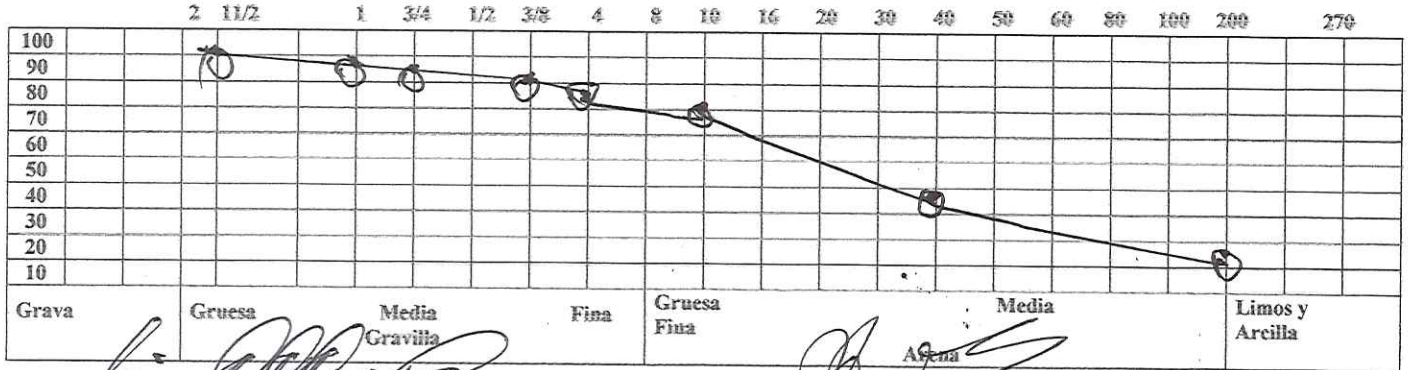

LABORATORISTA

JEFE DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
VRP 08202-12

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

Barranquilla, FEBRERO 22 DE 2023

Señores
COLEGIO JESUS DE NAZARETH
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los ensayos de rotura de cilindros de concreto a la compresión de la obra, COLEGIO JESUS DE NAZARETH, Estamos remitiendo (12) ensayos de rotura de cilindros.

LOCALIZACIÓN	FUNDIDO	EDAD DIAS	F ENSAYO	CARGA LBS	AREA PUL²	RESISTENCIA PSI
ZAPATA BLOQUE 1 -Z1 - Z9	01-14-23	7	01-21-23	82548	28.27	2920
ZAPATA BLOQUE 1 -Z1 - Z9	01-14-23	14	01-28-23	101206	28.27	3580
ZAPATA BLOQUE 1 -Z1 - Z9	01-14-23	28	02-11-23	120147	28.27	4250
VIGA CIMENTACION BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	7	01-28-23	89983	28.27	3183
VIGA CIMENTACION BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	14	02-04-23	94591	28.27	3346
VIGA CIMENTACION BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	28	02-18-23	114861	28.27	4063
PEDESTAL BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	7	01-28-23	89418	28.27	3163
PEDESTAL BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	14	02-04-23	95185	28.27	3367
PEDESTAL BLOQUE 1 AULA 1 - 4	01-21-23	28	02-18-23	115200	28.27	4075
PLACA CONTRA PISO BLOQUE 1	01-25-23	7	02-01-23	90464	28.27	3200
PLACA CONTRA PISO BLOQUE 1	01-25-23	14	02-08-23	94817	28.27	3354
PLACA CONTRA PISO BLOQUE 1	01-25-23	28	02-22-23	115002	28.27	4068

Nota: se requiere 4.000 PSI a la compresión a 28 días.

Atentamente,


FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
C.C. No. 8.677.331 de Barranquilla
M.P. No. 08202-12555 del Atlántico

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

Fernando Amaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: COLEGIO JESUS DE NAZARETH **REFERENCIA:** COLEGIO JESUS DE NAZARETH
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA RAMPA DE ACCESO*
LOCALIZACIÓN: *BARRANQUILLA ATLANTICO* **FECHA** ENERO 12 DE 2023

PRUEBA	1	2	3	4	5
No. DE GOLPES	125	125	125		
HUMEDAD DESEADA %	5.5	8.5	11.1		
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	5.5	5.5	5.5		
HUMEDAD ADICIONAL %	—	3.0	6.0		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	2500	2500	2500		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	2369	2369	2369		
AGUA ADICIONAL C.C.	—	75	150		
MOLDE No.	1	1	1		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	3770	3950	3850		
PESO DEL MOLDE GRS	1952	1952	1952		
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	1818	1998	1898		
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	5.5	8.5	11.5		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	1723	1841	1702		
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	3.79	4.05	3.74		
VOLUMEN DEL MOLDE CM³	940	940	940		
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM³	1.83	1.95	1.81		

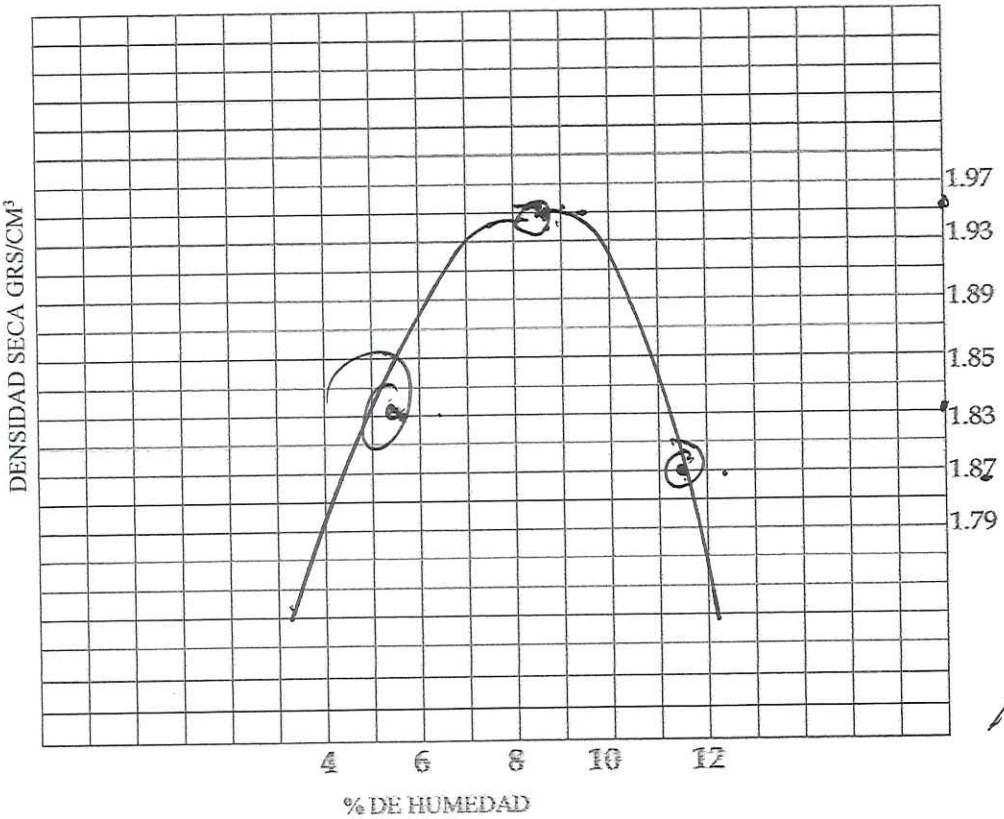

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.95 grs/cm³

Humd. Óptima 8.5%


OBSERVACIONES

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381

Fernando Amaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: COLEGIO JESUS DE NAZARETH **REFERENCIA:** COLEGIO JESUS DE NAZARETH
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA RAMPA DE ACCESO*
LOCALIZACIÓN: *BARRANQUILLA ATLANTICO* **FECHA** ENERO 12 DE 2023

PRUEBA	1	2	3	4	5
No. DE GOLPES	125	125	125		
HUMEDAD DESEADA %	5.5	8.5	11.1		
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	5.5	5.5	5.5		
HUMEDAD ADICIONAL %	—	3.0	6.0		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	2500	2500	2500		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	2369	2369	2369		
AGUA ADICIONAL C.C.	—	75	150		
MOLDE No.	1	1	1		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	3770	3950	3850		
PESO DEL MOLDE GRS	1952	1952	1952		
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	1818	1998	1898		
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	5.5	8.5	11.5		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	1723	1841	1702		
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	3.79	4.05	3.74		
VOLUMEN DEL MOLDE CM³	940	940	940		
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM³	1.83	1.95	1.81		

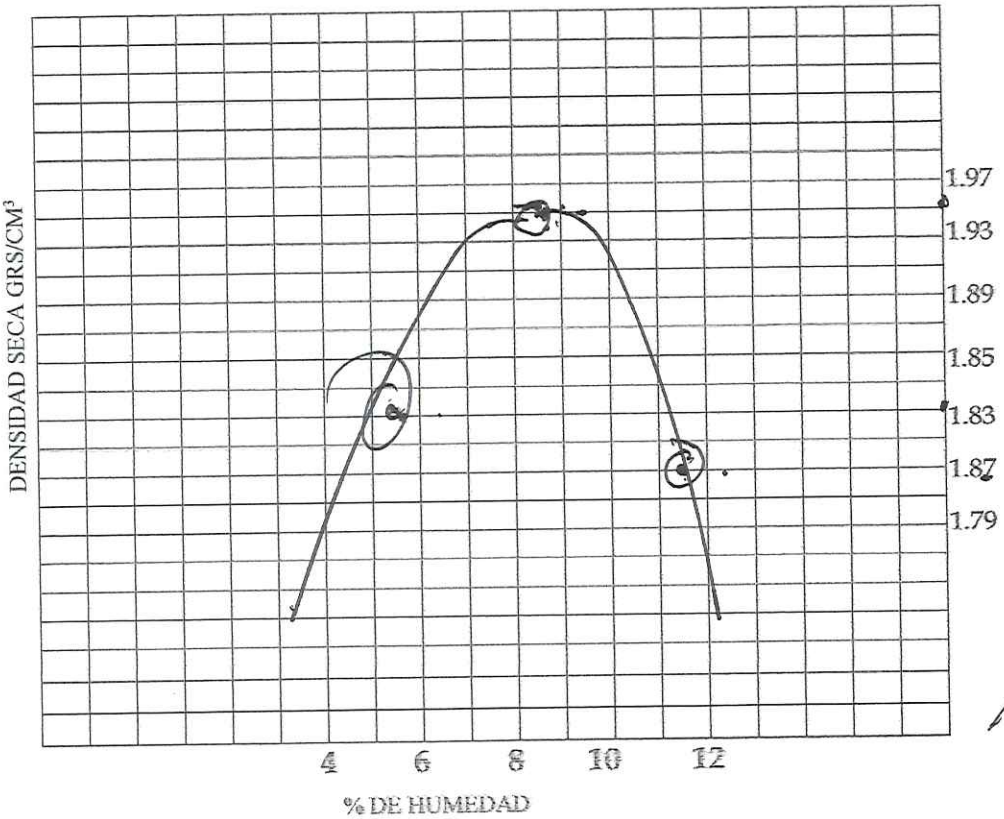

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.95 grs/cm³

Humd. Óptima 8.5%

OBSERVACIONES


Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381

Fernando Araya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: COLEGIO JESUS DE NAZARETH **REFERENCIA:** COLEGIO JESUS DE NAZARETH
DESCRIPCIÓN: *SUELO CEMENTO*
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA ATLANTICO *FECHA* ENERO 27 2023

PRUEBA	1	2	3	4		5
No. DE GOLPES	125	125	125			
HUMEDAD DESEADA %	5.5	9.6	13.0			
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	5.5	5.5	5.5			
HUMEDAD ADICIONAL %	---	4.1	7.5			
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	2500	2500	2500			
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	2369	2369	2369			
AGUA ADICIONAL C.C.	---	102.5	187.5			
MOLDE No.	1	1	1			
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	3760	3930	3863			
PESO DEL MOLDE GRS	1952	1952	1952			
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	1808	1978	1911			
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	5.5	9.6	13.0			
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	1713	1805	1692			
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	3.77	3.97	3.73			
VOLUMEN DEL MOLDE CM^3	940	940	940			
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM^3	1.82	1.92	1.80			

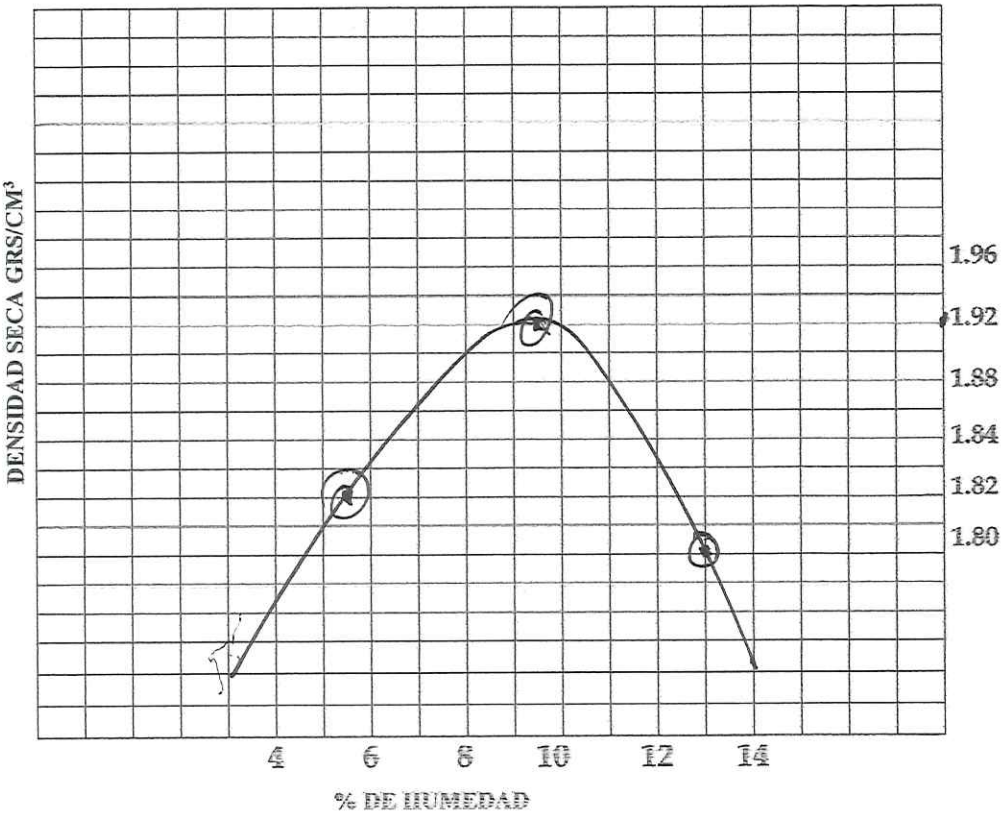

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.92 **grs/cm³**
Humd. Óptima 9.6%

OBSERVACIONES

Calle 11 No. 46-186 Cel. 314-5049881

Fernando Aragua Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: COLEGIO JESUS DE NAZARETH **REFERENCIA:** COLEGIO JESUS DE NAZARETH
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA BLOQUE 2 TERRACEO*
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA ATLANTICO *FECHA* *ENERO 30 2023*

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	34	23	17
% de humedad	32.1	37.6	40.1

LIMITE PLÁSTICO


No. de Recipiente	1	2	
% de humedad	26.0	25.8	

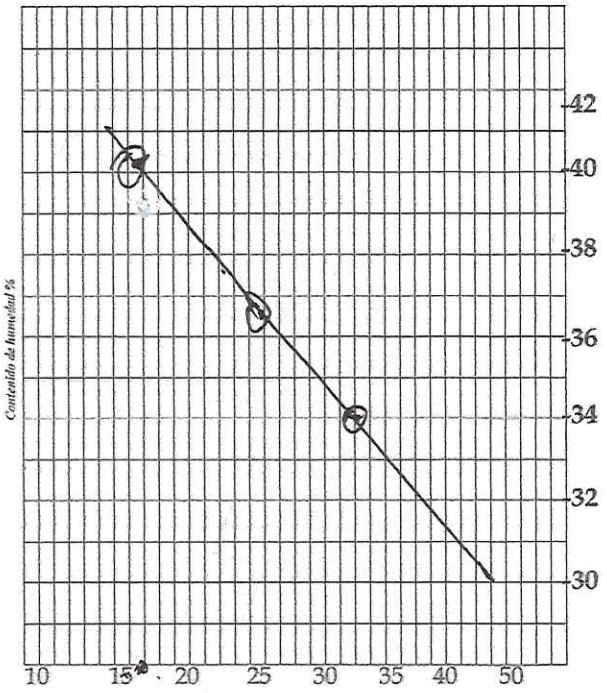

PI	1423	P2		NORMAS	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
11/2	-----	---	100		
1	138.4	9.72	90.28		
3/4	190.2	13.36	76.92		
½	171.3	12.03	64.89		
3/8	67.60	4.75	60.14		
No. 4	121.0	8.50	51.64		
10	98.70	6.93	44.71	≤80%	✓
40	243.6	17.12	27.59		
200	145.0	10.19	17.40	≤25%	✓
	247.2	**17.37**			

RESULTADOS

Humedad	**5.36**
Límite líquido:	**36.8**
Límite plástico	**25.9**
Índice de plasticidad	**10.9**
Índice de grupo	**0**
U.S.C.	**SC**
A.A.S.H.T.O.	**A-1-b**

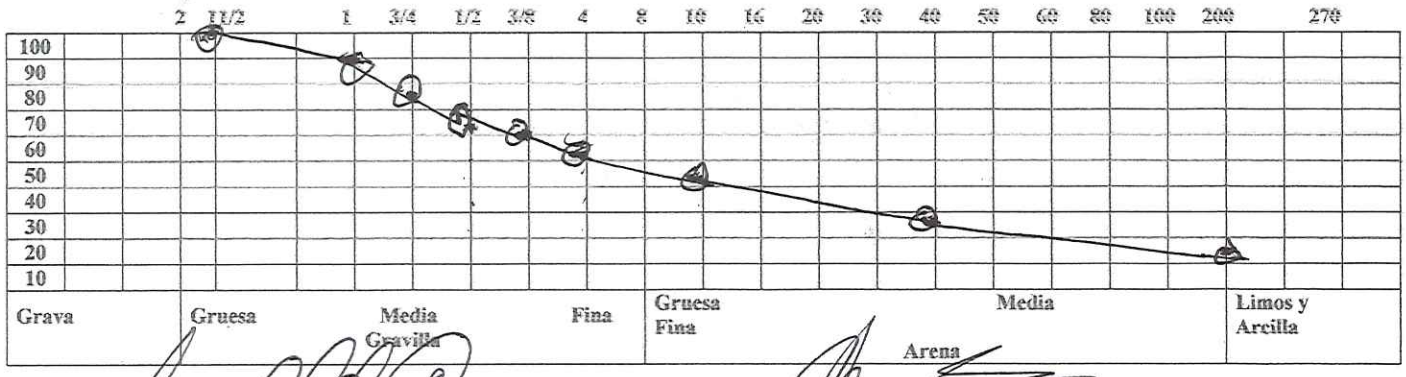

LABORATORISTA

JEFE DE LA SECCION DE CONTROL DE CALIDAD

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: COLEGIO JESUS DE NAZARETH **REFERENCIA:** COLEGIO JESUS DE NAZARETH
DESCRIPCIÓN: *RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA BLOQUE 2 TERRACEO*
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA ATLANTICO *FECHA* *ENERO 31 2023*

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	34	22	16
% de humedad	28.5	32.4	34.3

LIMITE PLÁSTICO

No. de Recipiente	1	2	
% de humedad	21.7	21.5	

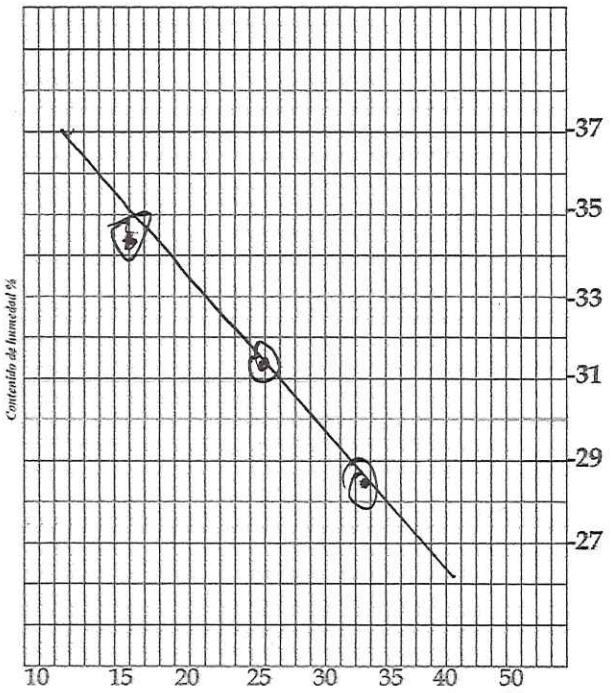


RESULTADOS

PI	548	P2			
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
3/4	----	----	100		
1/2	76.00	13.87	86.13		
3/8	49.60	9.05	77.08		
No. 4	70.80	12.92	64.16		
10	36.70	6.69	57.47		≤ 80%
40	88.50	16.15	41.32		
200	98.75	18.02	23.30		≤ 25%
F	127.68	23.30			

LL ≤ 40%
IP ≤ 15%

Humedad	4.51
Límite líquido:	31.4
Límite plástico	21.6
Índice de plasticidad	9.8
Índice de grupo	0
U.S.C.	SC
A.A.S.H.T.O.	A-1-b

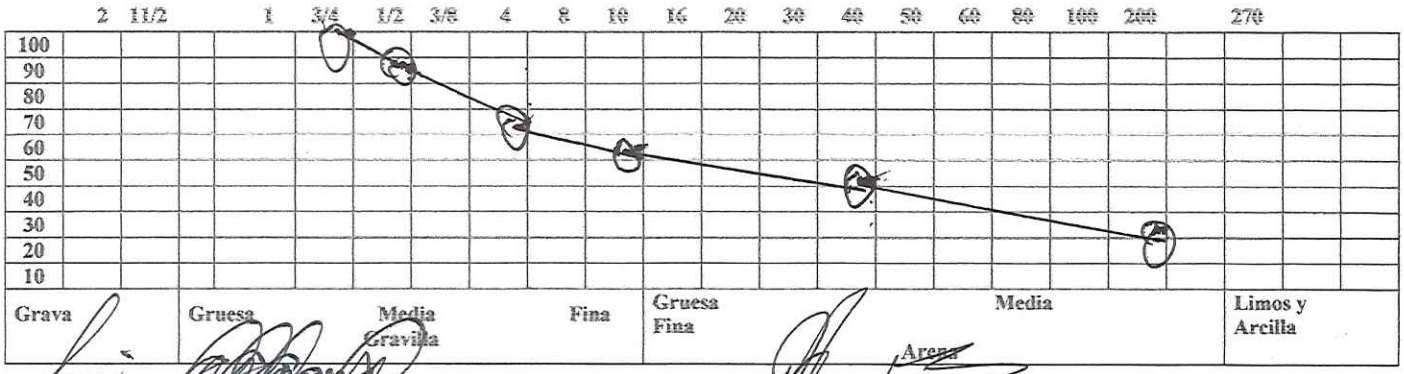

LABORATORISTA

JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

Barranquilla, MARZO 02 DE 2023

Señores
COLEGIO SARID ARTETA
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los ensayos de rotura de cilindros de concreto a la compresión de la obra, COLEGIO SARID ARTETA, Estamos remitiendo (12) ensayos de rotura de cilindros.

LOCALIZACIÓN	FUNDIDO	EDAD DIAS	F ENSAYO	CARGA LBS	AREA PUL²	RESISTENCIA PSI
ZAPATA 1 – 4	01-25-23	7	02-01-23	83396	28.27	2950
ZAPATA 1 – 4	01-25-23	14	02-08-23	100641	28.27	3560
ZAPATA 1 - 4	01-25-23	28	02-22-23	118168	28.27	4180
VIGA CIMENTACION TRAMO COMPLETO	01-26-23	7	02-02-23	84810	28.27	3000
VIGA CIMENTACION TRAMO COMPLETO	01-26-23	14	02-09-23	102337	28.27	3620
VIGA CIMENTACION TRAMO COMPLETO	01-26-23	28	02-23-23	118734	28.27	4200
COLUMNA 1 - 4	02-01-23	7	02-08-23	37081	28.27	2950
COLUMNA 1 - 4	02-01-23	14	02-15-23	47137	28.27	3750
COLUMNA 1 - 4	02-01-23	28	03-01-23	53875	28.27	4286
VIGA SOBREMURO TRAMO COMPLETO	02-02-23	7	02-09-23	81558	28.27	2885
VIGA SOBREMURO TRAMO COMPLETO	02-02-23	14	02-16-23	95552	28.27	3380
VIGA SOBREMURO TRAMO COMPLETO	02-02-23	28	03-02-23	11534	28.27	4080

Nota: se requiere 4.000 PSI a la compresión a 28 días.


Atentamente,

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
C.C. No. 8.677.331 de Barranquilla
M.P. No. 08202-12555 del Atlántico

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: COLEGIO SARID ARTETA *MUESTRA:* COLEGIO SARID ARTETA
DESCRIPCIÓN: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA ATLANTICO FECHA ENERO 18 2023

PRUEBA	1	2	3	4	5
No. DE GOLPES	125	125	125		
HUMEDAD DESEADA %	6.70	9.70	12.70		
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	6.70	6.70	6.70		
HUMEDAD ADICIONAL %	--	3.0	6.0		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	2500	2500	2500		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	2343	2343	2343		
AGUA ADICIONAL C.C.	---	75	150		
MOLDE No.	1	1	1		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	3730	3910	3810		
PESO DEL MOLDE GRS	1952	1952	1952		
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	1778	1958	1858		
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	6.70	9.70	12.70		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	1666	1784	1648		
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	3.66	3.92	3.62		
VOLUMEN DEL MOLDE CM^3	940	940	940		
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM^3	1.77	1.89	1.75		

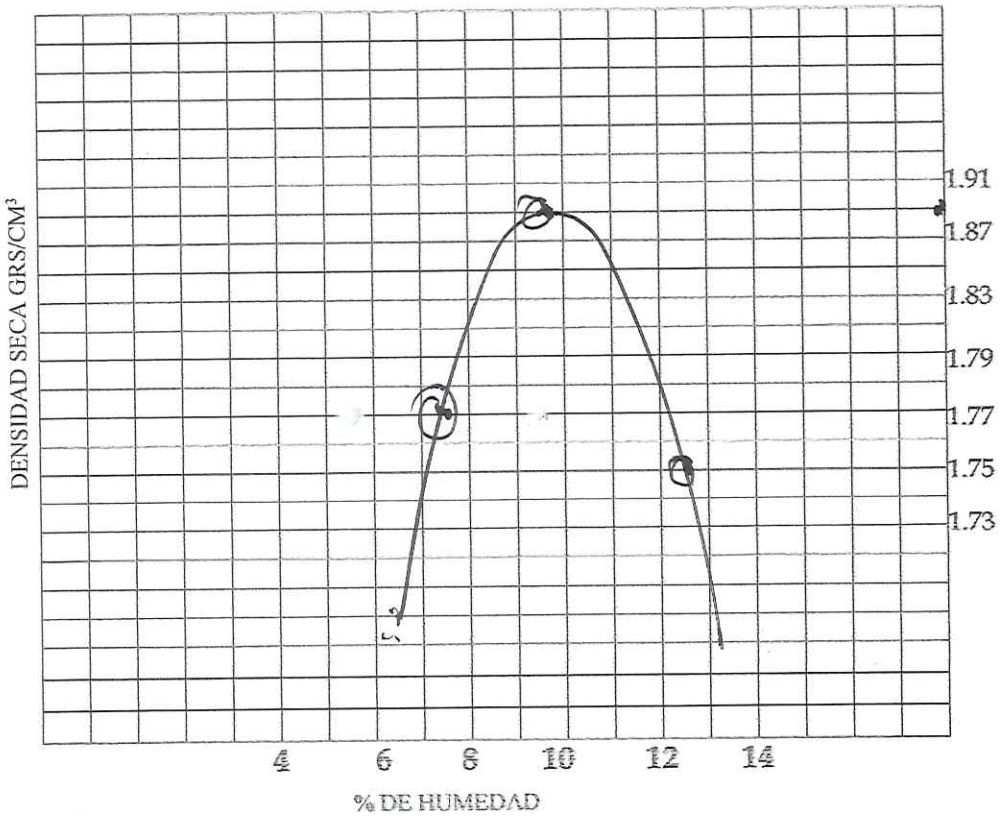

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.89 grs/cm^3

Humd. Óptima 9.70%

OBSERVACIONES

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049831

Fernando Arroyo Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vias y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: COLEGIO SARID ARTETA MUESTRA: COLEGIO SARID ARTETA
DESCRIPCIÓN: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA ATLANTICO FECHA ENERO 18 2023

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	---	---	---
% de humedad	---	---	---

LIMITE PLÁSTICO


No. de Recipiente	---	---	---
% de humedad	---	---	---

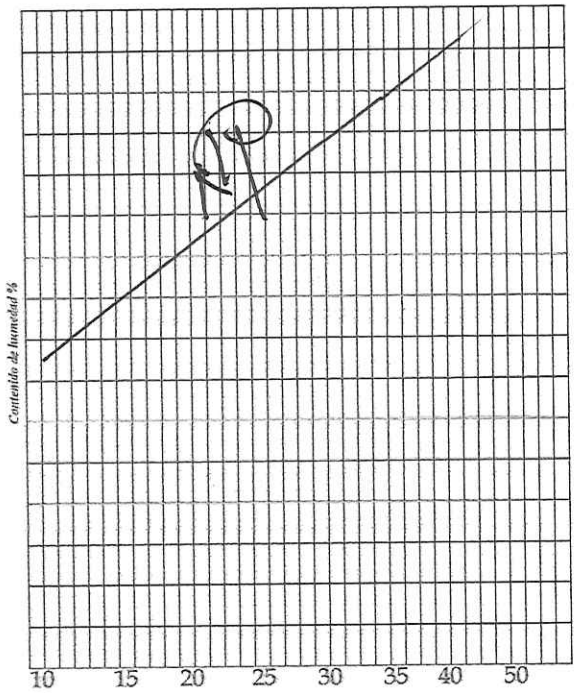

PI	1407	P2			
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
No 10	576.8	41.0	59.0	≤80%	
200	724.2	51.47	7.53	≤25%	
F	106.0	7.53			
				LL≤40%	
				IP≤15%	

RESULTADOS

Humedad 6.57
Límite líquido: NL
Límite plástico NP
Índice de plasticidad NP
Índice de grupo 0
U.S.C. SW-SM
A.A.S.H.T.O. A-1-b

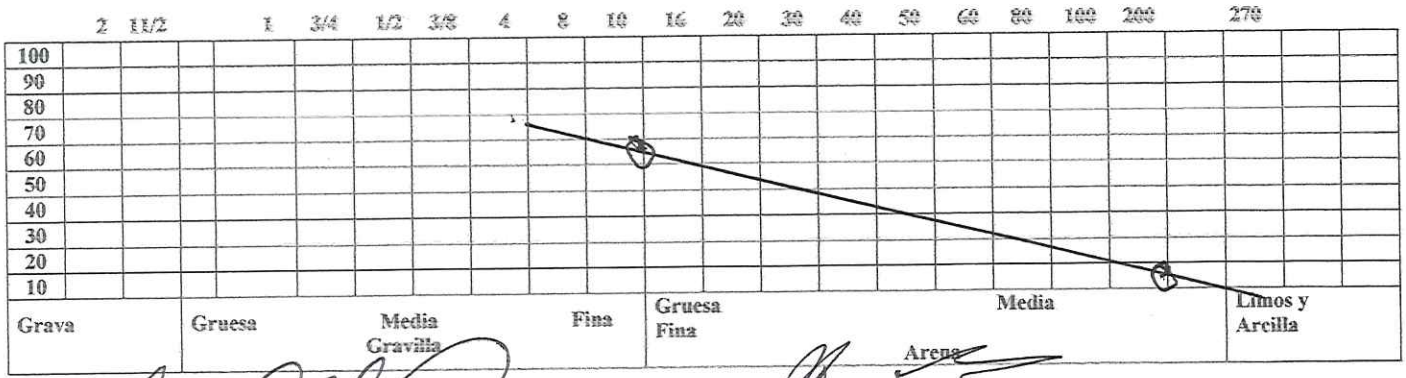

LABORATORISTA

JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
MP 0802-18

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
