			
FOTO 5	Levante de muro en mamposteria estructural.	**FOTO 6**	Levante de muro en bloque de concreto liso.
			
FOTO 7	Armado acero para columnas.	**FOTO 8**	Limpieza y acopio material sobrante.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	5	AL	11	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	9,52%	6,18%	6,18%	7	9,52%	6,18%	$ 8.094.054	6,18%
8	22/1/2023	28/1/2023	33,33%	45,80%	51,98%	8	33,33%	45,80%	$ 59.999.762	51,98%
9	29/1/2023	4/2/2023	26,38%	30,76%	82,74%	9	26,38%	30,76%	$ 40.295.639	82,74%
10	5/2/2023	11/2/2023	30,76%	17,26%	100,00%	10	30,76%	17,26%	$ 22.617.115	100,00%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	5/2/2023	Fundida de columnas para muro y fundida de zapatas y vigas de cimentacion restantes. Se continua con levante de muro figurado de acero y viga cinta.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	6/2/2023	Se hace limpieza del espacio intervenido y se avanza con la ultimas hiladas de muro y se funden columnas en ultimo tramo de muro. Se avanza en construcción de acero de viga corona.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	7/2/2023	Se procede con la construcción de viga corona y el figurado de acero correspondiente.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	8/2/2023	Se procede con la construcción de viga corona en los ultimos tramos de cerramiento y el figurado de acero correspondiente.	Se realizó toma de muestras de concreto para verificacion de calidad.
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	9/2/2023	Se rectifica el estado del muro de cerramiento y se rectifican sus medidas y se hace instalacion de concertina. Se detinen actividades hasta solventar intervencion sobre arbol sobre el trazado del muro.	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	10/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
INOCENCIO CHINCÁ	Calle 53D #21B-181	11/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	177,00	88,50	88,5	-	$ 4.221	$ -	88,50	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	177,00	5,00	5	-	$ 454.545	$ -	5,00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	0,00	177,00	159,3	17,70	$ 9.648	$ 170.770	177,00	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	59,00	59,00	59	-	$ 23.673	$ -	59,00	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	177,00	96,64	96,64	-	$ 25.396	$ -	96,64	-

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 10	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

2	**ESTRUCTURA**										
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**121,84**	16,28	16,28	-	$ 252.961	$ -	**16,28**	-
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**24,33**	40,53	40,53		$ 93.507	$ -	**40,53**	-
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	**5,31**	24,71	24,71		$ 192.928	$ -	**24,71**	-
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**34,70**	33,44	33,44	-	$ 54.171	$ -	**33,44**	-
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**6.631,87**	5.315,36	4518,056	**797,30**	$ 9.568	$ 7.628.605	**5.315,36**	-
2.17	**VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**7,08**	6,90	6,01	**0,89**	$ 894.392	$ 796.009	**6,90**	-
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**11,02**	7,45	7,0775	**0,37**	$ 1.742.818	$ 649.200	**7,45**	-
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**5,31**	4,93	2,3376	**2,59**	$ 1.894.074	$ 4.910.197	**4,93**	-
2.39	**ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**6,80**	6,80	6,55008	**0,25**	$ 813.350	$ 203.272	**6,80**	-
3	**MAMPOSTERIA**									
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**575,25**	118,85	118,85		$ 32.154	$ -	**118,85**	-
3.06	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,**	MT2	**575,25**	140,97	112,776	**28,19**	$ 100.669	$ 2.838.262	**140,97**	-
11	**URBANISMO**									
11.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12**	ML	**80,00**	80,00	0	**80,00**	$ 67.760	$ 5.420.800	**80,00**	-
								VALOR DE OBRA	22.617.114,51		
								INCIDENCIA	17,26%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED INOCENCIO CHINCA	**Arq. Anderson Saavedra**	**Arq. Alexandra Villareal**	**Herramientas menores**	**NO APLICA**
		Inspector Luis Mendoza.	**Trompo**	**NO APLICA**
			Tronzadora	**NO APLICA**

6. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levante de muro



FOTO 2	Levante de muro

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED INOCENCIO CHINCA No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**



FOTO 3	Vaciado viga corona



FOTO 4	Rectifcacion medidas.

7. OBSERVACIONES

SE REALIZA AJUSTE DE PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA SEGÚN RENDIMIENTOS ALCANZADOS EN SITIO DE TRABAJO Y LOS ALCANCES PROYECTADOS. PENDIENTE CONTRUCCION DE TRAMO DE MURO POR MOTIVOS DE LOGISTICA SEGÚN SE DEFINA INTERVENCION HIDRAULICA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO** **No. 9**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	29	AL	4	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2,54%	0,34%	0,34%	9	2,54%	0,34%	$ 4.079.844	0,34%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

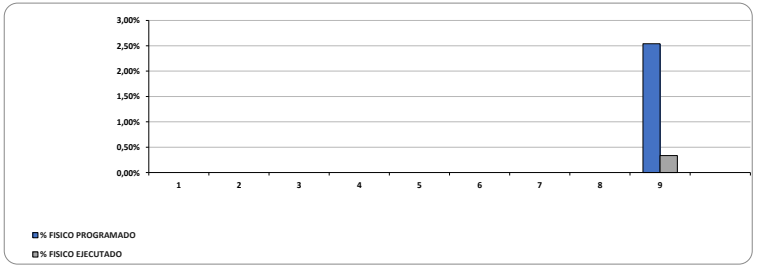

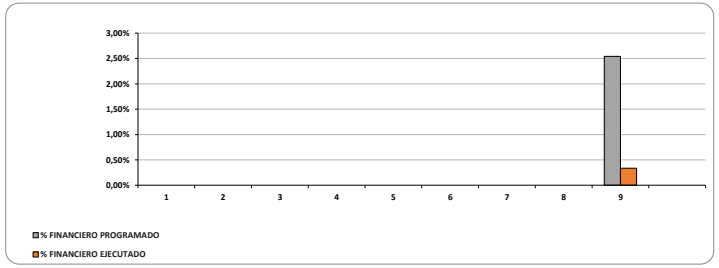

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	29/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	30/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	31/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	1/2/2023	Se realizó el desmonte y retiro de lamparas y puntos electricos.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	2/2/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso .	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 9			Código:	IP-FM-31
				VERSION:	01
				FECHA:	6/9/2021
				Paginas:	1 de 1

JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	3/2/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso .	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	4/2/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso .	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
6	ACABADOS									
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2			-	159,22	$20.865	$3.322.042	159,22	- 159,22
9	ELECTRICO									
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	20,00		-	20,00	$19.629	$392.580	20,00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	20,00		-	22,00	$16.601	$365.222	22,00	- 2,00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED JOSE EUSEBIO CARO	Edgar Arias	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Minicargador.		NO APLICA
	Junior Maza	Alexandra Villarreal e Inspector Luis Mendoza.	Herramientas menores		NO APLICA
		Alexandra Villarreal e Inspector Luis Mendoza.	Herramientas menores		NO APLICA

6. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO





FOTO 1	Desmonte cielo raso IED JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Desmonte cielo raso IED JOSE EUSEBIO CARO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO** **No. 9**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 3	Desmonte cielo raso IED JOSE EUSEBIO CARO	**FOTO 4**	Desmonte cielo raso IED JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ALEXANDRA VILLAREAL	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO	% FISICO	% AVANCE	SEMANA2	% FINANCIERO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	1	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	2	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	3	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	4	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	5	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	6	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	7	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	8	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2,54%	**0,34%**	0,34%	9	2,54%	**0,34%**	$ 4.079.844	0,34%
10	5/2/2023	11/2/2023	5,93%	**0,93%**	1,26%	10	5,93%	**0,93%**	$ 11.235.444	1,26%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

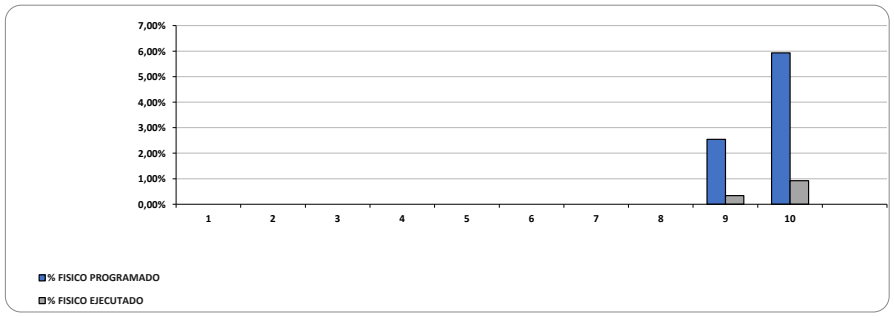

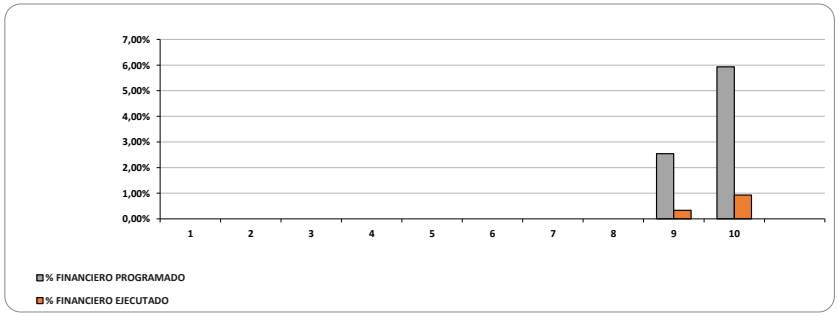

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	5/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	6/2/2023	Se realizó demonste de cielo raso, desmonte de cubierta existente incluyendo estructura de soporte	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	7/2/2023	Se realizó demonste de cielo raso, desmonte de cubierta existente incluyendo estructura de soporte	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	8/2/2023	Se realizó demonste de cielo raso, desmonte de cubierta existente incluyendo estructura de soporte. Se realizó instalación de cerramiento provisional.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	9/2/2023	Se realizó demonste de cielo raso, desmonte de cubierta existente incluyendo estructura de soporte. Se realizó instalación de cerramiento provisional.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	10/2/2023	Se culminó demonste de cielo raso y desmonte de cubierta existente, se continuó con el desmonte de la estructura de soporte para cubierta. Se realizó instalación de cerramiento provisional y acopio de RCD.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	11/2/2023	Traslado de materal al primer piso.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0,00		-	29,12	$23.673	$689.358	29,12	- 29,12
5	CUBIERTAS									
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740,25		-	163,55	$34.014	$5.563.024	163,55	576,70
6	ACABADOS									
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	0,00		159,22	238,82	$20.865	$4.983.063	398,04	- 398,04
9	ELECTRICO									
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	20,00		20,00		$19.629	$0	20,00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	20,00		22,00		$16.601	$0	22,00	- 2,00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED JOSE EUSEBIO CARO	Edgar Arias	Arq. Alexandra Villareal	Herramientas menores		NO APLICA
	Junior Maza	Inspector Luis Mendoza.	Andamios Certificados		NO APLICA
					NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

6. RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 2	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 3	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 4	Instalación cerramiento provisional IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 5	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 6	Instalación cerramiento provisional IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 7	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 8	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ALEXANDRA VILLAREAL	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 11**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO	% FISICO	% AVANCE	SEMANA2	% FINANCIERO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	1	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	2	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	3	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	4	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	5	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	6	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	7	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	**0,00%**	0,00%	8	0,00%	**0,00%**	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2,54%	**0,34%**	0,34%	9	2,54%	**0,34%**	$ 4.079.844	0,34%
10	5/2/2023	11/2/2023	5,93%	**0,93%**	1,26%	10	5,93%	**0,93%**	$ 11.235.444	1,26%
11	12/2/2023	18/2/2023	4,87%	**1,27%**	2,54%	11	4,87%	**1,27%**	$ 15.451.460	2,54%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

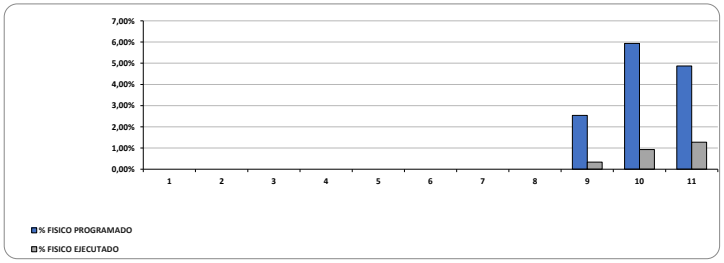

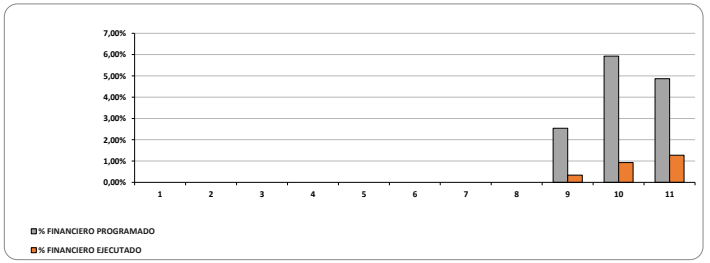

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	12/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	13/2/2023	Se inicia el desmonte de la estructura de madera de la cubierta existente.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	14/2/2023	Continua el desmonte de la estructura de madera de la cubierta, asi como el cielo raso existente.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	15/2/2023	Continua el desmonte de pisa techo y acopio de material al primer piso.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	16/2/2023	Demolicion de mamposteria y acopio de material al primer piso.asi mismo se continuó con el desmonte de cubierta y cielo raso.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	17/2/2023	Acopio de material al primer piso.Se continuó con el desmonte de cubierta y cielo raso.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	**Carrera 6 #54A -149**	18/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 11**	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	0,00	0,00	-	262,38	$4.221	$1.107.493	262,38	- 262,38
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0,00	0,00	29,12	-	$23.673	$0	29,12	- 29,12
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	0,00	0,00	-	23,00	$140.481	$3.231.063	23,00	- 23,00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740,25	0,00	163,55	245,33	$34.014	$8.344.536	408,88	331,37
6	ACABADOS									
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	0,00	0,00	398,04	132,68	$20.865	$2.768.368	530,72	- 530,72
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	20,00	0,00	20,00	-	$19.629	$0	20,00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	20,00	0,00	22,00	-	$16.601	$0	22,00	- 2,00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED JOSE EUSEBIO CARO	Edgar Arias	Arq. Angelo Sanchez	Herramientas menores	NO APLICA
	Junior Maza			

6. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 2	Cerramiento provisional IED JOSE EUSEBIO CARO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED JOSE EUSEBIO CARO No. 11**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 3	Demolición muro de bloque	**FOTO 4**	Desmonte estructura de soporte cubierta en madera

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ANGELO SANCHEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE CARO No. 12**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2,54%	0,34%	0,34%	9	2,54%	0,34%	$ 4.079.844	0,34%
10	5/2/2023	11/2/2023	5,93%	0,93%	1,26%	10	5,93%	0,93%	$ 11.235.444	1,26%
11	12/2/2023	18/2/2023	4,87%	1,27%	2,54%	11	4,87%	1,27%	$ 15.451.460	2,54%
12	19/2/2023	25/2/2023	5,61%	0,49%	3,03%	12	5,61%	0,49%	$ 5.989.456	3,03%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

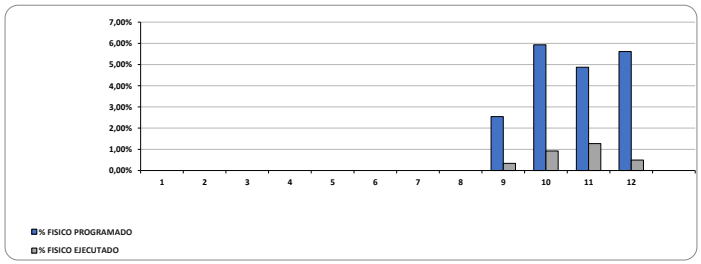

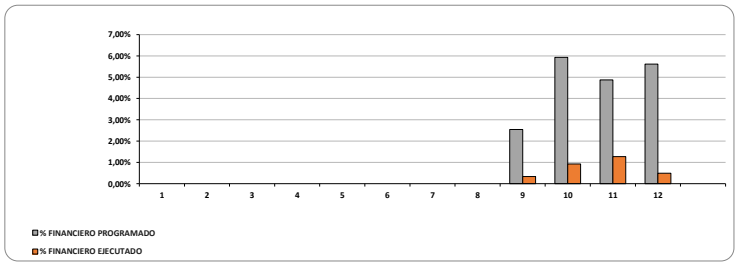

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	19/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	20/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	21/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	22/2/2023	Desmonte de cubierta . Demolicion y traslado de material al primer piso, se continuó con el desmonte de cielo raso	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	23/2/2023	Se culminó el desmonte de cubierta y se procedio a la demolición de muros de cubierta, se realizó desmonte del cielo raso y posterior acopio del material producido.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE CARO No. 12			Código:	IP-FM-31
				VERSION:	01
				FECHA:	6/9/2021
				Paginas:	1 de 1

JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	24/2/2023	Demolición de muros de cubierta,se realizó desmonte del cielo raso y posterior acopio del material producido.	N/A
JOSE EUSEBIO CARO	Carrera 6 #54A -149	25/2/2023	Demolición de muros de cubierta,se realizó desmonte del cielo raso y posterior acopio del material producido.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	0,00	0,00	262,38	320,68	$4.221	$1.353.603	583,06	- 583,06
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0,00	0,00	29,12	-	$23.673	$0	29,12	- 29,12
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	0,00	0,00	23,00	-	$140.481	$0	23,00	- 23,00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740,25	0,00	408,88	136,29	$34.014	$4.635.853	545,17	195,08
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	0,00	0,00	530,72	-	$20.865	$0	530,72	- 530,72
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	20,00	0,00	20,00	-	$19.629	$0	20,00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	20,00	0,00	22,00	-	$16.601	$0	22,00	- 2,00
								$ 1.213.421,66		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED JOSE EUSEBIO CARO	Edgar Arias	Angelo Sanchez	NO APLICA		NO APLICA
	Junior Maza				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 2	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE CARO No. 12**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 3	Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO	**FOTO 4**	Material sobrante Desmonte cubierta IED JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA INDICA QUE ES NECESARIO INTERVENIR LA ESTRUCTURA PARA CONTINUAR LA INTERVENCION, COMPROMETIENDOSE A LA ENTREGA DE UNA PROPUESTA. HASTA TANTO, LA INTERVENCION PERMANECE SUSPENDIDA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ANGELO SANCHEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 9**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"


1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO
VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	4,31%	0,00%	0,00%	5	4,31%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	6	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	7	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	6,03%	0,99%	0,99%	8	6,03%	0,99%	$ 41.464.800	0,99%
9	29/1/2023	4/2/2023	6,03%	1,95%	2,94%	9	6,03%	1,95%	$ 81.847.492	2,94%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	29/1/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	30/1/2023	Se inicia la Impermeabilización de losa mediante la instalación de manto asfaltico.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	31/1/2023	Se continuó con Instalación manto asfáltico impermeabilización losa de cubierta bloque 1, paraleo a esto se realiza la Imprimación losa de cubierta bloque 3	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	1/2/2023	Se realizó limpieza de cubierta del módulo 2, posterior a esto se realizó la imprimación de loza de cubierta para manto módulo 2 y se inició la Aplicación de manto en las áreas previamente preparadas.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	2/2/2023	Mediante comisión topográfica se inició el proceso de trazado y replanteo de zona de andenes exteriores, paralelo a esto se continuó con la instalación de manto asfaltico en la cubierto correspondiente al módulo 2.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	3/2/2023	Se continuó con el proceso de trazado y replanteo de zona de andenes exteriores, se inició la instalación de parrillas metálicas en el de depósito, destinada al soporte del cielo raso, paralelo a esto se continuó con la imprimación de losa de cubierta para manto módulo 2	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	4/2/2023	Se procede con la instalación de parrillas metalicas en el de depósito, destinada al soporte del cielo raso, se realizó el vaciado de concreto para plantilla de nivelación en las áreas definidas, se continuó imprimación de losa de cubierta para manto y aplicación de manto en el modula 2. asi mismo se culminó la nivelacion trazado y replanteo para zona de andenes exteriores estipuladas a intervenir, se realizó limpieza y acopio de material sobrante.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013		2.552,76	1.094,04	$4.221	$4.617.943	3.646,80	- 1.633,80
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL		0		0,00	10,00	$454.545	$4.545.450	10,00	- 10,00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805,2		2.370,42	1.276,38	$9.648	$12.314.514	3.646,80	- 2.841,60
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		0,00	213,00	$25.396	$5.409.348	213,00	- 213,00
5	CUBIERTAS									
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692		131,98	791,90	$59.248	$46.918.728	923,89	768,11
6	ACABADOS									
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570		0,00	119,45	$67.320	$8.041.509	119,45	450,55

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED NUEVO BOSQUE	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas Menores	NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 9**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de manto asfaltico IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 2	Imprimacion con bitumen IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 3	Imprimacion con bitumen IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 4	Instalación de manto asfaltico IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 5	Instalación parrila de soporte para cielo razo IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 6	Instalación parrila de soporte para cielo razo IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 7	Localizacion nivelacion y replanteo andenes exteriores IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 8	Instalación parrila de soporte para cielo razo IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Angelo Sanabria	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE Daniel Cantillo**
CARGO Residente Interventoria	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO Director de Interventoria**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	5	AL	11	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	4,31%	0,00%	0,00%	5	4,31%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	6	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	7	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	6,03%	0,99%	0,99%	8	6,03%	0,99%	$ 41.464.800	0,99%
9	29/1/2023	4/2/2023	6,03%	1,95%	2,94%	9	6,03%	1,95%	$ 81.847.492	2,94%
10	5/2/2023	11/2/2023	6,03%	0,63%	3,57%	10	6,03%	0,63%	$ 26.215.822	3,57%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	5/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	6/2/2023	Se realizó la instalación de cielo raso para el área de cocina y depósito, paralelo a esto se procedió a la imprimación de losa de cubierta para manto módulo 2 y posterior aplicación de manto asfaltico. Se realizó el descapto y limpieza posterior a esto se inició la Demolición de andenes contemplado a intervenir dentro del alcance del proyecto.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	7/2/2023	Se culminó IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA en el total del área destinada a intervenir , así mismo se culminó la instalación de cielo raso en el área de cocina y depósito, posterior a esto se inició la aplicación de masilla en estas mismas áreas. se continuó con la Demolición de andenes exteriores, paralelo a esto se realizó limpieza y acopio de RCD producidos por esta actividad.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	8/2/2023	Se realiza aplicación de pintura en vinilo para cielo raso en el área de cocina y depósito asimismo se continuó con la demolición de andenes exteriores y posterior acopio de material producido por esta actividad.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	9/2/2023	Se continua con la aplicación de pintura en vinilo para cielo en el área de cocina y depósito, se realiza alistado (excavación) del terreno para intervención de andenes, paralelo a esto se continuó con la demolición de los andenes exteriores existentes y posterior acopio de material producido por esta actividad.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	10/2/2023	Se continua con la aplicación de pintura en vinilo para cielo en el área de cocina y depósito, se realiza alistado (excavación) del terreno para intervención de andenes, paralelo a esto se continuó con la demolición de los andenes exteriores existentes y posterior acopio de material producido por esta actividad.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	11/2/2023	Se continua con la aplicación de pintura en vinilo para cielo en el área de cocina y depósito, se continuó con acopio de material producido por la demolición . Continúa trabajos en cielo raso.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES					-				
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013		3.646,80	-	$4.221	$0	3.646,80	- 1.633,80
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL		0		10,00	-	$454.545	$0	10,00	- 10,00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805,2		3.646,80	-	$9.648	$0	3.646,80	- 2.841,60
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	0		-	85,20	$140.481	$11.968.981	85,20	- 85,20
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		213,00	-	$25.396	$0	213,00	- 213,00
2	ESTRUCTURA					-				
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	0		-	248,50	$20.853	$5.181.971	248,50	- 248,50
2.04	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	0		-	355,00	$20.794	$7.381.870	355,00	- 355,00
5	CUBIERTAS					-				
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692		923,89	-	$59.248	$0	923,89	768,11
6	ACABADOS					-				
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570		119,45	25,00	$67.320	$1.683.000	144,45	425,55

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA
IED NUEVO BOSQUE	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas Menores		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 10**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**



FOTO 1	Acopio RCD IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 2	Aplicaion masilla y postrior aplicación de pintura en vinilo IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 3	Aplicación masilla para juntas cielo raso.



FOTO 4	Demolición andenes exteriores.



FOTO 5	Instalacion manto asfaltico IED NUEVO BOSQUE



FOTO 6	Demolicion y Alistado terreno para Andenes Exteriores



FOTO 7	Instalacion manto asfaltico IED NUEVO BOSQUE



FOTO 8	Curado plantilla de nivelacion IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE Daniel Cantillo**
CARGO Residente Interventoria	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO Director de Interventoria**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 11**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	4,31%	0,00%	0,00%	5	4,31%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	6	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	6,03%	0,00%	0,00%	7	6,03%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	6,03%	0,99%	0,99%	8	6,03%	0,99%	$ 41.464.800	0,99%
9	29/1/2023	4/2/2023	6,03%	1,95%	2,94%	9	6,03%	1,95%	$ 81.847.492	2,94%
10	5/2/2023	11/2/2023	6,03%	0,63%	3,57%	10	6,03%	0,63%	$ 26.215.822	3,57%
11	12/2/2023	18/2/2023	6,03%	2,06%	5,63%	11	6,03%	2,06%	$ 86.476.868	5,63%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

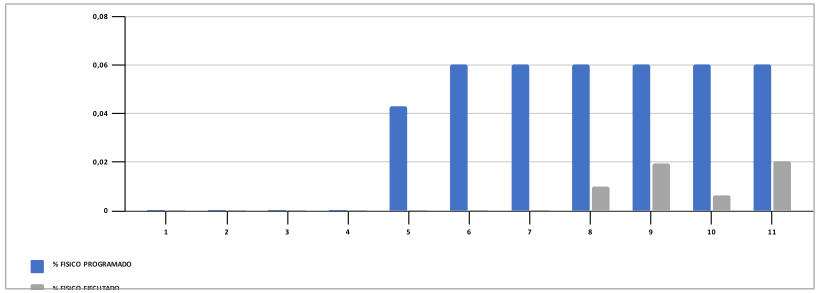

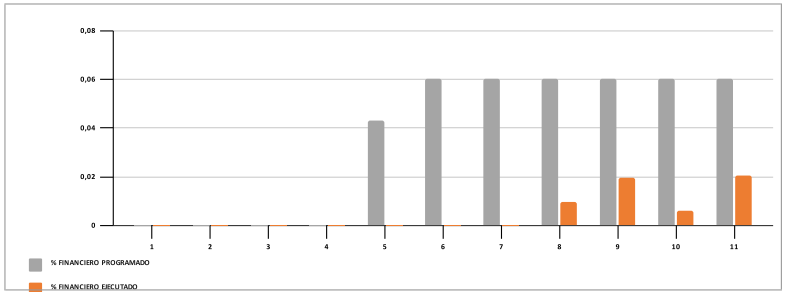

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	12/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 11			Código:	IP-FM-31
				VERSION:	01
				FECHA:	6/9/2021
				Paginas:	1 de 1

NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	13/2/2023	Se realizó alistado de terreno para andenes exteriores, se realizó Plantilla de nivelación en concreto para interiores en la zona estipulada para instalación de grama artificial , se inicia la instalación de las parrillas de soporte para el cielo raso en baños por último se procedió al acopio de escombros exteriores	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	14/2/2023	Se realizó la instalación de cielo raso en drywall para el área de baños. a se realiza alistado (excavación) del terreno para intervención de andenes, paralelo a esto se continuó con la demolición de los andenes exteriores existentes y posterior acopio de material producido por esta actividad.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	15/2/2023	Se culminó la instalación de cielo raso para baños, posterior a esto se aplica masilla para juntas y se culminó con la pintura en vinilo para cielo raso, se culmina el descapote y el alistado del área a intervenir mediante la realizacion de excavaciones relleno y demolición de andes existentes, se realizó acopio de material sobrante.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	16/2/2023	Se continuó con el tendido de grama artificial y sus capas necesarias para lograr el acabado estipulado.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	17/2/2023	Se continuó con el tendido de grama artificial y sus capas necesarias para lograr el acabado estipulado. Se inicia instalación de aires acondicionados.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Carrera. 7b #74-2	18/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES					-				
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013		3.646,80	-	$4.221	$0	3.646,80	- 1.633,80
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL		0		10,00	-	$454.545	$0	10,00	- 10,00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805,2		3.646,80	-	$9.648	$0	3.646,80	- 2.841,60
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	0		85,20	127,80	$140.481	$17.953.472	213,00	- 213,00
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	**0**		213,00	**-**	**$25.396**	**$0**	**213,00**	**- 213,00**
2	ESTRUCTURA					-				
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	0		248,50	106,50	$20.853	$2.220.845	355,00	- 355,00
2.04	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	**0**		355,00	**-**	**$20.794**	**$0**	**355,00**	**- 355,00**
5	CUBIERTAS					-				
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692		923,89	-	$59.248	$0	923,89	768,11
6	ACABADOS					-				
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	**0**	**298,63**		**121,45**	**$18.887**	**$2.293.826**	**121,45**	**- 121,45**
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	**0**	**1.130,15**		**822,00**	**$32.600**	**$26.797.200**	**822,00**	**- 822,00**
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	509,22	298,63	144,45	80,00	$67.320	$5.385.600	224,45	284,77
11	URBANISMO					-				
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA	M2	**144**	**504,00**	-	**198,00**	**$160.737**	**$31.825.926**	**198,00**	**306,00**

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IED NUEVO BOSQUE	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas Menores	NO APLICA
			Tronzadora	NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 11**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Plantilla de nivelacion en concreto.



FOTO 2	Acabado cielo raso IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 3	Excavaciones andenes IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS



FOTO 4	Parilla cielo raso IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE Daniel Cantillo**
CARGO Residente Interventoria	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO Director de Interventoria**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 12**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	1	0,00%	**0,00%**	$ -	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	2	0,00%	**0,00%**	$ -	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	3	0,00%	**0,00%**	$ -	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	**0,00%**	0,00%	4	0,00%	**0,00%**	$ -	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	2,70%	**0,00%**	0,00%	5	2,70%	**0,00%**	$ -	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,78%	**0,00%**	0,00%	6	3,78%	**0,00%**	$ -	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,55%	**0,00%**	0,00%	7	3,55%	**0,00%**	$ -	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,15%	**0,99%**	0,99%	8	3,15%	**0,99%**	$ **41.464.800**	0,99%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,99%	**1,95%**	2,94%	9	3,99%	**1,95%**	$ **81.847.492**	2,94%
10	5/2/2023	11/2/2023	4,46%	**0,63%**	3,57%	10	4,46%	**0,63%**	$ **26.215.822**	3,57%
11	12/2/2023	18/2/2023	4,30%	**2,06%**	5,63%	11	4,30%	**2,06%**	$ **86.476.868**	5,63%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,68%	**16,61%**	22,24%	12	3,68%	**16,61%**	$ **696.271.363**	22,24%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

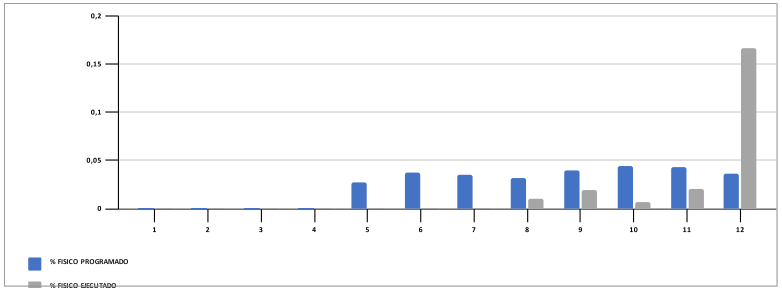

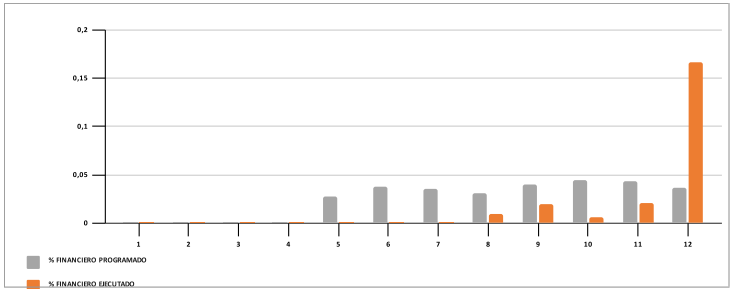

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	19/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	20/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 12**			**Código:**	**IP-FM-31**
				VERSION:	**01**
				FECHA:	**6/9/2021**
				Paginas:	**1 de 1**

NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	21/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	22/2/2023	Se continuó con el tendido de grama artificial . Actividades plantillas de zonas artificiales terminadas	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	23/2/2023	Se continua instalacion de aires acondicionados.	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	24/2/2023	Instalación de aires acondicionados Emparrillado de baños bloque 1 inferior niños	N/A
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**Carrera. 7b #74-2**	25/2/2023	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**					-				
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2013**	**4156,244**	**3.646,80**	**30,00**	**$4.221**	**$126.630**	**3.676,80**	**479,44**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL**		**0**	**30,00**	**10,00**	**-**	**$454.545**	**$0**	**10,00**	**20,00**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**805,2**	**4156,24**	**3.646,80**	**-**	**$9.648**	**$0**	**3.646,80**	**509,44**
1.08	**DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**0**	**213**	**213,00**	**-**	**$25.396**	**$0**	**213,00**	**-**
2	**ESTRUCTURA**					-				
2.03	**DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M**	M2	**0**	**425,88**	**355,00**	**-**	**$20.853**	**$0**	**355,00**	**70,88**
2.04	**DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL**	ML	**0**	**353,00**	**355,00**	**-**	**$20.794**	**$0**	**355,00**	**- 2,00**
5	**CUBIERTAS**					-				
5.13	**IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA**	MT2	**1692**	**1395,24**	**923,89**	**395,95**	**$59.248**	**$23.459.246**	**1.319,84**	**75,40**
6	**ACABADOS**					-				
6.08	**PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR**	MT2	**0**	**298,63**	**121,45**	**177,18**	**$18.887**	**$3.346.399**	**298,63**	**-**
6.11	**PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS**	MT2	**0**	**1.130,15**	**822,00**	**308,15**	**$32.600**	**$10.045.690**	**1.130,15**	**-**
6.23	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD**	MT2	**0**	**149,32**	**-**	**-**	**$77.644**	**$0**	**-**	**149,32**
6.24	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL**	MT2	**509,22**	**298,63**	**224,45**	**74,18**	**$67.320**	**$4.993.798**	**298,63**	**- 0,00**
11.06	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES**	M2	**144**	**504,00**	**198,00**	**306,00**	**$160.737**	**$49.185.522**	**504,00**	**-**
13	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					-				
NP 1	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU**	UND	**5**		**-**	**5,00**	**$6.216.101**	**$31.080.505**	**5,00**	**-**
NP 2	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU**	UND	**10**	**0,00**	**-**	**10,00**	**$7.849.119**	**$78.491.190**	**10,00**	**-**
NP 3	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH - 36000 BTU**	UND	**4**	**0,00**	**-**	**4,00**	**$10.977.640**	**$43.910.560**	**4,00**	**-**
NP 4	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 - 60000 BTU**	UND	**28**	**0,00**	**-**	**28,00**	**$16.129.708**	**$451.631.824**	**28,00**	**-**
							VALOR DE OBRA	$696.271.363		
							INCIDENCIA	16,61%		

4191751193

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA		
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**		**INTERVENTORIA**
IED NUEVO BOSQUE	**Anderson Saavedra**	**Angelo Sanchez**	**Herramientas Menores**		**NO APLICA**
			Tronzadora		**NO APLICA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA NUEVO BOSQUE PIES DESCALZOS No. 12**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Parilla cielo raso IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZO



FOTO 2	Plantilla de nivelacion IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZO



FOTO 3	Acabado cielo raso IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZO



FOTO 4	Acopio RCD IED NUEVO BOSQUE PIES DESCALZO

7. OBSERVACIONES

SE HACE AJUSTE EN CRONOGRAMA Y BALANCE DE OBRA SEGÚN ALCANCES APROBADOS

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE Daniel Cantillo**
CARGO Residente Interventoria	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO Director de Interventoria**

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 11	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACION CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	2,20%	0,00%	0,00%	6	2,20%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,08%	0,00%	0,00%	7	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,08%	0,00%	0,00%	8	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,08%	0,00%	0,00%	9	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,08%	0,00%	0,00%	10	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,08%	0,11%	0,11%	11	3,08%	0,11%	$ 4.316.814	0,11%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	12/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	13/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	14/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	15/2/2023	Se realizó socialización del proyecto ante todas las partes involucradas y se dió inició al desmonte de cielo raso.	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	16/2/2023	Se continuó con el Desmonte de cielo raso y desmonte de láminas de etermit, posterior a esto se realizó Limpieza de zona de trabajo	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	17/2/2023	Se continuó con el Desmonte de cielo raso y desmonte de láminas de etermit, posterior a esto se realizó Limpieza de zona de trabajo	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	18/2/2023	Se continuó con el Desmonte de cielo raso y desmonte de láminas de etermit, posterior a esto se realizó Limpieza de zona de trabajo	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	1391,26		-	516,22	$4.221	$2.178.974	516,22	875,04
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	678,365644		-	102,46	$20.865	$2.137.840	102,46	575,91
							VALOR DE OBRA	$4.316.814		
							INCIDENCIA	0,11%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Arq. Alberto Diaz	Arq. Angelo Sanchez	Andamios Certificados	NO APLICA
			Herramientas menores	NO APLICA
				NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 11	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 2	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 3	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 4	ACOPIO RCD



FOTO 5	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 6	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA** **No. 11**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 7	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 8**	DESMONTE DE CIELO RASO IED MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO EBRATT**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA** **No. 12**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	2	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	2,20%	0,00%	0,00%	6	2,20%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,08%	0,00%	0,00%	7	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,08%	0,00%	0,00%	8	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,08%	0,00%	0,00%	9	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,08%	0,00%	0,00%	10	3,08%	0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,08%	0,11%	0,11%	11	3,08%	0,11%	$ 4.316.814	0,11%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,08%	0,74%	0,85%	12	3,08%	0,74%	$ 28.579.728	0,85%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

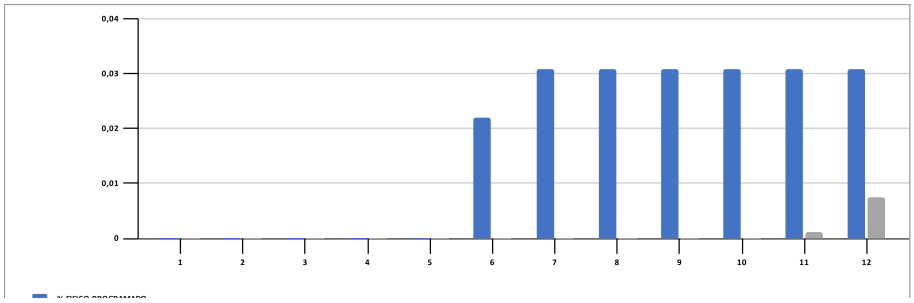

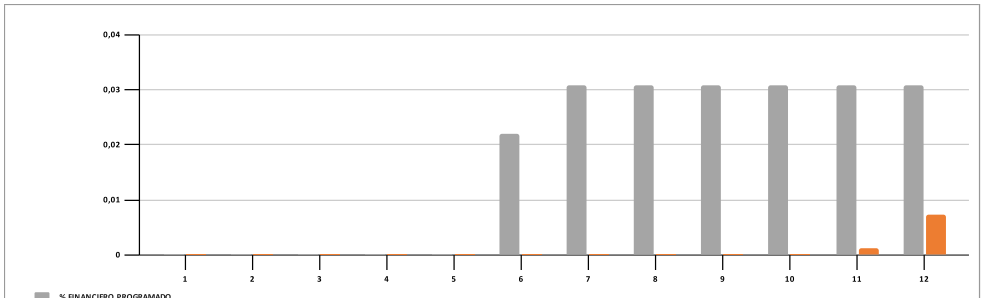

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 12

Código:	IP-FM-31
VERSION:	01
FECHA:	6/9/2021
Paginas:	1 de 1

% FISICO PROGRAMADO
% FISICO EJECUTADO
% FINANCIERO PROGRAMADO
% FINANCIERO EJECUTADO

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	19/2/2023	**No se desarrollan actividades de Obra IE Mayor de Barranquilla**	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	20/2/2023	Se realizó el desmonte de listones de madera en cielo raso demolido,Limpieza de pasillos y Acopio de escombros	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	21/2/2023	Se realizó el desmonte de listones de madera en cielo raso demolido,Limpieza de pasillos y Acopio de escombros	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	22/2/2023	Se realizó el desmonte de listones de madera en cielo raso demolido,Limpieza de pasillos y Acopio de escombros	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	23/2/2023	Se realizó el desmonte de listones de madera en cielo raso demolido,Limpieza de pasillos y Acopio de escombros	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	24/2/2023	Se realizó el desmonte de cielo raso y desmonte de lamparas.	N/A
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	25/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra IE Mayor de Barranquilla	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	1391,26		516,22	589,97	$4.221	$2.490.256	1.106,19	285,07
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		-	14,79	$20.699	$306.035	14,79	571,22
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22,5354		-	0,23	$266.275	$61.527	0,23	22,30
2.06	ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449,1		-	16,11	$32.124	$517.556	16,11	1.432,99
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	92,8125		-	14,79	$93.507	$1.382.501	14,79	78,03
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405,50004		-	795,32	$9.568	$7.609.622	795,32	44.610,18
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND			-	41,60	$40.436	$1.682.138	41,60	- 41,60
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	39,69		-	0,74	$1.742.818	$1.285.328	0,74	38,95
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306,6		-	30,00	$18.074	$542.220	30,00	276,60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	117		-	23,60	$14.939	$352.560	23,60	93,40
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	345,6		-	67,21	$32.154	$2.161.035	67,21	278,39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254,6		-	132,22	$33.985	$4.493.605	132,22	1.122,38
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570,6		-	86,76	$39.196	$3.400.645	86,76	483,84
