EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA MANUEL ELKIN PATARROYO No. 15	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 2	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 3	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 4	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA MANUEL ELKIN PATARROYO** **No. 15**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

			
FOTO 5	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO	**FOTO 6**	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED MANUEL ELKIN PATARROYO No. 16**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	9	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	10	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	11	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	2,65%	9,63%	9,63%	12	2,65%	9,63%	$ 8.585.539	9,63%
13	26/2/2023	4/3/2023	28,45%	26,17%	35,79%	13	28,45%	26,17%	$ 23.335.160	35,79%
14	5/3/2023	11/3/2023	14,33%	19,46%	55,25%	14	14,33%	19,46%	$ 17.352.943	55,25%
15	12/3/2023	18/3/2023	13,01%	13,36%	68,61%	15	13,01%	13,36%	$ 11.910.273	68,61%
16	19/3/2023	25/3/2023	12,13%	11,88%	80,49%	16	12,13%	11,88%	$ 10.597.753	80,49%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

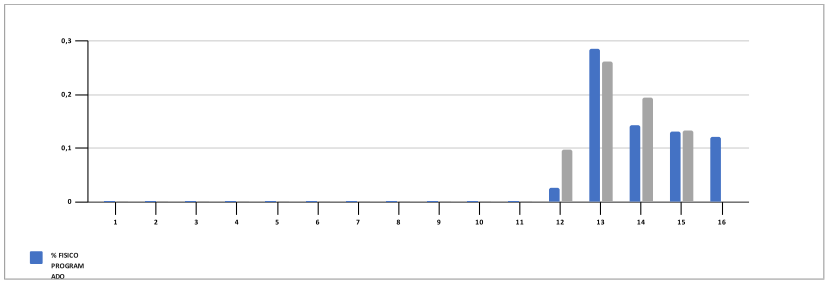

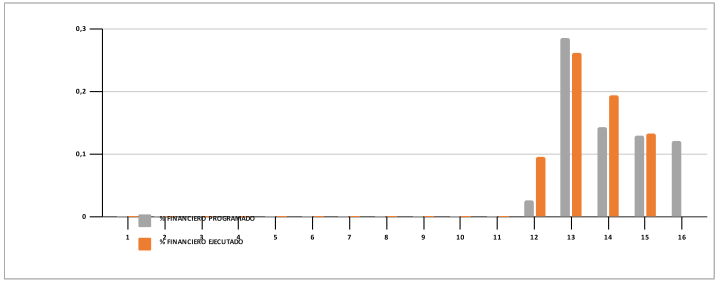

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

EDMBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED MANUEL ELKIN PATARROYO No. 16	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	19/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	20/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	21/3/2023	Ajuste de estribos en corona de columnas y se instalaron Grafiles de muros	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	22/3/2023	Encofrado y fundida de columnas	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	23/3/2023	Vaciado de columnas y liberación de columnas previamente fundidas.	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	24/3/2023	Desencofrado de columnas y figurado de acero de refuerzo para viga de amarre	N/A
MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 -199	25/3/2023	Figurado de acero de refuerzo para viga de amarre superior	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	MODIFICATIVA No.01	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	178,5	233,55	233,55		$4.221	$0	233,55	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL		0	30,00	21,00	6,00	$454.545	$2.727.270	27,00	3,00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	7,14	12,55	12,55		$252.961	$0	12,55	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	51	18,63	18,63		$20.699	$0	18,63	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	27	60,87	60,87		$93.507	$0	60,87	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	21,32	45,90	45,90		$34.062	$0	45,90	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	27,3	54,93	54,93		$54.171	$0	54,93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1635,6	1.412,45	1.282,98	129,47	$9.568	$1.238.769	1.412,45	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4,59	4,67	4,67		$894.392	$0	4,67	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2,559375	3,19	-	3,19	$1.742.818	$5.559.589	3,19	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	51	59,01	59,01		$99.065	$0	59,01	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3	1,53	1,53		$813.350	$0	1,53	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	153	142,95	132,30	10,65	$100.669	$1.072.125	142,95	- 0,00
							VALOR DE OBRA	$10.597.753		
							INCIDENCIA	11,88%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MANUEL ELKIN PATARROYO	Arq. Alberto Diaz	Arq. Angelo Sanchez	Tronzadora	NO APLICA
			Andamios Certificados	NO APLICA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IED MANUEL ELKIN PATARROYO No. 16**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**
	Herramientas menores	**NO APLICA**	

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levante de muro en mamposteria IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 2	Acero de refuerzo columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO




FOTO 3	Acero de refuerzo para viga sobre muro IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 4	Armado formaleta para columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO





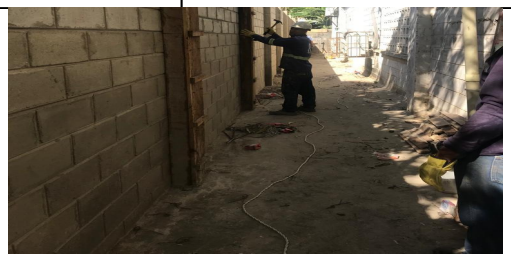


FOTO 5	Armado formaleta para columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 6	Vaciado columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 7	Armado formaleta para columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO



FOTO 8	Desencofrado columnas IED MANUEL ELKIN PATARROYO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO	NOMBRE DANIEL CANTILLO
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 15 IED LA LIBERTAD**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	9	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	10	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	11	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	12	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,32%	0,00%	0,00%	13	3,32%	0,00%	$ 0	0,00%
14	5/3/2023	11/3/2023	8,50%	0,00%	0,00%	14	8,50%	0,00%	$ 0	0,00%
15	12/3/2023	18/3/2023	11,50%	0,00%	0,00%	15	11,50%	0,00%	$ 0	0,00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

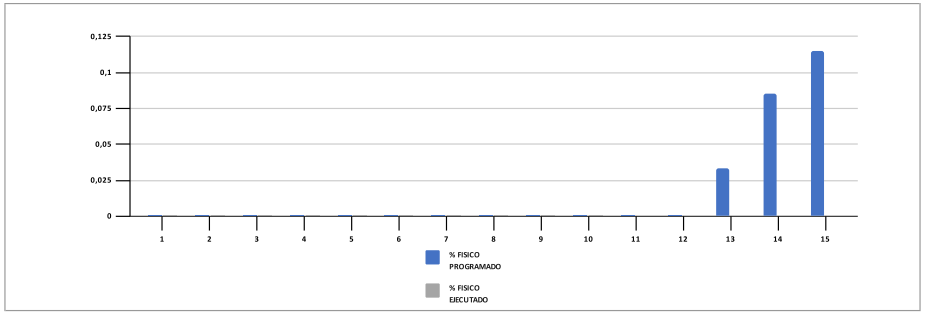

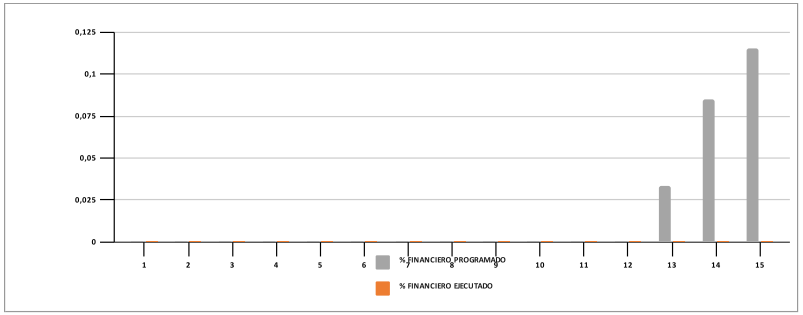

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-137	12/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-138	13/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-139	14/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-140	15/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-141	16/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-142	17/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-143	18/3/2023	Se realizaron actividades de reconocimineto y posterior limpieza de las aulas destinadas para iniciar la intervención de desmonte de cubierta.	

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista de Obra dispuso en su personal en campo destinado a las actividades preeliminares para el inicio de actividades.

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
FRENTE DE	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
LA LIBERTAD	Arq. Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	Hidrolavadora	NO APLICA
		Inspector. Luis Mendoza	Herramientas Menores	NO APLICA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 16**	**IED LA LIBERTAD**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	9	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	10	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	11	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0,00%	0,00%	0,00%	12	0,00%	0,00%	$ 0	0,00%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,32%	0,00%	0,00%	13	3,32%	0,00%	$ 0	0,00%
14	5/3/2023	11/3/2023	8,50%	0,00%	0,00%	14	8,50%	0,00%	$ 0	0,00%
15	12/3/2023	18/3/2023	11,50%	0,00%	0,00%	15	11,50%	0,00%	$ 0	0,00%
16	19/3/2023	25/3/2023	13,10%	8,03%	8,03%	16	13,10%	8,03%	$ 29.086.874	8,03%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

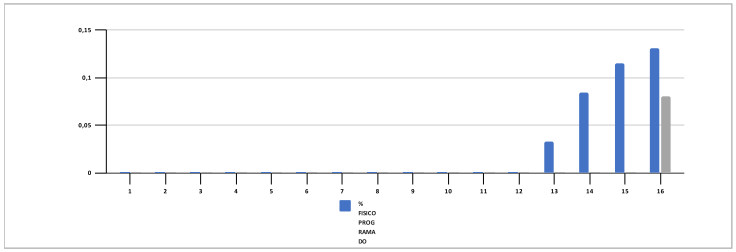

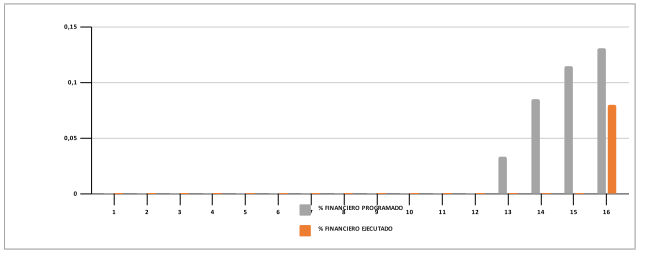

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-137	19/3/2023	Se inició el desmonte de luminarias, revisión de correas internas y el desmonte de laminas .	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-138	20/3/2023	Se continuó el desmonte de puntos electricos tuberias (Tomacorrientes y abanicos),se contnuó con el lavado de muros con hidrolavadora e inició la escarificacion de muros.	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-139	21/3/2023	Se continuó con la escarificacion de mensulas en concreto asi mismo se inició el mantenimiento y pintura de correas internas.	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-140	22/3/2023	Se continuó con la escarificacion de elementos estructurales, desmonste de cubiertas y correas principales.	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-141	23/3/2023	Se realizó reparación vigas en concreto mediante la implementación de mortero de reparación, se continuó con la escarificacion de pañetes sobre muros e inició de estuco para muros.	

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 16**	**IED LA LIBERTAD**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-142	24/3/2023	Se continuo con el proceso de estuco sobre pañete y asi mismo se realizó reparacion de vigas incluyendo acero para refuerzo.	
LA LIBERTAD	Carrera 26 # 74b-143	25/3/2023	Se inició la instalacion de lamparas y cometida electrica, se continuó con el desmonte de correas externas e instalación de correas nuevas.	

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	730,00			**120,05**	**$ 4.221,00**	$ 506.731,05	**120,05**	**609,95**
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	730,00			**120,05**	**$ 9.648,00**	$ 1.158.242,40	**120,05**	**609,95**
2.06	ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	139,21			**149,471**	**$ 32.124,00**	$ 4.801.606,40	**149,47**	- **10,26**
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	568,57			**198,3**	**$ 33.985,00**	$ 6.739.225,50	**198,30**	**370,27**
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	253,80			**50**	**$ 17.948,00**	$ 897.400,00	**50,00**	**203,80**
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	28,00			**12**	**$ 19.629,00**	$ 235.548,00	**12,00**	**16,00**
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	28,00			**20**	**$ 16.601,00**	$ 332.020,00	**20,00**	**8,00**
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	14,00			**6**	**$ 19.709,00**	$ 118.254,00	**6,00**	**8,00**
NP-22	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	156,20			**60,68**	$ 160.720,00	$ 9.752.489,60	**60,68**	**95,52**
							VALOR DE OBRA:	$ 29.086.873,71		
							INCIDENCIA:	8,03%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
LA LIBERTAD	Arq. Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	Hidrolavadora	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza	Herramientas Menores	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 DESMONTE DE CUBIERTA



FOTO 2 ESCARIFICACION DE PAÑETE Y ESTUCADO



FOTO 3	DESMONTE DE CUBIERTA



FOTO 4	DESMONTE DE CUBIERTA



FOTO 5	DESMONTE DE CUBIERTA



FOTO 6	

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 16**	**IED LA LIBERTAD**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1





FOTO 7	DESMONTE DE CUBIERTA	**FOTO 8**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y ESTUCADO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE Daniel Cantillo E.**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	26	AL	4	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:		SA-EDU-0001-2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:		CONSORCIO IE DISTRITO	


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL		$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL		31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO		6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION		N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO		% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	1,37%	0,00%	0,00%	6	1,37%		0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,28%	0,00%	0,00%	7	3,28%		0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,94%	0,00%	0,00%	8	3,94%		0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	4,67%	0,00%	0,00%	9	4,67%		0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,93%	0,00%	0,00%	10	3,93%		0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,89%	0,00%	0,00%	11	3,89%		0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	2,65%	0,72%	0,72%	12	2,65%		0,72%	$ 185.113.415	0,72%
13	26/2/2023	4/3/2023	2,72%	9,68%	10,40%	13	2,72%		9,68%	$ 101.344.043	10,40%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 1	26/2/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 2	27/2/2023	Se realizó figurado y corte de acero de refuerzo para elementos estructural, así mismo se continuó con excavación manual para Zapata. Reparación del cerramiento perimetral dañado por la comunidad.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 3	28/2/2023	Se inició excavación para Zapata con retrocargador, se continuó con el corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales, así mismo se realizó renivelación manual de excavación. Se realizó demolicion de plantilla y vigas existentes.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 4	1/3/2023	Se inició excavación para Zapata con retrocargador, se continuó con el corte figurado y armado de acero de refuerzo para zapatas, y se realizó fundida de zapatas. Se realizó demolicion de plantilla y vigas existentes.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 5	2/3/2023	Se realizó renivelacion de terreno, armado y figurado de acero para Zapata y Verificación de medidas de las zapatas previamente fundidas. Se realizó demolicion de plantilla y vigas existentes.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 6	3/3/2023	Se realizó renivelacion de terreno, armado y figurado de acero para Zapata, Verificación de medidas de las zapatas previamente fundidas y posterior fundida de pedestal y zapata.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 7	4/3/2023	Se realizó renivelacion de terreno, armado y figurado de acero para Zapata, Verificación de medidas de las zapatas previamente fundidas y posterior fundida de pedestal y zapata.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**			**Código:**	**IP-FM-31**
				VERSION:	**01**
				FECHA:	**6/9/2021**
				Paginas:	**1 de 1**

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	655,59	6.459,53	-	1.391,11	$4.221	5.871.875,31	1.391,11	5.068,42
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	0	70,00	7,00	7,00	$454.545	3.181.815,00	14,00	56,00
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	218,53	665,37	-	182,15	$23.673	4.312.036,95	182,15	483,22
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3		105,61	-	105,61	$252.961	26.715.211,21	105,61	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2		735,13	-	312,78	$20.699	6.474.233,22	312,78	422,35
2.10	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3		721,26	39,32	130,68	$90.362	11.808.506,16	170,00	551,26
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	77,76	345,72	-	122,00	$54.171	6.608.862,00	122,00	223,72
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8518,3	16.332,04	85,44	1.251,15	$9.568	11.971.003,20	1.336,59	14.995,45
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	103,8	208,30	-	30,00	$813.350	24.400.500,00	30,00	178,30
							EJECUTADO	101.344.043,05		
							INCIDENCIA	9,68%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	Arq. Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	TRONZADORA	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza	TROMPO	NO APLICA
			HERRAMIENTAS MENORES	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

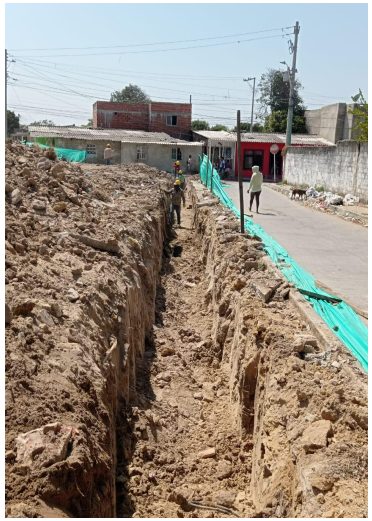


FOTO 1	Excavacion para zaptas IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

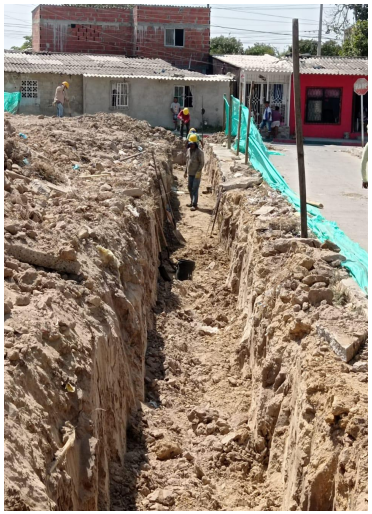


FOTO 2	Excavacion para zaptas IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**		**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**



FOTO 3	Excavacion para zaptas IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 4	Excavacion para zaptas IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 5	Armado acero de refuerzo zapata IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 6	Armado acero de refuerzo zapata IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**			**Código:**	**IP-FM-31**
				VERSION:	**01**
				FECHA:	**6/9/2021**
				Paginas:	**1 de 1**





FOTO 7	Armado acero de refuerzo zapata IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**FOTO 8**	Encofrado acero de refuerzo zapata IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	5	AL	11	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:		SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:		CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL		$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL		31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO		6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION		N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO		% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	1,37%	0,00%	0,00%	6	1,37%		0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,28%	0,00%	0,00%	7	3,28%		0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,94%	0,00%	0,00%	8	3,94%		0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	4,67%	0,00%	0,00%	9	4,67%		0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,93%	0,00%	0,00%	10	3,93%		0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,89%	0,00%	0,00%	11	3,89%		0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	2,65%	0,72%	0,72%	12	2,65%		0,72%	$ 7.552.339	0,72%
13	26/2/2023	4/3/2023	2,72%	9,68%	10,40%	13	2,72%		9,68%	$ 101.344.043	10,40%
14	5/3/2023	11/3/2023	4,55%	8,56%	18,96%	14	4,55%		8,56%	$ 89.651.057	18,96%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 1	5/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 2	6/3/2023	Se realizó fundida de pedestal, Armado y figurado de pedestal,encofrado de pedestal alistamiento de terreno, posterior fundida de Zapata y levante de muro	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 3	7/3/2023	Se realizó fundida de pedestal, Levante de muro y continuación del armado y figurado de acero, Se continuó con la excavacion del terreno.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 4	8/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 5	9/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 6	10/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 7	11/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	655,59	6.459,53	1.391,11	4.412,83	$4.221	18.626.555,43	5.803,94	655,59
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	0	70,00	14,00	7,00	$454.545	3.181.815,00	21,00	49,00
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	218,53	665,37	182,15	22,15	$23.673	524.356,95	204,30	461,07
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	105,61	105,61	105,61		$252.961	-	105,61	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735,13	735,13	312,78	118,55	$20.699	2.453.866,45	431,33	303,80
2.10	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721,26	721,26	170,00	232,15	$90.362	20.977.538,30	402,15	319,11
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	77,76	345,72	122,00	85,00	$54.171	4.604.535,00	207,00	138,72
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8518,3	16.332,04	1.336,59	2.235,44	$9.568	21.388.689,92	3.572,03	12.760,01
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	103,8	208,30	30,00	22,00	$813.350	17.893.700,00	52,00	156,30
							EJECUTADO	89.651.057,05		
							INCIDENCIA	8,56%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	Arq. Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	TRONZADORA	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza	TROMPO	NO APLICA
			HERRAMIENTAS MENORES	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	LEVANTAMIENTO MURO EN BLOQUE DE CONCRETO IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 2	LEVANTAMIENTO MURO EN BLOQUE DE CONCRETO IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**



FOTO 3	ENCOFRADO PEDESTAL IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 4	ARAMADO PEDESTAL IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"


1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:		SA-EDU-0001-2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:		CONSORCIO IE DISTRITO	
VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL		$1.349.952.660,00	
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL		31 DE DICIEMBRE DE 2022	
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO		6 DE DICIEMBRE DE 2022	
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA		HASTA 31 DE JULIO DE 2023	
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION		N/A	
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO		HASTA 31 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE JULIO DE 2023	

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO		% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	1,37%	0,00%	0,00%	6	1,37%		0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,28%	0,00%	0,00%	7	3,28%		0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,94%	0,00%	0,00%	8	3,94%		0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	4,67%	0,00%	0,00%	9	4,67%		0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,93%	0,00%	0,00%	10	3,93%		0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,89%	0,00%	0,00%	11	3,89%		0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	2,65%	0,72%	0,72%	12	2,65%		0,72%	$ 7.552.339	0,72%
13	26/2/2023	4/3/2023	2,72%	9,68%	10,40%	13	2,72%		9,68%	$ 101.344.043	10,40%
14	5/3/2023	11/3/2023	4,55%	8,56%	18,96%	14	4,55%		8,56%	$ 89.651.057	18,96%
15	12/3/2023	18/3/2023	4,66%	13,50%	32,46%	15	4,66%		13,50%	$ 141.411.696	32,46%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

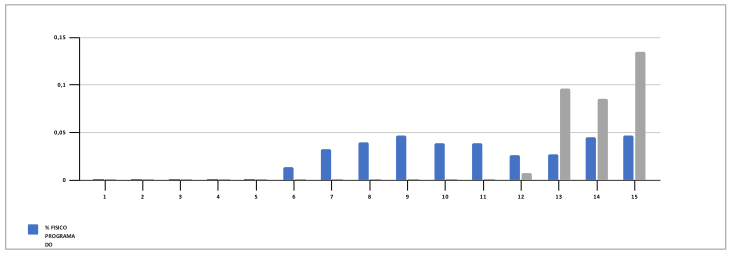

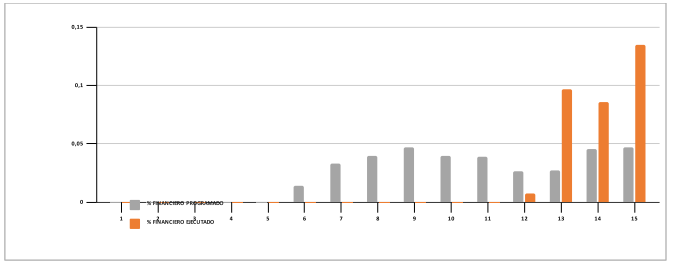

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 1	12/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 2	13/3/2023	Demolicion y excavacion manual.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 3	14/3/2023	Armado y figurado de acero. Excavación manual fachada sur.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 4	15/3/2023	Excavación, Se realizó fundida de zapata y continuación del armado y figurado de acero	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 5	16/3/2023	Se realizó excavación para Zapata con retrocargador. Excavación manual para Zapata y armado de parrilla para Zapata. Armado y figurado de acero.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 6	17/3/2023	Se realizó Armado y figurado de acero. Encofrado de pedestal. se inició el levante de muro en bloque de concreto, posterior a esto se procedio al relleno con material seleccionado.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 7	18/3/2023	Se realizó Armado y figurado de acero. Nivelación Manual de terreno. Se continuó el levante de muro en bloque de concreto, posterior a esto se procedio al relleno con material seleccionado.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	655,59	6.459,53	5.803,94		$4.221	-	5.803,94	655,59
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	0	70,00	21,00	7,00	$454.545	3.181.815,00	28,00	42,00
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	218,53	665,37	204,30	110,54	$23.673	2.616.813,42	314,84	350,53
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3		105,61	105,61		$252.961	-	105,61	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2		735,13	431,33	303,80	$20.699	6.288.356,20	735,13	-
2.10	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3		721,26	402,15	177,15	$90.362	16.007.628,30	579,30	141,96
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	271,2	886,39	-	263,00	$192.928	50.740.064,00	263,00	623,39
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	77,76	345,72	207,00	17,00	$54.171	920.907,00	224,00	121,72
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8518,3	16,332,04	3.572,03	1.527,42	$9.568	14.614.354,56	5.099,45	#VALUE!
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML		675,80	-	171,00	$27.186	4.648.806,00	171,00	504,80
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	103,8	208,30	52,00	14,00	$813.350	11.386.900,00	66,00	142,30
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	655,59	1.329,56	-	308,00	$100.669	31.006.052,00	308,00	1.021,56
							EJECUTADO	141.411.696,48		
							INCIDENCIA	13,50%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	Arq. Alberto Diaz	Arq. Alexandra Villareal	TRONZADORA	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza	TROMPO	NO APLICA
			HERRAMIENTAS MENORES	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO





FOTO 1	ARMADO REFUERZO EN ACERO PARA PEDESTAL	FOTO 2	ARMADO REFUERZO EN ACERO PARA PEDESTAL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.	NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	MES	3	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL	19	AL	25	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:		SA-EDU-0001-2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:		CONSORCIO IE DISTRITO	


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL		$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL		31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO		6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION		N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO		HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO		% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%		0,00%	$ 0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	1,37%	0,00%	0,00%	6	1,37%		0,00%	$ 0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,28%	0,00%	0,00%	7	3,28%		0,00%	$ 0	0,00%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,94%	0,00%	0,00%	8	3,94%		0,00%	$ 0	0,00%
9	29/1/2023	4/2/2023	4,67%	0,00%	0,00%	9	4,67%		0,00%	$ 0	0,00%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,93%	0,00%	0,00%	10	3,93%		0,00%	$ 0	0,00%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,89%	0,00%	0,00%	11	3,89%		0,00%	$ 0	0,00%
12	19/2/2023	25/2/2023	2,65%	0,72%	0,72%	12	2,65%		0,72%	$ 7.552.339	0,72%
13	26/2/2023	4/3/2023	2,72%	9,68%	10,40%	13	2,72%		9,68%	$ 101.344.043	10,40%
14	5/3/2023	11/3/2023	4,55%	8,56%	18,96%	14	4,55%		8,56%	$ 89.651.057	18,96%
15	12/3/2023	18/3/2023	4,66%	13,50%	32,46%	15	4,66%		13,50%	$ 141.411.696	32,46%
16	19/3/2023	25/3/2023	3,28%	22,15%	55%	16	3,28%		22,15%	$ 232.033.863	55%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

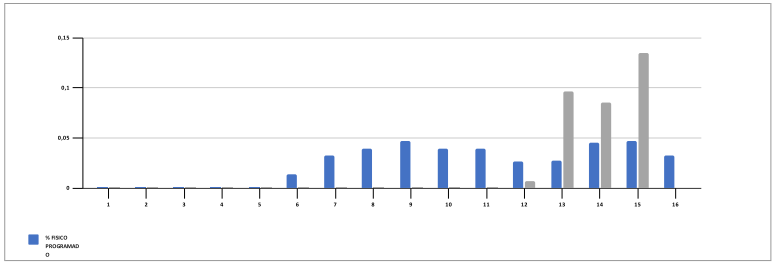



3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 1	19/3/2023	No se desarrollan actividades de Obra	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 2	20/3/2023	Figurado de acero y fundida de pedestal, continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 3	21/3/2023	Excavacion mecanica, armado y figurado de acero para Zapata, pedestal y nivelacion de terreno.continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 4	22/3/2023	se continuó con levante en bloque, se termina excavación mecánica y manual, se continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CLL 74 # 3SUR - 5	23/3/2023	Se realizó Relleno con material seleccionado en excavacion de cimentación, asi mismo se continuó con el Levante en bloque para muro, se realizó Revision liberación y posterior fundida de concreto para pedestal (11.90 ml) y zapatas (5.0 ml) continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas.	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**		**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**CLL 74 # 3SUR - 6**	24/3/2023	Armado y figurado de acero y nivelacion de terreno.continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas.	N/A
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**CLL 74 # 3SUR - 7**	**25/3/2023**	Fundida de Zapata sobre fachada Oeste,continuó el levante de muro en bloque concreto incluyendo anclaje de dovelas. Revisión de armado de acero de zapata Revision y liberación de fundida de concreto para zapata,Reconstrucción de cerramiento en Tela verde y aseo general.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	655,59	6.459,53	5.803,94		$4.221	-	5.803,94	655,59
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL**	DIA	0	70,00	28,00	7,00	$454.545	3.181.815,00	35,00	35,00
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	655,59	6.459,53	-	5.680,15	$9.648	54.802.087,20	5.680,15	779,38
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	218,53	665,37	314,84	132,00	$23.673	3.124.836,00	446,84	218,53
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3		105,61	105,61		$252.961	-	105,61	-
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2		735,13	735,13		$20.699	-	735,13	-
2.10	**EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	M3		721,26	579,30	114,82	$90.362	10.375.364,84	694,12	27,14
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	271,2	886,39	263,00	307,00	$192.928	59.228.896,00	570,00	316,39
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	77,76	345,72	224,00	24,50	$54.171	1.327.189,50	248,50	97,22
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	8518,3	16.332,04	5.099,45	2.187,66	$9.568	20.931.530,88	7.287,11	9.044,93
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	8,19	16,34	-	2,15	$1.894.074	4.072.259,10	2,15	14,19
2.24	**DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.**	ML		675,80	171,00	452,00	$27.186	12.288.072,00	623,00	52,80
2.39	**ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	103,8	208,30	66,00	34,00	$813.350	27.653.900,00	100,00	108,30
3.06	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,**	MT2	655,59	1.329,56	308,00	348,15	$100.669	35.047.912,35	656,15	673,41
							EJECUTADO	232.033.862,87		
							INCIDENCIA	22,15%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**Arq. Alberto Diaz**	**Arq. Alexandra Villareal**	**TRONZADORA**	**NO APLICA**
		Inspector Luis Mendoza	**TROMPO**	**NO APLICA**
			HERRAMIENTAS MENORES	**NO APLICA**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 Levante de muro en bloque de concreto IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



FOTO 2 Curado de zapatas

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16 COMUNITARIA 7 DE ABRIL**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FOTO 1	Levante de muro en bloque de concreto IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**FOTO 2**	Curado de zapatas





FOTO 3	Levante de muro en bloque de concreto IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**FOTO 4**	Rearmado Cerramiento provisional





FOTO 5	Levante de muro en bloque de concreto IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL	**FOTO 6**	Levante de muro en bloque de concreto IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Arq. Alexandra Villareal	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**	**NOMBRE: DANIEL CANTILLO E.**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

ANEXO 6 RELACION DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA

Barranquilla, 09 de marzo de 2023 **CIED-2023-040**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Seguridad Social y ritmo de trabajo IED JOSE EUSEBIO CARO

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las funciones asignadas como interventoría al Contrato de Obra EDU-345-2022 se pudo establecer que personal que se encuentra realizando las actividades constructivas en el frente de obra IED JOSE EUSEBIO CARO, no ha sido entregada, recordamos que dicha afiliación y entrega de documentación es obligatoria para todo personal que se encuentre presente en cualquier frente de obra como se encuentra pautado en el contrato de obra firmado en la cláusula 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA *"…10) Acreditar el aporte al sistema de seguridad social (Pensión, Salud, ARL). Si es persona jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante legal o revisor fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social…"*, por lo cual solicitamos la suspensión de la obra y tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento de los dichos requisitos indispensables para la ejecución de las obras.

Por otro lado, se evidencia que las actividades constructivas del frente de obra se encuentran rezagadas, puesto que no mantienen un ritmo constante que permita el cumplimiento de la obra con respecto al cronograma de esta. Por lo tanto, solicitamos gestión para este tipo de incidentes que afectan la ejecución de las obras.

Permanecemos atentos a la gestión de las problemáticas expuestas.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 24 de marzo de 2023 **CIED-2023-041**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECTIVOS EN OBRA COMUNITARIA 7 DE ABRIL

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras funciones como Interventoría del Contrato de Obra EDU-345-2022, nos permitimos solicitar que se tomen todas las medidas necesarias para subsanar las observaciones realizadas sobre el levante de muro de cerramiento en la IED Comunitaria 7 De Abril, teniendo en cuenta que durante el recorrido realizado el día 24/03/2023, en conjunto con la Supervisión del contrato, el Contratista y esta Interventoría, se pudo evidenciar que el levante del muro no cumple con las especificaciones descritas en los planos entregados para la institución educativa.
Se evidencia que la conformación de la zapata se dispuso de manera excéntrica, contrario a conformación concéntrica como se muestra en la Figura 1, y que las secciones de cimentación y del pedestal igualmente difieren de lo solicitado para la institución. Estas apreciaciones han sido de carácter recurrente, habiendo sido allegadas al contratista de obra con anterioridad; sin embargo, no se han tomado los correctivos para dicha situación.
Dado el caso, solicitamos rectificar en su totalidad la conformación de esta estructura y llevar la construcción de esta en total conformidad con las especificaciones suministradas en los planos, dando uso todo recurso a disposición para subsanar lo anterior mencionado, incluyendo la reconstrucción del levante en caso de ser necesario.

Recordamos igualmente, las juntas de dilatación según diseño a cada 4 metros, las cuales no se han tomado en cuenta en el desarrollo del levante actual, por lo cual, solicitamos tomar los correctivos sobre este aspecto al igual que sobre el cerramiento instalado en polisombra, el cual se ha evidenciado inadecuado para los requerimientos puntuales de la IED.

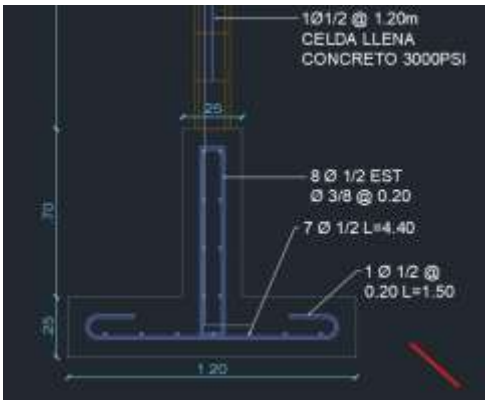


Figura 1 Detalle estructural de Zapata


Figura 2 Conformación de zapata y pedestal encontrada en sitio.

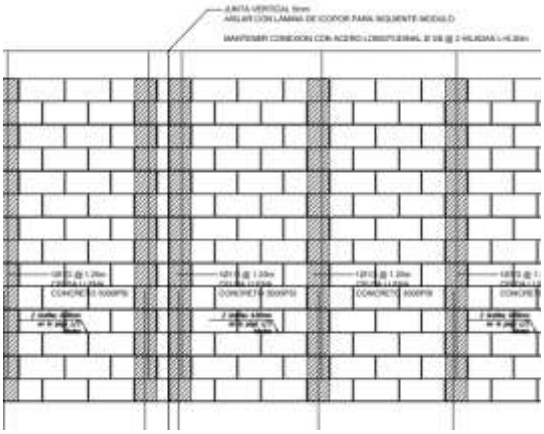


Figura 3 Especificaciones de junta de dilatación



Figura 4 Muro sin junta de dilatación



Figura 5 Polisombra caída

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 09 de marzo de 2023 **CIED-2023-039**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: COMUNITARIA 7 DE ABRIL

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento como Interventoría al Contrato de Obra EDU-345-2022, nos permitimos solicitar su presencia en comité de seguimiento el día 9 de marzo de 2023, a las 9:00 am en las instalaciones de EDUBAR, con el fin de discutir la línea de trabajo sobre la IED Comunitaria 7 de abril, en vista de incongruencias identificadas sobre la línea de construcción del muro de cerramiento contemplado los alcances, y los diseños definidos para este.
Durante nuestras visitas de inspección fue posible evidenciar que este está siendo construido en una línea a 1.2m a partir del ancho de vía, la cual dista de la establecida en los diseños, el cual está prevista a distancia promedio de 2.9m. Dicho trazado deberá ser revisado y aprobado en acuerdo con los lineamientos y normativas que regulan la intervención en este contrato, por lo cual agradecemos su presencia en comité, con el fin de convenir los correctivos a tomar en la mayor brevedad posible.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

RECIBIDA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

IP-00232

Barranquilla, 07 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRACTO DE INTERVENTORIA N°SA-EDU-0001-2022, QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS RIESGOS PRESENTES EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y RESPEL.

Cordial saludo

En atención al contrato en referencia y con base a la implementación y cumplimiento de la normatividad colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, se permita remitir soporte de las gestiones realizadas frente a los controles que deben ser desarrollados e implementados para la protección del personal y del medio ambiente con referencia a los riesgos presentes por las actividades de demolición (RCD) y desmonte de las láminas con asbesto debido a la fibra y el polvo que esta libera en el ambiente, por lo cual estas fibras y polvillos pueden ingresar al organismo por las vías respiratorias, aumentando el riesgo de enfermedades como asbestosis, mesotelioma y cáncer pulmonar entre otras.

Por lo anterior se solicita en calidad de gerente del proyecto, la entrega de los siguientes documentos con las respectivas aprobaciones por parte de la firma de interventoría que usted representa y los anexos de la implementación y cumplimiento por parte del contratista.

- Registros de las inspecciones o formatos utilizados donde se evidencie el adecuado manejo de los puntos de acopio de residuos de construcción, demolición y residuos peligrosos donde se:
    A. Efectué la separación de acuerdo al tipo de RCD.

B. Verifique el cumplimiento de establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento o de acopio.
C. Áreas de acopio debidamente demarcadas y señalizadas.
D. Almacenamiento y acopio adecuado acorde al tipo de residuo.

- Inspección de los vehículos que realicen el cargue y retiro de los residuos de construcción y demolición, verificando que no cuenten con extensiones de madera y que estén completamente carpados para evitar caída de material durante su transporte.
- Verificación del uso de elementos de protección personal para evitar el riesgo presente en la actividad de desmonte de cubierta de lámina de asbesto cemento y demolición.
- Permisos y análisis de trabajo seguro con su respectiva aprobación del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo.

Agradecemos de antemano su atención y pronta colaboración

Cordialmente

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyectó: Jhonatan Beltrán
Revisó: Lizz Figueredo

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

IP-00233

Barranquilla, 07 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N°SA-EDU-0001-2022, QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: CONTROL EN LA GESTION DE RCD Y RESPEL

Cordial saludo

Respetada doctora Baquero

En virtud que se vienen ejecutando actividades generadoras de RCD en los frentes de trabajo contemplados en el contrato de obra, se hace necesario intensificar el control de la gestión con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos definidos en la Resolución 1257 de 2021, emitida MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en la que se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.

Por lo anterior, la documentación de los gestores de RCD y los sitios de disposición final a utilizar en el proyecto deben estar verificados y validados por su firma interventora, además, los registros documentales de la gestión de estos residuos debe estar disponible de manera permanente para verificación tanto de la entidad como de la autoridad ambiental cuando esta lo requiera, igualmente, deben adjuntarse de manera mensual en el informe y como parte del acta de pago parcial, conforme a lo definido en el contrato de obra.

EDUBAR S.A manifiesta de manera expresa, que no se autoriza el retiro y disposición de los volúmenes de RCD, por gestores que no hayan sido verificados y validados por ustedes, por lo tanto, si se llegase omitir este requisito, los costos en el que se

incurra, no tendrán el reconocimiento económico hasta que se entregue la evidencia del cumplimiento de los requisitos de ley.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración

Cordialmente

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyectó: Jhonatan Beltrán
Revisó: Lizz Figueredo

IP - 00235

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

Barranquilla, 07 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRACTO DE INTERVENTORIA N°SA-EDU-0001-2022, QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST.

Cordial saludo

En atención a la supervisión del contrato de obra No. EDU-345-2022, se han realizado inspecciones de campo en las cuales se ha evidenciado la ausencia de controles ambientales y de SST. Por lo anterior, se solicita en virtud de sus funciones como interventoría, garantizar el seguimiento y verificación de los controles, requisitos y procedimientos requeridos en todas las actividades realizadas para controlar y mitigar los posibles impactos y aspectos ambientales, además de minimizar, mitigar y controlar los riesgos y peligros presentes con base a la seguridad y salud en el trabajo. Reiterando así, las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría N°SA-EDU-0001-2022.

Agradecemos de antemano su atención y pronta colaboración

Cordialmente

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyecto: Jhonatan Beltrán
Reviso: Lizz Figueredo

IP-00308

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

Barranquilla, 22 de marzo de 2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

ASUNTO: Falencias en procesos constructivos de elementos estructurales.

Cordial saludo

Durante la visita realizada por parte de nuestro equipo técnico en el "IED Comunitaria 7 de Abril" el día martes 21 de marzo del 2023, se evidenciaron falencias en la ejecución de diversas actividades las cuales se relacionan a continuación:

- Fundida de elementos estructurales sin el uso de vibrador de concreto
- Fundida de elementos estructurales (pedestal) con espesores menores a los establecidos en los planos y especificaciones.
- Armado incorrecto de acero de refuerzo de elementos estructurales (zapata), de acuerdo a planos y especificaciones.
- El pedestal no se encuentra en el eje central de la zapata tal y como lo establecen los planos correspondientes.
- No se evidenciaron formatos de liberación del acero así como tampoco se encontraban ni el residente de obra ni el de interventoría en sitio durante la fundida.

Adicionalmente, durante el recorrido realizado en el "IED MANUEL ELKIN PATARROYO" el día jueves 16 de marzo del 2023, se evidenció un armado inadecuado del acero de refuerzo de las columnas del muro en construcción. Se realizaron las anotaciones correspondientes en la bitácora en sitio.

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

IP-00308

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

Por lo anterior, solicitamos se realicen los correctivos correspondientes para garantizar que los elementos estructurales cumplan con lo establecido en los planos y especificaciones correspondientes. Además, solicitamos reforzar el control y seguimiento de todas las actividades en ejecución.

Anexamos registro fotográfico de las falencias mencionadas y especificaciones correspondientes como soporte de los requerimientos solicitados.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Samuel Iglesias Jimenez S.I.
Aprobó: Santiago Jaramillo Córdoba

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

icontec ISO 9001

ANEXO 1 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Ilustración 1 fundida de elementos estructurales sin vibrador de concreto (IED Comunitaria 7 de Abril)



Ilustración 2 Elementos estructurales (pedestal) con espesores menores a los establecidos en los planos y especificaciones (IED Comunitaria 7 de Abril)



Ilustración 3 Armado incorrecto de acero de refuerzo de elementos estructurales (zapata), de acuerdo a planos y especificaciones. (IED Comunitaria 7 de Abril).



Ilustración 4 El pedestal no se encuentra en el eje central de la zapata tal y como lo establecen los planos correspondientes. (IED Comunitaria 7 de Abril).

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

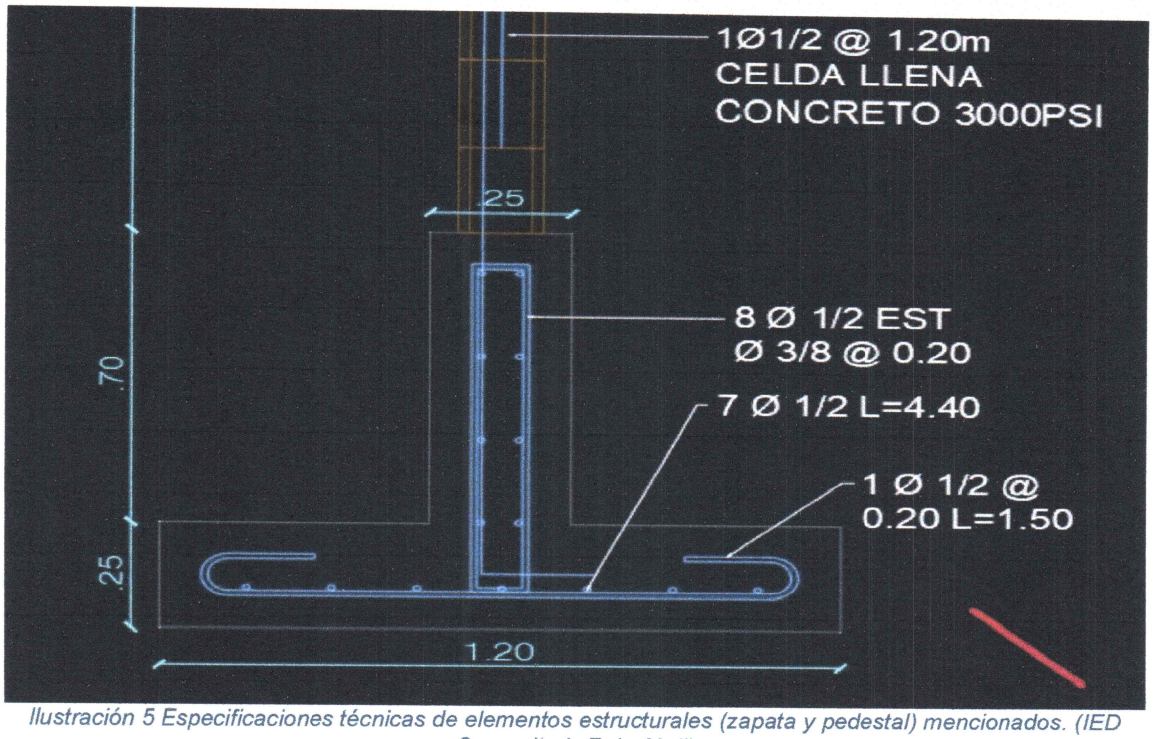


Ilustración 5 Especificaciones técnicas de elementos estructurales (zapata y pedestal) mencionados. (IED Comunitaria 7 de Abril)



Ilustración 6 armado inadecuado del acero de refuerzo de las columnas del muro en construcción (IED Manuel Elkin Patarroyo)

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 28 de febrero de 2023

CED-052-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED SARID ARTETA.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED Sarid Arteta, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 28 de febrero de 2023

CED-053-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED INOCENCIO CHINCA.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED INOCENCIO CHINCA, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 28 de febrero de 2023

CED-054-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED JOSE EUSEBIO CARO.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED JOSE EUSEBIO CARO, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 28 de febrero de 2023

CED-055-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED JOSE EUSEBIO CARO EMERGENCIA.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED JOSE EUSEBIO CARO EMERGENCIA, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 28 de febrero de 2023

CED-056-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 01 de marzo de 2023

CED-057-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: NUEVAS OBSERVACIONES SUBSANADAS – PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED MANUEL ELKIN PATARROYO.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados con las nuevas observaciones subsanadas, de la IED Manuel Elkin Patarroyo, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 01 de marzo de 2023

CED-058-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANADAS - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IED CASTILLO DE LA ALBORAYA.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el presupuesto y la programación de obra ajustados a la fecha con observaciones subsanadas, de la IED Castillo de la Alboraya, para su revisión y observaciones.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 01 de marzo de 2023

CED-059-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: ALCANCE DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el alcance de las actividades que se va a ejecutar en cada una de las IED.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 02 de marzo de 2023

CED-061-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.


ASUNTO: OBSERVACIONES SUBSANDAS INFORME MENSUAL NÚMERO 2. ENTREGA INFORMES SOCIAL Y AMBIENTAL – SST, NÚMERO 2.

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este documento el informe técnico mensual numero 2 con las observaciones enviadas, subsanadas. Adicional, adjuntamos los informes mensuales número dos, social y ambiental – SST, los cuales hacen parte de los anexos del informe técnico mensual.

Por otro lado, de la manera mas amable solicitamos plazo de cinco días hábiles, para realizar entrega de documentos correspondientes a la resolución y certificación de RCD de donde se está realizando la disposición final de los residuos generados durante las obras, debido a temas administrativos que estamos presentando y resolviendo con el proveedor.

Agradeciendo su atención.



CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 02 de marzo de 2023

CED-062-2023

Señores

EDUBAR S.A.

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS IED INOCENCIO CHINCÁ

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos el resultado de los estudios y diseños de solución hidráulica para la IED Inocencio Chincá.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 14 de marzo de 2023

CED-063-2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO

Ciudad

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: ACTA DE COBRO NUMERO 1

Cordial saludo,

De manera comedida, adjuntamos a este correo archivos correspondientes al acta de cobro numero 1 para su revisión y aprobación.

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

CED-064-2023

Señores

EDUBAR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INTERVENTORIA


Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente invitamos a las socializaciones programadas para el día 17 de marzo 2023 a las 10: 00 am, en el **Colegio CASTILLO DE LA ALBORAYA,** con el objetivo de socializar las actividades a realizar en las instituciones, el levantamiento de las actas de vecindad y con sus respectivos registros fotográficos.

Atentamente.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.
