SGC-CP-14915-23
Neiva, agosto 18 de 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No.287 de 2022.

Asunto: Informe de interventoría No.3.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2023, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.3
2. Informes semanales No.11 al No.14
3. Acta de comité técnico No.11 al No.14
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ – Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	3	Periodo comprendido entre el :	1 de julio de 2023	y el:	30 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".	**Objeto:**	"CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
Contrato N.º:	287 DE 2022	**Contrato N.º:**	284 de 2022
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	CONSORCIO BARRERAS 2022
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	**Plazo Inicial:**	CINCO (5) MESES
Fecha de Inicio:	19 de septiembre de 2022	**Fecha de Inicio:**	19 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación:	24 de septiembre de 2023	**Fecha de Terminación:**	24 de septiembre de 2023
Fecha de Suspensión:	3 de octubre de 2023	**Fecha de Suspensión:**	3 de octubre de 2023
Fecha de Reinicio:	8 de mayo de 2023	**Fecha de Reinicio:**	8 de mayo de 2023
Valor Inicial:	$ 145.620.151,00	**Valor Inicial:**	$ 1.834.920.337,00
Valor pagado:	$ -	**Valor pagado:**	$ -
Valor por pagar:	$ 145.620.151,00	**Valor por pagar:**	$ 1.834.920.337,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	23/08/2022	3/04/2024	$ 43.686.046,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	23/08/2022	25/09/2026	$ 14.562.016,00
Calidad del servicio	23/01/2023	24/09/2028	$ 29.124.031,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	19/09/2022	25/03/2024	$ 550.476.101,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/09/2022	25/03/2024	$ 733.968.134,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	19/09/2022	25/09/2026	$ 183.492.033,70
Estabilidad y calidad de las obras	5 años		$ 733.968.134,80
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/09/2022	25/09/2023	$ 300.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ -

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	1,47%	25,05%	26,52%
% Ejecutado	0,61%	41,44%	42,05%
Diferencia	-0,86%	16,39%	15,53%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)


CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 27.059,72	$ 486.668,60	$ 513.728,32	26,52%
% Ejecutado	$ 11.214,30	$ 771.612,64	$ 782.826,94	42,05%
Diferencia	$ (15.845,42)	$ 284.944,04	$ 269.098,62	15,53%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para este periodo se suministró y desplazaron hasta el sitio de obra el material y los elementos para la construcción de la barrera. Se realizó el desembolso del 40% de anticipo al contratista de obra.

El contratista de obra inició las perforaciones de los micropilotes del lecho, pero el compresor del equipo de perforacion presentó fallas, por cual no se pudo continuar con la actividad de perforación, el equipo fue enviado a reparación; sin embargo, este suguió presentado problemas, tomando la decisión de reemplazar el equipo para garantizar un buen funcionamiento y tener las presiones necesarias para la actividad.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

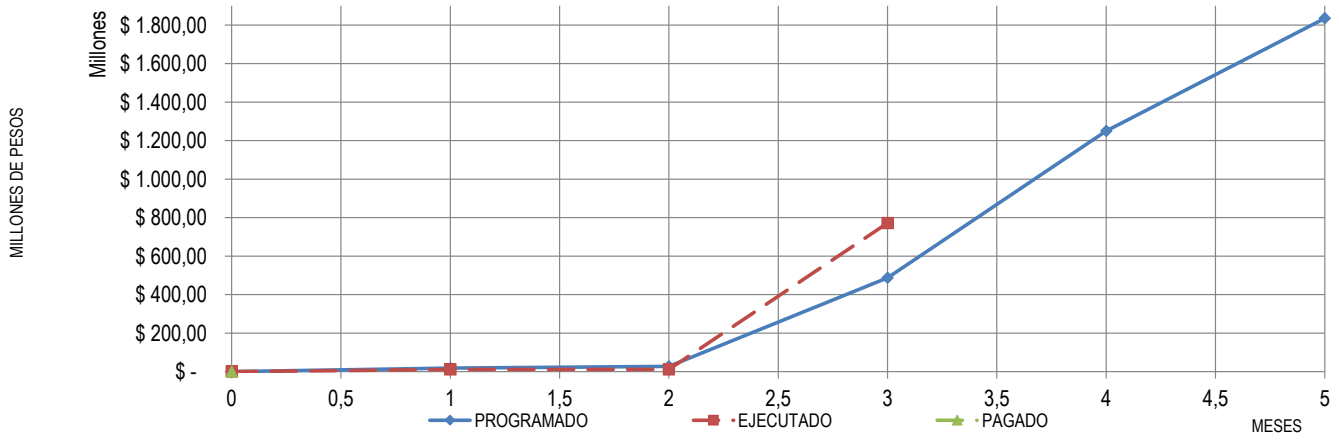

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista realizó la entrega de un plan de contigencia para garantizar que se realicen las actividades en el tiempo contractual, ya que algunas actividades previstas en la programación no se han iniciado en el tiempo estipulado lo cual genera atraso en las demás actividades.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Carmen Ligia Rojas Duarte Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Lindsay Daza Salgado Cargo: Profesional de Apoyo	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

ANEXO 1

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	284 de 2022	Contratista:	CONSORCIO BARRERAS 2022
Periodo:	1 de julio de 2023 al 30 de julio de 2023	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	GONZALO DIAZ TRILLOS	Director de Interventoria:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	Localización y replanteo.	Global	1,00	$ 8.700.000,00	$ 8.700.000,00	1,00	0,00	1,00	$ 8.700.000,00	$ -	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00
2	Cerramiento provisional y adecuación de sendero.	ML	100,00	$ 93.600,00	$ 9.360.000,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	100,00	$ 9.360.000,00
3	Traslado de cerca y recuperacion de postes y alambrado de puas.	ML	100	$ 29.328,00	$ 2.932.800,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	100,00	$ 2.932.800,00
4	Excavacion manual a todo factor.	M3	16,50	$ 31.911,00	$ 526.532,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	16,50	$ 526.532,00
5	Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6	UND	1,00	$ 1.169.623.962,00	$ 1.169.623.962,00	0,00	0,50	0,50	$ -	$ 584.811.981,00	$ 584.811.981,00	0,50	$ 584.811.981,00
6	Perforacion e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.	ML	301,00	$ 460.689,00	$ 138.667.389,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	301,00	$ 138.667.389,00
7	Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.	KG	1.200,00	$ 8.611,00	$ 10.333.200,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	1.200,00	$ 10.333.200,00
8	Muerto en concreto 4000 PSI	M3	12,50	$ 946.976,00	$ 11.837.200,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	12,50	$ 11.837.200,00
9	Suministro e instalación de micropilotes	ML	168,00	$ 425.841,00	$ 71.541.288,00	0,00	12,00	12,00	$ -	$ 5.110.092,00	$ 5.110.092,00	156,00	$ 66.431.196,00
				SUB TOTAL	**$ 1.423.522.371,00**				**$ 8.700.000,00**	**$ 589.922.073,00**	**$ 598.622.073,00**		**$ 833.600.298,00**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.423.522.371,00**				**$ 8.700.000,00**	**$ 589.922.073,00**	**$ 598.622.073,00**		**$ 833.600.298,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 411.397.966,00**				**$ 2.514.300,00**	**$ 170.487.479,10**	**$ 173.001.779,10**		**$ 240.910.487,00**
	ADMINISTRACION		**12%**		$ 170.822.685,00				$ 1.044.000,00	$ 70.790.648,76	$ 71.834.648,76		$ 100.032.036,00
	IMPREVISTOS		**5%**		$ 71.176.119,00				$ 435.000,00	$ 29.496.103,65	$ 29.931.103,65		$ 41.680.015,00
	UTILIDAD		**10%**		$ 142.352.237,00				$ 870.000,00	$ 58.992.207,30	$ 59.862.207,30		$ 83.360.030,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**		$ 27.046.925,00				$ 165.300,00	$ 11.208.519,39	$ 11.373.819,39		$ 15.838.406,00
VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					**$ 1.834.920.337,00**				**$ 11.214.300,00**	**$ 760.409.552,10**	**$ 771.623.852,10**		**$ 1.074.510.785,00**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.834.920.337,00	**V/R ANTICIPO:**	**$ 733.968.134,80**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**40,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.834.920.337,00**	**% RETEGARANTIA:**	**N/A**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
					$ 0,00	$ 0,00	$ 733.968.134,80	$ 0,00	$ 1.834.920.337,00	0,00%
	TOTAL			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 733.968.134,80**	**$ 0,00**	**$ 1.834.920.337,00**	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA


V/R INICIAL CONTRATO:	$ 145.620.151,00	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 145.620.151,00**	**% RETEGARANTIA:**	**N/A**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
				$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00	$ 145.620.151,00	0,00%
	TOTAL			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 145.620.151,00**	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3 **ANEXO 2**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO BARRERAS 2022	Director de obra:	GONZALO DIAZ TRILLOS
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Director Interventoria:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de julio de 2023	al	30 de julio de 2023

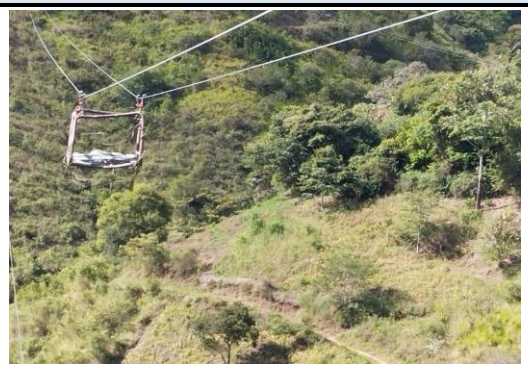FOTOGRAFÍA No.1	**FOTOGRAFÍA No.2**	**FOTOGRAFÍA No.3**
		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA	PERFORACIONES PARA MICROPILOTES	PERFORACIONES PARA MICROPILOTES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	10-jul-23	PERIODO No.	11	DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	153			PLAZO INICIAL (5 MESES):	153		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023			FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	77			DÍAS POR EJECUTAR	77		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:	153		
PLAZO TRANSCURRIDO:	76	EQUIVALE AL	49,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	76	EQUIVALE AL	49,7%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	4/06/2023	28/05/2023	7
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	11/06/2023		no iniciado
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	2/07/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	3/09/2023		no iniciado
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	10/09/2023		no iniciado
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	6/08/2023		no iniciado
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	16/07/2023		no iniciado
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	16/07/2023		no iniciado
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	30/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 201.860.476,68	11,00%	**-10,39%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 11.214.300,00	0,61%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
VIVIANA MEDINA DIAZ	1.024.518.323	Coordinadora HSEQ
JUAN CARLOS SANCHEZ	1.020.809.847	Residente auxiliar
CESAR HERNANDEZ	1.100.684.157	Ayudante de obra
YERRI ZABALETA	1.001.969.438	Ayudante de obra
NAHER YANEZ	1.003.077.584	Ayudante de obra
MICHAEL LOZANO	1.106.788.228	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	6	0,0%	60,0%	6
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	4	0,0%	40,0%	4
	TOTALES	**0**	**10**	**0,0%**	**100,0%**	**10**
	TOTAL	**10**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista inició con el transporte de equipos de perforación por la tarabita hasta el sitio de obra; sin embargo, por seguridad se reforzó la estructura de llegada para poder seguir ingresando materiales y equipos para la construcción de la barrera.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se insiste al contratista de obra agilizar el desplazamiento de materiales hasta el sitio de obra para evitar retrasos en las actividades constructivas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS POR LA TARABITA



DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS POR LA TARABITA



DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS POR LA TARABITA



DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS POR LA TARABITA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

Nota: El ingeniero Javier Cardosos Gutierrez se encuentra en periodo de vacaciones.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	17-jul-23	PERIODO No.	12	DEL	10/07/2023	AL	16/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	153			PLAZO INICIAL (5 MESES):	153		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023			FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	70			DÍAS POR EJECUTAR	70		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:	153		
PLAZO TRANSCURRIDO:	83	EQUIVALE AL	54,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	83	EQUIVALE AL	54,2%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	4/06/2023	28/05/2023	7
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	11/06/2023		no iniciado
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	2/07/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	3/09/2023		no iniciado
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	10/09/2023		no iniciado
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	6/08/2023		no iniciado
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	16/07/2023		no iniciado
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	16/07/2023		no iniciado
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	30/07/2023		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 408.497.349,71	22,26%	-21,65%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 11.214.300,00	0,61%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
VIVIANA MEDINA DIAZ	1.024.518.323	Coordinadora HSEQ
JUAN CARLOS SANCHEZ	1.020.809.847	Residente auxiliar
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforación
CESAR HERNANDEZ	1.100.684.157	Ayudante de obra
YERRI ZABALETA	1.001.969.438	Ayudante de obra
ALVARO RAMIREZ	1.075.239.976	Ayudante de obra
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
ISRAEL GUTIERREZ	1.072.394.871	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	6	0,0%	46,2%	6
	TECNICO	0	1	0,0%	7,7%	1
	M.O/N.C	1	5	7,7%	38,5%	6
	TOTALES	**1**	**12**	**7,7%**	**92,3%**	**13**
	TOTAL	**13**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó con el transporte de equipos de perforación por la tarabita hasta el sitio de obra y materiales para los micropilotes. Además, se inicio desvío de cauce con tulas llenas de arena para iniciar perforaciones de anclajes de los postes de la barrera y se realizó ubicación de puntos de anclaje de los costados y del lecho con topografía.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Debido que a la fecha se presenta un atraso significativo, dado que no se han ejecutado las actividades conforme a la programación de obra; se solicitó al contratista de obra presentar un plan de contingencia, donde las medidas a implementar garanticen que la obra se culmine en el plazo establecido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



UBICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE CON TOPOGRAFIA



UBICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE CON TOPOGRAFIA



ARMADO DE DESVIO DE CAUCE PARA ANCLAJE DE POSTE



TRASLADO DE EQUIPO A SITIO DE TRABAJO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	24-jul-23	PERIODO No.	13	DEL	17/07/2023	AL	23/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	153			PLAZO INICIAL (5 MESES):	153		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023			FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	63			DÍAS POR EJECUTAR	63		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:	153		
PLAZO TRANSCURRIDO:	90	EQUIVALE AL	58,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	90	EQUIVALE AL	58,8%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	4/06/2023	28/05/2023	7
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	11/06/2023		no iniciado
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	2/07/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	3/09/2023		no iniciado
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	10/09/2023		no iniciado
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	6/08/2023		no iniciado
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	16/07/2023		no iniciado
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	16/07/2023		no iniciado
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	30/07/2023		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 609.099.769,23	33,19%	**8,86%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 771.623.852,10	42,05%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
VIVIANA MEDINA DIAZ	1.024.518.323	Coordinadora HSEQ
JUAN CARLOS SANCHEZ	1.020.809.847	Residente auxiliar
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforacion
CESAR HERNANDEZ	1.100.684.157	Ayudante de obra
YERRI ZABALETA	1.001.969.438	Ayudante de obra
ALVARO RAMIREZ	1.075.239.976	Ayudante de obra
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
ISRAEL GUTIERREZ	1.072.394.871	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	6	0,0%	46,2%	6
	TECNICO	0	1	0,0%	7,7%	1
	M.O/N.C	1	5	7,7%	38,5%	6
	TOTALES	**1**	**12**	**7,7%**	**92,3%**	**13**
	TOTAL	**13**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista inició el ingresó de materiales para la barrera hasta el sitio de obra y se iniciaron perforaciones en el lecho de la quebrada para postes de la barrera.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se reitera al contratista la necesidad de presentar un plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades en el plazo contractual, teniendo en cuenta que con la programación presentada no se han ejecutado todas las actividades programadas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA



SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA



PERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE



PERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

FECHA REALIZACIÓN	31-jul-23	PERIODO No.	14	DEL	24/07/2023	AL	30/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Neiva - Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	287 DE 2022			CONTRATO No.:	284 DE 2022		
PLAZO INICIAL (5 MESES):	153			PLAZO INICIAL (5 MESES):	153		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 de octubre de 2022		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023			FECHA DE REINICIACIÓN:	8 de mayo de 2023		
DÍAS POR EJECUTAR	56			DÍAS POR EJECUTAR	56		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:	153		
PLAZO TRANSCURRIDO:	97	EQUIVALE AL	63,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	97	EQUIVALE AL	63,4%
VALOR INICIAL :	$ 145.620.151,00			VALOR INICIAL :	$ 1.834.920.337,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 145.620.151,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.834.920.337,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 145.620.151,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.834.920.337,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2022	19/09/2022	0
1,1	**Localización y replanteo.**	31/05/2023	28/05/2023	3
1,2	**Cerramiento provisional y adecuación de sendero.**	30/05/2023		no iniciado
1,3	**Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.**	14/06/2023		no iniciado
1,4	**Excavación manual a todo factor.**	24/08/2023		no iniciado
1,5	**Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6**	22/09/2023		en proceso
1,6	**Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.**	31/08/2023		no iniciado
1,7	**Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.**	31/08/2023		no iniciado
1,8	**Muerto en concreto 4000 PSI**	1/09/2023		no iniciado
1,9	**Suministro e instalación de micropilotes**	25/08/2023		en proceso


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 486.695.661,61	26,52%	**15,53%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 771.623.852,10	42,05%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
GONZALO DIAZ TRILLOS	80.855.029	Director de Obra
FLAVIO FEDERICO SOLER	79.505.743	Asesor especialista en riesgos y geotecnia
OSCAR MAURICIO ORTIZ	91.480.679	Residente de Obra
NATALY ROJAS MORCOTE	1.026.283.698	Ingeniero topográfico
VIVIANA MEDINA DIAZ	1.024.518.323	Coordinadora HSEQ
JUAN CARLOS SANCHEZ	1.020.809.847	Residente auxiliar
LUIS ANTONIO PAEZ	79.802.927	Jefe de perforación
GERARDO CARDENAS	1.003.337.298	Ayudante de obra
JOSE GREGORIO DIAZ	1.118.468.490	Ayudante de obra
FABIAN ICO	17.688.637	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	6	0,0%	60,0%	6
	TECNICO	0	1	0,0%	10,0%	1
	M.O/N.C	0	3	0,0%	30,0%	3
	TOTALES	**0**	**10**	**0,0%**	**100,0%**	**10**
	TOTAL	**10**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó el ingresó de materiales para la barrera hasta el sitio de obra y se iniciaron perforaciones en el lecho de la quebrada, pero debido a que el compresor presenta fallas en su funcionamiento no ha permitido realizar las perforaciones en su longitud total, debido a que por estar en el lecho al dejarlas de un día para otro se vuelven a tapar, lo que genera que se tenga que volver a perforar.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se entrega por parte del contratista el plan de contingencia, en el cual contiene medidas a implementar para cumplir con la ejecución de las actividades en el plazo contractual; pero el compresor continua presentando fallas, para lo cual se pide al contratista tome medidas en el asunto para cumplir con dicho plan de contingencia.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA



SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA BARRERA



REPERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE



REPERFORACIONES PARA MICROPILOTES DE POSTE

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 11	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que el contratista de obra durante la semana inició el traslado de equipos de perforación por la tarabita hasta el sitio de obra; por temas de seguridad también realizó el refuerzo de la estructura de llegada para poder seguir ingresando materiales y equipos para la construcción de la barrera.

CQ reitera sobre la necesidad de agilizar el traslado de equipos y materiales hasta el sitio de obra, con el fin de iniciar actividades constructivas y evitar retrasos mayores en el cronograma.

OO manifiesta que a más tardar el día domingo terminan de desplazar los elementos del equipo de perforación para empezar a armar la unidad de perforación, con el propósito de iniciar perforaciones la próxima semana, se empezarían con las correspondientes a las del lecho. De manera que, para el día miércoles 12 de julio de 2023, se tiene programado realizar la topografía para la localización de los micropilotes del lecho de la quebrada. Además, el día lunes se continuará con el traslado hasta el sitio de obra de las barras de acero utilizadas para los anclajes.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN


FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 12	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que el contratista de obra durante la semana realizó la topografía para ubicar los puntos de perforación y definir la localización puntual donde instalará la barrera. Además, se bajó a la quebrada el trineo y equipo perforación con mangueras, teniendo en cuenta que se iniciarán las perforaciones en el lecho. Es evidente que a la fecha se presenta un atraso significativo, dado que no se han ejecutado las actividades conforme a la programación de obra; por tanto, se solicitará al contratista de obra mediante oficio presentar un plan de contingencia, donde las medidas a implementar garanticen que la obra se culmine en el plazo establecido.

JC expresa que dada las circunstancias del atraso en el avance de la ejecución del contrato, está de acuerdo con lo solicitado por CQ, por lo cual requiere que dicho plan sea presentado la próxima semana.

OO manifiesta que las perforaciones en el lecho se empezarán el día domingo 16 de julio de 2023, teniendo en cuenta que durante la semana también se estuvo armando la unidad de perforación y el compresor, para poder iniciar dicha actividad. Con respecto al atraso que se presenta actualmente, informa que se ha generado por la dificultad inicial de construcción y armado del sistema para el transporte de equipos y materiales al sitio de obra, debido a las pendientes altas del terreno y la lejanía desde el sitio donde se pueden dejar los equipos y materiales para poderlos desplazar al sitio de construcción; de manera que, se atenderá a la solicitud realizada por el interventor y Supervisor.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Plan de contingencia en obra	Contratista	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 13	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que el contratista de obra durante la semana inició el ingreso de lo elementos que conforman la barrera hasta el sitio de obra e iniciaron con las perforaciones en el lecho de la quebrada para los postes de la barrera. De acuerdo a que el suministro de los elementos de la barrera corresponde a un ítem representativo en la programación, se evidencia que el avance ha mejorado; sin embargo, todas las actividades que están previstas dentro de la programación, a la fecha no se han ejecutado; por lo tanto, es primordial que el contratista presente un plan o restructuración de dicha programación, la cual conlleve a la culminación de las actividades en el plazo establecido.

JC avala lo mencionado por CQ y reitera al contratista la necesidad de presentar un plan de contingencia que garantice la culminación de las actividades constructivas en el plazo contractual, teniendo en cuenta que a la fecha no se han ejecutado todas las actividades que están programadas en el cronograma.

OO manifiesta que se ha ido avanzando conforme a lo informado por CQ, con algunas situaciones ajenas a la obra en cuanto a lluvias presentadas algunos días de la semana y a la rotura de la canasta donde se transportan los materiales y elementos de la barrera hasta el sitio de obra, lo que atrasó un poco la actividad, debido a que la canasta se envió a reparación a la ciudad de Neiva. De igual manera, de acuerdo a lo solicitado por la Interventoría y Supervisor se está trabajando en el plan para realizar la respectiva entrega.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Plan de contingencia en obra	Contratista	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los veintiuno (21) días del mes de julio de 2023.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No. 14	CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra.	
CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ informa que el contratista de obra entregó el plan de contingencia el cual contiene las medidas a implementar para cumplir con la ejecución de las actividades en el plazo contractual; sin embargo, nuevamente se presentaron inconvenientes con el compresor, debido a que ha presentado fallas técnicas que no permiten desarrollar la actividad de perforación con rendimientos apropiados.

OO manifiesta que en durante la semana anterior se le hicieron los correctivos necesarios para subsanar los inconvenientes presentados con el compresor, pero como lo informa CQ en la presente semana volvió a fallar; por lo tanto, se adelantan revisiones para buscar un arreglo definitivo o cambio de este equipo para garantizar un buen funcionamiento y tener las presiones necesarias para la actividad.

JC recuerda al contratista de obra, que dentro de las obligaciones contractuales se establece que debe reparar el equipo varado en un plazo no mayor a 72 horas o en su defecto reemplazarlo al mismo tiempo por otro, en perfectas condiciones, que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. Solicita se proceda de manera inmediata a la solución para no afectar el cronograma de trabajo.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2023.

SGC-CP-14912-23
Neiva, julio 15 de 2023

Señores
CONSORCIO BARRERAS 2022
Manuel José Hernández Ruiz
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.284 de 2022.

Asunto: Requerimiento plan de acción en obra.

Cordial saludo.

En atención a las funciones que tenemos como interventoría y de acuerdo al seguimiento que se ha realizado durante la ejecución del contrato, se informa que a la fecha se presenta un atraso del 21,65% en el avance de obra.

Por lo anterior, se solicita la entrega de un plan de contingencia en el cual se presenten las posibles alternativas y/o medidas pertinentes para lograr un mejor rendimiento y avance en las actividades programadas y cumplir con el plazo contractual.

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra personal en obra, y las actividades a realizar por las condiciones del terreno se constituyen como de alto riesgo, se solicita la permanencia del profesional SISO en la obra.

De la misma manera y como se ha mencionado en comité de obra e inicio del contrato, las modificaciones en procedimiento constructivo, materiales, especificaciones y en general actividades que puedan incidir en su ejecución deben ser remitidos a la interventoría para análisis y aprobación; caso contrario la actividad puede ser rechazada.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO G. – Supervisor contrato 284 de 2022

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ – Interventoría

SGC-CP-14913-23

LA SUSCRITA INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO BARRERAS 2022** con NIT. 901623492-2, con representación legal de Manuel José Hernández Ruiz, en calidad de contratista de obra del contrato No.284 de 2022, cuyo objeto es "*Construcción de una barrera dinámica de retención de partículas sólidas durante eventos naturales de avenidas torrenciales, sobre el cauce de la quebrada San Bartolo, localizada en la vereda Ceibas Afuera, un (1) kilometro antes de la desembocadura al río Las Ceibas, ingresando por el punto localizado a la altura del km 22 de la vía que conduce de Neiva (H) – Balsillas (Caquetá); como estrategia para la reducción del riesgo de desastres en zonas aledañas al cauce del río Las Ceibas en desarrollo del programa "Gestión para Minimizar el Riesgo" del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas.*", tiene a fecha de 30 de julio de 2023 el siguiente avance de obra:

Avance físico	**42,05%**
Avance financiero	**40,00%**

Nota: El avance financiero corresponde al desembolso del anticipo

Dado en Neiva, a los veintiséis (31) días del mes de julio de 2023.

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ – Interventoría

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27061412	I	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.900	7.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27061412	2023-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27061412	I	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.900	7.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27061412		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	4.100	0	228.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	4.100	0	228.100
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	3.200	0	178.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	3.200	0	178.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	200	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	200	0	7.600
Gran Total					406.400	0	7.500	0	413.900

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27061412	I	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.900	7.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27061412		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	4.100	0	228.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	4.100	0	228.100
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	3.200	0	178.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	3.200	0	178.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	200	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	200	0	7.600
Gran Total					406.400	0	7.500	0	413.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27323761	E	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.051.800	89.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	27323761	2023-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7721067	TORRENTE CANO JUAN CARLOS	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	3.000.000	F																0			23	23	23	23	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.300.000	92.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5711001
3	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	3.000.000	F																7			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	700.000	112.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.000	28.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	700.000	0	700.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	140.000	S	5711001
4	CC 12277033	BENITEZ RAMIREZ JAIBER	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
5	CC 1004493440	ROJAS PERDOMO MARIA PAULA	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
6	CC 1026299672	MORALES CIFUENTES STEPHANIE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
7	CC 1075227581	GUZMAN ROSERO CRISTIAN JOSE	3.000.000	F	X	X														0			21	21	21	21	COLFONDOS-231001	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5711001
8	CC 1077867784	HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
9	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.575.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.575.000	252.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.575.000	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.575.000	63.000	1.575.000	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	487.700	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27323761	E	2023-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.051.800	89.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	27323761		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.275.000	16.275.000	16.275.000	16.275.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	2.604.000	0	47.000	0	2.651.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	656.000	0	11.800	0	667.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	640.000	0	11.600	0	651.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.056.000	0	19.000	0	1.075.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	252.000	0	4.600	0	256.600
EPS(Administradoras: 3)				8	651.000	0	11.800	0	662.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	100.000	0	1.800	0	101.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	132.000	0	2.400	0	134.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	419.000	0	7.600	0	426.600
ARP(Administradoras: 1)				8	1.084.200	0	19.500	0	1.103.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	8	1.084.200	0	19.500	0	1.103.700
CCF(Administradoras: 1)				8	623.000	0	11.300	0	634.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	623.000	0	11.300	0	634.300
Gran Total					4.962.200	0	89.600	0	5.051.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27423311	E	2023-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.562.800	81.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27423311	2023-07-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5230529	CERON MUÑOZ FABIAN EFREN	1.594.893	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.594.893	255.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.594.893	63.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.594.893	63.800	1.594.893	111.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.900	S	1941201
2	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	3.189.785	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.189.785	510.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.189.785	127.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.189.785	127.600	3.189.785	222.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	987.700	S	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27423311	E	2023-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.562.800	81.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27423311		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.784.678	4.784.678	4.784.678	4.784.678	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	765.600	0	41.900	0	807.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	510.400	0	27.900	0	538.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	255.200	0	14.000	0	269.200
EPS(Administradoras: 2)				2	191.400	0	10.500	0	201.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	63.800	0	3.500	0	67.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	127.600	0	7.000	0	134.600
ARP(Administradoras: 1)				2	333.200	0	18.300	0	351.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	333.200	0	18.300	0	351.500
CCF(Administradoras: 1)				2	191.400	0	10.500	0	201.900
Gran Total					1.290.200	0	70.700	0	1.360.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	191.400	0	10.500	0	201.900
Gran Total					1.481.600	0	81.200	0	1.562.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27423319	E	2023-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.515.200	33.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27423319	2023-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5230529	CERON MUÑOZ FABIAN EFREN	1.594.893	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.594.893	255.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.594.893	63.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.594.893	63.800	1.594.893	111.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.900	S	1941201
2	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	3.189.785	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.189.785	510.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.189.785	127.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.189.785	127.600	3.189.785	222.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	987.700	S	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27423319	E	2023-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.515.200	33.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27423319		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.784.678	4.784.678	4.784.678	4.784.678	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	765.600	0	17.300	0	782.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	255.200	0	5.800	0	261.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	510.400	0	11.500	0	521.900
EPS(Administradoras: 2)				2	191.400	0	4.400	0	195.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	63.800	0	1.500	0	65.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	127.600	0	2.900	0	130.500
ARP(Administradoras: 1)				2	333.200	0	7.500	0	340.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	333.200	0	7.500	0	340.700
CCF(Administradoras: 1)				2	191.400	0	4.400	0	195.800
Gran Total					1.290.200	0	29.200	0	1.319.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	191.400	0	4.400	0	195.800
Gran Total					1.481.600	0	33.600	0	1.515.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
