107

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

INFORME DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S

ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
Representante Legal
Director de Interventoría

168

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
   2.1 COORDENADAS DEL PROYECTO 4
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 5
   3.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PERSONAL VINCULADO INTERVENTORÍA 5
   3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
   3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
   3.4 CONTROL PÓLIZAS CONTRATISTA 7
   3.5 CONTROL PÓLIZAS INTERVENTORÍA 7
4. PROGRAMACIÓN DE OBRA 8
   4.1 AVANCE FÍSICO DE OBRA. 8
   4.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE EJECUCIÓN 8
   4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 9
5. CONTROL DEL PERSONAL 22
6. GESTIÓN DOCUMENTAL 22
7. ESTADO DEL TIEMPO 23
8. NORMAS TÉCNICAS EN EL PROCESO 23
9. APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 24
   INTERVENTORÍA 24
   OBRA 24
10. INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 24
11. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 24
   11.1 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 24
   11.2 RECOMENDACIONES 24

TABLA DE ANEXOS 25

1. INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias profesionales y sociales de la población universitaria, contribuyen al desempleo y al sub empleo, de acuerdo con el DANE la NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) para el departamento del Tolima 29.79%.

En la Universidad del Tolima actualmente tiene un déficit de aulas y espacios propicios para llevar a cabo el ejercicio académico, tales como auditorios, laboratorios y demás escenarios, esto se ha convertido en una problemática que restringe la cobertura y la calidad de la Educación Superior en la región. La Universidad del Tolima en su sede central en la cuidad de Ibagué, está conformada con 39 Bloques, de las cuales (32) corresponden a construcciones de un solo nivel y (6) bloques en un promedio de (4) niveles. Además, en Ibagué se cuenta con la sede sur (Miramar) que cuenta con (1) Bloque de solo dos niveles, una sede Centro de 4 niveles, una sede en el Sur del Departamento en el municipio de Chaparral que cuenta con (4) Bloques distribuidos en 1 bloque de 2 niveles y 3 bloque de 1 nivel. En la sede del Municipio de Armero –Guayabal, se cuentan con 5 bloques de un nivel cada uno.

Para el funcionamiento del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), se cuenta con espacios en la modalidad de convenio y arrendamientos a nivel nacional. En la actualidad se están atendiendo 3696 estudiantes de 5027 estudiantes fuera de las instalaciones de la sede central de la Universidad del Tolima, lo que representa el 70% de la población estudiantil.

La dispersión de las sedes en el departamento dificulta la prestación del servicio educativo, y de igual manera se Incrementa los costos por arrendamiento en las diferentes sedes de la cuidad.

IMPACTO DEL PROYECTO Y OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la descripción del problema, la falta de cobertura y espacios para brindar educación superior en el departamento, en Educación Pública. El proyecto diseñado, aprobado y *adjudicado* ***"CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".***

Aporta como objetivo principal ante la problemática, ya que el diseño de las aulas cuenta con Construcción de 2.817.49 m2 distribuidos en 5 niveles y áreas externas de urbanismo de 787.40m2 para un total de 3.604.89 m2 de construcción. Que contempla las normas actuales para discapacitados, normas RETIE, RETILAP, rampas de acceso internas, aulas cómodas, equipos de alta tecnología para abastecimiento tanto hidráulico, como eléctricos. Paneles solares aportando a la transición energética y ascensor de servicio.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué capital del departamento del Tolima en la cabecera municipal.

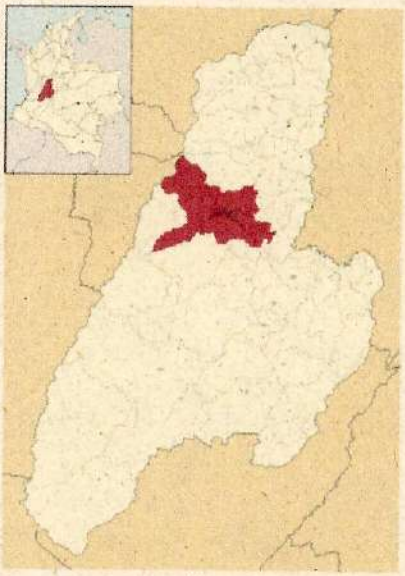


Imagen 1. Localización general

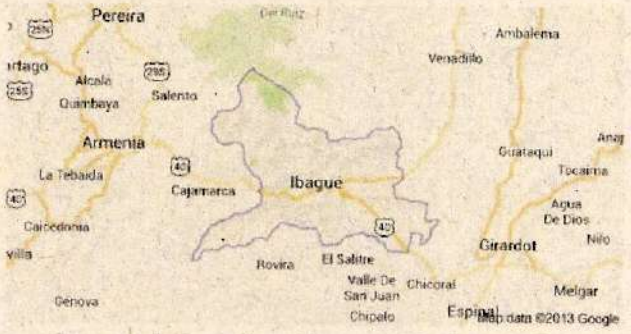


Imagen 2. Localización municipal

2.1 COORDENADAS DEL PROYECTO

Las coordenadas de acuerdo con el replanteo realizado por la comisión de topografía son:

CORDENADAS DELTA Y GPS			
PUNTO	**ESTE**	**NORTE**	**ELEVACION**
GPS1	873919,918	981483,583	1169,494
GPS2	873879,600	981492,361	1169,679
D1	873925,979	981508,979	1169,223
D2	873965,465	981489,147	1168,724

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PERSONAL VINCULADO INTERVENTORÍA



3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	2111 DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO ARGO UT
NIT - CONTRATISTA	800.113.672-7
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DE PESOS M/CTE $ 7.346.150.236,06 M/CTE
MODIFICATORIA ADICION PRESUPUESTAL 1	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ CIENTO CATORCE MIL PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS. $ 2.580.810.114,81

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022

3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	3815 DE 2022.
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATISTA	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT - CONTRATISTA	900.153.270-3
VALOR DEL CONTRATO	CUATRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE $ 445.542.664.00 M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022

3.4 CONTROL PÓLIZAS INTERVENTORIA

Pólizas actualizadas del contrato de obra.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4 PÓLIZA No. NB-100228786 ANEXO: 2			
CUMPLIMIENTO	28/11/2022	28/05/2024	$44.470.331,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/11/2022	28/11/2026	$22.235.165,95
CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2022	28/11/2028	$44.470.331,90

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 111.175.829,75

3.5 CONTROL PÓLIZAS CONTRATISTA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4 PÓLIZA No. 57155 ANEXO: 1			
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4 PÓLIZA No. 57155 ANEXO: 2 25/05/2023			
CUMPLIMIENTO	28/11/2022	30/05/2024	922.696.035
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/11/2022	28/11/2026	496.348.018,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/11/2023	28/11/2028	1.985.392.071,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	29/03/2022	28/11/2023	580.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO			
PÓLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL PÓLIZA No. 17047 anexo 1			

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 200.000.000

4. PROGRAMACIÓN DE OBRA

Se anexa flujo de fondos y cronograma actualizado como seguimiento de programación de obra **(ANEXO 2. Documentos técnicos ÍTEM 2.3. Programación de Obra)**

4.1 AVANCE FÍSICO DE OBRA.

	CAPÍTULOS	% AVANCE
1	PRELIMINARES	100.00%
2	CIMENTACIONES	100.00%
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS	65.00.%
4	MUROS, PAÑETES, DIVISIONES Y PINTURAS	17.00%
5	CARPINTERIA METALICA	0.00%
6	PISOS Y ENCHAPES	0.00%
7	RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIOS	0.00%
8	CIELO RASOS Y CUBIERTAS	0.00%
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0.00%
10	RED DE BAJA TENSION	70.00%
11	CUARTO ELECTRICO	0.03%
12	EQUIPO DE MEDIDA Y TABLEROS DE DISTRIBUCION	20.00%
13	ACOMETIDAS PARCIALES DENTRO DE LAS LOCACIONES	35.00%
14	RED DISTRIBUCION ILUMINACION EXTERIOR	0.02%
15	INSTALACIONES INTERNAS	00.00%
16	RED VOZ, DATOS Y RED REGULADA	5.00%
17	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA	17.00%
18	OTROS SISTEMAS	0.00%
19	PANELES SOLARES	0.00%
20	RED DE AGUAS LLUVIAS	80.00%
21	RED SANITARIA	80.00%
22	RED HIDRAULICA	45.05%
23	MOBILIARIO URBANO	50.00%
24	ITEM NO PREVISTOS	20%
25	AJUSTES A DISEÑOS	100.00%
26	PMA.	100.00%
%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	**33.5 %**

4.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE EJECUCIÓN

Se anexa seguimiento correspondiente a las semanas del 28 de mayo hasta el día 28 de junio de 2023, correspondiente al periodo de ejecución del presente informe.

4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Teniendo en cuenta el seguimiento diario en campo por parte del profesional de interventoría, se constató que para el presente periodo del informe se realizaron las siguientes actividades cumpliendo con las especificaciones técnicas y aprobación por la interventoría.

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (1)	



ÍTEM	4. MUROS PAÑETES Y PINTURAS
DESCRIPCIÓN	4.1 Mampostería de bloque en arcilla No.5

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (2)	



ÍTEM	3. ESTRCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN	3.1.15 Escalera en concreto FC 4000 PSI

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (3)	



ÍTEM	20. RED AGUAS LLUVIAS
DESCRIPCIÓN	20.18 Cajas de inspección de 60*60 en concreto

118

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (4)	



ÍTEM	20. RED AGUAS LLUVIAS
DESCRIPCIÓN	20.1 Excavación en material común.

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (5)	



ÍTEM	3. ESTRCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN	3.1.12 placa de entre piso

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (6)	



ÍTEM	3. ESTRCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN	3.1.26. Rampa en conreto de 3000 PSI

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (7)	



ÍTEM	3. 4. MUROS PAÑETES Y PINTURAS
DESCRIPCIÓN	4.1 Mampostería de bloque en arcilla No.5

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (8)	



ÍTEM	3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN	3.1.20 acero de refuerzo de fy 60.000 PSI

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023

FOTOGRAFÍA (9)



ÍTEM	3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
DESCRIPCIÓN	3.1.15 Escalera en concreto FC 4000 PSI

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (10)	




ÍTEM	4. MUROS PAÑETES Y PINTURAS
DESCRIPCIÓN	4.4 Pañetes lisos sobre muros 1:4

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (11)	



ÍTEM	4 MUROS PAÑETES Y PINTURAS
DESCRIPCIÓN	4.4 Pañetes lisos sobre muros 1:4

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (12)	

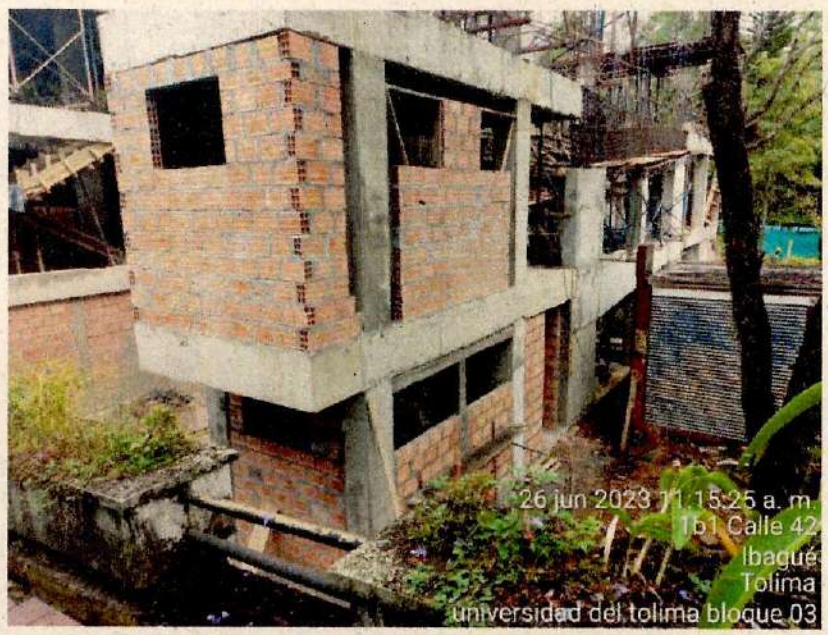

ÍTEM	3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCION	3.1.7 viga aérea en concreto de 4000 PSI RAMPAS

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUE- TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARGOS UT
CONTRATO No.:	2111 DE 2022
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3815 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍA	28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023
FOTOGRAFÍA (13)	



ÍTEM	3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
DESCRIPCION	3.1.7 FACHADA PRINCIPAL

2. CONTROL DEL PERSONAL

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA	79.791.210	Director de interventoría
ING. NOHORA YAMILE DIAZ GUARNIZO	65.553.261	Residente de interventoría
MARIA DEL PILAR ÑUNGO MORALES	65.759.640	Profesional Social
IVONNE MARITZA GUERRERO FRANCO	1.110.466.508	Profesional SSR (SISO)
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO	52.896.908	Especialista Ambiental.
GUILLERMO ANDRÉS CAMACHO OBREGON	79.938.883	Especialista Estructural.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES/ACCIONES
15/11/2022	Revisión y Ajuste al Presupuesto. Coordinación para inicio de Obras.	TALA DE ARBOLES POR LA GESTION DEL RIESGO.
21/11/2022	Revisión del balance de obra APU - NP	Realizar el balance según observaciones consignadas en esta acta para entrega comité 24 nov 2022.
22/11/2022	Revisión y análisis al presupuesto de obra.	Realizar correcciones solicitadas por la Supervisión del Contrato
24/11/2022	Revisión al balance de obra (memorias de cantidades,APU, Ítems no previstos)	Realizar el balance según observaciones consignadas en esta acta para entrega comité 02 DIC 2022.
02/12/2022	Revisión al balance de obra radicado por medio de correo electrónico a la supervisión de los contratos (memorias de cantidades,APU, Ítems no previstos)	Ajustar el abalance según observaciones consignadas en esta acta para entrega comité 05 DIC 2022.
05/12/2022	Revisión del balance final para radicación.	Radicar la Solicitud de ajuste.

15/12/2022.	Definición de actividades a ejecutar.	Tala de árboles, demolición, descapote y preliminares.
31/01/2023	Comité de Obra	Revisión avance de obra y comentarios generales.
07/02/2023	Comité de obra	Avance de Obra y seguimiento actividades.
21/02/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
07/03/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
21/03/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
11/04/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
10/05/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
16/05/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
25/05/2023	Comité de obra.	Avance de Obra y seguimiento actividades.
14/06/2023	Comité de obra y mesa técnica	Comité de obra y mesa técnica con veeduría de la UT
22/06/2023	Comité de obra y mesa técnica	Comité de obra y mesa técnica con veeduría de la UT

Se anexa actas de comités generadas.

4. ESTADO DEL TIEMPO

Se anexa cuadro de tiempo de la semana 16 a la semana 20 de ejecución del contrato de obra y según cronograma actualizado.

5. NORMAS TÉCNICAS EN EL PROCESO

Para el presente proceso se han realizado las actividades cumpliendo con las siguientes normas técnicas:

- ✓ NSR10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente es el reglamento colombiano
- ✓ RAS2000 - Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
- ✓ RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

6. APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

INTERVENTORÍA

Se anexan los soportes de los aportes de seguridad social y parafiscales del consorcio ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S. **(ANEXO 1. Certificado y pagos de seguridad social)**

OBRA

Se anexan los soportes de los aportes de seguridad social y parafiscales del consorcio UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE. **(ANEXO 1. Certificado y pagos de seguridad social)**

7. INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA.." **(ANEXO 2. Documentos técnicos ÍTEM 2.4. Informe Técnico Financiero Y Administrativo De Interventoría)**

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

a. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ La Interventoría ha realizado un continuo seguimiento a los materiales suministrados por el contratista verificando que estos cumplieran con las especificaciones requeridas.
- ✓ La continua comunicación entre el contratista y la Interventoría permitió celeridad en los trabajos y la solución rápida de los problemas presentados en la ejecución de la obra.

b. RECOMENDACIONES

- ✓ Hacer llegar a la interventoría las planillas mes a mes del total de los trabajadores en obra, en donde se relacione el personal en sitio con las planillas pertinentes de la obra en el mes.
- ✓ Elevar estrategias como plan de choques por los tiempos perdidos, debido a espera de trámites, permisos y lluvias.
- ✓ Realizar constantes reprogramaciones y socializarlas para dar cumplimiento con los tiempos.

c. ACTAS

9. Las actas acumuladas generadas para el contrato de obra a la fecha del presente informe son:

TIPO DE ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA PARCIAL 01	29 DE MAYO DE 2023

BALANCE GENERAL			
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.346.150.236,06		
VALOR ADICION 01	$ 2.580.810.114,81		
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ -	$	2.916.497.171,62
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$	7.010.436.179,25
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 9.926.960.350,87**	**$ 9.926.960.350,87**	

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. Certificado y pagos de seguridad social

ANEXO 2. Documentos técnicos

2.1. Resumen estado del tiempo
2.2. Programación de Obra
2.3. Seguimiento Semanal de Obra.
2.4. Informe Técnico Financiero Y Administrativo De Interventoría
2.5. Informe SST.


ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S

ANEXO 1. CERTIFICADO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENTORIA

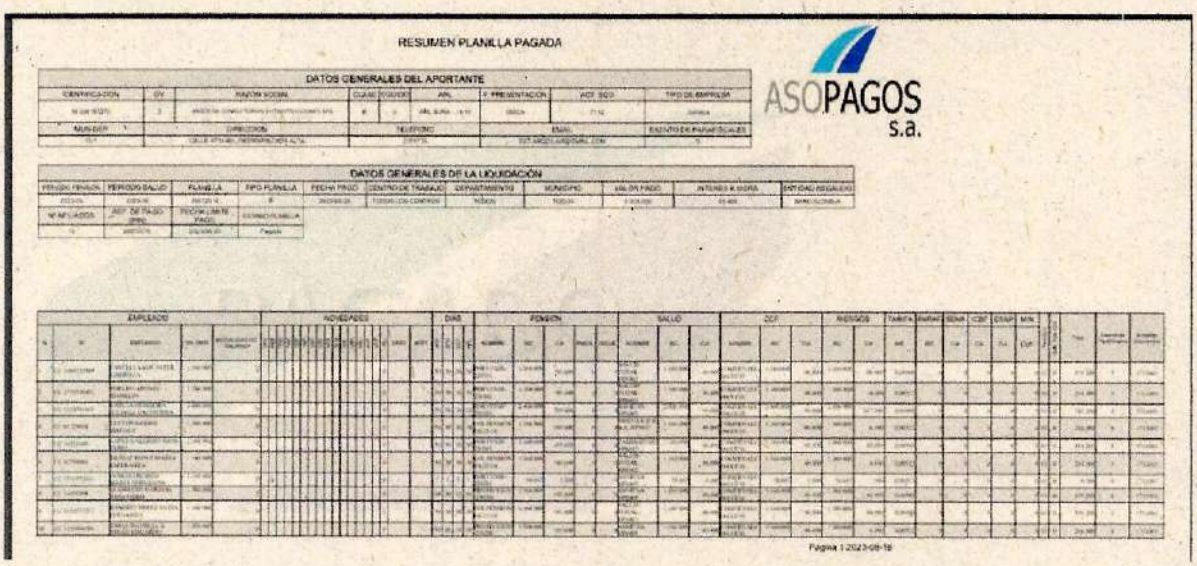

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 900130370	3	ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	R	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
73-1	CALLE 47 N 461 PIEDRAPINTADA ALTA		2761770		SST.ARQDILAM@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-08	39812060	E	2023-08-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.359.000	31.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	26872614		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.718.667	11.718.667	11.718.667	11.718.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.875.000	0	17.600	0	1.892.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	947.000	0	8.900	0	955.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	956.800	0	5.200	0	962.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	3.500	0	374.700
EPS(Administradoras: 4)				10	468.800	0	4.600	0	473.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	190.400	0	1.800	0	192.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	500	0	46.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	185.600	0	1.800	0	187.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.400	0	500	0	46.900
ARP(Administradoras: 1)				10	515.000	0	4.800	0	519.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	519.000	0	4.800	0	519.800
CCF(Administradoras: 1)				10	468.800	0	4.400	0	473.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	10	468.800	0	4.400	0	473.200
Gran Total					3.327.800	0	31.400	0	3.359.000

133

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

ANEXO 1. CERTIFICADO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA ARGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	ADMINISTRADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	OBRAS CIVILES Y INGENIERIA SAS	cra 4 no 11 2º piso 101	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Planilla No 2001	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRA	TOLIMA	IBAGUE	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	-				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
202304	202305	E	07/06/2023	98219063		$12.670.000


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE				INFORMACION NOVEDADES																				PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	AVP	VST	SLE	IRL	INCAPACIDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VACACIONES	VACACIONES COMPENSADAS	COD AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario y Aportes	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	COD EPS	IBC EPS	Cotizacion Fijo EPS	Cod. Arl	IBC ARL	Cotizacion	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	CC	[illegible]	[illegible]	X																				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2. DOCUMENTOS TECNICOS.

2.1. RESUMEN ESTADO DEL TIEMPO

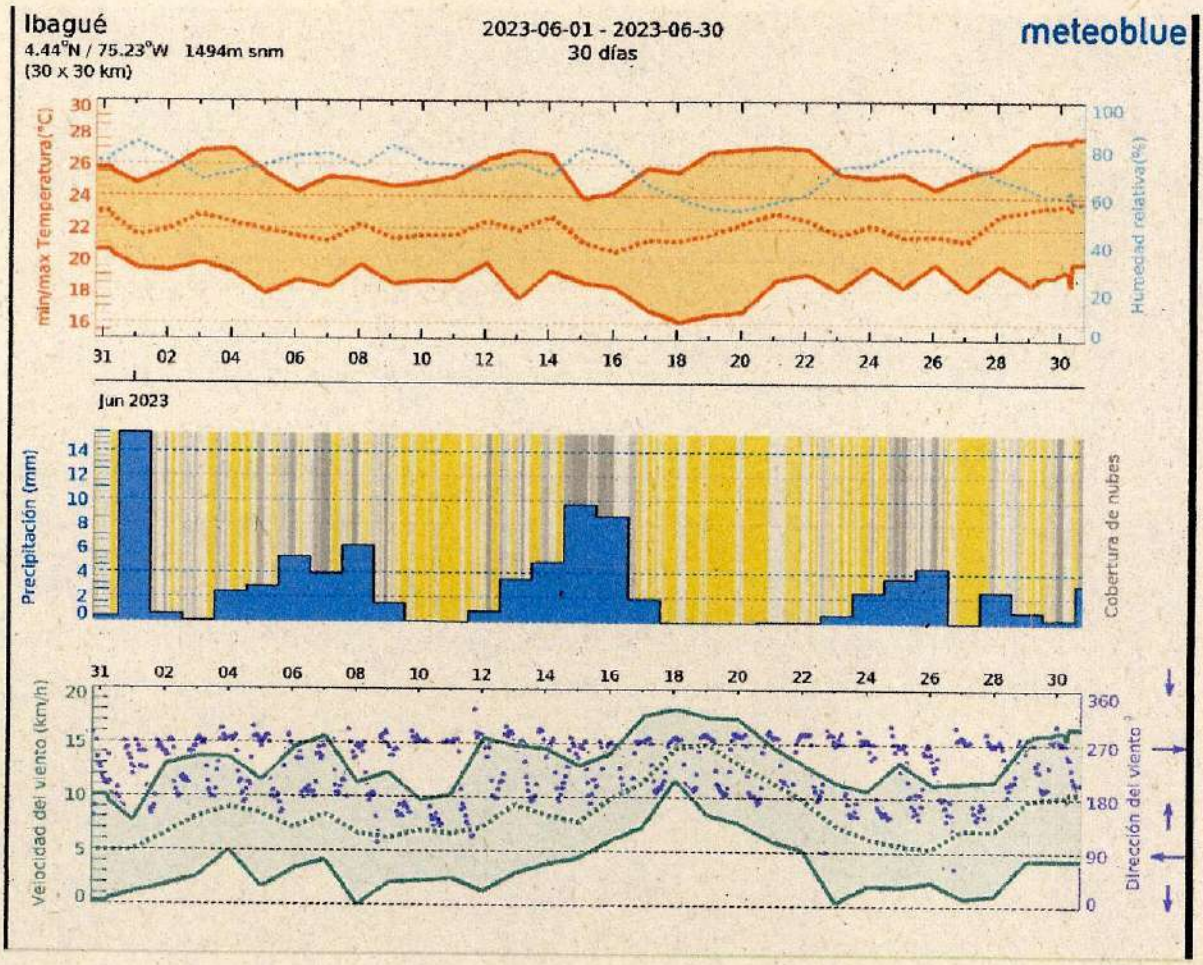

4.5 PROGRAMACIÓN DE OBRA

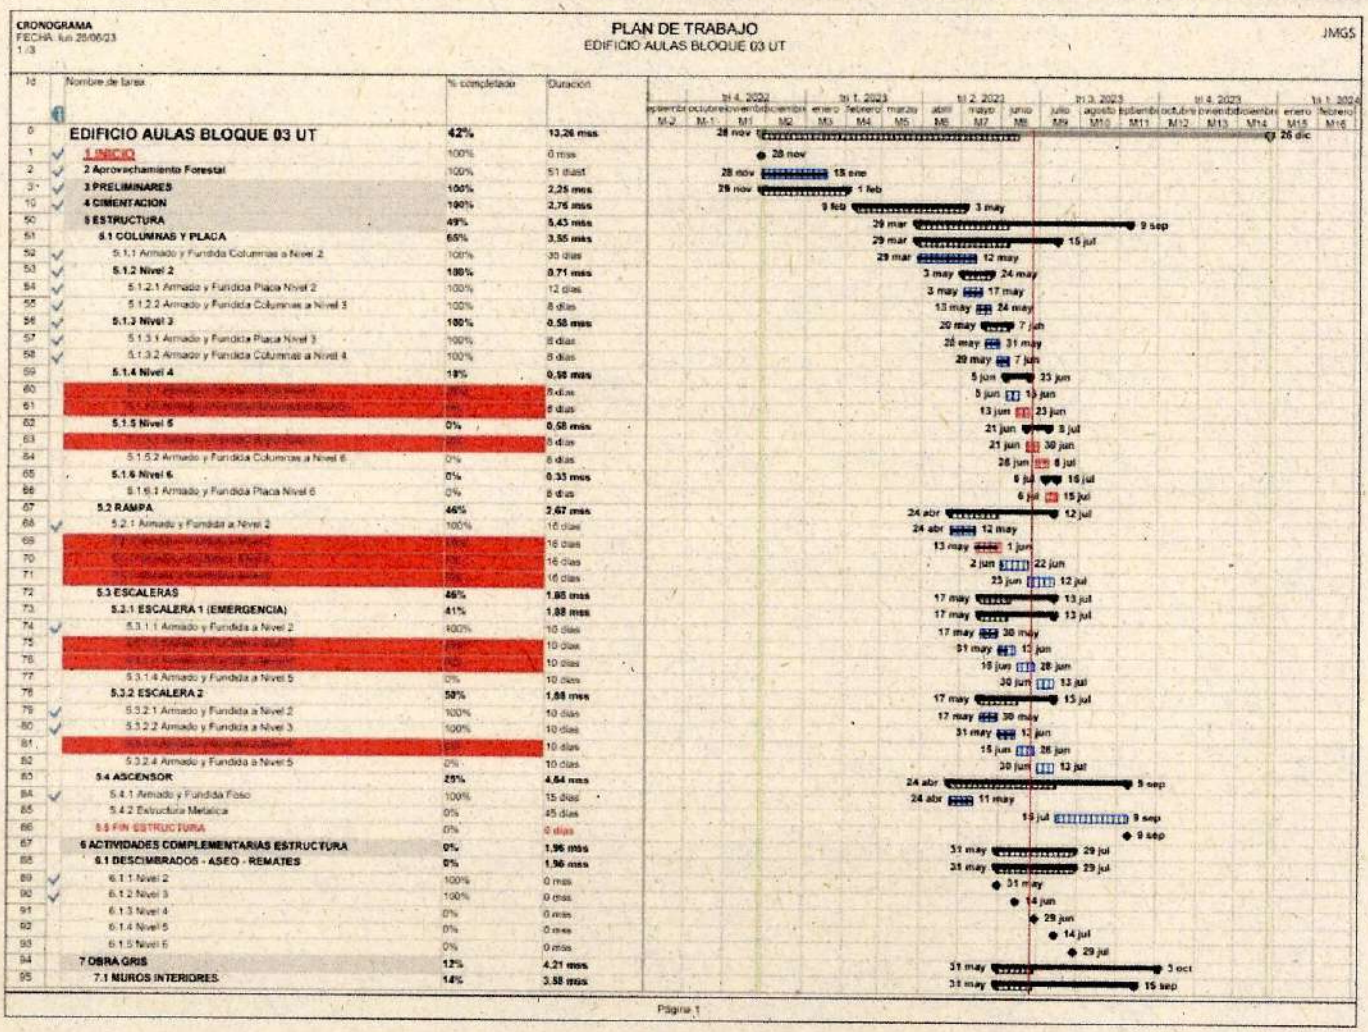

CRONOGRAMA
FECHA: lun 26/06/23
1 /3

PLAN DE TRABAJO
EDIFICIO AULAS BLOQUE 03 UT

JMGS

Id	Nombre de tarea	% completado	Duración
0	EDIFICIO AULAS BLOQUE 03 UT	42%	13,26 mss
1	1 INICIO	100%	0 mss
2	2 Aprovechamiento Forestal	100%	51 días?
3	3 PRELIMINARES	100%	2,25 mss
10	4 CIMENTACION	100%	2,76 mss
50	5 ESTRUCTURA	49%	5,45 mss
51	5.1 COLUMNAS Y PLACA	65%	3,55 mss
52	5.1.1 Armado y Fundida Columnas a Nivel 2	100%	30 días
53	5.1.2 Nivel 2	100%	0,71 mss
54	5.1.2.1 Armado y Fundida Placa Nivel 2	100%	12 días
55	5.1.2.2 Armado y Fundida Columnas a Nivel 3	100%	8 días
56	5.1.3 Nivel 3	100%	0,58 mss
57	5.1.3.1 Armado y Fundida Placa Nivel 3	100%	8 días
58	5.1.3.2 Armado y Fundida Columnas a Nivel 4	100%	8 días
59	5.1.4 Nivel 4	19%	0,58 mss
60	[redacted]	[redacted]	8 días
61	[redacted]	[redacted]	8 días
62	5.1.5 Nivel 5	0%	0,58 mss
63	[redacted]	[redacted]	8 días
64	5.1.5.2 Armado y Fundida Columnas a Nivel 6	0%	8 días
65	5.1.6 Nivel 6	0%	0,35 mss
66	5.1.6.1 Armado y Fundida Placa Nivel 6	0%	8 días
67	5.2 RAMPA	46%	2,67 mss
68	5.2.1 Armado y Fundida a Nivel 2	100%	16 días
69	[redacted]	[redacted]	16 días
70	[redacted]	[redacted]	16 días
71	[redacted]	[redacted]	16 días
72	5.3 ESCALERAS	46%	1,86 mss
73	5.3.1 ESCALERA 1 (EMERGENCIA)	41%	1,88 mss
74	5.3.1.1 Armado y Fundida a Nivel 2	100%	10 días
75	[redacted]	[redacted]	10 días
76	[redacted]	[redacted]	10 días
77	5.3.1.4 Armado y Fundida a Nivel 5	0%	10 días
78	5.3.2 ESCALERA 2	50%	1,88 mss
79	5.3.2.1 Armado y Fundida a Nivel 2	100%	10 días
80	5.3.2.2 Armado y Fundida a Nivel 3	100%	10 días
81	[redacted]	[redacted]	10 días
82	5.3.2.4 Armado y Fundida a Nivel 5	0%	10 días
83	5.4 ASCENSOR	25%	4,64 mss
84	5.4.1 Armado y Fundida Foso	100%	15 días
85	5.4.2 Estructura Metalica	0%	45 días
86	5.5 FIN ESTRUCTURA	0%	0 días
87	6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESTRUCTURA	0%	1,96 mss
88	6.1 DESCIMBRADOS - ASEO - REMATES	0%	1,96 mss
89	6.1.1 Nivel 2	100%	0 mss
90	6.1.2 Nivel 3	100%	0 mss
91	6.1.3 Nivel 4	0%	0 mss
92	6.1.4 Nivel 5	0%	0 mss
93	6.1.5 Nivel 6	0%	0 mss
94	7 OBRA GRIS	12%	4,21 mss
95	7.1 MUROS INTERIORES	14%	3,58 mss

Página 1

2.3. SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA

Se anexa información de información diaria

2.4. INFORME TÉCNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

2.4.1. INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE

La firma ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S está ejecutando las funciones propias de interventoría, poniendo a disposición del proyecto la logística requerida para el buen desempeño tanto de la parte técnica como de la parte administrativa desarrollando las siguientes actividades: - Participación en visitas, reuniones y comités de seguimiento del Contrato de obra, realizados en Ibagué Tolima, con la finalidad de conocer, ajustar y revisar el alcance proyecto. - Consecución y revisión de documentación contractual, programa de obra, análisis de precios unitarios, cantidades y presupuesto de obras, verificación de calidad, cumplimiento contractual del contratista, aprobación de cantidades y liberación de actividades técnicas.

2.5 ASPECTOS TÉCNICOS

2.5.1 COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Se realiza el control general del avance de las obras contratadas y verificación técnica contractual.

Bitácora: Esta es desarrolla con base a la información de diferentes aspectos referentes a la obra, la cual se debe aportar diariamente y está firmada por los contratistas o Residentes, tanto de obra como de interventoría.

Interventoría legal: En este sentido, la interventoría realiza el control y seguimiento de las condiciones contractuales de la obra y el seguimiento de todos aquellos procesos y procedimientos legales y jurídicos que son básicos en la realización del contrato de obra.

2.5.2 INSPECCIÓN DE OBRAS Y DE CALIDAD DE MATERIAL

Para las fechas del presente informe Se verificó y avaló en obra la calidad de los materiales y se presentó por parte del contratista los certificados de calidad de materiales suministrados para el desarrollo de las actividades.

2.5.3 CONTROL A LAS CANTIDADES DE MATERIALES

Para el corte del presente informe a su vez que solo han realizado actividades de cimentación, estructuras de concretos, Redes Sanitarias, Eléctricas y de Cableado Estructurado, de la misma manera el consorcio a cumplido con las especificaciones contractuales en temimos de materiales, herramientas y equipos.

2.5.4 CONTROL DE PERSONAL

A la fecha del presente informe, el personal promedio requerido por cada contratista está compuesto básicamente por:

- Ingeniero Director de Obra e Interventoría
- Arq. Residente de Obra e Interventoría
- Arq Auxiliar
- Residente Social de Obra.
- Auxiliar de Residente HSQ
- Residentes HSEQ Obra.

2.5.5 CONTROL TÉCNICO

A la fecha del presente informe, se continuo actividades de concreto (Columnas a nivel 6.40m, vigas aéreas placas de entre piso y vigas de soportes para rampas) Iniciaron actividades de mampostería en nivel 1 con sus respectivos confinamientos . Continua con la construcción de cajas de inspección para desagües de aguas lluvias. los contratistas de obra e interventoría han estado cumpliendo con los requisitos de ley 100, en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL y PENSIONES del personal empleado para el desarrollo y ejecución de la obra.

2.5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

A la fecha del presente informe, la interventoría veló por el normal cumplimiento de las normativas vigentes sobre seguridad industrial y salud en el trabajo para preservar el bienestar del personal de obra, teniendo en cuenta aspectos como:

- Supervisión de prevención de accidentes en cuanto a: riesgo y prevención.

- Se solicitó la utilización de implementos personales de seguridad industrial (casco, guantes, botas, gafas, entre otros.)
- Control del sistema de SST presente en campo, mediante informes presentados a la entidad contratante.
- Charlas diarias prevención y acción.

2.5.7 TIEMPO TRANSCURRIDO

La obra presenta un atraso de 60 días de ejecución de acuerdo con el cronograma o programación de obra presentado inicialmente, el inicio real de obra fue el día 21 enero de 2023 y a la fecha del presente informe tiene una programación ajustada a 26 de diciembre de 2023, se deja la claridad que no se ha realizado acta de modificación de tiempos. El contratista realiza planes de choque para mitigar los tiempos perdidos por temas de permisos de CORTOLIMA, que le impidieron iniciar el 28 de noviembre de 2022.

2.6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El personal utilizado por la interventoría para desarrollar sus funciones técnicas y administrativas durante el periodo estipulado en el presente informe fueron:

- Director de Interventoría.
- Residente de Interventoría.
- Secretaria.
- Residente Siso.
- Especialista Estructural
- Residente Social
- Residente Ambiental

Cabe destacar, que en el trascurso de tiempo del presente informe se desarrolló reuniones técnicas para revisión de planos y logística para el acceso de materiales y maquinaria y equipos. De la misma manera se revisa la programación en comité de obra y se revisa las condiciones contractuales.

2.6.1 ACTAS DE OBRA

A la fecha del presente informe no se han presentado actas de obra parciales, teniendo en cuenta que las condiciones de pago son con respecto al avance de obra cuando este llegue al 20% de ejecución.

2.6.2 ACTAS DE INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe, por parte del contratista de interventoría no se ha presentado actas de cobro.

2.6.3 ACTAS GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Las actas acumuladas generadas para el contrato de obra a la fecha del presente informe son:

TIPO DE ACTA	FECHA

ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	29 DE MAYO DE 2023

2.7 CONDICIONES LABORALES

2.7.1 CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO

Durante el periodo del presente informe no se presentaron inconvenientes con la comunidad y se lograron ejecutar las actividades con normalidad.

3 CONTROL, PROGRAMACIÓN Y AVANCE FÍSICO

Durante el periodo del presente informe, se realizó un cronograma de actividades y control de avance, al momento del presente informe tenemos un avance del 22.3% y un atraso de 28 días. Cabe resaltar que a diferencia del informe anterior el contratista redujo su atraso en 26 días según su última programación. Presentada.

3.5 PROGRAMACIÓN DE OBRA

Se anexa respectivo cronograma de ejecución como seguimiento a la programación de obra **(ANEXO 2. Documentos técnicos ÍTEM 2.2. Programación de Obra).**

3.6 AVANCE FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**AVANCE FÍSICO**	**AVANCE FINANCIERO**
1	PRELIMINARES	51.00%	$ 44.183.731,18
2	CIMENTACIONES	100.00%	$ 643.495.659,25
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS	70.00%	$2.216.345.713,40
4	MUROS, PAÑETES, DIVISIONES Y PINTURAS	10.00%	$ 60 575.000
5	CARPINTERIA METALICA	0.00%	
6	PISOS Y ENCHAPES	0.00%	
7	RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIOS	0.00%	

8	CIELO RASOS Y CUBIERTAS	0.00%	
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0.00%	
10	RED DE BAJA TENSION	70.00%	$ $137.775.309,70
11	CUARTO ELECTRICO	0.03%	$ 8.083.492,98
12	EQUIPO DE MEDIDA Y TABLEROS DE DISTRIBUCION	0.00%	
13	ACOMETIDAS PARCIALES DENTRO DE LAS LOCACIONES	30.00%	$ 39.947.606,04
14	RED DISTRIBUCION ILUMINACION EXTERIOR	0.02%	$ 2.644.120,63
15	INSTALACIONES INTERNAS	0.00%	
16	RED VOZ, DATOS Y RED REGULADA	0.00%	
17	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA	17.00%	$ 13.736.197,80
18	OTROS SISTEMAS	0.00%	
19	PANELES SOLARES	0.00%	
20	RED DE AGUAS LLUVIAS	90.00%	$ 73.157.418.4
21	RED SANITARIA	90.00%	$82.302.095,70
22	RED HIDRAULICA	0.00%	
23	MOBILIARIO URBANO	0.00%	
24	ITEM NO PREVISTOS	20 %	$51.856.322,70
25	PMA	100.00%	$ 69.348.355,00
26	AJUSTES A LOS DISEÑOS.	100.00%	$45.000.000,00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS (A)			**$ $3.487.936.122,81**
% DE AVANCE SEGÚN COSTOS			**35.2 %**

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO:28 MAYO- 28 DE JUNIO DEL 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S

ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
Representante Legal
Director de Interventoría

Contenido

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 7

1. INTRODUCCIÓN 10
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11

..... 11

3. CONDICIONES DEL CONTRATO 12
4. ENTREGA DE EPP/DOTACIÓN 14

..... 15

..... 16

..... 16

..... 16

..... 16

..... 17

..... 17

..... 17

..... 17

..... 17

..... 17

..... 19

..... 19

..... 19

El personal cumple con los EPP REQUERIDOS, pero en algunas ocasiones se han presentando situaciones en los que el colaborador realiza actividades criticas sin sus epp. 19

6. INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO 21
7. CHARLAS DIARIAS. 22
8. ORDEN Y ASEO áreas de trabajo. 27

Antes 28

Después 28

..... 28

..... 28

..... 28

.....29

.....29

.....29

9. CLIMATOLOGIA.....29

10. ACCIDENTES DE TRABAJO.....30

11. VERIFICACIÓN PERSONAL ACTIVO.....30

1. DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE AREAS EN OBRA.....32

1.1 Control ambiental.....39

1.2 Control Hídrico 40

.....40

1.3 Control Ingenieril.....**¡Error! Marcador no definido.**

.....41

1.4 Control de seguridad industrial.....42

.....42

1. CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES.....**¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCIÓN

ARQDILAM CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES S.A.S a través de interventores, representantes interventoría SG.SST, representante gestión ambiental y representante de la alta dirección, verifican el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, en el momento que lo consideren necesario mediante inspecciones planeadas o no planeadas, solicitud de documentación, a través de la interventoría y sus representaste.

La gestión en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente tienen como fundamento la constitución política de Colombia, el Decreto único reglamentaria 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017, Resolución 0312 del 201, Decreto 1076 del 2015 y demás leyes y normas que se deriven. Las cuales establecen el marco normativo de deberes y derechos que regulen todas las actividades operativas y administrativas del proyecto.

Durante la operación, prestación y administración de las actividades que controla la interventoría en el proyecto "Construcción de un edificio de aulas ubicadas en el bloque 03 de la sede principal de la universidad del Tolima "; se generan situaciones de riesgo, tanto para los trabajadores, terceros involucrados, así como para las instalaciones y el medio ambiente; por esta razón la gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiental se encargaran de verificar e inspeccionar la administración de los riesgos, peligros en cada actividad a realizar.

Los factores de riesgo pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daños en las instalaciones o impactos negativos en el ambiente; es política de la interventoría dar seguimiento para que se presente, mantenga y mejore la seguridad y salud de los empleados, contratistas y terceras personas involucradas en sus operaciones, así como la protección y cuidado del medio ambiente, en el marco del cumplimiento de la legislación y norma vigente.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima en la jurisdicción del municipio de Planadas, en la cabecera municipal

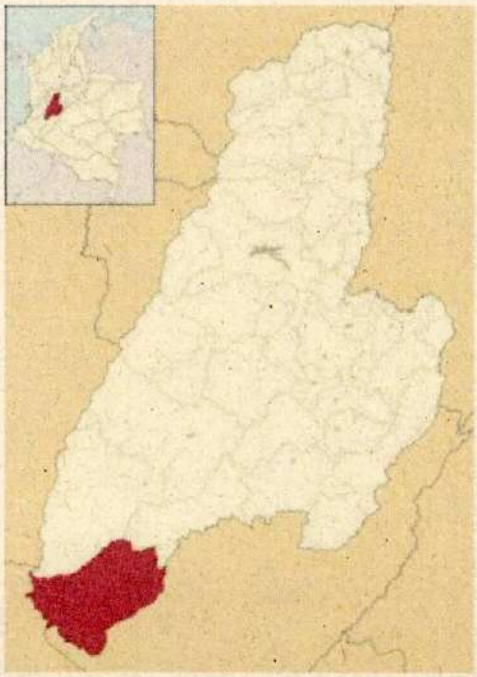


Imagen 1. Localización general



Imagen 2. Localización municipal

2.1 COORDENADAS DEL PROYECTO

Las coordenadas de acuerdo con el replanteo realizado por la comisión de topografía son:

CORDENADAS DELTA Y GPS			
PUNTO	**ESTE**	**NORTE**	**ELEVACION**
GPS1	873919,918	981483,583	1169,494
GPS2	873879,600	981492,361	1169,679
D1	873925,979	981508,979	1169,223
D2	873965,465	981489,147	1168,724

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PERSONAL VINCULADO INTERVENTORÍA



3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	2111 DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO ARGO UT
NIT - CONTRATISTA	901567152-3
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DE PESOS M/CTE $ 7.346.150.236,06 M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022

3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	3815 DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATISTA	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT - CONTRATISTA	900.153.270-3
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($444.703.319,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022

4. ENTREGA DE EPP/DOTACIÓN

El Contratista en cumplimiento de la legislación vigente (leyes vigentes y aquellas que la modifiquen o deroguen) tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos y elementos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con los servicios. Además, deberá controlar el uso correcto, calidad, efectuar la reposición, custodia oportuna y disposición final de estos elementos y equipos.
Dando cumplimiento con el suministro de EPP y Dotación, se evidencia entrega de:

- ✓ Casco.
- ✓ Guantes de carnaza.
- ✓ Tapa oídos.
- ✓ Botas de seguridad.
- ✓ Gafas.
- ✓ Pantalón, busos, camisas.


ANEXO. Fotográfico de entrega de EPP/DOTACIÓN por parte del contratista ARGO UT




CONSORCIO ARGO - UT
6 jun. 2023 7:04:19 a. m.
42-68 Carrera 1a
Ibagué
Tolima
#SST CONSORCIO UT
15/06/2023 7:0
Cra. 1 #42-68, Ibagué, Tolima
SST CONSORCIO ARGO - UT
15 jun 2023 9:30:59 a. m.
42-68 Carrera 1
Ibague
Tolima
#SST CONSORCIO UT

151


ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

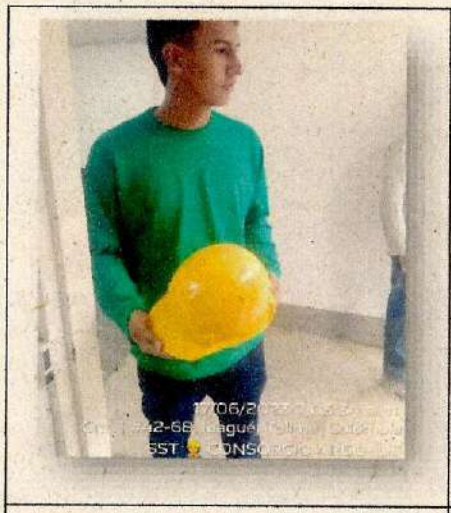








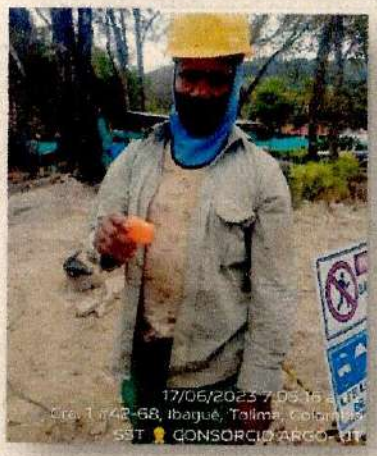

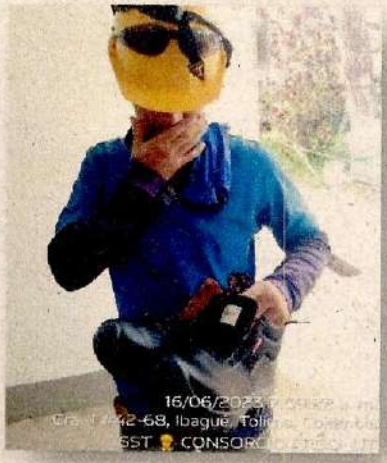









5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad se pueden definir como el proceso administrativo que permite estudiar las condiciones físicas y las tareas que se ejecutan, con el fin de detectar posibles peligros que pueden causar accidentes por fallas técnicas o humanas.
Al realizar este tipo de evaluaciones de forma regular podemos reconocer los riesgos, facilitar el control de costos y generar políticas efectivas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

ANEXO. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS-INSPECCIONES DE SEGURIDAD AL CONTRATISTA ARGO UT.

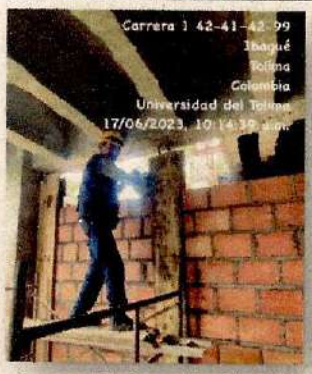Inspección andamios & Equipos para trabajo en altura	
 Se realiza inspección a andamio para realizar actividades de mampostería.	 Inspección a equipos para trabajo en altura

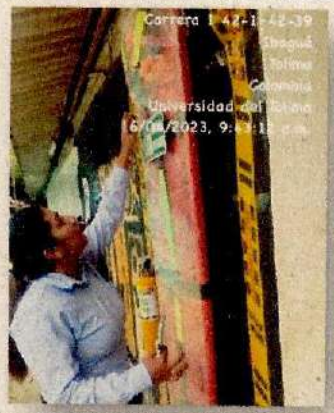Inspección de Equipos de primeros Auxilios.	
	

Nota: El botiquín se evidencia sin algunos insumos según inspección realizada, se deja observaciones en el formato de inspección de botiquín para sea corregida.


Inspección Pluma
 Se realiza inspección de pluma, andamio donde se encuentra el equipo, que se encuentre en optimas condiciones y este asegurado a la plataforma.

Inspección de EPP	
	
El personal cumple con los EPP REQUERIDOS, pero en algunas ocasiones se han presentando situaciones en los que el colaborador realiza actividades criticas sin sus epp.	


Inspecciones de vehículos, maquinaria y equipos de contratista.

En seguridad, la inspección de herramientas es una de las principales actividades que se debe realizar antes de empezar a ejecutar los trabajos encomendados por el jefe o supervisor de turno, ya que permite la detección temprana de posibles problemas o fallas en los equipos, máquinas o herramientas de trabajo.

Una buena inspección puede ser clave a la hora de buscar la disminución de los accidentes e incidentes en el trabajo.

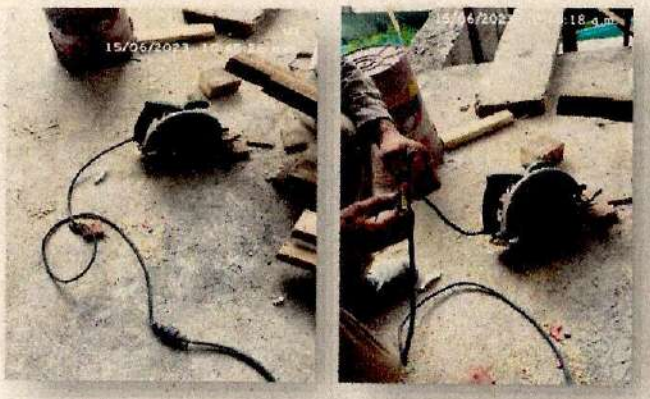

Inspección de Sierra eléctrica, se evidencia con su cable en mal estado, el cual fue corregido al instante.

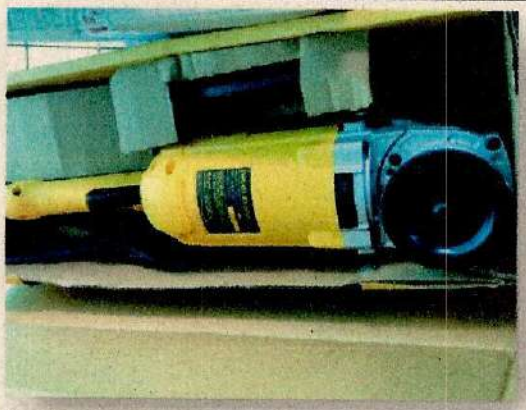

realiza inspección de pulidora nueva para corte de bloque, la cual cuenta con su mango y su guarda.





Se realiza inspección de escalera la cual se encuentra en mal estado para ser utilizada, se realiza observación de cambio, y se recibe la nueva escalera la cual se inspecciona y se da el aval para ser utilizada.

6. INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO

Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, el proceso de inducción representa vital importancia, pues permite finalizar el esquema organizacional que el trabajador necesita conocer claramente, no solo por la adecuada integración, los procesos, puestos y ambientes de trabajo, sino porque es vital reducir la brecha existente entre el desconocimiento y familiarización con los peligros y los riesgos existentes en las áreas de trabajo y las medidas preventivas y correctivas. En el periodo de 28 mayo a 28 de junio, se dio ingreso a 4 (cuatro) colabores nuevos.

ANEXO. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS-INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO



7. CHARLAS DIARIAS.

Durante el periodo del 28 de mayo al 28 de junio se realizaron 25 charlas al personal que se encuentra realizando diferentes actividades en el proyecto "CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADA EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." Dejando como evidencia las siguientes:

7.1 ACTIVIDAD: Charla de seguridad sobre "La Distracción"



La distracción pareciera ser uno de los males comunes de la humanidad. Muchas son las razones por las cuales las personas realizando un trabajo se distraen.

Hay trabajadores que por naturaleza son distraídos, otros se distraen únicamente en circunstancias especiales, como podría ser una preocupación o una gran alegría. Ambos extremos son cómplices de las distracciones.

Las consecuencias de las distracciones variaran de acuerdo al lugar y momento en que esta se produzca. El distraerse mientras se esta conversando o mirando una película o leyendo el periódico, no tendrá los mismos resultados que si nos distraemos al cruzar la calle, al manejar una maquina o trabajar sobre un tanque.



La falta de atención puede no solamente lesionar al distraído sino a las personas que lo rodean.

"NO APRENDA SEGURIDAD CON LOS ACCIDENTES"

ANEXO. Evidencias fotográficas.



7.2 ACTIVIDAD: "Diez factores humanos que causan accidentes"

Entre el 80% y 90% de los accidentes (en el trabajo, en el hogar y en la carretera) son producidos por factores humanos.

Identificando y controlando los factores humanos que causan accidentes, Habremos dado un paso gigantesco hacia la disminución de accidentes.
Aquí aquellos diez factores que debemos evitar:

1. NEGLIGENCIA:
Dejar de aplicar las normas o instrucciones de prevención de accidentes; no mantener los equipos como se debe.
2. MAL HUMOR: Actuar irracionalmente y dejar de lado el sentido común.
3. DECISIONES PRECIPITADAS: El actuar antes de pensar conduce a tomar Decisiones peligrosas.
4. INDIFERENCIA: Falta de atención al trabajo, no estar alerta, soñar despierto.
5. DISTRACCIONES: Interrupciones _mientras se realizan funciones de trabajo normal o tareas peligrosas que no son de rutina. Problemas familiares, bromas pesadas, pensar en asuntos ajenos al trabajo (distracción mental).
6.CURIOSIDAD MAL ENCAMINADA: Ejecutar una actividad desconocida simplemente para saberlo que pasa.
7. INSTRUCCIÓN INADECUADA: Una persona entrenada incorrectamente o sin entrenar.
8. MALOS HÁBITOS DE TRABAJO: Área de trabajo desorganizada, ropa suelta, falta de orden y limpieza, etc.
9. SOBRE CONFIANZA: Demasiada autosuficiencia, el correr riesgos innecesarios, comportamiento precipitado.
10. FALTA DE PLANIFICACIÓN: ejecución del trabajo sin planificar las actividades a realizar.

Estos son los factores que todos debemos tener en cuenta. Aprendamos a descubrirlos antes que se produzcan accidentes. Identifiquemos las áreas de trabajo donde es posible hacer algo para corregir o mejorar los factores humanos que causan accidentes.

¡Practiquemos Hábitos seguros en nuestro trabajo!

ANEXO. Evidencias fotográficas.



7.3 ACTIVIDAD: Charla de seguridad "Algunas Razones para NO fumar".

Toda persona que decida ir hacia la excelencia, debe esforzarse por alcanzar un propósito noble y digno, comprendiendo el valor que tiene su cuerpo y la importancia de cuidarlo. Debe, por lo tanto, enfrentar y derrotar a uno de los más grandes enemigos de la humanidad: el cigarrillo, cuya combustión genera aproximadamente 400 sustancias químicas, de las cuales, 43 tienen un efecto cancerígeno.

Los principales compuestos y sus efectos nocivos, en el organismo, son los siguientes:

- **Arsénico.** Envenena el organismo.
- **Alquitrán.** Forma en los pulmones el ingrediente que contribuye a generar el cáncer.
- **Nicotina.** Aumenta el ritmo cardiaco. Es droga adictiva.
- **Amoniaco.** Quema la nariz y la garganta.
- **Monóxido de Carbono.** Gas venenoso.
- **Gases irritantes.** Afectan al aparato respiratorio.



El fumar es responsable del 90% de los canceres al pulmón, del 30% de todos los canceres, de más del 80% de los casos de bronquitis crónicas y enfisemas pulmonares, así como del 20% de las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. El habito de fumar en mujeres gestantes, es causa de abortos, partos prematuros y bajo peso del niño al nacer.

Además, los fumadores adictos, presentan también efectos psicológicos como son: perdida de la memoria, intranquilidad, inseguridad y perturbación.

Por todas esas razones, e aquí algunas recomendaciones

- Lo más importante es aceptar que fumar es uno de los peores hábitos que se pueda tener.
- Concientizarnos del año a nuestro organismo y visualizar a futuro, las consecuencias.
- Elegir a nuestros amigos FUMADORES que no fumen cerca de nosotros.
- No aceptar cuando nos ofrezcan un cigarrillo.
- Hacer un cálculo del presupuesto que se gasta en cigarrillos. Socializar con gente no fumadora.
- Hacer que se respete la Ley N° 28705 en relación a la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, el cual incluye la prohibición de fumar en lugares públicos y privados dedicados a la salud, educación, dependencias públicas así como en los medios de transporte público.



¡Recuerda; fumar es dañino para la salud, el humo daña también a los no fumadores!

7.4 ACTIVIDAD: Charla 5 minutos "Reglas para tener en cuenta"



1. Obedezca, respete y siga todas las instrucciones, reglas y señalizaciones. Conozca la ubicación de las salidas y equipos de emergencia. Conozca la ubicación de las salidas y equipos de emergencia. Si usted, no las conoce o no las entiende, pregunta.
2. Reporta inmediatamente toda acción, condición, o procedimiento que usted crea que puede causar lesión y/o enfermedad de personas, daños equipos y/o instalaciones.
3. Reportar inmediatamente todo incidente o accidente, por nivel que este el mar. Obtener o prueba primeros auxilios con prontitud.
4. Utilice correctamente las herramientas y elementos de protección personal apropiada para cada trabajo.
5. No operar, ajustar, reparar equipos, ni accione interruptores y válvulas si no está alterado y autorizado para esta labor.
6. Esté atento a su trabajo. No ingiera alimentos fuera de las áreas apuntando, además no debe hacer bromas, fumar o correr dentro de las instalaciones.
7. Use adecuadamente y conservar limpios y en buen estado, todos sus equipos de protección personal.
8. Coloque todo lo que usa en el lugar apropiado, mantenga siempre su área en excelente estado de orden y limpieza.
9. Mantener los estándares de seguridad y salud ocupacional, así como prever accidentes personales o daños, minimiza las pérdidas económicas.
10. Esfuércese y contribuya con el logro de los objetivos y metas establecidos por su centro laboral.

"RECUERDE, SIN REGLAS NO HAY ORDEN Y SIN ORDEN NO HAY SEGURIDAD"

ANEXO. Evidencias fotográficas.


8. ORDEN Y ASEO áreas de trabajo.

El orden, aseo y desinfección en el lugar de trabajo son de importancia para la salud y seguridad de todos los colaboradores, mejoran la calidad, productividad, competitividad y permiten proteger al medio ambiente. Cuando un puesto de trabajo está desordenado y sucio o las instalaciones de la organización están en mal estado, aumenta la probabilidad de materialización de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, los trabajadores no se motivan y disminuye la productividad. El orden y aseo son esenciales para la eficiencia personal y organizacional al proporcionar ambientes de trabajo seguros, optimizan el tiempo y reducen los costos de las operaciones, y lo más importante fomentan el autocuidado y una actitud preventiva.

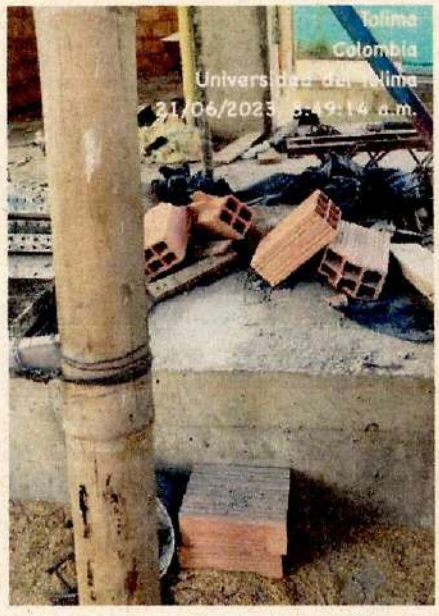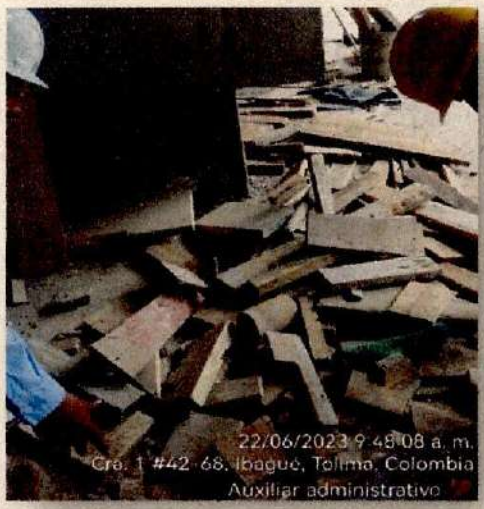Antes	Después
	
	









9. CLIMATOLOGIA.

Seguimiento del estado climático en el proyecto, durante el periodo del informe.

ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S

CONTRATO N° 3815 | PROYECTO: Edificación edificio bloque 03 UT | SECTOR: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | MES: JUNIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
CLIMA/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco / Soleado		x	x	N/A	x	x	x	x	x	x	N/A	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	X	X	X	X	X	N/A		x	x			
Lluvias moderadas	X																									x					
Lluvias intensas																															
Otros																															

Marque con una X el estado general de cada dia.

164

10. ACCIDENTES DE TRABAJO.

En el periodo de 28 de mayo al 28 de junio, no se presentó ningún incidente y accidente de trabajo en la obra.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIFICACIÓN	ARL	AFP	EPS	CCF
1	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	79.904.529	SURA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	COMFENALCO
2	FRANCIA ELENA VARGAS	65.829.167	POSITIVA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	COMFENALCO
3	DIANA CONSTANZA RENGIFO	28.542.724	SURA	COLFONDOS	SANITAS	COMFENALCO
4	KELIYOHANA REYES HERRERA	28.874.209	SURA	PROTECCION	SANITAS	COMFENALCO
5	DANANGEL BLANCO JAIMES	93.290.295	POSITIVA	PENSIONADO	SALUD TOTAL	COMFENALCO
6	MARDOQUEO ARIAS GIL	14.221418	POSITIVA	PENSIONADO	NUEVA EPS	COMFENALCO
7	BERTULFO ARIAS GIL	93.363.590	POSITIVA	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COMFENALCO
9	AGUSTIN PALOMA GARZON	14.276.395	POSITIVA	PENSIONADO	SALUD TOTAL	COMFENALCO
10	JAIR MAURICIO VARGAS CASTRILLON	1.111.335.820	POSITIVA	PROTECCION	SALUD TOTAL	COMFENALCO
11	JAIR VARGAS LAGUNA	14.278.417	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
12	JHON JAIRO VARGAS LAGUNA	1.111.340.988	POSITIVA	PORVENIR	ASMET SALUD	COMFENALCO
13	JOSE ANDRES BRAVO SUAREZ	93.413..137	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
14	BRAYAN FERNANDO VARGAS CASTRILLON	1.111.338.548	POSITIVA	PORVENIR	ASMET SALUD	COMFENALCO
15	REINEL GIRALDO ORJUELA	11.226.318	POSITIVA	PENSIONADO	SANITAS PTE	COMFENALCO
16	SENEN OSPINA FERLA	96.330.882	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
17	SAMUEL ARMANDO PATIÑO AGUDELO	1.105.870.146	POSITIVA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COMFENALCO
18	FEDERICO VARON TRIANA	1.013.502.285	POSITIVA	COLPENSIONES	SANITAS	COMFENALCO
19	JORGE ANDRES MENDEZ VARGAS	1.111.042.109	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
20	JAIR CARVAJAL OROZCO	93.371690	POSITIVA	PROTECCION	SALUD TOTAL	COMFENALCO
21	PAULA ANDRES POVEDA ARGUELLO	1.110.542.356	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
22	HERMIDES LASSO FLOREZ	14.297.930	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
23	LUIS RAFAEL NARANJO MARIN	14.137.195	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
24	JAVIER GALINDO SABOGAL	14.398..298	POSITIVA		FAMISANAR	COMFENALCO
25	WILMER FERNANDO LINARES	80.115.501	POSITIVA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COMFENALCO

11 TIVO

26	JUVENTINO RANGEL ESCOBAR	13.306.476	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
27	EDINSON MANUEL RIVERA G	73.507.369	POSITIVA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COMFENALCO
28	JAVIER STIVEN GALINDO GUERRERO	1006.127.973	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	COMFENALCO
29	AIMER VEGA BUSTOS	1.110.566.812	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
30	GUSTAVO ADOLFO BARRERO SABOGAL	1.110.539.131	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
31	LUIS ERNESTO YAIMA	93.364.976	POSITIVA	COLFONDOS	NUEVA EPS	COMFENALCO
32	ALDAIR VEGA BUSTOS	1.110.557.499	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	COMFENALCO
33	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	1.110.462.025	POSITIVA	PROTECCION	SALUD TOTAL	COMFENALCO
34	FFERSON ALEXANDER LOZANO CASTAÑE	1.005.839.953	POSITIVA	PORVENIR	PTE	COMFENALCO
35	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUILLERMO	1.110.512.663	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	COMFENALCO
36	HANSEN AUGUSTO RODRIGUEZ	1.110.460.842	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
37	JUAN GABRIEL DELGADO OTAVO	93.408.586	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
38	YOJAN FERNANDO BORJA BARERO	1.007.811.839	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
39	FERNANDO VARON MORENO	93.358.014	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	COMFENALCO
40	KEVIS DE JESUS ALVAREZ DIAZ	1.049.318.516	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
41	ADNER CABRERA VALENCIA	1.111.197.154	POSITIVA	PROTECCION	PTE	COMFENALCO
42	HEILER MURILLO VILLAR	11.806.962	POSITIVA	PTE	SALUD TOTAL	COMFENALCO
43	ADRIAN PEDROZA REYES	1.108.232.177	POSITIVA	PORVENIR	PTE	COMFENALCO
44	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY	79.791.210	SURA	PORVENIR	SANITAS	COMFENALCO
45	JHON JAIRO QUIMBAYA GARZON	14.395.898	SURA	PROTECCION	SANITAS	COMFENALCO
46	LUISA FERNANDA RAMIREZ PEREZ	1.110.577.377	SURA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COMFENALCO
47	JOSE ALCIBAR MORA CAMPOS	14.295.396	AXA COLPATRIA	PORVENIR	LA NUEVA EPS	COMFENALCO
48	PEDRO DANIR VANEGAS	17.711.623	AXA COLPATRIA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
49	JOSE YINER HERNANDEZ	1.111.339.994	AXA COLPATRIA	PROTECCION	SALUD TOTAL	COMFENALCO
50	DIEGO ALEJANDRO PACHECO	1.105.791.253	AXA COLPATRIA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
51	CARLOS EDUARDO MARIN	93.360.520	AXA COLPATRIA	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFENALCO
52	CLAYRE ARNEDIS LESMES	65.765.095	AXA COLPATRIA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	COMFENALCO
53	LUIS ERNESTO DELGADO FORERO	5.829.770	AXA COLPATRIA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO
54	ANDRES FELIPE HERNANDEZ RIVAS	1.111.333.947	AXA COLPATRIA	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFENALCO

IVONNE GUERRERO FRANCO

PROFESIONAL SST

ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S


AREA AMBIENTAL

1. DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE AREAS EN OBRA.

En el proyecto identificado como *"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA "*. Realizando inspecciones se evidencian los avances y puntos de DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN de áreas del proyecto donde se realizan labores.

ANEXO. Evidencias fotográficas.



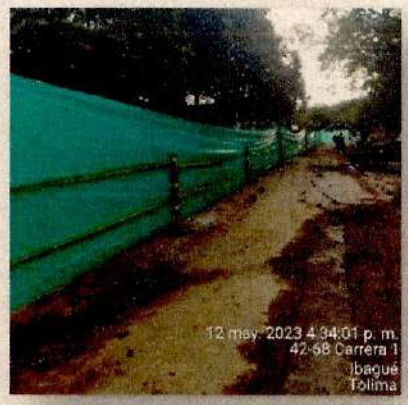





Señalización, *sendero peatonal, prohibido el ingreso de personal no autorizado, ingreso a obra con respectivos EPP, Punto de atención de emergencias y señalización eléctrica.*


El punto ecológico facilita la tarea de separación en la fuente de los residuos sólidos, ya que dispone recipientes especiales para depositar adecuadamente los diferentes materiales reciclables y los residuos orgánicos.

ANEXO. Evidencias fotográficas.




Nota: se evidencia punto ecológico, al cual se ha suministrado sus respectivas canecas.

Delimitaciones lugar de trabajo, en las cuales se realizaron diferentes actividades en obra.

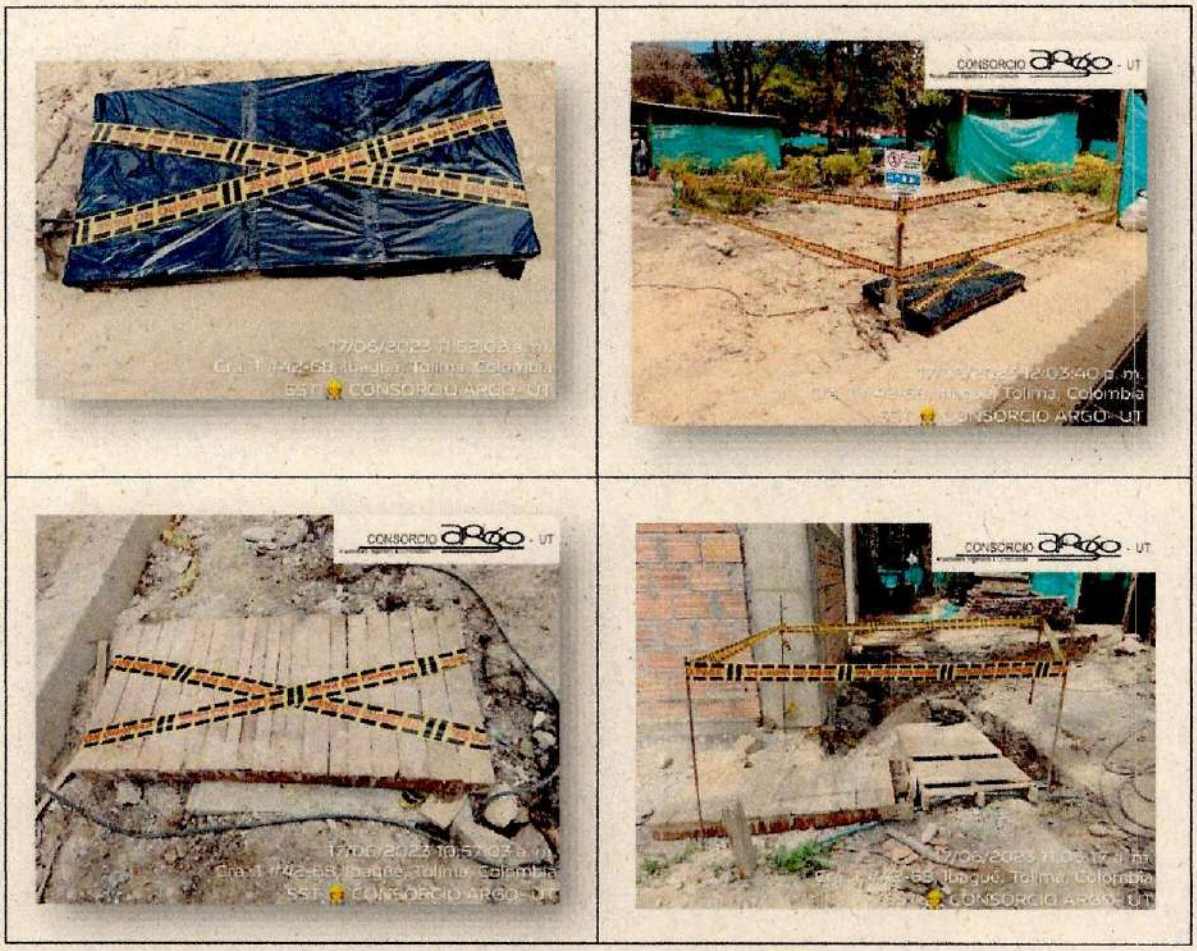

Señalización. punto de hidratación con su respectivo dispensador.

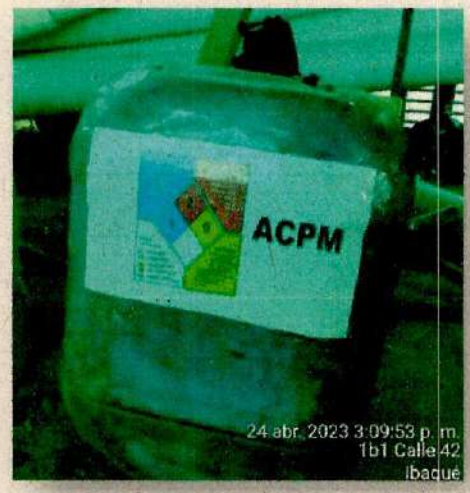
	
Rotulación de productos químicos ACPM & GASOLINA	

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES.

El acopio de materiales de construcción es uno de los aspectos más a tener en cuenta en la obra, antes incluso del comienzo de la propia obra. De hecho, el acopio de materiales se considera fundamental para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra.






Acopio de sacos de cemento, los cuales son retirados de obra por una entidad responsable.



Acopio de escombro de obra



Acopio de madera, en las cuales evidenciamos camillas, y residuos de madera que se vuelve a reutilizar.

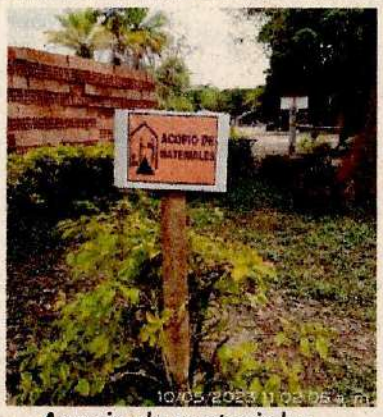

Acopio de materiales



Bodega, en la cual se guardan herramientas y material de obra.

173

1.1 Control ambiental

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2111-2022.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA.

INTERVENTOR: ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - R.L. Arq. Diego Mauricio

MUNICIPIO: IBAGUE - TOLIMA

PERIODO: 28 MAYO DEL 2023- 28 JUNIO

COMPONENTE ATMOSFÉRICO

IMPACTOS A CONTROLAR	MEDIDAS AMBIENTALES	SI	NO
Emisión de Partículas	El material proveniente de las excavaciones y demoliciones es evacuado rápidamente de la zona de obra.	X	
	El material granular (arena) es almacenado en montículos máximo de 2 metros y es protegido de factores ambientales.	X	
	Los vehículos de carga poseen carpas protectoras para evitar el escape de partículas al aire.	X	
	Se realiza la carga de materiales como escombros, agregados sueltos, materiales de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación con la maquinaria adecuada.	X	
Emisión de Gases	Los equipos o maquinaria pertenecientes al proyecto presentan alteraciones en su eficiencia o se les da un mal uso.		X
	Se da cumplimiento a la revisión tecnico-mecanica y de gases, para el control de los niveles sonoros de los vehiculos, maquinaria y equipos utilizados.	x	
Cambio en los Niveles de Ruido	El horario de trabajo es de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.	X	
	Se están realizando trabajos nocturnos.	X	

ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

1.2 Control Hídrico

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2111-2022.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA.

INTERVENTOR: ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - R.L. Arq. Diego Mauricio

MUNICIPIO: IBAGUE - TOLIMA

PERIODO:28 MAYO -28 JUNIO 2023

COMPONENTE HIDRICO

IMPACTOS A CONTROLAR	MEDIDAS AMBIENTALES	SI	NO
Control de Arrastre de Sedimentos a las Corrientes y Calidad del Agua	Son protegidos todos los sumideros dentro y cercanos a la obra con tablones, plásticos o lonas que no permitan aportes de materiales de obra al sistema de alcantarillado de aguas lluvias.	NA	
	Durante el transporte de materiales, se destaca que no se permiten morros en las volquetas y que debe ir perfectamente cubierto con lona, de modo que se garantice que en ningún momento se produzca caída del material, en especial a cercanía de los sumideros.	X	
	Los materiales de la obra pemanecen en los patios de almacenamiento.	X	
	Los derrames accidentales de materiales en los frentes de obra son retirados de manera inmediata por el contratista.	X	
Control de Derrames de Combustible, Aceites y Productos Químicos	Los vehículos son parqueados en lugares donde no causen interferencia.	X	
	Cuando hay derrames de combustible o aceite se retira inmediatamente.	x	
	Contaminación de los suelos en la zona del proyecto, debido al aporte de sustancias contaminantes (aceites combustibles y lodos en la actividad de pilotaje).		x
Control de Aguas Servidas y lluvias	El agua para consumo proviene de la empresa de acueducto.		x
	Se cuenta con conexiones a acueducto y alcantarillado.	x	

ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

175

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

1.3 Control de Ingeniería

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2111-2022.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA.

INTERVENTOR: ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - R.L. Arq. Diego Mauricio

MUNICIPIO: IBAGUE - TOLIMA

PERIODO: 28 DE MAYO-28 DE JUNIO 2023

COMPONENTE INGENIERIL

IMPACTOS A CONTROLAR	MEDIDAS AMBIENTALES	SI	NO
Excavaciones y Demoliciones	Se humedecen las estructuras en concreto previas a su demolición.	X	
	El personal encargado de las demoliciones tiene la dotación adecuada (gafas, tapabocas y protectores auditivos).	X	
	Las actividades de demolición solo son efectuadas en horario diurno.	X	
	Para el retiro de escombros se cuenta con un Bobcat.		X
	Las actividades de excavación siguen a la actividad de demoliciones o de retiro de la capa vegetal.	X	
Concretos de cimentación	Se establece acopio para los residuos de concreto.	x	
	Se evidencia material organico en los suelos donde se realiza el proyecto.	x	
Residuos de construcción y demolición (RCD)	Se realiza la clasificación adecuada de los residuos solidos tales como: fragmentos de ladrillos, residuos de concreto	x	
Disposición final de EPP	La ropa de trabajo y calzado desechados, se disponen en el lugar correcto.	x	
Generación de Riesgo de Accidentes al Personal de la Obra y a Terceros	se cuenta con vallas de señalización, cinta de peligro, señalización vial tubular.	x	
	Se cuenta con señales informativas que brinden información confiable a los trabajadores de la obra para evitar accidentes.	X	
	La obra presenta un correcto aislamiento en polipropileno.	x	

ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

1.4 Control de seguridad industrial

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Versión	Código	
	ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S Arquitectura Sostenible			

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA		
CONTRATO DE	2111-2022	FECHA: 07 octubre 2022	
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA		
INTERVENTOR:	ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	SI/BUENO	NO/DEFICIENTE	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		el campamento cuenta con su respectivo almacenista.
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
DOTACIÓN PERSONAL			
- Dotación completa	X		todo el personal se encuentra con sus respectivos epp
- Buen estado	X		Gafas, Guantes, Casco, Tapaoidos,botas
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
Señalizaciónn vial	X		
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		X	
- Afiliación del Personal al Sistema	X		

ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

AREA SOCIAL

1. PROBLEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Para el área de SST, SOCIAL y colaboradores, que laboran para la universidad del Tolima donde se encuentra ubicado el proyecto "Construcción de un edificio de aulas ubicadas en el bloque 03 de la sede principal de la universidad del Tolima", en el mes del 25 de mayo al 28 de junio del presente año, se han venido presentando diferentes situaciones que influyen en la continuidad y planeación de las actividades programadas.

NO INGRESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.



ACTOS VIOLENTOS POR PARTE DE PERSONAS ENCAPUCHADAS DURANTE LAS MANIFESTACIONES CONMEMORATIVAS DEL DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO. En el cual se vieron afectadas las actividades del día 08 de junio del presente año, debido a que tuvimos que retirarnos del campus educativo y parar actividades de obra.



Universidad del Tolima
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
¡Construimos la universidad que soñamos!

Comunicado a la opinión pública

Como alta dirección de la Universidad del Tolima rechazamos contundentemente los actos violentos desarrollados hoy por un grupo de personas encapuchadas durante las manifestaciones conmemorativas del Día del Estudiante Caído. Es inadmisible, repudiable y lamentable que una jornada dedicada a reivindicar el valor de la vida y memoria histórica, se vea desdibujada por actos vandálicos y temerarios que generan violencia y afectaciones significativas.

Repudiamos profundamente que una fecha tan significativa para las luchas estudiantiles, la cual busca honrar a aquellos que han perdido la vida en la defensa incansable de los derechos, sea empañada por acciones que comprometen la integridad física de toda nuestra comunidad universitaria, así como de transeúntes y habitantes del sector de Santa Helena. Nos llena de frustración que el miedo se tome los pasillos de nuestra alma mater y sus alrededores, donde lo que debe primar es el intercambio de saberes, las artes, las culturas y la paz.

El patrimonio institucional se vio fuertemente afectado siendo atacado con explosivos que generaron conflagraciones al interior de diferentes dependencias y sectores del campus universitario, aún cuando en su interior se encontraban nuestros/as compañeros/as, lo cual atenta contra la integridad de nuestra comunidad y la misión de nuestra casa de estudios; poniendo en alto riesgo a una de nuestras compañeras, pues al detonar explosivos en repetidas ocasiones en la oficina en la que se encontraba, se asfixió y entró en un estado de salud alarmante, que por fortuna se logró atender a tiempo.

Históricamente la Universidad del Tolima ha jugado un papel protagónico en la construcción de paz territorial, por lo que vemos con alta preocupación que se registraran consignas de grupos armados al margen de la ley en nuestra Institución, reviviendo en nuestras memorias aquellos espirales de violencia repudiables y condenados por parte de una comunidad que sueña con un país en paz.

Hacemos un fuerte llamado a las organizaciones estudiantiles, a los estamentos universitarios y ciudadanía en general a rechazar estas actuaciones que llegan a generar estigmatizaciones sobre nuestro papel y rol en la sociedad. Invitamos a alzar nuestras voces, en un acto de protesta generalizada en contra del conflicto armado en las Instituciones de educación superior de nuestro país.

Omar A. Mejía Patiño.
Rector

Jonh Jairo Méndez Arteaga
Vicerrector de Investigaciones Creación Innovación Extensión, Proyección Social

Martha Lucia Nuñez
Vicerrectora de Docencia

Mario Ricardo López Ramírez
Vicerrector Administrativo y Financiero

Diego Alberto Polo Paredes
Vicerrectoría de Desarrollo Humano

ACTOS VIOLENTOS POR PARTE DE PERSONAS ENCAPUCHADAS DURANTE LAS MANIFESTACIONES CONMEMORATIVAS DEL DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO. El día 09 de junio del presente año, se realizó un recorrido por parte de la Defensoría del pueblo y administrativa de la UT. Se verificaron todas las instalaciones de la universidad del Tolima para brindar un lugar seguro para toda la comunidad. Por ende, las actividades programadas para este día se vieron afectadas.





NO INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, DEBIDO AL PARO DE TRANSPORTADORES. En el cual se ven afectadas las actividades programadas para este día 14 de junio del 2023.

Universidad del Tolima
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
¡Construimos la universidad que soñamos!

CIRCULAR 021 – 2023
DGTH

PARA: PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DE: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ASUNTO: JORNADA LABORAL - MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023

Teniendo en cuenta que el próximo miércoles 14 de junio de 2023, se llevarán a cabo bloqueos realizados por el Gremio de Transportadores, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a través de la Dirección Gestión del Talento Humano determinó que las dependencias administrativas laborarán bajo la modalidad de trabajo en casa, mediado bajo las TIC´S, en su jornada habitual.

Cordial saludo,

MARIO RICARDO LÓPEZ RAMÍREZ
Vicerrector Administrativo y Financiero

IVÁN FELIPE REYES CORTÉS
Jefe Dirección Gestión del Talento Humano

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S.	Formato	29/05/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	29/05/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE –TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA PRIMER PISO



MAPOSTERIA PRIMER NIVEL ACCESOS

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, MAMPOSTERIA
2, PAÑETES
ESTRCTURA DE PLACAS

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA MAMPOSTERIA DE PRIMER NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)


ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	30/05/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE –TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	30/05/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

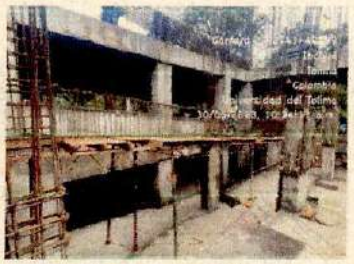




ARAMADO ACEEROS VIGAS RAMPAS Y



CAJAS PARA CONEXXION TANQUES

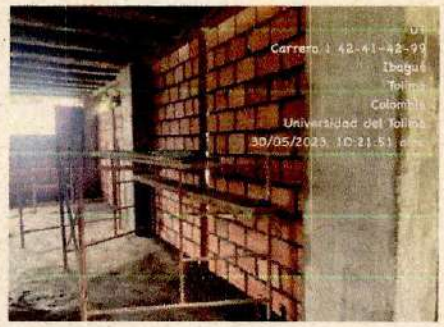

MAMPOSTERIA PRIMER NIVEL

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, MAMPOSTERIA
2, PAÑETES
ESTRCTURA DE PLACAS

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA MAMPOSTERIA DE PRIMER NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	01/05/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	01/05/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTRCTURA RAMPAS



MAMPOSTERIA

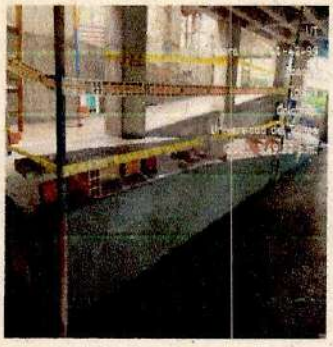

PAÑETES

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. MAMPOSTERIA
2. PAÑETES
3. ESTRCTURA DE PLACAS Y RAMPAS

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA MAMPOSTERIA DE PRIMER NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S.	Formato	01/06/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoria:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.,	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	01/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA NIVEL 2



ENCOFRADO DE VIGAS RAMPAS NIVEL 3,40 M



MAMPOSTERIA NIVEL 2

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, MAMPOSTERIA
2, PAÑETES
ESTRCTURA DE PLACAS RAMPAS

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* INICIA MAMPOSTERIA DE SEGUNDO NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS Y VIGAS

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S.	Formato	02/06/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	02/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE –TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTRUCTURAS RAMPAS Y VIGAS



CONCRETOS PLACAS Y CASETONES

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, MAMPOSTERIA
2, PAÑETES
ESTRCTURA DE PLACAS RAMPAS
4, CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* INICIA MAMPOSTERIA DE SEGUNDO NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS Y VIGAS
* CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS Y DESAGUES TANQUE RCI Y POTABLE

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	03/06/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	03/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA ESCALERAS Y ESTRCTURA



CAJAS DE INSPECCION TANQUES



CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, MAMPOSTERIA
2, PAÑETES
ESTRCTURA DE PLACAS RAMPAS
4, CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* INICIA MAMPOSTERIA DE SEGUNDO NIVEL
* CONTINUA PAÑETES DE PRIMER NIVEL Y RAMPAS
* CONTINUA AMARRES DE ACEROS RAMPAS Y VIGAS
* CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS Y DESAGUES TANQUE RCI Y POTABLE

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S.	Formato	05/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contrato de interventoria Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	05/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TUBERIA AEREA PARA LUMINACION Y ESTRCTURA DE RAMPA NIVEL 3,40M





ARMADO DE ESTRCTURA PARA VIGAS RAMPAS EN CONCRETO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA
2. AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS
3. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
4. ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M

RESUMEN GENERAL

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 A,M
* SE INICIA TENDIDO DE TUBERIA SH 40 EN PRIMER NIVEL PAFRA ILUMINACION DE SALONES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	06/06/2023
	INFORME DIARIO	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación Informe:	06/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





VACIADO DE CONCRETO DE RAMPAS Y



ARMADO DE ACEROS PANATALLAS



VACIADO DE CONCRETO ESCALERA

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA
2. AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS
3. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
4. ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* SE INICIA TENDIDO DE TUBERIA SH 40 EN PRIMER NIVEL PAFRA ILUMINACION DE SALONES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* VACIADO DE CPNCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERAS Y RAMPAS NIVEL 3,40 M A 6,80 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	07/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de Interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación Informe:	07/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA
2. AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS
3. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
4. ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* SE INICIA TENDIDO DE TUBERIA SH 40 EN PRIMER NIVEL PAFRA ILUMINACION DE SALONES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	08/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	08/06/2023	
Fecha de vencimiento informe;		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES A REALIZAR

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES

SE EVACUA PERSONAL POR DISTRUBIOS VANDALICOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	09/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	09/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES A REALIZAR

NO SE PRESENTAN CATIVIDADES DE OBRA POR DISTRURBIOS INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD.

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	10/06/2023
	INFORME DIARIO	Pagulna 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	10/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ARMADO DE ESCALERA 6,80 M
INSTALACION DE TUBERIA RED SANITARIA EXTERIOR





ARMADO DE ESTRCTURA DE PLACA Y RAMPAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

2, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS
3. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
4, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M
5, INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	12/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	12/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA



ESTRCTURA RAMPAS Y PLACA

ACTIVIDADES A REALIZAR

2, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS Y ESCALERA
3. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
4, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M
5 MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	13/06/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de Interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación Informe:	13/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ESTRCTURA PLACA NIVEL 10,40 M



VACIADO DE ESCALERA DE EMEREGENCIA Y MAMPOSTERIA

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS.
2. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
3, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M

VACIADO DE CONCRETO ESCALERA DE EMEREGENCIA

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R. L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	14/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	14/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES A REALIZAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR EL PARO DE TRANSPORTADORES E INDIGENA NO SE PERMITE EL INGRESO A LA UT

ARQDÍLAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	15/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	15/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

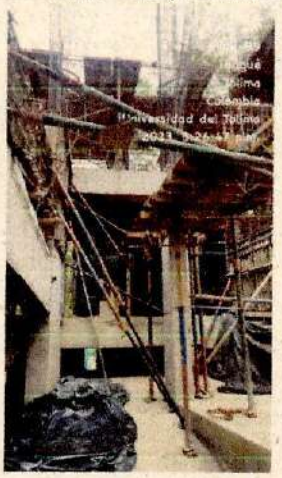

CONCRETO ESTRCTURAS RAMPAS



COLUMNETAS MAMPOSTERIA

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS.
2. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
3, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79,791.210 (Bogota)


ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	16/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	16/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		


ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI COLUMNAS Y PAÑETES MUROS

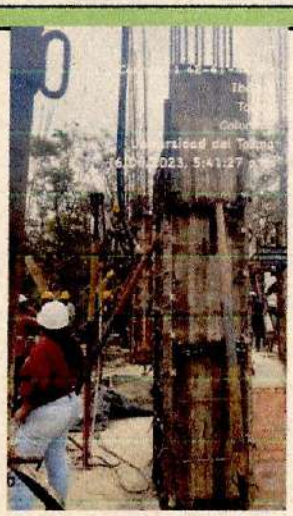

VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI COLUMNAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS.
2. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
3, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M
4, VACIADO DE CONCRETOS

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M
* VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI COLUMNAS NIVEL 10,40

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	17/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	17/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO COLUMNETAS



MAMSPOSTERIA



ESTRCTURAS ESCALERAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, AMARRE DE ESTRCTURA RAMPAS.
2. AMARRES ACEROS VIGAS COLUMNAS Y PANTALLAS
3, ARMADO DE ESTRCTURA PARA PLACA NIVEL 10,20M
4, MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA AMARRES DE ESTRCTURAS PARA RAMPAS EN GENERAL NIVEL 3,40 A 6,80 M
* CONTINUA MAPOSTERIA SEGUNDO NIVEL
* ARMADO DE TABLEROS PARA PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S	Formato	20/06/2023
	INFORME DIARIO	
		Paguina 1 de 1


CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	20/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		


REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.


ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO

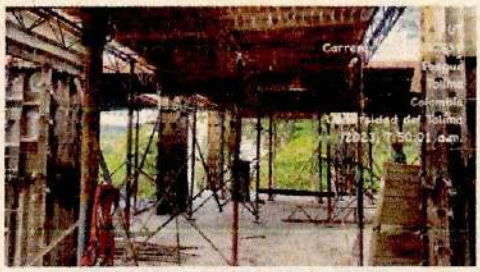

ESTRCTURAS PLACA Y COLUMNAS

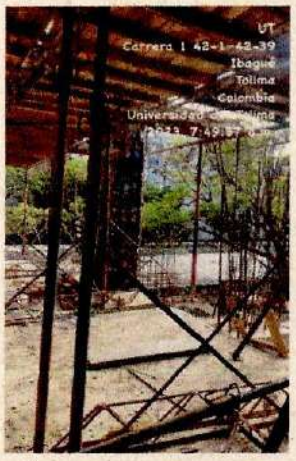

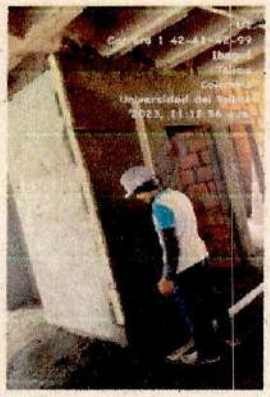

MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION TUBERIAS PVC SANITARIA
2. ARMADO DE ACEROS RAMPAS
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO
4. MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA, FIGURACION Y ARMADO DE VIGAS DE SOPORTE PARA LA RAMPA EN CONCRETO EN TRAMOS 4 A NIVEL 3,40M
* CONTINUA ARMADO DE VIGAS AEREAS, RIOSTRAS, Y VIGUETAS PARA LA CONFORMACION DE LA PLACA DE ENTRE PISO. NIVEL 10,40 M
* MAMPOSTERIA GENERAL NIVEL 2

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	21/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	21/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO






MAMPOSTERIA Y COLUMNETAS



ESTRCTURA ACDROS ESCALERAS



ESTRUCTURAS RAMPAS Y VIGAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION TUBERIA PVC ILUMINACION INTERIOR
2. ARMADO DE ACEROS RAMPAS
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO Y ESCALERAS
4. MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO .
* CONTINUA, FIGURACION Y ARMADO DE VIGAS DE SOPORTE PARA LA RAMPA EN CONCRETO EN TRAMOS 4 A NIVEL 3.40M
* CONTINUA ARMADO DE VIGAS AEREAS, RIOSTRAS, Y VIGUETAS PARA LA CONFORMACION DE LA PLACA DE ENTRE PISO.
* SE INSTALA CASETONES EN ICOPOR PARA PLACA DE ENTRE PISO.

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	22/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	22/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ENCOFRADO ESTRCTURAS DE VIGAS Y PANTALLAS

MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. INSTALACION TUBERIA PVC ILUMINACION INTERIOR
2. ARMADO DE ACEROS RAMPAS
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO Y ESCALERAS
4. MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO .
* CONTINUA, FIGURACION Y ARMADO DE VIGAS DE SOPORTE PARA LA RAMPA EN CONCRETO EN TRAMOS 4 A NIVEL 3,40M
* CONTINUA ARMADO DE VIGAS AEREAS, RIOSTRAS, Y VIGUETAS PARA LA CONFORMACION DE LA PLACA DE ENTRE PISO.

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	23/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**OBJETO**
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.**
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	23/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTRCTURA PLACA Y RAMPA





REDES HIDROSANITARIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

2. ARMADO DE ACEROS RAMPAS
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO Y ESCALERAS
4. MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO.
* CONTINUA, FIGURACION Y ARMADO DE VIGAS DE SOPORTE PARA LA RAMPA EN CONCRETO EN TRAMOS 4 A NIVEL 3,40M
* CONTINUA ARMADO DE VIGAS AEREAS, RIOSTRAS, Y VIGUETAS PARA LA CONFORMACION DE LA PLACA DE ENTRE PISO.

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S

INFORME DIARIO

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	24/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA NIVEL 2



FACHADA LATERAL

ACTIVIDADES A REALIZAR

2. ARMADO DE ACEROS RAMPAS
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO Y ESCALERAS
4. MAMPOSTERIA

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO.
* CONTINUA, FIGURACION Y ARMADO DE VIGAS DE SOPORTE PARA LA RAMPA EN CONCRETO EN TRAMOS 4 A NIVEL 3,40M
* CONTINUA ARMADO DE VIGAS AEREAS, RIOSTRAS, Y VIGUETAS PARA LA CONFORMACION DE LA PLACA DE ENTRE PISO.

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S

INFORME DIARIO

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	26/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ESTRUCTURA VIGAS, PANTALLAS Y RAMPAS Y ESCALERA DE EMEREGENCIA



ESTRCTURAS DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETOS ESTRCTURAS RAMPAS
2. ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
3. PAÑETES

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* VACIADO DE CONCRETO VIGAS, RAMPAS, COLUMNAS Y PANTALLAS NIVEL 3,40 A 10,20 M
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS EN FACHADAS
* PAÑETES EN PRIMER NIVEL DE RAMPAS
* ARMADO DE ESTRUCTURAS ARMADO DE PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM Consultorías & Construcciones S.A.S	Formato	27/06/2023
	INFORME DIARIO	Paguina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

		OBJETO
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	27/06/2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ESTRCTURA RAMPAS Y MAMPOSTERIA	MAMPOSTERIA NIVEL 2

ACTIVIDADES A REALIZAR

2. ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
3, PAÑETES
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS EN FACHADAS
* PAÑETES EN PRIMER NIVEL DE RAMPAS
* ARMADO DE ESTRUCTURAS ARMADO DE PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

207

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de interventoría Nº:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	28/06/2023
Fecha de vencimiento informe:	

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FACHADA POSTERIORES



FACHADA PRINCIPAL

ACTIVIDADES A REALIZAR

2. ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
3, PAÑETES
3. ESTRCTURAS DE PLACA ENTRE PISO

RESUMEN GENERAL

* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* MAMPOSTERIA SEGUNDO NIVEL Y VACIADO DE COLUMNETAS EN FACHADAS
* PAÑETES EN PRIMER NIVEL DE RAMPAS
* ARMADO DE ESTRUCTURAS ARMADO DE PLACA NIVEL 10,40 M

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

ARQDILAM
Consultorias & Construcciones S.A.S
Arquitectura Sostenible

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS SUSCRITOS REPRESENTANTES LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ARQDILAM – CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900 13 270 -3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A 6 (SEIS) MESES ATRÁS Y AL MES DE JUNIO DE 2023.

Realizar la interventria, administrativa, tecnica. legal, financiera, ambiental y juridica al proyecto de construcción de un edificio de aulas ubicadas en el bloque 03 de la sede proncipal de la universidad del Tolima, en la ciudad de Ibagué - Tolima Código BPIN 2019004730042.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Se expide en la ciudad de Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de julio del 2023.

ALEXANDER REYES HERRERA
Contador Publico
T.P 153922 - T

DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
Representante Legal
C.C. 79.791.210 de Bogotá D.C

Normativa
Articulo 50. Ley 789 de 2002

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.414.164
REYES HERRERA

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1979
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-DIC-1997 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3500100-00072742-M-0093414164-20060918 0003434980A 1 6360005549

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

153922-T



ALEXANDER
REYES HERRERA
C.C. 93414164
RESOLUCION INSCRIPCION 313 FECHA 21/10/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 164255

79297

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 C B F 9 B 4 E 6 8 9 1 B F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER REYES HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93414164 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 153922-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESU[redacted] PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900153270	3	ARQUILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 47 N 461 PIEDRAPINTADA ALTA		2761775			SST.ARQUILAM@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27023848	E	2023-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.737.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
16	27023848	2023-07-19	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot	Cot	Cot.	Tipo Cot	Dcto Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 71685914	CASTELLANOS JUAN ENRIQUE	1.160.000	F	X	X														0			2	2	2	2	COLPENSIONES-23601	77.334	12.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.000	S	7111005
2	CC 14395898	QUIMBAYO GARZON JOHN JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-23601	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
3	CC 65724858	LEYTON GODOY MAGALY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-FS-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1711001
4	CC 65754861	MUÑOZ YEPEZ MARIA ESPERANZA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-FS-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1711001
5	CC 65353499	LOPEZ GALLEGO JHON JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23601	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
6	CC 1003711940	GUZMAN ROMERO VALENTINA	1.160.096	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23601	77.334	12.400	0	0	SANITAS-EPS005	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.800	S	7111005
7	CC 1007405598	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIAN	1.160.096	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23601	77.334	12.400	0	0	SANITAS-EPS005	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.800	S	7111005
8	CC 1064755969	CASTELLANOS JAYER GABRIELA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23601	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1711001
9	CC 1065611936	MORENO HERNANDEZ MARCO AURELIO	1.160.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23601	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.800	S	1711007
10	CC 1067574503	RAMIREZ OSPINA JUAN DIEGO	1.160.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23601	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.800	S	1711005
11	CC 1110466467	NIETO GONZALEZ SUGEIDY	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-23601	1.121.334	179.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.121.334	44.900	COMFENALCO-CCF50	1.121.334	44.900	1.121.334	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	275.200	S	1711001
12	CC 1110490098	TARQUINO BULLA BRIAN EDUARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-23601	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1711001
13	CC 1110510452	FORERO APONTE MADELIN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23601	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1711001
14	CC 1110540749	TORRES SIERRA EDWIN ALBERTO	1.160.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23601	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	77.334	3.100	COMFENALCO-CCF50	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	24.800	S	7111005
15	CC 1110577577	RAMIREZ PEREZ LUISA FERNANDA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-FS-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFENALCO-CCF50	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
16	CC 1110581669	GARCIA GONGORA JULIANA VALENTINA	2.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23601	2.400.000	384.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.400.000	96.000	COMFENALCO-CCF50	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	743.100	S	5711001

112

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900153270	3	ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 47 N 461 PIEDRAPINTADA ALTA		2751776		SST.ARQDILAM@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27023848	E	2023-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.737.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	27023848		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.265.338	13.265.338	13.265.338	13.265.338	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	2.122.700	0	0	0	2.122.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	0	0	371.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	12.400	0	0	0	12.400
PORVENIR	230301	800224808	8	10	1.182.300	0	0	0	1.182.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	556.800	0	0	0	556.800
EPS(Administradoras: 5)				16	530.700	0	0	0	530.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	195.000	0	0	0	195.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	233.600	0	0	0	233.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	9.300	0	0	0	9.300
ARP(Administradoras: 1)				16	553.000	0	0	0	553.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	553.000	0	0	0	553.000
CCF(Administradoras: 1)				16	530.700	0	0	0	530.700
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	16	530.700	0	0	0	530.700
Gran Total					3.737.100	0	0	0	3.737.100

212

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79791210		LAMPREA GODOY DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 N° 4 - 61 Coworking 461	IBAGUE-TOLIMA	2761776	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	46313621	9453589263	I	2023/07/06	2023/07/14	BANCO DAVIVIENDA	8	$887,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,028,000	$484,500			$3,028,000	$378,500			$0	$0			$3,028,000		$15,900		$0	$0		$878,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,028,000	$484,500			$3,028,000	$378,500			$0	$0			$3,028,000		$15,900		$0	$0		$878,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,028,000	$484,500			$3,028,000	$378,500			$0	$0			$3,028,000		$15,900		$0	$0		$878,900
1	CC 79791210	LAMPREA GODOY DIEGO MAURICIO		230301	30	$3,028,000	$484,500	EPS005	30	$3,028,000	$378,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,028,000	0.522%	$15,900	0	$0	$0	No	$878,900
Total	**Afiliados(1)**					$3,028,000	$484,500			$3,028,000	$378,500			$0	$0			$3,028,000		$15,900		$0	$0		$878,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79791210		LAMPREA GODOY DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 N° 4 - 61 Coworking 461	IBAGUE-TOLIMA	2761776	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	46313621	9453589263	I	2023/07/06	2023/07/14	BANCO DAVIVIENDA	8	$887,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$484,500	$4,500	$0	$489,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$484,500	$4,500	$0	$489,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,900	$200	$0	$16,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,900	$200	$0	$16,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$378,500	$3,500	$0	$382,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$378,500	$3,500	$0	$382,000
TOTAL				1	$878,900	$8,200	$0	$887,100

RESU[redacted] PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65553261	0	NOHORA YAMILE DIAZ GUARNIZO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7410	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MAN 24 CS 12		3185572573		ING_YAMILEDIAZ@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	26372235	I	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	997.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	26372235	2023-06-15	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	SLN	INCA	LMA	VAC	VACT	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPTS	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 65553261	DIAZ GUARNIZO NOHORA YAMILE	3.500.000														0			28	16	0	0	COLPENSION 25-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS EPS005	3.500.000	437.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	997.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65553261	0	NOHORA YAMILE DIAZ GUARNIZO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7410	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MAN 24 CS 12		3185572573		ING_YAMILEDIAZ@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	26372235	I	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	997.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26372235		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.500.000	3.500.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	560.000	0	0	0	560.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	560.000	0	0	0	560.000
EPS(Administradoras: 1)				1	437.500	0	0	0	437.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	437.500	0	0	0	437.500
Gran Total					997.500	0	0	0	997.500

1/2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52896908		PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 N 69-232 CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	5151461	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	26842184	9452438967	I	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

2023/07/04 07:57 PM

2/5

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52896908		PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 N 69-232 CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	5151461	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	26842184	9452438967	I	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
1	CC 52896908	PARRADO ZULMA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**

2023/07/04 07:57 PM

2/6

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MARIA DEL PILAR ÑUNGO MORALES
No. Identificación: CC65759640
Dirección: MZ C CASA 17 TERRAZAS DE BOQUERON
Telefono: 2607114
Correo: jack.0307@hotmail.es
Ciudad: IBAGUÉ
Número de Planilla: 8368652108

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MARIA DEL PILAR ÑUNGO MORALES
Tipo y número de identificación	CC65759640
Número de planilla	8368652108
Fecha pago	2023-06-16
Número de autorización pago	45823521
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	330600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 8368652108

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	185600	1
EPS002	Salud Total EPS	145000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 65759640
APELLIDOS Y NOMBRES: MARIA DEL PILAR ÑUNGO MORALES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1160000	1160000	0	0	145000	0	185600	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESU[redacted] PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110466508	0	IVONNE GUERRERO FRANCO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 SUR N 93 65 T 2 ALTAGRACIA		3173484520		IVONNE.GUERRERO.F@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	27014511	I	2023-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	338.400	1.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27014511	2023-07-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1110466508	GUERRERO FRANCO IVONNE MARITZA	1.160.000																	0		30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	145.000	SIN CCT-SINCCF	0	0	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	336.700	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110466508	0	IVONNE GUERRERO FRANCO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 SUR N 93 65 T 2 ALTAGRACIA		3173484520		IVONNE.GUERRERO.F@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	27014511	I	2023-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	338.400	1.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27014511		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	186.600	0	900	0	186.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	186.600	0	900	0	186.500
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	700	0	145.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	145.000	0	700	0	145.700
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	100	0	6.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	100	0	6.200
Gran Total					336.700	0	1.700	0	338.400

212

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 1110466508	GUERRERO FRANCO IVONNE MARITZA	1.160.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	145.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	6.100	0.005522	0	0	0	0	0	57	0	336.700	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110466508	0	IVONNE GUERRERO FRANCO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 SUR N 90 65 T 2 ALTAGRACIA		3173484520		IVONNE.GUERRERO.F@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	27014511	I	2023-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	338.400	1.700	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27014511		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	900	0	186.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	900	0	186.500
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	700	0	145.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	145.000	0	700	0	145.700
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	100	0	6.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	100	0	6.200
Gran Total					336.700	0	1.700	0	338.400

ASOPAGOS s.a.

912
