INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL __X__ **FINAL** ____

PERIODO DE 25 de Mayo de 2023 **A** 24 de Junio de 2023

CONTRATO No. : Contrato No 019 del 23 de Mayo de 2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: **:** DESAJTU-MC-016 de 2023

OBJETO : CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DEOBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROPIA EN EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE, UBICADA EN LA CARRERA 8 No 8-41 EN LA CIUDAD DE LABRANZAGRANDE

LOCALIZACIÓN : LABRANZAGRANDE, BOYACA

VALOR : $39.830.464,00

PLAZO : Sesenta (60) días Calendario

FECHA DE INICIO : 25 de Mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN : 24 de Julio de 2023

CONTRATISTA : Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE

SUPERVISOR : Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

Pág. 1 de 11

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
	101 PRELIMINARES				
1	5220 RASPADO DE SUPERFICIE EN MURO PINTADO EN VINILO	M2	90	4.389,39	394.562,00
2	5227 RASPADO Y RESANE SUPERFICIE MURO PINTADO	M2	12	6.515,69	81.120,00
	102 DEMOLICIONES				
3	4500 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS SIN RETIRO	M2	10	7.201,35	74.678,00
4	6210 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO SIN RETIRO	M2	43	6.334,69	275.354,00
	103 DESMONTES				
5	21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS SIN TRANSPORTE	UND	1,00	4.663,73	4.664,00
6	5370 DESMONTE DE VENTANAS SIN TRANSPORTE	M2	0,40	7.313,82	2.926,00
7	6000 DESMONTE CIELO RASO SIN TRANSPORTE	M2	67	10.973,48	739.097,00
8	6003 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO SIN TRANSPORTE	M2	90	9.053,12	811.060,00
9	6715 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	13	2.743,37	36.051,00
	106 PISOS				
10	550 ALISTADO DE PISOS e=0,04m, EN MORTERO 1:4	M2	14	25.927,50	351.701,00
11	6652 ENCHAPE PISO EN CERÁMICA DUROPISO 33.8x33.8. SUMINISTRO E	M2	14	80.185,52	1.087.701,00
	108 CUBIERTAS				
12	6726 TEJA TERMOACÚSTICA COLOR PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO MAX A360	M2	99	88.792,36	8.753.196,00
13	6784 CABALLETE PARA CUBIERTA TERMOACÚSTICA	M	10	112.360,26	1.092.142,00
14	1.12.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LÁMINA 12x6 CAL.22 (APU´s	M	10	64.685,72	656.044,00
	109 CARPINTERÍA METÁLICA				
15	6031 INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA VENTANAS	M2	0,40	215.667,12	86.267,00
	110 CANALES Y BAJANTES				
16	442 CANAL BLANCA PVC PARA TECHO O C-30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	19	61.462,05	1.194.822,00
17	594 BAJANTE BLANCA PVC PARA CANALES. SUMINSITRO E INSTALACIÓN	M	3,70	61.186,49	226.390,00
	111 CIELO RASO				
18	7416 CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7mm (INCLUYE CORNISA)	M2	81	90.317,76	7.308.315,00
	112 ENCHAPES				
19	6285 ENCHAPE PARED CERÁMICA 30X60 cm BLANCO PLANA DE CORONA O	M2	14	62.192,61	886.618,00
	113 INSTALACIONES SANITARIAS				
20	6729 INSTALACIÓN TUBERÍA DE A. LL. PVC 4"	M	9	46.765,38	443.139,00
	114 APARATO SANITARIO				
21	1224 LAVAMANOS AVANTI PEDESTAL CON GRIFERÍA SENCILLA NOGAL DE CORONA	UND	1,00	353.115,04	353.115,00
22	1231 SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO DE CORONA. SUMINISTRO E	UND	1,00	616.394,27	616.394,00
	117 PINTURAS				
23	1034 PINTURA VINILO INTERIOR SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	88	9.234,61	810.139,00
24	1056 ANTIHUMEDAD FACHADA SIKA TRANSPARENTE 10 (1 CAPA)	M2	43	14.094,76	603.146,00
25	5920 PINTURA EXTERIOR VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	40,40	15.304,91	618.276,00
	118 PAÑETES				
26	279 PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	67	27.827,68	1.855.561,00
	120 ACCESORIOS				
27	704 JUEGO Y/O ACCESORIOS EN PORCELANA PARA BAÑO. SUMINISTRO E	UND	1,00	232.307,05	232.307,00
	124 MAMPOSTERÍA				
28	5767 MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN 0,245m (24.5 x 12 x 6), EN MORTERO	M2	17	115.019,40	1.906.171,00
	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS-LUMINARIAS-LÁMPARAS (APU´s BOYACÁ)				
29	1.07.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE (4P) PLACA (APU´s Boyacá)	UND	7,00	26.885,79	188.201,00
	TRANSPORTE MATERIALES				
30	VOLQUETA SENCILLA (6M3) CON MATERIALES DE YOPAL A LABRANZAGRANDE	GLB	1,00	540.000,00	540.000,00
	RETIRO DE ESCOMBROS				
31	VOLQUETA SENCILLA (6M3) CON MATERIALES DE LABRANZAGRANDE A YOPAL	GLB	1,00	540.000,00	540.000,00
			SUBTOTAL		**32.762.157,00**
			ADMINISTRACION 16%	16%	**5.243.065**
			IMPREVISTO 2%	2%	**655.383**
			UTILIDAD 3%	3%	**983.075**
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%	19%	**186.784**
				COSTO TOTAL	**39.830.464**

Tabla No 1. Contrato No 019 de 2023

1.2. GARANTÍAS

Para dar cumplimiento a la cláusula QUINTA del contrato se expidieron las pólizas No. 18-44-1010895261 y 18-40-101066033 de fecha 23 de Mayo de 2023, dichas pólizas tienen las coberturas de la siguiente manera:


AMPARO	No DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	18-44-1010895261	23/05/2023	23/11/2023	$ 3.983.046,40	Seguros del Estado S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18-44-1010895261	23/05/2023	23/07/2026	$ 3.983.046,40	Seguros del Estado S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-1010895261	23/05/2023	23/11/2023	$ 3.983.046,40	Seguros del Estado S.A.
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18-40-101066033	23/05/2023	23/07/2023	$ 232.000.000,00	Seguros del Estado S.A.
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	18-40-101066033	23/05/2023	23/07/2023	$ 232.000.000,00	Seguros del Estado S.A.
PERJUICIOS EXTRA PATRIMOMIALES	18-40-101066033	23/05/2023	23/07/2023	$ 232.000.000,00	Seguros del Estado S.A.

Tabla No 2. Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil del Contrato No 019 de 2023

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO Y AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

El desarrollo del presente contrato no presento ningunos inconvenientes financieros. Se ejecutó parcialmente los recursos por un valor de $10.253.650,00 al finalizar el primer mes de plazo contractual, que corresponde a un 25.74% del valor total contratado.

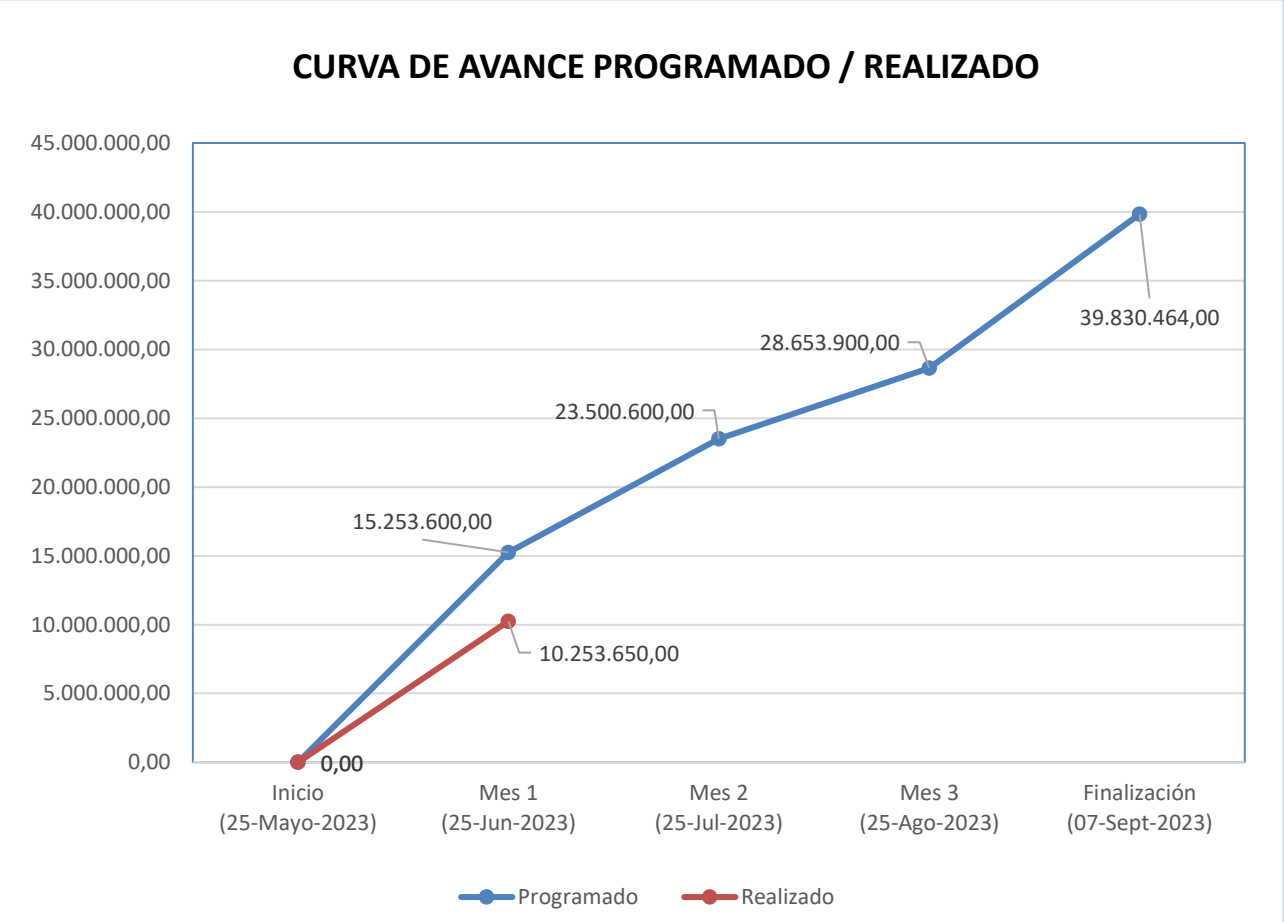

2.2. INVERSIÓN ANTICIPO

No aplica. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, efectuará al contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecución del contrato, de la siguiente manera: Se realizará a través de **dos (2) pagos** así: Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor de contrato se cancelará mediante actas parciales según avance de obra previa. El veinte por ciento (20%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. Los pagos se realizarán previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

2.3. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No aplica, No hubo anticipo por lo cual no se generaron rendimientos financieros.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

No se emplearon personas con Discapacidad.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

No aplica. A la fecha no se han presentado accidentes laborales y/o reclamaciones laborales o de pagos por salarios y prestaciones.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 25 de Mayo de 2023 al 24 de Junio de 2023, se realizaron actividades preliminares de localización y replanteo, y se dio inicio a las siguientes actividades:

Se realizó raspado de superficies en muro, resanes de paredes y algunas demoliciones de enchape y pañetes en mal estado.

Se realizó desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de ventanas y cielo raso y desmonte de cubierta asbesto cemento y desmonte de canales y bajantes de agua lluvias





Registro Fotográfico 1 y 2. Desmonte de Cubierta existente (Teja de asbesto-Cemento)







Registro Fotográfico 3, 4 y 5. Labores de raspado de superficies en muro, resanes de paredes y algunas demoliciones de enchape y pañetes en mal estado

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

El riesgo que afecto un poco el buen desarrollo de la obra fue la poca carencia de algunos materiales en la región, que debieron comprarse en otra ciudad y posteriormente ser enviados por transporte terrestre.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se contrató personal del área, para realizar trabajos de obras civiles del contrato No 019/2023, las cuales se relacionan a continuación:

GUERRA OSCAR	C.C. 77.036.623	Residente de Obra
ALARCON WILMAN	C.C. 74.083.692	Maestro de Obra
ALARCON EDWIN	C.C. 1.055.504.358	Ayudante de Obra
GOMEZ JORGE	C.C. 1.010.168.149	Ayudante de Obra
MARTINEZ JOSE	C.C. 1.019.050.313	Ayudante de Obra
MEJIA JUAN	C.C. 72 264 034	Ayudante de Obra


En el caso de los residuos generados de la obra están siendo entregados a la firma EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LABRANZAGRANDE “EMPOLAB SA ESP”, empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Labranzagrande, la cual al finalizar sus servicios de aseo y recolección procederá a certificarnos la recepción de estos residuos.

8. OBSERVACIONES

Las obras se realizan acorde a los ítems contractuales, se evidencia un avance físico del 25,74 %

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME MENSUAL No 1 a los veinticuatro (24) del mes de Junio de 2023





Ing. ANDRÉS GRANADOS ARCINIEGAS — Residente de Obra

Ing. YUILBERTH DARIO ANGARITA — Residente SISO – Especialista en Salud Laboral

ANEXOS

ANEXO No 1
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77036613	0	GUEBRA CHATE OSCAR ENRIQUE	A - 200 O MAS COTIZANTES	ANA I CORREA	carrera 8 No 8-29	VALLEDUPAR-CESAR	3002260492	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-05	2023-06	2136130570	9452261079	E	2023/06/07	2023/06/14	BANCOLOMBIA	7	$209,300		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre	Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1092504358	ALARCON EDWIN	X																		230301	4	$154,667	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF15	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	$0	SI	$40,000
2	CC 74082892	ALARCON WILMAN	X																		230201	4	$154,667	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF15	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	$0	SI	$40,000
3	CC 1010168149	GOMEZ JORGE	X																		230201	4	$154,667	EPS016	4	$154,667	$6,200	CCF15	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	$0	SI	$40,000
4	CC 1019030313	MARTINEZ JOSE	X																		230301	4	$154,667	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF15	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	$0	SI	$40,000
5	CC 7226404	MEJIA JUAN	X	X																	230301	1	$38,667	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF15	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	$0	SI	$12,100
Total	Afiliados(5)																						$667,335			$667,335	$26,400			$667,335	$26,400			$667,335	$45,900	$0		$204,100

ANEXO No 2
Póliza de Cumplimiento

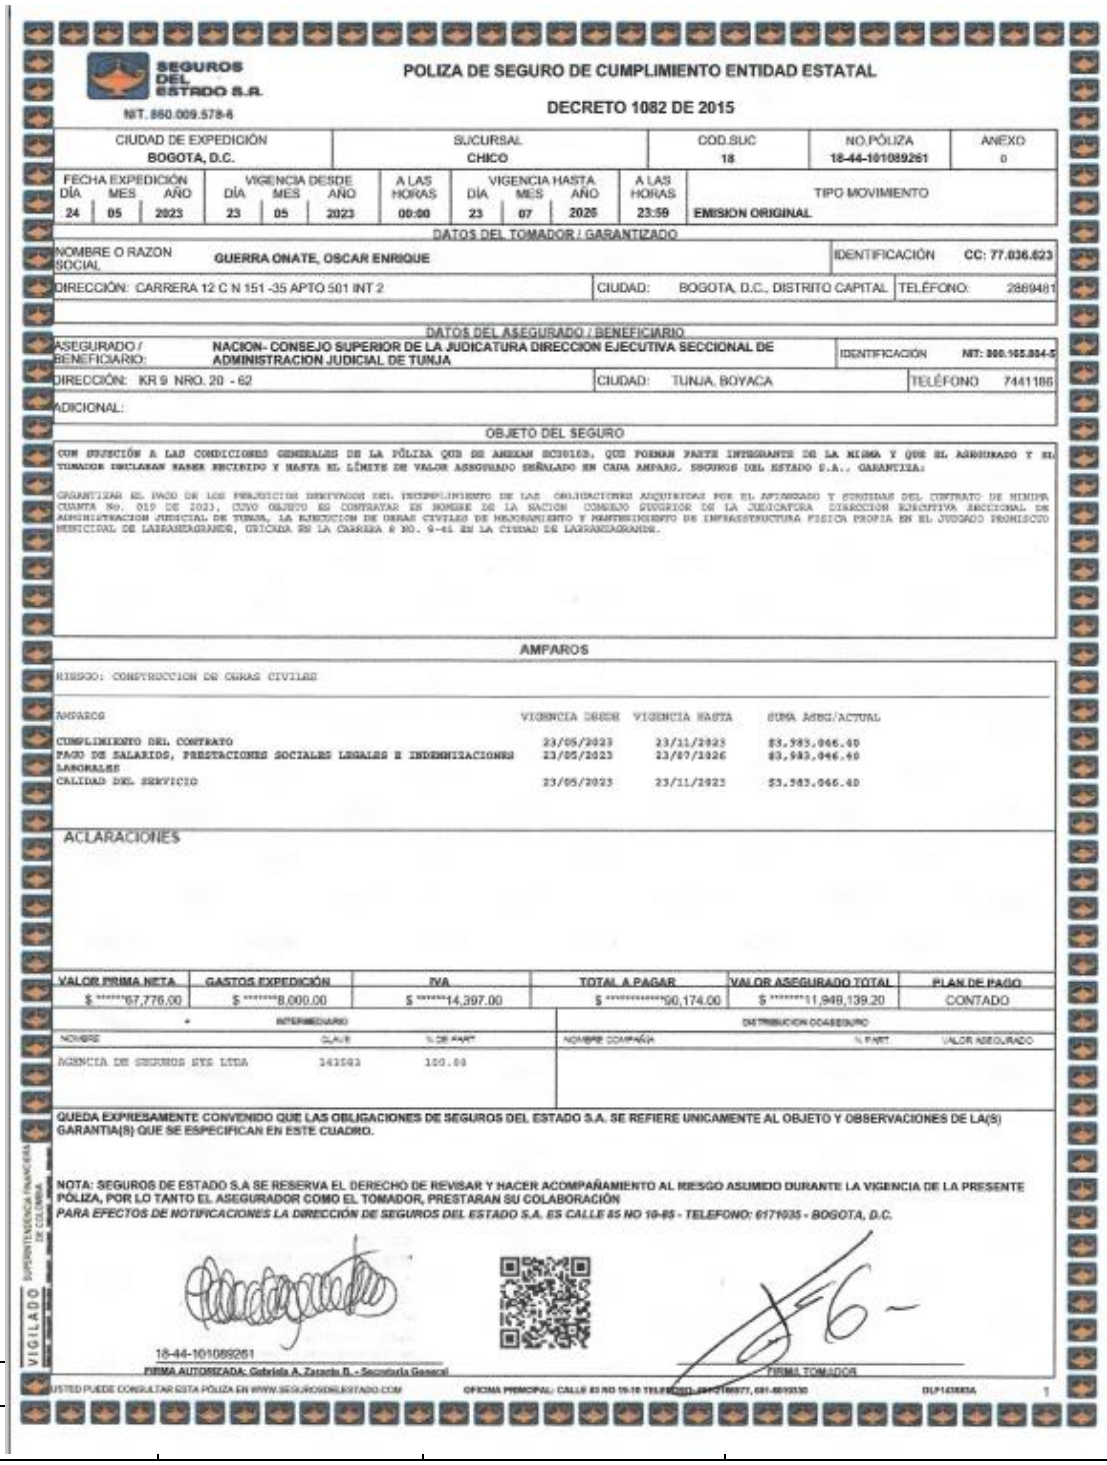

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101089261	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	05	2023	23	05	2023	00:00	23	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
QUERRA ONATE, OSCAR ENRIQUE	CC: 77.036.623

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 12 C N 151 -35 APTO 501 INT 2	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2869481

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA	NIT: 800.165.884-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 9 NRO. 20 - 62	TUNJA, BOYACA	7441186

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECHOIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y CONSIGNADAS DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 019 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROPIA EN EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE, UBICADA EN LA CARRERA 8 NO. 9-61 EN LA CIUDAD DE LABRANZAGRANDE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/05/2023	23/11/2023	$3,983,046.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2023	23/07/2026	$3,983,046.40
CALIDAD DEL SERVICIO	23/05/2023	23/11/2023	$3,983,046.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******67,776.00	$ ******8,000.00	$ ******14,397.00	$ **********90,174.00	$ ********11,949,139.20	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS EYE LTDA	141583	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101089261

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zazarlo B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-10 TELEFONO(S) 6912199077, 691-8010330

DLP1438834

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No 2

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101066033	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	05	2023	23	05	2023	00:00	23	07	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GUERRA ONATE, OSCAR ENRIQUE			CC: 77.036.623
DIRECCIÓN: CARRERA 12 C N 151 -35 APTO 501 INT 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2869467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA			NIT: 800.185.804-5
DIRECCIÓN: KR 9 NRO. 20 - 62	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO	7441186
BENEFICIARIO: 800185804 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 3-RCE-0028 NEXOS 04-09 / 3-RCE-0018, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 019 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROPIA EN EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE. UBICADA EN LA CARRERA 6 NO. 8-41 EN LA CIUDAD DE LABRANZAGRANDE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PERDIDA SALARIOS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/05/2023	23/07/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/05/2023	23/07/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/05/2023	23/07/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******155,090.00	$ *******3,000.00	$ ******30,037.00	$ **********188,127.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SVS LTDA	242582	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101066033

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LISTO PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-10 TELEFONO: 601-2188017, 601-6015335 DLP143583A 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CO	
F-	
VE	
