XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA**	**Código:**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000280

Nit: 901511522-4

martes, 15 de agosto de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000275	15-ago.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO GAMER SOACHA **CC o NIT** 901587366 **DV** 8

DIRECCION CL 44C 45 53 IN 2 AP 601 **TELEFONO** 3016341049

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N 5 **VALOR PAGO** 489,314,228.00

DESCRIPCION

OCTAVO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 74,45% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100609		CTA 9347 - CTO INTER. No. 3443 INTERVENTORIA	00.00	489,314,228.00			
240101	2.4.5.02.09	Bienes y servicios	489,314,228.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**489,314,228.00**	**489,314,228.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000115	2023000142	2.4.5.02.09.002	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002-Recursos en Administración	525,326,118.33

TOTAL PRESUPUESTO	525,326,118.33

Elabor Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** **Reviso:** **NOMBRE TESORERO** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO OCTAVO CTO 024-2022 CONSORCIO GAMER SOACHA - 74.45 POR CIENTO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	46234456		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300309347		
Fecha de Creacion	14/08/2023	**Fecha de Pago**	15/08/2023 08:45
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 528.988.355,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 528.988.355,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0242029015873668	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	$ 39.674.127,00	Pago Exitoso	
9015873668	0000009015873668	Ahorros	9900345746	DAVIVIENDA	$ 489.314.228,00	Pago Exitoso	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2023000275**	**FECHA**	14 de agosto de 2023
NUMERO FACTURA	CGS 9	**FECHA FACTURA**	14 de agosto de 2023
NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA		
NIT	901587366-8		
PROVEEDOR	CONSORCIO GAMER SOACHA		
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 - CONTRATO DE OBRA 024-2022		
FECHA INICIO			
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA N° 024-2022		
CDP		**RP**	

PAGO DE OCTAVO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 74,45% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
OCTAVO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 74,45% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION		1	$ 406,914,119.00		
A=	24%		$ 97,659,389.00		
I=	1%		$ 4,069,141.00		
U=	5%		$ 20,345,706.00		
RETEFUENTE	2%			$ 10,579,767.00	
RETE ICA (5 * 1000)	0.5%			$ 2,644,942.00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			$ -	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			$ -	
Fondo de seguridad- Art 138. Acuerdo 030	5%			$ 26,449,418.00	
TOTAL			**$ 528,988,355.00**	**$ 39,674,127.00**	**$ 489,314,228.00**

Nota: Tener en cuenta que se adiciono valor al contrato y por eso se recalcularon los porcentajes de ejecución

Contabilizó:

Roger Andrey Guiza
Contador

Reviso:

Camilo Torres
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA	Código: COM-2023000275	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2023000275

Nit: 901511522-4

lunes, 14 de agosto de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA	**CC o NIT**	901587366	**DV**	8
DIRECCION	CL 44C 45 53 IN 2 AP 601	**TEL**	3016341049		
DESCRIPCION	OCTAVO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL 74,45% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243626	Contratos de construcción	00.00	10,579,767.00
24079001	Rete ica	00.00	2,644,942.00
24072203	Fondo de seguridad	00.00	26,449,418.00
240101	Bienes y servicios	00.00	489,314,228.00
29020108	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3443 - 2021	3,662,236.67	00.00
29020108	CTO INTERADMINISTRATIVO No 3443 - 2021	525,326,118.33	00.00
	SUMAS IGUALES	**528,988,355.00**	**528,988,355.00**
Documento	**Valor a Girar**	**489,314,228.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000115	2023000142	2.4.5.02.09.002	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002-Recursos en Administración	525,326,118.33
2023000011	2023000011	3.2.4.5.02.09.007.91119.002	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 002-Recursos en Administración	3,662,236.67
TOTAL PRESUPUESTO				**528,988,355.00**

NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

JOHANA
Elaboró

Modificó

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA - NIT.: 901587366-8
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ - DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
CONTRATO	CONTRATO 024 DE 2022 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	CUMPLE - FACTURA CGS 9 - 08/08/2023 - FOLIO 109 - PENDIENTE CUFE
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FOLIO 260 AL 262 - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	PRESENTA - FOLIO 263 AL 264 - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FOLIO 265 - FIRMA SUPERVISOR - AJUSTAR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA - FOLIO 193
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA - FOLIO 194
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA - FOLIO 195
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	PRESENTA - FOLIO 196
Certificación Bancaria	PRESENTA - FOLIO 110
Planillas de pago parafiscales PN	PRESENTA - FOLIO 056 AL 058
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	PRESENTA - FOLIO 254 AL 255
RIT - Registro de información tributaria	PRESENTA - FOLIO 256 AL 258
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA - FOLIO 259 - AJUSTAR Y COMPLETAR
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	PRESENTA - FOLIO 111 AL 114 - FIRMA SUPERVISOR
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantias	NA
Copia Aprobacion de garantias	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
RADICADO Y REVISION FACTURA	**Fernando**	11/8/2023	17:10:00 PM						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
PEDIENTE AJUSTAR FACTURA - CUFE Y CIFRAS EN FORMATOS									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									

COCOSERING S.A.S.
CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.104.779 - 0

COCOSERING S.A.S
N.I.T. 900104779-0

Bogotá, 08 de Agosto de 2023

CITAR NÚMERO DE RADICADO 001355
FECHA DE RECEPCIÓN 2023-08-09 09:36:57
TIPO: EXTERNO
REMITENTE: EDGAR EDUARDO URIBE CARDENAS
DESTINATARIO: JUAN PABLO CAÑON
001355

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Calle 12 No. 8ª-36
Soacha-Cundinamarca

Referencia: Contrato 025 de 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

Asunto: Aprobación Acta parcial N °8 Contrato de Obra 024 de 2022.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la cuenta **Parcial No 08** con un valor de $ 528.988.355 equivalente al 7,83 % del valor total del contrato de obra 024 de 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Dando cumplimiento a la circular externa 002 adjunto la siguiente documentación:

- Informe técnico aval de interventoría para cuenta de cobro N° 8 del contratista de obra
- factura o cuenta.
- Acta parcial No 8 con memorias de Calculo.
- Informe de actividades Contratista de Obra.
- Informe de Supervisión.
- Certificado de Cumplimiento.
- Certificado de Pago de aportes a seguridades Social y parafiscales.
- Formato de Seguimiento.
- Descripción Actividades.

Numero de Folios Acta parcial N °8: Carpeta 1: 266 Folios

Cordialmente,

Edgar Eduardo Uribe Cárdenas
Director de Interventoría.
COCOSERING SAS.

CONTRATO 025 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

EL CAMBIO AVANZA


Alcaldía Municipal de Soacha

XUÁ

INFORME TÉCNICO AVAL DE INTERVENTORIA DE LA CUENTA DE CONTRATO DE OBRA No. 8

PERIODO: 28 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA

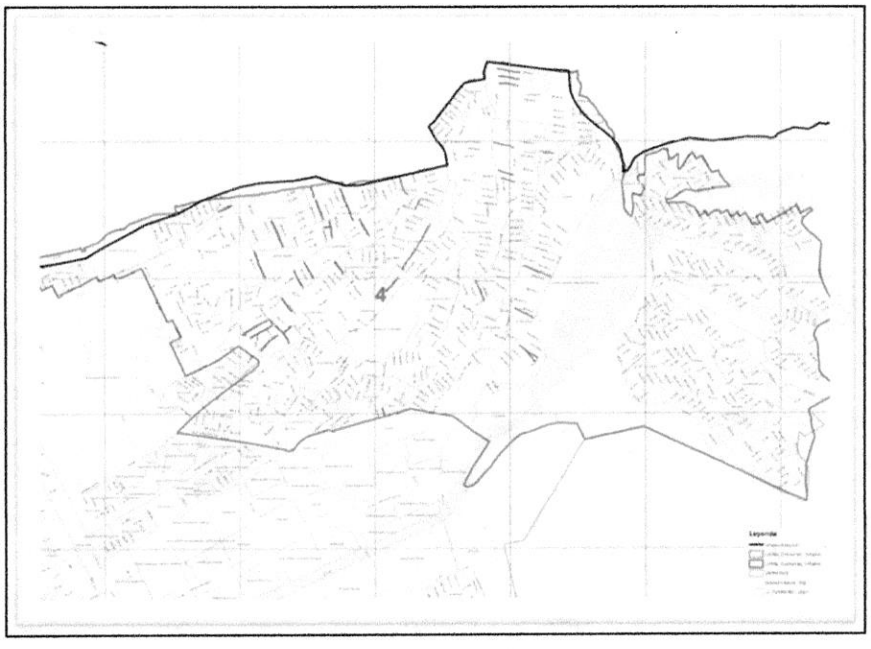

SOACHA- JULIO 2023.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022

COCOSERING SAS.

CONTRATISTA

CONSORCIO GAMER SOACHA

CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

INFORME TÉCNICO AVAL DE INTERVENTORIA DE LA CUENTA DE CONTRATO DE OBRA No. 8

PERIODO: 28 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

Responsables	Nombre	Cargo	Firma
Responsable residente Técnico	Sandra Lorena Cifuentes Fuentes.	Residente Técnico	
Responsable Aprobación Interventoría	Edgar Eduardo Uribe Cárdenas	Director Interventoría	
Responsable Aprobación Epuxua	Juan Pablo Cañón	Supervisión Epuxua	

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	No de Paginas
01		Versión inicial	
02		Versión corregida	
03			

COCOSERING S.A.S.
CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.104.779 - 0

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 6
3. ÁREA TÉCNICA 7
3.1 GENERALIDADES 7
3.2 LOCALIZACIÓN SEGMENTO VIAL CONTRACTUAL 8
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 9
3.3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 9
4. DATOS DE LOS CONTRATOS 12
5. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS 15
6. ADMINISTRATIVO 22
6.1 AREA ADMINISTRATIVA 22
6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 22
6.3 ACTA DE INICIO 23
7. FINANCIERO 23
7.1 PRESUPUESTO CONSORCIO GAMER SOACHA 23
7.2 ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022 29
7.3. ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022. 30
7.4. PAGOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATO DE OBRA 30
8. AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 31
8.1 ACTAS DE COMITÉ 31
8.2 OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 31
8.3 ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 34
8.4 VÍAS COMUNA 4- BARRIO LUIS CARLOS GALAN II- BARRIO LUIS CARLOS GALAN I Y VILLAS DE CASA LOMA. 34
Actividades de obra: 34
8.5 CRONOGRAMA. 36
9. REGISTRO FOTOGRAFICO 36
10. CALIDAD DE MATERIALES 40
11. ACCIONES DE EMERGENCIA 40
12. CONCLUSIONES 40

13. ANEXOS.....40

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2 Perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca.....8

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Vías a Intervenir.....9
Tabla 2 Datos del contratista de obra.....12
Tabla 3 Datos de la Interventoría.....14
Tabla 4 Pólizas Interventoría.....15
Tabla 5 Pólizas Contratista.....16
Tabla 6 Personal Administrativo Interventoría.....22
Tabla 7 Personal administrativo CONSORCIO GAMER SOACHA.....23
Tabla 8 avance financiero.....29
Tabla 10 Actas de comité.....31
Tabla 11 Correspondencia Enviada.....32
Tabla 12 Correspondencia Recibida.....33

1. INTRODUCCIÓN

La COMUNA 4 (Cazuca): Se encuentra en el nororiente y es el sector más pobre respecto a equipamientos. Los establecimientos educativos y de salud no cubren las necesidades de sus pobladores es también una de las Comunas del municipio con mayor déficit de infraestructura vial. Razón por la cual la administración municipal dentro del marco de su plan de desarrollo municipal "el CAMBIO AVANZA" incluye el ARTÍCULO 16. PROGRAMA 1.1. MALLA VIAL EFICIENTE Programa tiene como objetivo transformar la infraestructura de Soacha a partir de procesos de articulación, fortalecimiento de vías, facilitación del fluido de transporte masivo y de carga y mejoramiento de movilización de los habitantes dentro y fuera del municipio.

Este informe técnico aval de pago de obra No.8 , que contiene las actividades correspondientes al desarrollo del contrato de interventoría No. 025 de 2022 suscrito entre LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA y COCOSERING SAS, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021" del 28 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023 de la misma manera contiene las actividades desarrolladas DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA contrato No 024 DE 2022 , EJECUTADAS POR EL CONSORCIO GAMER SOACHA, cuyo objeto es "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA", Que el presupuesto oficial total destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.759.182.392,67) M/CTE

El presente informe de avance es presentado en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio de 2023.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe tiene como objeto describir las actividades realizadas por parte de la interventoría en referencia a las actividades de obra desarrolladas por contratista CONSORCIO GAMER SOACHA en el municipio de SOACHA durante el periodo comprendido 28 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023. En sus diferentes áreas (TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL), registrando las actividades propias desarrolladas por el Contratista y la Interventoría, junto con las observaciones, recomendaciones y gestiones adelantadas, con el fin de efectuar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.



Cumplir con las exigencias del cliente, respetando la opinión de la comunidad e informando a cabalidad las acciones y ejecuciones concernientes al contrato de obra 024 de 2022. Contestando los derechos de petición solicitados y solucionando los PQR presentados.

Verificar, controlar y revisar que EL CONSORCIO GAMER SOACHA, ejecute las actividades de obra con calidad y respetando a cabalidad las normas establecidas por el Instituto de Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del IVIAS y demás normas que se aplican para la debida ejecución de este proyecto . Asimismo siguiendo los Diseños y estudios entregados por la empresa pública de Soacha EPUXUA y por la Secretaria de Infraestructura de Soacha.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Realizar la entrega de los informes periódicamente y como está establecido en las obligaciones del contrato de interventoría.
- Inspeccionar, asesorar, supervisar, comprobar y evaluar las labores objeto del contrato.
- Exigir al contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales.
- Informar a la empresa pública del municipio de Soacha, Epuxua avanza en forma continua y periódica, sobre el avance, problemas y soluciones presentadas en el desarrollo del contrato.
- Controlar la calidad de los materiales empleados por el contratista.
- Realizar la entrega de los informes periódicamente y como está establecido en las obligaciones del contrato de interventoría.
- Exigir el cumplimiento de las normas técnicas en el desarrollo del contrato de obra.


3. ÁREA TÉCNICA

3.1 GENERALIDADES

El alcance específico del contrato de obra 024 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, busca disminuir el déficit de infraestructura vial existente en la COMUNA 4 - CAZUCA.

En cuanto al contrato de interventoría 025 de 2022 ,tiene como objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021"

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4- Cazuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

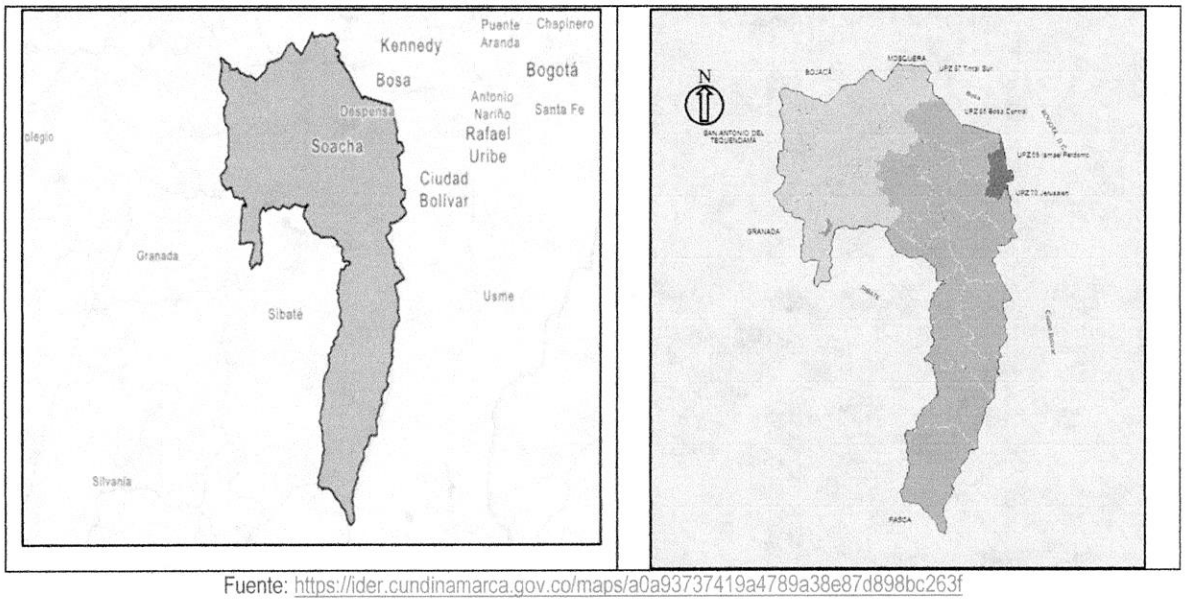

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f


3.2 LOCALIZACIÓN SEGMENTO VIAL CONTRACTUAL.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

- Calle 48 (Cazucá)
- Transversal 9 este - Carrera 1 (Julio Rincón - Cazucá)
- Avenida Terreros (Calle 38)
- Calles 41 y 42 (El Oasis - Los Robles - Caracolí)
- Transversal 33 Este / Diagonal 40 I (Los Pinos - Rincón del Lago - La Isla)
- Carrera 39 Este.

A continuación se ilustra el perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca Soacha.

Ilustración 1 Perímetro de intervención Comuna 4- Cazuca

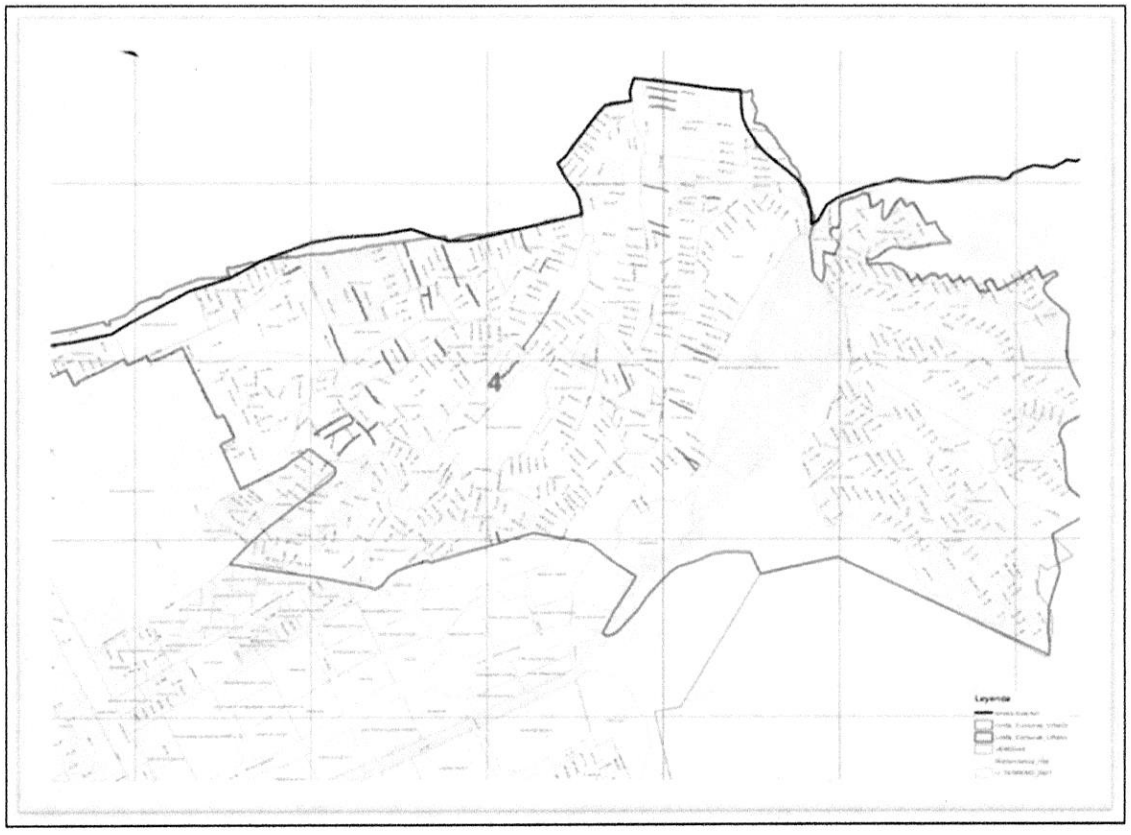

Fuente: Secretaria de Infraestructura

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo este una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicularen en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención:

Tabla 1 Vías a Intervenir.

NUM_CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 59 -58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CALLE 49 CRA 19 E -17	INTERVENIDA
4	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
5	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
6	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
7	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
9	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
10	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 CESTE	INTERVENIDA
11	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
12	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
13	CRA 26 ESTE ENTRE CSLL 58-59	INTERVENIDA
14	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
15	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
16	CALLE58 ENTRE 26A ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
17	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
18	CRA 19 ESTE CON 49-50	INTERVENIDA
19	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 39 A SUR (VIA CURA)	INTERVENIDA
20	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
21	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA

22	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 27D ESTE CON CALLE 44 -50	INTERVENIDA
24	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
25	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
26	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
27	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
28	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
29	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
30	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
31	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
32	CALLE 56 A CRA 26-27	INTERVENIDA
33	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA
34	CALLE 56B CRA 27 ESTE -CRA 27AESTE	INTERVENIDA
35	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
36	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
37	CALLE 43 BIS ETRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
38	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
39	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
40	CARRERA 32 A-CLL 44-59	FINALIZADA
41	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
42	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
43	CRA 37 ESTE DG 43J-DG.45	FINALIZADA
44	CALLE 50 CRA 32 A CRA 31	FINALIZADA
45	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
46	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43J	FINALIZADA
47	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
48	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA
49	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
50	CRA 28 ESTE CL 56A CL-59	FINALIZADA
51	CALLE 53 30-29	FINALIZADA
52	CRA 30 ESTE-CLL53 - CLLE 44	FINALIZADA
53	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
54	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
55	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
56	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
57	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 D Y 43F	FINALIZADA
58	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
59	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
60	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA

61	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
62	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
63	CRA 17 B ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
64	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
65	CRA 17 A ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
66	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
67	CRA 26 C este CLL 59	ENTREGADA
68	CRA 21 B este desde CLL 61 hasta CLL 50	ENTREGADA
69	CRA 33 A este hasta CLL 44	ENTREGADA
70	CRA 33 este hasta CLL 44	ENTREGADA
71	CRA 27 B este CLL 59	ENTREGADA
72	CRA 21A ESTE ENTRE CALLE 59 -77C BTA	ENTREGADA
73	CRA 19 ENTRE CALLE 49 -50	INTERVENIDA

Fuente: COCOSERIN SAS

4. DATOS DE LOS CONTRATOS

Tabla 2 Datos del contratista de obra

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
PRORROGA N° 1	01 FEBRERO DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	4 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN N° 1	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($ 2.252.614.494,00)
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.759.182.392,67) M/CTE
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 649.376.068
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 727.213.483
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	$ 1.003.532.431
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$ 451.030.329,00

VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$ 666.543.027,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	$ 484.672.910,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 7	$ 520.537.357,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 4.502.905.662,00
VALOR POR COBRAR	$ 2.256.276.730,67

Fuente: COCOSERIN SAS

Tabla 3 Datos de la Interventoría

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**COCOSERING SAS.**
NO. CONVENIO	3443-2021
NO. CONTRATO	025 DE 2022
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 900104779-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 79.782.553. de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	17 DE MAYO 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N° 1	01 FEBRERO DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	5 MESES
PRORROGA N° 2	30 DE JUNIO DEL 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	4 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($223.888.395) M/CTE
VALOR ADICIÓN N° 1	CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS $ (112.630.724,7.).
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($336.519119.70) M/CTE.
VALOR PAGO N° 1	$ 32.262.317,00
VALOR PAGO N° 2	$ 36.135.586,00
VALOR PAGO N° 3	$ 49.859.945,57
VALOR PAGO N° 4	$ 22.406.750,57
VALOR PAGO N° 5	$ 33.113.093.62
VALOR PAGO N° 6	$ 24.090.391,30
VALOR PAGO N° 7	$ 25.911.972.25
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 223.780.055,25

Fuente: COCOSERING SAS

5. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS

Para el periodo del 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio de 2023, se encuentran con las siguientes pólizas del contrato de obra 024 de 2022 y el contrato de interventoría 025 de 2022, aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua.

Tabla 4 Pólizas Contrato Interventoría 025 de 2022.

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008851	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/05/2022	17/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$200.000.000,00	17/05/2022	17/11/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 0 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	$134.333.037,00	17/05/2022	18/05/2022
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$44.777.679,00	17/05/2022	17/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$22.388.839,50	17/05/2022	17/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$67.166.518,50	17/11/2022	17/05/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 1 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/11/2022	31/01/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$200.000.000,00	17/11/2022	31/01/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 2 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	$134.333.037,00	05/08/2022	05/08/2022
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$44.777.679,00	01/08/2022	31/07/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$22.388.839,50	01/08/2022	31/01/2026
	Estabilidad de la obra.		$67.166.518,50	17/11/2022	31/01/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	17/06/2023	30/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$200.000.000,00	17/06/2023	30/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	$134.333.037,00	01/08/2022	17/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$44.777.679,00	01/08/2022	17/12/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$22.388.839,50	01/08/2022	17/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$67.166.518,50	17/11/2022	17/06/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	200.000.000,00	31/01/2023	30/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$200.000.000,00	31/01/2023	30/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	$134.333.037,00	01/08/2022	30/06/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$44.777.679,00	01/08/2022	30/12/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$22.388.839,50	01/08/2022	30/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$67.166.518,50	17/11/2022	30/06/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-74-99400008859	Aseguradora solidaria de Colombia	232.000.000.00	30/06/2023	30/10/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$232.000.000.00	30/06/2023	30/10/2023

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 7 (Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	980-47-994000021414	Aseguradora solidaria de Colombia	$201.911.471.40	01/08/2022	31/10/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$67.303.823.94	01/08/2022	30/04/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$33.651.911.99	01/08/2022	31/10/2026
	Calidad del servicio.		$100.955.735.94	17/11/2022	31/10/2028

Fuente: Cocosering SAS

Tabla 5 Pólizas Contrato de Obra 024 de 2022

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Cocosering SAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Cocosering SAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

Fuente: Cocosering SAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Cocosering SAS

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual) Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023

Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101023833	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,20	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 1 Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$4.055.509.435,60	01/06/2023	01/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$1.351.836.478,53	01/06/2023	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$675.918.239,27	01/06/2023	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$2.027.754.717,80	01/11/2023	01/11/2028

6. ADMINISTRATIVO

Mediante este informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, Lo cual se da cabalidad para la entidad contratante que es la alcaldía de Soacha, en el cual el contratista CONSORCIO GAMER SOACHA da exactitud a lo estipulado y la interventoría COCOSERING SAS realiza la inspección diaria al contratista.

6.1 AREA ADMINISTRATIVA

El contrato de interventoría 025 de 2022 fue adjudicado el 17 de mayo de 2022 y tuvo acta de inicio el día 01 de Agosto de 2022 mediante acta de iniciación del proyecto.

6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta la invitación a preseleccionados de OC 013-2022, se relaciona a continuación el personal administrativo del proyecto durante cada mes de ejecución.

Tabla 6 Personal Administrativo Interventoría

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 025 DE 2022 COCOSERING S.A.S.			
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
EDGAR EDUARDO URIBE CARDENAS.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	40 %	Interxua0252022@ gmail.com
SANDRA LORENA CIFUENTES FUENTES.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100 %	Interxua0252022@ gmail.com
CARLOS REINALDO CONTRERAS CORTES	INSPECTOR DE OBRA	100 %	Interxua0252022@ gmail.com
ALBERTO RIVERA	MAESTRO	100 %	Interxua0252022@ gmail.com
GUSTAVO MARTIN	MAESTRO	100 %	Interxua0252022@ gmail.com
Olga Stella Céspedes Soto	PROFESIONAL SISO	100 %	Interxua0252022@ gmail.com

Fuente: Cocosering SAS

Tabla 7 Personal administrativo CONSORCIO GAMER SOACHA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	30 %	consorciogamer024@gmail.com
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

Fuente: Cocosering SAS

6.3 ACTA DE INICIO

El contrato de interventoría 025 de 2022 fue suscrito en el municipio de Soacha el día 17 de Mayo del 2022 en las instalaciones de la EPUXUA, se reunieron DARLIN LENIS ESPITIA en calidad de gerente y representante la empresa pública del municipio de Soacha, Epuxua avanza; por parte del COCOSERING SAS, identificado con el NIT 900104779-0 el representante legal JOSÉ JOAQUÍN CONTRERAS CORTÉS, con C.C. 79.782.553. de Bogotá y de esta forma iniciar la ejecución del contrato.

De esta forma se inician las obras por parte del municipio de Soacha con el contrato de obra 024 de 2022 y el contrato de interventoría 025 de 2022, teniendo como acta de inicio el día 01 de Agosto de 2022.

7. FINANCIERO

7.1 PRESUPUESTO CONSORCIO GAMER SOACHA

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CAN	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	1	$ 11 419.00	$ 11 419.00
2	1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	$ 18 397.00	$ 18 397.00
3	1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1	$ 28 043.00	$ 28 043.00
4	1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	$ 46 104.00	$ 46 104.00
5	1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 285 090.00	$ 285 090.00

6	**1.45**	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 10 110.00	$ 10 110.00
7	**4.13**	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$ 160 620.00	$ 160 620.00
8	**16.1**	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMUN	M3	1	$ 6 242.00	$ 6 242.00
9	**16.3**	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	$ 33 159.00	$ 33 159.00
10	**16.4**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 54 134.00	$ 54 134.00
11	**16.5**	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 62 173.00	$ 62 173.00
12	**16.6**	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0	$ 106 162.00	$ -
13	**16.7**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$ 23 110.00	$ 23 110.00
14	**16.8**	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0	$ 70 034.00	$ -
15	**16.9**	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$ 68 748.00	$ 68 748.00
16	**16.1**	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	0	$ 169 782.00	$ -
17	**16.11**	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 64 443.00	$ 64 443.00

18	**16.12**	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 143 715.00	$ 143 715.00
19	**16.13**	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$ 164 131.00	$ 164 131.00
20	**3.22**	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1	$ 89 046.00	$ 89 046.00
21	**2.1**	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	1	$ 12 930.00	$ 12 930.00
22	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 173 358.00	$ 173 358.00
23	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 60 755.00	$ 60 755.00
24	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 10 724.00	$ 10 724.00
25	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 37 319.00	$ 37 319.00
26	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 9 838.00	$ 9 838.00
27	**220.1**	TERRAPLENES	M3	1	$ 16 634.00	$ 16 634.00
28	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	1	$ 14 575.00	$ 14 575.00
29	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	1	$ 8 398.00	$ 8 398.00
30	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL	M2	1	$ 538.00	$ 538.00

		SUELO EXISTENTE				
31	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	1	$ 14 340.00	$ 14 340.00
32	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 23 279.00	$ 23 279.00
33	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 69 968.00	$ 69 968.00
34	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 86 694.00	$ 86 694.00
35	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 21 165.00	$ 21 165.00
36	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 34 893.00	$ 34 893.00
37	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	1	$ 595 230.00	$ 5 230.00
38	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	1	$ 710 725.00	$ 710 725.00
39	**640.1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1	$ 7 832.00	$ 7 832.00
40	**671.1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	M3	1	$ 478 443.00	$ 478 443.00

		FUNDIDA EN EL LUGAR				
41	**630.6**	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1	$ 377 439.00	$ 377 439.00
42	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	$ 387 723.00	$ 387 723.00
43	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 396 324.00	$ 396 324.00
44	**630 P**	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	$ 402 949.00	$ 402 949.00
45	**630 P**	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 411 550.00	$ 411 550.00
46	**681.1**	GAVIÓN	M3	1	$ 191 010.00	$ 91 010.00
47	**681.1**	GAVIÓN MALLA PVC	M3	1	$ 195 311.00	$ 195 311.00
48	**672.1**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	1	$ 46 667.00	$ 46 667.00
49	**4.4**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	$ 7 922.00	$ 7 922.00
50	**311.1**	AFIRMADO	M3	1	$ 64 443.00	$ 64 443.00
51	***	AFIRMADO (EQUIPOS MENORES)	M3	1	$ 52 770.00	$ 52 770.00
52	****	AFIRMADO MANUAL	M3	1	$ 80 625.00	$ 80 625.00
53	**2.7**	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 687 261.00	$ 687 261.00
54	**5.1**	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	m2	1	$ 80 087.00	$ 80 087.00

Fuente: Cocosering SAS

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Para el presente periodo del 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio de 2023, se continúan con las mismas actividades no previstas ya aprobadas.

NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1	$	3 825.00	$	3 825.00
NP 2	MORTERO 1:4	M3	1	$	475 586.00	$	475 586.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO DE B=20CM, H=35CM (A-80).	UN	1	$	72 370.00	$	72 370.00
NP4	CONCRETOS CLASE D, F´C =3500 PSI (BASES)	M3	1	$	597 667.70	$	597 667.70
NP 5	CONCRETOS CLASE D, F´C =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	1	$	713 258.00	$	713 258.00
NP 6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 E=15 CM	KG	1	$	9 986.00	$	9 986.00
NP 7	CAJA INSECCION 60*60	UN	1	$	285 348.00	$	285 348.00
NP 8	REPARACION ACOMETIDA	UN	1	$	74 291.00	$	74 291.00
NP 9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/K	1	$	1 444.00	$	1 444.00
NP 10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$	250. 235	$	250. 235.00
NP 11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$	759.999	$	759.999.00
NP 12	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	1	$	33.539	$	33.539.00

Fuente: Cocosering SAS

7.2 ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022

Que el presupuesto oficial inicial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.759.182.392,67) M/CTE M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO, se resalta que dentro de la minuta del contrato de obra 024 de 2022 el contrato no cuenta con anticipo y/o pago anticipado.

Tabla 8 avance financiero Contrato de Obra

AVANCE FINANCIERO	
Valor total del contrato de Obra	$ 6.759.182.392,67
Acta pagada No. 1	$649.376.068,00
Acta pagada No. 2	$ 727.213.483
Acta pagada No. 3	$ 1.003.532.431
Acta Pagada No.4	$451.030.329,00
Acta Pagada No.5	$ 666.543.027,00
Acta Pagada No.6	$ 484.672.910,00
Acta Pagada No.7	$520.537.357.00
Acta por Pagar No.8	$ 528.988.355.00
Valor total Pagado	$ 5.031.894.015
Saldo Actual	$ 1.727.288.377.67

Fuente: Cocosering SAS

7.3. ÁREA FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DE 2022.

Que el presupuesto oficial inicial destinado para el presente proceso de contratación de Interventoría corresponde a la suma de TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($336.519119.70) M/CTE.

Tabla 9 avance financiero Contrato de Interventoría 025 de 2022.

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE INTERVENTORIA	
Valor total del contrato de Interventoria	$ 336.519.119.70
Acta pagada No. 1	$ 32.262.317,00
Acta pagada No. 2	$ 36.135.586,00
Acta pagada No. 3	$ 49.859.945,57
Acta pagada No. 4	$ 22.406.750,57
Acta pagada No. 5	$ 33.113.093.62
Acta pagada No. 6	$ 24.090.391,30
Acta pagada No. 7	$25.911.972.25
Valor total Pagado	$ 223.780.055.025
Saldo Actual	$ 112.052.537,25

Fuente: Cocosering SAS

7.4. PAGOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATO DE OBRA

Al presente periodo se ha registrado el pago No 1,2,3,4,5,6 y pago No 7 para el contrato de interventoria y para el Contrato de obra.

8. AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONSORCIO GAMER SOACHA.

El contratista encargado del Contrato No. 024 de 2022 a cargo de CONSORCIO GAMER SOACHA presenta a la fecha la terminación de Cintas en concreto en las cuadras:

RAMPA EN CONCRETO TERMINACION DE LA VIA CALLE 50 CRA 32A ESTE Y 31, CINTAS EN CONCRETO CRA 24 ENTRE 59-61.

8.1 ACTAS DE COMITÉ

En el periodo comprendido entre el 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio. Se realizó las siguientes actas de comité ver en el Anexo actas de Comité de Obra.

Tabla 9 Actas de comité

COMITÉ N.	FECHA
36	29/06/2023
37	05/07/2023
38	07/07/2023
39	13/07/2023
40	27/07/2023
41	27/07/2023

Fuente: Cocosering SAS

8.2 OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

A La fecha la interventoría ha realizado los siguientes oficios para EPUXUA y al contratista de obra CONSORCIO GAMER SOACHA con contrato de obra 024 de 2022 en el cual se han enviado respuestas a la interventoría COCOSERING SAS en el periodo comprendido entre 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio.

Tabla 10 Correspondencia Enviada

No CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	04-07-2023	EPUXUA	POLIZAS PRORROGA N° 2 YADICION N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DEL 2022
CORREO ELECTRONICO	04-07-2023	EPUXUA	NPS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 024 DEL 2022 PARA LA INTERVENCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL COMUNA 5 - VIA CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60
CORREO ELECTRONICO	11-07-2023	EPUXUA	REMITO LA TOPOGRAFÍA DE LA CRA 2 ENTRE CALLE 56 Y 60 LEVANTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA
CORREO ELECTRONICO	17-07-2023	EPUXUA	ENTREGA INFORME MENSUAL 10 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DEL 2022.
CORREO ELECTRONICO	17-07-2023	EPUXUA	ENTREGA INFORME MENSUAL 11 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DEL 2022.
CORREO ELECTRONICO	18-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	DISEÑO GEOMETRICO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CRA 2 ENTRE CLL 56 Y CLL 60
CORREO ELECTRONICO	21-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	AJUSTE ÍTEM NP 10 NO APROBADO
CORREO ELECTRONICO	27-07-2023	EPUXUA	TRASLADO DEL INFORME DE OBSERVACIONES A LA TOPOGRAFIA DE LA CRA 2 CON CLL 56Y CLL 60
CORREO ELECTRONICO	31-07-2023	EPUXUA	PLANO DE DISEÑO HORIZONTAL

Fuente: Cocosering SAS

Tabla 11 Correspondencia Recibida

CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CORREO ELECTRONICO	06- 07- 2022	COCOSERING SAS	CONCEPTO TRAMO DE LA VÍA CALLE 43F CON CARRERA 27B LUIS C. GALAN.	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	10- 07- 2022	COCOSERING SAS	APROBACION POLIZAS PRORROGA N° 2 YADICION N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DEL 2022	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	10- 07- 2022	COCOSERING SAS	SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	17- 07- 2022	COCOSERING SAS	INFORME REPLANTE DE VIA CRA 2	CONSORCIO GAMER SOACHA
CORREO ELECTRONICO	17- 07- 2022	COCOSERING SAS	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 11 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025 DEL 2022.	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	18- 07- 2022	COCOSERING SAS	PRORROGAS Y ADICIONES CTO 024 CTO 025	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	18- 07- 2022	COCOSERING SAS	DISEÑO GEOMETRICO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CRA 2 ENTRE CLL 56 Y CLL 60	EPUXUA
CORREO ELECTRONICO	18- 07- 2022	COCOSERING SAS	VÍA ZONA INDUSTRIAL ,INICIO DE ACTIVIDADES	EPUXUA

CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CORREO ELECTRONICO		COCOSERING SAS		
CORREO ELECTRONICO	18- 07- 2022	COCOSERING SAS	PLANO DE DISEÑO HORIZONTAL	EPUXUA

Fuente: Cocosering SAS

8.3 ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS

Durante este periodo no se entregaron topografía de vías. La topografía ha sido tomada por el contratista de Obra.

8.4 VÍAS COMUNA 4- BARRIO LUIS CARLOS GALAN II- BARRIO LUIS CARLOS GALAN I, VILLAS DE CASA LOMA.

Actividades de obra:

- **LOCALIZACION Y REPLANTEO**: CALLE 50 CON CRA 31 Y 32 A ESTE, CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.
- **INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR**: CALLE 50 CON CRA 31, CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.
- **RENIVELACION DE SUB BASE GRANULAR:** AFECTACION POR LLUVIAS CRA 24 ENTRE 59-61, CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B, CRA 19 CON CALL 50-49, CALLE 50 CRA 17- 21, CRA 27 ESTE CALLE 43D.
- **EXCAVACIÓN MANUAL**: CALLE 55 CON CRA 26, CRA 24 ENTRE 59-61, CRA 27B CALLE 43F -44, CRA 50 ENTRE 17-21, VIA LOS MICOS, CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.
- **EXCAVACIÓN ROCA**: CALLE 50 CON CRA 31 Y 32 A ESTE, CRA 50 ENTRE 17-21, CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B.
- **EXCAVACIÓN MAQUINA:** CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.
- **INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR:** CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.

- **INSTALACION DE RAJON:** CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.

- **MEJORAMIENTO DE SUBRRASANTE**: CALLE 50 CON CRA 31 Y 32 A ESTE **Y** CRA 2 ENTRE CALLE 56-60 VIA INDUSTRIALES.

- **FUNDIDA DE CINTAS EN CONCRETO:** SE REALIZÓ FUNDIDA DE CINTAS DE 60 CMS EN LAS SIGUIENTES VÍAS: CRA 24 ENTRE 59-61.

- **FUNDIDA DE CUNETAS:** CALLE 50 CRA 32A -31, CRA 24 ENTRE 59-61.

- **MUROS CICLOPEOS:** CALLE 50 CRA 17- 21, CRA 27B CALLE 43F -44, CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B.

- **GABIONES:** CALLE 50 CRA 32A -31.

- **MORTERO SELLO E INSTALACION ADOQUIN:** CALLE 50 CRA 17- 21, CRA 19 CON CALL 50-49, CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B, CRA 27B CALLE 43F -44, CRA 24 ENTRE 59-61, CALLE 50 CRA 32A-31.

- **INSTALACION DE BORDILLO:** CALLE 55 CON CRA 26, CALL 56B ENTRE 26 CRA 26A, CRA 27 D CALLE 50 -51, CRA 27D CALLE 44 -CLL 50, CRA 22B CON CALLE 43C - 43F, CRA 26 ENTRE 57-59, CALLE 25 CALLE 57-59, CRA 27 ESTE CALLE 43D, CALLE 58 CON CRA 26.

- **INSTALACION DE SARDINEL:** CALLE 50 CRA 32A -31, CALLE 50 CRA 17- 21, CRA 19 CON CALL 50-49, CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B, CRA 24 ENTRE 59-61, VIA LOS MICOS.

- **NIVELACION DE CAJAS:** CALLE 55 CON CRA 26.

- **ALZADO DE POZOS DE INSPECCION**: CRA 27 B CALLE 43C 43F, CRA 50 ENTRE 17-21.


- **REPARACION DE ACOMETIDAS**: CALLE 50 CRA 32A-31, CRA 27 B CON CALLE 43C - 43F.

- Se realizó en trasporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha.

8.5 CRONOGRAMA.

Se han realizado las intervenciones de las vías que ha venido entregando la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se especifica que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras requeridas en la Comuna 4 y ordenadas por la entidad. A la fecha se cuenta con un Cronograma por Barrios presentado por el contratista de Obra, el cual se evidencia dentro de los anexos del presente Informe.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

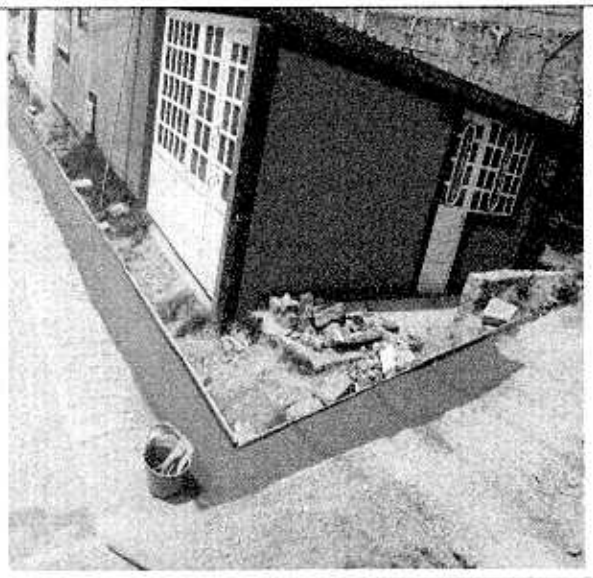





Fundida de Cunetas CRA 27 B CALLE 43C 43F






Reinstalación sardinel CRA 27 B CALLE 43C 43F

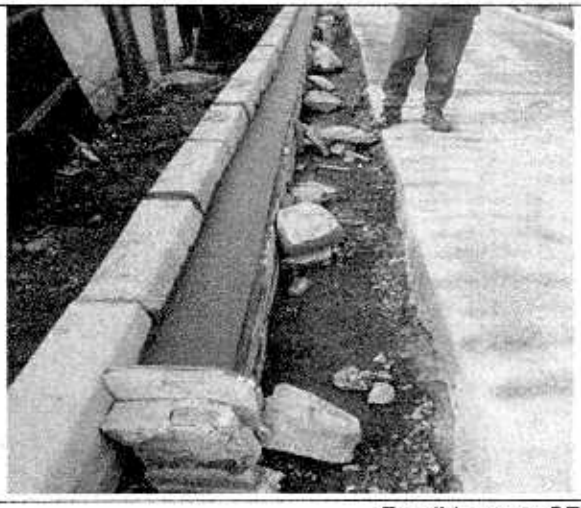


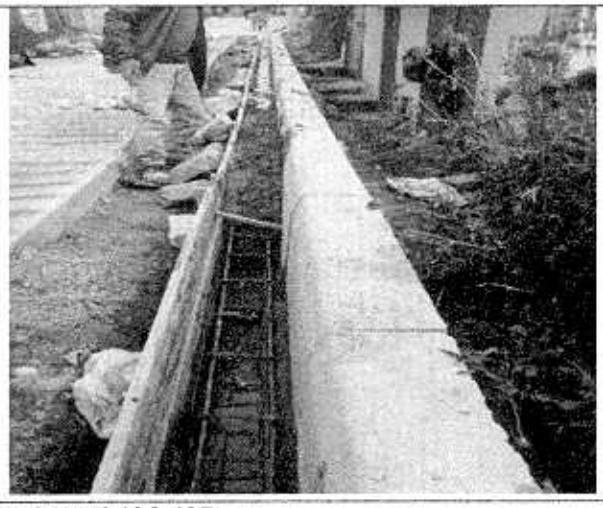


Fundida muro CRA 27 B CALLE 43C 43F

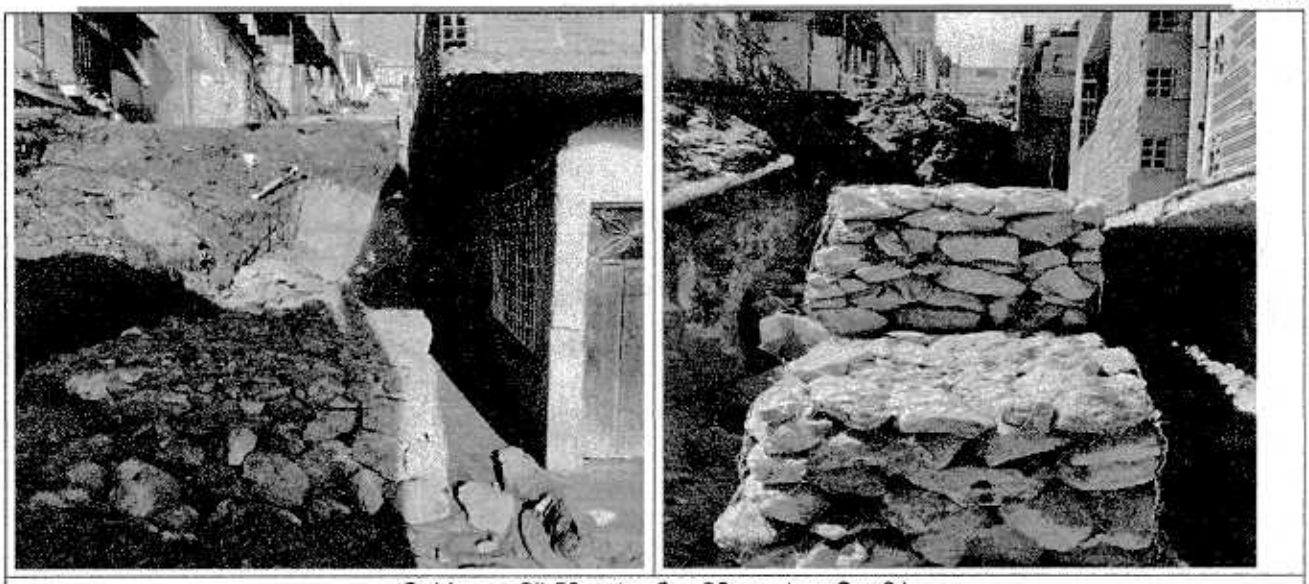


Gabiones Cll 50 entre Cra 32 a este y Cra 31

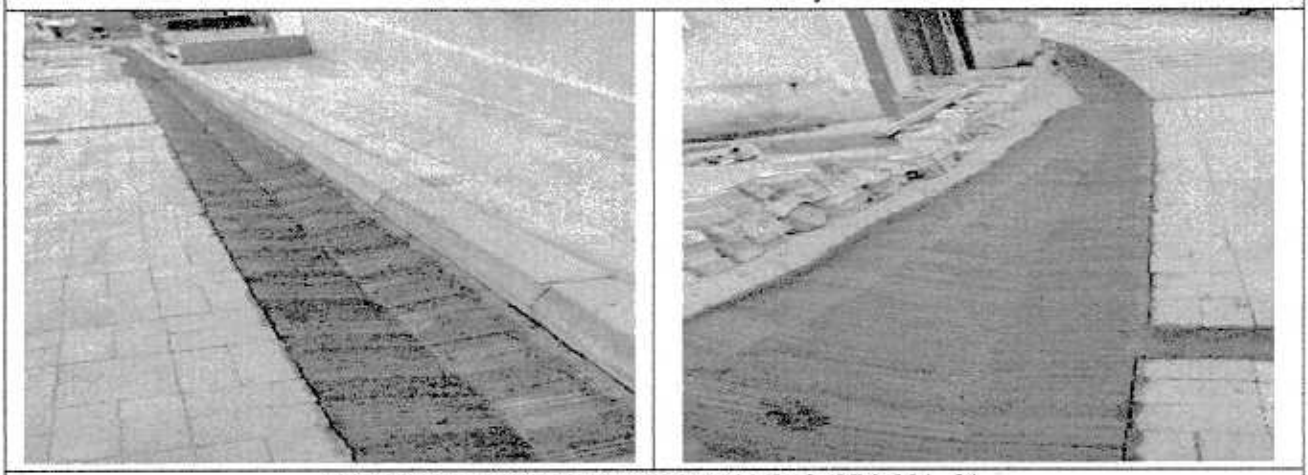

Fundida de cunetas en concreto CALLE 50 CRA 32A -31

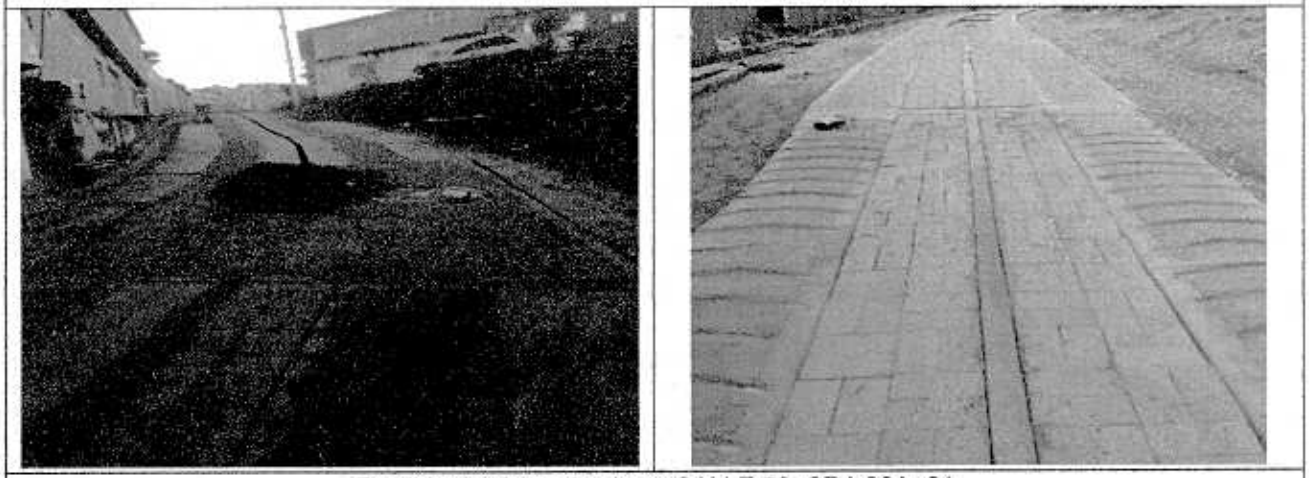



Fundida de cintas de ajuste CALLE 50 CRA 32A -31

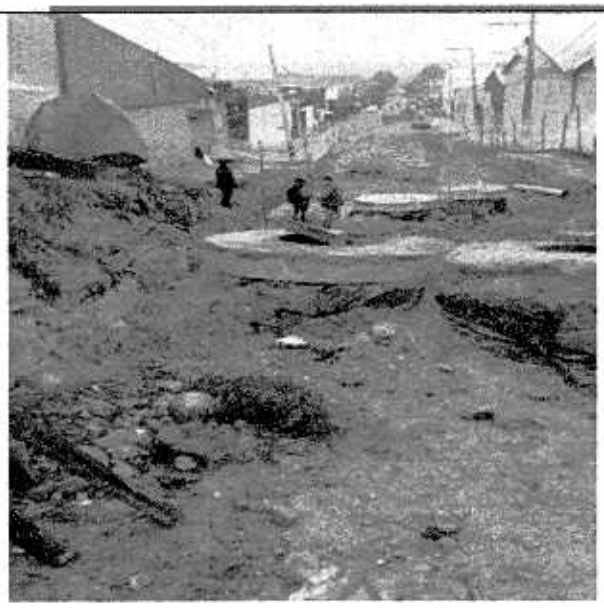



Excavaciones cra 2 entre 56 y 60 via industriales

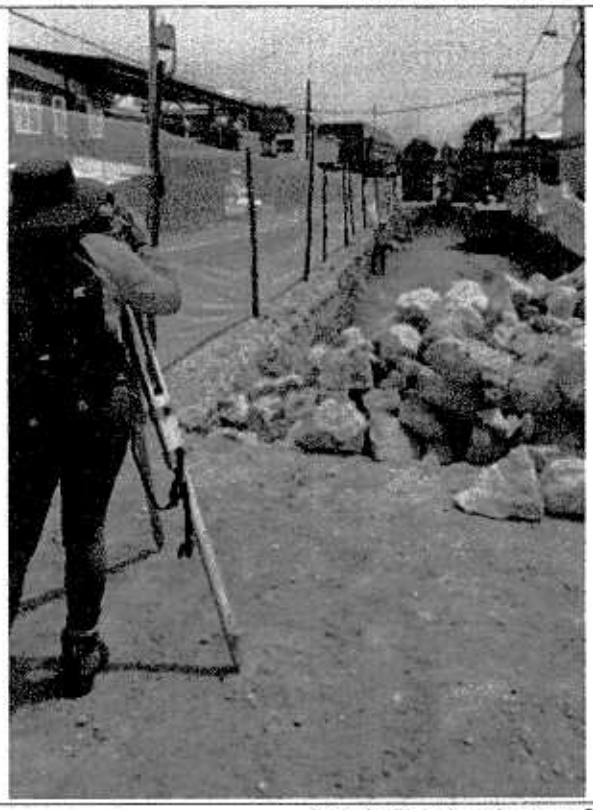

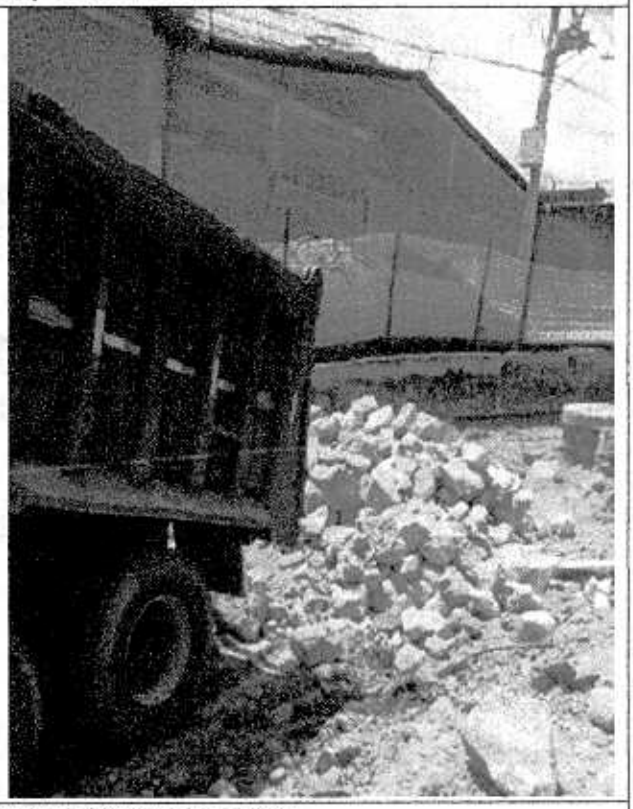

Instalacion de rajon cra 2 entre 56 y 60 via industriales

10. CALIDAD DE MATERIALES

El contratista hace entrega de los certificados de calidad y Laboratorios realizados a los materiales de Sub base, Concretos de 3000 psi, Aceros, Bordillo prefabricado, Adoquín. Estos certificados se pueden observar en el Anexo Certificados de Calidad de Materiales.

11. ACCIONES DE EMERGENCIA

En el presente periodo que comprende del 28 de Junio de 2023 al 31 de Julio, NO se presentaron acciones de emergencia.

12. CONCLUSIONES

- Se realiza el seguimiento a cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Se requiere de una topografía constante tanto de la entidad como del contratista de obra, ya que se evidencian constantes cambios de terreno.
- Se le solicita al Contratista de obra el aseo constante en los frentes de trabajo.

13. ANEXOS

- Informe Social.
- Pagos de parafiscales.
- Informes semanales.
- Actas de Comité Técnico.

INFORME SOCIAL.

CONTRATO 025 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

EL CAMBIO AVANZA

Alcaldía Municipal de Soacha

XUÁ

GESTION SOCIAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2022



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.-

COCOSERING S.A.S

Julio 2023

TABLA DE CONTENIDO

3. INTRODUCCIÓN 6
4. OBJETIVOS DE GESTIÓN SOCIAL 6
4.1 OBJETIVO GENERAL 6
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
5. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 7
5.1 Componente Identificación Territorial 10
5.2 Componente de Comunicación, información y acompañamiento social 10
5.3 Componente de Mano de obra no calificada 11
5.4 Componente de Seguimiento y Evaluación 11
CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

El Contrato de Consultoría Interventoría 025-2022 cuyo objeto es " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA FINANCIERA, CONTABLE SOCIAL y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDIAMARCA, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UITARIOS FIOS,SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE- DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 presenta en este informe de manera consolidada las actividades, procedimientos y acciones realizadas para asegurar controlar, y vigilar el cumplimiento y desarrollo idóneo del contrato 024 2022 en el ámbito de Gestión Social, de acuerdo a lo establecido contractualmente.

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN SOCIAL

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las labores de la Interventoría Social realizadas durante el periodo 1 a 31 de julio 2023, con el fin de verificar y garantizar que los procesos desarrollados por el Contratista, se hayan realizado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y documento de caracterización =C 011-2022

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar que a través del seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación realizada por la Interventoría, la labor desarrollada por el Contratista, en la ejecución de las actividades sociales se ajustaron a los requerimientos contractuales.

- Informar al el alcance y las dificultades que surgieron en el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social que ejecuto el Contratista.

3. PROGRAMAS PLAN DE GESTION SOCIAL

3.1Componente Identidad Territorial

El área de intervención se encuentra localizada en la Comuna 4 del Casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca "Cazuca".

"Es la cuarta de las 6 comunas del casco urbano de este municipio, localizado al extremo oriente de la ciudad de Bogotá. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazuca del que comparte su territorio con la UPZ 69 Ismael Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar Tiene 72.800 habitantes.
Gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá). Depende únicamente del transporte urbano de Soacha, así como de las rutas del sur de Bogotá en el límite oriental (SITP Ruta SITP 10 - 10 Cazuca - Portal Sur) y se espera la construcción del sistema de transporte de cable aéreo conocido como Cazucable, que uniría esta comuna y el barrio Quintanares de su vecina, la Comuna 5 de San Mateo, finalizando en la estación Transmilenio de Terreros." 1

Límites:

Noroeste: Comuna 5 de San Mateo (Transversal 9 Este)	*Norte:* Comuna 5 de San Mateo <Carrera 1 y 2 y Calle 55)	*Noreste:* Localidad de Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. (barrio Tres Reyes)
Oeste: Comuna 5 de San Mateo (barrio Terragrande)		*Este:* Localidad de Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. (barrios El Espino, Santa Viviana y Caracolí)
Suroeste: Corregimiento 1 (Vereda Panamá)	*Sur:* Corregimiento 1 (Vereda Panamá)	*Sureste:* Localidad de Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. (Vereda Quiba Baja)





Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

"Cazuca es una zona de extrema vulnerabilidad social, es una zona de mezcla de Pobreza, desempleo, desplazamiento forzado, violencia. Pandillas, degradación ambiental, informalidad urbana. Es una de las Comunas del municipio con mayor déficit de infraestructura vial. Razón por la cual la administración municipal dentro del marco de su plan de desarrollo municipal "el CAMBIO AVANZA" incluyo el programa MALLA VIAL EFICIENTE Programa tiene como objetivo transformar la infraestructura de Soacha a partir de procesos de articulación y fortalecimiento de vías, facilitación del fluido de transporte masivo y de carga y mejoramiento de movilización de los habitantes dentro y fuera del municipio y así mejorar la calidad de vida a la población de este sector. Las vías de esta comuna intervenidas y finalizadas son:

NUM_CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 59 -58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CALLE 49 CRA 19 E -17	INTERVENIDA
4	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
5	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
6	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
7	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
9	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA

10	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 CESTE	INTERVENIDA
11	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
12	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
13	CRA 26 ESTE ENTRE CSLL 58-59	INTERVENIDA
14	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
15	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
16	CALLE58 ENTRE 26A ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
17	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
18	CRA 19 ESTE CON 49-50	INTERVENIDA
19	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 39 A SUR (VIA CURA)	INTERVENIDA
20	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
21	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA
22	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 27D ESTE CON CALLE 44 -50	INTERVENIDA
24	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
25	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
26	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
27	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
28	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
29	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
30	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
31	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
32	CALLE 56 A CRA 26-27	INTERVENIDA
33	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA
34	CALLE 56B CRA 27 ESTE -CRA 27AESTE	INTERVENIDA
35	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
36	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
37	CALLE 43 BIS ETRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
38	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
39	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
40	CARRERA 32 A-CLL 44-59	FINALIZADA
41	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
42	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
43	CRA 37 ESTE DG 43J-DG.45	FINALIZADA
44	CALLE 50 CRA 32 A CRA 31	FINALIZADA
45	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
46	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43J	FINALIZADA
47	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
48	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA

49	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
50	CRA 28 ESTE CL 56A CL-59	FINALIZADA
51	CALLE 53 30-29	FINALIZADA
52	CRA 30 ESTE-CLL53 - CLLE 44	FINALIZADA
53	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
54	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
55	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
56	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
57	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 D Y 43F	FINALIZADA
58	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
59	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
60	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA
61	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
62	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
63	CRA 17 B ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
64	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
65	CRA 17 A ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
66	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
67	CRA 26 C este CLL 59	ENTREGADA
68	CRA 21 B este desde CLL 61 hasta CLL 50	ENTREGADA
69	CRA 33 A este hasta CLL 44	ENTREGADA
70	CRA 33 este hasta CLL 44	ENTREGADA
71	CRA 27 B este CLL 59	ENTREGADA
72	CRA 21A ESTE ENTRE CALLE 59 -77C BTA	ENTREGADA
73	CRA 19 ENTRE CALLE 49 -50	INTERVENIDA

Fuente: COCOSERIN SAS

3.1. Seguimiento y acompañamiento social


Durante el periodo 1 al 31 de julio 2023 la interventoria Social realizo seguimiento a las reclamaciones de la comunidad realizadas en el periodo anterior las cuales se describen a continuación:

La consulta ciudadana interpuesta por el señor Moisés Robayo el día 16 de junio de 2023, quedo en este periodo 1 a 31 julio 2023 en **estado cerrada**, ya que el contratista acepto la afectación del vidrio ubicado en la Calle 54S 88G 07 y autorizo su reposición

CONSULTAS CIUDADANAS


ATENCIONES CIUDADANAS CONTRATO COCOSERING SAS 025 -2022				
ITEM	N° REQUERIMIENTO	01	TELEFONO	313 4755843
	FECHA DE APERTURA	16/06/2023	CANAL	Telefónico
	FECHA DE CIERRE			
	NOMBRE	Moisés Robayo	TIPO DE REQUERIMIENTO	Solicitud
01	DIRECCION	Tv 34 este 44ª 50 sur	ESTADO	CERRADO
REQUERIMIENTO			SEGUIMIENTO	
El señor Moisés Robayo, solicita vía telefónica al área social de interventoría que el Contrato GAMMER 024 le reponga un vidrio del predio ubicado en la dirección Tv 34 este 44 A 50sur. ya que durante el tiempo que el Contratista ocupo este predio como bodega para guardar material, se venció este vidrio.			El Componente Social del Contrato de interventoría Cocosering SAS, realiza visita el día 23 de junio y revisa acta de vecindad levantada antes de inicio de obra con el fin de verificar la responsabilidad del Consorcio Gamer 024. Se verifica el predio contra acta de vecindad y se encuentra que hay un vidrio vencido, el cual el contratista debe reponer. El área social de interventoría realiza visita el día 21 de julio 2023 para verificar con el señor Moisés Robayo la reposición del vidrio. Quedando cerrada este requerimiento.		

Así mismo el día 21 de julio el área social de interventoría realizo recorrido de obra con el presidente de Santo Domingo señor Moisés Robayo, por la obra que el Consorcio Gamer 024 esta interviniendo en ese sector se está interviniendo en ese sector.

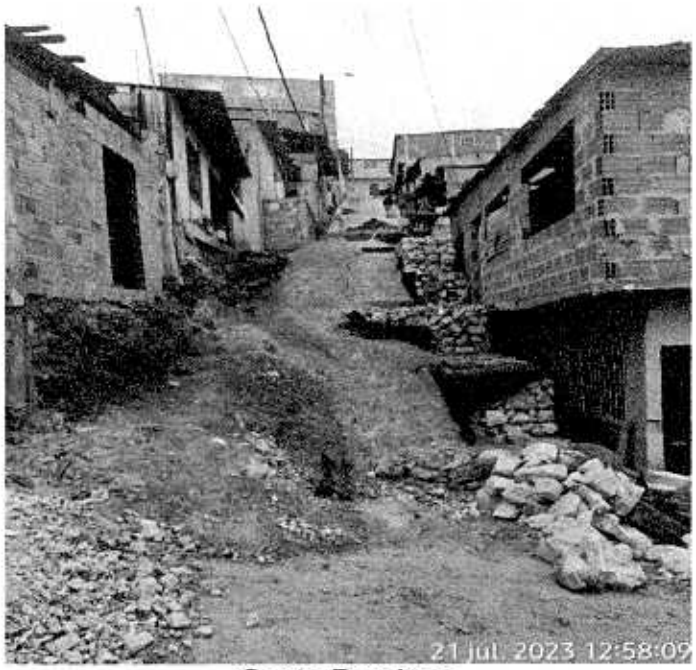

Santo Domingo

Igualmente se realizó recorrido de obra por el sector Luis Carlos Galán II.

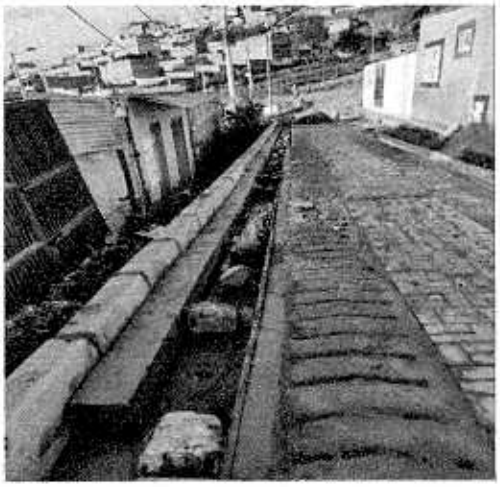










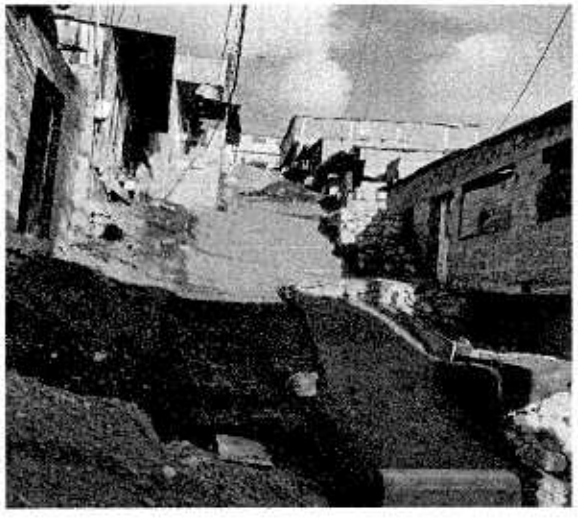

Se realizó contacto con la señora María Quintero y María Vargas líderes del sector, Luis Carlos Galán II, quienes informan que acerca del contrato ejecutado por el Consorcio Gamer 024, el contrato presenta disminución de personal desde hace más de un mes y por ende se ha notado retraso en algunas terminaciones de obra,

El día 28 de Julio la Interventoría social de Cocosering SAS se reúne presencialmente con la social nombrada por la Alcaldía de Soacha señora Ligia Pedraza para programar las actividades sociales que el contrato contempla dentro del Plan de Gestión social para este Contrato.

Así mismo hace entrega de 15 actas de vecindad levantadas en la carrera 2 con calle 56 zona industrial cazuca, para revisión. Estas actas corresponden a 15 bodegas

Igualmente se programó recorrido por este sector para el día 4 de agosto con el fin de tener contacto con la comunidad de este sector y programar para el 14 de agosto un comité de veeduría con el fin de entablar comunicación y propender por el sentido de pertenencia de esta comunidad.



3.2. Componente Mano de obra en la zona

La interventoría durante el presente periodo verifico el cumplimiento por parte del contratista de contratar mano de obra no calificada de la zona donde se interviene

El contrato. Para este periodo la contratación de MONC fue de veinte (20) personas, residentes en el Área de Influencia del Contrato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría realizo seguimiento algunas de las actividades realizadas por el contratista en este periodo como fue el requerimiento ciudadano recibido en el mes de junio 2023. El cual se pudo verificar que se puede pasar a estado cerrado.

Así mismo la interventoría social con el área social de la Alcaldía, iniciaran la realización de varias actividades contempladas dentro del Plan de Gestión Social para este Contrato entre las cuales se programa el comité de veeduría con la zona industrial de Cazuca para el mes de agosto.

Pagos de parafiscales

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901587366-6	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369483	gamersoachamfit@gmail.com	
A ACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69487786	$10.153.200	

ALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0		0		0	3	1.200	0	321.200	6
Sanitas EPS	800251440-6	488.800	0		0		0	3	1.700	0	490.500	5
EPS Sura	800088702-2	154.800	0		0		0	3	600	0	155.400	3
Famisanar EPS	830003564-7	103.700	0		0		0	3	400	0	104.100	3
Nueva EPS	900156264-2	74.400	0		0		0	3	300	0	74.700	1
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	112.400	0		0		0	3	400	0	112.800	2
Recaudo SGP Cajhal Salud	900298372-6	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.435.200	0	0	25.500	25.500	3	5.000	200	1.491.400	4
Porvenir	800224808-8	3.766.600	0	0	0	0	3	13.000	0	3.779.600	17

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800930790-5	2.264.000				2.264.000	3	7.900	2.271.900			22.640	2.271.900	21

TOTALES CAJAS

CF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	Compensar Caja	860066942-7	1.300.500	3	4.500	1.305.000	21

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901587366-5	CONSORCIO CAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	camersoachamfd@gmail.com	
A CIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69497766	$10.153.200	

TOTALES PARAFISCALES

te	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
	0	0	0	0
		ICBF		
	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.300.500	1.305.300
Pensión	2	5.252.500	5.271.000
Riesgos Laborales	1	2.264.000	2.271.900
CCF	1	1.300.500	1.305.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.117.800	10.153.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901587366-5	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158366403	gamersoachamhh@gmail.com	
A CIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69497766	$10.153.200	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Dominicano	IGE	IRP	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
DIAZ SANCHEZ JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
ANDRADE JOHN FREDY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
RIVERA RINCON NUBIA CONSUELO	1	0			S																	230301	5.100.000	816.000	0	0	25.500	25.500	EPS005	5.100.000	204.000	14-11	5.100.000	5	356.000	CCF24	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
CAMO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
PINOTTA SOTO CLEOFAS SEGUNDO	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS041	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	5	114.800	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
SALCEDO OLIVARES LUIS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
FLORES FLORES ROBERT DANIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
RIVERA RINCON FANNY EDITH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ASUAJE VIEDMA HECTOR JOSE	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS037	270.667	10.800	14-11	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.800	0	0	0	0	0
ROA VILLADIEGO IGNACIO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
IBARRA PEREZ FREDER DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ORIGUEZ DURAN ALONSO SEGUNDO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
ITANARE MARTINEZ JOSE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
YEPES FUENMAYOR JUAN CARLOS	1	0			S	X																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
DEVIA RAMON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
MORENO TIQUE JOSE YONAY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
MARIN CORDOBA JOHN CAMILO	1	0			S																	230301	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS010	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	5	107.900	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
VERA INFANTE JEAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
UEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS034	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ARCIA MENDOZA IGNACIO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS037	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resultados de Laboratorios

Carrera 3 Número 1 – 53, Barrio Las Acacias, Municipio de San Luis de Palenque, Casanare
Email: cocosering@gmail.com Cel. 312 – 5 86 04 29 y 320 – 3 80 31 17

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos.
Nit - 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No.

480-2-94-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022

SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA

SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA

DESCRIPCION : B400

OSC: 218

TIPO : B400

FECHA DE ENSAYO : 17-Jun-23

FECHA ENTREGA: 18-Jun-23

CAPA: UNICA

Densidad N°		1	2	3	4	5	
Ubicación		CL 50 KR 21	CL 50 KR 21B	KR 19 CL 49	CL 49 KR 17C	KR 27B CL 43D	
Capa		UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	
Profundidad	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Abscisa		CL 50 KR 21	CL 50 KR 21B	KR 19 CL 49	CL 49 KR 17C	KR 27B CL 43D	
Sector		VIA	VIA	VIA	SBG	SBG	
Margen		EJE	EJE	DERECHA	EJE	DERECHA	
Peso frasco y arena inicial	gr	6357	6294	6200	6120	6030	
Peso frasco y arena restante	gr	2303	2582	2688	2456	2292	
Peso arena total usada	gr	4054	3712	3512	3664	3738	
Constante del cono	gr	1636	1636	1636	1636	1636	
Peso arena en el hueco	gr	2418	2076	1876	2028	2102	
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
Volumen del hueco	gr	1778	1526	1379	1491	1546	
Peso material extraído húmedo	gr	3680	3050	2730	2994	3236	
Humedad	%	8,5	8,4	8,5	8,4	8,3	
Peso material extraído seco	gr	3392	2814	2516	2762	2988	
Densidad del material	gr/cm³	1,908	1,843	1,824	1,852	1,933	
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	
Humedad óptima laboratorio	%	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
Compactación en el terreno	%	**99,5**	**96,1**	**95,1**	**96,6**	**100,8**	
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	

OBSERVACIONES:

ELABORO	ERNAN AGUILERA	REVISO	NOEL RICO NAVARRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Informes semanales

Carrera 3 Número 1 – 53, Barrio Las Acacias, Municipio de San Luis de Palenque, Casanare
Email: cocosering@gmail.com Cel. 312 – 5 86 04 29 y 320 – 3 80 31 17

FORMATO			
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	6	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 48 **DEL** 26/06/2023 **AL** 1/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

CONTRATISTA CONSORCIO GAMER SOACHA **NIT** 901.587.366-5

INTERVENTOR COCOSERING SAS **NIT** 900.134.779-0

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 (día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	4506567898,67	Valor Inicial	223886385
Valor Actualizado	4506567898,67	Valor Actualizado	223886385
No. empleos Directos generados	19	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. PERSONAL DESEMPEÑANDO LABORES EN OBRA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Topografos	1
Profesional Siso	1
Inspectores	2
Oficiales	2
Ayudantes	7
Operarios	2
Conductores	2

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Interventoria	1
Residente de interventoria	1
Inspector de interventoria	1
Maestro	2
Profesional social	1
Otros	0

3. ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DESCRIPCION
26/05/2023	Dia Soleado
27/05/2023	Dia Soleado
28/05/2023	Dia Soleado
29/05/2023	Dia Soleado
30/05/2023	Dia Soleado
1/07/2023	Dia Soleado

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 48

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)
NIVELACION DE POZOS
REPARACION ACOMETIDA EN MANGUERA 1/2"
CONCRETOS 3000 PSI BASES (HUELLAS- RIOSTRAS)
INSTALACION DE ADOQUIN (PLACA HUELLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN NO INCLUYE MORTERO (PAÑOS DE ADOQUIN)
CUNETA FUNDIDA IN SITU
INSTALACION DE ADOQUIN

68

FORMATO		
Informe semanal		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 46 **DEL** 26/06/2023 **AL** 1/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.506.557.898,00
VALOR PAGADO	$ 3.982.358.303,00
VALOR TOTAL ACTUAL	$ 524.199.595,00

6. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA

1. El dia 26/06/2023, Se realiza excavacion e instalacion de Bordillo en la CRA 25 CLL59 - CLL57, en la CRA 27B CLL43d, en la CRA 27B CLL43d se realiza la Construcción caja de inspección en ladrillo y empañetada y en la CLL50 CRA17C - CRA21, CLL49 CRA17 se realiza la nivelacion de subbase se evidencian afectaciones en la subbase y en el adoquin instalado por la comunidad esto debido al paso de vehiculos en la via que se está ejecutando. En la Carrera 25 con calle 57 se realiza excavación de instalación de Bordillos para el confinamiento final de la via. Se realiza limpieza y emboquillamiento de la via para su finalización.

2.El dia 27/06/2023, se realiza la construcción de las dos cajas de inspección en la carrera 24 con calle 43F. Para la conexión de las cajas y el vertimiento de aguas, la comunidad realiza la instalación de tuberia de seis pulgadas que vierte sus aguas hacia afuera de la via sin conexión a ningún pozo. Se realiza la instalación de rejillas y fundida de cintas de concreto. En la calle 51 con carrera 27 se realiza la fundida de placa reforzada en la interopción de la via junto con el remate final de las cunetas. Se realiza el confinamiento final de la vida con una riostra de lado a lado.

3. El dia 28/06/2023.se continúa la excavación y fundida de cunetas laterales en la carrera 27 con calle 43F reforzadas con malla en la calle cuenta con carrera 22 se inicia la fundida de cunetas laterales de confinamiento y riostra. En la calle 43 d con carrera 27 se funde rampa de acceso para la conexión de las dos vias. Se realiza limpieza en la via y cargue material de excavación.

4.El dia 29/06/2023, se da inicio a la excavación en la calle 50 con carrera 32 donde se realiza la estabilidad del terreno con gaviones para formar un muro, en la calle 43 con carrera 17 se se realiza nivelación y compactación de subbase para la entrega a la comunidad y que inicien con la instalacion de adoquin. En la calle 50 con carrera 22 se realiza excavación para instalación de sardinel en la curva de las Abscisas 200 esto para darle confinamiento a la via

5.El dia 30/06/2023, se continúa con la excavación en la calle 50 con carrera 31 donde se realiza exclavación Manual en roca debido al poco acceso de la via para la máquina, se realiza la reparación de acometida se continúa con la fundida de conectar lateral en la carrera 27 con calle 43, se realiza recorrido de reconocimiento en la Carrera dos entre calle 56 y 60 via de los industriales para identificar redes de servicios públicos y estación y los puntos en la calle 50 con carrera 21 se continúa con la fundida desconecta lateral y cintas de confinamiento.

6.El dia 01/07/2023, se realiza fundida de cunetas laterales en la calle 50 con carrera 22 reforzadas. Se inicia la instalación de sardinel en la calle 49 con carrera 21 en el inicio de la via en uno de los laterales esto debido a que no se contaba con ningún tipo de confinamiento para la via. En la carrera 27 con calle 43F se inicia la excavación para canal lateral la cual llevara la captación de las aguas de toda la vida se continúa la fundida de cuneta lateral en la calle 50 con carrera 22 junto con las cintas de confinamiento.

8. RECOMENDACIONES Y OTROS

1.Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.


2. Se le solicita al contratista realizar la instalacion de la arena para los patios adoquin.

3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

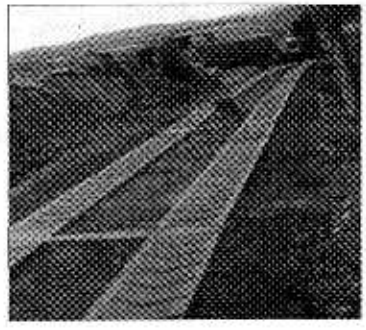

Descripción Foto 2

Cra 30 con Cll 44 la comunidad continua con la instalacion de adoquin (Foto 1 y 2).

69


FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	XUÁ
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	6	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 48 **DEL** 26/06/2023 **AL** 1/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

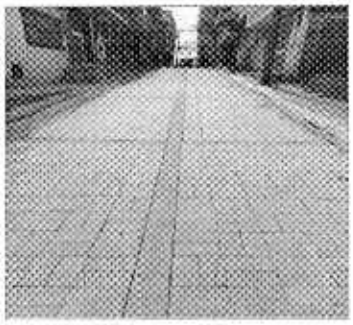

Descripción Foto 3.



Descripción Foto 4.

Fundida de cintas de ajuste y cierre de via Cra25 cll59 (Ver foto 3 y 4).



Descripción Foto 5.



Descripción Foto 6.

Cra27b cll 43d la comunidad ya realizó la instalación de la tubería. (Foto 5 y 6).


FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	XUA
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 48 **DEL** 26/06/2023 **AL** 1/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

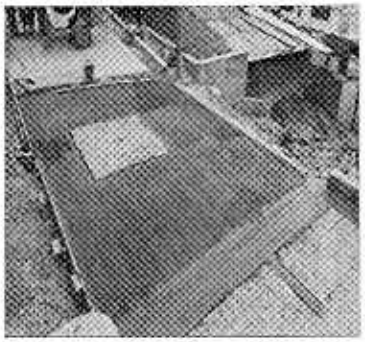

Descripción Foto 7.

Descripción Foto 8.

Cruce de la cl50 con cra27d. (Foto 7).



Descripción Foto 9.



Descripción Foto 10.

Se inicia trabajo en la cl 50 cra 31 (Foto 8 y 9).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoria, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria, en Soacha, a los

PRIMERO (1) días del mes de JULIO de 2023

Firma:

[illegible] EDGAR LEONARDO [illegible] CARDENAS

Director de Interventoria

COCOSERING SAS

FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

XUÁ

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 49 **DEL** 3/07/2023 **AL** 8/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

CONTRATISTA CONSORCIO GAMER SOACHA **NIT** 901.587.366-8

INTERVENTOR COCOSERING SAS **NIT** 900.104.779-0

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (día) DE AGOSTO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (día) DE MAYO (Mes) DE 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	4508567898,67	Valor Inicial	223888395
Valor Actualizado	4508567898,67	Valor Actualizado	223888395
No. empleos Directos generados	19	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. PERSONAL DESEMPEÑANDO LABORES EN OBRA:

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Topografos	1
Profesional Siso	1
Inspectores	2
Oficiales	2
Ayudantes	7
Operarios	2
Conductores	2

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Interventoria	1
Residente de interventoria	1
Inspector de interventoria	1
Maestro	2
Profesional social	1
Otros	0

3. ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DESCRIPCION
3/07/2023	Dia Soleado
4/07/2023	Dia Soleado
5/07/2023	Dia Soleado
6/07/2023	Dia Lluvioso
7/07/2023	Dia Lluvioso
8/07/2023	Dia Soleado

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 49

DESCRIPCION ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)
NIVELACION DE POZOS
REPARACION ACOMETIDA EN MANGUERA 1/2"
CONCRETOS 3000 PSI BASES (HUELLAS- RIOSTRAS)
INSTALACION DE ADOQUIN (PLACA HUELLAS)
SUMINISTRO EINSTALACION DE ADOQUIN NO INCLUYE MORTERO (PAÑOS DE ADOQUIN)
CUNETA FUNDIDA IN SITU
INSTALACION DE ADOQUIN

72

FORMATO Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	XUÁ
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 49 **DEL** 3/07/2023 **AL** 8/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.506.567.688,00
VALOR PAGADO	$ 3.982.368.303,00
VALOR TOTAL ACTUAL	$ 524.199.566,00

6. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA

1. El dia 03/07/2023, Dia festivo

2.El dia 04/07/2023. se evidencian afectaciones en la base en la calle 50 con carrera 22 en la calle 49 con carrera 21 y en la Carrera 21 con calle 49 por las fuertes lluvias, no se ha instalado adoquín por parte de la comunidad por lo cual las bases queda expuesta a las lluvias. Relación y compactación de las mismas en la calle 49 con Carrera 21 se termina la instalación del sardinel para confinamiento lateral y se continúa con la excavación lateral.

3. El dia 05/07/2023. se realizan terminaciones en las vias, siguiendo las observaciones presentadas por la interventoría. Cintas de ajuste confinamiento de adoquin y embotellamiento de Bordillos en la carrera 26C con calle hay cinco. reparación de cuneta de confinamiento en la carrera 26 con calle 53, y reparación de adoquín en la carrera 27d con calle 43d. Emocquillamiento y cintas de concreto en la calle 58 con carrera 26. Se realiza la fundida del muro final en la calle 44 con carrera 17 éste .

4.El dia 06/07/2023. se presentan lluvias en el frente de Obra desde las ocho de la mañana hasta las 11 de la mañana, se inicia con la construcción de los gaviones en la calle 50 entre carreras 31 y carrera 32 A este, en la calle 50 con carrera 22a se realiza la fundida de cintas de confinamiento de confinamiento. Se continúa con la excavación de canal lateral en la carrera 27 con calle 43I.

5.El dia 07/07/2023. se continúa con la construcción de los gaviones en la calle 50 con carrera 31 dónde se encuentra tubería antigua aún en funcionamiento. Se continúa con la fundía de cunetas laterales en la calle 50 con carrera 22 y se funde el acceso de la carrera 22. Se continúa con la excavación del canal de la carrera 27 con calle 43f se presentan lluvias en los frentes de obra a la 1.30 hasta las 3.30 P.M. afectando las vías donde no sea instalado el adoquín.

6.El dia 08/07/2023. se inicia realizando un recorrido en la calle 58 con carrera 21 para verificar las afectaciones de las cunetas fundidas el dia anterior se continúa con la construcción de los gaviones excavación Manual en roca. Se realiza fundida de la pared lateral de la canal en la carrera 27 con calle 43F y base de la misma con malla electrosoldada.

8. RECOMENDACIONES Y OTROS

1.Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.


2. Se le solicita al contratista realizar la instalacion de la arena para los peños adoquín.

3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripcion Foto 1

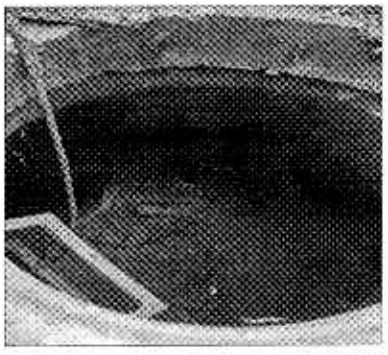

Descripcion Foto 2.

Recorrido e inspeccion de pozos en la Cra 2 entre dll 56 y cra 60 via los industriales (Foto 1 y 2).

73


FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E


Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 49 **DEL** 3/07/2023 **AL** 8/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

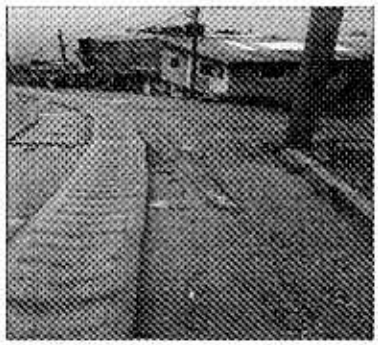

Descripción Foto 3.

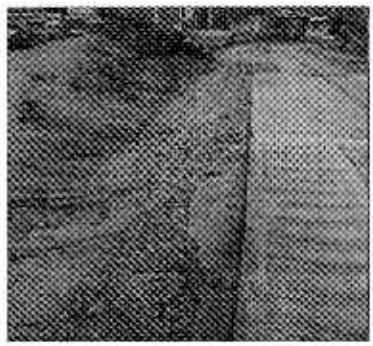

Descripción Foto 4.

Afectaciones en la base en la calle 50 con carrera 22 (Ver foto 3 y 4).



Descripción Foto 5.



Descripción Foto 6.

Construccion de Gaviones Cl 50 entre cra 31 y 32 A este. (Foto 5 y 6).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Soacha, a los

OCHO (8) días del mes de JULIO de 2023

Firma

EDWIN EDUARDO URIBE CARDONAS

Director de Interventoría

COCOSERING SAS

74

FORMATO			
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	XUA
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 50 **DEL** 10/07/2023 **AL** 15/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022

CONTRATISTA CONSORCIO GAHER SOACHA **NIT** 901.587.366-8

INTERVENTOR COCOSCHING SAS **NIT** 900.104.770-0

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$50658769867	Valor Inicial	2238683
Valor Actualizado	$50658769867	Valor Actualizado	2238683
No. empleos Directos generados	19	No. empleos Directos generados	5
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. PERSONAL DESEMPEÑANDO LABORES EN OBRA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Topografo	1
Profesional Siso	1
Inspectores	2
Oficiales	2
Ayudantes	7
Operarios	2
Conductores	2

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Interventoria	1
Residente de Interventoria	1
Inspector de Interventoria	1
Ambiental	2
Profesional social	1
Otros	0

3. ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DESCRIPCION
10/7/2023	Dia Soleado
11/07/2023	Dia Soleado
12/7/2023	Dia Soleado
13/07/2023	Dia Soleado
14/07/2023	Dia Soleado
15/07/2023	Dia Soleado

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 50

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO (H>0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)
INSTALACION DE POZOS
REFRACCION ACOMETIDA EN MANGUERA 1/2"
CONCRETO 3000 PSI BASES (HUELLAS, MUESTRAS)
INSTALACION DE ADOCRIN (PLACA HUELLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN INCLUYE MORTERO (PAÑOS DE ADOCRIN)
CUNETA FUNDIDA IN SITU
INSTALACION DE ADOQUIN

75

FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 50 **DEL** 10/07/2023 **AL** 15/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

5. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.506.567.898,00
VALOR PAGADO	$ 3.982.368.303,00
VALOR TOTAL ACTUAL	$ 524.199.595,00

6. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA

1. El dia 10/07/2023. Se continúan las actividades de construcción de gaviones en la calle 50 con carrera 31, en comité de obra se hace la entrega al contratista de los diseños para la construccion del muro lateral el cual será el confinamiento de la vía en la carrera 27 con calle 43F, se continúa con la fundida de las paredes laterales de la canal de confinamiento, se continúa con la reparación de subbase en la calle 50 con carrera 22 para poder continuar con la fundida de las cunetas.

2.El dia 11/07/2023. se continúa la fundida de la cuneta lateral en la calle 50 con Carrera 22 por ambos costados de la vía. En la calle 50 con carrera 31 se construye el tercer nivel de los gaviones por lo cual se inicia la instalación de geotextil no tejido para evitar la filtración de agua. En la Carrera 2 entre calle 56 y 60 vía los industriales se realizan apiques en el terreno por parte del contratista para la toma de laboratorios CBR. En la carrera 27 con calle 43F se continúa la fundida el canal lateral.

3. El dia 12/07/2023. Se continúa la fundida de conecta lateral y ctas de confinamiento en la carrera 27 con calle 43F se continúa con la fundida junto con las paredes laterales en la calle 50, se inicia el cuarto nivel de gaviones y se continuar la instalación de su base para relleno.

4.El dia 13/07/2023. Se continúa con la instalación de gaviones en la calle 50 con carrera 31 se realizan actividades de relleno de material y recubrimiento de los gaviones en Geotextil. Se realiza inspección de pozos y redes de aguas negras y lluvias, en la carrera 2 entre calle 56 60 vía los industriales. Se continúa con la fundida de cunetas en la calle 50 con carrera 22A y cntas de confinamiento en la carrera 27 con calle 43f.

5.El dia 14/07/2023. se inicia reconocimiento en la carrera 2 con calle 56 y 60 vía los industriales y se realizar solicitud para identificación de la Red de gas. En la calle 50 con carrera 22 en la abscisa 190 se realiza la instalación de Bordillos para el confinamiento de la vía. En la carrera 27 con calle 43 se inicia con el armado de acero con respecto a los planos suministrados por la entidad para el confinamiento de la vía. En la calle 50 con carrera 31 se continúa con la construcción de gaviones y protección de geotextil.

6.El dia 15/07/2023. en la calle 50 con Carrera 31 se realiza el desvio del agua de la tuberia antigua encontrada hacia la tuberia nueva para evitar filtraciones de agua que puedan afectar los gaviones. Se continúa con la construcción de gaviones y protección con geotextil. Se continúa con la fundida del lateral en la calle 50 con 22 la cual va confinada con el Bordillos. En la Carrera 2 con calle 56 y 60 se realiza la instalación de cerramiento para la señalización de la primer área a intervenir.


8. RECOMENDACIONES Y OTROS

1.Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.

2. Se le solicita al contratista realizar la instalacion de la arena para los pertos adoquin.

3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

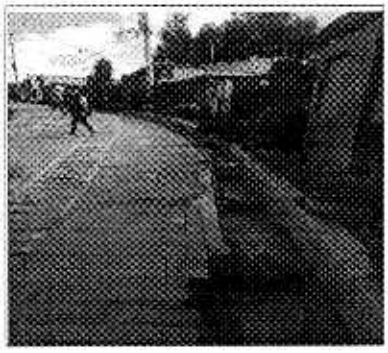

Descripción Foto 1.



Descripción Foto 2.

fundida Muro aprobado por la entidad en la carrera 27 con calle 43F, (Foto 1 y 2).

76


FORMATO			
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E


Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 50 **DEL** 10/07/2023 **AL** 15/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

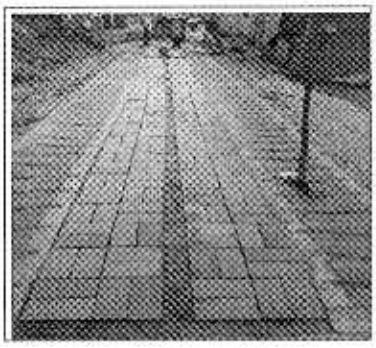

Descripción Foto 3.

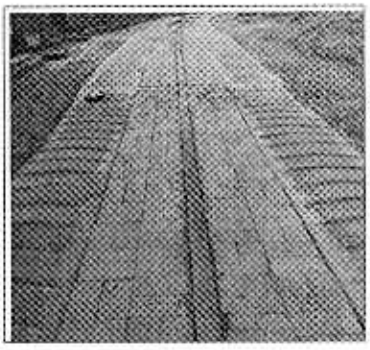

Descripción Foto 4.

Fundida de cintas de ajuste calle 50 con Carrera 22 (Ver folo 3 y 4).



Descripción Foto 5.



Descripción Foto 6.

Recubrimiento de los gaviones en Geotextil en la Cll 50 entre Cra 31 y Cra 32. .(Fcla 5 y 6).

Pere constancia ce lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoria, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria, en Soacha, a los

QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2023

Firma

Director de Interventoría

COCOSERING SAS

77

FORMATO			
Informe semanal			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 51 **DEL** 17/07/2023 **AL** 22/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

CONTRATISTA CONSORCIO GAMER SOACHA **NIT** 901.587.368-8

INTERVENTOR COCOSERING SAS **NIT** 900.104.779-0

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (día) **DE** AGOSTO (mes) **DE** 2022 (año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (día) **DE** MAYO (mes) **DE** 2023 (año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	4506567898,67	Valor Inicial	223888395
Valor Actualizado	4506567898,67	Valor Actualizado	223888395
No. empleos Directos generados	19	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. PERSONAL DESEMPEÑANDO LABORES EN OBRA.

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Topografos	1
Profesional Siso	1
Inspectores	2
Oficiales	2
Ayudantes	7
Operarios	2
Conductores	2

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Interventoria	1
Residente de Interventoria	1
Inspector de interventoria	1
Maestro	2
Profesional social	1
Otros	0

3. ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DESCRIPCION
17/07/2023	Dia Soleado
18/07/2023	Dia Soleado
19/07/2023	Dia Soleado
20/07/2023	Dia Soleado
21/07/2023	Dia Soleado
22/07/2023	Dia Soleado

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 51

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)
NIVELACION DE POZOS
REPARACION ACOMETIDA EN MANGUERA 1/2"
CONCRETOS 3000 PSI BASES (HUELLAS- RIOSTRAS)
INSTALACION DE ADOQUIN (PLACA HUELLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN NO INCLUYE MORTERO (PAÑOS DE ADOQUIN)
CUNETA FUNDIDA IN SITU
INSTALACION DE ADOQUIN

28

FORMATO Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 51 **DEL** 17/07/2023 **AL** 22/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022 (Numero de Contrato)

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.506.567.898,00
VALOR PAGADO	$ 3.982.368.303,00
VALOR TOTAL ACTUAL	$ 524.199.595,00

6. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA

1. El dia 17/07/2023, en la calle 50 con carrera 31 se continúa con la construcción de gaviones y necesaria la excavación manual para poder continuar con la construcción de los gaviones. En la calle 50 con carrera 21 se continúa con le fundida de cunetas de reforzadas y se realiza levantamiento de pozo junto con la instalación de cargue.

2.El dia 18/07/2023. se realiza instalación de Bordillos en las intersecciones de la calle 50 con carrera 17 y con carrera 21. Se realiza la fundie de la cuneta en las intersecciones. La carrera 27 con calle 43f se realiza el desmonte sardinel y se inicia con la reinstalación para dar confinamiento al muro aprobado por la alcaldia. En la calle 50 con Carrera 31 se realiza levantamiento de caja inspección y se inicia con el relleno de meterial de su base el nivel cinco de gaviones.

3. El dia 19/07/2023. En la calle 50 con carrera 31 se continúa con el relleno en material de su base, se realiza nivelación y compactación y se realiza la extendida del geotextil hasta el nivel más alto de los gaviones. En la calle 50 con carrera 17 se se realiza fundia de rampa de acceso a la vía. En la carrera 27 con calle 43f se inicia con la excavación del canal una vez terminada la instalación de sardinel en la carrera 48 con carrera 21 la comunidad inicia actividades de instalación y por parte del contratista se realizan los asesoramientos técnicos.

4.El dia 20/07/2023.se realiza fundida de muro 21 para dar confinamiento a la vía junto con la instalación. En la calle 50 con carrera 31 actividades de relleno en material de su base para proseguir en la nivelación y compactación de la misma.

5.El dia 21/07/2023. se presentan lluvias desde las 7:30 hasta las Hasta las 9:30 de la mañana se realiza el armado den compraco del muro en la carrera 27 con calle 43F se inicia con la fundida del mismo, siguiendo los parámetros de diseño se realiza la reinstalación de paños de adoquín en el inicio de la vida ya que la comunidad se negó a realizar esta actividad y esto es necesario para poder. Se continúa la nivelación y compactación de las base en la calle 50 con carrera 31.

6.El dia 22/07/2023. No se realizaron actividades el personal trabajo el 20 de julio.

8. RECOMENDACIONES Y OTROS

1.Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.

2. Se le solicita al contratista realizar la instalacion de la arena para los paños adoquín.

3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción Foto 1.



Descripción Foto 2.

Estado actual de la cra 24 cl50. Se necesita reinvelar toda la vía (Foto 1 y 2).

29

FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 51 **DEL** 17/07/2023 **AL** 22/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022





Descripción Foto 3. Descripción Foto 4.

Gaviones Cll 50 entre Cra 31 y 32 A este (Ver foto 3 y 4).





Descripción Foto 5. Descripción Foto 6.

Inicio excavaciones Cra 2 entre Cll 56 y 60 via los industriales (Foto 5 y 6).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Soacha, a los

VEINTIDOS (22) días del mes de JULIO de 2023

Firma:

EDGAR EDUARDO URIBE CARDENAS
Director de Interventoría
COCOSERING SAS

80

FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_C01_C3	Ejecución de Proyecto	0

XUÁ

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 52 **DEL** 24/07/2023 **AL** 29/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA 024 DE 2022.

CONTRATISTA CONSORCIO GAMER SOACHA **NIT** 901.587.368-8

INTERVENTOR COCOSERING SAS **NIT** 900.104.779-0

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día)	**DE**	AGOSTO (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	MAYO (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	4506567896.67	Valor Inicial	223888395
Valor Actualizado	4506567896.67	Valor Actualizado	223888395
No. empleos Directos generados	19	No. empleos Directos generados	5
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. PERSONAL DESEMPEÑANDO LABORES EN OBRA

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Topografos	1
Profesional Siso	1
Inspectores	2
Oficiales	2
Ayudantes	7
Operarios	2
Conductores	2

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Interventoria	1
Residente de Interventoria	1
Inspector de Interventoria	1
Maestro	2
Profesional social	1
Otros	0

3. ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DESCRIPCION
24/07/2023	Dia Soleado
25/07/2023	Dia Soleado
26/07/2023	Dia Soleado
27/07/2023	Dia Soleado
28/07/2023	Dia Soleado
29/07/2023	Dia Soleado

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA N° 52

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)
NIVELACION DE PC20S
REPARACION ACOMETIDA EN MANGUERA 1/2"
CONCRETOS 3000 PSI BASES (HUELLAS- RIOSTRAS)
INSTALACION DE ADOQUIN (PLACA HUELLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN NO INCLUYE MORTERO (PAÑOS DE ADOQUIN)
CUNETA FUNDIDA IN SITU
INSTALACION DE ADOQUIN

81

FORMATO Informe semanal			XUÁ
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
SUBTEC_031_03	Ejecución de Proyecto	0	

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 52 **DEL** 24/07/2023 **AL** 29/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.505.567.250,00
VALOR PAGADO	$ 3.982.362.300,00
VALOR TOTAL ACTUAL	$ 524.159.695,00

6. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA REPORTADA

1. El dia 24/07/2023. se continúa con la excavación relleno nivelación en la calle 50 con carrera 31. Se realiza cargue material y perfil amiento de la vía. En la calle 49 con carrera 17C se realiza renivelación y compactación de las vías afectadas por las lluvias y se realiza la renivelacion de material de sucbse. Se continúa con la fundida del muro reforzado en la carrera 27 con calle 43 F y se inicia a fundir la base de la canal para las aguas lluvias

2.El dia 25/07/2023. se da inicio a las actividades en en la carrera 2 con calle 56- 60. Se inician excavaciones a partir de la topografia del contratista, ya que la topografia enticad no contempla los accesos. Se solicita información de tuberia gas y la profundización de la misma. En la carrera 27 con calle 43f se realiza la conexión de tuberia hacia la caja inspección de laterales de la canal.

3. El dia 26/07/2023 en la Carrera 2 con calle 56 y 60 Via los industriales se continúan con las actividades de excavacion y retiro de material de la misma quedando en evidencia la tuberia del gas y redes de aguas negras se evidencia un brote de agua en la Super resanta. En la calle 50 con carrera 31 se inicia la construcción de la escalera central con el sardinel prefabricado en la carrera 27 43f se realiza la fundida de canal a empalmar con la caja de la cuneta faltante por el adoquin mani salado. Se realiza cargo de material en volquetas de la alcaldia a petición del ingeniero Yare de la via de la carrera dos con calle 56 y 60.

4.El dia 27/07/2023.se inician actividades con la construcción de la escalera en la calle 50 con carrera 31. se realiza el ataque del sardinel instalado. Se continúa la excavación en la Carrera dos con calle 56 y 60 se encuentran camaras de telefonia en la acera dos 60, se solicitaba nuevamente la profundización de la Red de esta via. En la carrera 27 con calle 44 se realiza la instalación de sardinel para el cierre final de la via las cintas en concreto.

5.El dia 28/07/2023. se continúa con la excavación en la Carrera dos con calle 56 y en la misma se inicia la instalación de material de rajón, se presenta agua proveniente de tubos rotos en la obra de los Balcanes la cual es afectando el material de su mezcla de la excavación realizada, se encuentra cableado electrico subterráneo el cual fue afectado por la maquinaria se realiza el reporte Codensa pero no hace presencia en la zona. Se realiza las de nivelación y compactación de las bases en la carrera 24 con calle 61. Se continúa con la construcción de cunetas en la calle 50 con carrera 31 la cual es funcionarán como la misma rampa continúa con la instalación de sardinel.

6.El dia 29/07/2023. se continúa la construcción de las escaleras en la calle 50 con carrera 31, se inicia la nivelación para la rampa laterales, se realiza nuevamente la compactación de la carrera 24 61 para la fundida de las cintas de 60 cm en concreto. Se inicia la compactación de las rasante en la carrera 27con calle 56 y se continúa con la excavación y cargo de material material en esta misma via.

8. RECOMENDACIONES Y OTROS

1.Se solicita al contratista no trabajar con la subrasante saturada por las lluvias presentadas.

2. Se le solicita al contratista realizar la instalacion de la arena para los partes adoquin.

3. Se ha visto afectado el rendimiento de las actividades en obra por la presencia de lluvias durante la jornada laboral.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.



Descripción Foto 2.

Actividades con la construcción de la escalera en la calle 50 con carrera 31 (Foto 1 y 2).

82


FORMATO		
Informe semanal		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
SUBTEC_001_03	Ejecución de Proyecto	0

EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Dirección Ejecucion de Proyectos

SEMANA N. 52 **DEL** 24/07/2023 **AL** 29/07/2023

CONTRATO No 024 DE 2022

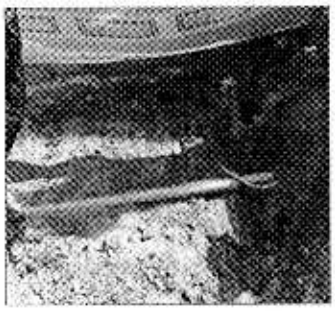


Descripción Foto 3.




Descripción Foto 4.

Tubería de gas Vant, se solicita la profundizacion de las redes Cra 2 entre clle 56-60. (Ver foto 3 y 4).

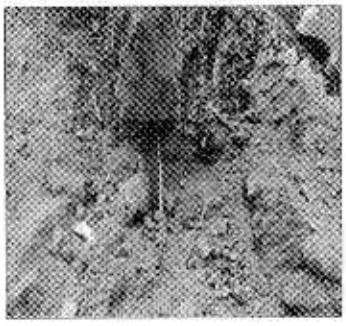


Descripción Foto 5.

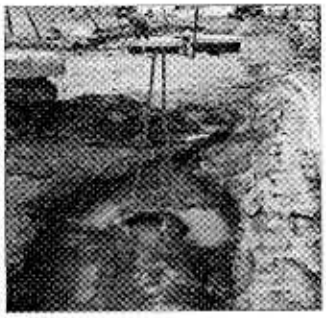


Descripción Foto 6.

Redes y cables encontrado superficialmente en la Cra 2 entre clle 56-60. (Foto 5 y 6).

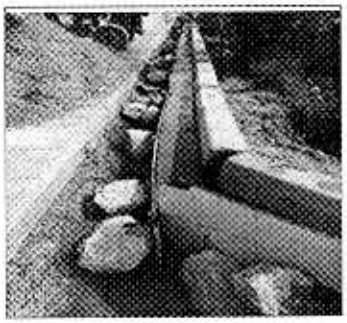

Descripción Foto 7.

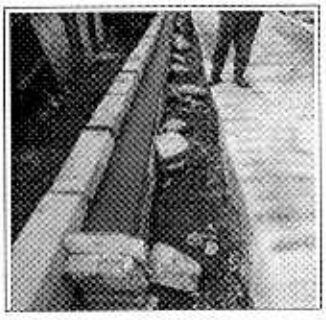

Descripción Foto 8.

Se continua con la fundida del muro reforzado en la carrera 27 con calle 43 F., (Foto 7 y 8).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoria, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria, en Soacha, a los

VEINTIDOS (22) días del mes de JULIO de 2023

(Firma)

(Nombre) EDGAR EDUARDO RAMIREZ CARDENAS

Director de Interventoria

COGUBERING SAS

83

Actas de Comité Técnico.

Carrera 3 Número 1 – 53, Barrio Las Acacias, Municipio de San Luis de Palenque, Casanare
Email: cocosering@gmail.com Cel. 312 – 5 86 04 29 y 320 – 3 80 31 17

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 8:25 am.
FECHA: 29 de Jno 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Estado Actual del contrato de Obra e Interventoria.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior
2.	Verificacion del estado Actual.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite a las 8:25 am, se revisan las pendientes del acta anterior, y se requiere de caracter urgente el concepto del especialista de vias de la secretaria de Infraestructura de la cra 27C entre cll 39 A sur, la interventoria solicita a epuxua y a la secretaria de infraestructura que definan las obras a (Interv.) realizarse con el presupuesto de la Adición N° 1.

la secretaria de Infraestructura se compromete a entregar el perfil y diseño geometrico de la via. y la revisión de los documentos de anexo de la cra 2.

85

la Socalización con los industriales se Programa para el día miercoles 05 de Julio 2023.

el contratista de Obra se compromete a realizar entrega de los Nps de la adición el dia 30 de junio 2023

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
EDGAR E. ULIBAR	INTERVENTORIA	3108032625	
Guido Tulcan.	Direc. Equipam.	3112657489	
Daniela Marín	EPUXUA.	322 223 1937	Daniela Cardona Marín
	Contratista	3102935197	
	EPUXUA	3166216313	
	Epuxua	3124821154	
	Interventora.	3105709036	
	Contratista	3219948913	

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Carrera 2 · # 56-45 Empresa Preflex	HORA DE INICIO: 9:26 Am.
FECHA: 5 de Julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Socializacion y intervencion Proyecto Via carrera 2 entre calle 56 y 60

7

AGENDA PROPUESTA	
1.	PRESENTACION VIA A INTERVENIR.
2.	RECORRIDO INSPECCION DE ENTRADAS.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Presentar el Proyecto de Pavimentación de la via y Señalizacion sobre la via y el trabajo a intervenir.

SE REALIZA RECORRIDO PARA REVISAR LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS COLINDANTES. DONDE SE DETERMINO QUE LA MEJOR FORMA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ES INTERVENIR POR TRAMOS, PROBLEMANDO LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS.

89

Calle 13 No 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-7305500
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CRISTIAN LEYTON	CHILCO GASPAIS	3185324585	
Cristhian Gaitan	Secretaria Pueblo	312 4266918	
Alexander Rodriguez	Argos	3122679820	
John Pinzon	Alcaldia Socha	3194498491	
Alejandro Cayrecdo	ricayses.	7807414.	alejandro Cayrecdo
Martha Inés Cortes	Recoltambores SAS	3142644133	
Sandra Figueroa G	Recoltambores	3123739889	
Fredy Jamil Jimenez	Alcaldia Socha	3005646979	

XUÁ

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Oscar Valencia	UAESP SAS	3168331352	
Francisco Sanchez	Secretaria Distrital	3189157962	
Jairo Fernando Diaz	Gas Amigo.	3201278987.	
Javier Ospina S.	Residente Interventoría Orosenig	3105309036.	
Yesid Oliveros B.	Sylva Consultores	7439449.	
Leonardo Duarte V.	Inspector Técnico	321 275 9255	
Andrés Ramírez	Prefton	3013256787	
Mónica Rodríguez	Ainca.	3206142536	
Ligia Pedraza	Equipamiento Social.	3123251499	
Guido Tulcan.	Dirección Equipamiento	3112657489.	
CRISTIAN LEYTON	CHILCO		

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 10:00 am.
FECHA: 07-09-23	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificacion del estado actual del contrato 024 del 2022. Verificacion Compromisos del acta anterior.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del acta anterior
2.	verificacion del estado actual
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicia el comite de obra a las 10:00am, Se espera aprobacion de los nuevos NPS - por parte de la entidad. y Epuxua.
- Generar PMT para la via Cra 2ª este ell 56, - para el inicio de las actividades, por parte del contratista.
- Se aprueba la demolicion de la rampa en la via ell 45f con Cra 22d para la construccion de cordon de 50cm de ancho por 40cm de profundidad.
- La alcaldia se compromete el pavimento de los rejillas en pavimento para el cordon en la ell 45f.
- La alcaldia se compromete a enviar auxiliares. para la gestion social con respecto a la nueva instalacion del adoquin en la Cra 22d.

- En el muro de la Cll 50 con Cra 31. Se realizara la instalacion de geotextil para el recubrimiento de los gaviones y una cuneta lateral entre el gavion y la propiedad.
Se realizara cuneta central en la Cll 50 con Cra 31. con escalera lateral.

- Se deja para evaluacion el estudio de caracamo de proteccion para ladera superficial en la Cra 2ª Cll 56, esto sera definido con un estudio de redes.
para la entrada a los predios se realizara instalacion de bajo rampa prefabricado con una altura de 0,05m a partir de la vaante para el manejo del agua.

- Solicitar visto preliminar a Vanti para el suministro de informacion de redes de gas. y para las redes de agua solicitar el acompañamiento de servicios publicos de Soacha.

- Presentar un cronograma preliminar general para el inicio de la obra y la socializacion con la comunidad por parte del contratista.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Guido Talcan.	Direcc. Equipamiento	3112853489.	
Fredy Jimenez	Dir. Equipamiento	3005641979	
Milton Rivera	Contratista	3153467630	
Jaime Daniel	Contratista.	321 7759255	
Alejandro Yate.	D. E	3175421886	
Marco Fuentes	EPUXUA	3166216813	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO:
FECHA: 13 de Julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Validacion del estado actual del contrato de obra 024 - 2022

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	estado del contrato.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de obra a las 8:40 am, con la validación de los nuevos diseños de la Via Cra 2 con 56 zona industrial, para lo que se hara envio de los mismos el dia de mañana 14 de Julio.

El contratista informa que el dia lunes 17 de Julio se radicará el PMT de la via de las industriales.

los Nps están en Validación de la Secretaria de Infraestructura para realizar el modificatorio.

la Secretaria Solicita realizar nuevamente la adecuación de la Vía. Cll 42 con Trasv 28 y 29 de altas de las pinas.

En la Cll 50 entre Cra 32 y Cra 31A, Se realizara el cunden y cañeta al lado de los gaviones que están en construcción

la Secretaria de Infraestructura Se compromete a realizar entrega de un listado de las obras adicionales que estan en el presupuesto de la adición.

Se autoriza Fundida de rompa de acceso a la via Cll 50 con Cra 17C por parte de la secretaria de Infraestructura y epuxua.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Fredy Jimenez	Dir. Equipamiento	3005640979	
Guido Tulcan	Dirc. Equipam.	3112657489	
Alejandro Yonte	Dirc Equipamiento	313 542 1556	
Fernando Quiroz U	Contratista.	3212759255	
Milton Rivera	Contratista	3153967636	
Julio A. Rosero	EPUXUA.	316216313	
EDGAR LICHE	INTERVENTORIA	3108032525	
Lorena Ortega	Interventoria	3105709036	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Carrera 2 # 56-80	HORA DE INICIO: 8:20 AM.
FECHA: 27 de julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN: 9:30AM
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Comite de obra en la via carrera 2 con con 56 Zona Industrial sitio de obra para brindar la información a los Empresarios industriales presentes

AGENDA PROPUESTA	
1.	SOCIALIZACION, INTERVENCION CARRERA 2 ZONA INDUSTRIAL
2.	PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
-SIENDO LAS 8:20 AM SE DA INICIO A LA REUNIÓN PROGRAMADA EN LA CUAL SE INTERVIENE Y DA INICIO X PARTE DEL ING JUAN PABLO CAÑON REALIZANDO LA PRESENTACION DE LAS PARTES (ALCALDIA, D. EQUIPAMIENTO) INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, EPUXUA Y LOS INTERESADOS POR PARTE DE LOS INDUSTRIALES)
-REALIZA LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ING MILTON REALIZANDO LA EXPLICACION DE COMO SE ESTA INTERVINIENDO Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE NECESITAN COMO EL ESPACIO Y EL PARQUEO DE MULAS, CARROS Y DEMAS VEHICULOS QUE IMPIDAN EL PASO O LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

-SE SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A LOS INDUSTRIALES LA COLABORACIÓN PARA LA EXCAVACIÓN Y LA UBICACIÓN DEL TRANSPORTE.

-SE DA RESPUESTA A LOS INDUSTRIALES QUE GENERARON COMO TIEMPO DE INTERVENCIÓN PLAN DE TRABAJO AL MOMENTO DE INTERVENIR LAS ENTRADAS. Y EL CAMBIO O SUMINISTRO DE TUBERÍA.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Manuel Flórez	AINCA	3208354593	
JHon Tuxo	Recoltaxes	322 7669444	Tuxo
Andrés Fernández	Pretex	3013256787	
Luis Fernando Bribiesca	Virch Shammah Sy	3114408706	
Oscar Valencia	Vagral SAS	3123240976	
Francisco Sanchez	Servicolagro	3154137762	
Mauricio Mendieta	Colnotex	3186954773	M Mendieta
Brandon Tequia	Colnotex	3202606082	B. Tequia

XUÁ

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Walter Vargas	Colcoatex	3164680959	
Andres Rubio	Jardinero Rubio	3118873555	Andres Rubio
Frank Caballero	Contratista	3143038835	Frank Caballero.
Jose Sanchez.	Vicgysag SAS Aux ambiental.	3175584670	
Jovica Mejia	AIGOS	3108066493	
Marco Fuentes	EPUXUA	3166216313	
Mónica Rodríguez	Aimca.	3206142536	
Guido Tulcan.	Direc. Ecosistemas	3126574489	
Jorge Cifuentes.	Residente interventoria	3105709036	
Nubia Ruiz	Contratista	3102985197	
Fredy J. Jimenez	Alcaldia Soacha	3005686979	
Alejandro Yate	D.E.V	313-8428156	
Ricardo Daniel	Contratista	321 275 9255	
Juan Pablo C.	Epuxua	3124821154	
Milton S. Lucu	Contratista	3153467636	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN:	HORA DE INICIO:
FECHA: Zona Industrial / 27/07/2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificación del Contrato Obra 024 del 2022.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del acta Anterior.
2.	Estado actual de la obra
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión del comite de obra solicitando a la secretaria de Infraestructura la entrega de las actas de vecindad de la Zona Industrial. y de todos los vias intervenidas en la carrera 4.
Se solicita la entrega de los diseños y detalles estructurales de los sumideros lo antes posible.

la secretaria de infraestructura solicita la implantacion del eje de via. con topografia, en campo.
la Supervision tecnica del Contrato aprobo el cargue de 6 viajes de material proveniente de excavación.

el contratista informa que ya se termino la ejecucion de las zanjas de la cll 50 entre cra 31 y 32A este y se informa que ya se inicio la Cra 24 barrio minuto. entre cll 59 y cll 61. con cintas de 60 cms.

el contratista solicita respuesta a las solicitudes de NPS.

105

XUA	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CESAR LUIS	INTERVENTORIA	3108032525	
Guido Tulcan	Dirección Equipamiento	3112657489	
Nubia Ruiz	Contratista	3102935197	
Fredy Jimenez	Alcaldía Soacha	3005646979	
Alejandro Yate L.	D.E.V	3138421556	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	
Mario Fuentes	EPUXUA	3166216313	
Laura Cifuentes	Proserving SAS.	3185309036	
Milton Ruiz	Contratista	3153467636	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

CONSORCIO GAMER SOACHA

NIT.901.587.366-8

CON-GAMER024-2022

Bogotá, 8 de Agosto de 2023

Señores
COCOSERING SAS
Attn: Ing. Edgar Eduardo Uribe
Director Interventoría
Correo.interxua0252022@gmail.com

Referencia: Contrato 024 de 2022 cuyo objeto es la "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".

Apreciado Ingeniero.

Con la presente hacemos entrega de el ACTA No. 8 , Para su revision y previa radicacion

1. Factura
2. Acta parcial No 8 , memoria de cantidades
3. Informe actividades contratista y anexos
4. Informe supervision
5. Certificado de cumplimiento
6. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales
7. Formato de seguimiento
8. Descripcion actividades

Atentamente

CONSORCIO GAMER SOACHA
MILTON RIVERA
C.C.No. 79.205.702 de Soacha
Director de Obra

Factura Electrónica De Venta No

CGS No. 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053650841 que habilita desde CGS 9 hasta CGS 200. Vence 2024-08-14

CONSORCIO GAMER SOACHA

Nit 901587366 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901511522 4	ACTA N°8 CONTRATO 024-2022	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 12 8 A 36	Soacha		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/08/2023	15/08/2023	VENDY ESTEFANIA ZULUAGA GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
[redacted]	C.D.	ACTA N° 8 - CTO N. 024-2022 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA COSTO DIRECTO	1	Und.	406.914.119	0%	0	406.914.119
2	C.I.	COSTO INDIRECTO	1	Und.	122.074.236	0%	0	122.074.236

ADMINISTRACION	24%	$ 97.659.389
[redacted]REVISTOS	1%	$ 4.069.141
UTILIDAD	5%	$ 20.345.706

SUBTOTAL	**528.988.355**
DESCUENTO	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**528.988.355**

Total lineas o ítems: 2

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 15:45:23

CL 44 C 45 53 Teléfono 3016341049 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadgrupoica@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 653740d0c38ab73991d9e370384d294cb12f4c323f17ebf7980027e0ee751384Ce4980e61b4f585a3f0453e8386b31d4 --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2023 9:17:57 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CGS No. 9

CONSORCIO GAMER SOACHA

Nit 901587366 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXU		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901511522 4		ACTA N°8 CONTRATO 024-2022
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 12 8 A 36	Soacha		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/08/2023	08/08/2023	VENDY ESTEFANIA ZULUAGA GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C.D.	ACTA N° 8 - CTO N. 024-2022 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA COSTO DIRECTO	1	Und.	406.914.119	0%	0	406.914.119
2	C.I.	COSTO INDIRECTO	1	Und.	122.074.236	0%	0	122.074.236

ADMINISTRACION	24%	$ 97.659.389
IMPREVISTOS	1%	$ 4.069.141
UTILIDAD	5%	$ 20.345.706

SUBTOTAL	**528.988.355**
DESCUENTO	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**528.988.355**

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 15:45:23

CL 44 C 45 53 Teléfono 3016341049 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadgrupoica@gmail.com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 14/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO GAMER SOACHA** con **NIT 901.587.366-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009900345746

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **GAMEVING CONSTRUCCION SAS** identificado con NIT No **901082172-8** posee en la oficina **SOLEDAD (032)**, la cuenta corriente No **032111635** desde el 18 de mayo de 2018.

Esta certificación se expide a solicitud del INTERESADO a los 18 día del mes de julio de 2023.

Atentamente,

Gerente Oficina Bogotá Soledad

Esta certificación tiene un costo de $13.950.oo, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

110

	EPUXUA	Versión	Código	Fecha de Aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-00-050	

ACTA No. 5

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — CONTRATO No.

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: CONSULTORING SAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DD/MM/AA: 4/05/2022

PERIODO A PAGAR: 5 28 de junio al 31 julio

En Soacha, a los Cuatro (31) días del mes de Julio del año 2023 se reunieron MILTON EDUARDO RIVERA Director de Obra del Contratista / EDGAR URIBE Directora de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta de las siguiente actividades según las condiciones

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES ACTUALIZADAS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,25	DEMOLICION PLACA PISO 0,20 M	M2	1	$ 11.419,00	$ 11.419,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,26	DEMOLICION PLACA PISO 0,10 M	M2	1	$ 18.397,00	$ 18.397,00	0,00	79,57	0,0	79,57	$ 1.463.849,00	$ -	$ 1.463.849,00	0,00	$ -
1,27	DEMOLICION PLACA PISO 0,15 M	M2	1	$ 28.043,00	$ 28.043,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,28	DEMOLICION PLACA PISO 0,20 M	M2	1	$ 46.104,00	$ 46.104,00	0,00	1.317,76	0,0	1317,76	$ 60.754.122,00	$ -	$ 60.754.122,00		
1,29	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 10.000,00	$ 10.000,00	0,00		0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
4,13	NIVELACION DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0.3 M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$ 160.620,00	$ 160.620,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMUN	M3	1	$ 8.242,00	$ 8.242,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
16,3	EXCAVACION MANUAL ZANJA DE TIERRA H=1.0 M	M3	1	$ 33.159,00	$ 33.159,00	0,00		0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
16,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=1.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 54.134,00	$ 54.134,00	0,00	3.845,61	0,0	3845,61	$ 208.178.458,00	$ -	$ 208.178.458,00	0,00	$ -
16,5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 62.173,00	$ 62.173,00	0,00	1.768,83	132,33	2301,16	$ 109.972.704,00	$ 33.016.459,83	$ 143.070.164,00	0,00	$ -
16,6	EXCAVACION MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M SECO SIN EXPLOSIVOS	M3	1	$ 106.162,00	$ 106.162,00	0,00	1.053,28	137,06	1190,33	$ 112.030.402,00	$ 14.357.092,71	$ 126.387.514,73	0,00	$ -
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 23.110,00	$ 23.110,00	0,00	106,25	0,0	106,25	$ 2.455.438,00	$ -	$ 2.455.438,00	0,00	$ -
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 70.034,00	$ 70.034,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 68.748,00	$ 68.748,00	0,00	-	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
16,1	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE DEBIDAMENTE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 169.782,00	$ 169.782,00	0,00		0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
16,11	APIQUE (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 64.443,00	$ 64.443,00	0,00		0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 142.715,00	$ 142.715,00	0,00	5.568,13	238,26	5806,39	$ 803.398.597,00	$ 37.115.404,75	$ 840.514.002,15	0,00	$ -
16,13	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	M2	1	$ 164.131,00	$ 164.131,00	0,00	98,00	454,48	552,48	$ 16.084.838,00	$ 74.594.356,88	$ 90.679.295,00	0,00	$ -
3,22	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1	$ 89.046,00	$ 89.046,00	0,00	94,98	655,01	749,99	$ 8.457.589,00	$ 58.326.020,46	$ 66.783.609,00	0,00	$ -
2,1	ENTIBADO TIPO I (1/2 LITIZACIONES)	M2	1	$ 12.950,00	$ 12.950,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
201 P	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5K)	M3	1	$ 173.356,00	$ 173.356,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
201 P	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 60.755,00	$ 60.755,00	0,00	4,43	0,0	4,43	$ 269.145,00	$ -	$ 269.145,00	0,00	$ -
210.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1	$ 10.734,00	$ 10.734,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
210.2.1	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1	$ 37.319,00	$ 37.319,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1	$ 9.836,00	$ 9.836,00	0,00	-	0,0	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -

	EPUKUA	Version	Codigo	Fecha de aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-05-050	

ACTA No. 8

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA — CONTRATO No. _____

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COCOBERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DD/MM/AA 4/05/2022

PERÍODO A PAGAR: 28 de junio al 31 julio

220.1	TERRAPLENES	M3	1	$	16.634,00	$	16.634,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
221.1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	1	$	14.575,00	$	14.575,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
221.2	PEDRAPLEN SUELTO	M3	1	$	8.398,00	$	8.398,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
330.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	1	$	538,00	$	538,00	0,00	18.444,57	1[illegible],77	18494,57	$	9.950.070,00	$	5[illegible].224,00	$	10.639.303,00	0,00	$	-
330.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO UNA HENDE MATERIAL SELECIONADO	M3	1	$	14.240,00	$	14.240,00		-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-		$	-
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUY. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$	23.279,00	$	23.279,00		1.349,51	1[illegible]9,00	3168,51	$	31.415.230,00	$	42.8[illegible].031,00	$	74.225.301,00	0,00	$	-
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$	69.968,00	$	69.968,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$	86.694,00	$	86.694,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
600.4	EXCAVACIONES Varias EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$	21.165,00	$	21.165,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$	34.891,00	$	34.891,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (losas)	M3	1	$	595.230,00	$	595.230,00	0,00	746,99	22,46	769,45	$	444.632.779,00	$	13[illegible].889,65	$	457.998.669,00	0,00	$	-
630.5	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (estructuras)	M3	1	$	710.725,00	$	710.725,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1	$	7.832,00	$	7.832,00	0,00	6.490,46	453,61	6944,07	$	50.833.048,00	$	3[illegible].717,38	$	54.385.965,00	0,00	$	-
677.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1	$	478.443,00	$	478.443,00	0,00	319,14	10,48	329,78	$	248.281.065,00	$	[illegible].415.417,93	$	253.476.482,93	0,00	$	-
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1	$	277.439,00	$	277.439,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE D, 3000 PSI 40% R-JON PARA BASES	M3	1	$	387.723,00	$	387.723,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE D, 3000 PSI 40% R-JON PARA ELEVACIONES	M3	1	$	396.324,00	$	396.324,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	1	$	402.949,00	$	402.949,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA ELEVACIONES	M3	1	$	411.550,00	$	411.550,00	0,00	35,36	8,80	44,16	$	14.965.193,80	$	3.[illegible].596,37	$	18.422.789,00	0,00	$	-
681.1	GAVIÓN	M3	1	$	191.010,00	$	191.010,00	0,00	-	46,00	46,00	$	-	$	8.[illegible].460,00	$	8.786.460,00	0,00	$	-
681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	1	$	195.311,00	$	195.311,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE F, 2500 PSI	ML	1	$	46.667,00	$	46.667,00	69,00	-		0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	$	7.923,00	$	7.923,00	0,00	85,00	85,00	170,00	$	673.370,00	$	[illegible].370,00	$	1.346.740,00	0,00	$	-
311.1	ATRAQUE	M3	1	$	64.443,00	$	64.443,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
***	ATRAQUE (CUERPOS MENORES)	M3	1	$	52.770,00	$	52.770,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
****	ATRAQUE MANUAL	M3	1	$	80.625,00	$	80.625,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
5,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$	667.261,00	$	667.261,00	0,00	-	0,0	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00	$	-
5,1	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8cm	M2	1	$	80.067,00	$	80.067,00	0,00	1.750,00	6,00	1756,00	$	140.752.645,00	$	[illegible].532,68	$	140.631.167,68	0,00	$	-
NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	1	$	3.825,00	$	3.825,00	0,00	19.856,46	548,40	21437,09	$	79.178.425,00	$	22.[illegible].445,00	$	98.261.870,00	0,00	$	-
NP 2	MORTERO 1:4	M3	1	$	479.586,00	$	479.586,00	0,00	671,13	97,95	769,27	$	379.175.168,00	$	46.[illegible].095,48	$	369.760.263,48	0,00		
NP3	Suministro e instalacion de Bordillo de confine-miento prefabricado en concreto de h=70cm, A=35cm (A=B).	UN	1	$	72.570,00	$	72.570,00	0,00	2.757,74	100,00	2[illegible],74	$	199.977.804,00	$	12.[illegible].530,00	$	211.808.334,00	0,00	$	-

	EPUXUA	Versión	Código	Fecha de Aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-60-050	

ACTA No: 8

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA — CONTRATO No. _____

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COCOSERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DD/MM/AA: 4/05/2023

PERIODO A PAGAR: 5 28 de junio al 31 julio

NP4	CONCRETOS CLASE D, F'c =3500 PSI (BASES)	M3	1	$ 397.667,00	$ 397.668,00	0,00	1,19		1,19	$ 710.005,00	$ -	$ 710.005,00	0,00	
NP5	CONCRETOS CLASE D, F'c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	1	$ 713.358,00	$ 713.358,00	0,00	1,31	0,0	1,31	$ 937.231,00	$ -	$ 937.231,00	0,00	$ -
NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 a 15 cm	KG	1	$ 9.999,00	$ 9.999,00	0,00	29.811,13	865,33	30676,47	$ 297.693.965,00	$ 8.641.218,33	$ 306.335.183,33	0,00	$ -
NP7	CAJA INSPECCION 60*80	UN	1	$ 285.348,00	$ 285.348,00	0,00	5,00	2,0	7,00	$ 1.426.740,00	$ 570.696,00	$ 1.997.436,00	0,00	
NP8	REPARACION ACOMETIDA	UN	1	$ 34.390,00	$ 34.390,00	0,00	311,00	4,0	315,00	$ 10.695.290,00	$ 137.562,00	$ 10.832.852,00	0,00	$ -
NP9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXCAVACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/K	1	$ 1.444,00	$ 1.444,00	0,00	94.720,00	1082,00	103601,00	$ 136.775.683,00	$ 15.711.764,00	$ 152.487.844,00	0,00	$ -
NP10	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN (H=1.7M E=0.25M, H=0.21M)INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$ 250.235,00	250.235,00	0,00	102,00	3,0	105,00	$ 25.523.970,00	$ 750.705,00	$ 26.274.675,00	0,00	$ -
NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 759.999,00	759.999,00	0,00	94,93	3,11	97,84	$ 72.144.332,00	$ 2.212.737,09	$ 74.357.067,09	0,00	$ -
NP12	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10 VOH NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	1	$ 33.539,00	33.539,00	0,00	602,73	25,00	627,73	$ 20.214.978,00	$ 838.475,00	$ 21.053.453,00	0,00	$ -
NP13	CINTA AJUSTE EN CONCRETO DE 3500 OPSI e= 01.10cm ANCHO ENTRE 12-20CMS	ML	1	$ 17.442,00	17.442,00		2.328,75	0,0	2328,75	$ 40.618.058,00	$ -	$ 40.618.058,00		
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE 40*40 EXC MANUAL + GEOTEXTIL 1600 + TUBO 6SCH	ML	1	$ 87.365,00	87.365,00	0,00	2.328,75	0,0	2328,75	$ 203.538.603,00	$ -	$ 203.538.603,00		
NP15	SUMINISTRO DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO 8= 10CM H000 (B-30)	ML	1	$ 54.424,00	54.424,00		2.328,75	0,0	2328,75	$ 126.748.738,00	$ -	$ 126.748.738,00		
NP16	SUMINISTRO DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO 8= 10CM H000 (B-30)	ML	1	$ 56.964,00	56.964,00		2.331,75	0,0	2331,75	$ 132.809.307,00	$ -	$ 132.809.307,00		
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO E=40CM (+40) F'c =3CM	ML	1	$ 57.135,00	57.135,00		2.332,75	0,0	2332,75	$ 133.287.671,00	$ -	$ 133.287.671,00		
NP18	SARDINEL PREFABRICADO A=12	UN	1	$ 115.293,00	115.293,00		2.331,75	0,0	2331,75	$ 268.834.463,00	$ -	$ 268.834.463,00		
NP19	CERCA EN TELA VERDE 2,10 M	ML	1	$ 25.933,00	25.933,00			0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
NP20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 10.198,00	20.198,00				0,00	$ -	$ -	$ -		
NP21	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 10.198,00	20.198,00			0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION)	M2	1	$ 9.963,00	9.963,00			0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
NP23	SARDINEL PLANO EN STU H=0.410M E=0.20M CONCRETO 3000PSI	ML	1	$ 60.471,00	60.471,00			0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		
NP24	SUMIDERO TUNNEL DE STRO REFORZADO (L 1C)	UN	1	$ 2.465.571,00	2.465.571,00			0,0	0,00	$ -	$ -	$ -		

	EPUKUA	Versión	Código	Fecha de actualización
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-00-050	

ACTA No. 8

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — CONTRATO No.

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COLOSERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DD/MM/AA 4/05/2022

PERIODO A PAGAR: 5 28 de junio al 31 julio

NP 25	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL 250	UN	1	$ 3.353.712,00	3.353.712,00			0,00	0,00	$ -	$ -	$ -		
NP 26	INSTALACION EN CONCRETO PAVIMENTO RIJIDO MR 43 (INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO SOLAMENTE)	M3	1	$ 383.931,37	383.931,37			1,00	0,00	$ -	$ -	$ -		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS										$ 4.334.434.317,00	$ 406.914.115,00	$ 4.741.348.335,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS										$ 1.300.330.265,00	$ 122.074.236,00	$ 1.422.404.501,00	$ -	$ -
	ADMINISTRACIÓN	24,00%								$ 1.041.264.212,00	$ 97.737.285,00	$ 1.139.001.497,00	$ -	$ -
	IMPREVISTOS	1,00%								$ 43.344.342,00	$ 4.069.141,00	$ 47.413.483,00	$ -	$ -
	UTILIDAD	5,00%								$ 216.721.711,00	$ 20.343.706,00	$ 237.065.417,00	$ -	$ -
										$ -	$ -		$ -	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS										$ 5.634.764.583,00	$ 528.988.355,00	$ 6.163.752.836,00		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$	4.506.567.898,67	V/R ANTICIPO:	N/A	
V/R ADICIONES:		2.252.614.494,00	% ANTICIPO :	N/A	
V/R ACTUAL CONTRATO:	$	6.759.182.392,67	% RETEGARANTIA :	N/A	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR CONTRATO		SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	ACTA 1		649.376.068,00	9,61%			-	649.376.068,00	3.857.191.830,67	9,61%
	ACTA 2		727.213.483,00	10,76%	4.506.567.898,67		-	727.213.483,00	3.129.978.347,67	10,76%
	ACTA 3		1.003.532.471,00	14,85%			-	1.003.532.471,00	2.126.445.876,67	14,85%
	ACTA 4		451.030.346,00	6,67%				451.030.346,00	1.675.415.530,67	6,67%
	ACTA 5		666.543.025,00	9,86%				666.543.025,00	1.008.872.505,67	9,86%
	ACTA 6		484.672.910,00	7,17%				484.672.910,00	524.199.595,67	7,17%
	ACTA 7		520.537.357,00	7,70%	2.252.614.494,00			520.537.357,00	3.662.238,67	7,70%
	ACTA 8		528.988.355,00	7,83%				528.988.355,00		7,83%
	TOTAL		5.031.894.015,00	74,45%	6.759.182.392,67			5.031.894.015,00	1.727.288.377,67	74,45%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial, de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: MILTON EDUARDO TORRES RINCON
DIRECTOR DE OBRA

31 JULIO DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma: EDGAR URIBE

Nombre: EDGAR URIBE
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Firma: Juan Pablo Cañón

Nombre: JUAN PABLO CAÑON

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS					NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA					NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3






CALLE 50 ENTRE 32A 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
EXCA, SARDINEL ESCALERA	23,00	1,00	0,60	1,00	13,80
EXCA,MUROS LATERALES ESCALERAS	23,00	0,30	0,20	2,00	2,76
EXCA,MURO LATERAL	14,00	0,40	0,25	1,00	1,40
TOTAL					17,96

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



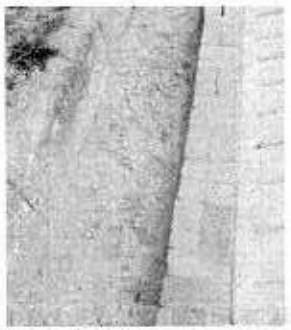

CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
CUNETA	63,00	0,40	0,250	2,00	12,60
VIGA CONFINAMIENTO TRANSV	5,00	0,15	0,250	20,00	3,75
VIGA CONFINAMIENTO LONGITUDINAL	63,00	0,15	0,250	1,00	2,36
BORDILLO FINAL	0,80	0,40	0,500	12,00	1,92
TOTAL					20,63

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CRA 27B CALLE 43F -44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
EXCAVACION ZANJA MURO	27,00	0,40	0,500		5,40
EXCAVACION ZANJA SARDINEL PARA REINSTALAR	27,00	0,40	0,500		5,40
TOTAL					10,80

OBSERVACIONES: se desistala e instala sardinel existente

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CRA 50 ENTRE 17-21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MURO	4,84	0,50	0,800		1,94
TOTAL					1,94

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



VIA LOS MICOS

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
EXCAVACION SARDINEL	70,00	0,50	0,600		21,00
TOTAL					21,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3







CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERAS TOPOGRAFICAS	73,00	1,00	1,50		460,00
TOTAL					460,00
TOTAL					532,33

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	°	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS					NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA					NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE 32A 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICO					101,58
TOTAL					101,58

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	UNID.	M3



CRA 50 ENTRE 17-21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
EXC ROCA SARDINEL	62,50	0,50	0,600		18,75

OBSERVACIONES:			TOTAL		18,75
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	UNID.	M3





CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
EXCAVACION SARDNEL	49	0,50	0,600		14,63

OBSERVACIONES:	TOTAL	14,63
	TOTAL	134,96

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3



CALLE 50 CON CRA 32a 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					20,28
TOTAL					20,28

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 27 ESTE CALLE 430

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RENIVELACION PARA CAJAS	10,00	4,00	0,07	1,00	2,80
VER INFORME ADJUNTO					
TOTAL					2,80

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





cra 21 entre calle 50-49

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
NIVELACION PARA ADOQUIN	27	5,20	0,100	1,00	14,04
VER INFORME ADJUNTO					
			TOTAL		14,04

OBSERVACIONES.

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 27 ENTRE 43F Y 43D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RENIVELACION POR FALLOS LLUVIAS	40	2,00	0,050	1,00	4,00
VER INFORME ADJUNTO					
			TOTAL		4,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE CRA 22 -21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RENIVELACION POR FALLOS LLUVIAS	45	2,50	0,070	1,00	7,88
VER INFORME ADJUNTO					
OBSERVACIONES:			TOTAL		7,88

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RENIVELACION INICIO OBRA	63,00	5,20	0,120		39,31
VER INFORME ADJUNTO					
OBSERVACIONES:			TOTAL		39,31

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	16,12	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	0



CRA 2 VIA ZONA INDUSTRIAL

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					169,95
KO+310 AL KO + 230-	50,00	10,85	1,39	—	—
TOTAL					169,95
TOTAL					258,26

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS					NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA					NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	16,13	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	UNID.	M3



CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					454,48
OBSERVACIONES:			TOTAL		454,48
			TOTAL		454,48

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	3,22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	UNID.	M3







CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					655,01
				TOTAL	655,01
				TOTAL	655,01

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA							
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222	
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2



CALLE 50 ENTRE CRA 32A 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERAS TOPOGRAFICA					96,60
				TOTAL	96,60

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2



CRA 2 VIA ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					1.149,17
				TOTAL	1.149,17
				TOTAL	1245,77

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CRA 2 NO 56-60 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERAS TOPOGRAFICAS					1.839,00
TOTAL					1.839,00
TOTAL					1839,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RECUADROS INCIAL	5,00	0,70	0,15	1,00	0,53
	6,00	0,30	0,15	1,00	0,27
			TOTAL		0,80

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3




CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTAS CONCRETO	63,00	0,60	0,150	2,00	11,34
			TOTAL		11,34

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3

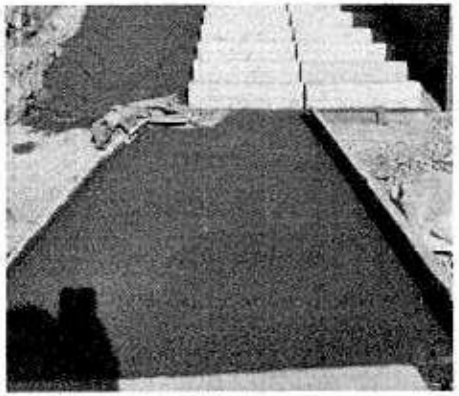


CALLE 50CRA 32A ESTE Y 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTA RAMPA	6,00	1,00	0,150	1,00	0,90
CINTA RAMPA	17	1,30	0,150	1,00	3,32
PLACA CONCRETO	4	3,00	0,150	2,00	3,60
CINTA CONTINAMIENTO	17,00	0,25	0,15	2,00	1,28
				TOTAL	9,09

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3

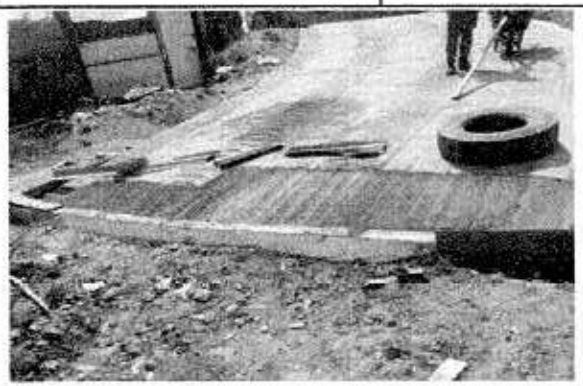

CRA 27 B CON CALLE 43C - 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RECUADRO	4,00	1,35	0,150	1,00	0,81
RECUADRO	4	0,70	0,150	1,00	0,42
				TOTAL	1,23
				TOTAL	22,46

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Firma de Interventoria:

CONSORCIO GAMER SOACHA


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG







CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
FLEJES	0,72	35,00	0,25	1,00	35,18
LONGITUDINAL 1/2	5,20	4,00	0,99	1,00	9,15
FLEJES	0,70	5,00	0,25	2,00	5,35
LONGITUDINAL 1/2	0,70	4,00	0,99	2,00	5,39
			TOTAL		55,06

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG

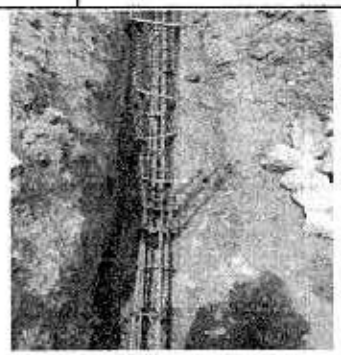

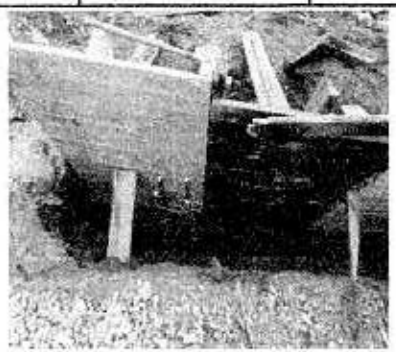


CALLE 49 CRA 48D- CRA 178

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
FLEJES	0,72	33,00	0,25	1,00	33,18
LONGITUDINAL 1/2	4,84	4,00	0,99	1,00	8,79
FLEJES	0,72	5,00	0,25	2,00	5,36
LONGITUDINAL 1/2	0,60	4,00	0,99	2,00	5,19
			TOTAL		52,52

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG

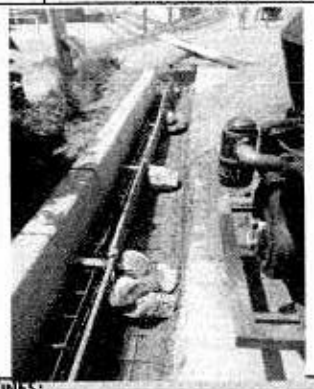




CRA 27B CALLE 43F -44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
FLEJES	0,72	181,00	0,25	1,00	181,18
LONGITUDINAL 1/2	27,00	4,00	0,99	1,00	106,92
			TOTAL		288,10

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG





CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
FLEJES	0,72	35,00	0,25	13,00	37,34
LONGITUDINAL 1/2	5,20	4,00	0,99	13,00	20,59
			TOTAL		57,93
			TOTAL		453,62

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD					
	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
CUNETA	63,00	0,50	0,15	2,00	9,45
TOTAL					9,45

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD					
	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE CRA 22 -21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
AFECTACIONES CUNETAS LLUVIA	60,00	0,20	0,10		1,20
VER INFORME ADJUNTO					
TOTAL					1,20
TOTAL					10,65

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3






CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)		
MURO	5.20	0.25	0.700	1.00	0.91
TOTAL					0.91

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3



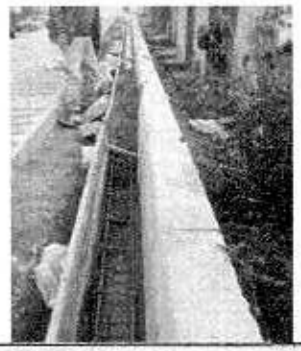

CRA 27B CALLE 43F -44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Prof (m)		
MURO	27,00	0,70	0,250	1,00	4,73
TOTAL					4,73

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3




CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO MURO	5,20	0,15	0,25	1,00	0,20
TOTAL					0,20

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3

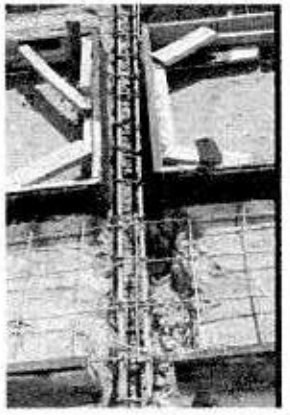

CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO CINTAS	5,20	0,15	0,250	13,00	2,54
TOTAL					2,54

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3



CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)		
MURO	4,84	0,30	0,700	1,00	1,02
TOTAL					1,02

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3



CALLE 50 ENTRE 32A-31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)		
MURO	14,00	0,25	0,500	1,00	1,75
TOTAL					1,75
TOTAL					8,40

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	GAVIÓN	681.1	GAVIÓN	UNID.	M3





CALE 5O CRA 32A -31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)		
MURO GAVION	1.00	2.00	1.000	23.00	46.00
TOTAL					46,00
TOTAL					46,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

A36

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	UNID.	M2





CALLE 50 CRA 32A -31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
MURO GAVION	17.00	5.00		1.00	85.00
TOTAL					85,00
TOTAL					85,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	UNID.	M2



CRA 50 ENTRE 32 AESTE -31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
ADOQUIN ESCALERA	1,00	0,20		30,00	6,00
TOTAL					6,00
TOTAL					6,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CALLE 50 CON CRA 32A -31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERAS TOPOGRAFICAS					96,60
TOTAL					96,60

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2





CRA 2 VIA ZONA INDUSTRIAL

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VER CARTERA TOPOGRAFICA					5.886,00
TOTAL					5.886,00
TOTAL					5982,60

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA


Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3

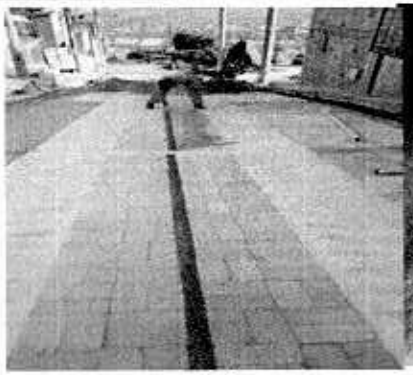




CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	185,00	4,98	0,040	1,00	36,85
MORTERO SELLO	185,00	4,98	0,020	1,00	18,43
TOTAL					55,28

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3

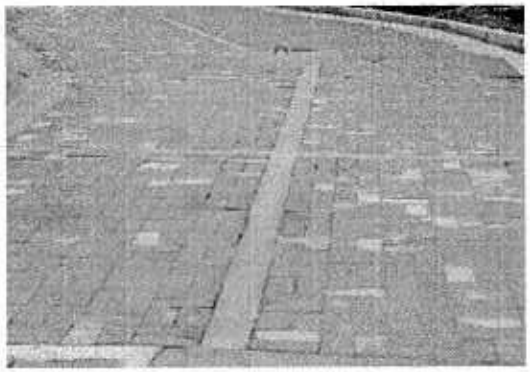


CRA 19 CON CALL 50-49

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	37,00	5,00	0,04	1,00	7,40
MORTERO SELLO	37,00	5,00	0,02	1,00	3,70
TOTAL					11,10

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3

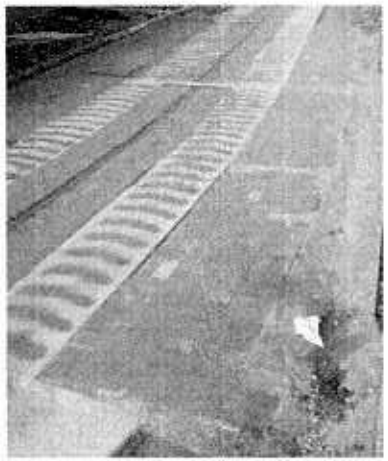

CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	132	2,10	0,040	1,00	11,09
MORTERO SELLO	132,00	2,10	0,020	1,00	5,54
			TOTAL		16,63

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3





CRA 27B CALLE 43F -44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	25	1,20	0,040	1,00	1,20
MORTERO SELLO	25,00	1,20	0,020	1,00	0,60
			TOTAL		1,80

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	63	3,35	0,040	1,00	8,44
MORTERO SELLO	63,00	3,35	0,020	1,00	4,22
			TOTAL		12,66

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	NP 2	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CALLE 50 CRA 32A-31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
MORTERO ADOQUIN	1	0,20	0,040	30,00	0,24
MORTERO SELLO	1	0,20	0,040	30,00	0,24
			TOTAL		0,48
			TOTAL		97,95

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2023	CORTE N° 8	CONSORCIO GAMER SOACHA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222		
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022		

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN






CALLE 55 CON CRA 26

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
instalacion bordillo					9,00
TOTAL					9,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



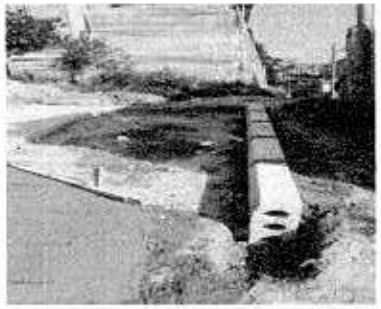

CALL 56B ENTRE 26 CRA 26A

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho	Espesor (m)		
instalacion bordillo					28,00
TOTAL					28,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN





CRA 27 D CALLE 50 -51

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
instalacion bordillo					80,00
TOTAL					80,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN





CRA 27D CALLE 44 -CLL 50

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
instalacion bordillo					10,00
TOTAL					10,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN

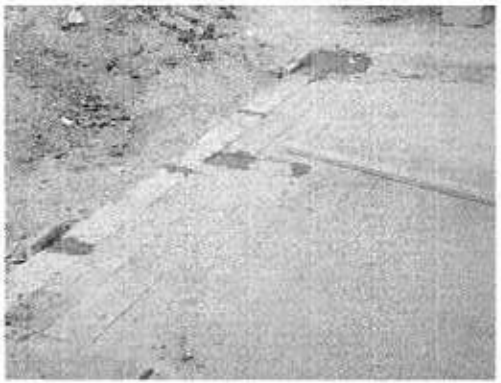


CRA 22B CON CALLE 43C - 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
Instalacion bordillo					12,00
TOTAL					12,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN

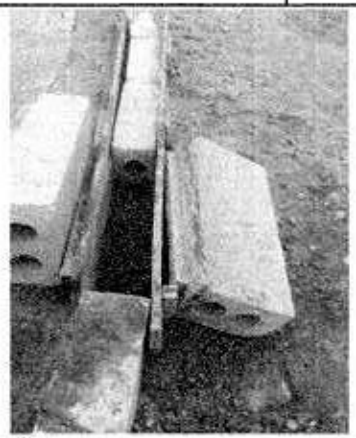

CRA 26 ENTRE 57-59

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
Instalacion bordillo					5,00
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN





CALLE 25 CALLE 57-59

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
instalacion bordillo					10,00
TOTAL					10,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CRA 27 ESTE CALLE 43D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
instalacion bordillo					5,00
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	NP3	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CALLE 58 CON CRA 26

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
instalacion bordillo					10,00
TOTAL					10,00
TOTAL					169,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG




CALLE 50 CRA 32A -31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTA RAMPA	6,00	1,00	4,30	1,00	25,82
CINTA RAMPA	17	1,30	4,303	1,00	95,10
PLACA CONCRETO	4	3,00	4,303	2,00	103,27
MURO CONTINAMIENTO	17,00	0,25	4,303	2,00	36,58
			TOTAL		760,76

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG

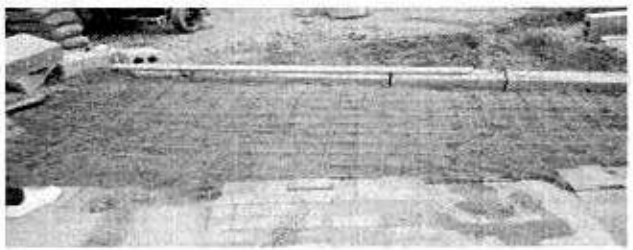



CRA 27 B CON CALLE 43C - 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
RECUADROS	4,00	1,35	4,303	1,00	23,24
	4	0,70	4,303	1,00	12,05
			TOTAL		35,28

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG

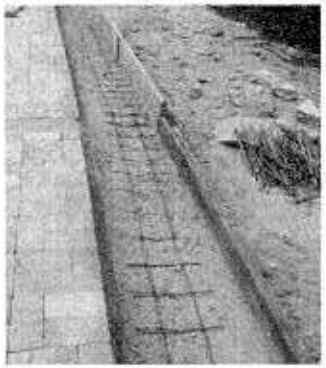

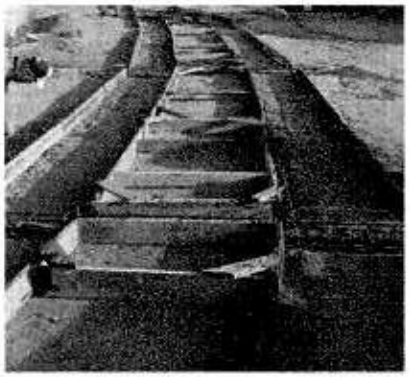

CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CINTAS CONCRETO	63,00	0,60	4,303	2,00	325,31
CUNETAS	63,00	0,45	4,303	2,00	243,98
			TOTAL		569,29
			TOTAL		865,33

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE


CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CAJA INSECCION 60*60	NP7	CAJA INSECCION 60*60	UNID.	und



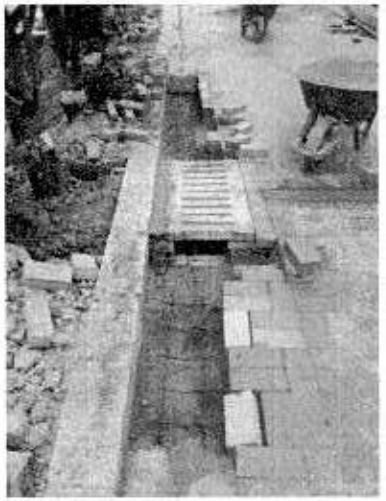

CALLE 55 CON CRA 26

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
cantidad	2,00				2,00
TOTAL					2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022
ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	NP8	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN






CALLE 50 CRA 32A-31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CANTIDAD				2,00	2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

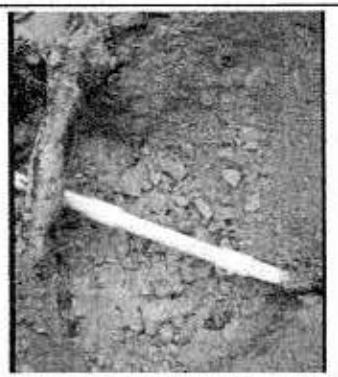



CRA 27 B CON CALLE 43C - 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
CANTIDAD				2,00	2,00
TOTAL					2,00
TOTAL					4,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y	NP9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	UNID.	M3/K





CALLE 50 CRA 32A -31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Prof (m)		
SE ADJUNTA SOPORTE Y VALES TRANSPORTE					
TOTAL					1.081,00
TOTAL					1.081,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:	Firma de Interventoria:
Nombre: MILTON RIVERA	NOMBRE: EDGAR URIBE

RELACION TRANSPORTE

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46241
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46242
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46243
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46244
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46245
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46322
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46323
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46324
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46325
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46326
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46328
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46329

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46327
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18303
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	10302
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	20339
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46308
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46309
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46310
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46317
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46313
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46311
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46312
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46314

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	m3	20338
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	m3	46315
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	m3	46316
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46318
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46319
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	m3	46321
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	**46320**
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18171
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18174
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18169
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18177
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18183

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18175
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18181
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18191
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18186
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18188
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18194
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18193
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18190
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18179
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18180
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18187
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18197

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	18191
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46326
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46327
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46328
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46329
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46330
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46331
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46313
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46314
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46315
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46316
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46317

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46318
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46319
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46320
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7	M3	46321
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46332
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46333
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46334
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46335
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46336
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46337
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46338
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46339

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	15	M3	46340
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	15	M3	18303
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	7	M3	18302
Consorcio Gamer Soacha 024-2025	Comuna 4 Soacha	15	M3	18191
Consorcio Gamer Soacha 024-2026	Comuna 4 Soacha	15	M3	18186
Consorcio Gamer Soacha 024-2027	Comuna 4 Soacha	15	M3	18194
Consorcio Gamer Soacha 024-2028	Comuna 4 Soacha	15	M3	18188
Consorcio Gamer Soacha 024-2029	Comuna 4 Soacha	15	M3	18193
Consorcio Gamer Soacha 024-2030	Comuna 4 Soacha	15	M3	18179
Consorcio Gamer Soacha 024-2031	Comuna 4 Soacha	15	M3	18190
Consorcio Gamer Soacha 024-2032	Comuna 4 Soacha	15	M3	18180
Consorcio Gamer Soacha 024-2033	Comuna 4 Soacha	15	M3	18187

Consorcio Gamer Soacha 024-2032	Comuna 4 Soacha	15	M3	18192
Consorcio Gamer Soacha 024-2033	Comuna 4 Soacha	15	M3	18189
Consorcio Gamer Soacha 024-2033	Comuna 4 Soacha	15	M3	18172
Consorcio Gamer Soacha 024-2034	Comuna 4 Soacha	15	M3	18197
Consorcio Gamer Soacha 024-2035	Comuna 4 Soacha	15	M3	18195
Consorcio Gamer Soacha 024-2032	Comuna 4 Soacha	7	M3	46301
Consorcio Gamer Soacha 024-2033	Comuna 4 Soacha	7	M3	46302
Consorcio Gamer Soacha 024-2034	Comuna 4 Soacha	15	M3	18169
Consorcio Gamer Soacha 024-2033	Comuna 4 Soacha	15	M3	18174
Consorcio Gamer Soacha 024-2034	Comuna 4 Soacha	15	M3	18177
		1209	M3	
	M/K	9	M3	
		10881	TOTAL	

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN





CRA 27 B CALLE 43C 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
					2,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		2,00

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CRA 50 ENTRE 17-21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
					1,00
OBSERVACIONES:			TOTAL		1,00
			TOTAL		3,00


Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3

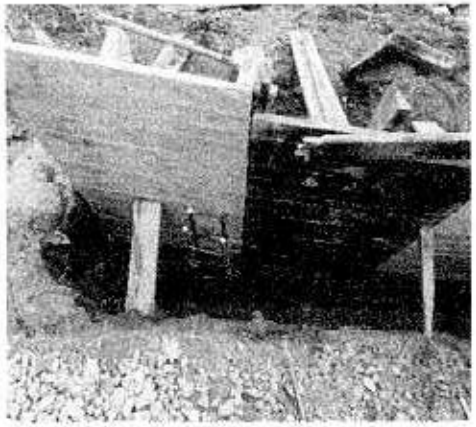

CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO MURO	4,84	0,15	0,25	1,00	0,18
			TOTAL		0,18
			TOTAL		2,91

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3




CALLE 50 CRA 17- 21

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO MURO	5,20	0,15	0,25	1,00	0,20
TOTAL					0,20

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3

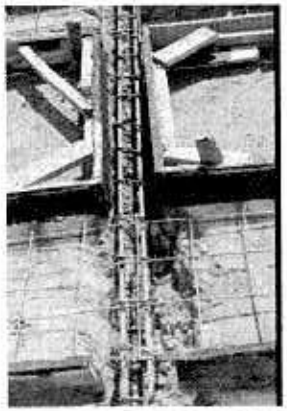


CRA 24 ENTRE 59-61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO CINTAS	5,20	0,15	0,250	13,00	2,54
TOTAL					2,54

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3

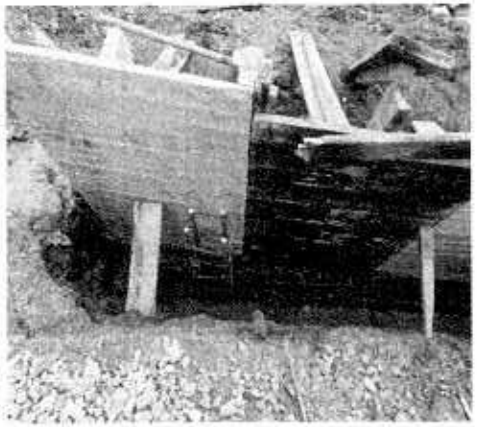

CALLE 49 CRA 48D- CRA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
VIGAS CONCRETO MURO	4,84	0,15	0,25	1,00	0,18
			TOTAL		0,18
			TOTAL		2,91

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR LIBBE

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2023	CORTE N°	8	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022
ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	NP12	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2





CRA 27 B CON CALLE 43C - 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
INSTALACION ADOQUIN COMUNIDAD	25,00	1,00			25,0
				TOTAL	25,0
				TOTAL	25,00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA- EXCAVACIÓN CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y 60

VOLUMENES DE EXCAVACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMER SOACHA | CARTERA DE TOPOGRAFIA | Fecha:

ABSCISA	TERRENO NATURAL			EXCAVACION			ANCHO	CÁLCULO DE VOLUMENES			
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER		ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+150,00	2535,326	2535,276	2535,306	2533,950	2534,050	2533,950	10,4	10,40	1,319		
K0+155,00	2535,491	2535,441	2535,471	2534,064	2534,164	2534,064	10,4	10,40	1,345	5,00	69,94
K0+160,00	2535,549	2535,499	2535,529	2534,177	2534,277	2534,177	10,4	10,40	1,343	5,00	69,84
K0+165,00	2535,652	2535,602	2535,632	2534,387	2534,487	2534,387	10,4	10,40	1,287	5,00	66,93
K0+170,00	2535,765	2535,715	2535,745	2534,496	2534,596	2534,496	10,4	10,40	1,236	5,00	64,25
K0+175,00	2535,878	2535,828	2535,858	2534,658	2534,758	2534,658	10,4	10,40	1,188	5,00	61,77
K0+180,00	2536,033	2535,983	2536,013	2534,820	2534,920	2534,820	10,4	10,40	1,160	5,00	60,31
K0+185,00	2536,179	2536,129	2536,159	2534,864	2534,964	2534,864	10,4	10,40	1,208	5,00	62,79
K0+190,00	2536,336	2536,286	2536,256	2534,877	2535,007	2534,907	10,4	10,40	1,311	5,00	68,15
K0+195,00	2536,492	2536,442	2536,412	2535,147	2535,277	2535,177	10,4	10,40	1,305	5,00	67,88
K0+200,00	2536,684	2536,609	2536,579	2535,417	2535,547	2535,447	10,4	10,40	1,201	5,00	62,45
K0+205,00	2536,863	2536,788	2536,758	2535,508	2535,638	2535,538	10,4	10,40	1,198	5,00	62,29
K0+210,00	2537,042	2536,967	2536,937	2535,598	2535,728	2535,628	10,4	10,40	1,286	5,00	66,89
K0+215,00	2537,169	2537,094	2537,064	2535,813	2535,553	2535,843	10,4	10,40	1,352	5,00	70,30
K0+220,00	2537,277	2537,202	2537,172	2536,027	2535,767	2536,057	10,4	10,40	1,320	5,00	68,64
K0+225,00	2537,620	2537,545	2537,515	2536,235	2535,975	2536,265	10,4	10,40	1,334	5,00	69,39
K0+230,00	2537,753	2537,678	2537,648	2536,442	2536,182	2536,472	10,4	10,40	1,365	5,00	70,98
K0+235,00	2537,905	2537,830	2537,800	2536,556	2536,296	2536,586	10,4	10,40	1,347	5,00	70,04
K0+240,00	2538,099	2538,024	2538,004	2536,309	2536,409	2536,309	10,4	10,40	1,533	5,00	79,72
K0+245,00	2538,294	2538,219	2538,199	2536,857	2536,959	2536,857	10,4	10,40	1,523	5,00	79,22
K0+250,00	2538,575	2538,500	2538,480	2537,074	2537,176	2537,074	10,4	10,40	1,379	5,00	71,69
K0+255,00	2538,964	2538,889	2538,869	2537,227	2537,329	2537,227	10,4	10,40	1,528	5,00	79,48
K0+260,00	2539,320	2539,245	2539,225	2537,380	2537,481	2537,380	10,33	10,37	1,748	5,00	90,59
K0+265,00	2539,709	2539,634	2539,614	2537,771	2537,861	2537,771	9,155	9,75	1,851	5,00	90,19
K0+270,00	2540,009	2539,934	2539,914	2538,162	2538,240	2538,162	8	8,58	1,808	5,00	77,58
K0+275,00	2540,243	2540,168	2540,148	2538,575	2538,652	2538,575	7,85	7,93	1,675	5,00	66,38
K0+280,00	2540,998	2540,923	2540,893	2538,988	2539,063	2538,988	7,7	7,78	1,755	5,00	68,24
K0+285,00	2541,467	2541,392	2541,362	2539,500	2539,603	2539,500	7,7	7,70	1,899	5,00	73,11
K0+290,00	2542,100	2541,960	2541,960	2540,012	2540,115	2540,012	7,7	7,70	1,917	5,00	73,79
K0+295,00	2542,894	2542,754	2542,554	2540,642	2540,739	2540,642	7,05	7,38	2,010	5,00	74,12
K0+300,00	2543,648	2543,548	2543,348	2541,272	2541,362	2541,272	6,4	6,73	2,136	5,00	71,83
K0+305,00	2544,554	2544,414	2544,214	2542,290	2542,380	2542,290	6,4	6,40	2,144	5,00	68,59
K0+310,00	2544,977	2545,377	2545,177	2543,307	2543,397	2543,307	6,4	6,40	1,957	5,00	62,63
K0+313,00	2545,977	2546,377	2546,177	2543,927	2544,017	2544,127	6,4	6,40	1,997	3,00	38,34
					TOTAL:						2.298,34

ALTO PROMEDIO	1,53
ANCHO PROMEDIO	9,468

AREA LOCALIZACIÓN M2	5.962,13

NOTAS ACLARATORIAS

Los anchos aquí contemplados son los mantenidos y respetados al diseño entregado por parte de la alcaldía el día 31 de julio del presente año, los cuales fueron a su vez relacionados en visita de obra el mismo día.

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C.
1.012'190.084 DE BOGOTA

firma topografía contratista

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA- SUB-BASECARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y 60

VOLUMENES DE SUB BASE

CONTRATISTA:	CONSORCIO GAMER SOACHA			CARTERA DE TOPOGRAFIA			Fecha:				
ABSCISA	SUB-BASE			RAJON			ANCHO	CÁLCULO DE VOLÚMENES			
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER		ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+150,00	2534,495	2534,540	2534,490	2534,365	2534,430	2534,380	10,4	10,00	0,110		-
K0+155,00	2534,609	2534,704	2534,604	2534,479	2534,604	2534,494	10,4	10,40	0,115	5,00	5,98
K0+160,00	2534,722	2534,817	2534,717	2534,592	2534,717	2534,607	10,4	10,40	0,113	5,00	5,89
K0+165,00	2534,882	2534,977	2534,877	2534,752	2534,877	2534,767	10,4	10,40	0,113	5,00	5,89
K0+170,00	2535,041	2535,136	2535,036	2534,911	2535,036	2534,926	10,4	10,40	0,113	5,00	5,89
K0+175,00	2535,203	2535,298	2535,198	2535,073	2535,198	2535,088	10,4	10,40	0,113	5,00	5,89
K0+180,00	2535,365	2535,460	2535,380	2535,235	2535,360	2535,250	10,4	10,40	0,117	5,00	6,07
K0+185,00	2535,444	2535,444	2535,424	2535,314	2535,344	2535,294	10,4	10,40	0,120	5,00	6,24
K0+190,00	2535,422	2535,487	2535,467	2535,292	2535,387	2535,337	10,4	10,40	0,120	5,00	6,24
K0+195,00	2535,692	2535,777	2535,767	2535,562	2535,677	2535,637	10,4	10,40	0,120	5,00	6,24
K0+200,00	2536,017	2536,037	2536,037	2535,887	2535,937	2535,907	10,4	10,40	0,120	5,00	6,24
K0+205,00	2536,108	2536,128	2536,128	2535,978	2536,028	2535,998	10,4	10,40	0,120	5,00	6,24
K0+210,00	2536,198	2536,228	2536,178	2536,068	2536,118	2536,088	10,4	10,40	0,115	5,00	5,98
K0+215,00	2536,393	2536,053	2536,393	2536,283	2535,943	2536,303	10,4	10,40	0,107	5,00	5,55
K0+220,00	2536,607	2536,267	2536,607	2536,497	2536,157	2536,517	10,4	10,40	0,103	5,00	5,37
K0+225,00	2536,815	2536,475	2536,815	2536,705	2536,365	2536,725	10,4	10,40	0,103	5,00	5,37
K0+230,00	2537,022	2536,682	2537,022	2536,912	2536,572	2536,932	10,4	10,40	0,103	5,00	5,37
K0+235,00	2537,136	2536,796	2537,086	2537,026	2536,686	2536,996	10,4	10,40	0,103	5,00	5,37
K0+240,00	2536,829	2536,909	2536,829	2536,719	2536,799	2536,719	10,4	10,40	0,107	5,00	5,55
K0+245,00	2537,377	2537,449	2537,377	2537,267	2537,349	2537,267	10,4	10,40	0,108	5,00	5,63
K0+250,00	2537,594	2537,666	2537,594	2537,484	2537,566	2537,484	10,4	10,40	0,107	5,00	5,55
K0+255,00	2537,747	2537,829	2537,747	2537,637	2537,729	2537,637	10,4	10,40	0,107	5,00	5,55
K0+260,00	2537,900	2537,981	2537,900	2537,790	2537,881	2537,790	10,33	10,37	0,107	5,00	5,53
K0+265,00	2538,291	2538,351	2538,291	2538,181	2538,251	2538,181	9,165	9,75	0,107	5,00	5,20
K0+270,00	2538,682	2538,730	2538,682	2538,572	2538,630	2538,572	8	8,58	0,107	5,00	4,58
K0+275,00	2539,150	2539,142	2539,095	2539,055	2539,042	2538,985	7,85	7,93	0,104	5,00	4,13
K0+280,00	2539,563	2539,563	2539,508	2539,468	2539,453	2539,398	7,7	7,78	0,103	5,00	4,02
K0+285,00	2540,075	2540,103	2540,020	2539,980	2539,993	2539,910	7,7	7,70	0,105	5,00	4,04
K0+290,00	2540,587	2540,615	2540,582	2540,492	2540,505	2540,472	7,7	7,70	0,105	5,00	4,04
K0+295,00	2541,217	2541,259	2541,212	2541,122	2541,149	2541,102	7,05	7,38	0,105	5,00	3,87
K0+300,00	2541,777	2541,882	2541,842	2541,682	2541,772	2541,732	6,4	6,73	0,105	5,00	3,53
K0+305,00	2542,795	2542,900	2542,810	2542,700	2542,790	2542,700	6,4	6,40	0,105	5,00	3,36
K0+310,00	2543,827	2543,917	2543,827	2543,717	2543,807	2543,717	6,4	6,40	0,108	5,00	3,44
K0+313,00	2544,447	2544,537	2544,647	2544,337	2544,427	2544,537	6,4	6,40	0,110	3,00	2,11
					TOTAL:						169,95

ALTO PROMEDIO	0,11
ANCHO PROMEDIO	9,456

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C.
1.012'390.084 DE BOGOTÁ

firma topografia contratista

NOTAS ACLARATORIAS

Los anchos aquí contemplados son los mantenidos y respetados al diseño entregado por parte de la alcaldia el dia 31 de julio del presente año, los cuales fueron a su vez relacionados en visita de obra el mismo dia.

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA-BASE CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y 60

VOLUMENES DE BASE

CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA			CARTERA DE TOPOGRAFIA				Fecha:			
	BASE			SUB-BASE				CÁLCULO DE VOLUMENES			
ABSCISA	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	ANCHO	ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+150,00	2534,820	2534,865	2534,815	2534,495	2534,540	2534,490	10	10,00	0,320		-
K0+155,00	2534,934	2535,029	2534,929	2534,609	2534,704	2534,604	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+160,00	2535,047	2535,142	2535,042	2534,722	2534,817	2534,717	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+165,00	2535,207	2535,302	2535,202	2534,882	2534,977	2534,877	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+170,00	2535,366	2535,461	2535,361	2535,041	2535,136	2535,036	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+175,00	2535,528	2535,623	2535,523	2535,203	2535,298	2535,198	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+180,00	2535,690	2535,785	2535,705	2535,365	2535,460	2535,380	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+185,00	2535,769	2535,769	2535,749	2535,444	2535,444	2535,424	10	10,00	0,325	5,00	16,25
K0+190,00	2535,732	2535,797	2535,777	2535,422	2535,487	2535,467	10	10,00	0,317	5,00	15,87
K0+195,00	2536,002	2536,087	2536,077	2535,692	2535,777	2535,767	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+200,00	2536,327	2536,347	2536,347	2536,017	2536,037	2536,037	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+205,00	2536,418	2536,438	2536,438	2536,108	2536,128	2536,128	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+210,00	2536,508	2536,538	2536,488	2536,198	2536,228	2536,178	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+215,00	2536,703	2536,363	2536,703	2536,393	2536,053	2536,393	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+220,00	2536,917	2536,577	2536,917	2536,607	2536,267	2536,607	10	10,00	0,310	5,00	15,50
K0+225,00	2537,112	2536,772	2537,112	2536,815	2536,475	2536,815	10	10,00	0,303	5,00	15,17
K0+230,00	2537,319	2536,979	2537,319	2537,022	2536,682	2537,022	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+235,00	2537,433	2537,093	2537,383	2537,136	2536,796	2537,086	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+240,00	2537,126	2537,206	2537,126	2536,829	2536,909	2536,829	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+245,00	2537,674	2537,746	2537,674	2537,377	2537,449	2537,377	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+250,00	2537,891	2537,963	2537,891	2537,594	2537,666	2537,594	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+255,00	2538,044	2538,126	2538,044	2537,747	2537,829	2537,747	10	10,00	0,297	5,00	14,85
K0+260,00	2538,197	2538,278	2538,197	2537,900	2537,981	2537,900	9,93	9,97	0,297	5,00	14,80
K0+265,00	2538,588	2538,648	2538,588	2538,291	2538,351	2538,291	8,765	9,35	0,297	5,00	13,88
K0+270,00	2538,980	2539,028	2538,980	2538,682	2538,730	2538,682	7,6	8,18	0,297	5,00	12,17
K0+275,00	2539,448	2539,440	2539,393	2539,150	2539,142	2539,095	7,45	7,53	0,298	5,00	11,21
K0+280,00	2539,861	2539,861	2539,806	2539,563	2539,563	2539,508	7,3	7,38	0,298	5,00	10,99
K0+285,00	2540,373	2540,401	2540,318	2540,075	2540,103	2540,020	7,3	7,30	0,298	5,00	10,88
K0+290,00	2540,885	2540,913	2540,880	2540,587	2540,615	2540,582	7,3	7,30	0,298	5,00	10,88
K0+295,00	2541,515	2541,557	2541,510	2541,217	2541,259	2541,212	6,65	6,98	0,298	5,00	10,39
K0+300,00	2542,075	2542,180	2542,140	2541,777	2541,882	2541,842	6	6,33	0,298	5,00	9,42
K0+305,00	2543,093	2543,198	2543,108	2542,795	2542,900	2542,810	6	6,00	0,298	5,00	8,94
K0+310,00	2544,147	2544,237	2544,147	2543,827	2543,917	2543,827	6	6,00	0,309	5,00	9,27
K0+313,00	2544,767	2544,857	2544,967	2544,447	2544,537	2544,647	6	6,00	0,320	3,00	5,76
						TOTAL:					455,48

ALTO PROMEDIO	0,32
ANCHO PROMEDIO	9,068

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C. 1.012'390.084 DE BOGOTÁ

firma topografia contratista

NOTAS ACLARATORIAS

Los anchos aqui contemplados son los mantenidos y respetados al diseño entregado por parte de la alcaldia el dia 31 de julio del presente año, los cuales fueron a su vez relacionados en visita de obra el mismo dia

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA- RAJON CARRERA 2 ENTRE CALLE S6 Y 60

VOLUMENES DE RAJON

CONTRATISTA:	CONSORCIO GAMER SOACHA			CARTERA DE TOPOGRAFIA			Fecha:				
	RAJON			EXCAVACIÓN				CALCULO DE VOLUMENES			
ABSCISA	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	ANCHO	ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+150,00	2534,365	2534,430	2534,380	2533,950	2534,050	2533,950	10,4	10,00	0,410		-
K0+155,00	2534,479	2534,604	2534,494	2534,064	2534,164	2534,064	10,4	10,40	0,418	5,00	21,75
K0+160,00	2534,592	2534,717	2534,607	2534,177	2534,277	2534,177	10,4	10,40	0,428	5,00	22,27
K0+165,00	2534,752	2534,877	2534,767	2534,337	2534,437	2534,337	10,4	10,40	0,428	5,00	22,27
K0+170,00	2534,911	2535,036	2534,926	2534,496	2534,596	2534,496	10,4	10,40	0,428	5,00	22,27
K0+175,00	2535,073	2535,198	2535,088	2534,658	2534,758	2534,658	10,4	10,40	0,428	5,00	22,27
K0+180,00	2535,235	2535,360	2535,250	2534,820	2534,920	2534,820	10,4	10,40	0,428	5,00	22,27
K0+185,00	2535,314	2535,344	2535,294	2534,864	2534,964	2534,864	10,4	10,40	0,424	5,00	22,06
K0+190,00	2535,292	2535,387	2535,337	2534,877	2535,007	2534,907	10,4	10,40	0,414	5,00	21,54
K0+195,00	2535,562	2535,677	2535,637	2535,147	2535,277	2535,177	10,4	10,40	0,417	5,00	21,67
K0+200,00	2535,887	2535,937	2535,907	2535,417	2535,547	2535,447	10,4	10,40	0,432	5,00	22,49
K0+205,00	2535,978	2536,028	2535,998	2535,508	2535,638	2535,538	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+210,00	2536,068	2536,118	2536,088	2535,598	2535,728	2535,628	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+215,00	2536,283	2535,943	2536,303	2535,813	2535,553	2535,843	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+220,00	2536,497	2536,157	2536,517	2536,027	2535,767	2536,057	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+225,00	2536,705	2536,365	2536,725	2536,235	2535,975	2536,265	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+230,00	2536,912	2536,572	2536,932	2536,442	2536,182	2536,472	10,4	10,40	0,440	5,00	22,88
K0+235,00	2537,026	2536,686	2536,996	2536,556	2536,296	2536,586	10,4	10,40	0,432	5,00	22,45
K0+240,00	2536,719	2536,799	2536,719	2536,309	2536,409	2536,309	10,4	10,40	0,413	5,00	21,49
K0+245,00	2537,267	2537,349	2537,267	2536,857	2536,959	2536,857	10,4	10,40	0,403	5,00	20,97
K0+250,00	2537,484	2537,566	2537,484	2537,074	2537,176	2537,074	10,4	10,40	0,403	5,00	20,97
K0+255,00	2537,637	2537,729	2537,637	2537,227	2537,329	2537,227	10,4	10,40	0,405	5,00	21,06
K0+260,00	2537,790	2537,881	2537,790	2537,380	2537,481	2537,380	10,33	10,37	0,407	5,00	21,08
K0+265,00	2538,181	2538,251	2538,181	2537,771	2537,861	2537,771	9,165	9,75	0,405	5,00	19,74
K0+270,00	2538,572	2538,630	2538,572	2538,162	2538,240	2538,162	8	8,58	0,403	5,00	17,31
K0+275,00	2539,055	2539,042	2538,985	2538,575	2538,652	2538,575	7,85	7,93	0,415	5,00	16,44
K0+280,00	2539,468	2539,453	2539,398	2538,988	2539,063	2538,988	7,7	7,78	0,427	5,00	16,59
K0+285,00	2539,980	2539,993	2539,910	2539,500	2539,603	2539,500	7,7	7,70	0,427	5,00	16,43
K0+290,00	2540,492	2540,505	2540,472	2540,012	2540,115	2540,012	7,7	7,70	0,435	5,00	16,75
K0+295,00	2541,122	2541,149	2541,102	2540,642	2540,739	2540,642	7,05	7,38	0,447	5,00	16,47
K0+300,00	2541,682	2541,772	2541,732	2541,272	2541,362	2541,272	6,4	6,73	0,438	5,00	14,74
K0+305,00	2542,700	2542,790	2542,700	2542,290	2542,380	2542,290	6,4	6,40	0,418	5,00	13,39
K0+310,00	2543,717	2543,807	2543,717	2543,307	2543,397	2543,307	6,4	6,40	0,410	5,00	13,12
K0+313,00	2544,337	2544,427	2544,537	2543,927	2544,017	2544,127	6,4	6,40	0,410	3,00	7,87
					TOTAL:						655,01

ALTO PROMEDIO	0,42
ANCHO PROMEDIO	9,456

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C.
T.P. 1101061 DE BOGOTÁ

firma topografia contratista

NOTAS ACLARATORIAS

anchos aqui contemplados son los mantenidos y respetados al diseño entregado por parte de la alcaldia el dia 31 de julio del presente año, los cuales fueron a su vez relacionados en visita de obra el mismo

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA- BASE CALLE 50 ENTRE CRA 32 A ESTE Y CRA 31 ESTE

VOLUMENES DE BASE

CONTRATIST	CONSORCIO GAMER SOACHA			CARTERA DE TOPOGRAFIA			Fecha:				
ABSCISA	BASE			EXCAVACIÓN			ANCHO	CÁLCULO DE VOLUMENES			
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER		ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+042,00	93,820	93,790	93,800	93,500	93,510	93,590	4,2	4,20			-
K0+045,00	92,360	92,010	92,100	92,040	91,690	91,780	4,2	4,20	0,29	3,00	3,72
K0+050,00	90,910	90,380	90,450	90,540	90,010	90,080	4,2	4,20	0,34	5,00	7,24
K0+055,00	89,410	88,680	88,750	89,040	88,310	88,380	4,2	4,20	0,37	5,00	7,77
K0+056,00	87,910	87,020	87,050	87,540	86,650	86,680	4,2	4,20	0,37	1,00	1,55
TOTAL:											**20,28**

ALTO PROMEDIO	0,36
ANCHO PROMEDIO	4,200

AREA LOCALIZACIÓN	96,6

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C.
1.012'390.084 DE BOGOTÁ

Firma Topografia Constratista

CUADRO DE CONTROL : TOPOGRAFIA Y VOLUMENES

VIAS SOACHA- EXCAVACIÓN CALLE 50 ENTRE CRA 32 A ESTE Y CRA 31 ESTE

VOLUMENES DE EXCAVACIÓN

CONTRATISTA:	CONSORCIO GAMER SOACHA			CARTERA DE TOPOGRAFIA			Fecha:				
ABSCISA	TERRENO NATURAL			EXCAVACIÓN			ANCHO	CÁLCULO DE VOLÚMENES			
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER		ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO	LARGO	VOLUMEN (M3)
K0+042,00	93,990	93,820	93,930	93,500	93,510	93,590	3,98	4,20			-
K0+045,00	92,520	92,170	92,260	92,040	91,690	91,780	4,2	4,20	0,43	3,00	5,42
K0+050,00	91,000	90,470	90,540	90,540	90,010	90,080	4,2	4,20	0,47	5,00	9,87
K0+055,00	89,480	88,770	88,820	89,040	88,310	88,380	4,2	4,20	0,45	5,00	9,52
K0+056,00	87,960	87,070	87,100	87,540	86,650	86,680	4,2	4,20	0,43	1,00	1,82
TOTAL:											**26,63**

ALTO PROMEDIO	0,45
ANCHO PROMEDIO	4,200

AREA LOCALIZACIÓN	96,6

CATHERINE MUÑOZ MANCIPE C. C.
1.012'390.084 DE BOGOTÁ

Firma Topografia Constratista

VOLUMEN MURO EXCAVACIÓN		
ANCHO PROM(M)	ALTO PROM (M)	LONGITUD DE MURO (M)
2,2	2,4333333	14
VOLUMEN M3		74,94666667

Volumen total intervención
101,58

Informe técnico

CONSORCIO GAMER SOACHA

"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO N° 08
28 JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1

1. INTRODUCCION 3

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4

2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 4
2.2 GENERALIDADES 5

3 OBJETIVOS 6

4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO 8

6 POLIZAS DEL CONTRATO 9

7 CAPITULO FINANCIERO 13

8 VIAS ASIGNADAS 14

9 ACTIVIDADES REALIZADAS 18

9 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 24

10. CONCLUSIONES 25

11. ANEXOS 26

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4
Ilustración 2.Localizacion general 6
Ilustración 3. Localización Cazuca 6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quiénes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.


NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023

VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
MODIFICATORIO N° 1	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	11 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA N° 1	4 MESES 31 ENERO DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	31 MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
VALOR ADICION AL CONTRATO	$2.256.276.732.67
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICION	6.759.182.392.67
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

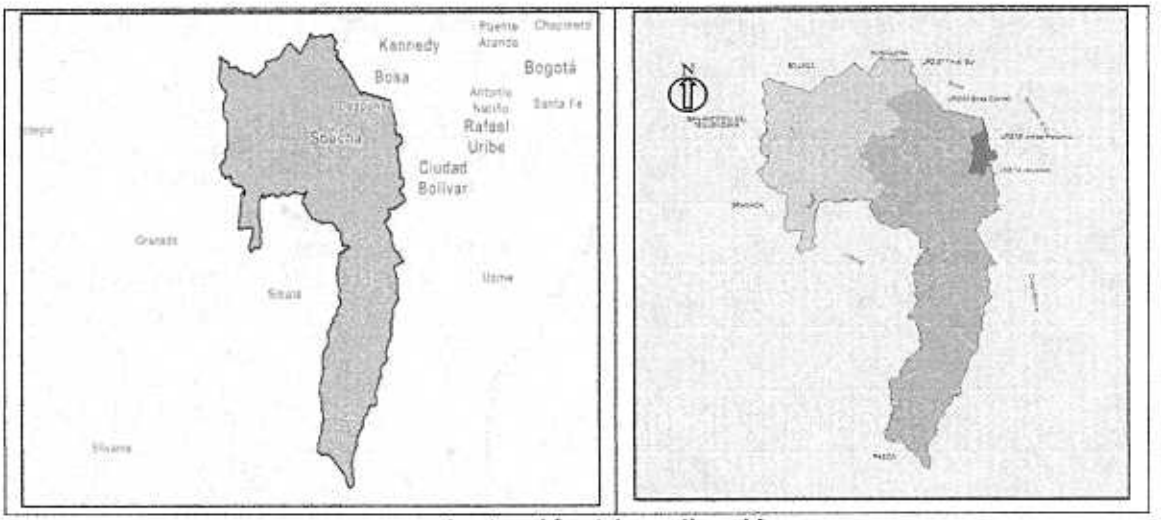

lustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898be263f

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 06, durante al periodo comprendido entre 5 Marzo del 2023 al 8 abril de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte del acta N° 6 del contrato de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

3 OBJETIVOS


Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el período de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".


4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

Lustración 2.Localización General

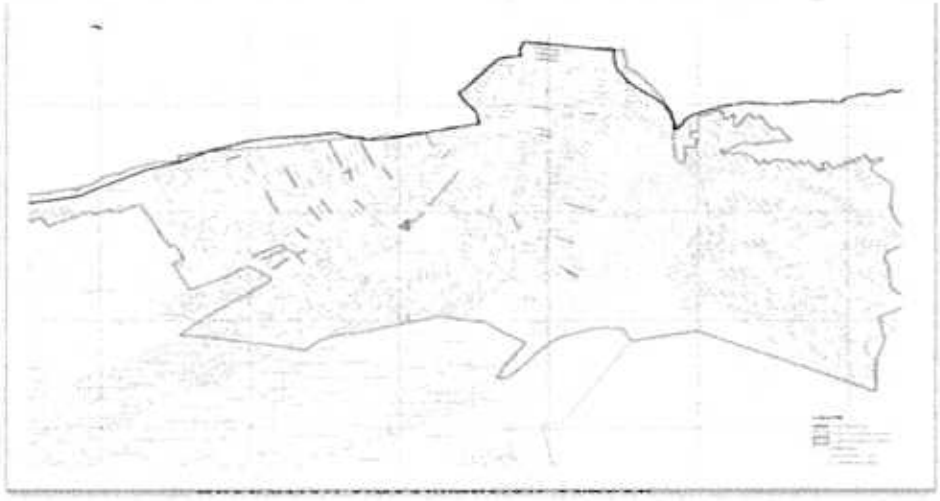

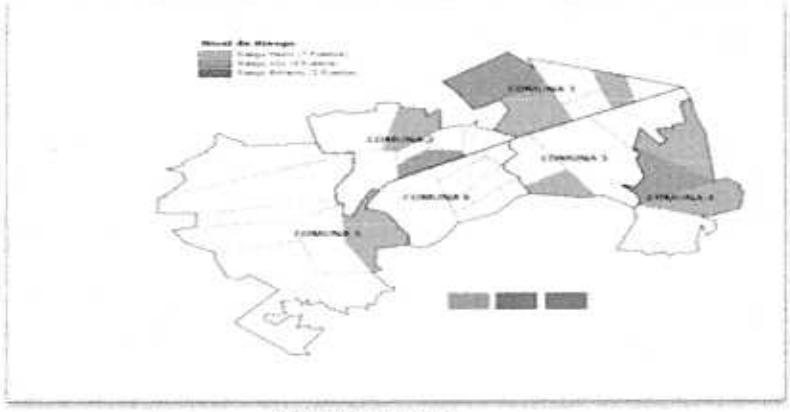

CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

4.2. Vías de Acceso a la comuna 4 – Cazuca

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 E 59-61
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 27 CON 39A -CURA
5	CALLE 27 E 43 D
6	CALLE 43D CON 27
7	CALLE 49 ENTRE 17C-19
8	CRA 19 ENTRE 59-51
9	CALLE 50 17C -21
10	CALLE 51 ENTRE 27-27D
11	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME
12	CRA 21 A ESTE 59-77 C -BOGOTA

4.2.1 Via Cra 2 entre 56-60 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	30 %	consorciogamer024@gmail.com
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6 POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual) Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023

Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101023833	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,20	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 1 Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$4.055.509.435,60	01/06/2023	01/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$1.351.836.478,53	01/06/2023	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$675.918.239,27	01/06/2023	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$2.027.754.717,80	01/11/2023	01/11/2028

Anexo 6 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/11/2023

7 CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO .
EL contrato tiene una adicion de $2.256.276.732.67 para un valor total del contrato y adicion $6.759.182.392.67

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 6.759.182.392.67
Acta No. 1	$ 649.376.068,00
Acta No. 2	$ 727.213.483,00

Acta No. 3	$ 1.003.532.431,00
Acta No. 4	$ 451.030.346
Acta No .5	$ 666.543.025
Acta No .6	$4864.672.910
Acta No .7	$ 520.537.357
Acta No. 8	$ 528.988.355
Saldo Actual	$ 1.727.288.377.67
Avance ejecutado financiero	74.25%

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8 VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa


aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

A corte del acta N° 8 en reporte, se relaciona las vías en intervención e intervenidas a la fecha corte .

Tabla 4. Vías en intervención

NUM_CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 59 -58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CALLE 49 CRA 19 E -17	INTERVENIDA
4	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
5	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
6	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
7	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
9	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
10	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 CESTE	INTERVENIDA
11	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
12	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
13	CRA 26 ESTE ENTRE CALL 58 59	INTERVENIDA
14	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
15	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
16	CALLE58 ENTRE 26A ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
17	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
18	CRA 19 ESTE CON 49-50	INTERVENIDA
19	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 39 A SUR (VIA CURA)	INTERVENIDA
20	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
21	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA
22	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 27D ESTE CON CALLE 44 -50	INTERVENIDA
24	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
25	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
26	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
27	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
28	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
29	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
30	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
31	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
32	CALLE 56 A CRA 26 27	INTERVENIDA

33	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA
34	CALLE 56B CRA 27 ESTE -CRA 27AESTE	INTERVENIDA
35	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
36	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
37	CALLE 43 BIS ETRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
38	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
39	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
40	CARRERA 32 A-CLL 44-59	FINALIZADA
41	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
42	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
43	CRA 37 ESTE DG 43J-DG.45	FINALIZADA
44	CALLE 50 CRA 32 A CRA 31	FINALIZADA
45	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
46	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43J	FINALIZADA
47	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
48	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA
49	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
50	CRA 28 ESTE CL 56A CL-59	FINALIZADA
51	CALLE 53 30-29	FINALIZADA
52	CRA 30 ESTE-CLL53 - CLLE 44	FINALIZADA
53	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
54	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
55	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
56	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
57	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 D Y 43F	FINALIZADA
58	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
59	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
60	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA
61	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
62	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
63	CRA 17 B ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
64	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
65	CRA 17 A ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
66	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
67	CRA 26 C ESTE CLL 59	ENTREGADA
68	CRA 21 B ESTE DESDE CLL 61 HASTA CLL 50	ENTREGADA
69	CRA 33 A ESTE HASTA CLL 44	ENTREGADA
70	CRA 33 ESTE HASTA CLL 44	ENTREGADA
71	CRA 27 B ESTE CLL 59	ENTREGADA
72	CRA 21A ESTE ENTRE CALLE 59 -77C BTA	ENTREGADA
73	CRA 19 ENTRE CALLE 49 -50	INTERVENIDA

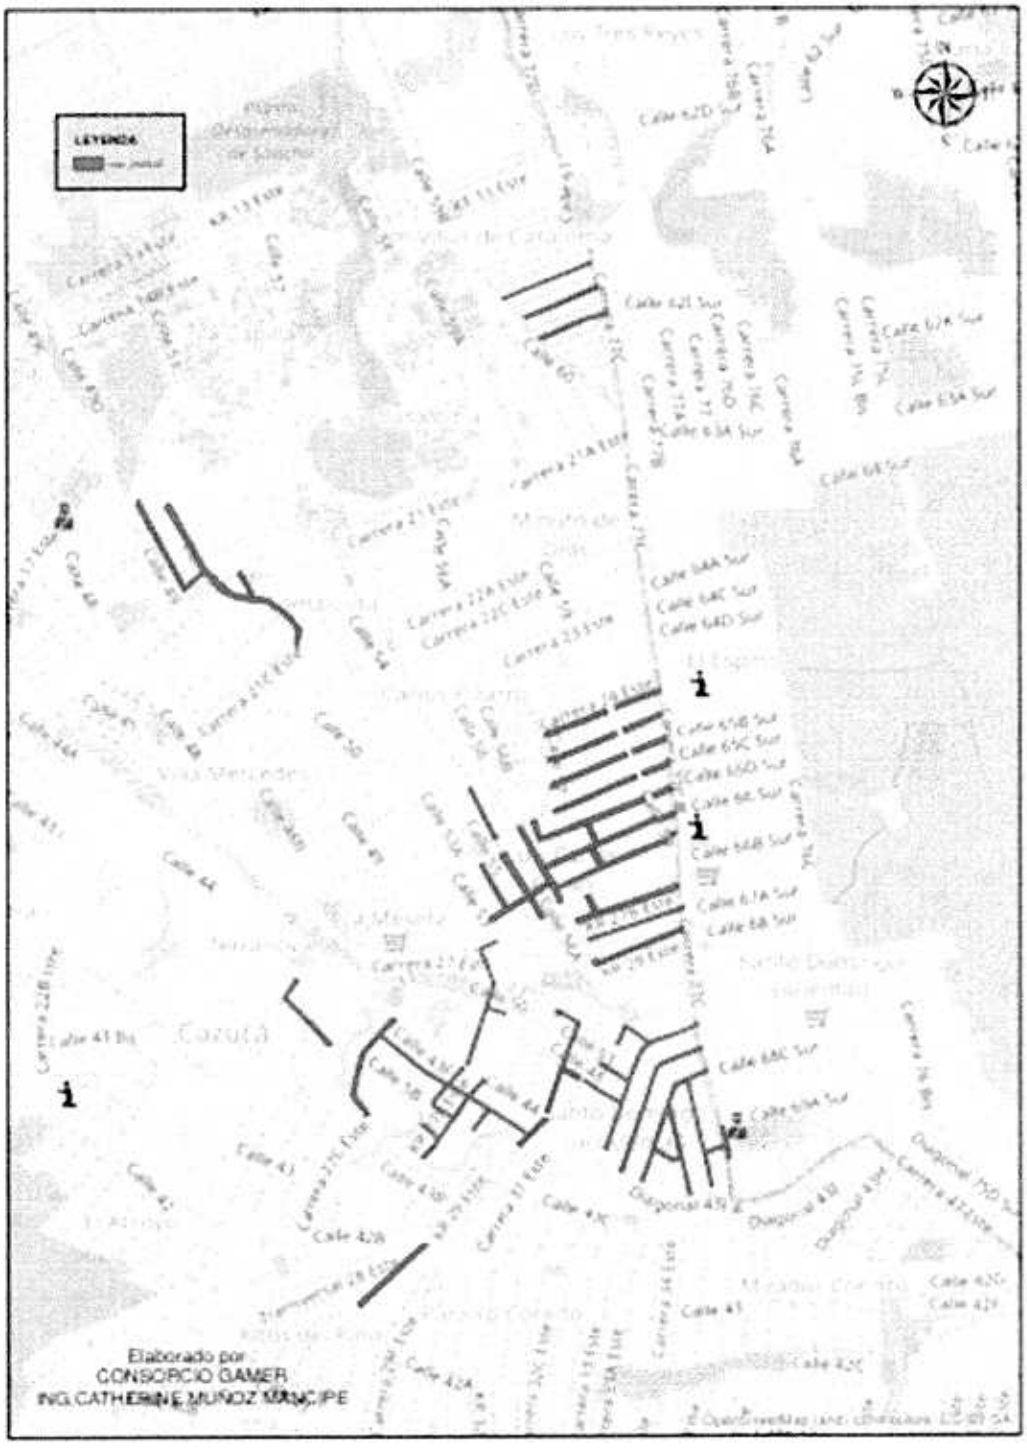

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9 ACTIVIDADES REALIZADAS


Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas en los barrios Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán, El minuto, Los pinos, relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas:



- Se retan actividades en la calle 50 entre 32ª -31 Muro Gabio, excavación en roca , geotextil , escaleras y rampa de acceso .
- Se inician excavaciones en conglomerado y maquina en la cra 2 entre 56-60 zona industrial cazuca
- Se realizan renivelaciones por lluvias según informe adjunto .
- Se realiza nivelación de rajon en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Se realiza nivelación de sub base en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Instalación de geotextil t2000 en cra 2 zona industrial cazuca
- Se realiza nivelación de base en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Ejecución de concretos, mallas , aceros en la calle 50 entre 32a-31
- se reanudan actividades en la cra 24 entre 59-61 ya que se tenía en espera de la adicion del contrato por el municipio de Soacha, quien dio aval para continuar con la intervención en la vía. Se realiza renivelación, fundida de cintas , cunetas.
- Se realiza topografía de la cras 2 entre 56-60 zona industrial cazuca
- Ser reañoza entrega de mortero en la calle 50 entre 17-21, cra 19 con 50-49, calle 49 cra 48d cra 17b , cra 24 entre 59-61 ,calle 50 cra 32ª-31
- se realiza la instalación de Bordillos lateral para el confinamiento de la vía.
- Se realiza muro según diseño en la cra 27 d calle 43f -44
- Se realizan nivelaciones de cajas, nivelación pozos, reparación acometidas
- Instlacion de adoquin en la cra 50 entre 32ª-31 y cra 27 b calle 43c – 43f
- Se realizó en trasporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha, dia azul futuro verde.



Nota: Se realizaron las actividades anteriormente descritas y todas las relacionadas en el acta parcial 8


10 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

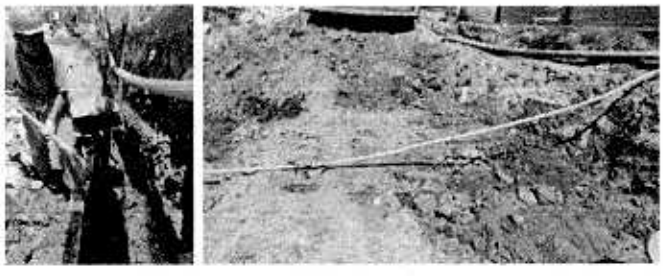	EXCAVACION ROCA EN LA CALLE 50 ENTRE 32ª -31- CALLE 49 CRA 48D -17B; CALLE 50 ENTRE 17-21
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CRA 2 ENTRE 56-60
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
	SUBASE GRANULAR SBG1 CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

	INSTALACIÓN BASE GRANULAR CRA 2 ZONA INDUSTRIAL
 	INSTALACIÓN RAJON CRA 2 ZONA INDUSTRIAL
	MEJORAMIENTO SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE
 	CONCRETO CLASE D f C 3000 PSI

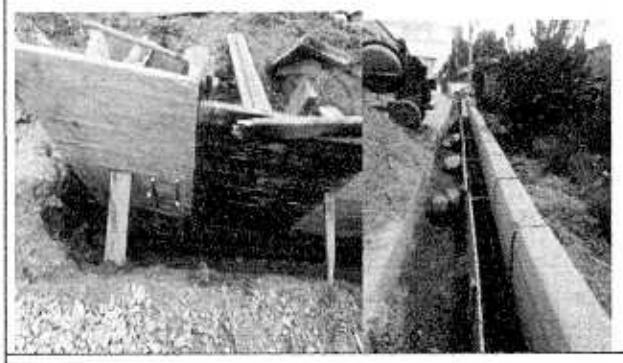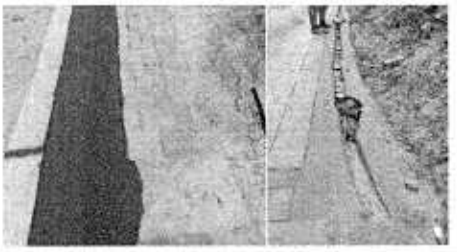	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI
	CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR
	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI
	GAVION

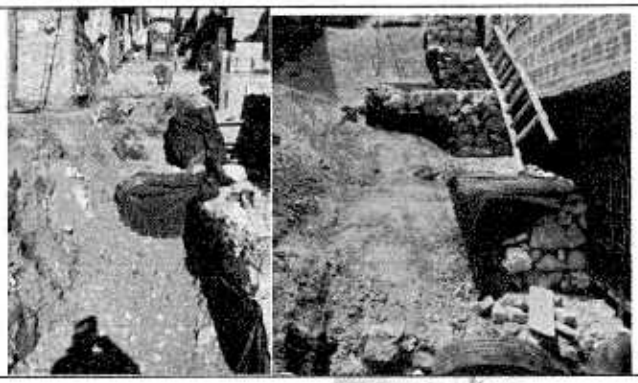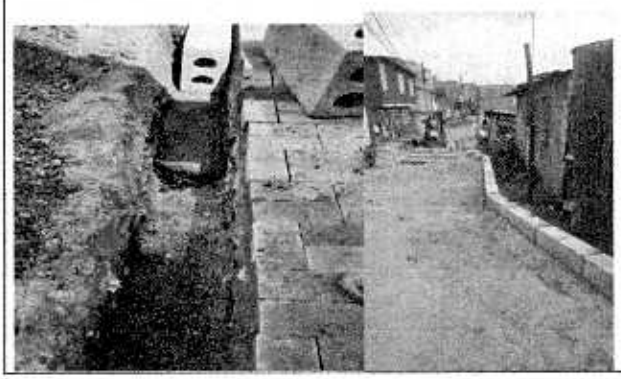	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	INSTALACION DE MORTERO 1:4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO

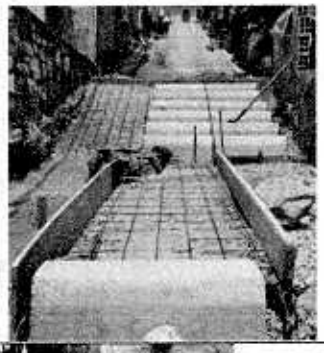 	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e 15
 	CAJAS DE INSPECCION DE 60*60
 	NIVELACION DE POZOS
	INSTLACION DE ADOQUIN DE 20*10*6 CM
  	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE 20*10*6

11 ACTAS DE COMITE

Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 8. Comités

COMITÉ N.	FECHA
36	29/06/2023
37	05/07/2023
38	07/07/2023
39	13/07/2023
40	27/07/2023
41	27/07/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente informe se radico la siguiente correspondencia:

Tabla 8. Correspondencia Recibida

No CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	RECIBIDO DE	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	17-04-2023	COCOSERING SAS	ENTREGADE DISEÑO DE ESCALERAS CRA 27F ESTE- CL 43D
CORREO ELECTRONICO	25-04-2023	COCOSERING SAS	SOLICITUD DE ARREGLO DE SARDINELES BRACARRERA 9 ENTRE CALLE 11 Y TV 7 VÍA INDUMIL.
CORREO ELECTRONICO	25-04-2023	COCOSERING SAS	SOLICITUD CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE 50 ENTRE CARRERA 31 Y 32 A ESTE DEL BARRIO SANTO DOMINGO.
CORREO ELECTRONICO	26-04-2023	COCOSERING SAS	RESPUESTA SOLICITUDES NP 13,14, 15.
CORREO ELECTRONICO	18-05-2023	COCOSERING SAS	ALCANCE A SOLICITUD DE ADICION CTO 3443-21 ID 23028 4-05-2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Tabla 9. Correspondencia Enviada

No CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	DISEÑO GEOMETRICO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CRA 2 ENTRE CLL 56 Y CLL 60
CORREO ELECTRONICO	21-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	AJUSTE ÍTEM NP 10 NO APROBADO

10. CONCLUSIONES

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.

- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.

- Para las vías según informe donde se realizaron cintas de concreto se debe tener claro que es para uso de vehículo pequeño de poco peso, un mal uso como se ha visto en las vias fraguado de 28 dias o uso (carro pesado) puede afectar las cintas y los adoquines .

- El adoquin es instalado por la comunidad por lo cual el contratista no cubre garantía alguna..

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales
Reporte de afectaciones por lluvia
Relación de material para disposición final
RUT
RIT



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

ANEXOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901587366-5	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoachanth@gmail.com	
ACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	C
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-08	E	21/07/2023	69497766	$10.153.200	

LES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0		0		0	3	1.200	0	321.200	6
Sanitas EPS	800251440-6	488.800	0		0		0	3	1.700	0	490.500	5
EPS Sura	800088702-2	154.800	0		0		0	3	600	0	155.400	3
Famisanar EPS	830003564-7	103.700	0		0		0	3	400	0	104.100	3
Nueva EPS	900156264-2	74.400	0		0		0	3	300	0	74.700	1
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	112.400	0		0		0	3	400	0	112.800	2
Reasudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.435.200	0	0	25.500	25.500	3	5.000	200	1.491.400	4
Porvenir	800224808-5	3.766.600	0	0	0	0	3	13.000	0	3.779.600	17

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	860063780-5	2.264.000				2.264.000	3	7.900	2.271.900			22.648	2.271.900	21

TOTALES CAJAS

F	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	Compensar Caja	860066942-7	1.300.500	3	4.500	1.305.000	21

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901687366-8	CONSORCIO CAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoachamfr@gmail.com	
A ACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B -- menos de 200 c			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C. -		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69457766	$10.153.200	

TOTALES PARAFISCALES

ta	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.300.500	1.305.300
Pensión	2	5.252.800	5.271.000
Riesgos Laborales	1	2.264.000	2.271.900
CCF	1	1.300.500	1.305.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.117.800	10.153.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901587388-8	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369483	gamersoachainh@gmail.com	
ACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69467766	$10.152.280	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero en Colombia	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizante Exonerado	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporta CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN
DIAZ SANCHEZ JAVIER	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0			5																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	416.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
ANDRADE JOHN FREDY	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
RIVERA RINCON NUBIA CONSUELO	1	0			5																	230301	5.100.000	816.000	0	0	25.500	25.500	EPS005	5.100.000	204.000	14-11	5.100.000	5	816.000	CCF24	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
CARO BERNAL YUM CLEMENCIA	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
BAQUERO SOTO CLEOFAS SEGUNDO	1	0			5																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS041	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	5	132.000	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
SALCEDO CUEVARES LUIS DAVID	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
FLORES FLORES ROBERT DANIEL	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
RIVERA RINCON FANNY EDITH	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ASIJUF MEDINA HECTOR JOSE	1	0			5	X																230301	272.667	43.400	0	0	0	0	EPS017	272.667	10.900	14-11	272.667	5	18.900	CCF24	272.667	10.900	0	0	0	0	0
GARCIA VILLADIEGO IGNACIO DE JESUS	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
IBARRA PEREZ FREDER DAVID	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ENRIQUEZ DURAN ALONSO SEGUNDO	1	0			5																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	155.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
TAMARE MARTINEZ JOSE ENRIQUE	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
YEPES FUENMAYOR JUAN CARLOS	1	0			5	X																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
DEVIA RAMON	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
MORENO TEQUE JOSE YONNY	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
MARIN CORDOBA JOHN CAMILO	1	0			5																	230301	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS010	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	5	107.500	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
VERA INFANTE JEAN CARLOS	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
UEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0			5																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS034	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	92.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
ARCIA MENDOZA IGNACIO DE JESUS	1	0			5																	230301	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS037	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	130.200	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, agosto 08 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8;** y yo **ADRIANA BONILLA en** mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **ocho (08)** días del mes de **agosto** de 2023.

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal

ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora

193

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **51.920.908**

BONILLA BERNAL

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-DIC-1968**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00909962-F-0051920908-20170606 0055630499A 2 9910019145

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



55341-T

ADRIANA
BONILLA BERNAL
C.C. 51928308
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 16/10/87
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

012052

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E Z 1 E Z 2 7 7 F B 2 9 7 A 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA BONILLA BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51920908 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

93ED66EF88737F3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA BONILLA BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51920908 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Carrera 2 # 56-45 Empresa Preflex	HORA DE INICIO: 9:26 Am
FECHA: 5 de Julio 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Socializacion y intervencion Proyecto Via carrera 2 entre calle 56 y 60

7

AGENDA PROPUESTA	
1.	PRESENTACION VIA A INTERVENIR.
2.	RECORRIDO INSPECCION DE ENTRADAS.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Presentar el proyecto de Pavimentación de la via y Salzacion sobre la via y el trabajo a intervenir.

SE REALIZA RECORRIDO PARA REVISAR LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS COLINDANTES. DONDE SE DETERMINA QUE LA MEJOR FORMA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ES INTERVENIR POR TRAMOS, PROBLEMANDO LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS.

198

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CRISTIAN LEYTON	CHILCO GASPAIS	3185329585	
Cristhian Gaitan	Secretaria Salud	32 4266798	
Alexander Rodriguez	Argos	3122679820	
John Pinzon	Alcaldia Soacha	3194449861	
Alejandro Cayzedo	vicysces.	7807414.	alejandro Cayzedo
Martha Inés Cortes	Recoltambores SAS	3142644133	
Sandra Figueroa	Recoltambores	3123739889	
Fredy Jamil Jimenez	Alcaldia Soacha	3005646979	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Oscar Valencia	UAEPOLSAS	3168331552	
Francisco Sanchez	Secretaria de Equipamiento	3184157762	
Juan Fernando Diaz	Gas Amigo.	3209218987.	
Javier Oquendo F	Residente Interventoría Ocasering	3105309036.	
Yesi Olaya B.	Sylda Columbia Ltda	7431449.	
Leonardo Duran U.	Inspector Tecnico	321 275 9255	
Andrés Fernández	Prettex	3013256787	
Mónica Rodríguez	Ainca.	3206142536	
Ligia Pedraza	Social. Equipamiento.	3123251499	
Guido Tulcan.	Dirección Equipamiento	3112657489.	
CRISTIAN LEYTON	CHILCO		

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Carrera 2 # 56-80	HORA DE INICIO: 8:20 AM.
FECHA: 27 de julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN: 9:30AM
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Comite de obra en la via carrera 2 con con 56 Zona Indus Trial sitio de obra para brindar la información a los Empresarios industriales presentes.

AGENDA PROPUESTA	
1.	SOCIALIZACION, INTERVENCION CARRERA 2 ZONA INDUSTRIAL
2.	PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
-SIENDO LAS 8:20 AM SE DA INICIO A LA REUNIÓN PROGRAMADA EN LA CUAL SE INTERVIENE Y DA INICIO A PARTE DEL ING JUAN PABLO CAÑON REALIZANDO LA PRESENTACION DE LAS PARTES (ALCALDIA, D. EQUIPAMENTO) INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, EPUXUA Y LOS INTERESADOS POR PARTE DE LOS INDUSTRIALES) -REALIZA LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ING MILTON REALIZANDO LA EXPLICACION DE COMO SE ESTA INTERVINIENDO Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE NECESITAN COMO EL ESPACIO Y EL PARQUEO DE MAULAS, CARROS Y DEMAS VEHICULOS QUE IMPIDAN EL PASO O LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

-SE SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A LOS INDUSTRIALES LA COLABORACIÓN PARA LA EXCAVACIÓN Y LA UBICACIÓN DEL TRANSPORTE.

-SE DA RESPUESTA A LOS INDUSTRIALES QUE GENERARON COMO TIEMPO DE INTERVENCIÓN PLAN DE TRABAJO AL MOMENTO DE INTERVENIR LAS ENTRADAS. Y EL CAMBIO O SUMINISTRO DE TUBERÍA.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Manuel Flórez	ATNC.A	3208554573	
JHon Tarazo	Recoltamsa	322 766 8444	Tarazo
Andrés Fernández	Pretex	3013256707	
Luis Fernando Barbio	Vitch Stammah Sa	3114408906	
Oscar Valencia	Vagral SAS	3123240976	
Francisco Sanchez	Servicologico	3184137362	
Mauricio Mendieta	Colnotex	3186954773	M Mendieta
Bardan Tequia	Colnotex	3202606082	B. Tequia

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Walter Vargas	Colcaotex	3164680959	
Andrés Rubio	Jardinería Rubio	3118803555	Andrés Rubio
Frank Caballero	Colmagro	3143038835	Frank Caballero.
Jose Sanchez.	Vicaysrg sas Aux contable.	3175584670	
Javier Mejia	Aigos	3108066493	
Marco Fuentes	EPUXUA	3166216313	
Mónica Rodríguez	Aimca.	3206142536	
Guido Tulcan.	Direc. Equipamiento	3112657489	
Jorge Cifuentes.	Residente Interventoría	3105709036	
Nubia Ruiz	Contratista	3102585197	
Fredy J. Jimenez	Alcaldía Soacha	3005647979	
Alejandro Yate	DEV	313-8421882	
Fernando Duarte	Cabalista	321 275 9255	
Juan Pablo C.	Epuxua	3124821154	
Milton G. Rivera	Contratista	3153467636	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO:
FECHA: 13 de Julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Validacion del estado actual del contrato de obra 024 - 2022

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	estado del contrato.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de obra a las 8:40 am, con la Validacion de los nuevos diseños de la Via Cra 2 con 56 zona industrial, para lo que se hara envio de los mismos el dia de mañana 14 de Julio.

El contratista informa que el dia lunes 17 de Julio se radicará el PMT de la via de las industriales.

los NPS estan en Validación de la Secretaria de Infraestructura para realizar el modificatorio.

la Secretaria Solicita realizar nuevamente la adecuación de la Vía. cll 42 con Trasv 28 y 29 de altos de los pinos.

En la cll 50 entre cra 32 y Cra 31A, Se realizara el cunden y cañeta al lado de los gaviones que están en construcción

la Secretaria de Infraestructura Se compromete a realizar entrega de un listado de las obras adicionales que estan en el presupuesto de la adición.

Se autoriza Fundida de rompa de acceso a la via cll 50 con cra 17C por parte de la secretaria de Infraestructura y epusca.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Freddy Jimenez	Dir. Equipamiento	3005646979	
Guido Tulcan	Direc. Equipam.	3112657489	
Alejandro Yepe	Direc Equipamiento	313 842 1556	
Fernando Daza U	Contratista.	3212739255	
Milton Rivera	Contratista	3153967636	
Yuli A. Rueda	EPUXUA.	3166216313	
EDGAR LICHE	INTERVENTORIA	3108032525	
Lorena Ortega	Interventoria	3105709036	

207

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 10:00 am.
FECHA: 07-09-23	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificacion del estado actual del contrato 024 del 2022. Verificacion Compromisos del acta anterior.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del acta anterior
2.	Verificacion del estado actual.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicia el comite de obra a las 10:00am, se espera aprobacion de los nuevos NPS - por parte de la entidad. y Epuxua.
- Generar PMT para la via Cra 2ª entre Cll 56, - para el inicio de las actividades, por parte del contratista.
- Se aprueba la demolicion de la rampa en la via Cll 43f con Cra 27d para la construccion de cuneta de 50cm de ancho por 40cm de profundidad.
- La alcaldia se compromete el suministro de los rejillas en polimercto para el cuneta en la Cll 43f.
- La alcaldia se compromete a enviar auxiliares para la gestion social con respecto a la nueva instalacion del colegio en la Cra 27d.

209

- En el muro de la Cll 50 con Cra 31. Se realizara la instalacion de geotextil para el recubrimiento de los gaviones y una cuneta lateral entre el gavion y la propiedad.
Se realizara cuneta central en la Cll 50 con Cra 31. con escalera lateral.

- Se deja para evaluacion el estudio de carcamo de proteccion para tuberia superficial en la Cra 2ª Cll 56, esto sera definido con un estudio de redes.
para la entrada a los predios se realizara instalacion de bajo rampa prefabricado con una altura de 0,05m a partir de la vaxante para el manejo del agua.

- Solicitar visita preliminar a Vanti para el suministro de informacion de redes de gas. y para las redes de agua solicitar el acompañamiento de servicios publicos de Soacha.

- Presentar un cronograma preliminar general para el inicio de la obra y la socializacion con la comunidad por parte del contratista.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Ignacio Talcan.	Direcc. Equipamiento	3112657189.	
Fredy Jimenez	Dire. Equipamiento	3005641979	
Milton Parra	Contratista	3153467630	
Leonardo Daniel U	Contratista.	321 7759255	
Alejandro Yate.	D.E	3173541686	
Marco Fuentes	EPUXUA	3166216813	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Carrera 2 # 56-80	HORA DE INICIO: 8:20 AM.
FECHA: 27 de julio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN: 9:30AM
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Comite de obra en la via carr 2 con con 56 Zona indus Trial sitio de obra para brindar la informacion a las Empresarios industriales presentes

AGENDA PROPUESTA	
1.	SOCIALIZACION, INTERVENCION CARRERA 2 ZONA INDUSTRIAL
2.	PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
-SIENDO LAS 8:20 AM SE DA INICIO A LA REUNIÓN PROGRAMADA EN LA CUAL SE INTERVIENE Y DA INICIO X PARTE DEL ING JUAN PABLO CAÑON REALIZANDO LA PRESENTACION DE LAS PARTES (ALCALDIA, D. EQUIPAMIENTO) INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, EPUXUA Y LOS INTERESADOS POR PARTE DE LOS INDUSTRIALES) -REALIZA LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ING MILTON REALIZANDO LA EXPLICACION DE COMO SE ESTA INTERVINIENDO Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE NECESITAN COMO EL ESPACIO Y EL PARQUEO DE VOLQUETAS, CARROS Y DEMAS VEHICULOS QUE IMPIDAN EL PASO O LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

- SE SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A LOS INDUSTRIALES LA COLABORACIÓN PARA LA EXCAVACIÓN Y LA EXTRACCIÓN DEL TRANSPORTE.

- SE DA RESPUESTA A LOS INDUSTRIALES QUE GENERARON COMO TIEMPO DE INTERVENCIÓN PLAN DE TRABAJO AL MOMENTO DE INTERVENIR LAS ENTRADAS. Y EL CAMBIO O SUMINISTRO DE TUBERÍA.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Manuel Flórez	AINCA	3208354573	
JHon Tavera	Pizzoltamberos	322 7668444	Tavera
Andrés Fernández	Pretex	3013256707	
Luis Fernando Barbio	Vitch Stammahsy	3114408206	
Oscar Valencia	Vagral SAS	3123240976	
Francisco Sanchez	Servicologico	3154137762	
Mauricio Mendieta	Colnatex	3186954773	M Mendieta
Brandon Taguia	Colnatex	3202606082	B. Taguia

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Walter Vargas	Colcoatex	3164680959	
Andres Rubio	Jardineria Rubio	3118803555	Andres Rubio
FRANK CABALLERO	COLIMAGRO	3143038885	FRANK CABALLERO.
Jose Sanchez.	vicaysegsas Aux contable.	3175584670	
Jovier Mejia	AIGOS	3108066493	
MARCO PUENTES	EPUXUA	3166216313	
Mónica Rodriguez	Aimca.	3206142536	
Guido Tulcan.	Direc. Equipamiento	3112657489	
Jorge Cifuentes.	Residente Interventoria	3105709036	
Nubia Ruen	Contratista	3102585197	
Fredy J. Jimenez	Alcaldia Soacha	3005647979	
Alejandro Yate	D.E.V	313-8421886	
Fernando Duarte	Cundinamarca	321 275 9255	
Juan Pablo C.	Epuxua	3124821154	
Milton S. Rivera	Contratista	3153467636	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 8:25 am.
FECHA: 29 de Jnio 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Estado Actual del contrato de Obra e Interventoria.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior
2.	Verificacion del estado Actual.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite a las 8:25 am, se revisan los pendientes del acta anterior, y se requiere de caracter urgente el concepto del especialista de vias de la secretaria de Infraestructura de la Cra 27C entre cll 39 A Sur, la interventoria solicita a epuxua y a la secretaria de infraestructura que definan las obras a (Interv.) realizarse con el presupuesto de la Adición N° 1.

la secretaria de Infraestructura se compromete a entregar el perfil y diseño geometrico de la via. y la revisión de los documentos de anexo de la cra 2.

la Socalización con los industriales se Programa para el día miercoles 05 de Jlio 2023.

el contratista de Obra se compromete a realizar entrega de los Nps de la adicion el dia 30 de junio 2023

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel 57 - 1 - 7295500 Fax 57-1-7295500
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
EDGAR E. ULLOA C.	INTERVENTORIA	3108032625	
Guido Tulcan.	Direc. Equipam.	3112657489	
Daniela Marín	EPUXUA.	322 223 1937	Daniela Cardona Marín
	Contratista	3102935197	
	EPUXUA	3166216313	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	
Lorena Agudelo	Interventora.	3105709036	
Catherine Muñoz	Contratista	3219943913	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

CERTIFICADOS DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA


INGESTRAC LABORATORIO DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS	ESPACIO RESERVADO	**INFORME DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO** **INV E 213 – 13**	CÓDIGO	FT-LB-01
			VERSIÓN	4
			FECHA	2023-04-17
			APROBÓ	Director Laboratorio

Cliente:	INCOMINERIA S.A.S.			**Fecha de recepción:**	2023-06-02
*** Dirección:**	Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca			**Fecha de Ensayo:**	2023-06-21
*** Material:**	RAJON 20 -30	**Muestra Suministrada por:**	Cliente	**Informe N°**	1928
Muestra No.:	3779-23	*** Procedencia:**	Cantera		

Condiciones ambientales durante la ejecución del ensayo

Humedad relativa (%)	Inicial:	58	Final:	60	Temperatura ambiente (°C)	Inicial:	22,1	Final:	22,6

Masa antes de lavado (g)		83620,0	Masa después de lavado (g)		82488,0
Tamiz		*Masa retenida*	*Porcentaje retenido (%)*	*Porcentaje retenido acumulado*	*Porcentaje pasa (%)*
(in)	*(mm)*	*(g)*		*(%)*	
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
		0,0	0	*0*	100
10"	264,0	*0,0*	0	*0*	100
3"	*75*	*45862,0*	55	*55*	45
1"	*25,4*	*21766,9*	26	*81*	19
No4	4,8	*7735,9*	9	*90*	10
No 40	0,4	*6082,0*	7	*97*	3
No 200	0,1	*1013,8*	1	*98,6*	1,4
Fondo		1159,4	1,4	*100*	
Total		*83620,0*	100		

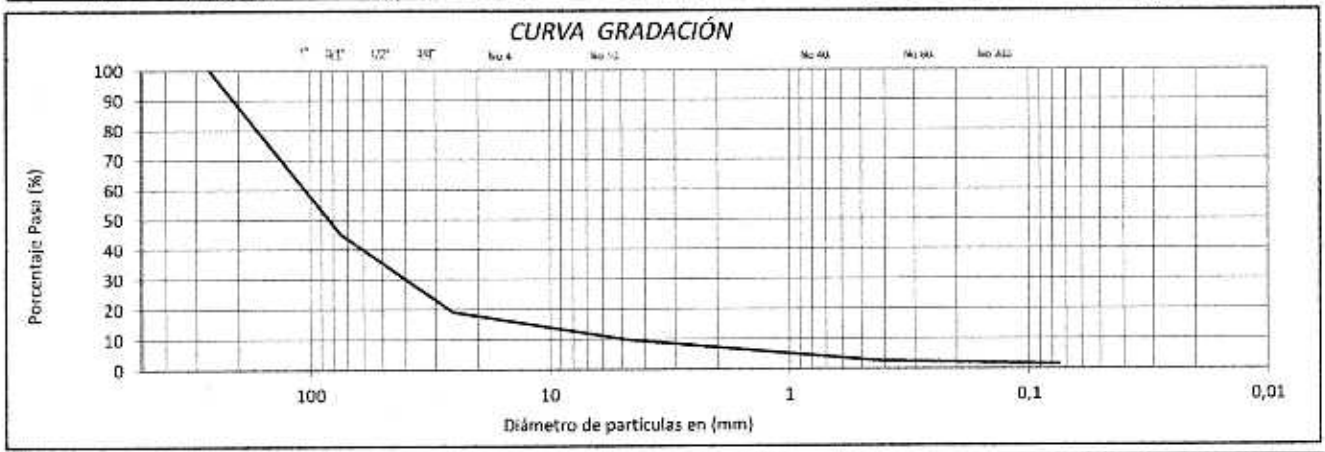

Comentarios / Observaciones:

OBSERVACIONES

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas en las instalaciones del Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
- No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando haya obtenido permiso por escrita del laboratorio que lo emite.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El usuario es responsable de realizar la cantidad de ensayos a intervalos apropiadas para sus muestras, acorde al volumen o numero de lotes producidos
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestra, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por parte del cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para los muestreos, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO	FECHA DE EMISIÓN
Liliana Espejo		2023-07-06
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER	
JEFE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO	


INGESTRAC LABORATORIO DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS	ESPACIO RESERVADO	**INFORME DE ENSAYO LIMITES DE CONSISTENCIA** **INV E 125 – 13 / INV E 126 – 13**	CÓDIGO	FT-LB-02
			VERSIÓN	4
			FECHA	2023-04-17
			APROBÓ	Director Laboratorio

Cliente:	INCOMINERIA S.A.S.			**Fecha de recepción:**	2023-06-02
*** Dirección:**	Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca			**Fecha de Ensayo:**	2023-06-21
*** Material:**	RAJON 20-30	**Muestra suministrada por:**	Cliente	**Informe No.**	1928
Muestra No.:	3779-23	*** Procedencia:**	Cantera		

Condiciones ambientales durante la ejecución del ensayo								
Humedad relativa (%)	**Inicial:**	58	**Final:**	60	**Temperatura ambiente (°C)**	**Inicial:**	22,1	**Final:** 22,6

DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS MÉTODO A - INV E 125 – 13			
No. de tara			
No. de golpes cazuela (N)			
Masa tara (g)			
Masa tara + material húmedo (g)			
Masa tara + material seco (g)			
Masa del agua (g)			
Masa material seco (g)			
Porcentaje de humedad (%)	-	-	-

DETERMINACIÓN DEL LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS - INV E 126 – 13			
No. de tara			
Masa tara (g)			
Masa tara + material húmedo (g)			
Masa tara + material seco (g)			
Masa del agua (g)			
Masa material seco (g)			
Porcentaje de humedad (%)	-	-	-

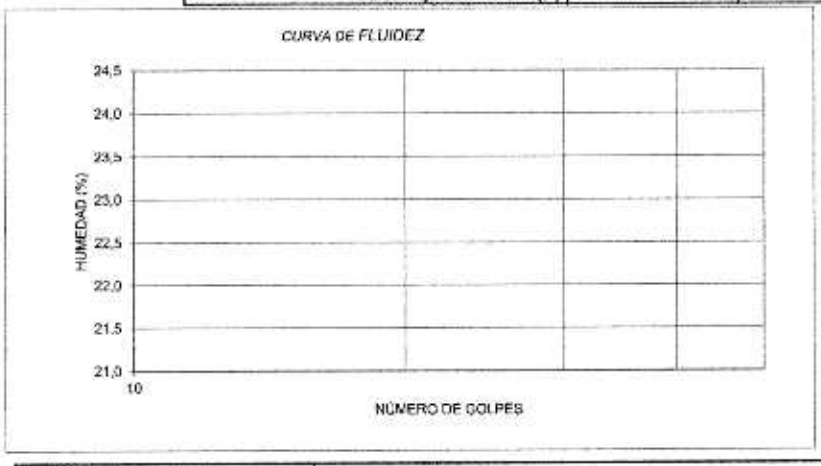

Limite liquido (LL)	**(%)**	NP
Limite Plástico (LP)	**(%)**	NP
Índice de plasticidad (IP)	**(%)**	NP

Comentarios / Observaciones:

OBSERVACIONES

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas en las instalaciones del Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
- No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El usuario es responsable de realizar la cantidad de ensayos o intervalos apropiados para sus muestras, acorde al volumen o numero de lotes producidos
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestreo, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por parte del cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para los muestreos, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	**AUTORIZO**	**FECHA DE EMISIÓN**
Liliana Espejo		2023-07-06
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER	
JEFE LABORATORIO	**DIRECTOR LABORATORIO**	

INGESTRAC LABORATORIO DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS	ESPACIO RESERVADO	**INFORME DE ENSAYO RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES** **INV E 218 – 13 / INV E – 219**	CÓDIGO	FT-LB-08
			VERSIÓN	4
			FECHA	2023-04-18
			APROBÓ	Director Laboratorio

Cliente:	INCOMINERIA S.A.S.			**Fecha de recepción:**	2023-06-02
*** Dirección:**	Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca			**Fecha de Ensayo:**	2023-06-21
*** Material:**	RAJON 20 -30	**Muestra Suministrada por:**	Cliente	**Informe N°**	1928
Muestra No.:	3779-23	*** Procedencia:**	Cantera		

Condiciones ambientales durante la ejecución del ensayo									
Humedad relativa (%)	**Inicial:**	55	**Final:**	59	**Temperatura ambiente (°C)**	**Inicial:**	23,8	**Final:**	24,1

DESGASTE MAQUINA DE LOS ÁNGELES	
Condición	Seco
Granulometría usada	1,0
Número de esferas	12
Masa esferas (g)	4995
Número de revoluciones	1000
P1 : Masa de la muestra seca antes del ensayo (g)	10010
P2 : Masa de la muestra seca después del ensayo (g)	6893
Porcentaje de desgaste (%)	31,1

TAMAÑO TAMIZ		**MASA DE LA FRACCIÓN INDICADA (g)**						
		INV E 218				**INV E 219**		
PASA	**RETENIDO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**1**	**2**	**3**
3" (75mm)	2 1/2" (63mm)					2500 ± 50		
2 1/2" (63mm)	2" (50 mm)					2500 ± 50		
2" (50 mm)	1 1/2" (37,5 mm)					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2"(37,5 mm)	1" (25 mm)	1250 ±25					5000 ± 25	5000 ± 25
1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1250 ±25						5000 ± 25
3/4" (19 mm)	1/2" (12.5 mm)	1250 ±10	2500 ± 10					
1/2" (12.5 mm)	3/8" (9.5 mm)	1250 ±10	2500 ± 10					
3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)			2500 ± 10				
1/4" (6.3 mm)	No.4 (4.75 mm)			2500 ± 10				
No.4 (4.75 mm)	No.8 (2.36mm)				5000 ± 10			
Número de esferas		12	11	8	6	12	12	12
Masa de la carga		5000 ± 25	4584 ± 25	3330 ± 25	2500 ± 15	5000 ± 25	5000 ± 25	5000 ± 25
Número de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

Comentarios / Observaciones:

OBSERVACIONES

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas en las instalaciones del Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
- No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El usuario es responsable de realizar la cantidad de ensayos a intervalos apropiados para sus muestras, acorde al volumen o numero de lotes producidos
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestreo, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por parte del cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para los muestreos, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	**AUTORIZO**	**FECHA DE EMISIÓN**
Liliana Espejo		2023-07-06
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER	
JEFE LABORATORIO	**DIRECTOR LABORATORIO**	

FIN DEL DOCUMENTO

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia / e-mail: laboratorio@ingestrac.co

Sello de Calidad

icontec Internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO TIPOS UG Y ART

Fabricado por **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.**, en la **Carrera 11 No. 75 – 19, Bogotá; PLANTA: Vereda Chitiva Abajo, Finca La María, Suesca, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.**, in the **Carrera 11 No. 75 – 19, Bogotá; PLANTA: Vereda Chitiva Abajo, Finca La María, Suesca, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2014)

Especificación de desempeño para cemento hidráulico

Performance specification for hydraulic cement

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC -CER468310
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-05-27
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-05-24
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-05-26
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANSI

ENTREGA LABORATORIOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No.

480-2-94-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA
SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION: B400

OSC: 218
TIPO : B400
FECHA DE ENSAYO : 17-jun-23
FECHA ENTREGA: 18-jun-23
CAPA: UNICA

Densidad N°		1	2	3	4	5	
Ubicación		CL 50 KR 21	CL 50 KR 21B	KR 19 CL 49	CL 49 KR 17C	KR 27B CL 43D	
Capa		UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	
Profundidad	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Abscisa		CL 50 KR 21	CL 50 KR 21B	KR 19 CL 49	CL 49 KR 17C	KR 27B CL 43D	
Sector		VIA	VIA	VIA	SBG	SBG	
Margen		EJE	EJE	DERECHA	EJE	DERECHA	
Peso frasco y arena inicial	gr	6357	6294	6200	6120	6030	
Peso frasco y arena restante	gr	2303	2582	2688	2456	2292	
Peso arena total usada	gr	4054	3712	3512	3664	3738	
Constante del cono	gr	1636	1636	1636	1636	1636	
Peso arena en el hueco	gr	2418	2076	1876	2028	2102	
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
Volumen del hueco	gr	1778	1526	1379	1491	1546	
Peso material extraído húmedo	gr	3680	3050	2730	2994	3236	
Humedad	%	8,5	8,4	8,5	8,4	8,3	
Peso material extraído seco	gr	3392	2814	2516	2762	2988	
Densidad del material	gr/cm³	1,908	1,843	1,824	1,852	1,933	
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	
Humedad óptima laboratorio	%	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
Compactación en el terreno	%	**99,5**	**96,1**	**95,1**	**96,6**	**100,8**	
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	

OBSERVACIONES:

ELABORO	ERNAN AGUILERA	REVISO	NOEL RICO NAVARRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

INFORME
FACTOR CLIMATICO

CONSORCIO GAMER SOACHA

CONSORCIO GAMER SOACHA

Contrato 024 del 2022 julio del 2023

Informe Técnico de Lluvia y su Impacto en el Material de Subbase

Introducción:

Las lluvias presentadas en las semanas del 20 de junio al 15 de julio del del 2023 reflejaron un impacto significativo en el material de subbase en las vias del **barrio Luis Carlos Galan II y Loma linda** Los efectos de la lluvia incluyen socavación, erosión, arrastre de finos y pérdida de material por el agua, generando la necesidad de reacondicionar el material de subbase y afectaciones en las cunetas laterales con el arrastre de material.

Análisis:

Debido a la accion de las corrientes de agua que fluyen a lo largo de las superficies de la via, se genera **socavación** en la superficie de la subbase, esto evidenciado en la perdida de material (en su mayoria material fino) generando zanjas y exponiendo el material grueso. Otro de los factores mas significativos en la subbase, fue la **erosión** generada por el impacto del agua lluvia de las casas hacia la superficie, debiliando la subbase hasta que el constante impacto rompe la estabilidad del material, generando asi que la subbase pierda su densidad y empiece a **saturarse** por la filtración del agua. Se ha solicitado por parte del contratista la canalizacipon de las aguas lluvias, en las vias afectadas se ha echo caso omiso a esta petición.

Las vias afectadas por estos fenomenos fueron:

CRA 21 entre CLL 50 y CLL 49



Longitud	Ancho	Espesor	Volumen
27,0 m	5,2 m	0,1 m	14,04 m3

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la perdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adicion de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 27 B entre CLL 43f y CLL43d



Longitud	Ancho	Espesor	Volumen
40,0 m	2,0 m	0,05 m	4,00 m3


« Debido a la pendiente de la vía, recibe las aguas de las calles **CLL 43f y CLL43d,** el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas en la subbase y revelando la subrasante.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la perdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adicion de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CRA 24 entre CLL 61 y CLL 59

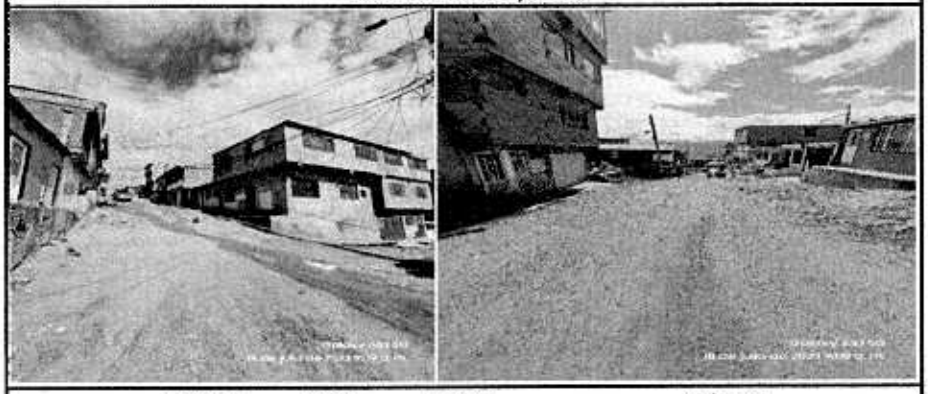

Longitud	Ancho	Espesor	Volumen
75,0 m	5,5 m	0,10 m	41,25 m3

« Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la **CLL 61,** el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas la subrasante

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subrasante por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando sutaración y fallos en el material

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la excavación del material suturado y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación en

CLL 50 entre CRA 22 y CRA 21



Longitud	Ancho	Espesor	Volumen
45,0 m	2,5 m	0,07 m	7,88 m3

« Debido a la pendiente de la vía, la cual se incrementa hacia la **CRA 17,** el agua se acumula generando un caudal elevado que genera zanjas en la subbase y revelando la subrasante.

« La calle presenta degradación en la capa superficial de material de subbase por acción del agua que ha generado una grave socavación, provocando la perdida de material fino y grueso.

« Se presentan áreas en el material donde la filtración del agua genero saturación, por lo cual es necesaria la extracción de este material.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adicion de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

CLL 50 entre CRA 22 y CRA 21			
			
Longitud	**Ancho**	**Espesor**	**Volumen**
60,0 m	0,2 m	0,10 m	1,20 m3

« Las cunetas presentan una perdida importante de material granular debido al arrastre de la lluvia, teniendo en cuenta la pendiente de la via y las aguas que recibe desde la **CRA 22a** se encuentra un caudal acumulado lo suficientemente fuerte para causar esta afectación.

« Para la reparación de estas afectaciones es necesaria la adicion de material nuevo y realizar nueva mente las actividadesde nivelación y compactación

Conclusión:

Ante los efectos negativos generados por la lluvia en el material de subbase, se llevó a cabo una solución eficaz para garantizar su estabilidad y durabilidad. Se realizó el levantamiento del material afectado, se eliminó el material que ya no tenía presencia de finos o se encontraba saturado, se llevó a cabo la renivelación de subbase, que se encontraba por debajo del nivel requerido, se agregó más material de subbase y finalmente se compactó. De esta manera, se logró resolver los problemas generados por la lluvia en el material y garantizar la estabilidad de la estructura. Se debe tener en cuenta que las afectaciones se presentaron en vías entregadas para la instalación de adoquín por parte de la comunidad, instalación que no se realizo al debido momento.

_____

Entrego

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46304

FECHA 14 | MAR | 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Comfer Soacha
OBRA	Contrato 024 2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Sencillo
PLACA VEHICULO	BAN 519 — 7 M3
CONDUCTOR	Ilca Nena
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Calidad Rayos • Nit. 51.873.705-4 • Cel. 312 811 1676

CEMENTO	
total bodega	soporte No.

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46305

CLIENTE	Consorcio Comer Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 509 — 7 M3
CONDUCTOR	Ivan Neira
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

IMPRESORES • Cristo Rey • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 11/07/22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46306

CLIENTE	Consorcio Comer Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 509 — 7 M3
CONDUCTOR	Ivan Neira

IMPRESORES • Cristo Rey • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 11/7/22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46307

CLIENTE	Consorcio Comer Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 509 — 7 M3
CONDUCTOR	Ivan Neira
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

IMPRESORES • Cristo Rey • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 7 | 23

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN Nº 46276

CLIENTE: Consorcio Gama Soacha

OBRA: Contrato 024-2022

DIRECCION: Comuna 4 Soacha

MATERIAL: Excavación

PLACA VEHICULO: BAK 599 — M3

CONDUCTOR:

DESPACHADO POR: Leonardo Deva.

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposición Final de Escombros

Overol Op L.		1			
Chaleco refle		1			
Tapa oidos		1			
Papel higienico		12.			
Cafe.		1			
Azucar		1			

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07 | 07 | 23

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN Nº 46280

CLIENTE: Consorcio Gama Soacha

OBRA: Contrato 024-2022

DIRECCION: Comuna 4 Soacha

MATERIAL: Excavación

PLACA VEHICULO: BAK 599 — M3

CONDUCTOR:

DESPACHADO POR: Leonardo Deva.

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 5 | 7 | 23

REMISIÓN Nº 46274

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamex Soacha.
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Sobrante
PLACA VEHICULO	BAK 599. — 7 M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Leonardo Devia.

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 7 | 23

REMISIÓN Nº 46275

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamex Soacha.
OBRA	Contrato 024-2022.
DIRECCION	Comuna 4 Soacha.
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	BAK 599. — 7 M3
CONDUCTOR	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 7 | 23

REMISIÓN Nº 46277

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamex Soacha.
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Sobrante
PLACA VEHICULO	BAK 599. — 7 M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Leonardo Devia.

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 7 | 23

REMISIÓN Nº 46278

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamex Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Sobrante
PLACA VEHICULO	BAK 599. — 7 M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Leonardo Devia.

MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposicion Final de Escombros

232

Obra 7 Soacha

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 9 | 22

REMISIÓN Nº 46272

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Germal Soacha
OBRA	Contrato 024-2022.
DIRECCION	Comuna 4 Soacha.
MATERIAL	Excavación Terreno
PLACA VEHICULO	BAK 599. — M3
CONDUCTOR	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 6 | 9 | 22

REMISIÓN Nº 46273

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Germal Soacha.
OBRA	Comuna 4 Soacha
DIRECCION	Contrato 024-2022.
MATERIAL	Excavación Terreno
PLACA VEHICULO	BAK 599. — M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Leonardo Devia.

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

REMISIÓN Nº 46218

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamma Soacha
OBRA	Cartuche 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

PROYECTO
N°D11847
Placa No.
Fecha

3 352 0600 - 3136271274
3106135580

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

REMISIÓN Nº 46219

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Gamma Soacha
OBRA	Cartuche 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Nubia

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 31 | 3 | 23

REMISIÓN Nº 46214

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato C2A-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO M3
CONDUCTOR

MAGIR SAS. ESP

IMPRESORES • Calle Ayos • Nit. 51.873.285-4 • Cel. 317 221 1624

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 16 | 4 | 23

REMISIÓN Nº 46217

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato C2A-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO M3
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Fernando Devia

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

IMPRESORES • Calle Ayos • Nit. 51.873.285-4 • Cel. 317 221 1624

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46231

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO BAK 549
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 18 04 22

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46232

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO BAK 549
CONDUCTOR

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46236

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO BAK 549
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Leonardo Orejuela
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 20 04 22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46235

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO BAK 549
CONDUCTOR Leonardo Orejuela
DESPACHADO POR:

M3

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46267

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO BAK 549
CONDUCTOR Leonardo Orejuela
DESPACHADO POR:

M3

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46211

CLIENTE Consorcio Comp Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46208

CLIENTE Consorcio Comp Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO 0162 292
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE

REMISIÓN Nº 46229

CLIENTE Consorcio Comp Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 590
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46233

CLIENTE Consorcio Comp Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
M3
PLACA VEHICULO BAK 590
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46230

CLIENTE Consorcio Comp Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
M3
PLACA VEHICULO BAK 590
CONDUCTOR ACHERO
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46171

FECHA

ORDEN CLIENTE

CLIENTE Consorcio Comercio Soacha.
OBRA Contrato C24-2022
DIRECCION Comercio Acceso Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46207

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Comercio Soacha
OBRA Contrato C24-2022
DIRECCION Comercio Acceso Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR
DESPACHADO POR

M3

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46226

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Comercio Soacha
OBRA Contrato C24-2022
DIRECCION Comercio Acceso Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46228

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Comercio Soacha
OBRA Contrato C24-2022
DIRECCION Comercio Acceso Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR
DESPACHADO POR

M3

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46227

FECHA

ORDEN CLIENTE

CLIENTE Consorcio Comercio Soacha
OBRA Contrato C24-2022
DIRECCION Comercio Acceso Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46319

CLIENTE	Consorcio Gomez Cacha
OBRA	Ciudad 024-2022
DIRECCION	Cra 4 Cacha
MATERIAL	Escombros Sencillo
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP

IMPRESORES • Calle 6 Bogotá • Tel. 311 312 2154 • Cel. 312 321 1628

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46321

CLIENTE	Consorcio Gomez Cacha
OBRA	Ciudad 024-2022
DIRECCION	Cra 4 Cacha
MATERIAL	Escombros Sencillo
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	

IMPRESORES • Calle 6 Bogotá • Tel. 311 312 2154 • Cel. 312 321 1628

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA 29 07 17

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46320

CLIENTE	Consorcio Gomez Cacha
OBRA	Ciudad 024-2022
DIRECCION	Cra 4 Cacha
MATERIAL	Escombros Sencillo
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

IMPRESORES • Calle 6 Bogotá • Tel. 311 312 2154 • Cel. 312 321 1628

Señores INTERVENTORIA
Ing. Jorge Enrique Bautista
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO BUENOS AIRES

CC GALU

Certificación del director - de obra

Insert

239

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 20338

Fecha 27/07/2023

Obra/Frente Conjunto Cerrado Portal 82 II

Placa de Vehículo B.A. FUNDACIÓN

Nombre de Conductor

Cédula

Tipo de Material Escombros

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KMS

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46315

FECHA

ORDEN CLIENTE

CLIENTE	Conjunto Cerrado Portal
OBRA	Portal 82 II
DIRECCION	Conjunto Cerrado Portal
MATERIAL	Escombros
PLACA VEHICULO	B.A. FUNDACIÓN
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
0	
	34,60
	34,60

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Conjunto Cerrado Portal
OBRA	Portal 82 II
DIRECCION	Conjunto Cerrado Portal
MATERIAL	Escombros M3
PLACA VEHICULO	B.A. FUNDACIÓN
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46318

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Conjunto Cerrado Portal
OBRA	Portal 82 II
DIRECCION	Conjunto Cerrado Portal
MATERIAL	Escombros M3
PLACA VEHICULO	B.A. FUNDACIÓN
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46317

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato 024 2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR Ilver Neira

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46313

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato 024 2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR Ilver Neira

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46311

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato 024 2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR Ilver Neira

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46312

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato 024 2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR Ilver Neira

M3

DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN Nº 46314

CLIENTE Consorcio Gamma Soacha
OBRA Contrato 024 2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO BAK 519
CONDUCTOR Ilver Neira

M3

DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

21

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 20339

Fecha 17/07/2022

Obra/Frente Conser Soacha NIT 901582408

Placa de Vehículo: BAK 599

Nombre de Conductor: Jhon Nelvi

Cédula:

Tipo de Material: Soloconcreto

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46308

FECHA 17

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Conser Soacha
OBRA	Contrato 024 2022
DIRECCION	Conjunto 4 Soacha
MATERIAL	Escombro Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 599 7 M3
CONDUCTOR	Jhon Nelvi
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46309

FECHA 17

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Conser Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Conjunto 4 Soacha
MATERIAL	Escombro Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 599 7 M3
CONDUCTOR	Jhon Nelvi
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46310

FECHA 17

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Conser Soacha
OBRA	Contrato 024 2022
DIRECCION	Conjunto 4 Soacha
MATERIAL	Escombro Sencillo
PLACA VEHICULO	BAK 599 7 M3
CONDUCTOR	Jhon Nelvi
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

→ Intervention – acta
que

→ Planos record – Finalizar Contrato

→ Tipo Via – Pendiente – 10% inclinación } PH
Necesidad.

292

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENT

REMISIÓN Nº 46328

CLIENTE Consorcio Gomez Soacha
OBRA Contrato 021-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO
CONDUCTOR

MAGIR SAS. ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENT

REMISIÓN Nº 46329

CLIENTE Consorcio Gomez Soacha
OBRA Contrato 021-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO WGZ292
CONDUCTOR

MAGIR SAS. ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA

ORDEN CLIENT

REMISIÓN Nº 46327

CLIENTE Consorcio Gomez Soacha
OBRA Contrato 021-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:
Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18303

Fecha 12/07/2023
Obra/Frente Gomez Soacha-NIT: 901587366-
Placa de Vehiculo: WGZ 292
Nombre de Conductor: Hilario Rodriguez
Cédula:
Tipo de Material: Escavacion

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18302

Nota: NIT: 901587366-8
Fecha Gomezing NIT: 901082172
Obra/Frente 27/07/2023.
Placa de Vehiculo: WGZ292
Nombre de Conductor: Hilario Rodriguez
Cédula:
Tipo de Material: Escavacion

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

243

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46322

FECHA

ORDEN CLIEN

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO 15
CONDUCTOR
DESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46323

FECHA 29

ORDEN CLIEN

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO 15
CONDUCTOR
DESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46324

FECH

ORDEN CLI

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO 15
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46325

FECHA 24/01/23

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO 15 M3
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46326

FECHA 29/01/23

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Gamer Soacha
OBRA Contrato 024-2022
DIRECCION Comuna 4 Soacha
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO W62292 15 M3
CONDUCTOR
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28-11

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN Nº 46241

CLIENTE: Consorcio Gamer Soacha.
OBRA: Contrato 024-2022.
DIRECCION: Comuna 4 Soacha.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO:
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28-11

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN Nº 46242

CLIENTE: Consorcio Gamer Soacha.
OBRA: Contrato 024-2022.
DIRECCION: Comuna 4 Soacha.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO:
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28-11

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN Nº 46243

CLIENTE: Consorcio Gamer Soacha.
OBRA: Contrato 024-2022.
DIRECCION: Comuna 4 Soacha.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO:
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Leonardo Devia.
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28-11-22

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN Nº 46244

CLIENTE: Consorcio Gamer Soacha.
OBRA: Contrato 024-2022.
DIRECCION: Comuna 4 Soacha.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO:
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR:

M3

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28-11-22

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN Nº 46245

CLIENTE: Consorcio Gamer Soacha.
OBRA: Contrato 024-2022.
DIRECCION: Comuna 4 Soacha.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO:
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Leonardo Devia.

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18191

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio 6 SMER sur

Placa de Vehículo: THX FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Yuber Fernández

Cédula: 1[illegible]

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18186

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio 6 SMER sur

Placa de Vehículo: THX FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Yuber Fernández

Cédula: 1[illegible]

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18194

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio 6 SMER sur

Placa de Vehículo: THX FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Yuber Fernández

Cédula: 1[illegible]

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

INSPECTOR INTERVENTORIA INSPECTOR CONTRATISTA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18188

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio 6 SMER sur

Placa de Vehículo: THX FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Yuber Fernández

Cédula: 1[illegible]

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

246

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18193

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GAMEN sucursal

Placa de Vehículo: SMP 224

Nombre de Conductor: Hernan Libreros

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Escombros

Volqueta Doble Troque ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352

fundacion@aazulfuturoverde@hotmail.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18179

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GAMEN sucursal

Placa de Vehículo: SMP 224

Nombre de Conductor: Hernan Libreros

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Escombros

Volqueta Doble Troque ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18190

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GAMEN sucursal

Placa de Vehículo: SMP 224

Nombre de Conductor: Hernan Libreros

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Escombros

Volqueta Doble Troque ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352

fundacion@aazulfuturoverde@hotmail.com

www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18180

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GAMEN sucursal

Placa de Vehículo: SMP 224

Nombre de Conductor: Hernan Libreros

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Escombros

Volqueta Doble Troque ☐

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352

fundacion@aazulfuturoverde@hotmail.com

www.diaazulfuturoverde.com

247

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18187

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GSMER Suba

Placa de Vehículo: TK FUNDACION

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavacion

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18192

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GSMER Suba

Placa de Vehículo: TK FUNDACION

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavacion

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18189

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Consorcio GSMER Suba

Placa de Vehículo: TK FUNDACION

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavacion

Volqueta Doble Troque [X]

JONATHAN OLI
FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Salario $_____ mensual, fecha de

MILTON RIVERA

poica@gmail.com
158369463

209

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18172

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto GAMER south

Placa de Vehículo: TKC FUNDACIÓN 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18183

Fecha 29-07-2023

Obra/Frente TKC 522

Placa de Vehículo: Conjunto GAMER south

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18175

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto GAMER south

Placa de Vehículo: TKC FUNDACIÓN 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18181

Fecha 29-07-2023

Obra/Frente Conjunto GAMER south

Placa de Vehículo: TKC FUNDACIÓN 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18171

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto Ciudad Soacha

Placa de Vehículo: STD FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Hernan Tibaquira

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18169

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto Ciudad Soacha

Placa de Vehículo: TK FUNDACIÓN 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18174

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto Ciudad Soacha

Placa de Vehículo: STD FUNDACIÓN

Nombre de Conductor: Hernan Tibaquira

Cédula: 79800144

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. Nº 18177

Fecha 28-07-2023

Obra/Frente Conjunto Ciudad Soacha

Placa de Vehículo: TK FUNDACIÓN 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80751664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

25A

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. **Nº 18197**

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Conjunto Edificio Sucre

Placa de Vehículo: THX 899

Nombre de Conductor: Nombre y Apellidos

Cédula: 1017 [illegible] 45

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. **Nº 18195**

Fecha 31-07-2023

Obra/Frente Conjunto Edificio Sucre

Placa de Vehículo: THC 522

Nombre de Conductor: Oscar Gonzalez

Cédula: 80251664

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Doble Troque ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 31/7/23

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46302

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Canto Soacha

OBRA Contrato 024-2022

DIRECCION Comuna 4 Soacha

MATERIAL Excavación Seco

PLACA VEHICULO BAK 179 M3

CONDUCTOR JHON

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 31/7/23

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN Nº 46301

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Canto Soacha

OBRA Contrato 024-2022

DIRECCION Comuna 4 Soacha

MATERIAL Excavación Seco

PLACA VEHICULO BAK 179 M3

CONDUCTOR JHON

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

253

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14855262869

(415)7707212489984(8020) 000001485526286 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 7 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GAMER SOACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601

42. Correo electrónico gameving.sas1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 3 4 1 0 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 26 / 09 : 21: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RINCON ACOSTA DANIELA
985. Cargo Representante legal Certificado

255

Fecha generación documento PDF: 26-08-2022 09:22:32

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

SOACHA GOBIERNO MUNICIPAL | Secretaria de Hacienda | Dirección de Impuestos Municipales

Código **01**

FORMULARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Lea las instrucciones al respaldo

A. OPCIÓN DE USO

1. Inscripción [X] 2. Novedades [ ] 3. Cese de Actividades [ ]

1.1 Sujeto Pasivo ICAT [ ] 1.2 Agente de retención [X] 1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual [ ]

1.4 Impuesto Delineación Urbana [ ] 1.5 Otro [ ] Cual? _____

B. ES UTED PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TÉCNICOS, TECNÓLOGOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO? SI [ ] NO [ ]

2. Nombre de la Entidad

3. Dirección de la entidad | 4. Número de contrato | 5. Fecha del Contrato (Día Mes Año)

C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [X] CE [ ] No. 901587366 DV 8

7. Naturaleza Jurídica: Persona Natural [ ] Persona Jurídica [X] Sociedad de hecho [ ]

8. Régimen Tributario: Régimen Preferencial [ ] Régimen Común [X] Régimen Simple de Tributación [ ] Gran contribuyente [ ]

9. Nombres y apellidos o Razón Social: CONSORCIO GAMER SOACHA

10. Número de Registro Mercantil: Ciudad BOGOTA — No. Matrícula 0000

11. Fecha de matrícula: Día 01 Mes 08 Año 2022

12. Estado del registro mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

13. Dirección de notificación judicial: CRA 7 20 49 | 14. Departamento: CUNDINAMARCA | 15. Municipio: SOACHA

16. Dirección comercial | 17. Municipio: SOACHA | 18. Barrio: CENTRO

17. Teléfono fijo o movil: 3158369463 | 18. Teléfono alterno: 3183980098 | 19. Correo Electrónico: CONTABILIDADGRUPOICA@GMAIL.COM

C. ¿USTED TIENE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? SI [ ] NO [ ]

20. Nombre del Establecimiento Comercial

21. Dirección del Establecimiento Comercial: CRA 7 20 49 | 22. Barrio | 23. Comuna

24. Número de Registro Mercantil del Establecimiento: Ciudad — No. Matrícula

25. Fecha de Matrícula del Establecimiento: Día 31 Mes 08 Año 2022

26. Estado del Registro Mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

D. ACTIVIDAD ECONÓMICA

27. Tipo de actividad: Industrial [ ] Comercial [ ] Servicios [X] Financiera [ ]

28. Fecha de Inicio de Actividades en el Municipio de Soacha: Día 01 Mes 08 Año 2022

29. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RUT): Código Act. Principal 4290 Descripción: Construcción de otras obras de ingeniería civil.

E. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO

30. Nombres y Apellidos	31. Tipo y Número de Identificación	32. CR	33. No. Tarjeta Profesional
1. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	1. CC: 79205702	1. 1	1.
2. ADRIANA BONILLA BERNAL	2. CC: 51920908	2. 2	2. 55341-T

F. NOVEDADES (TRASPASO - CAMBIO RAZON SOCIAL - CAMBIO DIRECCCION - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACION DE DATOS)

34. Traspaso [ ] 35. Cambio razón Social [ ] 36. Cambio de dirección [ ] 37. Cambio de Régimen [ ] 38. Otros [ ] Cual? _____

39. Nombres y Apellidos del Nuevo Propietario | 40. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [ ] CE [ ] No. _____ DV __

41. Nombre Razón social

42. Número de Registro Mercantil: Ciudad — No. Matrícula | 43. Fecha de Matrícula: Día Mes Año | 44. Cambio de Régimen: Regimen Preferencial [ ] Regimen Comun [ ] Regimen Simple de tributación [ ] Gran Contribuyente [ ]

45. Nueva Dirección | 46. Barrio | 47.Comuna | 48.Teléfono

49. Si selecciono la casilla 38 diligencie este campo la información a actualizar

G. CESE DE ACTIVIDADES

50. Causal: Fusión [ ] Escisión [ ] Liquidación [ ] Cese de actividades [ ] Clausura del establecimiento [ ] Otro [ ] Cual? _____

51. Número de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio: Ciudad — No. Matrícula

52. Fecha de Clausura del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha: Día Mes Año

H. FIRMAS

257

SOACHA GOBIERNO MUNICIPAL | Secretaria de Hacienda | Direccion de Impuestos Municipales

Codigo **01**

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCIÓN DE USO

1. Inscripción [X] 2. Novedades [ ] 3. Cese de Actividades [ ]

1.1 Sujeto Pasivo ICAT [ ] 1.2 Agente de retencion [X] 1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual [ ]

1.4 Impuesto Delineación Urbana [ ] 1.5 Otro [ ] Cual? _____

B. ES UTED PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TECNICOS, TECNOLOGOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL MUNICIPIO? SI [ ] NO [ ]

2. Nombre de la Entidad

3. Dirección de la entidad | 4. Número de contrato | 5. Fecha del Contrato (Dia Mes Año)

C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [X] CE [ ] — No 901587386 — DV 8

7. Naturaleza Jurídica: Persona Natural [ ] Persona Jurídica [X] Sociedad de hecho [ ]

8. Régimen Tributario: Regimen Preferencial [ ] Régimen Comun [X] Regimen Simple de Tributación [ ] Gran contribuyente [ ]

9. Nombres y apellidos o Razon Social: CONSORCIO GAMER SOACHA

10. Número de Registro Mercantil: Ciudad BOGOTA — No. Matricula 0000 | 11. Fecha de matrícula: 01 08 2022 (Dia Mes Año) | 12. Estado del registro mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

13. Dirección de notificación judicial: CRA 7 20 49 | 14. Departamento: CUNDINAMARCA | 15. Municipio: SOACHA

16. Dirección comercial | 17. Municipio: SOACHA | 18. Barrio: CENTRO

17. Teléfono fijo o movil: 3158369463 | 18. Telefono alterno: 3183980098 | 19. Correo Electrónico: CONTABILIDADGRUPOICA@GMAIL.COM

C. ¿USTED TIENE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? SI [ ] NO [ ]

20. Nombre del Establecimiento Comercial

21. Dirección del Establecimiento Comercial: CRA 7 20 49 | 22. Barrio | 23. Comuna

24. Número de Registro Mercantil del Establecimiento: Ciudad — No. Matricula | 25. Fecha de Matricula del Establecimiento: 31 08 2022 (Dia Mes Año) | 26. Estado del Registro Mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

D. ACTIVIDAD ECONÓMICA

27. Tipo de actividad: Industrial [ ] Comercial [ ] Servicios [X] Financiera [ ]

28. Fecha de Inicio de Actividades en el Municipio de Soacha: 01 08 2022 (Dia Mes Año)

29. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RUT): Código Act. Principal 4290 — Descripción: Construcción de otras obras de ingeniería civil.

E. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO

30. Nombres y Apellidos	31. Tipo y Numero de Identificación	32. CR	33. No. Tarjeta Profesional
1. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	1. CC: 79205702	1. 1	1.
2. ADRIANA BONILLA BERNAL	2. CC: 51920908	2. 2	2. 55341-T

F. NOVEDADES (TRASPASO - CAMBIO RAZON SOCIAL - CAMBIO DIRECCCION - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACION DE DATOS)

34. Traspaso [ ] 35. Cambio razon Social [ ] 36. Cambio de direccion [ ] 37. Cambio de Régimen [ ] 38. Otros [ ] Cual? _____

39. Nombres y Apellidos del Nuevo Propietario | 40. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [ ] CE [ ] — No _____ DV __

41. Nombre Razón social

42. Numero de Registro Mercantil: Ciudad — No. Matricula | 43. Fecha de Matricula: Dia Mes Año | 44. Cambio de Regimen: Regimen Preferencial [ ] Regimen Comun [ ] Regimen Simple de tributacion [ ] Gran Contribuyente [ ]

45. Nueva Dirección | 46. Barrio | 47.Comuna | 48.Telefono

49. Si selecciono la casilla 38 diligencie este campo la información a actualizar

G. CESE DE ACTIVIDADES

50. Causal: Fusión [ ] Escisión [ ] Liquidación [ ] Cese de actividades [ ] Clausura del establecimiento [ ] Otro [ ] Cual? _____

51. Número de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio: Ciudad — No. Matricula

52. Fecha de Clausura del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha: Dia Mes Año

H. FIRMAS

La información consignada en este formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y es correcta y corresponde exactamente a la

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODO LO MANIFESTADO ES VERDAD

254

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

XUÁ

SOACHA EL CAMBIO AVANZA

CONTRATO No.	024 2022	FECHA	4/05/2022	PLAZO DE EJECUCION	390				
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA								
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .								
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	1/08/2022
	DESDE	1/08/2022
	HASTA	31/10/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	120
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	60

PRORROGA No. 01	FECHA		PRORROGA EN DIAS	120
PRORROGA No. 02	FECHA		PRORROGA EN DIAS	150
PRORROGA No. 03	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGAS			TOTAL PRORROGAS EN DIAS	270
			FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/05/2023
			TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	120

VALOR DEL CONTRATO			$ 4.506.567.898,00
ADICION No. 01	FECHA	27/06/2023	$ 2.252.614.494,00
ADICION No. 02	FECHA		
ADICION No. 03	FECHA		
		VALOR TOTAL ADICIONES	$ 2.252.614.494,00
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.759.182.392,00


VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 649.376.068,00	01	DEL 1 AGOSTO AL 10 OCTUBRE		$ 6.109.806.324,00
$ 727.213.483,00	02	DEL 10 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE		$ 5.382.592.841,00
$ 1.003.532.471,00	04	DEL 13 NOVIEMBRE AL 15	16/12/2022	$ 4.379.060.370,00
$ 451.030.346,00	05	DICIEMBRE 16 2022 A ENERO 31 DE	31/01/2023	$ 3.928.030.024,00
$ 666.543.027,00	06	DEL 1 AL 4 MARZO DE 2023	4/03/2023	$ 3.261.486.997,00
$ 484.672.910,00	07	DEL 45 MARZO AL 8 DE ABRIOL 2023	10/04/2023	$ 2.776.814.087,00
$ 520.537.357,00	08	DEL 09 ABRIL AL 27 DE JUNIO 2023	27/05/2023	$ 2.256.276.730,00
$ 528.968.355,00	09	DEL 28 JUNIO AL 31 JULIO 2023	8/08/2023	$ 1.727.288.375,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	6.759.182.392,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	5.031.894.017,00	74,45%
TOTAL POR EJECUTAR	$	1.727.288.375,00	25,55%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	390		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	240		62%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	150		38%

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



JUAN PABLO CAÑON	27/06/2023
Nombre y Firma Supervisor	Fecha

XUÁ Empresa Pública de Soacha

INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

INFORMACION DEL CONTRATO					
No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**024-2022**	**CDP RP**	**044-2022 2.5.2.09.01. 0.1.04.01.04 .01-2022**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$6.759.182.392.67
NOMBRE DEL CONTRATISTA. CONSORCIO GAMER SOCHA				IDENTIFICACIÓN: 901.587.366 8	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHBILITACION DE LS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	01	**08**	**2022**	**30**	**OCTUBRE**	**2023**

SUBGERENCIA	Administrativa	**Centro de Costo (área)**	Administrativa
VALOR ADICIONES	2.252.614.494	**N° CDP -FECHA**	
PRORROGA	**PRORROGA 1**	FECHA	31/05/2023
PRORROGA	**PRORROGA 2**	FECHA	31/10/2023
MODIFICACIONES:1		Agosto 12 de 2022	

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JUAN PABLO CAÑON
CARGO	SUPERVISOR	**CARGO**	SUPERVISOR

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 528.988.355	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (28/6/2023)	**CUENTA DE COBRO No.**	**CGS No 9**
	HASTA (31/7/2023)	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	08/08/ 2023
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	$5.031.894.015	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 1.727.288.377.67
Observaciones:			

960

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Se ejecutan según cronograma de obra
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Se realiza durante el inicio de obra
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Se verifica con interventoría , según acta 8
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Se verifica con interventoría , personal utilizado en cada uno de los frentes de vias ejecutadas según acta 8
SUMIINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES'PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA	Se verifica con interventoría , y se entregan certificados calidad, según acta 8

LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	
REALIZAR PRUEBAS , LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS , BABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS	Se verifica con interventoría , y se entregan certificados calidad
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUXUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Se verifica con interventoría cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos .
Se expide a los 8 de Agosto de 2023	
FIRMA CONTRATISTA CONSORCIO GAMER SOACHA NIT 901587366-8	FIRMA SUPERVISOR TECNICO JUAN PABLO CAÑON

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 024 DE 2021

Informe: Mensual Parcial x Final __ No. Del Informe: 08	
Periodo del Informe: 28 de Junio de 2023 al 31 julio de 2023	
Fecha de informe:	08 de agosto de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO GAMER SOCHA
NIT / C.C.	901.587.366 8
Supervisor	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción de Contrato:	04/05/2022
Fecha de inicio del Contrato:	01/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	044-2022
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	2022-0077
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	$ 4.506.567.898.67
Plazo de ejecución	DIEZ MESES
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN N° 1	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($ 2.252.614.494,00)
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.759.182.392,67) M/CTE
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 649.376.068

VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 727.213.483
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	$ 1.003.532.431
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$ 451.030.329,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$ 666.543.027,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	$ 484.672.910,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 7	$ 520.537.357.00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 4.502.905.662.00
VALOR POR COBRAR	$ 2.256.276.730,67

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Pólizas.	Garantías aprobadas y en firme contemplando la última actualización debido a la prorroga
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Ejecución de cantidades de acuerdo a los pactado contractualmente	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta
SUMIINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.		
REALIZAR PRUEBAS , LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS , BABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA. EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 1 de agosto del 2022 hasta la fecha en corte del acta

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	74.45%
Financiero	74.45%

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

5. ANEXOS

INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS, ENTREGABLES

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Supervisor Cto 024-2022

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA · EL CAMBIO AVANZA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 024-2022

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato de obra No. 024 – 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHAE suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 024-2022	CONSORCIO GAMER SOACHA	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No 8 , Certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre 28 junio l al 31 de julio de 2023 , relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
74.45%	09	$ 528.988.355

fuente, Contrato N. 3443 DE 2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria de Infraestructura – Obra, Interventoria

SUBTOTAL FACTURA	528.988.355
IVA	$ 0,00
TOTAL, FACTURA	$ 528.988.355

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

JUAN PABLO CAÑON
Supervisor Contrato N° 024 DE 2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E
