	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 141 DE 2.022 — **Contratista:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022 — JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 — HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022 — EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058 — CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059 — CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022 — CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022 — CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 — CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 — CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Convenio 2496 de 2019

Contrato de Interventoría No. 1100 — **Interventoría:** CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9".

INFORME MENSUAL No. 3 — **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		16
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		17
2.1	Localización		17
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		24
2.4	Características técnicas del proyecto		24
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		29
3.1	Información general del contrato		29
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		47
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		51
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		51
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		60
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	141
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	142
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	143
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	144
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	145
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	146
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	160
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		161
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		162
5.1	Información general del contrato		162
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		162
5.3	Informes especialistas y profesionales		163
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		193
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	193
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	194
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	195
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	197
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	199
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		200
8	**Anexos**		201
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		202
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3886 de fecha 19/10/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-289-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,779,782,602.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.885
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado	ml	15

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,779,782,602.00		1,779,782,602.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,779,782,602.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1,779,782,602.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 795,011,198.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.415
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	795,011,198.00		795,011,198.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			795,011,198.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	795,011,198.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: ARG-OBRA-009-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

CONTRATISTA: ENCONSULT S.A.S

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 958.081.628,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.46
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	958,081,628.00		958,081,628.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			958,081,628.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	958,081,628.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma María Camila Arenas

Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 005-003-15.05/059

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 3,478,131,956.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.05
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Batea	Und	1
	Box Coulvert	Und	3
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	30
	Dren	m	393
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	m	4
	Muro de contención en concreto reforzado	m	26

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Batea		0	
	Box Coulvert		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
	Dren		0	
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones		0	
	Muro de contención en concreto reforzado		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3,478,131,956.00		3,478,131,956.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			3,478,131,956.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	3,478,131,956.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: LP 04-003-15 05/058

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,063,184,929.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.456
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	6
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,063,184,929.00		1,063,184,929.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,063,184,929.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1,063,184,929.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 608,231,289.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.24
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	608,231,289.00		608,231,289.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			608,231,289.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	608,231,289.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A	Foto 2 N/A
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-240-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23

PLAZO INICIAL: 30/09/2023
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.85
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	15
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	2,248,615,000.00		2,248,615,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2,248,615,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	2,248,615,000.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma María Camila Arenas
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 484-2022

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2022
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 912,367,379.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.496
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	Und	8
	Muro en gaviones	Und	1
Otros (Especificar cuales)	Muro de contención en concreto reforzado	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
	Muro en gaviones			
Otros (Especificar cuales)	Muro de contención en concreto reforzado		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	912,367,379.00		912,367,379.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			912,367,379.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	912,367,379.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A

Indicar la localización y actividad.

Foto 2 N/A

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma María Camila Arenas D
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-090-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,078,384,354.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.706
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,078,384,354.00		1,078,384,354.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,078,384,354.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1,078,384,354.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A	**Foto 2 N/A**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma María Camila Arenas
Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS G Y A S. A. S.

PLAZO INICIAL: 31/08/2023
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4,306,911,911.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	2.125
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	23
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	4,306,911,911.00		4,306,911,911.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			4,306,911,911.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	4,306,911,911.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A	Foto 2 N/A
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma María Camila Arenas

Nombre MARIA CAMILA ARENAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y MINAS


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	Director de interventoría	

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....16

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS....17

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS....17
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO....19
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS....24
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....24
2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO....29
2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO....29
2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO....29

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA....29

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....29
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....47
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS....51
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA....51

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA....60

4.1 INFORME SEMANAL....60
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA....141
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA....142
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 143
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....144
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO....145
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....146
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA....160
4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL....161

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA....162

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....162
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR....162
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES....163

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA....164

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....164
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....165

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 166
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 170

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 171

8 ANEXOS 172

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 173

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir 19
Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA 20
Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES 20
Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE 21
Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR 22
Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER 22
Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA 23
Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO 23
Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA 24

1 INTRODUCCIÓN

Mediante Contrato 1100 de 2022 “CONSULTORES DONOVAN SAS” realiza la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” “LOTE 9” el cual fue adjudicado por Resolución de Adjudicación No 1715 del 24 de mayo de 2022, previo Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DTE-SEP- 197-2021.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de BOLÍVAR, ALMAGUER, QUILICHAO, SUCRE, BOLÍVAR, MERCADERES, SUCRE, ALMAGER, ARGELIA, INZA Y PUERTO TEJADA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero desarrolladas por el contratista durante el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de las obras que nos ocupan.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa "COLOMBIA RURAL" que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de ONCE
(11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Cauca en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CAUCA	ARGELIA	960.000.000	1984-2021
CAUCA	MERCADERES	2.250.000.000	1894-2021
CAUCA	SUCRE	4.320.000.000	1866-2021
CAUCA	SUCRE	1.080.000.000	1769-2021
CAUCA	BOLIVAR	3.600.000.000	1867-2021
CAUCA	BOLIVAR	1.080.000.000	1750-2021
CAUCA	ALMAGUER	1.800.000.000	1749-2021
CAUCA	ALMAGER	810.000.000	1982-2021
CAUCA	INZA	610.000.000	1983-2021
CAUCA	QUILICHAO	940.000.000	1768-2021
CAUCA	PUERTO TEJADA	2.196.000.000	2496-2019

Las principales actividades y obras para ejecutar son las siguientes:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de once (11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

METAS FISICAS CONTRACTUALES						
CONVENIO	MUNICIPIO	CORREDOR	LONG (KM)	PUNTO DE INICIO	PUNTO FINAL	OBSERVACIONES
1894-2021	ARGELIA	LA PLAYA-EL ENCANTO	1.80	Cruce con carretera 25cc03	Vereda el encanto	Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico
1894-2021	MERCADERES	LA PLAYA -LA DESPENSA	1.85	Vereda la Despensa	Vereda la Despensa	construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m

1866-2021	SUCRE	EL PARAÍSO - LA CEJA – LA CABECERA MUNICIPAL	2.125	Puente sobre el Río Mazamorras vía que conduce Sucre-La Ceja	Caseta Central vereda la Ceja	construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 2125 ml de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio
1769-2021	SUCRE	25CC08 S4-1 LA BALASTRERA	0.706	inicia inmediatamente se pasa la quebrada Peña Blanca	Termina 830 metros arriba de la quebrada Peña Blanca	construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36" Construcción de 706 ml de placa huella
1867-2021	BOLIVAR	VIA AGUA GORDAS - LOS MILAGROS	1.05	Puente militar río Dantas K22+642	Cabecera de Milagros – Cauca K23+643	demolición de 9 alcantarillas y 1 batea en concreto reforzado, construcción de 1050 metros de placa huella, Construcción de 30 alcantarillas de 36" en concreto reforzado, construcción de 3 Box Culvert en concreto reforzado tipo C, Construcción de 393 metros de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de longitudes de 6 m y 20m en concreto reforzado, construcción de 1 Muro de contención de longitud de 4m y altura 4 metros en gaviones, instalación de 30 señales de tránsito verticales.
1750-2021	BOLIVAR	BOLIVAR-CHALGUAYACO	13.5	Vda. Chalguayaco	Vda. Cucho	Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36", Construcción de 456 ml de placa huella, demolición de una alcantarilla.
1749-2021	ALMAGUER	CAQUIONA-HATO-HUMUS RESGUARDO	4.90	KM 0 + 000	KM 0 + 818	construcción de 10 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5m Construcción 15m de muro en concreto reforzado tipo, de 3m de altura
1892-2021	ALMAGUER	VIA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA		KM 0 + 000	KM 0 + 405	construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 415 ml de placa huella de ancho tipo 5 m
1983-2021	INZÁ	SAN ANDRES DE PISIMBALA-ALTO PISIMBALA-TUMBICHUCUE	14	VÍA 26CC04 PR 4+0000 = PR 0+0000 SAN	VÍA 26CC04 PR 18+0000 TUMBICHUCUE	construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long = 240 m - conformación de calzada existente
1768-2021	SANTANER DE QUILICHAO	PANAMERICANA – CRUCERO LA SALINA - ALTO DE SAN JOSÉ DE MANDIVA Y EMANUEL	7.10	PR 0+0000 Ruta 25KA126 vía Panamericana – Crucero de Salinas – Alto el Paraíso	PR 4+0800 Ruta 25KA126- 1 vía Crucero de Salina – Alto de San José Mandiva y Emanuel	construcción y recuperación alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long =496 m - conformación de calzada existente y afirmado - construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato que se obtenga como resultado del presente Concurso de Méritos.

Las obras a construir se encuentran ubicadas en el DEPARTAMENTO DE CAUCA, A continuación, se presenta el mapa de localización de las obras para los Municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao y Puerto Tejada del departamento del Cauca.

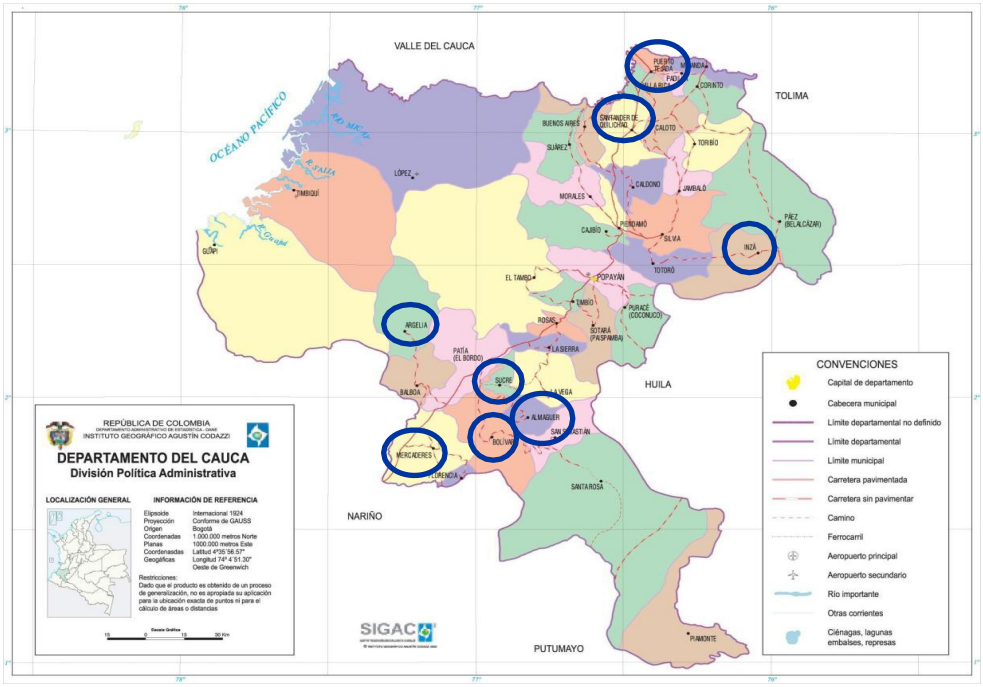


Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 ARGELIA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado al occidente del departamento del Cauca, en el piedemonte de la cordillera occidental sobre la llanura del Pacifico, ubicado sobre el macizo colombiano a 184 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.250 m. su temperatura es 22 °C .

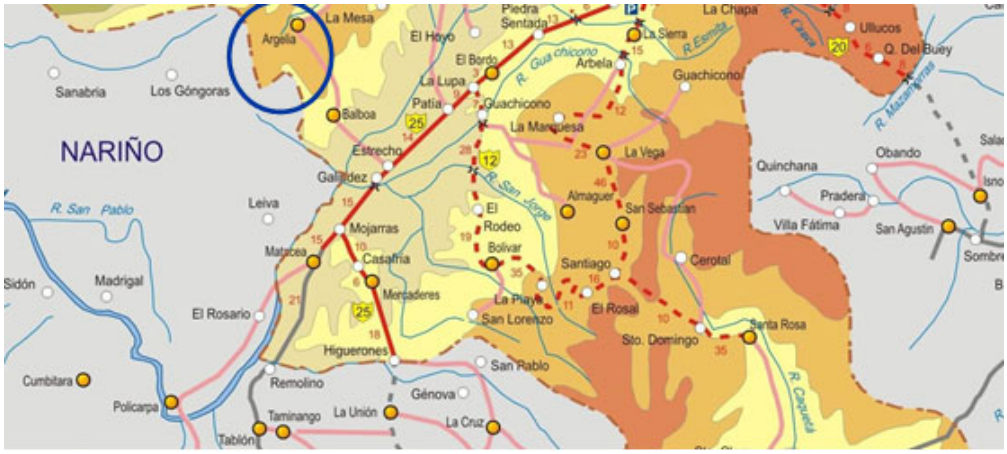


Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA

2.2.2 MERCADERES – CAUCA

Es un municipio colombiano situado en el suroeste del país, en el departamento de Cauca, a 97 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.167 m. su temperatura es 22 °C. Limita al este con Bolívar, al norte con Patía y Balboa, al oeste con Leiva y El Rosario, ambos en el departamento de Nariño, y al sur con Florencia y con el municipio de Taminango del departamento de Nariño.

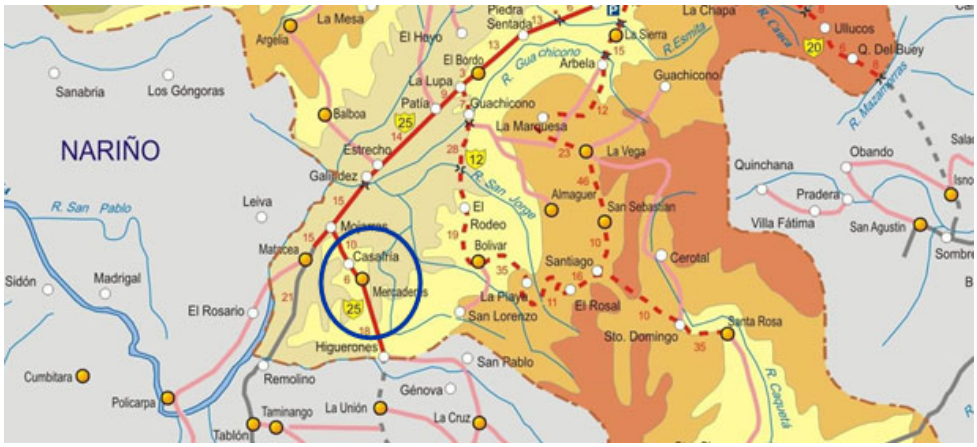


Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES

2.2.3 SUCRE – CAUCA

Sucre está ubicada a 02º, 03,30” Latitud Norte y 76º, 56,46” Longitud Oeste Su altura sobre el nivel del mar es de 1.140 m. su temperatura es 26 °C y su precipitación es 1600 ml anuales.

Por el Norte limita con los municipios del Patía y la Vega, por el Oriente con Almaguer, la Vega y Bolívar, por el Occidente con el Patía y en su parte sur con el Municipio de Bolívar.



Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE

2.2.4 BOLIVAR - CAUCA

Se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la cordillera central, haciendo parte del denominada Macizo Colombiano, Limita al norte con Florida, al oriente con Rio blanco, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 145 km de la capital.

La región cuenta con una altura promedio sobre el nivel del mar de 1. 177 m.s. n.m, con terreno ondulado y con una temperatura promedio de 18°C.

Las vías en estudio hacen parte de la red de vías terciarias y sirve como conexión de cabeceras municipales, centros poblados y veredales, cumpliendo un papel ponderable en el desarrollo socioeconómico en la época del posconflicto

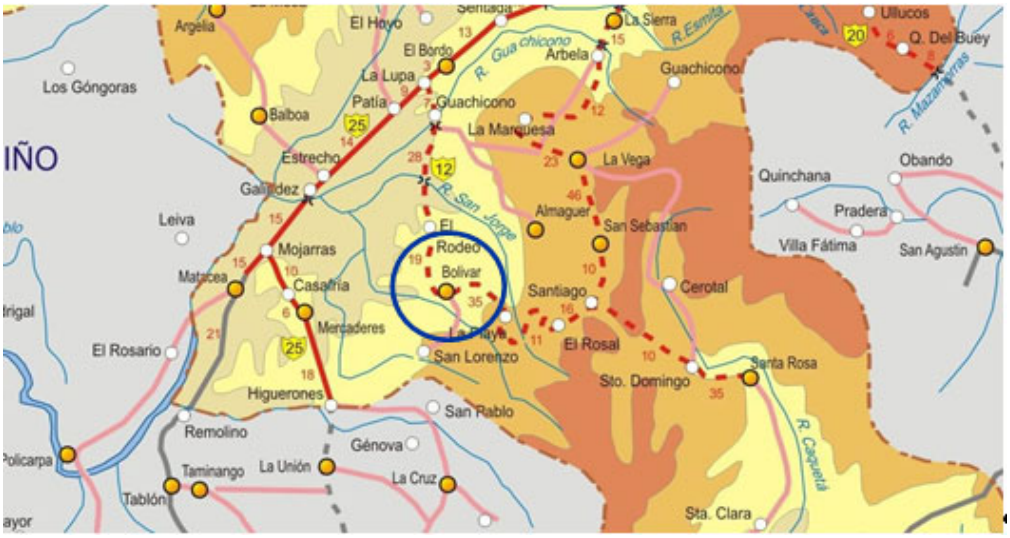


Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR

2.2.5 ALMAGUER – CAUCA

Pertenece al denominado Macizo Colombiano, La población de Almaguer se halla situada al pie de la colina de Belén - Panecillos y Santa Bárbara, como sus cerros tutelares, ceñida por el poderoso macizo de la cordillera de los Andes. Altura sobre el nivel del mar: 2.312 m. Temperatura media: 17°C. Dista de Popayán 172 km. Limita al Norte: Municipio de La Vega. Al sur: Municipios de Bolívar y San Sebastián. Al Oriente: Municipio de San Sebastián. Y al Occidente: Municipio de Sucre.

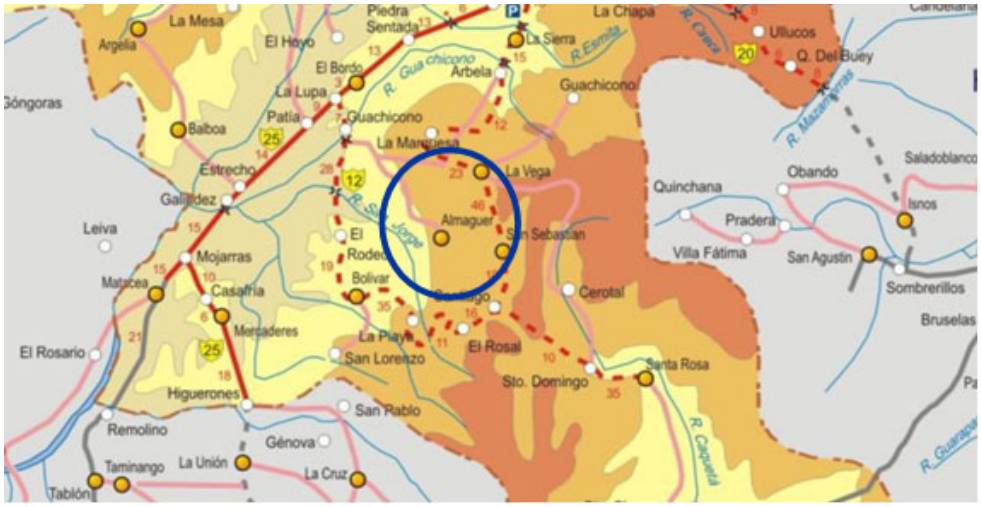


Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER

2.2.6 INZA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca, a 102 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.754 m. su temperatura es 27 °C.

Limita por el Norte y el Este con Páez, por el Sur con el departamento del Huila y por el Oeste con Totoró y Silvia.

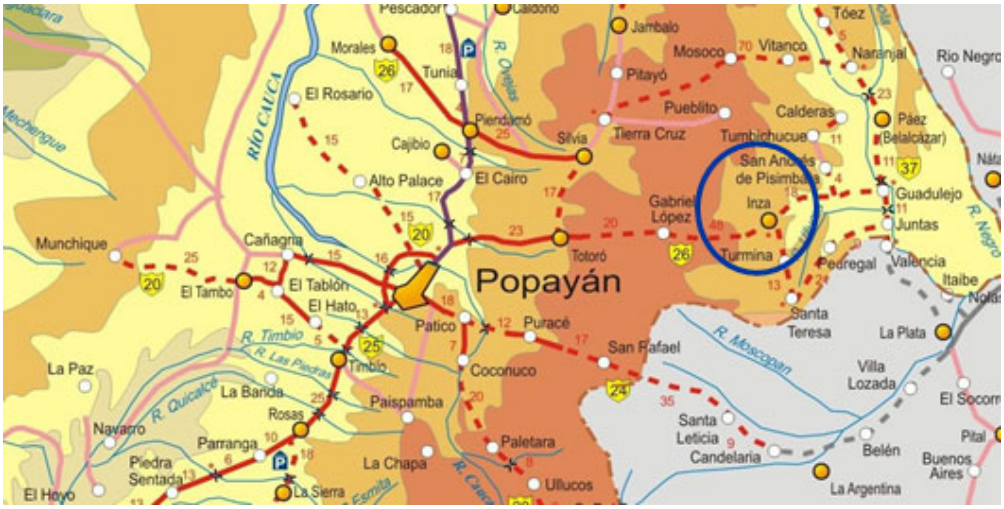


Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA

2.2.7 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 m. su temperatura es 27 °C. Limita al norte con los Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de Caldono.

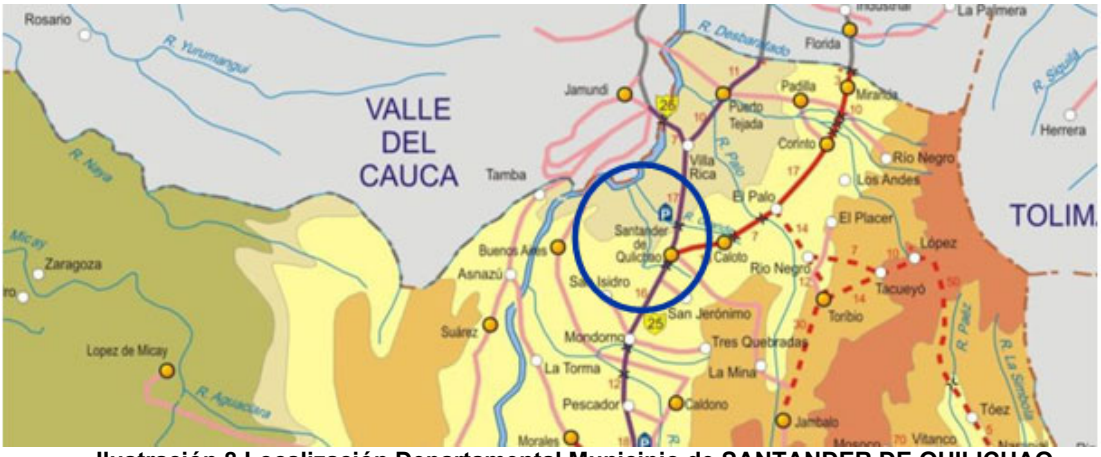


Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO

2.2.8 PUERTO TEJADA – CAUCA

Es un municipio colombiano localizado en la Provincia Norte del departamento del Cauca, cercana al área metropolitana de Cali 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 968 m. su temperatura es 27 °C.

Limita al norte con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Occidente con los municipios de Villarrica y Jamundí, al oriente con los municipios de Miranda y Padilla y al sur con los municipios de Caloto y Villarrica.



Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

Las vías para intervenir son vías rurales, prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.
De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inza, Santander de Quilichao y Puerto Tejada; En El Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa COLOMBIA RURAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

Los municipios son los encargados de suministrar al contratista de obra, los diseños para su respectiva aprobación u observaciones y a su vez remitir a la interventoría para su concepto y poder dar viabilidad para el inicio de las obras.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por bermacunetas.

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

2.4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El mantenimiento periódico es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

La principal actividad por ejecutar es el Suministro e instalación de afirmado Para la ejecución de las obras de mantenimiento periódico se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 1: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán conforme a lo estipulado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías.

Nota 2: El equipo mínimo requerido debe estar acorde con lo indicado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones

Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías y Especificaciones Particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 3: Los aportes previstos en maquinaria amarilla y materiales granulares por parte de los Entes Territoriales deben cumplir con el requerimiento de las Especificaciones de Construcción de Carreteras y estar acordes con la necesidad que tiene el proyecto, reflejada en los análisis de precios unitarios del presupuesto del proyecto

2.4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El mantenimiento rutinario consiste en el conjunto de actividades a ejecutar en las vías rurales que buscan mejorar el comportamiento estructural y funcional de las vías con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía, empleando la mano de obra local y herramienta menor.

Las principales actividades por ejecutar son: • Desmonte y limpieza en zonas no boscosas • Rocería • Reparación de baches • Limpieza de alcantarillas y descoles • Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor • Reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo Para la ejecución de las obras de mantenimiento rutinario se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Las actividades del mantenimiento rutinario se realizarán bajo un sistema de gestión con participación comunitaria con un alto componente social que posibilite a las administraciones locales introducir una modalidad de mantenimiento de la red vial rural a menor costo y con un significativo arraigo local, favoreciendo inclusive el que las comunidades se empoderen y gestionen el desarrollo de obras en las vías, que son vitales para su progreso y el bienestar de sus habitantes, esto se logra con la participación comunitaria.

El personal vinculado debe pertenecer a organizaciones de acción comunal y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo, dando prioridad a las mujeres rurales, que se encuentren en las zonas de influencia de las vías, quienes serán los responsables de la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario del Corredor Productivo seleccionado a través de su comunidad formalizada, que se denominarán los “Emprendedores Rurales”, cuya cartilla podrá ser consultada en la página https://colombiarural.invias.gov.co.

El Ente Territorial ejecutará estas actividades de manera directa a través de Convenios Solidarios con las juntas de acción comunal y/o asociaciones comunales y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo. Lo anterior, conforme a lo regulado en el parágrafo 3 y 4 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012 y demás normas aplicables a la materia.

Así mismo el artículo 141 de la Ley 136 de 1994 establece que los municipios pueden vincular a las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales y sin ánimo de lucro, al mejoramiento y desarrollo municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. De conformidad a lo establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”, para la operación los Entes Territoriales se obligan a aportar la dotación, herramientas y equipos que se relacionan a continuación: • DOTACIÓN: overol, botas, cascos, chalecos reflectivos, guantes, conos reflectivos, botiquín, cintas de señalización. • HERRAMIENTA Y EQUIPOS: picas, carretillas, machetes con estuche, barras, pisones, palas, rastrillos, limas, baldes, azadones, escobas, guadañas; así como el mantenimiento y el combustible requerido para el óptimo funcionamiento de los equipos; respaldado mediante certificación expresa de aportes en bienes y servicios.

El procedimiento para cuantificar la cantidad de estos elementos se encuentra establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”.

2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente
- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	F1-F14-289-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 1.799.782.602
Nombre del Contratista	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

Fecha suscripción Contrato de obra	21/12/2022

3.1.1.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	440.00	$ 41,548.00	$ 18,281,120.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	206.00	$ 17,079.00	$ 3,518,274.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 992,001.00	$ 77,376,078.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 796,225.00	$ 6,369,800.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	5789.00	$ 9,553.00	$ 55,302,317.00
Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900mm de diámetro interior	ml	70.00	$ 978,174.00	$ 68,472,180.00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Construcción de Placa Huella				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	803.49	$ 41,548.00	$ 33,383,403.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	484.96	$ 17,079.00	$ 8,282,632.00
Subbase granular tipo C	m	769.09	$ 405,707.00	$ 312,025,197.00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	13.90	$ 796,225.00	$ 11,067,528.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	615.76	$ 992,001.00	$ 610,834,536.00
Concreto resistencia 14 MPA (G) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	223.94	$ 703,683.00	$ 157,582,771.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	m3	27,059.67	$ 9,553.00	$ 258,501,028.00
Sello para juntas	m3	6,978.00	$ 6,405.00	$ 44,694,090.00
			Sub- total	**$1,436,371,185.00**
Construcción de filtro				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	20.40	$ 41,548.00	$ 847,579.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	132.40	$ 9,958.00	$ 1,318,439.00
Tubería plástica tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	34.00	$ 41,853.00	$ 1,423,002.00
Relleno con material filtrante	m3	20.40	$ 353,549.00	$ 7,212,400.00
			Sub- total	**$ 10,801,420.00**
Construcción muro de contención				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	129.03	$ 41,548.00	$ 5,360,938.00
Relleno con material filtrante	m3	18.34	$ 353,549.00	$ 6,484,089.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37.35	$ 992,001.00	$ 37,051,237.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	2.10	$ 796,225.30	$ 1,672,073.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	4,862.28	$ 9,553.00	$ 46,449,361.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	15.03	$ 41,853.00	$ 629,051.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 50,8MM	ml	15.73	$ 23,880.00	$ 375,632.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	121.13	$ 9,958.00	$ 1,206,213.00
Rellenos para estructuras con suelo	m3	41.26	$ 17,079.00	$ 704,680.00
			Sub- total	**$ 99,933,274.00**

Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	6.00	$ 637,719.00	$ 3,826,314.00
			Sub- total	**$ 3,826,314.00**
Elementos de bioseguridad				
Elementos bioseguridad	gl	1	$1,482,535.00	$ 1,482,535.00
			Sub- total	**$ 1,482,535.00**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1	$17,766,423.00	$ 17,766,423.00
			Sub- total	**$ 17,766,423.00**
			Sub total básico de obra (A)	$1,799,500,920.00
			Valor IVA consultoría (c)	$ 281,682.00
			Valor total A+B+C+AIU	**$1,799,782,602.00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	93-2023
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CH\LCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 795.011.198
Nombre del Contratista	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
Fecha suscripción Contrato de obra	Pendiente

3.1.2.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Subbase granular tipo C	m3	336.15	$445,142	$ 149,634,483
Sello asfaltico para juntas	ml	3240.00	$3,105	$ 10,060,200
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	243.45	$46,140	$ 11,232,783
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	74.70	$15,496	$ 1,157,551
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	250.45	$1,020,185	$ 255,505,333
Concreto resistencia 14 MPa (G) ciclópeo	m3	104.00	$705,577	$ 73,380,008
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	12501.56	$9,618	$ 120,240,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	12.90	$714,961	$ 9,222,997
			Sub- total	**$ 630,433,359**
Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	176.00	$46,140	$ 8,120,640
Relleno para estructuras con suelo	m3	82.40	$15,496	$ 1,276,870
Concreto 21MPa (D)	m3	31.23	$1,020,185	$ 31,860,378
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	3.22	$714,961	$ 2,302,174
Acero de Refuerzo Fy 60.000 PSI.	kg	2,315.00	$9,618	$ 22,265,670
Tubería de concreto reforzado clase II de 900mm de diámetro interior	ml	28.00	$873,572	$ 24,460,016
			Sub- total	**$ 90,285,748**
Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	4.00	$ 628,120	$ 2,512,480
			Sub- total	**$ 2,512,480**
Revisión de estudios y diseños				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19/10/2020	gl	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000

			Sub- total	**$ 5,000,000**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1,287,132	$1,287,132
			Sub- total	**$1,287,132**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1%		$ 7,309,314
			Sub- total	**$ 7,309,314**
Mantenimiento vial				
Conformación de calzada existente	m2	6,665	1,130	$7,531,450
Afirmado con material de la zona	m3	333	148,520	$49,457,160
			Sub- total	**$ 56,988,6610**
			Sub total básico de obra (A)	$793,816,643
			Valor IVA consultoría (B)	$1,194,555
			Valor total A+B+AIU	**$795,011,198**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.3 ARGELIA – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Argelia, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	ARG-OBRA-009-2022
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 958.081.628
Nombre del Contratista	EMCONSUT S.A.S.

Representante legal	William Alcides Sánchez Fajardo
Fecha suscripción Contrato de obra	7/10/2022

3.1.3.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Conformación de la calzada existente	m2	2.925,60	$ 1.020,00	$2.984.112,00
Subbase granular clase c	m3	438,84	$ 281.980,00	$123.744.103,00
Sello asfaltico para juntas	m	1.950,40	$ 3.040,00	$5.929.208,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	225,03	$ 13.620,00	$3.064.909,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	99,36	$ 18.300,00	$1.818.288,00
Rellenos con material filtrante	m3	39,74	$ 249.430,00	$9.912.348,00
Concreto resistencia 21mpa (D)	m3	368,17	$ 826.140,00	$304.159.964,00
Concreto resistencia 14mpa (g) (ciclópeo)	m3	173,88	$ 551.760,00	$ 95.940.029,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	16.547,10	$ 7.860,00	$130.060.206,00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma ntc 1087 de diámetro 101.6 mm	m	110,40	$ 33.170,00	$3.661.968,00
Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	m2	2.252,16	$ 9.030,00	$20.336.995,00
			Sub- total	**$701.612.130,00**
Construcción de alcantarillas 36"				
Remoción de alcantarillas	m	56,00	$36.760,63	$ 2.054.641,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	530,00	$13.534,00	$ 7.293.977,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	36,00	$18.338,00	$ 658.800,00
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	98,00	$814.356,00	$ 80.961.720,00
Concreto resistencia 14MPa (f)	m3	18,00	$666.254,00	$ 9.931.680,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	7.354,20	$8.538,00	$ 57.951.096,00
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior	m	70,00	$557.123,00	$ 38.920.700,00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1.095.274,00	$1.095.274,00
			Sub- total	**$1.095.274,00**
SECCIÓN 2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Conformación de la calzada existente	m3	1.500,00	$1.024,00	$1.530.000,00
Suministro e instalación de afirmado	m3	189,24	$245.529,00	$46.371.462,00
			Sub- total	**$47.901.462,00**
			Sub total básico de obra (A)	$948.381.480,00
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$9.492.046,00
			Valor IVA consultoría (c)	$208.102,00
			Valor total A+B+C+AIU	**$958.081.628,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU

2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 005-003-15.05/059
Objeto del Contrato de Obra	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 3.478.131.956
Nombre del Contratista	CONSORCIO ONIX CCM
Representante legal	JHANER SEGOVIA QUINTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	13/12/2022

3.1.4.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	142	$ 181,764.00	$ 25,810,488.00
Remoción de alcantarillas	ml	89	$ 81,042.00	$ 7,212,738.00
Excavaciones varias en roca en seco	m3	86	$ 91,174.00	$ 7,840,964.00
			Sub- total	**$ 40,864,190.00**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C SBG-50	m3	950	$ 311,091	$ 295,536,450
			Sub- total	**$ 295,536,450**
Estructura de pavimento				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	102	$ 24,000	$2,448,000.00
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ	m3	690	$ 765,385	$528,115,650
Concreto resistencia 14MPa (f) - Ciclopeo	m3	445	$ 554,024	$246,540,680
Defensa metálica	m	12	$ 218,922	$2,627,064
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	63,500	$ 9,700	$615,950,000

			Sub- total	**$1,395,681,394**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	2350	$ 24,000	$ 56,400,000
Excavaciones varias en roca en seco		285	$ 91,174	$ 25,984,590
Relleno para estructuras con recebo	m3	538	$ 204,226	$ 109,873,588
Concreto resistencia 28MPa (C) mezcla In Situ	m3	80	$ 1,036,426	$ 82,914,080
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	903	$ 765,385	$ 691,142,655
Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	5	$ 727,128	$ 3,635,640
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	37,500	$ 9,700	$ 363,750,000
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	180	$ 868,679	$ 156,362,220
Relleno de gravilla	m3	87	$ 269,491	$ 23,445,717
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	826	$ 10,205	$ 8,429,330
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	393	$ 38,199	$ 15,012,207
			Sub- total	**$ 1,536,950,027**
Obras de estabilización				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 24,000	$ 3,600,000
Relleno para estructuras con recebo	m3	73	$ 204,226	$ 14,908,498
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	52	$ 765,385	$ 39,800,020
Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	2	$ 727,128	$ 1,454,256
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	7,923	$ 9,700	$ 76,853,100
Relleno de gravilla	m3	15	$ 269,491	$ 4,042,365
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	120	$ 10,205	$ 1,224,600
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	26	$ 38,199	$ 993,174
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m3	24	$ 730,253	$ 17,526,072
			Sub- total	**$ 160,402,085**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con tablero en lámina retroreflectiva tipo IX (75 x 75) cm	m3	30	$ 730,253	$ 21,907,590
			Sub- total	**$ 21,907,590**
			Sub total básico de obra (A)	$3,445,219,240
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$32,912,716
			Valor total A+B+AIU	**$3,478,131,956**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso

3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 004-003-15.05/058
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 1.063.184.929
Nombre del Contratista	CONSORCIO PH CHALGUAYACO
Representante legal	HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
Fecha suscripción Contrato de obra	13/12/2022

3.1.5.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	27,13	$ 153,105	$ 4,153,828
Remoción de alcantarillas	ml	44	$ 55,477	$ 2,444,705
			Sub- total	**$ 8,598,533**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C	m3	573	$ 258,200	$ 147,915,292
			Sub- total	**$ 147,915,292**
Estructura de pavimento				
Excavaciones manual para riostras de placa huella, incluye transporte	m3	48	$ 26,725	$1,295,460
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ (Huellas, riostra, cunetas)	m3	597	$ 715,730	$427,201,113
Concreto resistencia 14MPa - Ciclopeo	m3	207	$ 544,008	$112,672,163
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	22,975	$ 9,843	$226,143,564
			Sub- total	**$767,312,300**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco (incluye retiro)	m3	392	$ 26,725	$ 110,481,446

Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	5,255	$ 9,843	$ 51,726,410
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	62	$ 817,200	$ 50,416,173
			Sub- total	**$ 112,624,029**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	m3	24	$ 746,991	$ 17,556,081
			Sub- total	**$ 17,556,081**
			Sub total básico de obra (A)	$ 1,052,006,235
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 110,520,062
			Valor total A+B+AIU	**$ 1,062,526,297**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.6 INZA – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Inza, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	141 DE 2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN CORCONDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 608.231.289,49
Nombre del Contratista	CONSORCIO INZA 2022
Representante legal	JAMES PIAMBA HOYOS
Fecha suscripción Contrato de obra	27/09/2022

3.1.6.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCION 1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de alcantarillas				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	176	$ 46,500	$ 8,184,000
Rellenos para estructuras con suelo	M3	108	$ 44,980	$ 4,857,840
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	31.20	$ 746,518	$ 23,291,362
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	3	$ 640,825	$ 2,050,640
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	2316	$ 8,563.00	$ 19,831,908
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	28	$ 683,987	$ 19,151,636
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	28	$ 518,395.00	$ 14,515,060
Geotextil	M2	381.59	$ 11,905.00	$ 4,542,829
Material granular drenante	M3	55.26	$ 180,864	$ 9,994,545
			Sub- total	**$ 106,419,819**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	53.76	$ 46,811	$ 2,516,559
Rellenos para estructuras con suelo	M3	34	$ 44,980	$ 1,529,320
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	80.48	$ 746,518	$ 60,079,769
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	2.40	$ 640,825.00	$ 1,537,980
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclópeo)	M3	53.76	$ 449,265.00	$ 24,152,486
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	7759	$ 8,563.00	$ 66,440,317
Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	31.36	$ 763,510	$ 23,943,674
Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	M3	11.0	$ 846,548	$ 9,312,028
Subbase Granular Clase C	M3	180.00	$ 231,636	$ 41,694,480
			Sub- total	**$ 231,206,613**
Revisión y/o ajuste de diseños base Cartilla Colombia rural				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19-oct-2020	GLB	1.00	$ 6,098,780	$ 6,098,780
			Sub- total	**$ 6,098,780**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1,853,627	$ 1,853,627
			Sub- total	**$ 1,853,627**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
Conformación de calzada	M2	58,500.00	$ 1,119	$ 65,461,500
Afirmado	M3	2,300.00	$ 67,920	$ 156,216,000
Excavaciones varias sin clasificar	M3	32.00	$ 47,691	$ 1,526,112
Rellenos para estructuras con suelo.	M3	6.00	$ 44,989	$ 269,934
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	12.00	$ 746,667	$ 8,960,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	1.00	$ 640,953	$ 640,953
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	920.00	$ 8,565	$ 7,879,800
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de	ml	6.00	$ 683,987	$ 4,103,922

900 mm de diámetro interior				
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	21.00	$ 518,395.00	$ 10,886,295
			Sub- total	**$ 255,944,520**
			Sub total básico de obra (A)	$ 601,523,359,49
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5,201,230
			Valor IVA (C)	$ 1,506,700
			Valor total A+B+AIU	**$ 608,231,289,49**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
   - Administración A: 20%
   - Imprevisto I:5%
   - Utilidad U:5%
   - AIU:30%

3.1.7 MERCADERES – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Mercaderes, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	CE-F1-F14-240-2022-02
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 2.248.615.000
Nombre del Contratista	CONSORCIO MERCADERES 23
Representante legal	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
Fecha suscripción Contrato de obra	30/12/2022

3.1.7.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Construcción de alcantarillas de 36”				
Excavaciones varias en material comun en seco	M3	679.80	$ 13,720	$ 9,326,856
Relleno para estructuras con suelo	M3	209.15	$ 80,370	$ 16,809,386
Concreto resistencia 21MPa (d) - mezcla in situ	M3	120.51	$ 792,200	$ 95,468,022

Concreto resistencia 14mpa (F)	M3	20.20	$ 625,000	$ 12,625,000
Acero de refuerzo fy 4200 MPa	KG	8,930.10	$ 9,120	$ 81,442,512
Tubería de concreto reforzado, clase II de 900mm de diámetro interior	ML	92.70	$ 1,210,000	$ 112,167,000
			Sub- total	**$ 327,838,776**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	4,245.20	$ 17,160	$ 72,847,632
Subbase granular clase C	M3	1,550.67	$ 198,400	$ 307,652,928
Concreto resistencia 21MPa (D) - mezcla in situ	M3	933.79	$ 792,000	$ 739,561,680
Concreto resistencia 14MPa (F)	M3	50.07	$ 625,500	$ 31,318,785
Concreto resistencia 14MPa (G) (ciclópeo)	M3	445.78	$ 482,240	$ 214,972,947
Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	56,320.00	$ 9,120	$ 513,638,400
Sello para juntas	ML	6,729.33	$ 3,900	$ 26,244,387
			Sub- total	**$ 1,906,236,759**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 2,468,398	$ 2,468,398
			Sub- total	**$ 2,468,398**
			Sub total básico de obra (A)	$ 2,236,543,932
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 11,602,071
			Valor IVA (C)	$ 468,996
			Valor total A+B+AIU	**$ 2,248,615,000**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	484-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 912.367.379

Nombre del Contratista	CONSORCIO VIAS RURAL 2022
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	7/09/2022

3.1.8.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción y recuperación de alcantarillas				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	338,00	$ 37.22	$12.581.827,00
Rellenos para estructuras con material recebo	m3	194,12	$ 65.42	$12.700.019,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	74,90	$ 626.36	$46.914.327,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	8,00	$ 457.30	$3.658.428,00
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	5.629	$ 7.45	$41.959.131,00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	59,00	$ 668.04	$39.414.335,00
			Sub- total	**$ 157.228.067,00**
Construcción muro en concreto reforzado				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	285,98	$ 37.22	$10.645.417,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	208,70	$ 65.42	$13.653.894,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	58,50	$ 626.36	$36.642.031,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	4,10	$ 457.30	$1.874.945,00
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	2.969	$ 7.45	$22.131.109,00
			Sub- total	**$ 84.947.396,00**
Construcción muro en gaviones				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	120,00	$ 37.22	$4.466.921,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	314,00	$ 65.42	$20.542.994,00
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	12,00	$ 359.42	$4.313.029,00
Gaviones de malla de almabre de acero entrelazado clase 1: Recubrimiento de Zinc Galvanizado	m3	60,00	$ 329.85	$19.791.240,00
			Sub- total	**$ 49.114.184,00**
Construcción muro en concreto reforzado				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	730,00	$ 37.22	$27.173.769,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	219,00	$ 65.42	$14.327.757,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	238,00	$ 626.36	$149.073.561,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	55,00	$ 457.30	$25.151.695,00
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	80,00	$ 359.42	$28.753.527,00

Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	16.690,00	$ 7.45	$124.408.287,00
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	104,00	$ 694.13	$72.189.146,00
Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ml	1.216,00	$ 69.98	$85.095.192,00
Subbase Granular Clase A	m3	791,00	$ 143.74	$ 113.694.153,00
Excavaciones varias en material común en seco	m3	730,00	$ 37.22	$27.173.769,00
			Sub- total	**$ 639.867.087,00**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 2.820.000	$ 2.820.000
			Sub- total	**$ 2.820.000**
			Sub total básico de obra (A)	$ 933.976.734,00
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5.487.466,00
			Valor IVA (C)	$ 535.800,00
			Valor total A+B+AIU	**$ 940.000.000,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.9 SUCRE 1769 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	484-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 912.367.379
Nombre del Contratista	CONSORCIO SUCRE 22
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	1/02/2023

3.1.9.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de placa huella				
Sub base granular clase C	m³	577,07	$190.127,00	$109.717.020,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	610,00	823.776,00	$502.503.360,00
Concreto resistencia 14 MPA (G) (ciclópeo)	m³	227,00	541.940,00	$123.020.380,00
Acero de refuerzo Fy = 420 MPa	kg	20041,90	$ 9.942,00	$199.256.567,00
Sello de juntas con material bituminoso	m	2564,77	$ 4.096,00	$10.505.280,00
Sub base granular clase C	m³	577,07	$190.127,00	$109.717.020,00
			Sub- total	**$945.002.607,00**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m³	358,00	$36.671,00	$13.128.218,00
Acero de refuerzo Fy = 420 MPA	m³	3474,00	$ 9.942,00	$ 34.538.508,00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Incluye atraque con sub base granular)"	m	36,00	$870.626,00	$31.342.536,00
Concreto resistencia 14 MPa (F)	m³	1,00	$627.509,00	$627.509,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	56,00	$823.776,00	$46.131.456,00
			Sub- total	**$125.768.227,00**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1.711.197,00	$ 1.711.197,00
			Sub- total	**$ 1.711.197,00**
			Sub total básico de obra (A)	$1.072.482.031,00
Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)				$ 7.517.969,00
			Valor total A+B+AIU	**$1.080.000.000,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.10 SUCRE 1866 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	258-2022

Objeto del Contrato de Obra	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021
Valor del Contrato de Obra	$ 4.306.911.911
Nombre del Contratista	CONSTRUOBRAS GIA SAS
Representante legal	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
Fecha suscripción Contrato de obra	28/10/2022

3.1.10.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Demolición de estructuras	m³	93.60	$174.053,76	$16.291.431,94
Remoción de alcantarillas	m	84.00	$88.439,54	$7.428.921,36
			Sub- total	**$23.720.353,3**
Construcción pavimento rígido				
Excavación de la explanación, canales y prestamos (incluye retiro de material)	m3	7599,75	$ 9,992.33	$ 75,939,209.93
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/km	65357,85	$ 1,684.83	$ 110,116,866.42
Mejoramiento de la subrasante con adición de material	m3	1174,51	$ 109,109.10	$ 128,149,729.04
Sub base granular clase b	m3	2062,50	$ 181,940.55	$ 375,252,384.38
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	21100,67	$ 9,855.75	$ 207,962,928.35
Pavimento en concreto rígido Mr= 4.1 MPa	m3	2612,50	$ 823,981.88	$ 2,152,652,661.50
Bordillo en concreto 21 MPa vaciado in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	ml	5000,00	$ 71,640.11	$ 358,200,550.00
			Sub- total	**$3,408,274,329.61**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	1012,00	$ 32,540.12	$ 32,930,601.44
Relleno para estructuras con material de recebo	M3	402,50	$ 101,368.86	$ 40,800,966.15
Relleno con material proveniente de la excavación	M3	172,50	$ 13,509.53	$ 2,330,393.93

Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	179,40	$ 821,087.76	$ 147,303,144.14
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg	13340,00	$ 9,855.75	$ 131,475,705.00
Concreto resistencia 14 MPa (F)	M3	18,40	$ 675,707.99	$ 12,433,027.02
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior (incluye atraque con sub base granular)	ML	161,00	$ 957,967.62	$ 154,232,786.82
			Sub- total	**$521,506,624.5**
Construcción de filtro				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	753,12	$ 32,540.12	$ 24,506,615.17
Material granular drenante	M3	740,40	$ 198,796.81	$ 147,189,158.12
Geotextil NT 1800 resistencia a la tension 470 N	M2	5491,50	$ 6,069.37	$ 33,329,945.36
Tubería perforada de 4 pulgadas	ML	1569,00	$ 34,094.35	$ 53,494,035.15
			Sub- total	**$258,519,753.80**
Señalización y seguridad vial				
Línea de demarcación con pintura en frio (amarilla o blanca)	ml	7499,00	$ 2,512.29	$ 18,839,662.71
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo X(75x75)	Und	51	$ 652,493.24	$ 33,277,155.24
			Sub- total	**$ 52,116,817.95**
			Sub total básico de obra (A)	$4,264,137,879
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 42,774,034,00
			Valor total A+B+AIU	**$4,306,911,913**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.11 PUERTO TEJADA – CAUCA

A la fecha del presente informe, el contrato asociado al municipio de Puerto Tejada no ha sido adjudicado.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

De acuerdo con lo establecido en el Manual De Interventoría Obra Pública, el contratista implementador deberá efectuar la entrega en medio magnético los siguientes documentos, previo a la suscripción de la orden de inicio:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Copia del documento de aprobación de garantías.
- Contrato suscrito entre Entidad municipal y contratista.
- Carpeta que contenga la información y documentación de la Etapa Precontractual (Pliegos de Condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.).
- Programa de obra e inversión.
- Los contratos que cuenten con anticipo, deben presentar la documentación respectiva de constitución de FIDUCIA y demás requeridos.
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

Adicionalmente, dando cumplimiento a VII. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR "El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra"

- Entrega de hojas de vida del personal profesional
- Gestión municipal y/o certificación programa de Reintegración y Reincorporación
- Entrega de documentos mínimos para la maquinaria
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Gestión municipal y/o certificación para el programa de generación de empleo
- Instalaciones provisionales
- Documentos del laboratorio toma de control de calidad
- Plan de calidad
- Plan de Manejo de Tránsito - PMT
- Certificación inventario de vías publicas
- Realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los

planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG
- Informe, Datos crudos de campo, capas geográficas en formato shapefile con posición original
- Plan de Gestión Social - PGS
- Presentar protocolo bioseguridad a la entidad, ARL y entes territoriales
- Plan Gestión Ambiental
- Estudios y diseños
- Instalación Valla Informativa

3.2.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Envió de Observaciones a documentos previos al inicio de las obras (entrega realizada el 30 de enero de 2023). Mediante comunicado DON-1100-INV-054-2023 del 6/02/2023.
- Solicitud complementar entrega de documentos previos al inicio del Contrato de obra. Según oficio DON-1100-INV-055-2022 del 7/02/2023.
- Solicitud de Contrato firmado y Pólizas actualizadas convenio 1749-2021.

3.2.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Solicitud Documentos contractuales convenio 1982-2021. Por medio de correo electrónico el día 17 de febrero de 2023.
- Solicitud de documentos contractuales. Por medio de correo electrónico el día 17 de febrero de 2023.

3.2.3 ARGELIA – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Respuesta comunicación del 03 de febrero de 2023 (Inicio de las obras del Contrato de obra No ARG-OBRA-009-2022) por medio del oficio DON-1100-INV-052-2022 del 3/02/2023.
- Remisión Estudios para su revisión y/o apropiación. Por medio del oficio DON-1100-INV-059-2022. Del 9/02/2023.
- Respuesta Oficio OF-CTA-009-2022-004 y remisión concepto de Esp. Pavimentos. Del 10/02/2023.
- Observaciones de la Interventoría a los Estudios y diseños entregados por la entidad. DON-1100-INV-059-2023 – 14/02/2023.
- Proceso en las comunicaciones del 15 de febrero de 2023 por medio de Correo electrónico.
- Solicitud Pólizas actualizadas convenio 1984-2023, por medio de correo electrónico de fecha del 17 de febrero de 2023.

3.2.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (pavimento rígido, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1867-2021 del Municipio de Bolívar, realizados por el Esp. de Pavimentos de la Interventoría. Por medio del oficio DON-1100-INV-060-2022. Enviado el día 22/02/2023.

3.2.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 26 de enero). DON-1100-INV-050-2022 – 2/02/2023.
- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1750-2021 del Municipio de Bolívar, realizados por el Esp. de Pavimentos de la Interventoría. Por medio del oficio DON-1100-INV-056-2022. De fecha 3/02/2023.
- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 06 de febrero). DON-1100-INV-057-2022 – 8/02/2023.

- Solicitud de Pólizas Actualizadas y Minuta del Contrato -Convenio 1750-2021, por medio de Correo electrónico de fecha del 17 de febrero de 2023.
- Reiteración de solicitud de Pólizas Actualizadas del Contrato -Convenio 1750-2021, por medio de correo electrónico de fecha del 21 de febrero del 2023.

3.2.6 INZA – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Revisión a la corrección de Análisis de Precios Unitarios enviada el 12 de enero del 2023 presentada por el Contratista. Por medio del oficio DON-1100-INV-058-2023 de fecha 9/02/2023.
- Solicitud Minuta del Contrato firmada y Pólizas Actualizadas Convenio 1983-2021, por medio de correo electrónico de fecha del 17 de febrero del 2023.
- Solicitud de Pólizas Actualizadas Convenio 1983-2021, por medio de correo electrónico con fecha del 21 de febrero del 2023.
- Reiteración de solicitud de garantías de cumplimiento Convenio 1983-2021, por medio de correo electrónico con fecha del 22 de febrero del 2023.

3.2.7 MERCADERES – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1894-2021 del Municipio de Mercaderes, realizados por el Esp. De Pavimentos de la Interventoría. Por medio del oficio DON-1100-INV-061-2022 de fecha 22/02/2023.
- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 09 de febrero). Por medio del oficio DON-1100-INV-062-2022. De fecha 22/02/2023.

3.2.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado.

- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 30 de enero). Por medio del oficio DON-1100-INV-051-2023 con fecha del 2/02/2023.
- Solicitud de Prórroga y actualización de Pólizas del Contrato de obra N. 484-2022 del Convenio 1768-2021 Municipio de Santander Quilichao- Instituto Nacional de Vías. Por medio del oficio DON-1100-INV-053-2023 – 3/02/2023.

3.2.9 SUCRE 1769 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado. Para el presente periodo el contratista no radico comunicaciones ante la interventoría.

3.2.10 SUCRE 1866 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO por requerimientos administrativos que el contratista no ha entregado. Para el presente periodo el contratista no radico comunicaciones ante la interventoría.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los contratos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría en cuanto a revisar y aprobar las condiciones estipuladas para el desarrollo de cada uno de los proyectos, se solicita a los contratistas de obra la entrega de los documentos requeridos para dar inicio a la etapa de construcción.

Durante el periodo del presente informe, se realiza seguimiento a las entregas del contratista respecto a los requerimientos previo a la orden de inicio. Las cuales se listan a continuación:

3.4.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	ALMAGUER 1	
CONVENIO	**1749-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	641 del 14 de octubre del 2022
Copia de Registro presupuestal	OK	815 del 29 de ciciembre de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	OK	29 de diciembre de 2022
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. F1-F14-289-2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	OK	*Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Póliza de buen manejo del anticipo *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	*Pliego Condiciones
Anticipo	Sin enviar	*Registro Presupuestal

3.4.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	ALMAGUER 2	
CONVENIO	**1982-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013	Sin enviar	

del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD		
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	642 del 14 de octubre de 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 23 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Póliza de buen manejo del anticipo *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.3 ARGELIA – CAUCA

	ARGELIA	
CONVENIO	**1984-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	636 de 29 de julio de 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA No. ARG-OBRA-009-2022 DE 7 DE OCTUBRE DE 2022

Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica *Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	BOLIVAR 1	
CONVENIO	**1867-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	CONTRATO No. LP 005-003-15.05/059 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor

Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	BOLIVAR 2	
CONVENIO	**1750-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 16 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.6 INZA – CAUCA

	INZA	
CONVENIO	**1983-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	

Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	464 del 1 de agosto de 2022
Copia de Registro presupuestal	OK	37 del 10 de octubre de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	Pendiente	Hay una aprobación de pólizas inicialmente con fecha de firma del día 10 de octubre 2022, sin embargo, los amparos ya están vencidos. Se debe actualizar las pólizas teniendo en cuenta el acta de inicio
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	Contrato No. 141 de 2022 del 27 de septiembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.7 MERCADERES – CAUCA

	MERCADERES	
CONVENIO	**1894-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito el 30 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc).	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato

*Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor		*Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

	SANTANDER DE QUILICHAO	
CONVENIO	**1768-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	OK	1070 del 24 de junio de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 1 de septiembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica *Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.9 SUCRE 1769 – CAUCA

	SUCRE 1	
CONVENIO	**1866-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	693 del 9 de septiembre del 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Pendiente	RESOLUCION No, 727 del 01 de noviembre de 2022 Resolucion falta hoja N 2
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.10 SUCRE 1866 – CAUCA

	SUCRE 2	
CONVENIO	**1769-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolucion 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolusión No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	

Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	762 del 20 de octubre del 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	OK	RESOLUCION N° 118 del 14 de febrero de 2023
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-090-2023 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 Falta firma del contratista
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan informes semanales del periodo 12 al 31 de diciembre de 2022 de los contratos de obra de los convenios en formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3:

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023
- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023
- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023
- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

4.1.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36". construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
CONTRATO No:	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899.891.301,00
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 899.891.301,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.799.782.602,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899.891.301,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899.891.301,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %: 0.00%

Avance o Atraso Físico %: 0.00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100.0%
					Ejec					
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100.0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tuberia de 36" en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI NO		N/A
EMISIONES:	SI NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALÚOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-054-2023 del 06 de febrero, la interventoría devolvió con observaciones los documentos previos entregados por el contratista referentes a: Plan de Calidad, Maquinaria Mínima del proyecto, Análisis de Precios Unitarios y flujo de caja.
2. Mediante comunicación DON-1100-INV-055-2023 del 07 de febrero la interventoría solicito al contratista, complementar la entrega de documentos previos, de acuerdo al Manual de Interventoría del INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificación y seguimiento a los compromisos acordados en reunión virtual del 26 de enero.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

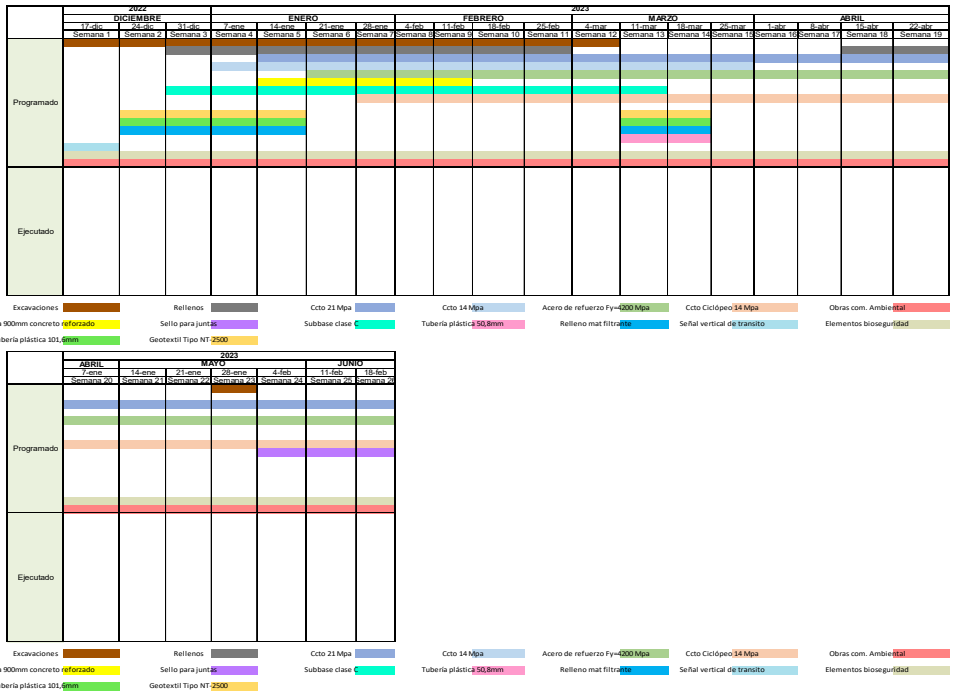

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad

FOTO 2 — Indicar localización y actividad

FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1749 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matricula Profesional No.: 2520223626D-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 Ultimo Informe Semanal S☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.799.782.602,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.799.782.602,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899.891.301,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 899.891.301,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.799.782.602,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899.891.301,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899.891.301,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....
DISPONIBLE

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALUOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-035-2022 del 18 de enero, la interventoría envía hoja de vida de los especialistas que estarán a cargo de la revisión de los estudios y diseños de las obras del convenio, para revisión y aprobación del INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

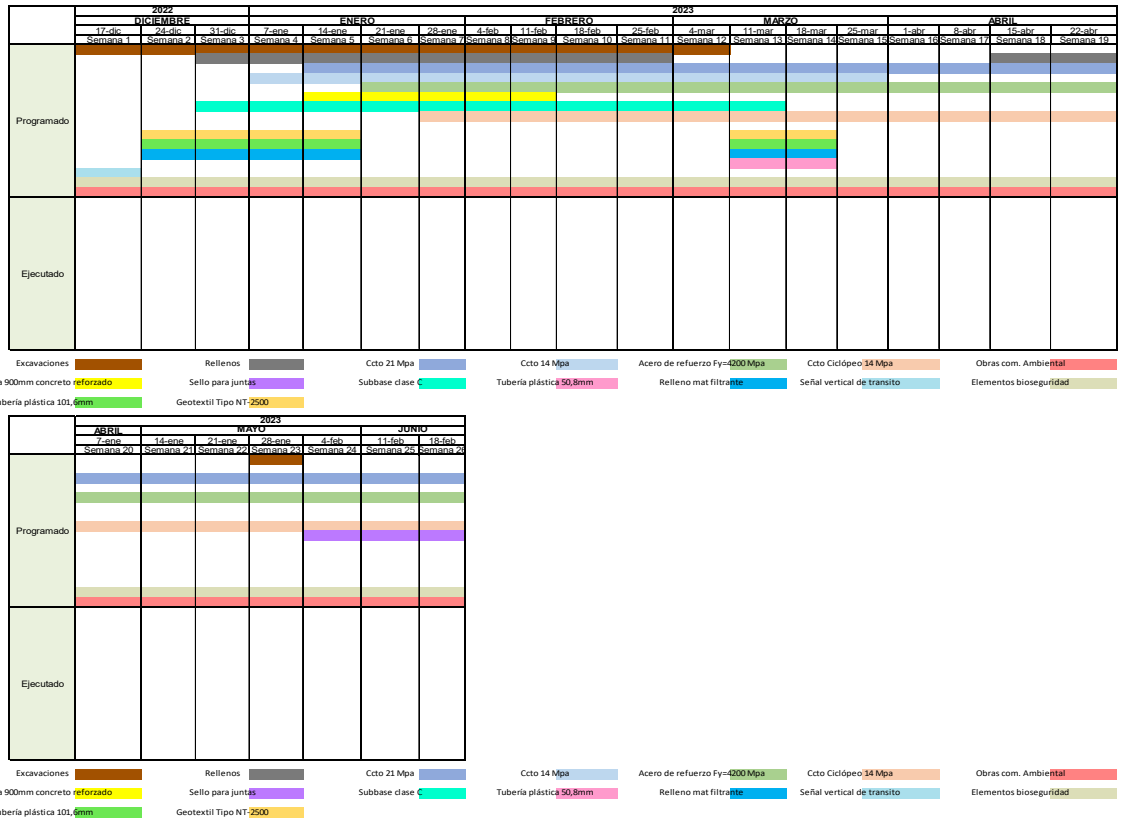

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1749 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ ELABORÓ

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 del 17/02/2023 al 23/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36". construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899.891.301,00
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 899.891.301,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.799.782.602,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899.891.301,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899.891.301,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-071-2022 del 07 de marzo se envió al Municipio de Almaguer para informar sobre la cuenta en la cual se deben hacer el reintegro al instituto de los rendimientos financieros generados de los recursos del convenio 1749-2021 Municipio de Almaguer.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

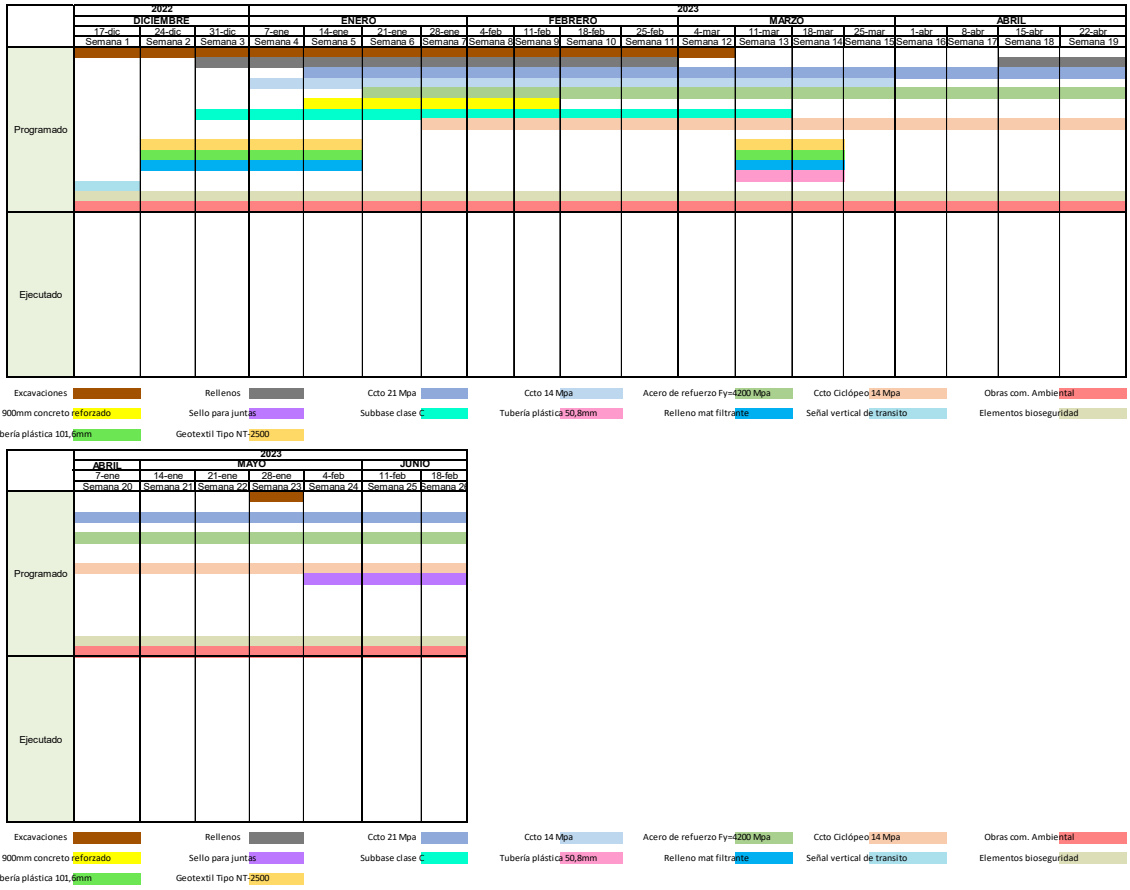

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1749 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36". construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.799.782.602,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899.891.301,00
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 899.891.301,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.799.782.602			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.799.782.602,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899.891.301,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899.891.301,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-071-2022 del 07 de marzo se envió al Municipio de Almaguer para informar sobre la cuenta en la cual se deben hacer el reintegro al instituto de los rendimientos financieros generados de los recursos del convenio 1749-2021 Municipio de Almaguer.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

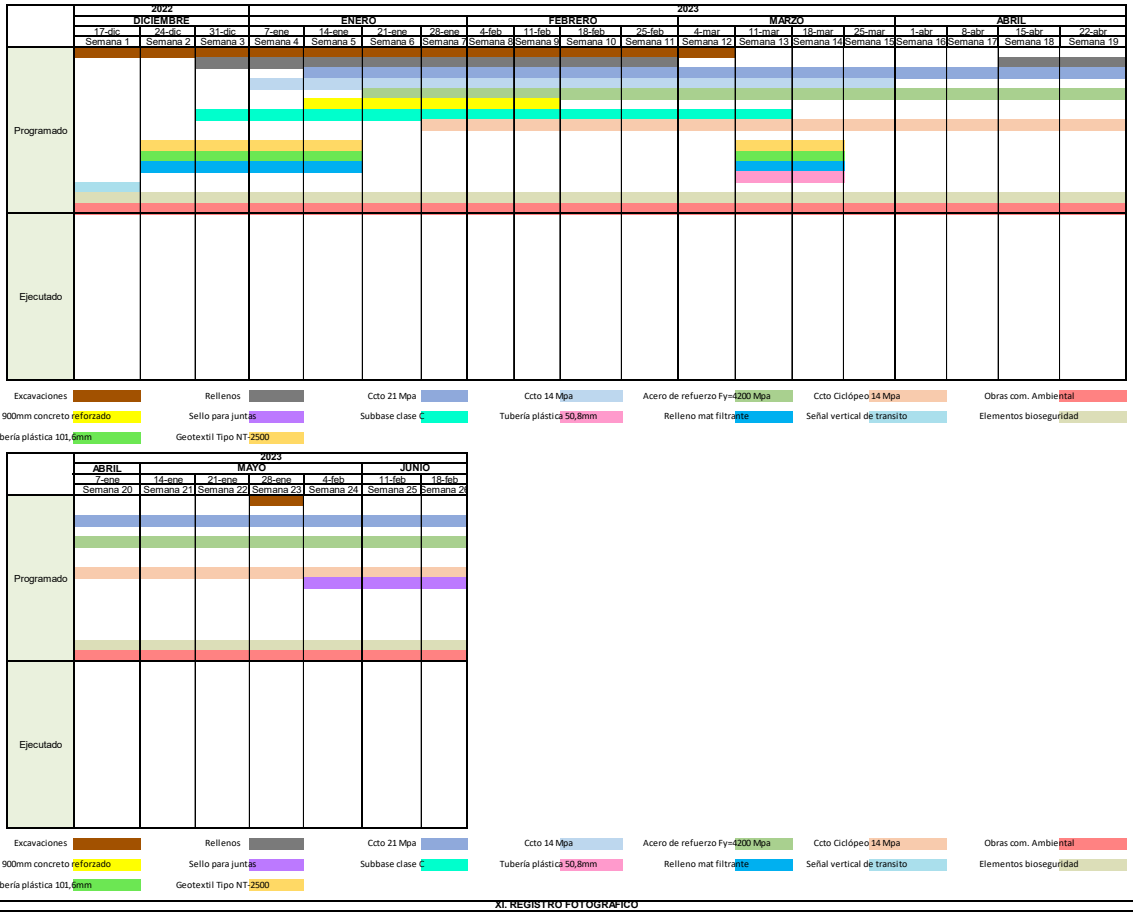

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1749 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 2520223826O-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

4.1.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 3/02/2023 al 9/02/2023 Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tamo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 795.011.198,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 795.011.198,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795.011.198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 795.011.198			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795.011.198,00		
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%	
(Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)			
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -		
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%	
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00		
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene firmado el contrato de obra.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100,0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
						Ejec					
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A la fecha del presente informe el contratista de obra manifiesta que no ha firmado contrato con el Municipio de Almaguer para ejecución de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1982 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tamo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 795.011.198,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 795.011.198,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795.011.198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 795.011.198			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795.011.198,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene firmado el contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36¨en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A la fecha del presente informe el Contratista de obra manifiesta que no ha firmado contrato con el Municipio de Almaguer para ejecución de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1982 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 11 del 17/02/2023 al 23/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tamo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 795.011.198,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 795.011.198,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795.011.198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 795.011.198			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795.011.198,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene firmado el contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36¨en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A la fecha del presente informe el Contratista de obra manifiesta que no ha firmado contrato con el Municipio de Almaguer para ejecución de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1982 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 12 - 24022023 – 02032023

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 (Numeración consecutiva) del 24/02/2023 al 2/03/2023 — Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tamo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 795.011.198,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 795.011.198,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795.011.198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 795.011.198			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795.011.198,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene firmado el contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36¨en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1982 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.3 ARGELIA – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invías y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	VALOR INICIAL: $ 958.081.628,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 958.081.628,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958.081.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 958.081.628			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958.081.628,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Mantenimiento periodico	M2	1500			Prog		1500		1500	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 450 metros lineales de placa huella y construccion de 10 alcantarillas con tuberia de 36" en concreto reforzado.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de via
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI NO		N/A
EMISIONES:	SI NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante correo electrónico del 08 de febrero el Municipio de Argelia envió los estudios y diseños para la construcción de placa huella objeto del presente convenio.
2. El 08 de febrero el contratista de obra envió oficio de disponibilidad de maquinaria para las obras del convenio.
3. En comunicación DON-1100-INV-059-2022 del 09 de febrero la interventoría envió al contratista los estudios y diseños para que en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, se pronuncie sobre los mismos e indique si son aprobados o realizará ajustes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de los términos de referencia.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

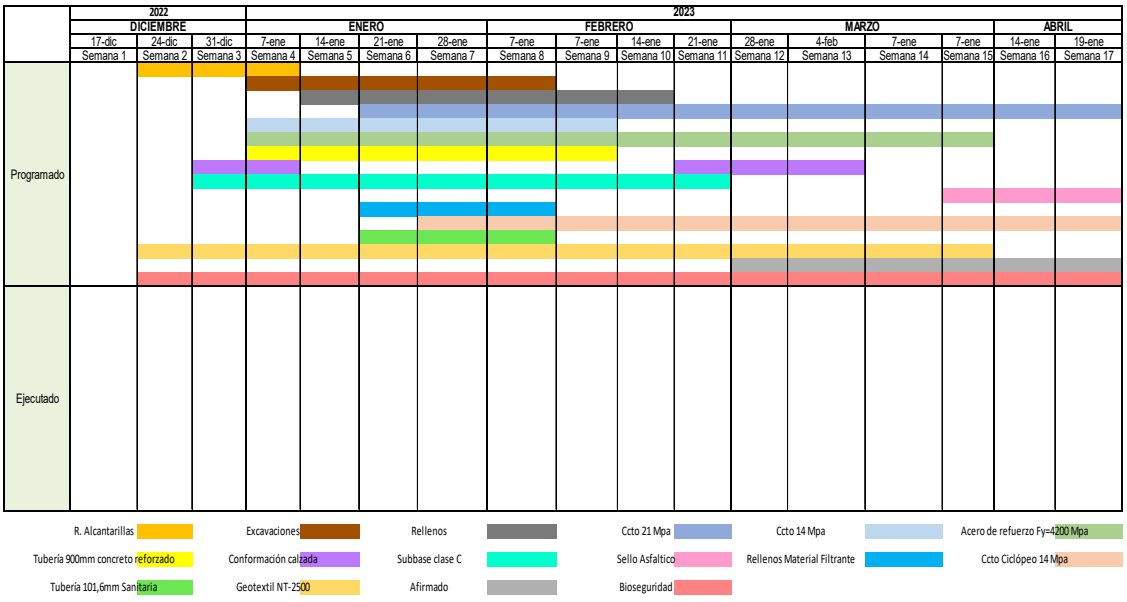

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité de seguimiento al inicio de obras para tratar definir fecha de entrega de respuesta por parte del Municipio a las observaciones a los estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta tisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	VALOR INICIAL:	$ 958.081.628,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 958.081.628,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958.081.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 958.081.628			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958.081.628,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%
EJECUTADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Mantenimiento periodico	M2	1500			Prog		1500		1500	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 450 metros lineales de placa huella y construccion de 10 alcantarillas con tuberia de 36" en concreto reforzado.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de via
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Con comunicación DON-1100-INV-059-2023 del 13 de febrero la interventoría emite comentarios y observaciones a los Estudios y Diseños presentados por el Municipio de Argelia para las obras del convenio.
2. El 16 de febrero la Interventoría convoco mediante correo electrónico convoco a comité de obra el día 23 de febrero al Contratista y a la entidad en la territorial Cauca, para tratar los asuntos pendientes para dar inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

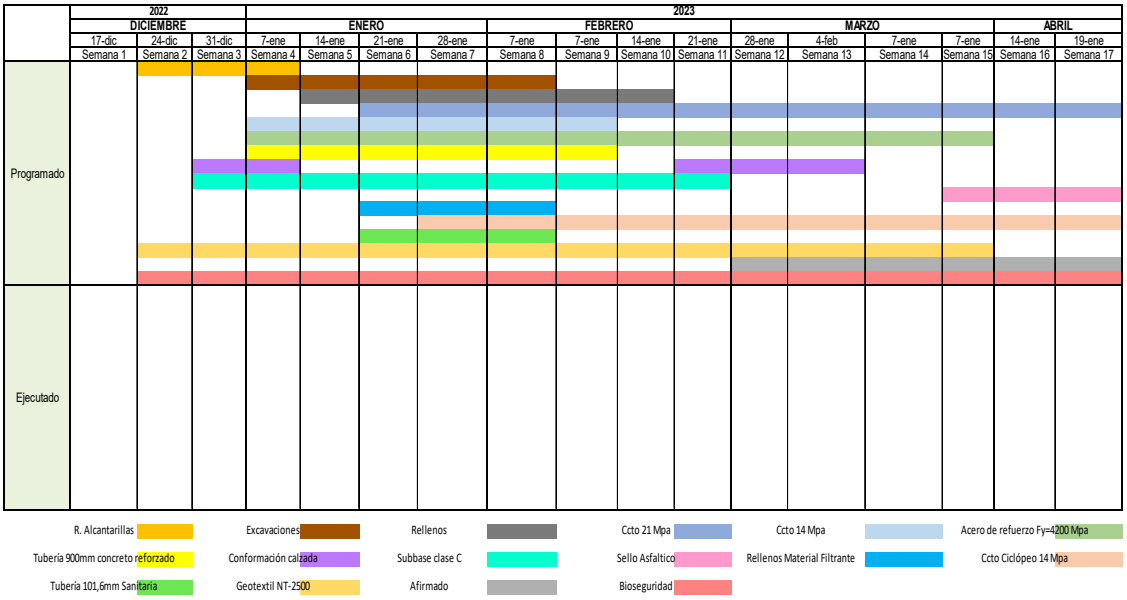

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité de seguimiento al inicio de obras para tratar definir fecha de entrega de respuesta por parte del Municipio a las observaciones a los estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es."INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 (Numeración consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023 Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 958.081.628,00	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 958.081.628,00	VALOR ACUMULADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958.081.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 958.081.628			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958.081.628,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%
EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Mantenimiento periodico	M2	1500			Prog		1500		1500	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 450 metros lineales de placa huella y construccion de 10 alcantarillas con tuberia de 36' en concreto reforzado.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de via
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALÚOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

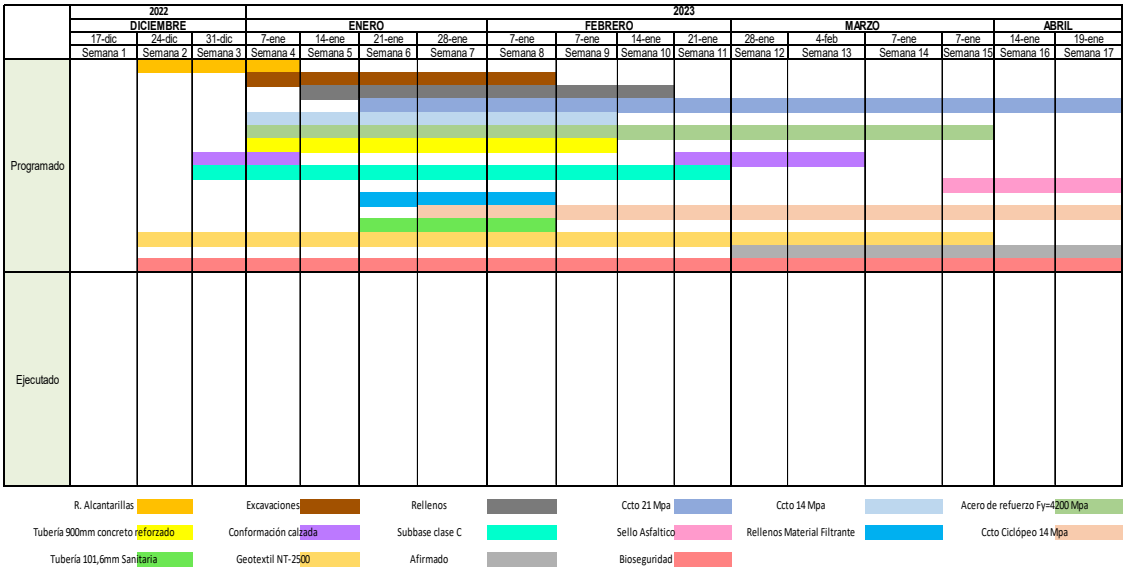

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité de seguimiento al inicio de obras para tratar definir fecha de entrega de respuesta por parte del Municipio a las observaciones a los estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

- Informe Semanal 12 - 24022023 – 02032023

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 (Numeración consecutiva) del 24/02/2023 al 2/03/2023 — Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	VALOR INICIAL: $ 958.081.628,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 958.081.628,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958.081.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 958.081.628			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958.081.628,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
* Mantenimiento periodico	M2	1500			Prog		1500		1500	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 450 metros lineales de placa huella y construccion de 10 alcantarillas con tuberia de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de via
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ (DISPONIBLE)
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALÚOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

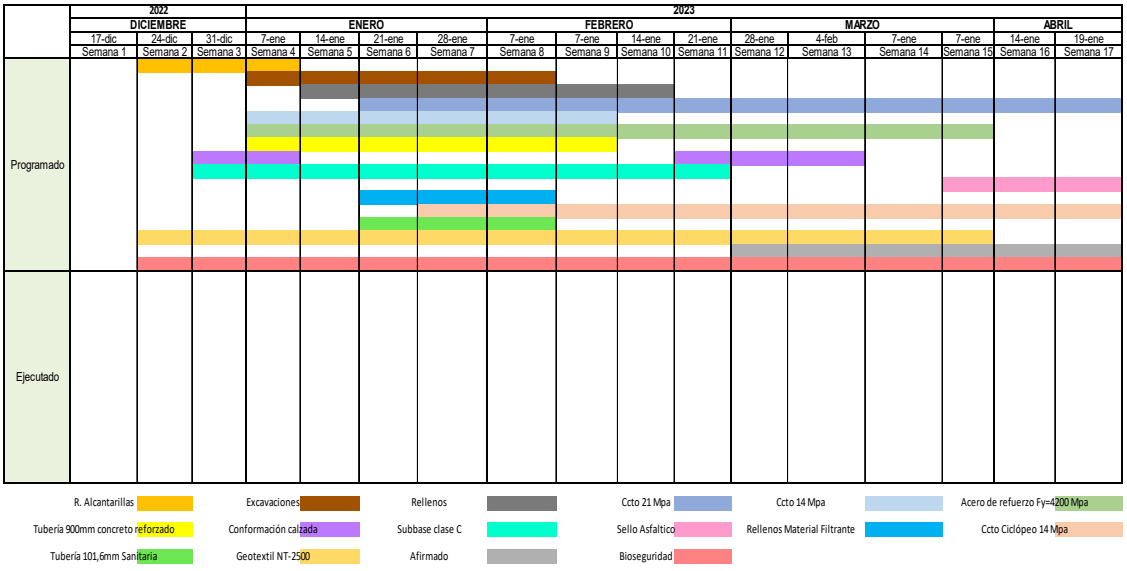

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité de seguimiento al inicio de obras para tratar definir fecha de entrega de respuesta por parte del Municipio a las observaciones a los estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 3/02/2023 al 9/02/2023 — Ultimo Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolivar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vias. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	VALOR INICIAL: $ 3.478.131.956,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 3.478.131.956,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ 1.043.439.586,80	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 1.043.439.586,80			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.478.131.956,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.043.439.586,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.043.439.586,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100,0%
					Ejec					
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100,0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100,0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec					
* Señales de transito	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de transito.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

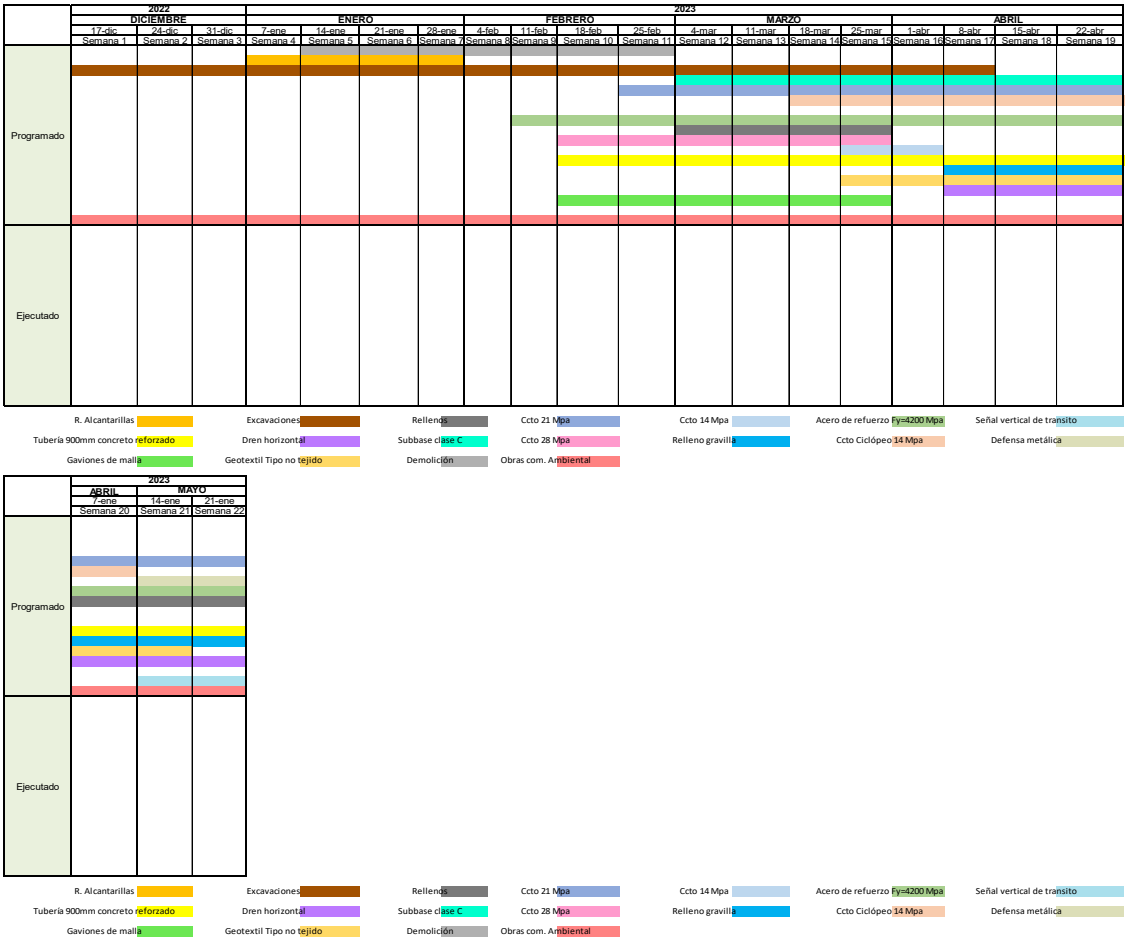

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1867 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Marzo 10 de 2023	

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 (Numeración consecutiva) del 10/02/2023 al 16/02/2023 Ultimo Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolivar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 3.478.131.956,00	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 3.478.131.956,00	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.043.439.586,80	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.043.439.586,80	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.478.131.956,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.043.439.586,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.043.439.586,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	31691961000
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100,0%
					Ejec					
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100,0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100,0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec					
* Señales de transito	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de transito.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALUOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

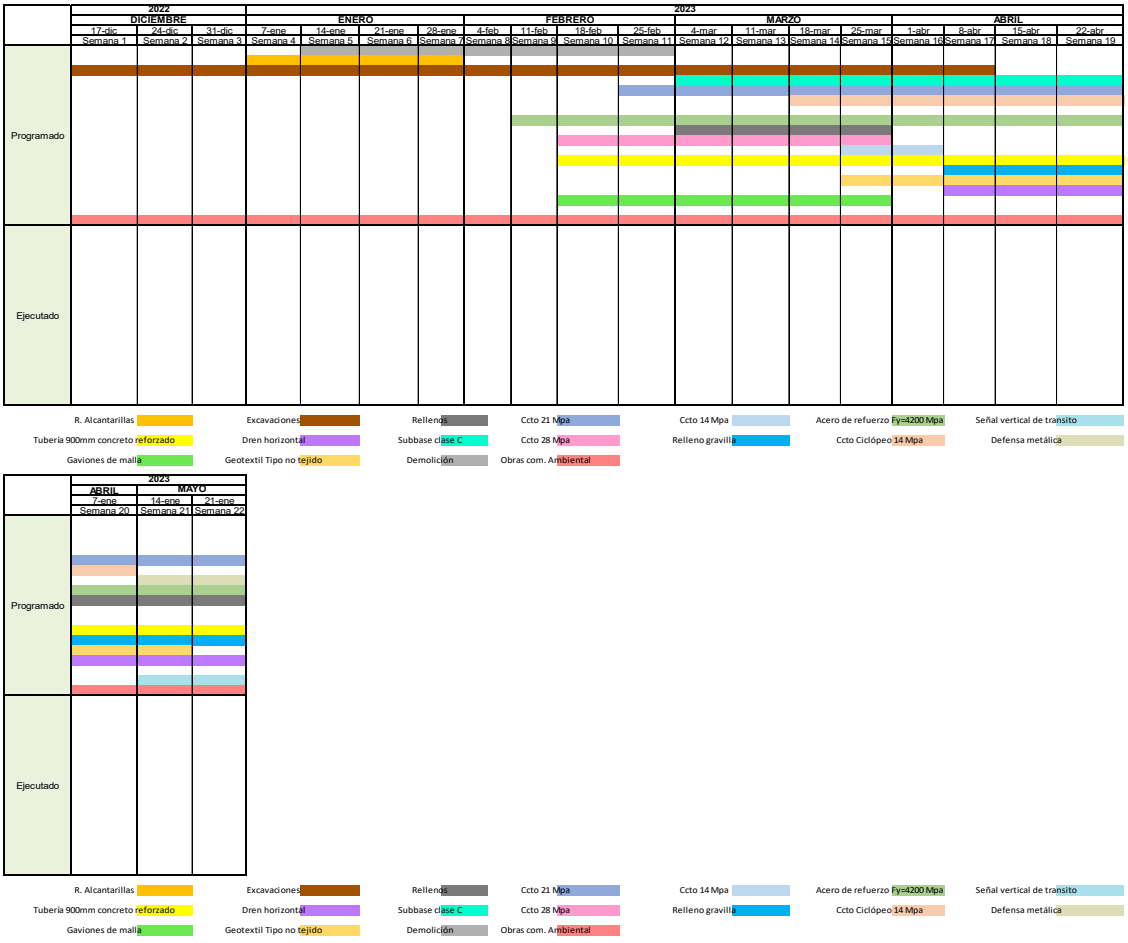

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1867 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matricula Profesional No.: 2520223826O-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 11 (Numeración consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023 — Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolívar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	VALOR INICIAL: $	3.478.131.956,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $	3.478.131.956,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $	1.043.439.586,80
		VALOR AMORTIZADO: $	-
		SALDO POR AMORTIZAR $	1.043.439.586,80
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $	1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $	-
		VALOR AMORTIZADO: $	-
		SALDO POR AMORTIZAR: $	-

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.478.131.956,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
	$ 4.510.486,75	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.043.439.586,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.043.439.586,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100,0%
					Ejec					
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100,0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100,0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec					
* Señales de transito	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de transito.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

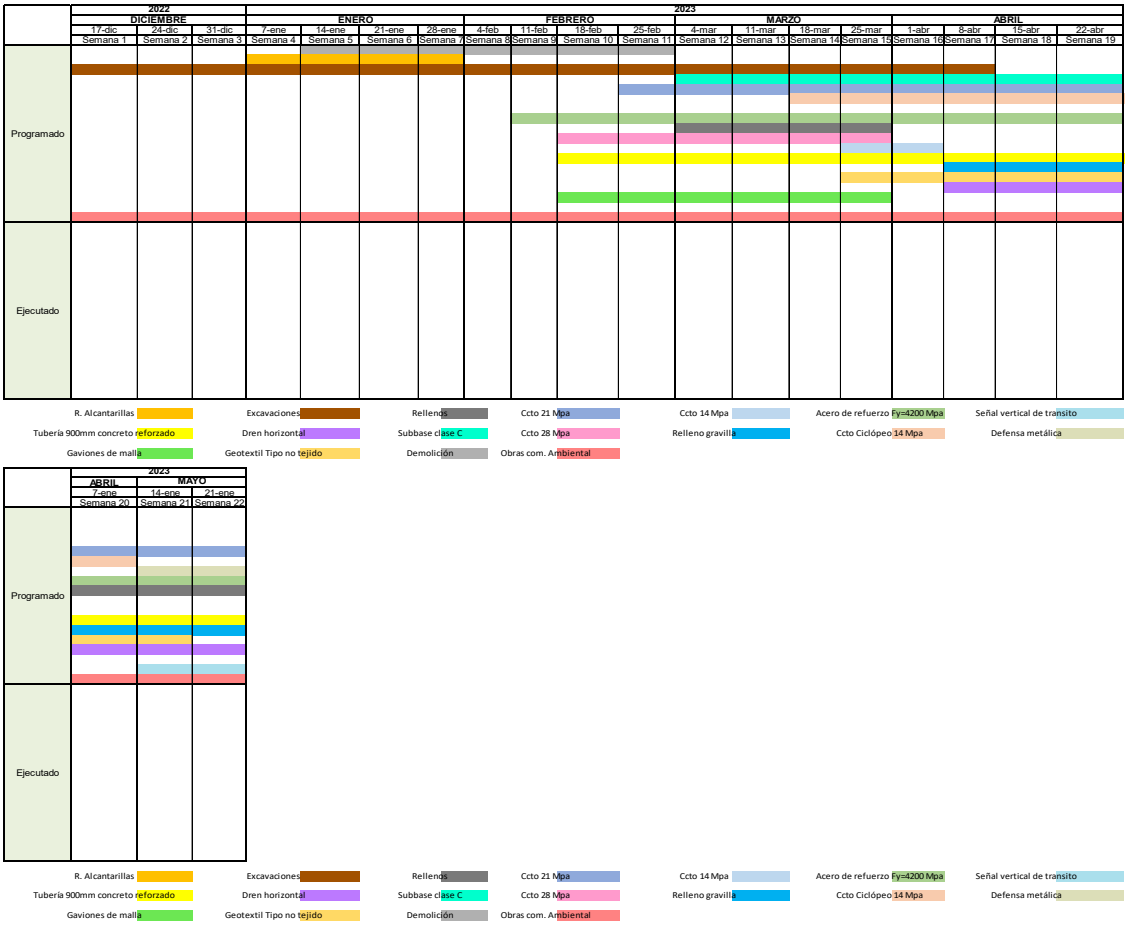

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1867 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolivar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	VALOR INICIAL: $ 3.478.131.956,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 3.478.131.956,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ 1.043.439.586,80	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 1.043.439.586,80			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.478.131.956			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.478.131.956,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.043.439.586,80
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.043.439.586,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100,0%
					Ejec					
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100,0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100,0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100,0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec					
* Señales de transito	UND	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de transito.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

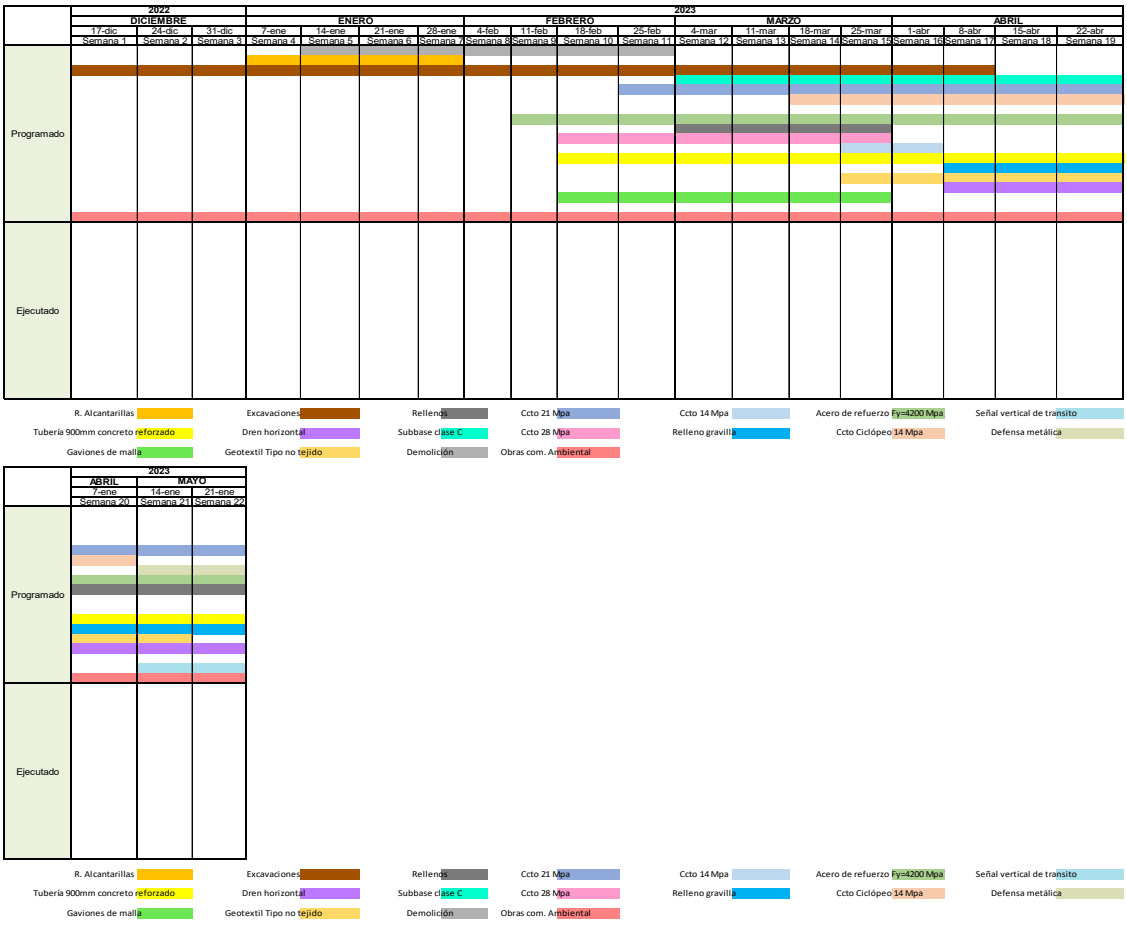

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1867 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: MARÍA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

4.1.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolivar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de placa huella

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	VALOR INICIAL:	$ 1.063.184.929,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 1.063.184.929,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ 318.955.478,70	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 318.955.478,70			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.063.184.929,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318.955.478,70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318.955.478,70

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36' en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. En comunicación LP 004-003-15.05/058 - 001 del 06 de febrero el contratista, responde a las observaciones hechas por la interventoría a los documentos previos presentados para inicio de las obras del convenio.
2. Mediante comunicación DON-1100-INV-056-2022 del 07 de febrero la interventoría remitió al Municipio de Bolívar las observaciones a los Estudios y Diseños presentados para las obras del convenio.
3. La interventoría realizo revisión a documentos previos al inicio de las obras y mediante comunicación DON-1100-INV-057-2022 del 08 de febrero envió observaciones para atención y corrección del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

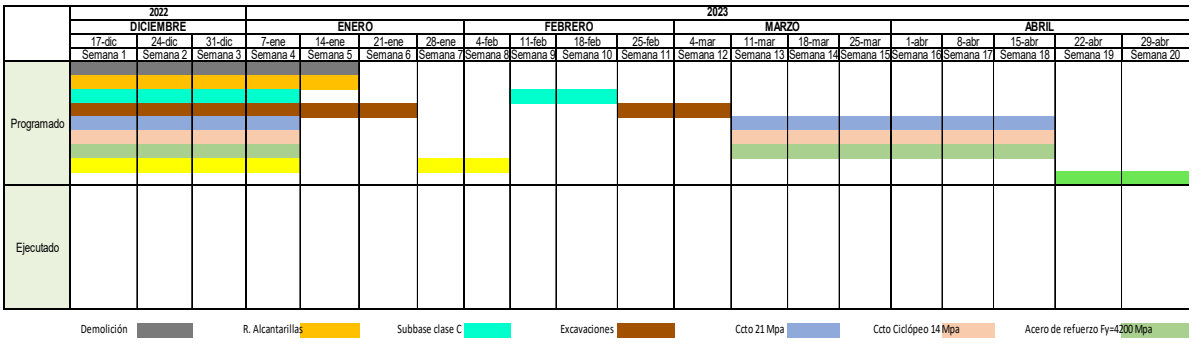

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1750 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de placa huella

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	VALOR INICIAL:	$ 1.063.184.929,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 1.063.184.929,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ 318.955.478,70	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 318.955.478,70			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.063.184.929,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318.955.478,70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318.955.478,70

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 13 de febrero el contratista envió a la interventoría mediante correo electrónico el flujo de caja, plan de inversión y programación de obra para revisión y aprobación de la interventoría.
2. El 16 de febrero la interventoría cito a comité técnico para el día jueves 23 de febrero en la territorial cuaca, a la Alcaldía Municipal y al contratista para definir lo referente a estudios y diseños, presupuesto, ítems no previstos y documentos entregados por el contratista previo al inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

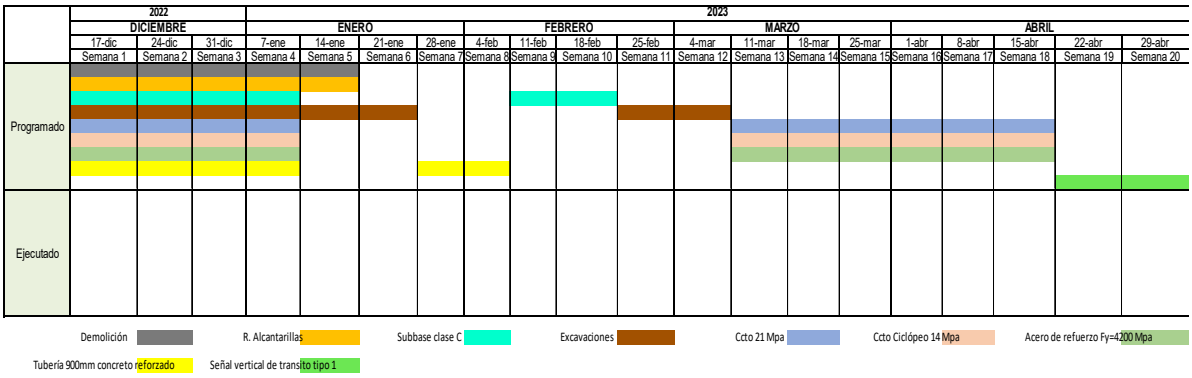

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1750 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 11 (Numeración consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023 — Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de placa huella

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	VALOR INICIAL:	$ 1.063.184.929,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 1.063.184.929,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ 318.955.478,70	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 318.955.478,70			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.063.184.929,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318.955.478,70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318.955.478,70

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 21 de febrero la interventoría solcito al contratista pólizas actualizadas del contrato de obra.
2. Se realizo comité de obra en la territorial Cauca para definir lo referente para tratar asuntos técnicos de cada convenio y se fijaron compromisos y fechas de entrega.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

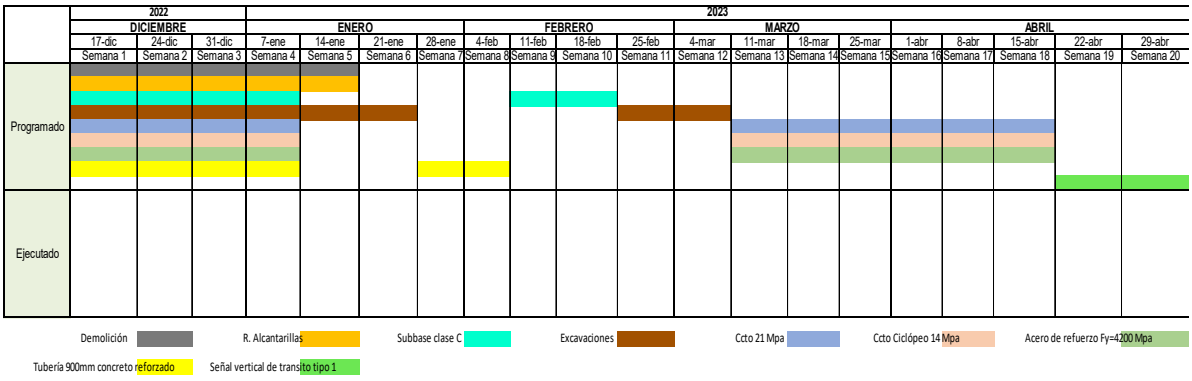

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1750 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 12 (Numeración consecutiva) del 24/02/2023 al 2/03/2023 Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de placa huella

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	VALOR INICIAL: $ 1.063.184.929,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 1.063.184.929,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ 318.955.478,70	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 318.955.478,70			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.063.184.929			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.063.184.929,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318.955.478,70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318.955.478,70

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100,0%
					Ejec					
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESION DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

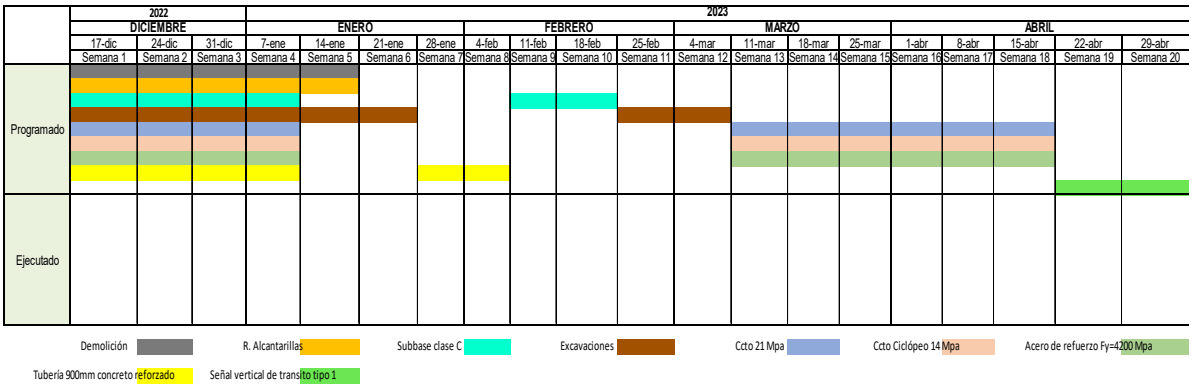

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la Alcaldía Municipal los Estudios y Diseños de las obras objeto del convenio 1750 - 2021 y al contratista la entrega de documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ELABORÓ	APROBÓ
ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

4.1.6 INZA – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeracion consecutiva) Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	141 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 608.231.289,49	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 608.231.289,49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608.231.289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 608.231.289			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608.231.289,49	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%
EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	KM	3,07	3,07		Prog	3,07			3,07	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante correo electrónico del 06 de febrero, el contratista envía APU's corregidos para revisión de la Interventoría.
2. Una vez revisada la entrega de documentos hecha por el contratista como requisito para el inicio de las obras del convenio, emite observaciones en comunicación DON-1100-INV-058-2023 del 09 de febrero.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

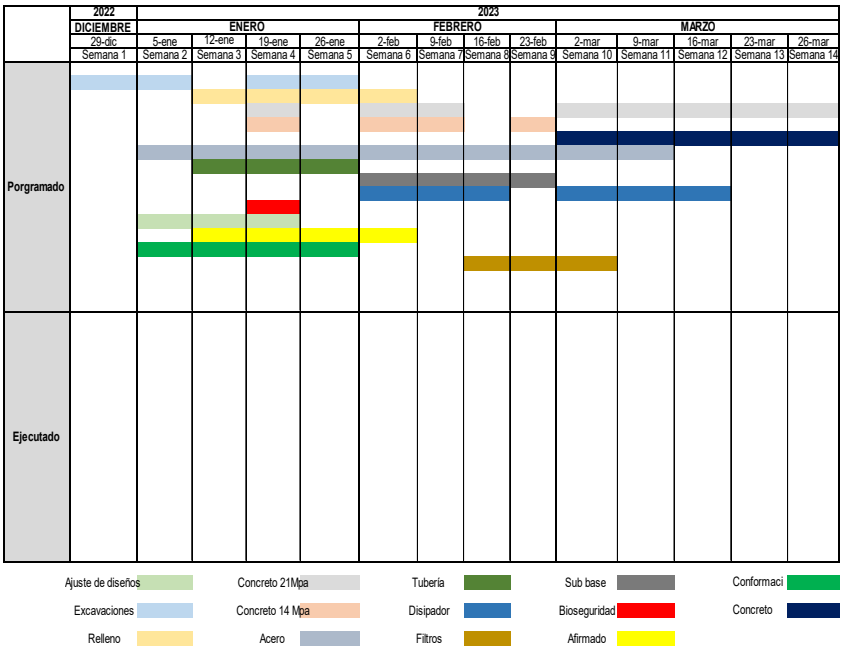

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No:	141 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 608.231.289,49	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 608.231.289,49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608.231.289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 608.231.289			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608.231.289,49	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	KM	3,07	3,07		Prog	3,07			3,07	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 16 de febrero la Interventoría convoco a comité el jueves 23 de febrero, en la territorial Cauca para tratar asuntos técnicos y documentales pertinentes al inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

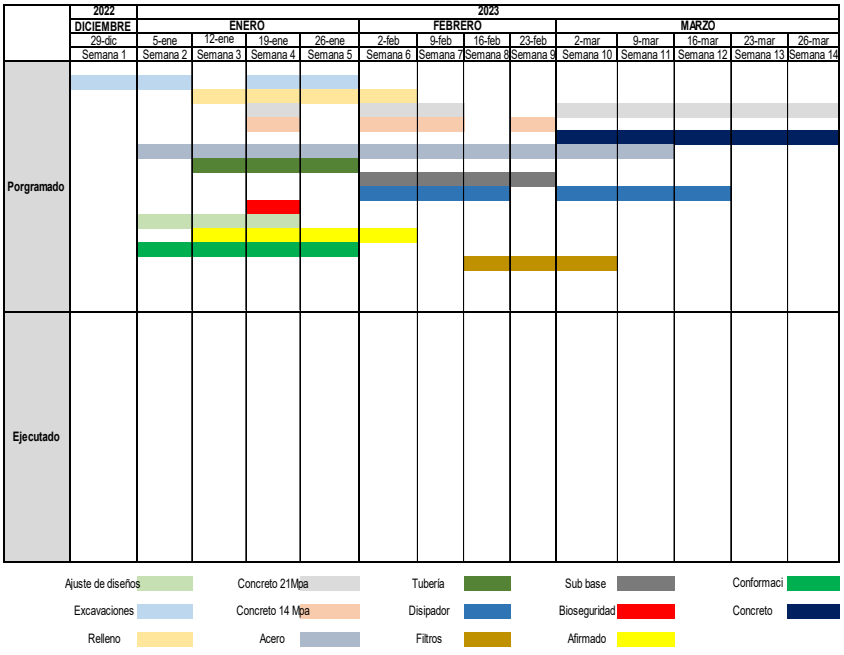

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ELABORÓ	APROBÓ
ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 del 17/02/2023 al 23/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	141 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 608.231.289,49	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 608.231.289,49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608.231.289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 608.231.289			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608.231.289,49	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	KM	3,07	3,07		Prog	3,07			3,07	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	**4**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 23 de febrero se realizó reunión con el Contratista y el Municipio de Inzá, donde se adquirieron compromisos por parte del contratista para entrega de documentos y atender las observaciones de la interventoría a los que ya se habían presentado. Los temas tratados y los compromisos adquiridos quedaron consignados en Acta de Comité.
2. El contratista envió mediante correo electrónico las pólizas y minuta del contrato.
3. Mediante correo electrónico del 23 de febrero el contratista envió hoja de vida del residente, hoja de vida del director de obra y flujo de caja de la inversión del anticipo para revisión y aprobación de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

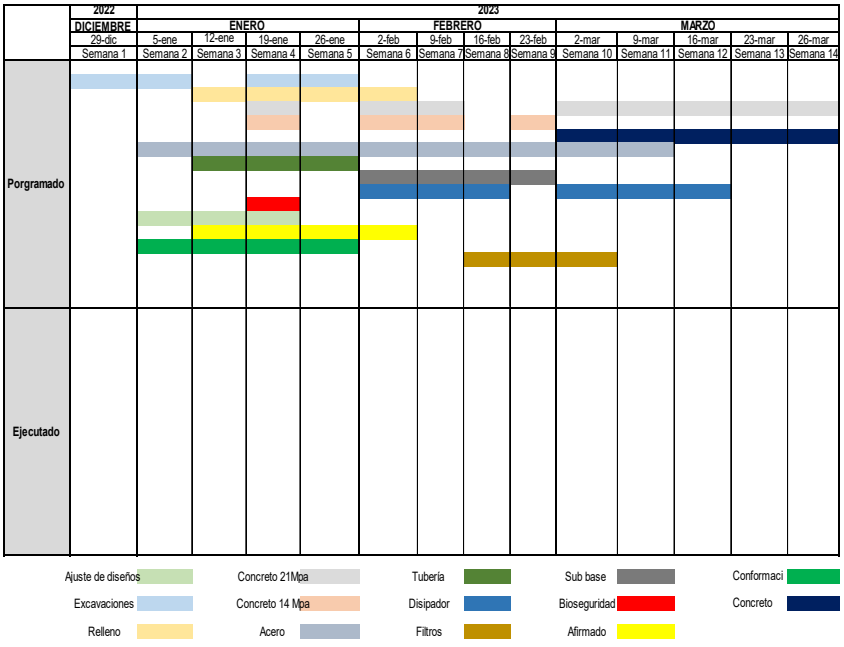

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	141 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 608.231.289,49	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 608.231.289,49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608.231.289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 608.231.289			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608.231.289,49	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	KM	3,07	3,07		Prog	3,07			3,07	100,0%
					Ejec					
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	**4**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se informa según fechas programadas y ejecutadas que hasta la fecha no se han iniciado actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

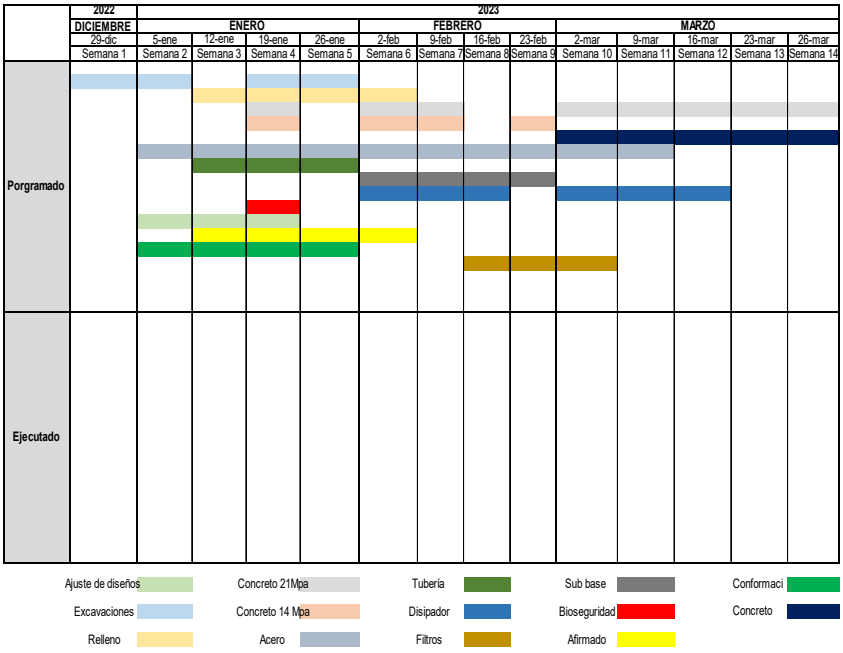

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.7 MERCADERES – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 2.248.615.000,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.248.615.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.124.307.500,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.124.307.500,00		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.248.615.000,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.124.307.500,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.124.307.500,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidraulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 09 de febrero la Alcaldía Municipal de Mercaderes envió los estudios y diseños y realizo entrega parcial de los documentos previo al inicio de las obras del convenio para revisión y aprobación de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual del convenio.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 2.248.615.000,00	CONTRATO No. 1100 de 2022		VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.248.615.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023		VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.124.307.500,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.124.307.500,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.248.615.000,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.124.307.500,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.124.307.500,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidraulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoría convoco el 17 de febrero mediante correo electrónico al Municipio de Mercaderes y al contratista de las obras del convenio a reunión en la territorial Cauca el 23 de febrero para tratar asuntos técnicos y documentales para inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Informar al INVIAS el estado actual del convenio 1894-2021.
2. Se realizará comité de obra en la territorial Cauca para tratar asuntos de técnicos referente a los entregables de los estudio y diseños de las obras del convenio.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

CALIDAD INVÍAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 del 17/02/2023 al 23/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	**$ 2.248.615.000,00**	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1.740.313.120,00**
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.248.615.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.124.307.500,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.124.307.500,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 2.248.615.000,00**	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.124.307.500,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.124.307.500,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidraulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realizo comité en la territorial Cauca, donde se acordaron compromisos de entrega documental por parte del contratista y compromiso de entrega de estudios y diseños por parte de la entidad Municipal. Los temas tratados en comité y los compromisos acordados quedaron registrados en el Acta de Reunión No. 3.
2. Mediante comunicación DON-1100-INV-061-2022 del 22 de febrero la interventoría emitió concepto sobre los estudios y diseños presentados por la Alcaldía Municipal de Mercaderes.
3. En comunicación DON-1100-INV-062-2022 del 22 de febrero la interventoría realizo observaciones a los documentos entregados por el contratista para revisión y aprobación de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 Ultimo Informe Semanal SI ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 2.248.615.000,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.248.615.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.124.307.500,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.124.307.500,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.248.615.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.248.615.000,00		
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -		
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00		
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.124.307.500,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1.124.307.500,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidraulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL: $ 912.367.379,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO: $ 912.367.379,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912.367.379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 912.367.379			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912.367.379,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % | Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100,0%
						Ejec					
*	Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100,0%
						Ejec					
*	Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100,0%
						Ejec					
*	Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100,0%
						Ejec					
*											

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-051-2023 enviada el 07 de febrero se le realizaron observaciones a la entrega parcial de documentos realizada por el contratista.
2. En comunicación DON-1100-INV-053-2023 radicada el 07 de febrero se le solicito al contratista allegar a la interventoría la prórroga del contrato y las pólizas actualizadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay Programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 (Numeración consecutiva) del 10/02/2023 al 16/02/2023 Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL:	$ 912.367.379,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 912.367.379,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912.367.379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 912.367.379			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912.367.379,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100,0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante correo electrónico la interventoría convoco a comité a la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao y a l contratista el día 23 de febrero en la territorial Cauca para realizar seguimiento al avance del proceso de inicio de las obras, referente a entrega de documentos y estado de los estudios y diseños de las obras del convenio.
2. La interventoría solicito al contratista la entrega de pólizas actualizadas y minuta del contrato firmada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité técnico en la territorial Cauca para tratar asuntos técnicos y documentales del convenio.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay Programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Marzo 10 de 2023	

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 (Numeración consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023 Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO			REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL:	$ 912.367.379,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 912.367.379,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912.367.379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 912.367.379			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912.367.379,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100,0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría, pólizas actualizadas y el otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay Programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeracion consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL: $ 912.367.379,00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO: $ 912.367.379,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912.367.379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 912.367.379			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	912.367.379,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$	-	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100,0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100,0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100,0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría pólizas actualizadas y el otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay Programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.9 SUCRE 1769 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastrera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	VALOR INICIAL: $ 1.078.384.354,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO: $ 1.078.384.354,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
	VALOR AMORTIZADO: $ -		VALOR AMORTIZADO: $ -
	SALDO POR AMORTIZAR $ -		SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.078.384.354,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ ELABORÓ	APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Una vez revisados los estudios y diseños por la interventoría, se emitió concepto y observaciones que fueron enviadas a la Alcaldía Municipal de Sucre mediante comunicación DON-1100-INV-038-2022 del 09 de febrero.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1769-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastrera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolivar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 1.078.384.354,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 1.078.384.354,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.078.384.354,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoría convoco a comité a la Alcaldía Municipal de Sucre y al contratista en la territorial Cauca para definir fechas de entrega de correcciones a los estudios y diseños y de los documentos previos al inicio de las obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1769-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 11 del 17/02/2023 al 23/02/2023 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastrera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 1.078.384.354,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 1.078.384.354,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.078.384.354,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El 23 de febrero la interventoría realizo comité de obra con el contratista y la Alcaldia Municipal para definir fecha de entrega de estudio y diseños y los documentos previos a inicio de obras que tiene pendiente el contratista para revisión y aprobación de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1769-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastrera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolivar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 1.078.384.354,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 1.078.384.354,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.078.384.354			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.078.384.354,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALUOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante el oficio DON-1100-INV-068-2023 de fecha 07 de marzo de 2023 solicitando información técnica para poder dar inicio a las labores correspondientes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1769-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.10 SUCRE 1866 – CAUCA

- Informe Semanal 9 - 03022023 – 09022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 9 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA BPIM 2018130101785

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	VALOR INICIAL: $ 4.710.005.975,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO: $ 4.710.005.975,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
	VALOR AMORTIZADO: $ -		VALOR AMORTIZADO: $ -
	SALDO POR AMORTIZAR $ -		SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.181.474			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.713.131.646			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.710.005.975,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.181.474,25	1,56%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/02/2023
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 21.382.277,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rigido	ML	2125			Prog	2125			2125	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___		N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___		N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___		N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___		N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___		N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___		N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___		N/A	___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación DON-1100-INV-038-2022 radicada el 09 de febrero en la Alcaldía Municipal de Sucre, la interventoría envió el concepto técnico emitido por el especialista en vías, con las observaciones, solicitando sean atendidas a la mayor brevedad para darle celeridad al inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 10 - 10022023 – 16022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 10/02/2023 al 16/02/2023 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA BPIM 2018130101785

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	VALOR INICIAL:	$ 4.710.005.975,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO:	$ 4.710.005.975,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
	VALOR AMORTIZADO:	$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.691.961			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.708.621.159			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.710.005.975,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.691.961,00	1,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Pavimento rigido	ML	2125			Prog	2125			2125	100,0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100,0%
						Ejec					
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	___
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoría convoco al contratista y a la Alcaldía de Sucre para reunión el jueves 23 de febrero en la territorial Cuaca para solicitar a la entidad se agilice la entrega de estudios y diseños y al contratista que entregue los documentos previos al inicio de las obras del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité de seguimiento a inicio de las obras del convenio, la reunión se realizará en la territorial Cauca.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 11 - 17022023 – 23022023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 11 (Numeracion consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023 Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA BPIM 2018130101785

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO		REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.		VALOR INICIAL: $ 4.710.005.975,00	CONTRATO No. 1100 de 2022		VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022		VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: $ 4.710.005.975,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023		VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023		VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.202.448			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.704.110.672			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.710.005.975,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.202.447,75	2,08%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%
EJECUTADA EN LA INVERSION	$ 4.510.486,75	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Pavimento rigido	ML	2125			Prog	2125			2125	100,0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100,0%
						Ejec					
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	n/a
AVALÚOS APROBADOS:	n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS:	n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoría realizo comité en la territorial Cauca para definir fechas de entrega de estudios y diseños de las obras del convenio y entrega de documentos previos al inicio de obras por parte del contratista. Los compromisos acordados quedaron registrados en Acta de Comité.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar que se cumplan los compromisos acordados en comité.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Marzo 10 de 2023

- Informe Semanal 12 - 24022023 - 02032023

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 12 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Numeración consecutiva) | Ultimo Informe Semanal S☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA BPIM 2018130101785

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	VALOR INICIAL: $ 4.710.005.975,00	CONTRATO No. 1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.740.313.120,00
FECHA DE INICIO:	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO: 12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	VALOR ACUMULADO: $ 4.710.005.975,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
	VALOR AMORTIZADO: $ -		VALOR AMORTIZADO: $ -
	SALDO POR AMORTIZAR $ -		SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.710.005.975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.740.313.120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.801.337			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.699.511.783			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.710.005.975,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0,00	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 0,00	0,00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.801.336,52	2,34%
INVERSION PROGRAMADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%
INVERSION EJECUTADA EN LA	$ 4.598.888,77	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, especialista en pavimentos, transporte y viáticos de la directora de Interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,00%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rigido	ML	2125			Prog	2125			2125	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100,0%
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___		N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___		N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___		N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___		N/A		
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___		N/A		
EMISIONES:	SI ___	NO ___		N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___		N/A		

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: n/a
FICHAS PREDIALES APROBADAS: n/a
AVALUOS APROBADOS: n/a
PREDIOS ADQUIRIDOS: n/a

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante el oficio DON-1100-INV-068-2023 de fecha 07 de marzo de 2023 solicitando información técnica para poder dar inicio a las labores correspondientes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar que se cumplan los compromisos acordados en comité.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: María Camila Arenas D.
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, no se cuenta con ningún contrato en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los contratos a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 maquinaria y equipo cto obra para los municipios que se encuentran en ejecución.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: _____ **PROYECTO:** _____

CONTRATO No. _____ **CONTRATISTA:** _____

CONTRATO INTERVENTORÍA No. _____ **INTERVENTORÍA:** _____

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma **N/A**
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, no se cuenta con ningún contrato en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los contratos a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 personal control aportes leg y seg social obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTRATO DE OBRA No: _____ **CONTRATISTA:** _____

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: _____ **PROYECTO:** _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: _____ **INTERVENTOR:** _____

NOMBRE ARL: _____ **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** _____

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma N/A
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, no se cuenta con ningún contrato en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los contratos e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 inf fin y presupuestal obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

MES INFORME MENSUAL: **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma **N/A**
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún contrato en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los contratos a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 estado general del tiempo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTRATO DE OBRA No: _____ **CONTRATISTA:** _____

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: _____ **PROYECTO:** _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: _____ **INTERVENTOR:** _____

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma **N/A**
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún contrato en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los contratos a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 de INVÍAS con los ensayos realizados y los resultados obtenidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTRATO DE OBRA No.: _____ **CONTRATISTA:** _____

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: _____ **PROYECTO:** _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____ **INTERVENTOR:** _____

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma **N/A**
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se validaron las garantías de los contractos de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 1 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 3.5
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1,799,782,602.00
VALOR ACUMULADO: $ 1,799,782,602.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 179,978,260.20	21	12	2022	30/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	49.4%	$ 889,891,301.40	21	12	2022	30/04/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 359,946,520.40	21	12	2022	31	12	2025
Estabilidad de la obra	30.0%	$ 539,934,780.60	21	12	2022	31	12	2027
Calidad	0.0%	$ 444,816.30	21	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16.7%	$ 300,000,000.00	21	12	2022	30/04/2023		
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D.
Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 93-2023 **CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 4
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 795,011,198.00
VALOR ACUMULADO: $ 795,011,198.00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 79,501,119.80	14	3	2023	13/07/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 159,002,239.60	14	3	2023	13	7	2026
Calidad de la revisión, ajustes y diseños	30.0%	$ 238,503,359.40	14	3	2023	13	7	2028
Estabilidad y calidad de las obras	30.0%	$ 238,503,359.40	14	3	2023	13	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	29.2%	$ 232,000,000.00	14	3	2023	13/07/2023		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3 ARGELIA – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 1 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. ARG-OBRA-009-2022 **CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 3.5
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 958,081,628.00
VALOR ACUMULADO: $ 958,081,628.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 95,808,162.80	7	10	2022	30/07/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 287,424,488.40	7	10	2022	30/07/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.0%	$ 47,904,081.40	7	10	2022	28	1	2026
Estabilidad y calidad de la obra	20.0%	$ 191,616,325.60				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101003017
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D.

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -

FECHA DE INICIO: _____

PLAZO INICIAL: 5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3,478,131,956.00

VALOR ACUMULADO: $ 3,478,131,956.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100.0%	$ 3,478,131,955.60	13	12	2022	13/09/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,043,439,586.00	13	12	2022	13/09/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 695,626,391.00	13	12	2022	13	5	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 1,043,439,586.00				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40-44-101058457

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	90.0%	$ 3,130,318,760.40	13	12	2022	13	12	2027
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No. -

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.7.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 1 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP 004-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 5
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1,063,184,929.00
VALOR ACUMULADO: $ 1,063,184,929.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 106,318,492.90	13/12/2022	13/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 318,955,478.70	13/12/2022	13/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 212,636,985.80	13/12/2022	13/5/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 318,955,478.70		5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.8%	$ 232,000,000.00	13/12/2022	13/9/2023
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.6 INZA – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP No 01 DE 2.022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 3

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 608,231,289.00

VALOR ACUMULADO: $ 608,231,289.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 60,823,129.00	27	9	2022	27/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 182,469,387.00	27	9	2022	27/04/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 121,646,258.00	27	9	2022	27	12	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 182,469,387.00				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	32.9%	$ 200,000,000.00	27	9	2022	27	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.7 MERCADERES – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 1 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. L.P. 003 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 3
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 224,861,500.00	30/12/2022	30/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100.0%	$ 2,248,615,000.00	30/12/2022	30/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 449,723,000.00	30/12/2022	30/9/2025
Calidad de la revisión, ajustes y diseños	30.0%	$ 674,584,500.00	30/12/2023	30/9/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 674,584,500.00	30/12/2022	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 300,000,000.00	27/9/2022	30/9/2023
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 30/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 608,231,289.00

VALOR ACUMULADO: $ 608,231,289.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20.0%	$ 121,646,257.80	7 / 9 / 2022	31/12/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 121,646,257.80	7 / 9 / 2022	31 / 12 / 2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 182,469,386.70	7 / 9 / 2022	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	32.9%	$ 200,000,000.00	7 / 9 / 2022	31/12/2022
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.9 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 1 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,078,384,354.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,078,384,354.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 107,838,435.40	1	2	2023	1/10/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 323,515,306.20	1	2	2023	1/10/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 161,757,653.10	1	2	2023	1	6	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 215,676,870.80	1	2	2023	1	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100018793

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/-2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.5%	$ 200,000,000.00	27	9	2022	27	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.10 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,078,384,354.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 107,838,435.40	1	2	2023	1/10/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 323,515,306.20	1	2	2023	1/10/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 161,757,653.10	1	2	2023	1	6	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 215,676,870.80	1	2	2023	1	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100018793

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9.3%	$ 232,000,000.00	1	2	2023	1	5	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100004020 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma María Camila Arenas D

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha suscrito acta de inicio de ninguno de los contratos asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan comités de obra:

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Durante este periodo, no se realizaron reuniones.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ING. JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ Representante Legal
No. del Contrato de Interventoría	1100 DE 2022
Objeto del Contrato de Interventoría	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9”
Valor del Contrato de Interventoría	$1.740.313.120
Fecha suscripción Contrato	12 de diciembre de 2021
Fecha Orden de Inicio	12 de diciembre de 2022
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de octubre De 2023

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los siguientes documentos:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Carpeta de la etapa de Pre-Contractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc).
- Programa de obra e inversión
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades de control y seguimiento:}

- Generar comunicaciones a los contratistas dando respuesta a inquietudes y a su vez solicitando la información referente al contrato.
- Revisar, verificar y corroborar la documentación entregada por el contratista, velando por la calidad de la información suministrada.
- Emitir las observaciones y recomendaciones a los documentos exigidos por los contratos y pliegos de condiciones, siguiendo las instrucciones que se describen en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVÍAS en su versión del 2022.
- Dar aprobación a la información que sea suministrada sin observaciones o subsanando las que se hayan generado por Interventoría.


5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, el especialista de pavimentos realiza un informe de con base en la revisión realizada en el transcurso del mes.

1

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y MINAS

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100 DE 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

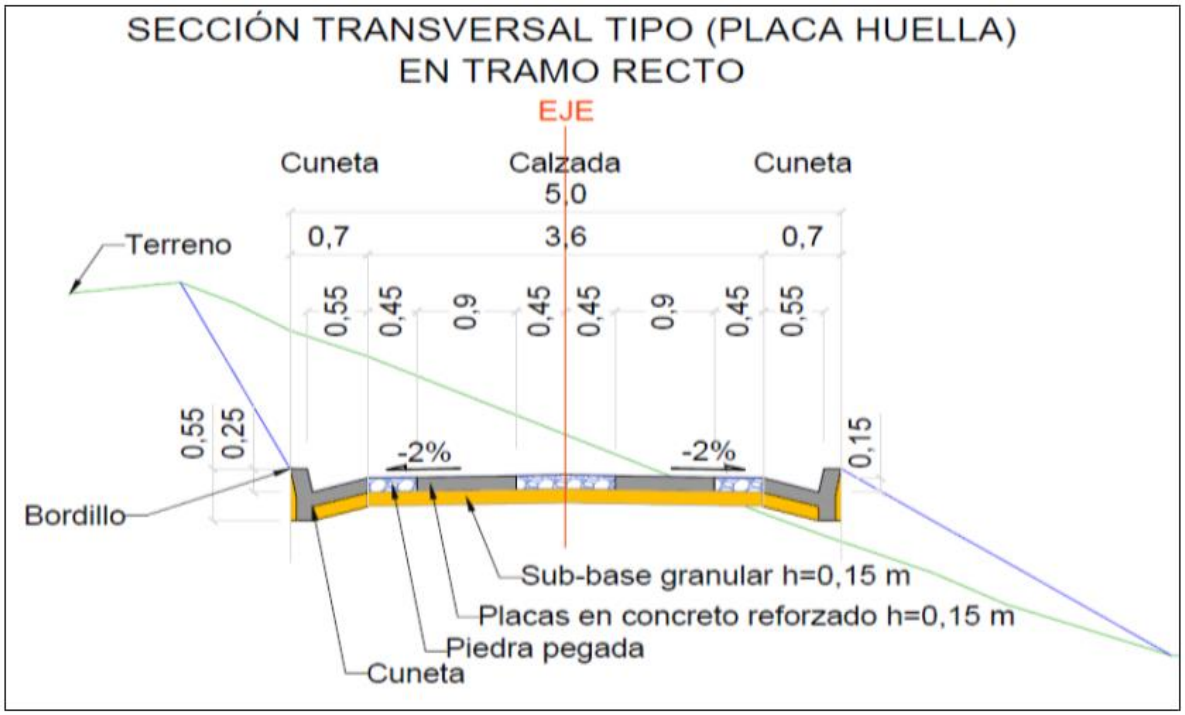

PERIODO:
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONSULTORES DENOVAN S.A.S.
INTERVENTORÍA DE OBRA

2

INFORME DE VÍA/PAVIMENTOS
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 28 DE FEBRERO DE 2023

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO	Profesional Consultor en Infraestructura Vial y Aeroportuaria	

DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO Profesional Consultor en Infraestructura Vial y Aeroportuaria ELABORÓ	**ING. MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ** DIRECTORA DE INTERVENTORÍA APROBÓ

1 INTRODUCCIÓN

El INVÍAS suscribió convenios interadministrativos con municipios en el Departamento de Cauca cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", producto de ello los municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA, MERCADERES, SUCRE, BOLÍVAR, ALMAGUER, INZÁ, SANTANDER DE QUILICHAO, PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", para lo cual se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

COLOMBIA RURAL, es un programa del Gobierno Nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao, Puerto tejada en el Departamento de Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A partir del 12 de diciembre de 2022 se da orden de inicio del contrato de Interventoría No. **1100 de 2022**, que tiene por objeto el **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YAMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍASTERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOSDEL DEPARTAMENTO DE CAUCADEL PROGRAMA "COLOMBIARURAL" LOTE 9".,** en proyectos viabilizados, priorizados y aprobados por medio de la Ley 1955 de 2019 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad.

Realizando labores de control de ejecución de las obras, de los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el anexo técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El objetivo particular de este informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 28 de febrero de 2023, es reportar al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) las actividades desarrolladas durante el periodo referentes a la especialidad de Vías y/o pavimentos de los contratos de obra, lo anterior considerando que los contratistas deben realizar una revisión y ajuste a los diseños base de la cartilla Colombia Rural.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

4

En general el contrato contempla el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita, priorizando corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

De esta manera, con la suscripción de los convenios interadministrativos con los municipios de Bolívar, La Sierra, Patía, Rosas, Santa Rosa y Timbio en el Departamento de Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

El objeto, presupuesto oficial estimado y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla:

OBJETO DEL PROYECTO	VALOR (PESOS INCLUIDO IVA)	LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9".	$ 1.740.313.120	ARGELIA MERCADERES SUCRE BOLÍVAR ALMAGUER INZÁ SANTANDER DE QUILICHAO PUERTO TEJADA

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y META FISICA

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de once (11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, Lote 9, como parte del programa Colombia Rural:

METAS FISICAS CONTRACTUALES

CONVENIO	MUNICIPIO	CORREDOR	LONG (KM)	PUNTO DE INICIO	PUNTO FINAL	OBSERVACIONES
1894-2021	ARGELIA	LA PLAYA-EL ENCANTO	1.80	CRUCE CON CARRETERA 25CC03	VEREDA EL ENCANTO	construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico
1983-2021	INZÁ	SAN ANDRES DE PISIMBALA-ALTO PISIMBALA-TUMBICHUCUE	14	VÍA 26CC04 PR 4+0000 = PR 0+0000 SAN	VÍA 26CC04 PR 18+0000 TUMBICHUCUE	construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long = 240 m - conformación de calzada existente

5

				ANDRÉS DE PISIMBALA - ALTO PISIMBALA TUMBICHUCUE PR 18+0000.		y afirmado, recuperación de alcantarillas.
1892-2021	ALMAGUER	VIA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA		KM 0 + 000	KM 0 + 405	construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 415 ml de placa huella de ancho tipo 3 m
1749-2021	ALMAGUER	CAQUIONA-HATO-HUMUS RESGUARDO	4.90	KM 0 + 000	KM 0 + 818	construcción de 10 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 3m Construcción 15m de muro en concreto reforzado tipo, de 3m de altura
1894-2021	MERCADERES	LA PLAYA -LA DESPENSA				construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 3m
1867-2021	BOLIVAR	VIA AGUA GORDAS - LOS MILAGROS				demolición de 9 alcantarillas y 1 batea en concreto reforzado, construcción de 1050 metros de placa huella, Construcción de 30 alcantarillas de 36" en concreto reforzado, construcción de 3 Box Culvert en concreto reforzado tipo C, Construcción de 393 metros de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de longitudes de 6 m y 20m en concreto reforzado, construcción de 1 Muro de contención de longitud de 4m y altura 4 metros en gaviones, Instalación de 30 señales de tránsito verticales.
1750-2021	BOLIVAR	BOLIVAR-CHALGUAYACO	13.5	Vda. Chalguayaco	Vda. Cucho	Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36", Construcción de 456 ml de placa huella, demolición de una alcantarilla.
1866-2021	SUCRE	El Paraiso - La Ceja – La cabecera Municipal		Puente sobre el Río Mazamorras vía que conduce Sucre-La Ceja	Caseta Central vereda la Ceja	construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 2125 ml de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 3.5 metros de ancho promedio
1769-2021	SUCRE	25CC08 54-1 LA BALASTRERA		Inicia inmediatamente se pasa la quebrada Peña Blanca	Termina 830 metros arriba de la quebrada Peña Blanca	construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36" Construcción de 706 ml de placa huella
1768-2021	SANTANER DE QUILICHAO	PANAMERICANA – CRUCERO LA SALINA - ALTO DE SAN JOSÉ DE MANDIVA Y EMANUEL	7.10	PR 0+0000 Ruta 25KA126 vía Panamericana – Crucero de Salinas – Alto el Paraiso	PR 4+0800 Ruta 25KA126-1 vía Crucero de Salina – Alto de San José Mandiva y Emanuel	construcción y recuperación alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long =496 m - conformación de calzada existente y afirmado - construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

6

3.1.1 REVISIÓN DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTO DEL CONVENIO 1750-2021 MUNICIPIO DE BOLÍVAR.

El día 3 de febrero se realiza revisión del diseño de vías y pavimento entregado por el contratista de obra asociado al municipio de Bolívar – convenio 1750-2021, obteniendo los siguientes comentarios:

A. DESARROLLO GENERAL

1. Se presenta un muy buen trabajo de levantamiento topográfico realizado por la profesional Angélica Otálvaro Cruz (AOC Consultoría, Octubre/2022) sobre una longitud aproximada de (1677.34 m) acorde a los lineamientos técnicos solicitados para tal fin, así como a la presentación de estudios fase III para el abscisado contractual. El documento lo constituye una memoria técnica y un cierto número de planos con levantamiento de eje y perfil, deltas, coordenadas como secciones transversales. Igual, se materializa toda esta información en archivos editables (.doc) y (.dwg). También se anexa información correspondiente a carteras de campo, poligonal topográfica, curvas de nivel, nube de puntos, materialización de mojones, informe de procesamiento en “líneas base”, sistema de amarre coordenadas MAGNA-SIRGAS, lista de puntos, informe de ajuste de red, datos crudos, registro fotográfico y configuración del diseño geométrico vial en planta para el sistema placa-huella de la estructura de pavimento en archivos editables (.xls), (.pdf), (kmz), (.jpeg) y (.dwg). No se tiene objeción a este ítem de consultoría.

2. Se exhibe igualmente un competente diseño geométrico vial (Horizontal y vertical), así como de señalización horizontal realizado por parte del mismo consultor (AOC Consultoría, Octubre/2022). Lo anterior, como requisito establecido en las guías y manuales de diseño mencionados en los numerales 10, 11 y 12 del Aparte A, además de los lineamientos técnicos solicitados para tal fin y la presentación de estudios fase III. El sistema placa-huella “encaja” en dicha evaluación de consultoría como en las correspondiente al estudio hidrológico, diseño hidráulico, señalización e ingeniería de pavimentos bajo los requisitos que en sección transversal muestran las Figuras 1 a 2. El documento lo constituye un informe consolidado, planos planta-perfil, carteras de localización, grilla de coordenadas, movimiento de tierras, diseño de curvas horizontalesverticales, secciones transversales, diagrama de peraltes, bombeos, pendientes

longitudinales, circunspección del vehículo, velocidad de diseño y modulación de la estructura de pavimento en archivos bajo extensiones (.dwg), (.doc) y (.pdf). No se tendría objeción al ítem de consultoría, a excepción del establecimiento en la velocidad de diseño del K1+120 al K1+576 que en el plano constructivo cita un valor de (20 Km/h) y en las conclusiones del informe consolidado (30 Km/h).

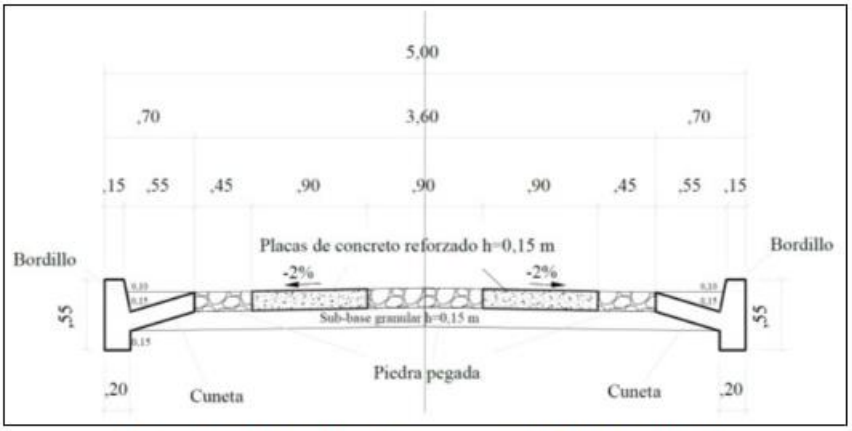


Figura 1. Sección Transversal Placa-huella
Fuente: Guía de diseño de pavimentos con placa-huella INVÍAS, 2015

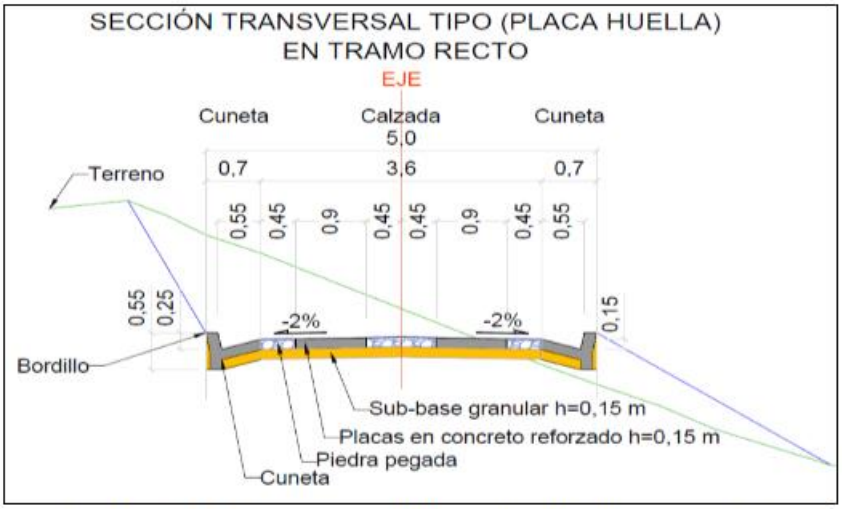


Figura 2. Sección Transversal Placa-huella Tramo Contractual
Fuente: Municipio de Bolívar (AOC Consultoría), 2022

3. Con respecto al estudio geotécnico de exploración de suelos realizado por la organización GEOESTUDIOS - LAB (Ing. José Alberto Muñoz Gallego,

Octubre/2022) para el chequeo de la estructura de pavimento (Sistema placa-huella) en el sector contractual, se tienen los siguientes comentarios en particular:

8

3.1. Para el segmento en estudio (K1+120 a K1+576; L~456 m) solo se ejecutó (1) apique, debiéndose aplicar como mínimo un total de (2) sondeos a nivel de longitud y estadística promedio auscultado. Para el resto del corredor vial sobre la longitud neta descontada, debieron haberse practicado (5) calicatas, y nó el número exiguo detectado en (3).

3.2. Se está de acuerdo con la selección de una única unidad o sección geotécnica de diseño.

3.3. Existe error de nomenclatura respecto a los apiques ejecutados versus los perfiles estratigráficos exhibidos. Los (3) allí señalados se identifican con la nomenclatura 1.

3.4. Se desconocen los valores de capacidad portante resistiva CBR y de expansión a nivel de pisos originales de fundación (Altura exploratoria a 1.50 m). Independiente de lo mostrado en los perfiles estratigráficos (Suelos tipo GC) y la caracterización del afirmado granular remanente, se descartaría de raíz “fenómeno de expansividad” alguno. Lo anterior, sobre la base de los direccionamientos establecidos por la literatura especializada en el tema y normativa técnica citada – Ver Figuras 3 a 6 respectivamente.

GRADO DE EXPANSIÓN	LÍMITE LÍQUIDO	
	CHEN	NORMA IS 1498
Bajo	< 30	20 – 35
Medio	30 – 40	35 – 50
Alto	40 – 60	50 – 70
Muy alto	> 60	70 - 90

GRADO DE EXPANSIÓN	ÍNDICE DE PLASTICIDAD		
	HOLTZ Y GIBBS	CHEN	NORMA IS 1498
Bajo	< 20	0 – 15	< 12
Medio	12 – 34	10 – 35	12 – 23
Alto	23 – 45	20 – 55	23 – 32
Muy alto	> 32	> 35	> 32

Grado de expansión	LL%	IP %	$\tau\ nat(Ton/pie^2)$
Elevado	>60	<35	>4
Marginal	50-60	25-35	1.5-4
Bajo	<50	<25	<1.5

Potencial de Expansión	Indice de plasticidad, IP (%)
Muy alto	Mayor que 32
Alto	23 a 45
Medio	12 a 34
Bajo	Menor que 20

Figuras 3 a 6. Predicción Expansividad (LL e IP)
Fuente: Normatividad de ensayo INVE-132 / Literatura numerales 1, 5, 13 y 14 – Aparte A

9

3.5. Se descartan líneas freáticas, pero no deberá omitirse la construcción de sistemas de subdrenaje (Filtros) para la protección de la estructura de pavimento (Ver Figuras 7 a 9).

3.6. La selección del CBR de diseño –formulada sobre el testeo a nivel de granular remanente-, concuerda con requisito INA en función del tránsito de diseño (NT-1, Art. 100 INVÍAS/2022).

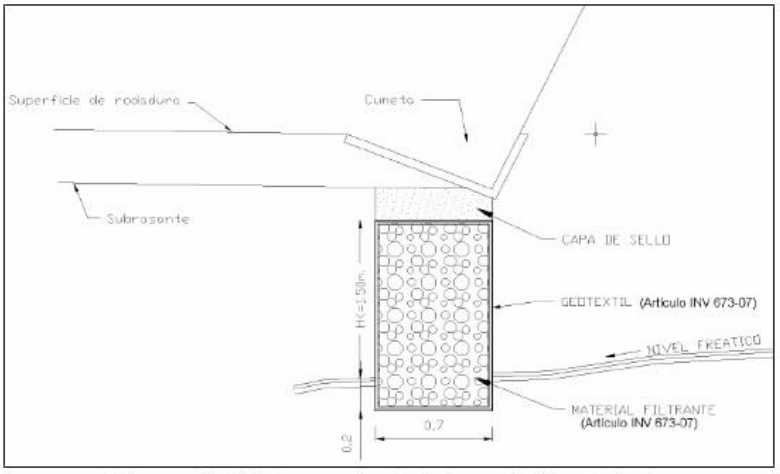


Figura 7. Sistema de Subdrenaje Postulado
Fuente: Manual de diseño de pavimentos flexibles para vías con bajos volúmenes de tránsito INVÍAS/2007

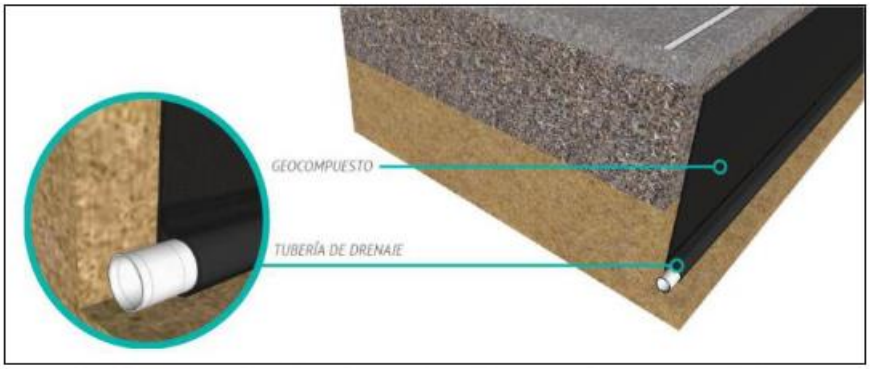


Figura 8. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico geodrén planar)
Fuente: www.pavco.com

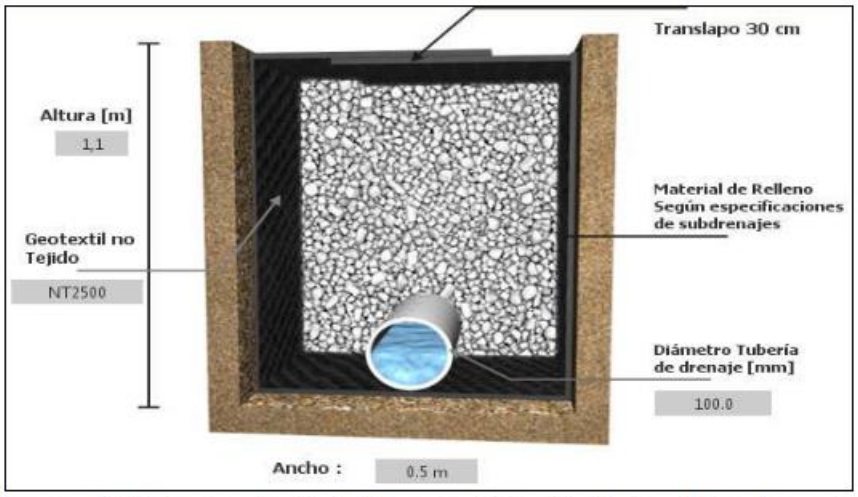


Figura 9. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico filtro francés)
Fuente: www.pavco.com

Ante lo justificado en el numeral 3.4, debería haberse considerado o promovido la obtención de un (CBReqv) equivalente de diseño con ayuda, por ejemplo, de la teoría de IVANOV tal y como lo recomienda la literatura especializada en el tema. La tasa seleccionada de diseño para la sección homogénea o unidad geotécnica de diseño fue del (13.5%); valor que a nuestra consideración no es la verdadera, así provea un valor mayor o igual que ella.

3.7. Se encuentra de acuerdo con las postulaciones correspondientes a las medidas constructivas objeto a sardineles, cunetas y obras de drenaje exteriores complementarias (Numeral 6, capítulo 8 – Conclusiones y recomendaciones generales). Igual sucede con respecto al aprovechamiento del granular remanente (Afirmado); esto siempre y cuando dicho insumo cumpla con todos los requisitos formulados en el Art. 311 INVÍAS/2022, más nó con el enfoque proveniente del Art. 320 (Subbase granular) que es diferente considerado como “capa independiente” y obligatoria en la constitución del sistema placa-huella.

3.8. El consultor adopta la versión 2013 de las especificaciones generales de construcción de carreteras para la presentación oficial en su estudio. Recordar que el contrato de construcción se firmó después del acto resolutorio 1524 del 06-V-2022 objeto a la actualización de dicha normativa. Por ende, todos los procesos constructivos y de homologación técnica a materiales e insumos se regirá por esta versión, y nó la obsoleta.

11

3.9. Se encuentra de acuerdo con la extracción de insumos nocivos (Basuras, escombros, materia orgánica entre otros) para reemplazarlos por “recebos” o material de “terraplén” – Arts. 220 y 610 INVÍAS/2022. Finalmente se cita o se hace mención sobre el numeral 21 del capítulo 8, la participación de una base granular (Art. 330 INVÍAS/2022); condición que nada tiene que ver con el alcance contractual del sistema constructivo en placa-huella.

Se tendría por ahora, objeción a este ítem de consultoría.

4. Para el estudio de ingeniería de tránsito realizado nuevamente por la organización (AOC Consultoría, Octubre/2022) en el sector contractual, se tienen los siguientes comentarios:

4.1. Se muestra un informe consolidado bajo extensión (.pdf) incluyendo toma de información primaria, estimación de volúmenes, cálculo del número de ejes equivalentes (NEE) al período de diseño y plan de manejo de tráfico (PMT) con sus respectivos planos de implementación bajo archivos (.xls) y (.dwg). Su presentación y desarrollo metodológico se ajusta a los requerimientos técnicos y de exposición en estudios a nivel de fase III.

4.2. No se encuentra de acuerdo con el mínimo número de días correspondientes a los aforos practicados –independiente de las proyecciones así sustentadas-. Es más, en la información recibida se adjuntan archivos editables que nada tienen que ver con el contrato referencia.

4.3. ¿No se entiende el por qué se muestra en la Tabla 8 (Pág. 40/54) numeral 5.3 (Volúmenes de tránsito proyectados a 10 y 20 años) composición vehicular con tipología C3-S3?

4.4. Se comparte “parcialmente” la adopción de los factores de equivalencia de carga o camión (FEC) reseñados en la Tabla 9 de la página (41/54).

4.5. Se participa de la adopción en la tasa de crecimiento reseñada por (r=3.5%).

4.6. Se evidencia “admisión” con respecto a la resolución citada en el numeral 8 del Aparte A. Es de anotar que en la página (51/54), 5 to párraf - capítulo

10 “Conclusiones” se transcribe el nombre e identificación inexacta del acto resolutorio en mención.

12

4.7. Se encuentra de acuerdo con la adopción estimada al nivel de tránsito atraído (Tat), generado (TG) y desarrollado (TD) de manera respectiva.

4.8. Igual concordancia con el factor de distribución carril (Fca), direccional (Fd) y nivel de confiabilidad (R=80%).

4.9. El valor del (NEE) a (20) años de duración para el modelamiento de la estructura de pavimento (Placa-huella) en el período de diseño (2022-2042) se estimó en (51.383 ejes equivalentes de 8.2 Ton).

Se tendría por ahora, objeción a este ítem de consultoría.

5. Referente al estudio hidráulico (EH) y diseño hidrológico (DH) otra vez por la organización (AOC Consultoría, Octubre/2022) se tienen los siguientes comentarios:

5.1. Compendio muy completo en archivos originales (.doc), (.pdf) y (.dwg) correspondiente a memoria técnica y planos de construcción (Incluyendo obras de drenaje transversal alcantarillas K1+123/214. 50/323/421/468/573 y cunetas entre K0+835 a K1+573 y subdrenaje interior). Se encuentran presentados de acuerdo a requerimientos técnicos y presentación de estudios a nivel de fase III.

5.2. El consultor adopta la versión 2013 de las especificaciones generales de construcción de carreteras para la presentación oficial en su estudio. Recordar que el contrato de construcción se firmó después del acto resolutorio 1524 del 06-V-2022 objeto a la actualización de dicha normativa. Por ende, todos los procesos constructivos y de homologación técnica a materiales e insumos se regirá por esta versión, y nó la obsoleta.

No se tiene objeción a este ítem de consultoría.

6. Para finalizar y dentro del estudio de consultoría en pavimentos para el sistema placa-huella, del mismo modo realizado por la organización consultora (AOC Consultoría, Octubre/2022), se tienen los siguientes comentarios:

13

6.1. Antes de iniciar, se muestra en las referencias bibliográficas de la memoria técnica, nomenclatura obsoleta al manual referido de manera acertada en el numeral 10 del Aparte A.

6.2. Compendio muy completo en archivos originales (.doc), (.pdf) y (.dwg) correspondiente a memoria técnica y planos de construcción (Incluyendo modulaciones típicas según geometría vial diseñada en planta-perfil). Se encuentran presentados de acuerdo a requerimientos técnicos presentación de estudios a nivel de fase III.

6.3. El consultor –"gran maestro" y profesor del presente asesor, Ing. Carlos Benavides- adopta la versión 2013 de las especificaciones generales de construcción de carreteras para la presentación oficial en su estudio. Recordar que el contrato de construcción se firmó después del acto resolutorio 1524 del 06-V-2022 objeto a la actualización de dicha normativa. Por ende, todos los procesos constructivos y de homologación técnica a materiales e insumos se regirá por esta versión, y nó por la obsoleta.

6.4. Con respecto a las fuentes de materiales o canteras propuestas en el estudio, no se adjuntaron mínimos ensayos de caracterización. Por lo anterior, promulgar con cuál de ellos se podría trabajar quedará a expensas de la presentación de los ensayos a esta interventoría de obra para su respectiva homologación antes de cualquier inicio de proceso constructivo.

6.5. Con respecto a los apartes abordados en los capítulos (8.1) y (9.3) de la memoria técnica reseñada, será necesario atender y generar justificación técnica a las observaciones que se citaron en el numeral 3 del presente Aparte.

No se tiene objeción a este ítem de consultoría.

3.1.2 REVISIÓN DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTO DEL CONVENIO 1984-2021 MUNICIPIO DE ARGELIA.

1. Se allegó oficialmente desde la jornada de ayer vía mail, un documento bajo extensión (.pdf) realizado por el profesional HÉCTOR NARVÁEZ MONTEALEGRE con fecha Enero del año en curso. Lo anterior, bajo un compendio de (29) folios con los siguientes anexos:

1.1. Registros de campo (Contiene perfiles estratigráficos).

14

1.2. Ensayos de laboratorio (Contiene pruebas de testificación en granulometría, límite líquido, límite plástico y CBR con memorial de responsabilidad).

1.3. Localización de sondeos (Contiene ubicación general, regional y particular del proyecto).

1.4. Registro fotográfico (Contiene constancia en fotografías a los (3) apiques realizados).

2. Que, con respecto al mismo, se expresa de manera particular lo siguiente:

2.1. El estudio es orientado a la exploración geotécnica de las subrasantes de fundación y materiales granulares remanentes que componen un segmento vial sin abscisado referente para un tramo de “placa-huella” en el municipio de Argelia (Cauca).

2.2. Que el documento adolece de buenas prácticas a nivel de redacción y control ortográfico.

2.3. No se entiende el alcance que confiere dentro del estudio, la participación de la firma INGEOANÁLISIS, más aún, firmando de paso un “memorial de responsabilidad”. A lo anterior, esta asesoría técnica solicita justificación al respecto con el objetivo de conocer a ciencia cierta quien asume la “responsabilidad final” del estudio.

2.4. Los ensayos granulométricos a nivel de suelos de fundación explorados a (1.0 m) de profundidad, omiten la participación validatoria de los tamices Nos. 10 y 40 respectivamente.

2.5. Existen errores de clasificación y de no “correlacionabilidad” bajo el uso sistemático de las cartas SUSC y AASHTO. Caso especial, en el apique No. 2 donde se identifica una grava arcillosa (GC) “advertida ilógicamente” con un suelo tipo A-7-6 (Ver Figura 1). De igual modo, en los apiques 2 y 3 el material no puede ser una grava limosa (GM) toda vez que sus índices de plasticidad son (>7%). Para finalizar, en el apique No. 1 se obtiene desfasado la determinación de su límite líquido a (25) golpes por (50.9%), siendo el real (56.9%).

2.6. En la Figura 2 se muestra la participación “mayoritaria” de fracciones finas con resultados de capacidad portante en desviación (Caso apique No. 1). Sobre la selección de la “unidad homogénea de diseño por CBR” para la hipótesis estructural del pavimento (Sistema placahuella), deberá estimarse el cálculo correspondiente al percentil (75) – Criterio INA.

15

También se evidencian humedades naturales de intermedias con límites líquidos cuyo promedio supera el (40%) –indicador indiscutible para la inclusión de sistemas de subdrenaje protectores al sistema de pavimento (Ver Figuras 3 a 5)- e IP (>15%) – Ver Figura 1.

RESULTADOS CLASIFICACION DE SUELOS (EXPLORACION GEOTECNICA) - PROYECTO "PLACA-HUELLA", MUNICIPIO DE ARGELIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONSULTORES DENOVAN S.A.S. (ELABORÓ: DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO, M. Sc. (10-FEBRERO-2023)) - FUENTE: ESTUDIO DE SUELOS HÉCTOR NARVÁEZ MONTEALEGRE

Apique No.	Absc.	Marg.	Prof. (m)	W_{nat} (%)	Gradación 3"	1-1/2"	1"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 200	(%) Participación Gravas	Arenas	Finos	Límites Atterberg LL	LP	IP	Próctor Mod. γ máx	Wopt(%)	Diferencia (%) Wopt-Wnat	CBR (%) (%)	(%)Expansión	95%*V_{min}	Clasificación SUSC	AASHTO	Calificación S.R
AP-1			1.00	23.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	?	?	77.1	0.0	22.9	77.1	58.9	30.5	28.4	?	?	?	4.1	No reporta	3.9	MH	A-7-5	REGULAR A POBRE
AP-2	Sin Identificar		1.00	19.5	100.0	100.0	100.0	82.7	70.1	59.0	?	?	5.1	41.0	53.9	5.1	44.0	28.2	15.8	?	?	?	9.2	No reporta	8.7	GC	A-7-6	INCONSECUENCIA
AP-3			1.00	20.1	100.0	100.0	100.0	73.6	60.4	51.3	?	?	18.8	48.7	32.5	18.8	31.0	22.6	8.4	?	?	?	8.4	No reporta	8.0	GC	A-4	REGULAR A POBRE
Promedio General				*21.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*85.4*	*76.8*	*70.1*	*?*	*?*	*33.7*	*29.9*	*36.4*	*33.7*	*44.0*	*27.1*	*16.9*	*?*	*?*	VALOR NEGATIVO (SECAR) VALOR POSITIVO (MOJAR)	*7.2*	*4.1*	*6.9*	*Suelos finos constituidos por fracción arenosa (36.4%) de plasticidad media (17%) con humedades naturales superiores en capacidades resistivas de bajas a intermedias. El color amarillo identifica no reciprocidad en validación por uso de cartas SUSC-AASHTO*		
Artículo 220 INVÍAS/2022											80%		35%	Material predominante: ARENAS			<=40%	-	<=9%	-	-	-	Prom	Percentil$_{75}$				$CBR_{Diseño}$>4.1%

Figura 1. Resultados de Clasificación de Suelos (Exploración Geotécnica) Proyecto “Argelia”
Fuente: Héctor Narváez Montealegre – Elaboración Propia

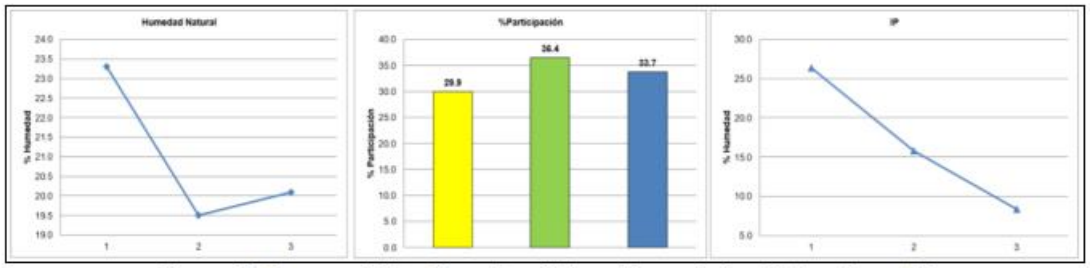


Figura 2. Composición Granulométrica, Humedades Naturales e IP
Fuente: Elaboración Propia

2.7. Al desconocerse la longitud de estudio sobre el segmento vial auscultado, se posee incertidumbre en la validación del mínimo número de apiques solicitados para el estudio de consultoría en ingeniería de pavimentos. Lo anterior, con base en los requerimientos normativos y de literatura especializada que se referencian en el Aparte A.

2.8. Se presentan los registros de perforación y/o perfiles estratigráficos obtenidos en la exploración geotécnica. Se descarta la presencia de niveles freáticos, y a su vez, se identifica la constitución de un espesor en afirmado granular que dejó de caracterizarse. Lo anterior, con el fin de determinar su

16

aprovechamiento definitivo en la constitución de la estructura de pavimento del sistema placa-huella. De no validarse, el proyecto puede verse abocado a sobrecostos o ahorros financieros en su inversión final. Se recomienda realizar dicha tarea con el objetivo de finiquitar lo anteriormente enunciado. Igualmente, toda presencia de escombros, residuos de construcción, basuras, materia orgánica o materiales nocivos detectados sobre los suelos de fundación y/o sus capas suprayacentes, deberá ser retirado en su totalidad para la fundación del sistema placa-huella. Sus alternativas de reemplazo obedecerán a los criterios que defina el profesional geotecnista del proyecto.

Como alternativas se recomiendan las opciones mostradas en las Fotografías 1 a 10.



Fotografías 1 a 6. Estabilización Mecánica con Rajón y Sello Granular (Total= 0.5 m)
Fuente: Propia




Fotografías 7 a 8. Estabilización Mecánica con Bolo de Río y Sello Granular (Total = 0.5 m)
Fuente: Propia



Fotografía 9. Estabilización Mecánica con Terraplén y Geotextil Separador (Total = 1 m)
Fuente: Propia



Fotografía 10. Estabilización Mecánica con Demolición Losas MR y Granular (Total = 0.5 m)
Fuente: Propia

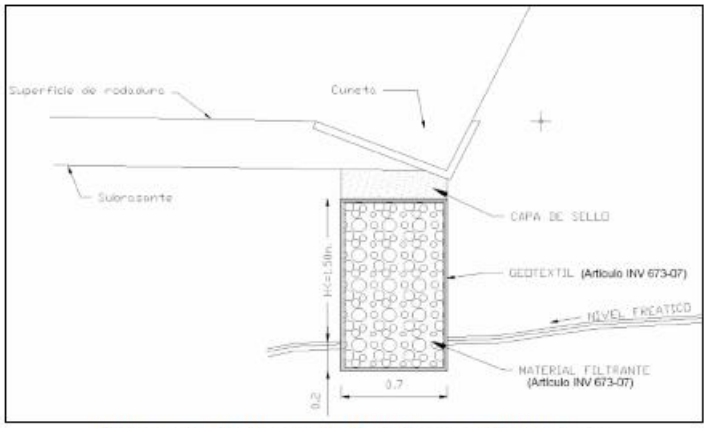


Figura 3. Sistema de Subdrenaje Postulado
Fuente: Manual de diseño de pavimentos flexibles para vías con bajos volúmenes de tránsito INVÍAS/2007

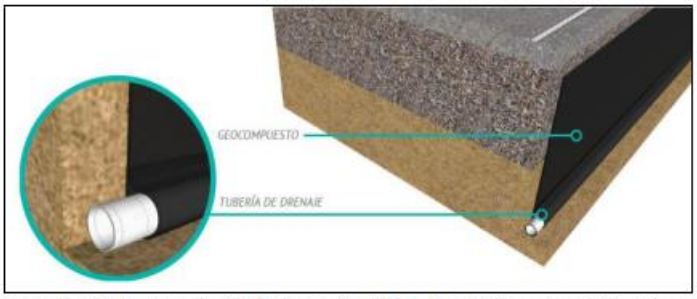


Figura 4. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico geodrén planar)
Fuente: www.pavco.com

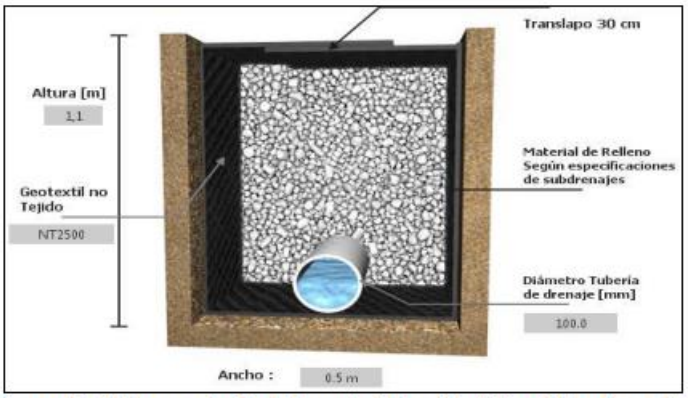


Figura 5. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico filtro francés)
Fuente: www.pavco.com

Ante ello, no se encuentra de acuerdo con la recomendación “a priori” de retirar toda la capa correspondiente del afirmado remanente en un espesor de (e~0.4 m) tal y como se solicita en el capítulo 8 (Recomendaciones) de la página 5 hasta tanto no se demuestre lo contrario.

19

2.9. Tampoco se encuentra de acuerdo con la recomendación de “sobre-excavar” en (0.25 m) donde se sitúa el posicionamiento del sistema placa-huella. Igual sucede con la promoción de los últimos (0.15 m) para recompactar la corona de los suelos originales replanteados, cuando la normatividad citada en el numeral 3 del Aparte A, cita otro tipo de escenario.

3.1.3 REVISIÓN DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTO DEL CONVENIO 1867-2021 MUNICIPIO DE BOLÍVAR.

1. Se remite en correo electrónico del pasado 17 de los corrientes, la constitución de los siguientes archivos digitales incluyendo el oficio que se cita en el numeral 6 del Aparte A (Ver Figura 1):

- 0.5 REGISTRO FOTOGRAFICO-20230208T164700Z-001.zip
- PLANO-20230208T164647Z-001.zip
- 0.2 CARTERA-20230208T164653Z-001.zip
- 0.4 MOSAICO-20230208T164656Z-001.zip
- Diseño geométrico.rar


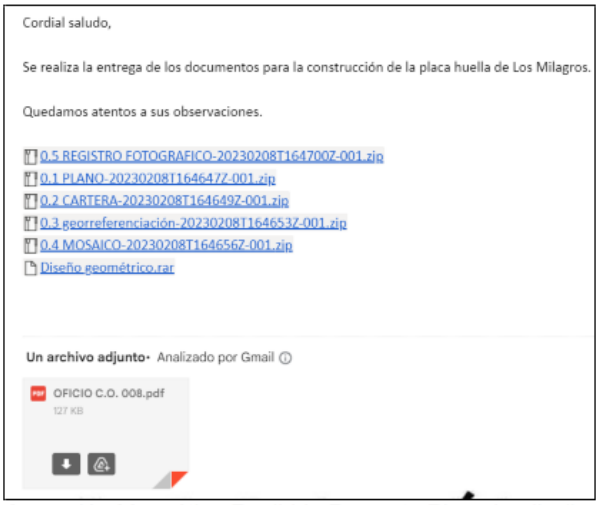


Figura 1. Información Magnética Recibida Proyecto Placa-huella (Los Milagros)
Fuente: CONSULTORES DENOVAN S.A.S. (CONSORCIO ONIX CCM)

20

2. Dentro de esta documentación magnética, se hará énfasis en lo referido especialmente al diseño geométrico vial que se compila en (10) archivos bajo extensiones (.xls) y (.pdf) - Ver Figura 2:

- Secciones transversales (8 de 8)
- Plano planta-perfil (1 de 1)
- Carteras de diseño

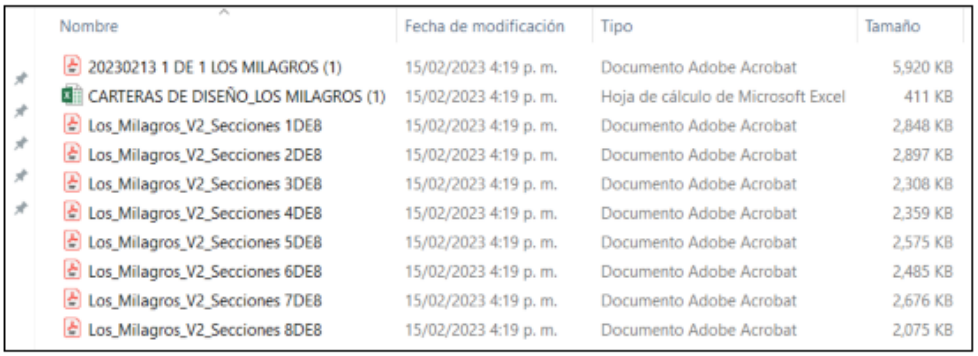

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
20230213 1 DE 1 LOS MILAGROS (1)	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	5,920 KB
CARTERAS DE DISEÑO_LOS MILAGROS (1)	15/02/2023 4:19 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	411 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 1DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,848 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 2DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,897 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 3DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,308 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 4DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,359 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 5DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,575 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 6DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,485 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 7DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,676 KB
Los_Milagros_V2_Secciones 8DE8	15/02/2023 4:19 p. m.	Documento Adobe Acrobat	2,075 KB

Figura 2. Información Magnética Diseño Geométrico (Los Milagros)
Fuente: CONSULTORES DENOVAN S.A.S. (CONSORCIO ONIX CCM)

De antemano, el expediente adolece de la presentación oficial de su memoria técnica -incluidos los respectivos planos en versión editable (.dwg)- según referencia numeral 12 – Aparte A.

El plano general, identifica adecuadamente un competente trabajo plasmado en una silueta con configuración en planta, modulación interactiva del sistema placa-huella tal (Requisito guía citada numeral 13 del Aparte A), apiques, grilla de coordenadas, cuadros de elementos horizontales - verticales, convenciones, diagrama de transición de peraltes, sección transversal típica, localización general, coordenadas de amarre con localización GPS sistema MAGNA-SIRGAS, detalles típicos de construcción del sistema placa-huella -incluidas (8) notas técnicas, dentro de las cuales se hace mención de manera particular al enfoque normativo de “estabilización con cemento” sobre los suelos de fundación original (Art. 350)* y (3) subítems para labores de mantenimiento-, secciones transversales con caracterización de volúmenes en corte y terraplén, bombeos, cotas, obras de drenaje transversal (ODT) y manchetas de presentación con las escalas apropiadas para tal fin. Tampoco se identifica la señalización horizontal-vertical del segmento vial comprendido entre las abscisas K0+020 a K1+000.

3. Mientras no se tenga la información requerida (Memoria técnica), el presente consultor se abstiene de emitir concepto favorable en esta disciplina de consultoría.

21

4. De otro lado, y tal como se ha referenciado, será como mínimo y totalmente necesario incluir los estudios y memorias técnicas correspondientes a la exploración de suelos, diseño geotécnico de pavimento*, hidrología e hidráulica; esta última, mostrada “parcialmente” en el plano de planta citado. Todos ellos bajo el enfoque que establecen las directrices sobre la presentación formal de estudios a nivel de fase III (Numeral 12 – Aparte A) como literatura especializada en el tema.

3.1.4 REVISIÓN DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTO DEL CONVENIO 1894 - 2021 MUNICIPIO DE MERCADERES.

1. Consultoría original “Alcaldía Mercaderes (C)”

1.1. Topografía

Se presenta informe digital realizado por el tecnólogo profesional HAROL PAREJA LÓPEZ. El compendio consta de (2) archivos bajo extensión (.pdf) denominados “Cartera de campo” e “Informe topografía” realizados en Febrero/2020 y constituidos por un total de (48) folios. No se adjuntan archivos originales bajo extensiones (.dwg) tal y como se describen en el capítulo 8 (Conclusiones); y el trabajo se enmarca para la rehabilitación del corredor rural “La Despensa – La Curva” en el municipio de Mercaderes (C) desde el K0+000 al K4+836. La memoria –y al parecer, ya que se identifica la misma nomenclatura-logotipo del profesional geometrista vial Ing. HELDER DANILO MARTÍNEZ BURBANO--, “dista considerablemente” de los mínimos requisitos en presentación que referencia el numeral 13 del Aparte A. Se deja entrever de manera adicional, la georreferenciación del levantamiento con ayuda de un “RTK submétrico” bajo el sistema posicional MAGNA-SIRGAS materializado en (1) prisma de concreto (BM) a la altura de la cabecera veredal “La Despensa”.

1.2. Geometría vial y señalización

Se exhibe un diseño geométrico vial (Horizontal y vertical), sin implantación de la señalización horizontal-vertical tal y como lo exige el manual citado sobre el numeral 17 del Aparte A. La consultoría fue realizada por el Ing. HELDER DANILO MARTÍNEZ BURBANO en Febrero/2021. Su compendio se

22

encuentra conformado por la entrega de una memoria técnica sobre un archivo de (15 folios), (8) planos planta-perfil y (20) de secciones transversales bajo extensión (.pdf). Lo anterior, como direccionamiento establecido en las guías y manuales de diseño mencionados en los numerarios 1 y 16, más nó con el citado en el numeral 13 del Aparte A. La sección en banca vial del sistema placa-huella "encaja" dentro del componente exigido por la guía de diseño (Numeral 14 - Aparte A) – Ver Figuras 1 a 2:

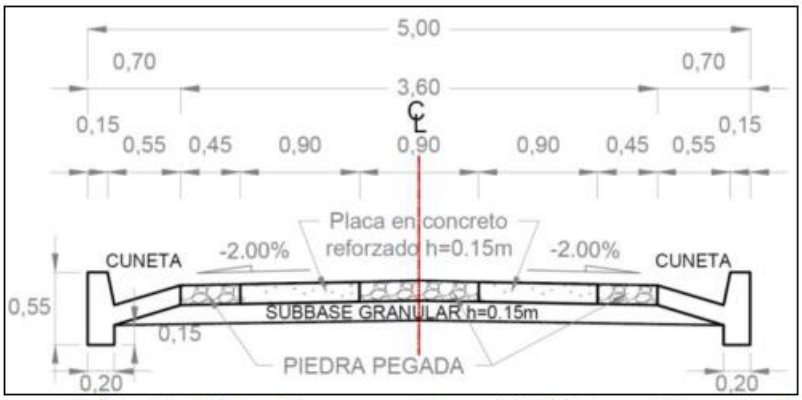


Figura 1. Sección Típica Transversal Banca Vial Sistema "Placa-huella"
Fuente: MARTÍNEZ, H. (2021). Informe diseño geométrico "Alcaldía Mercaderes"

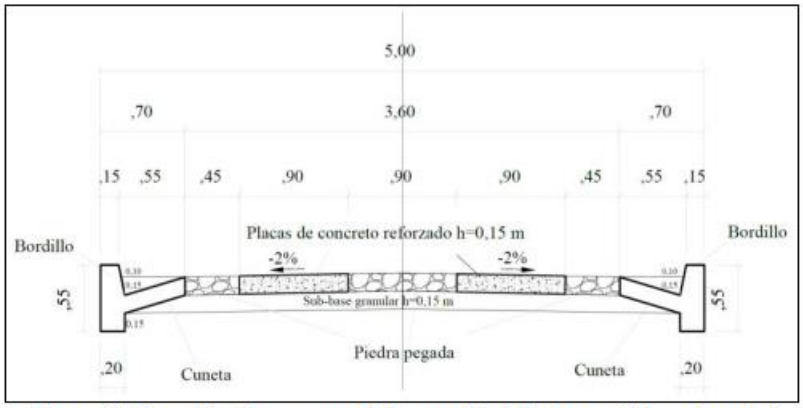


Figura 2. Sección Transversal Banca Vial Sistema "Placa-huella"
Fuente: Guía de diseño de pavimentos con placa-huella INVÍAS, 2015

El expediente adolece de la presentación oficial de los respectivos planos en versión editable (.dwg). Los planos planta-perfil como de secciones transversales, identifican adecuadamente las siluetas en configuración por eje vial replanteado y diseñado, más nó con la correspondiente modulación interactiva del sistema placa-huella tal y como lo exige en requisito la guía citada sobre el numeral 14 del

23

Aparte A. Adicional y como se sustentará en la evaluación del estudio hidrológico e hidráulico, tampoco se presentan los planos constructivos correspondientes al manejo del agua superficial (Cunetas) como de las respectivas obras de drenaje transversal (ODT) y demás complementarios. Se identifican los bordes de vía diseñada y existente, así como las curvas de nivel con sus respectivos chaflanes de corte y relleno para el cálculo del movimiento de tierras. Son identificables las grillas de coordenadas, cuadros de elementos horizontales-verticales, convenciones, diagrama de transición de peraltes, sección transversal típica (Ya mencionada), localización general, coordenadas de amarre con localización GPS sistema MAGNA-SIRGAS, detalles típicos de construcción del sistema placa-huella sin ningún tipo de anotación técnica complementaria, volúmenes en corte y terraplén, bombeos, cotas y manchetas de presentación con las escalas apropiadas para tal fin. El segmento vial diseñado se encuentra reconocido entre las abscisas K0+000 al K4+836.

Se encuentra de acuerdo con la selección de la velocidad y vehículo de diseño, anchos mínimos a utilizar en sección transversal general o de calzada y de berma-cuneta, peraltes, bombeos, pendientes longitudinales, sobre-anchos en curvas horizontales y radios mínimos entre otros. No se identifican dentro de dicha memoria, la justificación de curvas verticales ni los análisis por distancia o constante de visibilidad (K), a pesar de ser ilustradas algunas de ellas en los planos planta-perfil acabados de mencionar.

1.3. Hidráulica e hidrología

Se muestra un diseño bajo la consolidación de una memoria técnica promovida en (9) archivos digitales bajo extensión (.pdf), “adolecida” totalmente de los requisitos mínimos exigidos por los términos de referencia que se citan en el numeral 13 del Aparte A. Tampoco se evidencia direccionamiento alguno con base en las consideraciones establecidas por el manual de diseño citado en el numeral 10 del Aparte A, ni tampoco se muestra plano alguno de construcción tal y como se señaló en el numeral inmediatamente anterior. Se comparte especial y totalmente, el informe correspondiente a la inspección de alcantarillas existentes para el corredor vial en análisis. Para terminar, el documento fue realizado por la profesional RITA ALEXANDRA ZAMORA MARTÍNEZ en Febrero/2020.

1.4. Pavimentos

No se presenta informe o memoria técnica alguna; independiente de las secciones ilustradas en los planos planta-perfil del diseño geométrico vial, resultados de laboratorio en la exploración geotécnica al estudio de suelos y geología-geotecnia entre otros.

1.5. Suelos

24

Documento constituido básicamente por (6) archivos digitales en extensión (.pdf), que incluyen ensayos de caracterización, registros de perforación y una tabla resumen, dejando a un lado la presentación de un informe final o memoria técnica tal y como lo consideran los mínimos requisitos según términos de referencia sobre estudios fase III (Numeral 13 – Aparte A). Los documentos fueron realizados por la organización GEOSESTUDIOS LAB en Diciembre/2020. El corredor vial en estudio para la longitud considerada, cumple con el mínimo número de calicatas exploratorias, registrando un total de (18) unidades sobre las que se identifican sobre sus perfiles obtenidos -libres de nivel freático alguno-, la presencia de suelos arcillosos de baja compresibilidad (CL) intercalados con arenas arcillosas (SC) de capacidades portantes resistivas CBR bajas (4%) y libres “supuestamente” de potencial expansivo. Así las cosas, existen valores de humedad natural “correspondientes” a la tipología y uso granulométrico de los suelos así caracterizados, pero revistiendo con algo de preocupación respecto a la medida de sus límites líquidos cercanos al (40%) e índices de plasticidad superiores al (15%). Ante ello, es totalmente inminente la inclusión de sistemas de subdrenaje interior (Ver Figuras 3 a 5) como “posibles” mecanismos de mejoramiento en la estructura de pavimento (Ver “modelos” Fotografías 1 a 10) que robustecerá el sistema “placa-huella”, además del uso correspondiente e irrestricto de compactadores tipo “pata de cabra” para la consolidación constructiva y eficaz de los pisos de fundación original.

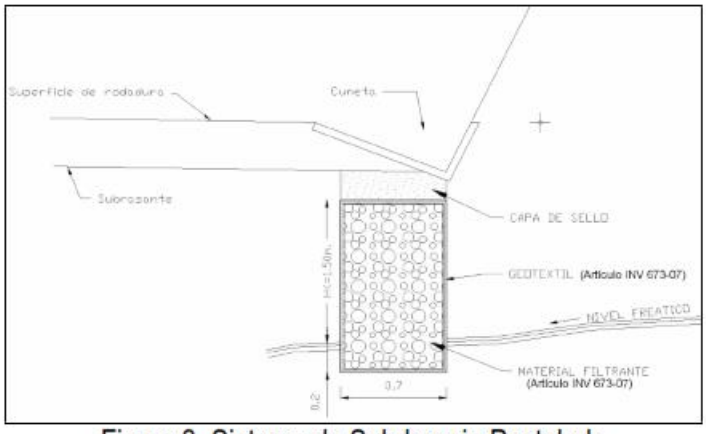


Figura 3. Sistema de Subdrenaje Postulado
Fuente: Manual de diseño de pavimentos flexibles para vías con bajos volúmenes de tránsito INVÍAS/2007

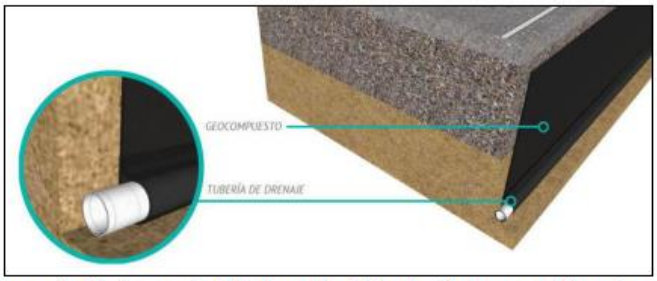


Figura 4. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico geodrén planar)
Fuente: www.pavco.com

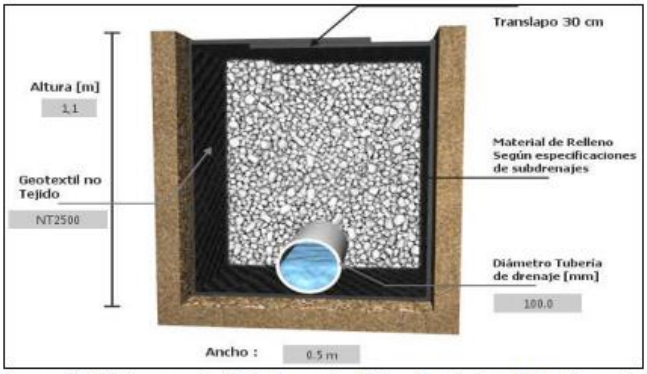


Figura 5. Sistema de Subdrenaje (Diseño típico filtro francés)
Fuente: www.pavco.com



Fotografías 1 a 6. Estabilización Mecánica con Rajón y Sello Granular
Fuente: Propia




Fotografías 7 a 8. Estabilización Mecánica con Bolo de Río y Sello Granular
Fuente: Propia



Fotografía 9. Estabilización Mecánica con Terraplén y Geotextil Separador
Fuente: Propia



Fotografía 10. Estabilización Mecánica con Demolición Losas MR y Granular
Fuente: Propia

1.6. Tránsito

No se presenta informe o memoria técnica alguna. Lo anterior, como base fundamental para la justificación del diseño geotécnico de pavimento que tampoco fue elaborado.

1.7. Geología & geotecnia

Se presenta informe digital realizado por el tecnólogo profesional ISMALE GARCÍA

27

ESPINOZA. El compendio consta de (1) archivo bajo extensión (.pdf) realizado en Febrero/2021 y constituido por un total de (14) folios. La memoria –y al parecer, ya que se identifica nuevamente bajo la misma nomenclatura-logotipo del profesional geometrista vial Ing. HELDER DANILO MARTÍNEZ BURBANO--, "dista considerablemente" de los mínimos requisitos en presentación que referencia el numeral 13 del Aparte A. Toma como base los ensayos de laboratorio y registros de perforación del estudio de suelos acabado de citar.

Se identifica la presencia de suelo orgánico en el apique No. 12, que deberá ser retirado en su totalidad para su reemplazo respectivo. Esta condición se "omitió" en el que podríamos "supuestamente" denominar estudio de suelos, y que en la presente consultoría igualmente lo prescinde de manera desafortunada. Llama la atención, los apartes consignados y ratificados en el capítulo 4 (Conclusiones). Según ellas, se ratifica que las obras de construcción al proyecto de infraestructura vial se desarrollarán en zonas geológicamente "estables"; condición que a mi respecto y por ser una zona en sección mixta, podrían causar fisuramiento en el sistema de placa-huella u otros complementarios, tipo media luna o agrietamientos longitudinales –esperemos que nó-.

2. Consultoría "Consorcio Mercaderes 23" y comunicado numeral 7 – Aparte A

2.1. Geometría vial e hidrología

Se exhiben (4) archivos digitales en extensión (.pdf) y (.dwg) objeto a un "ajuste" geométrico vial (Horizontal-vertical con "sobre-anchos" en curvas) y de cunetas (Curvas IDF-, longitudes y secciones hidráulicas) sin profesional responsable por autoría.

No se identifica señalización horizontal-vertical alguna, pero se resalta la implantación modulatoria del sistema placa-huella tal y como lo refiere la guía citada en el numeral 14 del Aparte A. Tampoco se evidencian secciones transversales, cálculo de movimiento de tierra, y, en fin, cada uno de los requisitos mencionados predecesoramente.

Con respecto a la primera viñeta del oficio en mención, no se comparte el ancho postulado de sección típica tal y como se muestra en la Figura 4 proveniente de los nuevos planos planta-perfil ajustados. Primarán los postulamientos y requisitos provenientes de los manuales de diseño que se citan en el Aparte A como del estudio original de consultoría. Es contradictorio que mientras en un aparte de este apunte se ciña a las directrices provenientes de la guía citada, se omita el condicionamiento mostrado en la Figura 2.

28




Figura 4. Sección Típica Transversal Banca Vial Sistema "Placa-huella"
Fuente: CONSORCIO MERCADERES 23 (2023)

Finalmente, se celebra la posición fijada en la viñeta final de dicha comunicación con respecto al direccionamiento establecido por el manual citado en el numeral 10 del Aparte A. De todas maneras, al no existir una memoria final o documento técnico que consolide y/o respalde lo acabado de citar, y aparte de ello, ni siquiera se formalicen planos de construcción, la viabilidad aprobatoria de consultoría en este aparte es totalmente nula.

Del mismo modo, para las demás y mínimas disciplinas omitidas.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Por lo anterior, esta asesoría técnica NO APRUEBA el estudio presentado para acometer presupuesto alguno en la ejecución del contrato referencia. Deberá en primera instancia, dar contestación oficial a las observaciones y justificaciones técnicas aquí presentadas. Convenio 1984 de 2021.

- Por lo anterior, esta asesoría técnica NO APRUEBA ningún diseño o estudio de consultoría para acometer presupuesto alguno en la ejecución del contrato referencia. Convenio 1867 – 2021.

- Por todo lo anteriormente justificado, esta asesoría técnica interventora NO APRUEBA ningún diseño o estudio de consultoría para acometer presupuesto alguno en la ejecución del contrato referencia. Convenio 1894.

Atentamente,

DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO
Ingeniero Civil UIS - TP 6820266808 STD

B. NORMATIVIDAD TÉCNICA, LITERATURA ESPECIALIZADA E INFORMACIÓN RECIBIDA.

1. BOWLES, J. (2000). Foundation analysis and design. Singapore (SNG).
2. CHOW, V. Te. (1962). Hydrologic determination of waterway areas for the design of drainage structures in small drainage basins. University of Illinois at Urbana Champaign, College of Engineering. Engineering Experiment Station. (EUA).
3. CHOW, V., TE, Maidment D. R., MAYS, L. W. (1994). Hidrología aplicada. Bogotá D.C. (COL).
4. CONSULTORES DENOVAN S.A.S. (2022). Estudios de topografía, hidráulica-hidrología, pavimentos (sistema placa-huella) y suelos “Alcaldía de Sucre (C)”. Bogotá D.C. (COL).
5. CRESPO, V. (2008). Mecánica de suelos y cimentaciones. Ciudad de México (MXC).
6. GAVILÁN, G. (2001). Manual de diseño de drenajes superficiales y subsuperficiales en vías. Bucaramanga (S) (COL).
7. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2009). Manual de drenaje para carreteras. Bogotá D.C. (COL).
8. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2004-2009). Resolución 4100 “Pesos máximos por ejes autorizados”.
9. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2022). Especificaciones generales de construcción de carreteras. Bogotá D.C. (COL).
10. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2015). Guía de diseño de pavimentos con placa-huella. Bogotá D.C. (COL).
11. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2020). Cartilla obras mejores drenaje y estructuras viales “Programa Colombia Rural”. Bogotá D.C. (COL).
12. MINISTERIO DEL TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2008). Manual de diseño geométrico de carreteras. Bogotá D.C. (COL).
13. MONTEJO, A. (2006). Ingeniería de pavimentos para carreteras. Universidad Católica de Colombia, 3ª Ed. Bogotá D.C. (C).
14. TERZAGHI K. PECK R. Mecánica de suelos en la ingeniería. Madrid (ESP).
15. AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS - AASHTO (2011). A policy on geometric design of highways and streets 6 th Ed. Washington (EUA).
16. AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO (1993). Guide for design of pavement structures. 2 nd Ed. Washington (EUA).

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se hizo uso de vehículos para el desplazamiento de las actividades. Puesto que los contratos de obra adjudicados se encuentran recopilando la documentación necesaria para suscribir orden de inicio. Una vez se requiere y se implemente equipos y vehículos se diligenciará formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: _____ **PROYECTO:** _____

CONTRATO INTERVENTORÍA No. _____ **INTERVENTORÍA:** _____

CONTRATO DE OBRA No. _____ **CONTRATISTA:** _____

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma _____
Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Firma _____
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el mes de enero se realizó seguimiento a los contratos de obra con el siguiente personal:

Cargo	Nombre	Dedicación
Director de Interventoría	María Camila Arenas de la Hoz	81%
Especialista en Pavimentos y/o Vías	David Alberto Santos Montero	17%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEB/2023
PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2.022 / F1-E1-IA-289-2022 / No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 / ARC-OBRA-009-2022 / LP 04-003-15 09/08 / LP 05/003-15 5/09 / F1-E1-IA-240-2022 / 484 de 2022 / 298 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 / LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 / Convenio 2496 de 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 22 RIL JAMES PIAMBA HOYOS / JULIAN LEONARDO GONZALES CASAS / HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO / EMCONSUT S.A.S. RIL WILIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO / CONSORCIO PH CHALGUAYACO RIL HERBERT LIZARDO DORADO DORADO / CONSORCIO ONIX CCM RIL JHSNER SEGOVIA QUINTERO / CONSORCIO MERCADERES 23 RIL JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA / CONSORCIO VIAS RURAL 2022 RIL JESUS ANCISAR CASTRO CALVO / CONSTRUCCIONES GYA SAS RIL PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO / CONSORCIO SUCRE 22 RILJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO / 0
NOMBRE ARL: Colmena y Sura
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	FEBRERO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MARIA CAMILA AREAS DE LA HOZ	1,078,367,738	Director de Interventoría	$ 4.860.000	X	X			X	X			X			X	X					X	X						X	X		70%	CONSULTORES DONOVAN SAS		$ 278.400	V	SANITAS	9448230020	$ 160.000	PORVENIR	9448230020	$ 640.000		$ -	$ -	
2	DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO	91,269,179	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 1.160.000	X	X			X	X						X	X						X	X					X	X		18%	CONSULTORES DONOVAN SAS		$ 80.800	I	SALUD MIA EPS	9450752551	$ 145.000	COLPENSIONES	9450752551	$ 185.600		$ -	$ -	
3																																		$ -				$ -		0			$ -	$ -	
4																																		$ -				$ -		0			$ -	$ -	
5																																		$ -				$ -		0			$ -	$ -	
6																																		$ -				$ -		0			$ -	$ -	
N																																													
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.020.000																																								

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25/04/2023 - 30/05/2023 - 9/05/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIA CAMILA AREAS DE LA HOZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520223260 CND

Firma
Nombre: LUIS EDU
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio mediante concurso de méritos No.CMA-DO-SRT-062-2021, la oferta económica adjudicada es:

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000
1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,500,000.00		18	$ 99,000,000
1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,500,000.00		16	$ 56,000,000
	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)				$ 87,500,000
1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
1	Inspector	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48	$ 10,560,000
	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA				
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000
1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000
1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000
	OTROS COSTOS				
1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16	$ 40,000,000

1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$	1,000,000.00	Mes	16	$	16,000,000
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$	1,000,000.00	GL	16	$	16,000,000
1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$	550,000.00	Mes	6	$	3,300,000
1	Veeduría Técnica Comunitaria	$	200,000.00	Mes	12	$	2,400,000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					$	261,460,000
*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**					$	1,389,186,000
	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)					$	73,262,000
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)					$	1,462,448,000
*	**IVA = 19% * (E) = (F)**					$	277,865,120
*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**					**$**	**1,740,313,120**

En este sentido se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT en donde se evidencia el avance financiero de Interventoría conforme a las actas de cobro tramitadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: FEB/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2.022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:** 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ 170,575,776
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,530,313,120
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120**	**$ 1,700,888,896**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,740,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
5		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
6		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
7		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
8		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
TOTALES		**$ 33,129,600**	**$ 6,294,624**	**$ 39,424,224**	$ -	$ -	$ -		**$ 1,700,888,896.00**	**$ 1,700,888,896**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 30,160,800	$ 5,730,552	$ 35,891,352
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2,968,800	$ 564,072	$ 3,532,872
VALOR TOTAL	$ 33,129,600	$ 6,294,624	**$ 39,424,224**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARIA CAMILA AREAS DE LA HOZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como parte de los compromisos de esta Interventoría se relaciona el seguimiento de las garantías del contrato mismo:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

PLAZO INICIAL: 10,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 174,031,312	22	7	2022	30	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 292,489,600	22	7	2022	30	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 348,062,624	22	7	2022	31	10	2026
Calidad del servicio	30%	$ 522,093,936	31	10	2023	31	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100216606

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 3/05/2023


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARIA CAMILA AREAS DE LA HOZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

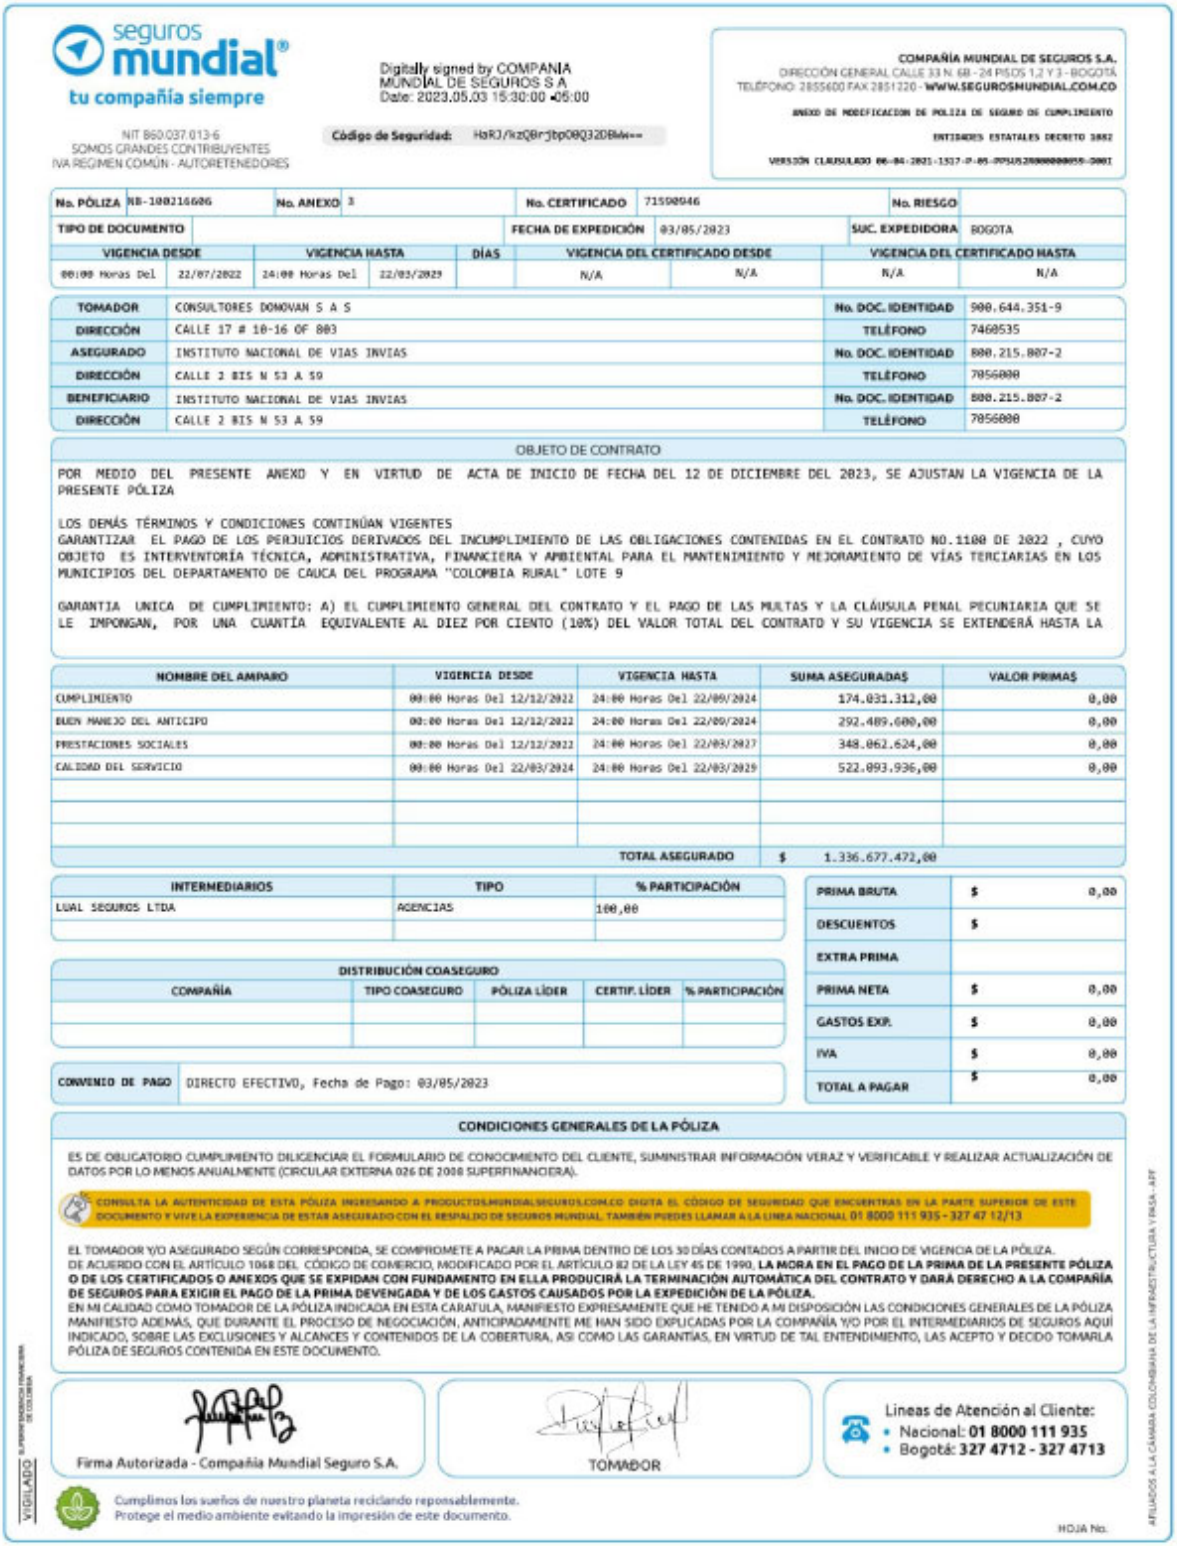

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.05.03 15:30:00 -05:00

Código de Seguridad: HsRJ/kzQBrjbp08Q32DBWw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1517-P-05-[illegible]

No. PÓLIZA	NB-100216606	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71590946	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/07/2022	24:00 Horas Del	22/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSULTORES DONOVAN S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.644.351-9
DIRECCIÓN	CALLE 17 # 10-16 OF 803	TELÉFONO	7460535
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 2 BIS N 53 A 59	TELÉFONO	7856000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 2 BIS N 53 A 59	TELÉFONO	7856000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1100 DE 2022 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: A) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/09/2024	174.031.312,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/09/2024	292.489.600,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/03/2027	348.062.624,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 22/03/2024	24:00 Horas Del 22/03/2029	522.093.936,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.336.677.472,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El 12 de diciembre, la interventoría firmo Acta de inicio del contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” “LOTE 9”.
- En el transcurso del contrato la interventoría solicito a las Alcaldías Municipales del Cauca, que suscribieron convenio con el INVIAS y que son objeto de seguimiento de esta interventoría, el envío de los Estudios y Diseños de las obras para revisión y aprobación de los especialistas de la interventoría.
- A la fecha del presente informe se avanzó en la entrega de documentos previos por parte de los contratistas de obra para revisión y aprobación de la interventoría, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoría del INVIAS.
- La Interventoría seguirá reiterando a través de oficios, Correos electrónicos y reuniones la entrega de Estudios y Diseños por parte de las entidades Municipales donde se desarrollarán las obras de los convenios y a los contratistas, la entrega de documentos previos a las obras del contrato de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoría del INVIAS.
- Se recomendó a cada uno de los municipios, objeto de los convenios para adelantar las obras, previo a la suscripción de la orden de inicio, efectuar una visita conjunta con el objetivo de definir y establecer los puntos de intervención por parte de la administración municipal, quienes conocen y determinan la necesidad de las obras.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

MUNICIPIO DE ARGELIA – CAUCA – CONVENIO: 1984

FECHA	OBJETO	MEDIO
15/02/2023	Proceso en las comunicaciones	CORREO ELECTRONICO
17/02/2023	Solicitud Pólizas actualizadas convenio 1984-2021	CORREO ELECTRONICO

- Respuesta comunicación del 03 de febrero de 2023 (Inicio de las obras del Contrato de obra No ARG-OBRA-009-2022) DON-1100-INV-052-2022 – 3/02/2023.
- Remisión Estudios para su revisión y/o apropiación. DON-1100-INV-059-2022. 9/02/2023.
- Concepto de Esp. Pavimentos de la Interventoría a los Estudios y diseños entregados por la entidad. DON-1100-INV-059-2023 – 13/02/2023.
- Respuesta Oficio OF-CTA-009-2022-004 y remisión concepto de Esp. Pavimentos. El 10/02/2023
- Observaciones de la Interventoría a los Estudios y diseños entregados por la entidad. DON-1100-INV-059-2023 – 14/02/2023

MUNICIPIO DE MERCADERES – CAUCA – CONVENIO: 1894

- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1894-2021 del Municipio de Mercaderes, realizados por el Esp. De Pavimentos de la Interventoría**. DON-1100-INV-061-2022 -** 22/02/2023.
- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 09 de febrero). **DON-1100-INV-062-2022.** 22/02/2023.

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1866

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/02/2023	Solicitud de documentos convenio 1866-2021 Sucre	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1769

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1867

- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1867-2021 del Municipio de Bolívar, realizados por el Esp. de Pavimentos de la Interventoría. **DON-1100-INV-060-2022.** 22/02/2023.

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1750

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/02/2023	Acta comité de obra No 1 Convenio 1750-2021 Bolívar -Cauca.	CORREO ELECTRONICO
15/02/2023	Acta de Reunión general del 24 de enero de	CORREO

	2023 para firma	ELECTRONICO
17/02/2023	Solicitud de Pólizas Actualizadas y Minuta del Contrato -Convenio 1750-2021	CORREO ELECTRONICO
21/02/2023	Reiteración de solicitud de Pólizas Actualizadas del Contrato -Convenio 1750-2021	CORREO ELECTRONICO

- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 26 de enero). **DON-1100-INV-050-2022 –** 2/02/2023.
- Revisión y comentarios a los Estudios y Diseños de las obras del convenio 1750-2021 del Municipio de Bolívar, realizados por el Esp. de Pavimentos de la Interventoría. DON-1100-INV-056-2022. 3/02/2023.
- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 06 de febrero). DON-1100-INV-057-2022 – 8/02/2023.

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1749

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/02/2023	Solicitud de Contrato firmado y Pólizas actualizadas convenio 1749-2021	CORREO ELECTRONICO

- Observaciones a documentos previos al inicio de las obras (entrega realizada el 30 de enero de 2023). **DON-1100-INV-054-2023 –** 6/02/2023.
- Solicitud complementar entrega de documentos previos al inicio del Contrato de obra. DON-1100-INV-055-2022 – 7/02/2023.

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1982

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/02/2023	Solicitud Documentos contractuales convenio 1982-2021.	CORREO ELECTRONICO
21/02/2023	Solicitud de documentos contractuales	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE INZÁ – CAUCA – CONVENIO: 1983

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/02/2023	Solicitud Minuta del Contrato firmada y Pólizas Actualizadas Convenio 1983-2021	CORREO ELECTRONICO
21/02/2023	Solicitud de Pólizas Actualizadas Convenio 1983-2021	CORREO ELECTRONICO
22/02/2023	Solicitud de garantías de cumplimiento Convenio 1983-2021	CORREO ELECTRONICO

- Revisión a la corrección de Análisis de Precios Unitarios presentada por el Contratista. **DON-1100-INV-058-2023** – 9/02/2023.

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA – CONVENIO: 1748

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/02/2023	Solicitud de documentos Contractuales - Convenio 1748-2021	CORREO ELECTRONICO

- Observaciones a entrega de Documentos previos (entrega del 30 de enero). DON-1100-INV-051-2023 – 2/02/2023.
- Solicitud de Prórroga y actualización de Pólizas del Contrato de obra N. 484-2022 del Convenio 1768-2021 Municipio de Santander Quilichao- Instituto Nacional de Vías. DON-1100-INV-053-2023 – 3/02/2023.

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA – CONVENIO: 2496
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

- Acta Modificatoria de Costos No 1. DON-1100-INV-049-2022 – 1/02/2023.
- Reunión jueves 23 de febrero - INVIAS TERRITORIAL CAUCA – 16/02/2023.
- Informes Semanales de Interventoría, periodo del 12 al 31 de diciembre de 2022. DON-1100-INV-063-2022. 28/02/2023.
- Informe Mensual de Interventoría, periodo del 12 al 31 de diciembre de 2022. DON-1100-INV-064-2022 – 28/02/2023.
