	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 141 DE 2.022 — **Contratista:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022 — JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 — HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022 — EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058 — CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059 — CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022 — CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022 — CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 — CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 — CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Convenio 2496 de 2019

Contrato de Interventoría No. 1100 **Interventoría:** CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9".

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** Julio

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		16
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		17
2.1	Localización		17
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		24
2.4	Características técnicas del proyecto		24
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		29
3.1	Información general del contrato		29
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		48
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		52
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		53
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		62
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	62
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	137
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	146
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	149
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	150
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	160
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	161
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	180
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		180
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		180
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	188
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	215
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		227
5.1	Información general del contrato		227
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		227
5.3	Informes especialistas y profesionales		228
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		233
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	233
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	234
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	236
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	238
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	241
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		242
8	**Anexos**		244
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		245
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		251
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		261

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3886 de fecha 19/10/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-289-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO: 11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 1/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,799,782,602.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 899,891,301.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.885
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado	ml	15

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Filtro	ml	12	12
	Muros	ml	12	12
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	8	8
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,799,782,602.00		1,799,782,602.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,799,782,602.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	128,435,093.00		$ -	251,788,457.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	251,788,457.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 759,893,662.57
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 251,788,457.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 13.99%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación Acero de Refuerzo Alcantarilla No. 8



Construcción Poceta de Encole Alcantarilla No. 8

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 795,011,198.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.415
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Vial	m2	6665	6665

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	795,011,198.00		795,011,198.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			795,011,198.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	152,578,375.00		$ -	152,578,375.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	152,578,375.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 103,545,630.51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 152,578,375.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 19.19%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de material de subbase



Extensión y nivelación de material de Subbase

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: ARG-OBRA-009-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

CONTRATISTA: EMCONSULT S.A.S

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO: 3/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 18/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
PRORROGA N°1
PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 958,081,628.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 287,424,488.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.46
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento periódico	m2	1500	1500

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	958,081,628.00		958,081,628.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			958,081,628.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	289,430,945.00		$ -	297,032,585.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	297,032,585.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 948,361,479.97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 297,032,585.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 31.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte, figuración e instalación de acero descole Km 2+207m



Fundición de solado limpieza descole Km 2+207m

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-240-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23

PLAZO INICIAL: 30/09/2023
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.85
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	15
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	2,248,615,000.00		2,248,615,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2,248,615,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	2,248,615,000.00		$ -	
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A	Foto 2 N/A
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS G Y A S. A. S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 16/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2023
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4,306,911,911.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 1,292,073,573.30
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	2.125
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	23
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		2	2
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	4,306,911,911.00		4,306,911,911.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			4,306,911,911.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	27,056,717.23		$ -	65,414,701.39
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	65,414,701.39

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2,985,120,645.51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 65,414,701.39
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1.52%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maquinaria en el frente de obra



Fundición de obra de descole ALC 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-090-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 54-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,078,384,354.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 319,633,887.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.706
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,078,384,354.00		1,078,384,354.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,078,384,354.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	2,541,230.00		$ -	2,541,230.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	2,541,230.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 236,321,848.50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2,541,230.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.24%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAQUINARIA INSTALANDO TUBERIA



ALCANTARILLA K0+216

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 005-003-15.05/059

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 26/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 3,478,131,956.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 1,043,439,586.80
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 77,481,376.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.05
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Batea	Und	1
	Box Coulvert	Und	3
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	30
	Dren	m	393
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	m	4
	Muro de contención en concreto reforzado	m	26

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	52.83	143.38
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Alcantarillas	und	1	1
	Box Coulvert		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		1	1
	demolicion alcantarilas		6	6
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones		0	
	Muro de contención en concreto reforzado		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3,478,131,956.00		3,478,131,956.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			3,478,131,956.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	161,822,052.00		$ -	488,064,185.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	488,064,185.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1,161,963,436.86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 488,064,185.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 14.03%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 21
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **35**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción Concreto Ciclópeo K0+169



Construcción Huellas K0+130

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CARLOS IVAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: LP 04-003-15 05/058

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES
FECHA DE INICIO: 5/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 3/09/2023
PLAZO ACUMULADO: 3.5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,063,184,929.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 318,955,478.70
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.456
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	6
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,063,184,929.00		1,063,184,929.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,063,184,929.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	999,758.00		$ -	136,546,351.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	136,546,351.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 778,582,020.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 136,546,351.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 12.84%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

135546593

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 22

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION DE FILTRO



EXCAVACION DE FILTRO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 28/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2023
PLAZO ACUMULADO: 4 8MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 608,231,289.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 182,469,386.85
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.24
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	608,231,289.00		608,231,289.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			608,231,289.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	112,017,576.00		$ -	112,017,576.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	112,017,576.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 601,516,253.67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 112,017,576.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 18.42%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Deslizamientos en la via

Foto 2 N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 484-2022

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 1/06/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 1/10/2023
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 912,367,379.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.496
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	Und	8
	Muro en gaviones	Und	1
Otros (Especificar cuales)	Muro de contención en concreto reforzado	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
	Muro en gaviones			
Otros (Especificar cuales)	Muro de contención en concreto reforzado		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	912,367,379.00		912,367,379.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			912,367,379.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	70,931,828.40		$ -	70,931,828.40
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	70,931,828.40

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 304,194,049.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 70,931,828.40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 7.77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entrada a la obra



Actividades de acero para alcantarillas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y MINAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
INTERVENTORÍA DE OBRA

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ	Director de interventoría	

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....16

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS....17

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS....17
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO....19
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS....24
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....24
2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO....29
2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO....29
2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO....29

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA....29

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....29
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....48
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS....52
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA....53

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA....62

4.1 INFORME SEMANAL....62
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA....137
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA....146
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 149
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....150
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO....160
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....161
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA....180
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....180

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA....227

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....227
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR....227
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES....228

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA....229

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....229
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....230

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 232
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....234
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 237

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 238

8 ANEXOS 240

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 241

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir 19
Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA 20
Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES....20
Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE 21
Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR 22
Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER....22
Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA....23
Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO 23
Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA 24

1 INTRODUCCIÓN

Mediante Contrato 1100 de 2022 “CONSULTORES DONOVAN SAS” realiza la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” “LOTE 9” el cual fue adjudicado por Resolución de Adjudicación No 1715 del 24 de mayo de 2022, previo Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DTE-SEP- 197-2021.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de BOLÍVAR, ALMAGUER, QUILICHAO, SUCRE, BOLÍVAR, MERCADERES, SUCRE, ALMAGER, ARGELIA, INZA Y PUERTO TEJADA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero desarrolladas por el contratista durante el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de las obras que nos ocupan.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de ONCE
(11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Cauca en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CAUCA	ARGELIA	958.081.628	1984-2021
CAUCA	MERCADERES	2.248.615.000	1894-2021
CAUCA	SUCRE	4.306.911.911	1866-2021
CAUCA	SUCRE	1.078.384.354	1769-2021
CAUCA	BOLIVAR	3.478.131.956	1867-2021
CAUCA	BOLIVAR	1.063.184.929	1750-2021
CAUCA	ALMAGUER	1.799.782.602	1749-2021
CAUCA	ALMAGER	795.011.198	1982-2021
CAUCA	INZA	608.231.289	1983-2021
CAUCA	QUILICHAO	912.367.379	1768-2021
CAUCA	PUERTO TEJADA	2.196.000.000	2496-2019

Las principales actividades y obras para ejecutar son las siguientes:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de once (11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

METAS FISICAS CONTRACTUALES						
CONVENIO	**MUNICIPIO**	**CORREDOR**	**LONG (KM)**	**PUNTO DE INICIO**	**PUNTO FINAL**	**OBSERVACIONES**
1984-2021	ARGELIA	LA PLAYA-EL ENCANTO	1.80	Cruce con carretera 25cc03	Vereda el encanto	Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico
1894-2021	MERCADERES	LA PLAYA -LA DESPENSA	1.85	Vereda la Despensa	Vereda la Despensa	construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m

1866-2021	SUCRE	EL PARAÍSO - LA CEJA – LA CABECERA MUNICIPAL	2.125	Puente sobre el Río Mazamorras vía que conduce Sucre-La Ceja	Caseta Central vereda la Ceja	construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 2125 ml de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio
1769-2021	SUCRE	25CC08 S4-1 LA BALASTRERA	0.706	inicia inmediatamente se pasa la quebrada Peña Blanca	Termina 830 metros arriba de la quebrada Peña Blanca	construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36" Construcción de 706 ml de placa huella
1867-2021	BOLIVAR	VIA AGUA GORDAS - LOS MILAGROS	1.05	Puente militar río Dantas K22+642	Cabecera de Milagros – Cauca K23+643	demolición de 9 alcantarillas y 1 batea en concreto reforzado, construcción de 1050 metros de placa huella, Construcción de 30 alcantarillas de 36" en concreto reforzado, construcción de 3 Box Culvert en concreto reforzado tipo C, Construcción de 393 metros de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de longitudes de 6 m y 20m en concreto reforzado, construcción de 1 Muro de contención de longitud de 4m y altura 4 metros en gaviones, instalación de 30 señales de tránsito verticales.
1750-2021	BOLIVAR	BOLIVAR-CHALGUAYACO	13.5	Vda. Chalguayaco	Vda. Cucho	Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36", Construcción de 456 ml de placa huella, demolición de una alcantarilla.
1749-2021	ALMAGUER	CAQUIONA-HATO-HUMUS RESGUARDO	0.885	KM 0 + 000	KM 0 + 818	construcción de 10 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5m Construcción 15m de muro en concreto reforzado tipo, de 3m de altura
1892-2021	ALMAGUER	VIA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA	0.415	KM 0 + 000	KM 0 + 405	construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 415 ml de placa huella de ancho tipo 5 m
1983-2021	INZÁ	SAN ANDRES DE PISIMBALA-ALTO PISIMBALA-TUMBICHUCUE	14	VÍA 26CC04 PR 4+0000 = PR 0+0000 SAN	VÍA 26CC04 PR 18+0000 TUMBICHUCUE	construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long = 240 m - conformación de calzada existente
1768-2021	SANTANER DE QUILICHAO	PANAMERICANA – CRUCERO LA SALINA - ALTO DE SAN JOSÉ DE MANDIVA Y EMANUEL	7.10	PR 0+0000 Ruta 25KA126 vía Panamericana – Crucero de Salinas – Alto el Paraíso	PR 4+0800 Ruta 25KA126- 1 vía Crucero de Salina – Alto de San José Mandiva y Emanuel	construcción y recuperación alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long =496 m - conformación de calzada existente y afirmado - construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato que se obtenga como resultado del presente Concurso de Méritos.

Las obras a construir se encuentran ubicadas en el DEPARTAMENTO DE CAUCA, A continuación, se presenta el mapa de localización de las obras para los Municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao y Puerto Tejada del departamento del Cauca.

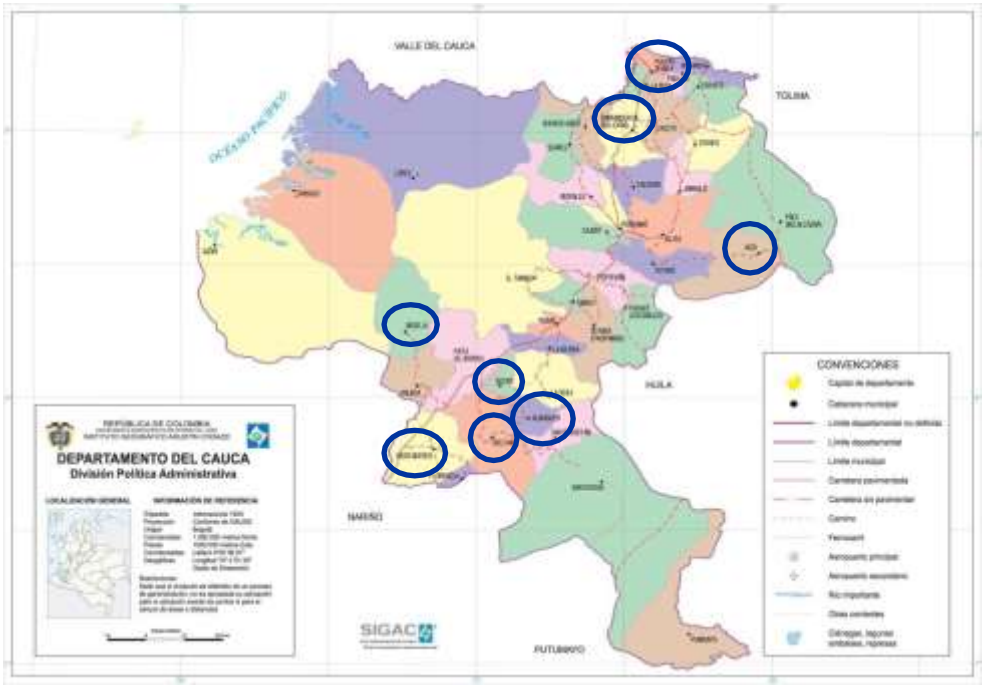


Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 ARGELIA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado al occidente del departamento del Cauca, en el piedemonte de la cordillera occidental sobre la llanura del Pacifico, ubicado sobre el macizo colombiano a 184 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.250 m. su temperatura es 22 °C .

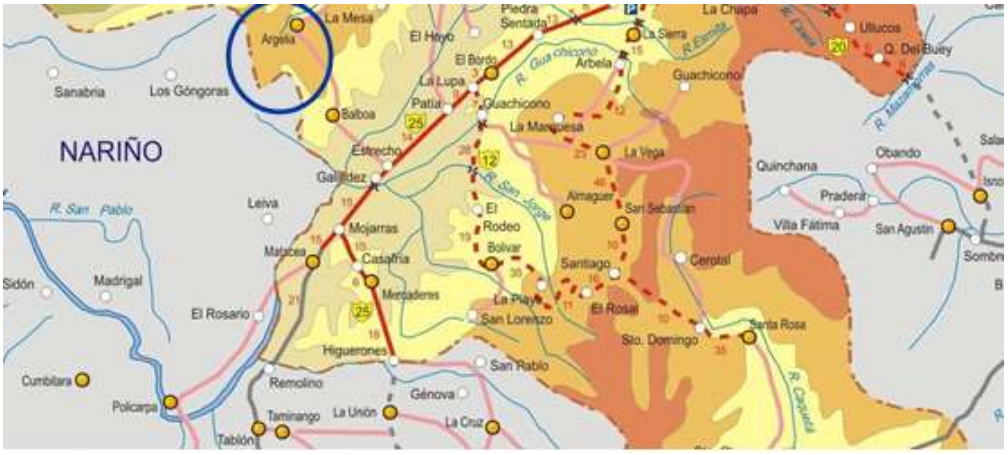


Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA

2.2.2 MERCADERES – CAUCA

Es un municipio colombiano situado en el suroeste del país, en el departamento de Cauca, a 97 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.167 m. su temperatura es 22 °C. Limita al este con Bolívar, al norte con Patía y Balboa, al oeste con Leiva y El Rosario, ambos en el departamento de Nariño, y al sur con Florencia y con el municipio de Taminango del departamento de Nariño.

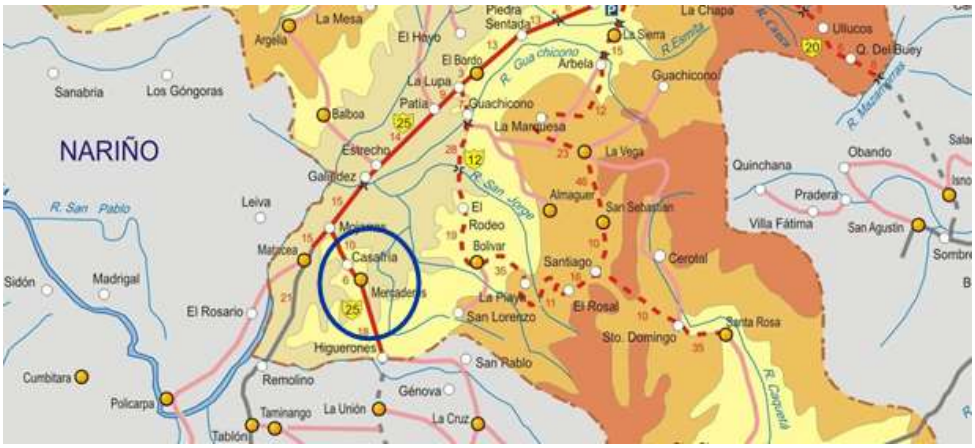


Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES

2.2.3 SUCRE – CAUCA

Sucre está ubicada a 02º, 03,30” Latitud Norte y 76º, 56,46” Longitud Oeste Su altura sobre el nivel del mar es de 1.140 m. su temperatura es 26 °C y su precipitación es 1600 ml anuales.

Por el Norte limita con los municipios del Patía y la Vega, por el Oriente con Almaguer, la Vega y Bolívar, por el Occidente con el Patía y en su parte sur con el Municipio de Bolívar.



Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE

2.2.4 BOLIVAR - CAUCA

Se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la cordillera central, haciendo parte del denominada Macizo Colombiano, Limita al norte con Florida, al oriente con Rio blanco, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 145 km de la capital.

La región cuenta con una altura promedio sobre el nivel del mar de 1. 177 m.s. n.m, con terreno ondulado y con una temperatura promedio de 18°C.

Las vías en estudio hacen parte de la red de vías terciarias y sirve como conexión de cabeceras municipales, centros poblados y veredales, cumpliendo un papel ponderable en el desarrollo socioeconómico en la época del posconflicto

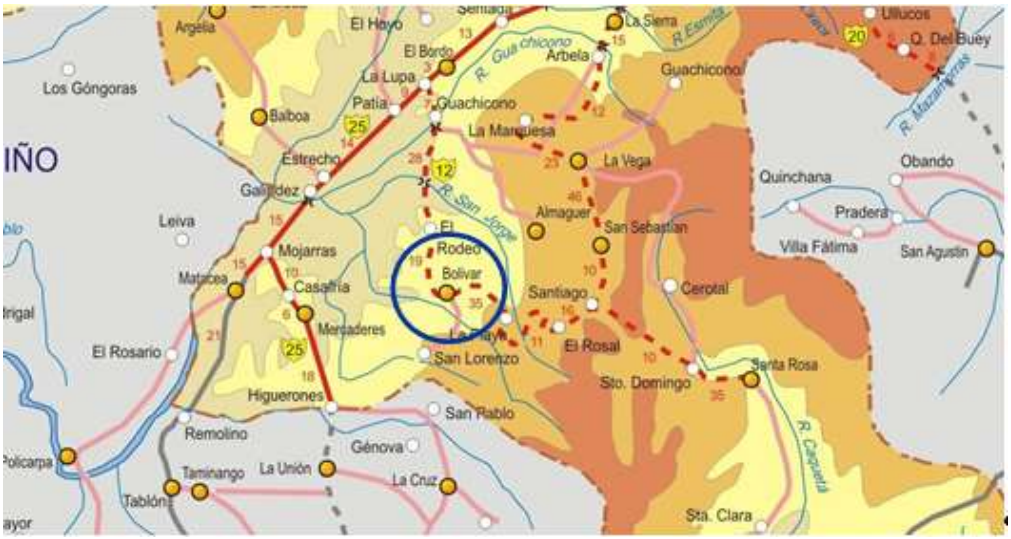


Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR

2.2.5 ALMAGUER – CAUCA

Pertenece al denominado Macizo Colombiano, La población de Almaguer se halla situada al pie de la colina de Belén - Panecillos y Santa Bárbara, como sus cerros tutelares, ceñida por el poderoso macizo de la cordillera de los Andes. Altura sobre el nivel del mar: 2.312 m. Temperatura media: 17°C. Dista de Popayán 172 km. Limita al Norte: Municipio de La Vega. Al sur: Municipios de Bolívar y San Sebastián. Al Oriente: Municipio de San Sebastián. Y al Occidente: Municipio de Sucre.

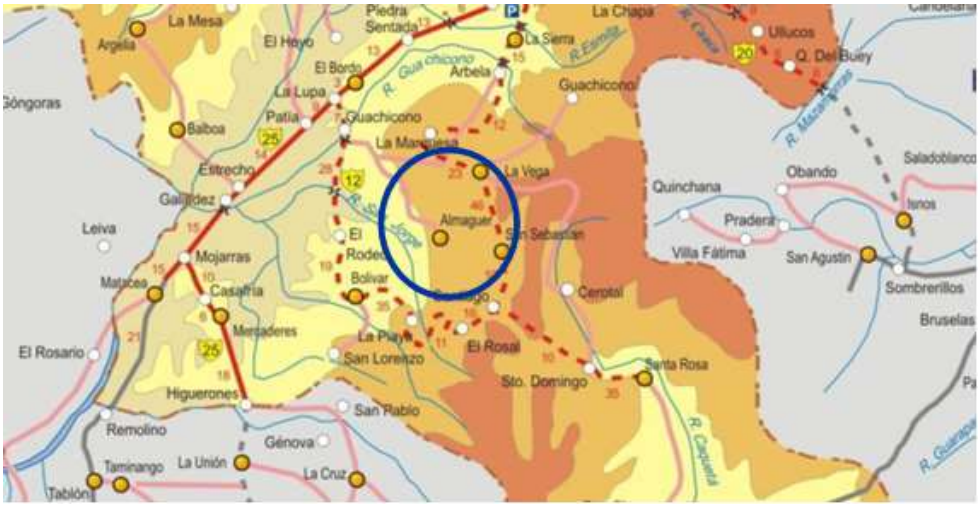


Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER

2.2.6 INZA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca, a 102 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.754 m. su temperatura es 27 °C.

Limita por el Norte y el Este con Páez, por el Sur con el departamento del Huila y por el Oeste con Totoró y Silvia.



Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA

2.2.7 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 m. su temperatura es 27 °C. Limita al norte con los Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de Caldono.



Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO

2.2.8 PUERTO TEJADA – CAUCA

Es un municipio colombiano localizado en la Provincia Norte del departamento del Cauca, cercana al área metropolitana de Cali 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 968 m. su temperatura es 27 °C.

Limita al norte con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Occidente con los municipios de Villarrica y Jamundí, al oriente con los municipios de Miranda y Padilla y al sur con los municipios de Caloto y Villarrica.



Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

Las vías para intervenir son vías rurales, prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.
De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao y Puerto Tejada; En El Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa COLOMBIA RURAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

Los municipios son los encargados de suministrar al contratista de obra, los diseños para su respectiva aprobación u observaciones y a su vez remitir a la interventoría para su concepto y poder dar viabilidad para el inicio de las obras.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

2.4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El mantenimiento periódico es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

La principal actividad por ejecutar es el Suministro e instalación de afirmado Para la ejecución de las obras de mantenimiento periódico se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 1: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán conforme a lo estipulado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías.

Nota 2: El equipo mínimo requerido debe estar acorde con lo indicado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones

Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías y Especificaciones Particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 3: Los aportes previstos en maquinaria amarilla y materiales granulares por parte de los Entes Territoriales deben cumplir con el requerimiento de las Especificaciones de Construcción de Carreteras y estar acordes con la necesidad que tiene el proyecto, reflejada en los análisis de precios unitarios del presupuesto del proyecto

2.4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El mantenimiento rutinario consiste en el conjunto de actividades a ejecutar en las vías rurales que buscan mejorar el comportamiento estructural y funcional de las vías con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía, empleando la mano de obra local y herramienta menor.

Las principales actividades por ejecutar son: • Desmonte y limpieza en zonas no boscosas • Rocería • Reparación de baches • Limpieza de alcantarillas y descoles • Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor • Reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo Para la ejecución de las obras de mantenimiento rutinario se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Las actividades del mantenimiento rutinario se realizarán bajo un sistema de gestión con participación comunitaria con un alto componente social que posibilite a las administraciones locales introducir una modalidad de mantenimiento de la red vial rural a menor costo y con un significativo arraigo local, favoreciendo inclusive el que las comunidades se empoderen y gestionen el desarrollo de obras en las vías, que son vitales para su progreso y el bienestar de sus habitantes, esto se logra con la participación comunitaria.

El personal vinculado debe pertenecer a organizaciones de acción comunal y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo, dando prioridad a las mujeres rurales, que se encuentren en las zonas de influencia de las vías, quienes serán los responsables de la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario del Corredor Productivo seleccionado a través de su comunidad formalizada, que se denominarán los “Emprendedores Rurales”, cuya cartilla podrá ser consultada en la página https://colombiarural.invias.gov.co.

El Ente Territorial ejecutará estas actividades de manera directa a través de Convenios Solidarios con las juntas de acción comunal y/o asociaciones comunales y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo. Lo anterior, conforme a lo regulado en el parágrafo 3 y 4 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012 y demás normas aplicables a la materia.

Así mismo el artículo 141 de la Ley 136 de 1994 establece que los municipios pueden vincular a las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales y sin ánimo de lucro, al mejoramiento y desarrollo municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. De conformidad a lo establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”, para la operación los Entes Territoriales se obligan a aportar la dotación, herramientas y equipos que se relacionan a continuación: • DOTACIÓN: overol, botas, cascos, chalecos reflectivos, guantes, conos reflectivos, botiquín, cintas de señalización. • HERRAMIENTA Y EQUIPOS: picas, carretillas, machetes con estuche, barras, pisones, palas, rastrillos, limas, baldes, azadones, escobas, guadañas; así como el mantenimiento y el combustible requerido para el óptimo funcionamiento de los equipos; respaldado mediante certificación expresa de aportes en bienes y servicios.

El procedimiento para cuantificar la cantidad de estos elementos se encuentra establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”.

2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente
- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Argelia, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	ARG-OBRA-009-2022
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

Valor del Contrato de Obra	$ 958.081.628
Nombre del Contratista	EMCONSUT S.A.S.
Representante legal	William Alcides Sánchez Fajardo
Fecha suscripción Contrato de obra	7 de octubre de 2022
Acta de inicio	3 de abril de 2023
Prorroga 1	19 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial	18 de julio de 2023
Fecha de terminación vigente	1 de septiembre de 2023

3.1.1.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Conformación de la calzada existente	m2	2.925,60	$ 1.020,00	$2.984.112,00
Subbase granular clase c	m3	438,84	$ 281.980,00	$123.744.103,00
Sello asfaltico para juntas	m	1.950,40	$ 3.040,00	$5.929.208,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	225,03	$ 13.620,00	$3.064.909,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	99,36	$ 18.300,00	$1.818.288,00
Rellenos con material filtrante	m3	39,74	$ 249.430,00	$9.912.348,00
Concreto resistencia 21mpa (D)	m3	368,17	$ 826.140,00	$304.159.964,00
Concreto resistencia 14mpa (g) (ciclópeo)	m3	173,88	$ 551.760,00	$ 95.940.029,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	16.547,10	$ 7.860,00	$130.060.206,00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma ntc 1087 de diámetro 101.6 mm	m	110,40	$ 33.170,00	$3.661.968,00
Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	m2	2.252,16	$ 9.030,00	$20.336.995,00
			Sub- total	**$701.612.130,00**
Construcción de alcantarillas 36"				
Remoción de alcantarillas	m	56,00	$36.760,63	$ 2.054.641,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	530,00	$13.534,00	$ 7.293.977,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	36,00	$18.338,00	$ 658.800,00
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	98,00	$814.356,00	$ 80.961.720,00
Concreto resistencia 14MPa (f)	m3	18,00	$666.254,00	$ 9.931.680,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	7.354,20	$8.538,00	$ 57.951.096,00
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior	m	70,00	$557.123,00	$ 38.920.700,00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1.095.274,00	$1.095.274,00
			Sub- total	**$1.095.274,00**
SECCIÓN 2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Conformación de la calzada existente	m3	1.500,00	$1.024,00	$1.530.000,00

Suministro e instalación de afirmado	m3	189,24	$245.529,00	$46.371.462,00
			Sub- total	**$47.901.462,00**
			Sub total básico de obra (A)	$948.381.480,00
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$9.492.046,00
			Valor IVA consultoría (c)	$208.102,00
			Valor total A+B+C+AIU	**$958.081.628,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Mercaderes, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	CE-F1-F14-240-2022-02
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 2.248.615.000
Nombre del Contratista	CONSORCIO MERCADERES 23
Representante legal	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
Fecha suscripción Contrato de obra	30 de diciembre de 2022

3.1.2.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Construcción de alcantarillas de 36”				
Excavaciones varias en material común en seco	M3	679.80	$ 13,720	$ 9,326,856
Relleno para estructuras con suelo	M3	209.15	$ 80,370	$ 16,809,386
Concreto resistencia 21MPa (d) - mezcla in situ	M3	120.51	$ 792,200	$ 95,468,022
Concreto resistencia 14mpa (F)	M3	20.20	$ 625,000	$ 12,625,000
Acero de refuerzo fy 4200 MPa	KG	8,930.10	$ 9,120	$ 81,442,512

Tubería de concreto reforzado, clase II de 900mm de diámetro interior	ML	92.70	$ 1,210,000	$ 112,167,000
			Sub- total	**$ 327,838,776**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	4,245.20	$ 17,160	$ 72,847,632
Subbase granular clase C	M3	1,550.67	$ 198,400	$ 307,652,928
Concreto resistencia 21MPa (D) - mezcla in situ	M3	933.79	$ 792,000	$ 739,561,680
Concreto resistencia 14MPa (F)	M3	50.07	$ 625,500	$ 31,318,785
Concreto resistencia 14MPa (G) (ciclópeo)	M3	445.78	$ 482,240	$ 214,972,947
Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	56,320.00	$ 9,120	$ 513,638,400
Sello para juntas	ML	6,729.33	$ 3,900	$ 26,244,387
			Sub- total	**$ 1,906,236,759**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 2,468,398	$ 2,468,398
			Sub- total	**$ 2,468,398**
			Sub total básico de obra (A)	$ 2,236,543,932
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 11,602,071
			Valor IVA (C)	$ 468,996
			Valor total A+B+AIU	**$ 2,248,615,000**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.3 SUCRE 1866 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	258-2022
Objeto del Contrato de Obra	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866

	DE 2021
Valor del Contrato de Obra	$ 4.306.911.911
Nombre del Contratista	CONSTRUOBRAS GIA SAS
Representante legal	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
Fecha suscripción Contrato de obra	28 de octubre de 2022
Acta de inicio	16 de mayo de 2023
Prorroga 1	1 septiembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de agosto de 2023
Fecha de terminación vigente	31 de octubre de 2023

3.1.3.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Demolición de estructuras	m³	93.60	$174.053,76	$16.291.431,94
Remoción de alcantarillas	m	84.00	$88.439,54	$7.428.921,36
			Sub- total	**$23.720.353,3**
Construcción pavimento rígido				
Excavación de la explanación, canales y prestamos (incluye retiro de material)	m3	7599,75	$ 9,992.33	$ 75,939,209.93
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/km	65357,85	$ 1,684.83	$ 110,116,866.42
Mejoramiento de la subrasante con adición de material	m3	1174,51	$ 109,109.10	$ 128,149,729.04
Sub base granular clase b	m3	2062,50	$ 181,940.55	$ 375,252,384.38
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	21100,67	$ 9,855.75	$ 207,962,928.35
Pavimento en concreto rígido Mr= 4.1 MPa	m3	2612,50	$ 823,981.88	$ 2,152,652,661.50
Bordillo en concreto 21 MPa vaciado in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	ml	5000,00	$ 71,640.11	$ 358,200,550.00
			Sub- total	**$3,408,274,329.61**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	1012,00	$ 32,540.12	$ 32,930,601.44
Relleno para estructuras con material de recebo	M3	402,50	$ 101,368.86	$ 40,800,966.15
Relleno con material proveniente de la excavación	M3	172,50	$ 13,509.53	$ 2,330,393.93
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	179,40	$ 821,087.76	$ 147,303,144.14
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg	13340,00	$ 9,855.75	$ 131,475,705.00

Concreto resistencia 14 MPa (F)	M3	18,40	$ 675,707.99	$ 12,433,027.02
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior (incluye atraque con sub base granular)	ML	161,00	$ 957,967.62	$ 154,232,786.82
			Sub- total	**$521,506,624.5**
Construcción de filtro				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	753,12	$ 32,540.12	$ 24,506,615.17
Material granular drenante	M3	740,40	$ 198,796.81	$ 147,189,158.12
Geotextil NT 1800 resistencia a la tensión 470 N	M2	5491,50	$ 6,069.37	$ 33,329,945.36
Tubería perforada de 4 pulgadas	ML	1569,00	$ 34,094.35	$ 53,494,035.15
			Sub- total	**$258,519,753.80**
Señalización y seguridad vial				
Línea de demarcación con pintura en frio (amarilla o blanca)	ml	7499,00	$ 2,512.29	$ 18,839,662.71
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo X(75x75)	Und	51	$ 652,493.24	$ 33,277,155.24
			Sub- total	**$ 52,116,817.95**
			Sub total básico de obra (A)	$4,264,137,879
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 42,774,034,00
			Valor total A+B+AIU	**$4,306,911,913**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.4 SUCRE 1769 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	484-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 1.078.384.354

Nombre del Contratista	CONSORCIO SUCRE 22
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	1 de febrero 2023
Acta de inicio	16 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial	16 de septiembre de 2023

3.1.4.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de placa huella				
Sub base granular clase C	m³	577,07	$190.127,00	$109.717.020,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	610,00	823.776,00	$502.503.360,00
Concreto resistencia 14 MPA (G) (ciclópeo)	m³	227,00	541.940,00	$123.020.380,00
Acero de refuerzo Fy = 420 MPa	kg	20041,90	$ 9.942,00	$199.256.567,00
Sello de juntas con material bituminoso	m	2564,77	$ 4.096,00	$10.505.280,00
Sub base granular clase C	m³	577,07	$190.127,00	$109.717.020,00
			Sub- total	**$945.002.607,00**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m³	358,00	$36.671,00	$13.128.218,00
Acero de refuerzo Fy = 420 MPA	m³	3474,00	$ 9.942,00	$ 34.538.508,00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Incluye atraque con sub base granular)"	m	36,00	$870.626,00	$31.342.536,00
Concreto resistencia 14 MPa (F)	m³	1,00	$627.509,00	$627.509,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	56,00	$823.776,00	$46.131.456,00
			Sub- total	**$125.768.227,00**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1.711.197,00	$ 1.711.197,00
			Sub- total	**$ 1.711.197,00**
			Sub total básico de obra (A)	$1.072.482.031,00
Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)				$ 7.517.969,00
			Valor total A+B+AIU	**$1.080.000.000,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%

- Utilidad U:5%
- AIU:30%

3.1.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 005-003-15.05/059
Objeto del Contrato de Obra	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 3.478.131.956
Nombre del Contratista	CONSORCIO ONIX CCM
Representante legal	JHANER SEGOVIA QUINTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	13 de diciembre de 2022
Acta de inicio	25 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial	25 de septiembre de 2023

3.1.5.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	142	$ 181,764.00	$ 25,810,488.00
Remoción de alcantarillas	ml	89	$ 81,042.00	$ 7,212,738.00
Excavaciones varias en roca en seco	m3	86	$ 91,174.00	$ 7,840,964.00
			Sub- total	**$ 40,864,190.00**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C SBG-50	m3	950	$ 311,091	$ 295,536,450
			Sub- total	**$ 295,536,450**
Estructura de pavimento				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	102	$ 24,000	$2,448,000.00
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ	m3	690	$ 765,385	$528,115,650
Concreto resistencia 14MPa (f) - Ciclópeo	m3	445	$ 554,024	$246,540,680
Defensa metálica	m	12	$ 218,922	$2,627,064
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	63,500	$ 9,700	$615,950,000
			Sub- total	**$1,395,681,394**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	2350	$ 24,000	$ 56,400,000

Excavaciones varias en roca en seco		285	$ 91,174	$ 25,984,590
Relleno para estructuras con recebo	m3	538	$ 204,226	$ 109,873,588
Concreto resistencia 28MPa (C) mezcla In Situ	m3	80	$ 1,036,426	$ 82,914,080
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	903	$ 765,385	$ 691,142,655
Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	5	$ 727,128	$ 3,635,640
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	37,500	$ 9,700	$ 363,750,000
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	180	$ 868,679	$ 156,362,220
Relleno de gravilla	m3	87	$ 269,491	$ 23,445,717
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	826	$ 10,205	$ 8,429,330
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	393	$ 38,199	$ 15,012,207
			Sub- total	**$ 1,536,950,027**
Obras de estabilización				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 24,000	$ 3,600,000
Relleno para estructuras con recebo	m3	73	$ 204,226	$ 14,908,498
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	52	$ 765,385	$ 39,800,020
Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	2	$ 727,128	$ 1,454,256
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	7,923	$ 9,700	$ 76,853,100
Relleno de gravilla	m3	15	$ 269,491	$ 4,042,365
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	120	$ 10,205	$ 1,224,600
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	26	$ 38,199	$ 993,174
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m3	24	$ 730,253	$ 17,526,072
			Sub- total	**$ 160,402,085**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con tablero en lámina retro reflectiva tipo IX (75 x 75) cm	m3	30	$ 730,253	$ 21,907,590
			Sub- total	**$ 21,907,590**
			Sub total básico de obra (A)	$3,445,219,240
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$32,912,716
			Valor total A+B+AIU	**$3,478,131,956**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%

- Imprevisto I:5%
- Utilidad U:5%
- AIU:30%

3.1.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 004-003-15.05/058
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 1.063.184.929
Nombre del Contratista	CONSORCIO PH CHALGUAYACO
Representante legal	HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
Fecha suscripción Contrato de obra	13 de diciembre de 2022
Acta de inicio	3 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial	3 de septiembre de 2023

3.1.6.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	27,13	$ 153,105	$ 4,153,828
Remoción de alcantarillas	ml	44	$ 55,477	$ 2,444,705
			Sub- total	**$ 8,598,533**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C	m3	573	$ 258,200	$ 147,915,292
			Sub- total	**$ 147,915,292**
Estructura de pavimento				
Excavaciones manuales para riostras de placa huella, incluye transporte	m3	48	$ 26,725	$1,295,460
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ (Huellas, riostra, cunetas)	m3	597	$ 715,730	$427,201,113
Concreto resistencia 14MPa - Ciclópeo	m3	207	$ 544,008	$112,672,163
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	22,975	$ 9,843	$226,143,564
			Sub- total	**$767,312,300**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	392	$ 26,725	$ 110,481,446

(incluye retiro)				
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	5,255	$ 9,843	$ 51,726,410
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	62	$ 817,200	$ 50,416,173
			Sub- total	**$ 112,624,029**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	m3	24	$ 746,991	$ 17,556,081
			Sub- total	**$ 17,556,081**
			Sub total básico de obra (A)	$ 1,052,006,235
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 110,520,062
			Valor total A+B+AIU	**$ 1,062,526,297**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	F1-F14-289-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 1.799.782.602
Nombre del Contratista	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
Fecha suscripción Contrato de obra	21 de diciembre de 2022
Acta de inicio	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial	11 de noviembre de 2023

3.1.7.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				

Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	440.00	$ 41,548.00	$ 18,281,120.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	206.00	$ 17,079.00	$ 3,518,274.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 992,001.00	$ 77,376,078.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 796,225.00	$ 6,369,800.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	5789.00	$ 9,553.00	$ 55,302,317.00
Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900mm de diámetro interior	ml	70.00	$ 978,174.00	$ 68,472,180.00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Construcción de Placa Huella				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	803.49	$ 41,548.00	$ 33,383,403.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	484.96	$ 17,079.00	$ 8,282,632.00
Subbase granular tipo C	m	769.09	$ 405,707.00	$ 312,025,197.00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	13.90	$ 796,225.00	$ 11,067,528.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	615.76	$ 992,001.00	$ 610,834,536.00
Concreto resistencia 14 MPA (G) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	223.94	$ 703,683.00	$ 157,582,771.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	m3	27,059.67	$ 9,553.00	$ 258,501,028.00
Sello para juntas	m3	6,978.00	$ 6,405.00	$ 44,694,090.00
			Sub- total	**$1,436,371,185.00**
Construcción de filtro				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	20.40	$ 41,548.00	$ 847,579.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	132.40	$ 9,958.00	$ 1,318,439.00
Tubería plástica tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	34.00	$ 41,853.00	$ 1,423,002.00
Relleno con material filtrante	m3	20.40	$ 353,549.00	$ 7,212,400.00
			Sub- total	**$ 10,801,420.00**
Construcción muro de contención				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	129.03	$ 41,548.00	$ 5,360,938.00
Relleno con material filtrante	m3	18.34	$ 353,549.00	$ 6,484,089.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37.35	$ 992,001.00	$ 37,051,237.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	2.10	$ 796,225.30	$ 1,672,073.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	4,862.28	$ 9,553.00	$ 46,449,361.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	15.03	$ 41,853.00	$ 629,051.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 50,8MM	ml	15.73	$ 23,880.00	$ 375,632.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	121.13	$ 9,958.00	$ 1,206,213.00
Rellenos para estructuras con suelo	m3	41.26	$ 17,079.00	$ 704,680.00
			Sub- total	**$ 99,933,274.00**
Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	6.00	$ 637,719.00	$ 3,826,314.00
			Sub- total	**$ 3,826,314.00**
Elementos de bioseguridad				
Elementos bioseguridad	gl	1	$1,482,535.00	$ 1,482,535.00
			Sub- total	**$ 1,482,535.00**

Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1	$17,766,423.00	$ 17,766,423.00
			Sub- total	**$ 17,766,423.00**
			Sub total básico de obra (A)	$1,799,500,920.00
			Valor IVA consultoría (c)	$ 281,682.00
			Valor total A+B+C+AIU	**$1,799,782,602.00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	93-2023
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CH\LCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 795.011.198
Nombre del Contratista	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
Fecha suscripción Contrato de obra	14 de marzo de 2023
Acta de inicio	4 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial	4 de noviembre de 2023

3.1.8.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Subbase granular tipo C	m3	336.15	$445,142	$ 149,634,483
Sello asfaltico para juntas	ml	3240.00	$3,105	$ 10,060,200
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	243.45	$46,140	$ 11,232,783
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	74.70	$15,496	$ 1,157,551
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	250.45	$1,020,185	$ 255,505,333
Concreto resistencia 14 MPa (G) ciclópeo	m3	104.00	$705,577	$ 73,380,008
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	12501.56	$9,618	$ 120,240,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	12.90	$714,961	$ 9,222,997
			Sub- total	**$ 630,433,359**
Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	176.00	$46,140	$ 8,120,640
Relleno para estructuras con suelo	m3	82.40	$15,496	$ 1,276,870
Concreto 21MPa (D)	m3	31.23	$1,020,185	$ 31,860,378
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	3.22	$714,961	$ 2,302,174
Acero de Refuerzo Fy 60.000 PSI.	kg	2,315.00	$9,618	$ 22,265,670
Tubería de concreto reforzado clase II de 900mm de diámetro interior	ml	28.00	$873,572	$ 24,460,016
			Sub- total	**$ 90,285,748**
Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	4.00	$ 628,120	$ 2,512,480
			Sub- total	**$ 2,512,480**

Revisión de estudios y diseños				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19/10/2020	gl	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000
			Sub- total	**$ 5,000,000**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1,287,132	$1,287,132
			Sub- total	**$1,287,132**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1%		$ 7,309,314
			Sub- total	**$ 7,309,314**
Mantenimiento vial				
Conformación de calzada existente	m2	6,665	1,130	$7,531,450
Afirmado con material de la zona	m3	333	148,520	$49,457,160
			Sub- total	**$ 56,988,6610**
			Sub total básico de obra (A)	$793,816,643
			Valor IVA consultoría (B)	$1,194,555
			Valor total A+B+AIU	**$795,011,198**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.9 INZA 1983 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Inza, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	141 DE 2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN CORCONDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –

	INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 608.231.289
Nombre del Contratista	CONSORCIO INZA 2022
Representante legal	JAMES PIAMBA HOYOS
Fecha suscripción Contrato de obra	27 de septiembre de 2022
Acta de inicio	28 de abril de 2023
Prorroga 1	29 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial	28 de julio de 2023
Fecha de terminación vigente	14 de septiembre de 2023

3.1.9.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCION 1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de alcantarillas				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	176	$ 46,500	$ 8,184,000
Rellenos para estructuras con suelo	M3	108	$ 44,980	$ 4,857,840
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	31.20	$ 746,518	$ 23,291,362
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	3	$ 640,825	$ 2,050,640
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	2316	$ 8,563.00	$ 19,831,908
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	28	$ 683,987	$ 19,151,636
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	28	$ 518,395.00	$ 14,515,060
Geotextil	M2	381.59	$ 11,905.00	$ 4,542,829
Material granular drenante	M3	55.26	$ 180,864	$ 9,994,545
			Sub- total	**$ 106,419,819**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	53.76	$ 46,811	$ 2,516,559
Rellenos para estructuras con suelo	M3	34	$ 44,980	$ 1,529,320
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	80.48	$ 746,518	$ 60,079,769
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	2.40	$ 640,825.00	$ 1,537,980
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclópeo)	M3	53.76	$ 449,265.00	$ 24,152,486
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	7759	$ 8,563.00	$ 66,440,317
Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	31.36	$ 763,510	$ 23,943,674
Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	M3	11.0	$ 846,548	$ 9,312,028
Subbase Granular Clase C	M3	180.00	$ 231,636	$ 41,694,480
			Sub- total	**$ 231,206,613**

Revisión y/o ajuste de diseños base Cartilla Colombia rural				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19-oct-2020	GLB	1.00	$ 6,098,780	$ 6,098,780
			Sub- total	**$ 6,098,780**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1,853,627	$ 1,853,627
			Sub- total	**$ 1,853,627**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
Conformación de calzada	M2	58,500.00	$ 1,119	$ 65,461,500
Afirmado	M3	2,300.00	$ 67,920	$ 156,216,000
Excavaciones varias sin clasificar	M3	32.00	$ 47,691	$ 1,526,112
Rellenos para estructuras con suelo.	M3	6.00	$ 44,989	$ 269,934
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	12.00	$ 746,667	$ 8,960,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	1.00	$ 640,953	$ 640,953
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	920.00	$ 8,565	$ 7,879,800
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6.00	$ 683,987	$ 4,103,922
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	21.00	$ 518,395.00	$ 10,886,295
			Sub- total	**$ 255,944,520**
			Sub total básico de obra (A)	$ 601,523,359,49
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5,201,230
			Valor IVA (C)	$ 1,506,700
			Valor total A+B+AIU	**$ 608,231,289,49**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	484-2022
Objeto del Contrato de Obra	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER

	DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 912.367.379
Nombre del Contratista	CONSORCIO VIAS RURAL 2022
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	7 de septiembre de 2022
Acta de inicio	1 de junio de 2023
Fecha de terminación inicial	1 de octubre de 2023

3.1.10.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción y recuperación de alcantarillas				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	338,00	$ 37.22	$12.581.827,00
Rellenos para estructuras con material recebo	m3	194,12	$ 65.42	$12.700.019,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	74,90	$ 626.36	$46.914.327,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	8,00	$ 457.30	$3.658.428,00
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	5.629	$ 7.45	$41.959.131,00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	59,00	$ 668.04	$39.414.335,00
			Sub- total	**$ 157.228.067,00**
Construcción muro en concreto reforzado				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	285,98	$ 37.22	$10.645.417,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	208,70	$ 65.42	$13.653.894,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	58,50	$ 626.36	$36.642.031,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	4,10	$ 457.30	$1.874.945,00
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	2.969	$ 7.45	$22.131.109,00
			Sub- total	**$ 84.947.396,00**
Construcción muro en gaviones				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	120,00	$ 37.22	$4.466.921,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	314,00	$ 65.42	$20.542.994,00
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	12,00	$ 359.42	$4.313.029,00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: Recubrimiento de Zinc Galvanizado	m3	60,00	$ 329.85	$19.791.240,00
			Sub- total	**$ 49.114.184,00**
Construcción muro en concreto reforzado				

Excavaciones varias en material común en seco	m3	730,00	$ 37.22	$27.173.769,00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	219,00	$ 65.42	$14.327.757,00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	238,00	$ 626.36	$149.073.561,00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	55,00	$ 457.30	$25.151.695,00
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	80,00	$ 359.42	$28.753.527,00
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	16.690,00	$ 7.45	$124.408.287,00
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	104,00	$ 694.13	$72.189.146,00
Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	1.216,00	$ 69.98	$85.095.192,00
Subbase Granular Clase A	m3	791,00	$ 143.74	$ 113.694.153,00
Excavaciones varias en material común en seco	m3	730,00	$ 37.22	$27.173.769,00
			Sub- total	**$ 639.867.087,00**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 2.820.000	$ 2.820.000
			Sub- total	**$ 2.820.000**
			Sub total básico de obra (A)	$ 933.976.734,00
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5.487.466,00
			Valor IVA (C)	$ 535.800,00
			Valor total A+B+AIU	**$ 940.000.000,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.11 PUERTO TEJADA 2496 – CAUCA

A la fecha del presente informe, el contrato asociado al municipio de Puerto Tejada no ha sido adjudicado.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

De acuerdo con lo establecido en el Manual De Interventoría Obra Pública, el contratista implementador deberá efectuar la entrega en medio magnético los siguientes documentos, previo a la suscripción de la orden de inicio:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Copia del documento de aprobación de garantías.
- Contrato suscrito entre Entidad municipal y contratista.
- Carpeta que contenga la información y documentación de la Etapa Precontractual (Pliegos de Condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.).
- Programa de obra e inversión.
- Los contratos que cuenten con anticipo, deben presentar la documentación respectiva de constitución de FIDUCIA y demás requeridos.
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

Adicionalmente, dando cumplimiento a VII. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR "El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra"

- Entrega de hojas de vida del personal profesional
- Gestión municipal y/o certificación programa de Reintegración y Reincorporación
- Entrega de documentos mínimos para la maquinaria
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Gestión municipal y/o certificación para el programa de generación de empleo
- Instalaciones provisionales
- Documentos del laboratorio toma de control de calidad
- Plan de calidad
- Plan de Manejo de Tránsito - PMT
- Certificación inventario de vías publicas
- Realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los

planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG
- Informe, Datos crudos de campo, capas geográficas en formato shapefile con posición original
- Plan de Gestión Social - PGS
- Presentar protocolo bioseguridad a la entidad, ARL y entes territoriales
- Plan Gestión Ambiental
- Estudios y diseños
- Instalación Valla Informativa

3.2.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella y afirmado), en cuanto a materiales, el contratista realiza actividad de acopio de materiales en la obra, se cuenta con tubería en concreto de 36” la cual es trasladada hasta la obra.

En la vereda el Encanto en municipio de Argelia, se inició la remoción de alcantarillas ubicadas en el K0+255m, Km 1+034m, km 1+556m, Km 2+207m, seguido de actividades de excavaciones varias sin clasificar para las alcantarillas K0+255m, Km 1+034m, km 1+556m, Km 2+207m, instalación de la tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas en las alcantarillas de las abscisas Km 1+034m, km 1+556m, Km 2+207m, para un total de 23 unidades instaladas, seguidamente se ejecutó la actividad de relleno de la estructura sobre los tubos de concreto. Se realiza una conformación de la calzada existente para dar homogeneidad del corredor vial a intervenir, también se inicia con la instalación del afirmado desde el Km 0+000 al Km 0+250m; finalizando las actividades del mes de julio se inicia con la instalación de la sub base granular en los tres tramos asignados para placa huella, un total de 560 ml aproximadamente.

3.2.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), debido a que no se ha suscrito el ACTA DE INICIO, sin embargo, en comité virtual el día 24 de julio donde estuvieron presentes tanto el contratista, supervisor de interventoría, representantes del municipio e interventoría, se dieron directrices para subsanar la documentación contractual requerida y de esta manera poder dar inicio a las obras del contrato. Se espera que para el próximo periodo se pueda iniciar con la obra.

3.2.3 SUCRE 1866 – CAUCA

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), en cuanto a materiales, el contratista realiza actividad de acopio de materiales en la obra.

Se realiza actividad de remoción de alcantarillas existentes, en este mes se intervinieron un total de 5 alcantarillas, consigo las excavaciones varias sin clasificar de las alcantarillas existentes ALC3, ALC 4, ALC 5, ALC6 Y ALC 7, seguidamente se perfila la excavación, para proceder al encofre de las obras de encole y descole de la alcantarilla ALC 2 y ALC3, corte, figuración e instalación del acero de refuerzo de las obras de descole de la ALC2 y ALC 3, fundición de concreto 21 Mpa de la obra de descoles de la alcantarilla ALC 2, fundición de concreto 21 Mpa de la obra de encole de la alcantarilla ALC 3, elaboración de tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas para un total de 20 tubos aproximadamente.

3.2.4 SUCRE 1769 – CAUCA

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), en cuanto a materiales, el contratista realiza actividad de acopio de materiales en la obra.

El contratista realizo actividades de replanteo para iniciar con la construcción de alcantarillas, se inicia la construcción de la alcantarilla K0+216 donde instalo 6 tubos y realizo el atraque para contener la calzada existente, realizó también la excavación e instalación de tubos de la alcantarilla K0+400, inician con actividades de explanación y excavación de la calzada con el fin de instalar posteriormente la subbase granular y construcción de la placa huella, se funde estructura de entrada y salida de las alcantarillas K0+216 y K0+400, se instalaron los tubos de la alcantarilla K0+711.

3.2.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

Para este periodo se desarrollaron actividades de instalación de acero de refuerzo y formaleta de poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla K0+172.65 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨, se realizó la construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36”, la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa. (huellas y vigas riostras) entre las abscisas k0+037.74 - k0+143.38, instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas k0+037.74 - k0+169.78, también la construcción de bordillo cuneta del lado derecho entre las abscisas k0+037.74 –

k0+090.55 y finalmente la construcción de bordillo cuenta lado derecho entre las abscisas k0+000 – k0+090.55.

3.2.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

Durante el periodo de julio se da viabilidad al acta de modificación que aprueba la ejecución de actividades como construcción de filtro y demolición en roca necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.
El contratista realiza actividades de excavación para la construcción de filtro, demolición de roca y excavaciones para la aplicación de subbase.

3.2.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

En este periodo se realizaron actividades de excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36¨ de concreto reforzado en las alcantarillas No. 6, No. 7, No. 8, No. 9 y su posterior construcción de relleno compactado. Se realizó la instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No 9 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨, fundición de concreto de 21 Mpa, poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8 y No. 9 y finalmente el contratista realizó actividad de transporte y acopio de material de Sub base granular clase C.

3.2.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

En este periodo se realizaron actividades de conformación de calzada existente con maquinaria especializada (motoniveladora y vibro compactador) correspondiente al capítulo mantenimiento vial del presupuesto contractual, también se realizó la instalación de afirmado en puntos específicos a lo largo del corredor vial en intervención correspondiente al capítulo mantenimiento vial de las obligaciones contractuales. Se lleva a cabo excavaciones varias sin clasificar correspondientes a la ampliación de calzada (5 metros) a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella, relleno con suelo de excavación a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella y finalmente se realizó el transporte, extensión y compactación de material de subbase clase C entre las abscisas K0+185 – K0+415.

3.2.9 INZA 1983 – CAUCA

Durante el periodo se realiza una visita el día 6 de julio al punto de obra para placa huella y tramo para mejoramiento, se evidencia trabajos de mantenimiento y de forja de acero para la placa huella. De igual manera en tramo de placa huella se evidencia puntos críticos para el tránsito de vehículos.
El día 10 de julio se realizó una reunión presencial en conjunto con el contratista, municipio e interventoría, posteriormente se realizó una visita a punto de obra el día 14 de julio; El día 18 de julio se convoca a comunidad, contratista, interventoría y municipio para una reunión presencial en el municipio de Inzá para tratar inconformidades con respecto al contratista, pero no es posible el desplazamiento por deslizamientos en la vía Popayán- Inzá. Se realiza sección virtual con comunidad, contratista, interventoría y municipio el 18 de julio. El contratista ha desarrollado actividades correspondientes a la instalación de tubería para alcantarillas.

3.2.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768– CAUCA


Para este periodo se realiza una visita a lugar de obra el día 7 de julio donde se evidencia que se están realizando actividades de excavación e instalación de tubería para alcantarillas, posteriormente el 17 de julio y se convoca a contratista, comunidad, interventoría y municipio por inconvenientes presentados con la comunidad por los cierres de la vía esto por las actividades realizadas en la obra. Finalmente se reporta el avance de obra del contratista ya que ejecutó la instalación de la tubería completa para el total de las alcantarillas, excavación para el filtro, y trabajos de acero para alcantarillas.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Para el presente informe se actualiza la condición de ítems no previstos del municipio de Bolívar convenio 1750, quienes presentan un acta de modificación de costos 1, de las siguientes actividades:

ITEMS NO PREVISTOS							
	N.P.01	210.1.1		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3		$ 24,157.00
	N.P.02	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		$ 65,562.00
	N.P.03	211.1		REMOCION DE DERRUMBES	M3		$ 17,057.00
	N.P.04	610.2		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		$ 93,328.00
	N.P.05	630.1.4.1		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS)	M3		$ 835,116.00
	N.P.06	673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3		$ 252,123.00
	N.P.07	673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500	M2		$ 9,913.00
	N.P.08		IP	TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 100 MM	ML		$ 36,057.00

Se adjunta el acta de modificación de costos:

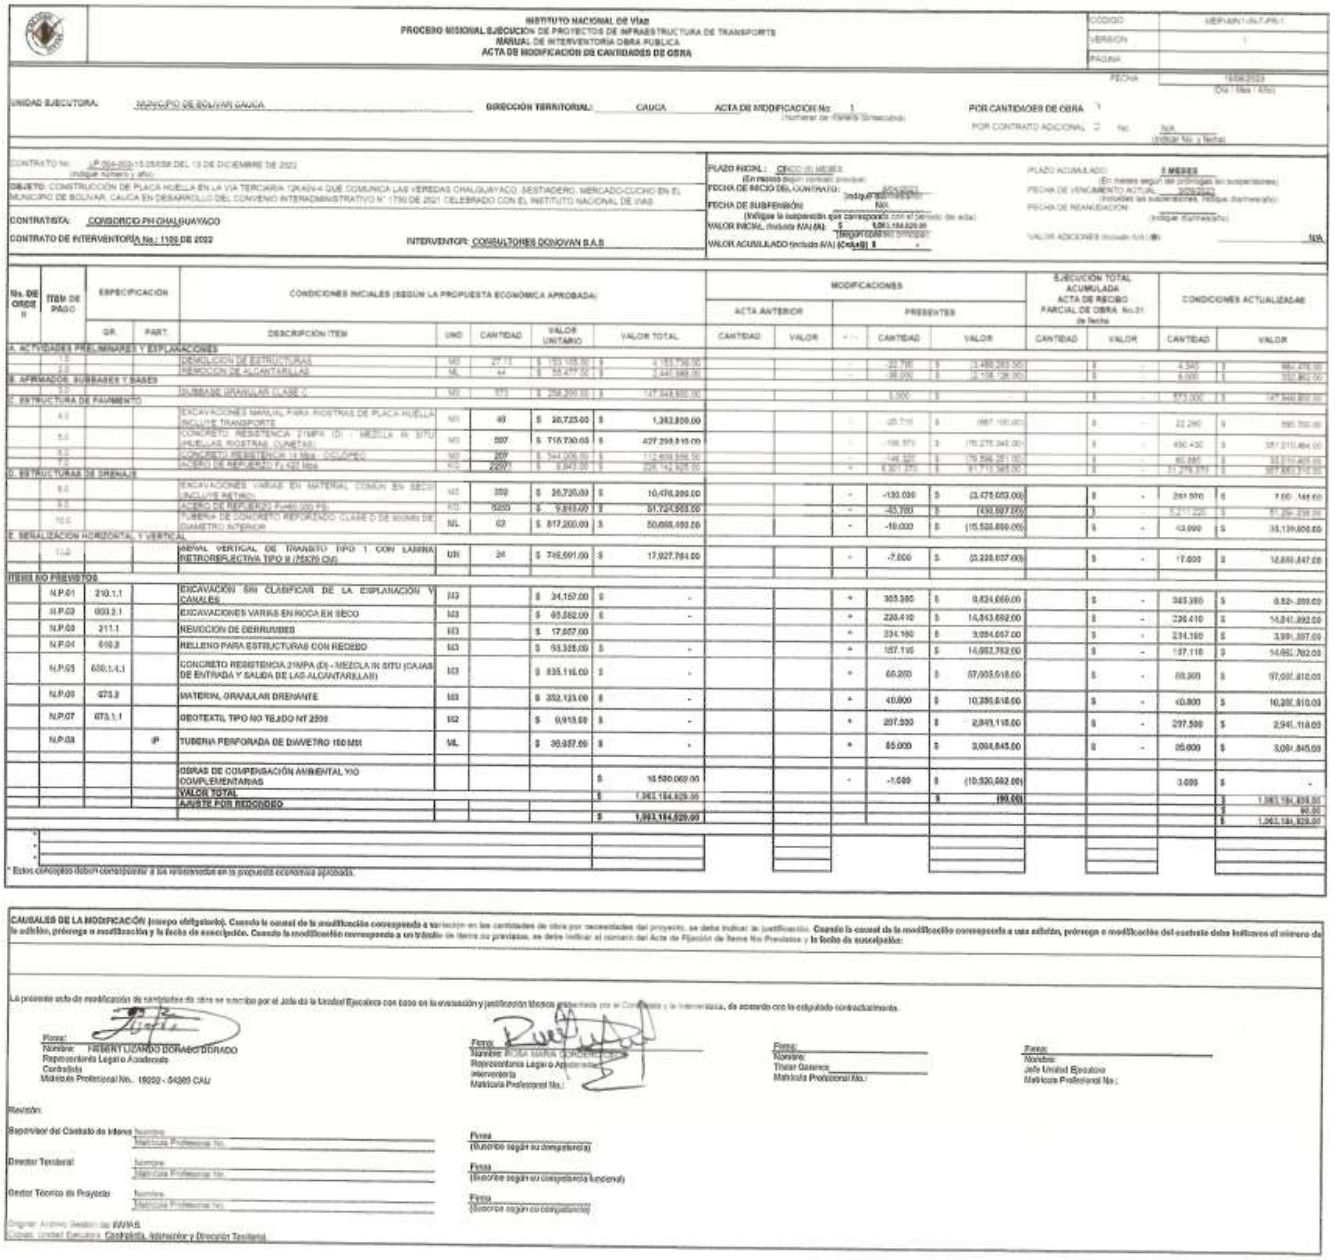

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — ACTA DE MODIFICACIÓN No: 1 — POR CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No: LP-004-2021-15 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA0I4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, MESTADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022 — INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES — PLAZO ACUMULADO: 2 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 1,063,184,629.00 — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($): $ 1,063,184,629.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($): N/A

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACTA ANTERIOR VALOR	MODIFICACIONES PRESENTES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.21 de fecha CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.21 de fecha VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
	1.3			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	27.13	$ 153,135.00	$ 4,153,756.55			-	22.795	$ 13,480,283.00		$ -	4.340	$ 660,476.00
	1.4			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	44	$ 55,477.00	$ 2,440,988.00			-	36.200	$ 18,156,126.00		$ -	8.000	$ 532,862.00
B. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES																	
	3.0			SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	975	$ 258,200.00	$ 147,548,850.00			-	5.000	$ -		$ -	971.000	$ 147,548,850.00
C. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
	4.0			EXCAVACIONES MANUAL PARA HUELLAS DE PLACA HUELLA INCLUYE TRANSPORTE	M3	49	$ 20,725.00	$ 1,383,800.00			-	25.715	$ (987,100.00)		$ -	22.285	$ 850,700.00
	5.0			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (HUELLAS ROSETAS CUNETAS)	M3	597	$ 716,730.00	$ 427,298,810.00			-	106.571	$ 76,375,340.00		$ -	490.429	$ 351,211,464.00
	5.0			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - CICLOPEO	M3	207	$ 544,006.00	$ 112,609,242.00			-	146.322	$ 79,596,261.00		$ -	60.687	$ 33,012,981.00
	7.0			VALERO DE REFLEXIVO Fy 420 MPa	KG	22007	$ 6,943.00	$ 152,753,801.00			-	6.301.370	$ 41,713,345.00		$ -	15.705.370	$ 111,040,456.00
D. ESTRUCTURAS DE DRENAJE																	
	8.0			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO INCLUYE RETIRO	M3	359	$ 28,720.00	$ 10,476,080.00			-	-130.000	$ (3,475,053.00)		$ -	261.970	$ 7,001,165.00
	9.0			ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	5203	$ 9,813.00	$ 51,724,903.00			-	-43.760	$ (430,007.00)		$ -	5.211.220	$ 51,294,896.00
	10.0			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE C DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	62	$ 817,200.00	$ 50,666,400.00			-	-19.000	$ (15,526,800.00)		$ -	43.000	$ 35,139,600.00
E. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL																	
	11.0			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO II (75X75 CM)	UN	24	$ 745,001.00	$ 17,927,784.00			-	-7.000	$ (5,215,007.00)		$ -	17.000	$ 12,686,847.00
ITEMS NO PREVISTOS																	
	N.P.01	210.1.1		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3		$ 24,157.00	$ -			+	303.380	$ 9,824,666.00		$ -	303.380	$ 9,824,666.00
	N.P.02	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		$ 65,562.00	$ -			+	226.410	$ 14,843,892.00		$ -	226.410	$ 14,841,892.00
	N.P.03	211.1		DEMOLICION DE DERRUMBES	M3		$ 17,057.00				+	234.160	$ 3,994,657.00		$ -	234.160	$ 3,991,657.00
	N.P.04	600.2		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		$ 93,335.00	$ -			+	157.110	$ 14,662,762.00		$ -	157.110	$ 14,662,762.00
	N.P.05	630.1.4.1		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS)	M3		$ 835,116.00	$ -			+	65.200	$ 57,003,518.00		$ -	65.200	$ 57,003,518.00
	N.P.06	673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3		$ 252,123.00	$ -			+	40.800	$ 10,285,618.00		$ -	40.800	$ 10,285,618.00
	N.P.07	673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500	M2		$ 9,913.00	$ -			+	297.500	$ 2,941,118.00		$ -	297.500	$ 2,941,118.00
	N.P.08		P	TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 150 MM	ML		$ 36,937.00	$ -			+	85.000	$ 3,094,845.00		$ -	85.000	$ 3,091,845.00
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 16,530,092.00			-	-1.000	$ (10,530,092.00)			3.000	$ -
				VALOR TOTAL				$ 1,063,184,629.00					$ (00.00)				$ 1,063,184,629.00
				AJUSTE POR REDONDEO				$ -									$ 00.00
								$ 1,063,184,629.00									$ 1,063,184,629.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Nombre: FREDDY LIZANDO BORAGO DORADO — Representante Legal o Apoderado Contratista — Matrícula Profesional No.: 16202 - 54380 CAU

Firma: Nombre: ROSA MARIA QUINTERO — Representante Legal o Apoderado Interventoría — Matrícula Profesional No.:

Firma: Nombre: — Tilsan Gaviria — Matrícula Profesional No.:

Firma: Nombre: — Jefe Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: — Matrícula Profesional No. — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: — Matrícula Profesional No. — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Director Técnico de Proyectos — Nombre: — Matrícula Profesional No. — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría en cuanto a revisar y aprobar las condiciones estipuladas para el desarrollo de cada uno de los

proyectos, se solicita a los contratistas de obra la entrega de los documentos requeridos para dar inicio a la etapa de construcción.

Durante el periodo del presente informe, se realiza seguimiento a las entregas del contratista respecto a los requerimientos previo a la orden de inicio. Las cuales se listan a continuación:

3.4.1 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	ALMAGUER 1	
CONVENIO	**1749-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	641 del 14 de octubre del 2022
Copia de Registro presupuestal	OK	815 del 29 de diciembre de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	OK	29 de diciembre de 2022
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. F1-F14-289-2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	OK	*Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Póliza de buen manejo del anticipo *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	*Pliego Condiciones
Anticipo	Sin enviar	*Registro Presupuestal

3.4.2 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	ALMAGUER 2	
CONVENIO	**1982-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	642 del 14 de octubre de 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 23 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Póliza de buen manejo del anticipo *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.3 ARGELIA – CAUCA

	ARGELIA	
CONVENIO	**1984-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	636 de 29 de julio de 2022

Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA No. ARG-OBRA-009-2022 DE 7 DE OCTUBRE DE 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica *Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	BOLIVAR 1	
CONVENIO	**1867-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	CONTRATO No. LP 005-003-15.05/059 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento

*Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor		*Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	BOLIVAR 2	
CONVENIO	**1750-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 16 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.6 INZA – CAUCA

INZA

CONVENIO	1983-2021	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	464 del 1 de agosto de 2022
Copia de Registro presupuestal	OK	37 del 10 de octubre de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	Pendiente	Hay una aprobación de pólizas inicialmente con fecha de firma del día 10 de octubre 2022, sin embargo, los amparos ya están vencidos. Se debe actualizar las pólizas teniendo en cuenta el acta de inicio
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	Contrato No. 141 de 2022 del 27 de septiembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.7 MERCADERES – CAUCA

	MERCADERES	
CONVENIO	**1894-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-	Sin enviar	

FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD		
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito el 30 de diciembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.8 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

	SANTANDER DE QUILICHAO	
CONVENIO	**1768-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	Sin enviar	
Copia de Registro presupuestal	OK	1070 del 24 de junio de 2022
Copia del documento de aprobación de garantías	Sin enviar	
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	Contrato suscrito 1 de septiembre de 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato	Pendiente	*Propuesta económica *Registro Presupuestal *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Asignación Supervisor

*Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor		
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.9 SUCRE 1769 – CAUCA

	SUCRE 1	
CONVENIO	**1866-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	693 del 9 de septiembre del 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	Pendiente	RESOLUCION No, 727 del 01 de noviembre de 2022 Resolución falta hoja N 2
Contrato (entidad municipal y contratista)	OK	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

3.4.10 SUCRE 1866 – CAUCA

	SUCRE 2	
CONVENIO	**1769-2021**	
	Estado	**Observaciones**
Copia de la resolución de la autoridad ambiental - PAGA (que se debe ir gestionando y adelantando para la presentación de soportes). Resolución 04001 DE 2013 del invias Se debe radicar ante SMA, formatos MSE-FR-28 y MSE-FR-29. Resolución No. 0472 de 2017 - RCD	Sin enviar	
Copia de Certificado de disponibilidad presupuestales	OK	762 del 20 de octubre del 2022
Copia de Registro presupuestal	Sin enviar	
Copia del documento de aprobación de garantías	OK	RESOLUCION N° 118 del 14 de febrero de 2023
Contrato (entidad municipal y contratista)	Sin enviar	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-090-2023 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 Falta firma del contratista
Carpeta de la etapa de Precontractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.). *Propuesta económica *Pliego Condiciones *Registro Presupuestal *Adjudicación *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento *Audiencia Pliegos *Adendas *Asignación Supervisor	Pendiente	*Propuesta económica *Pólizas Según Contrato *Pólizas de responsabilidad civil *Pólizas de cumplimiento
Programa de obra e inversión	Sin enviar	
Anticipo	Sin enviar	

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan informes semanales del periodo 1 al 31 de marzo de 2022 de los contratos de obra de los convenios en formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3:

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706
- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713
- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720
- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

4.1.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706
-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO		
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	VALOR INICIAL:	$ 958,081,628.00
FECHA DE INICIO:	3 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/7/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 958,081,628.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	18/7/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 287,424,488.40
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 287,424,488.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958,081,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 152,970,913			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 805,110,715			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958,081,628.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 872,649,283.04	91.08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152,970,913.00	15.97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (719,678,370.04)	-75.12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 872,649,283.04	91.08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 172,092,277.00	15.97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (719,678,370.04)	-75.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se firma acta de inicio el 3 de abril de 2023, el porcentaje programado de 91,08 % versus un porcentaje ejecutado de 15,97 %, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 75,12 %, presenta un plan de contingencia aún no está avalado por la interventoría.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 287,424,488.40
Amortizado $	$
Saldo $	$ 287,424,488.40

INDICADOR I/C	
En el mes:	2.17
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 91.08% — Avance o Atraso Físico % -75.12%
Meta Física Ejecutada % 15.97%

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
* Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
* Mantenimiento periódico	M2	1500			Prog		1500		1500	100.0%
					Ejec		1500		1500	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

Vereda el Encanto — Programado: 450 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas
Ejecutado: Se inicia con la excavación de alcantarillas

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de vía
Ejecutado: En esta semana se ejecuta los 1500 m2 de mantenimiento periodico

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-125-2023, se emiten observaciones a la Versión 1 del documento PAGA el 23 de mayo
*Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa
Se recibe resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
2. No hay actividades de obra hasta el momento.
3. Se solicita inicio de las actividades por parte del municipio e interventoría.
4. Menciona la interventoría que el contratista presenta un presunto incumplimiento de contrato, debido a que aún no hay adelanto de las actividades de obra.
5. Se transporta la tubería de 36"al corredor vial.
6. Se inicia con el acopio de material cemento, acero y material granular en el corredor vial.
7. Excavación cuerpo de obra de la alcantarilla 1 y 2
8. Solado de limpieza alcantarilla 1 y alcantarilla 2
9. Instalación de tubería concreto de 36"
10. Conformación de calzada existente corredor vial
11. Excavación de cuerpo de obra, obra de entrada, obra de salida alcantarilla 3 y 4
12. Afirmado tramo inicial
13. Relleno con material de sitio, cuerpo de obra ALC 1, ALC 2, ALC 3 y ALC 4
14. Solicitud de prorroga 45 días por parte del contratista, la interventoría avala el documento

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Programar actividades de obra según lo programado luego del acta se suscripción.
2. Iniciar con la excavación de las 4 alcantarillas del tramo de placa huella.
3. Afiliación del personal que se va a contratar, envió de planillas de seguridad a la interventoría.
4. Iniciar con la excavación de las medias alcantarillas.
5. Encofrado y fundición de obra de salida y obra de entrada ACL 1
6. Encofrado de obras de salida y obra de entrada de ALC 2
7. Relleno con material del sitio, para cuerpo de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

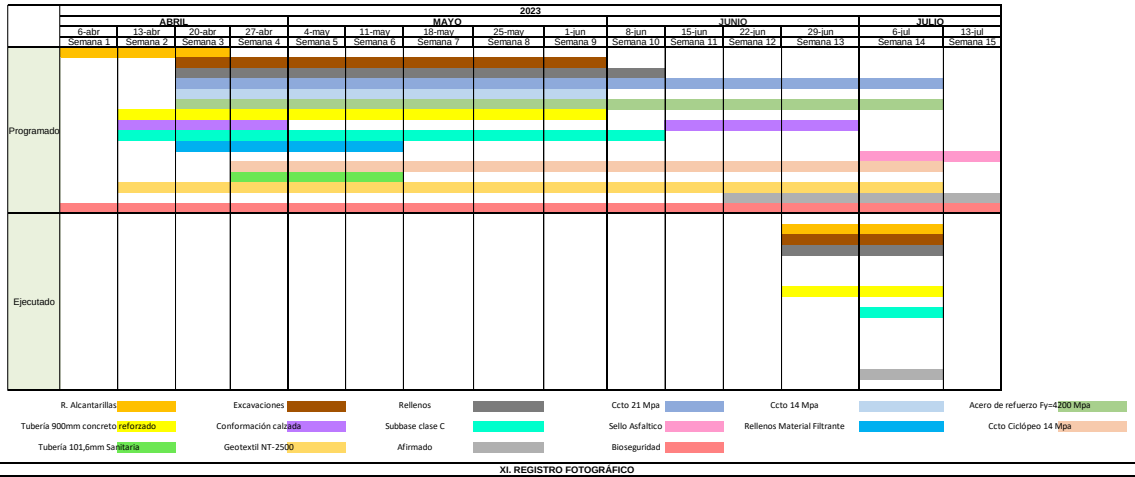

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Acero de refuerzo acopiado


Excavación de alcantarilla ALC 1 obra de entrada


Afirmado de tramo 1

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023



Acopio de material granular



Instalación de tuberia de 36 pulgadas ALC 4



Relleno de cuerpo de obra ALC 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Realizar comité de seguimiento al inicio de obras para tratar definir fecha de entrega de respuesta por parte del Municipio a las observaciones a los estudios y diseños. Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Items contractuales. Revisión de la calidad de los materiales empleados. Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto. Revisión de plan de contingencia.	FIRMA: NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ Matricula Profesional No.: 2520223626O-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 (Numeración consecutiva) del 7/7/2023 al 13/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invías y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMCONSUT SAS		
REPRESENTANTE LEG:	WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO		
CONTRATO No.	ARG-OBRA-009-2022	VALOR INICIAL:	$ 958,081,628.00
FECHA DE INICIO:	3 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/7/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 958,081,628.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/9/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 287,424,488.40
PRORROGA N°1	19/7/2023	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 287,424,488.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958,081,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 282,257,258			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 675,824,370			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 958,081,628.00**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 933,750,989.45	97.46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 282,257,258.00	29.46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (651,493,731.45)	-68.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 933,750,989.45	97.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282,257,258.00	29.46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (651,493,731.45)	-68.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se firma acta de inicio el 3 de abril de 2023, el porcentaje programado de 97,46 % versus un porcentaje ejecutado de 29,46 %, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 68,00 %

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 287,424,488.40
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 287,424,488.40

INDICADOR IIC	
En el mes:	1.28
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografia, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 97,46% — Avance o Atraso Físico %: -68,00%
Meta Física Ejecutada %: 29,46%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100.0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
						Ejec					
*	Mantenimiento periódico	M2	1500			Prog		1500		1500	100.0%
						Ejec		1500		1500	100.0%
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Vereda el Encanto — Programado: 450 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas
Ejecutado: Se inicia con la excavación de alcantarillas

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de vía
Ejecutado: En esta semana se ejecuta los 1500 m2 de mantenimiento periodico

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-125-2023, se emiten observaciones a la Versión 1 del documento PAGA el 23 de mayo
*Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa
Se recibe resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
* No hay actividades de obra hasta el momento.
* Se solicita inicio de las actividades por parte del municipio e interventoría.
* Menciona la interventoría que el contratista presenta un presunto incumplimiento de contrato, debido a que aún no hay adelanto de las actividades de obra.
* Se transporta la tubería de 36"al corredor vial.
* Se inicia con el acopio de material cemento, acero y material granular en el corredor vial.
* Excavación cuerpo de obra de la alcantarilla 1 y 2
* Solado de limpieza alcantarilla 1 y alcantarilla 2
* Instalación de tubería concreto de 36"
* Conformación de calzada existente corredor vial
* Excavación de cuerpo de obra, obra de entrada, obra de salida alcantarilla 3 y 4
* Afirmado tramo inicial
* Relleno con material de sitio, cuerpo de obra ALC 1, ALC 2, ALC 3 y ALC 4
* Solicitud de prorroga 45 días por parte del contratista, la interventoria avala el documento
* Suscripcion de prorroga de tiempo el día 11 de julio 2023. tiempo avalado y aprobado 45 días
* Mantenimiento periodico de la vía
* Conformación de la calzada existente
* Solicitud afiliaciones de personal y planillas pagas de seguridad social del personal en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Programar actividades de obra según lo programado luego del acta se suscripción.
* Afiliación del personal que se va a contratar, envió de planillas de seguridad a la interventoría.
* Encofrado y fundición de obra de salida y obra de entrada ACL 1
* Encofrado de obras de salida y obra de entrada de ALC 2
* Relleno con material del sitio, para cuerpo de obra.
* Entrega de cronograma de actividades, polizas actualizadas teniendo encuenta el tiempo prorrogado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

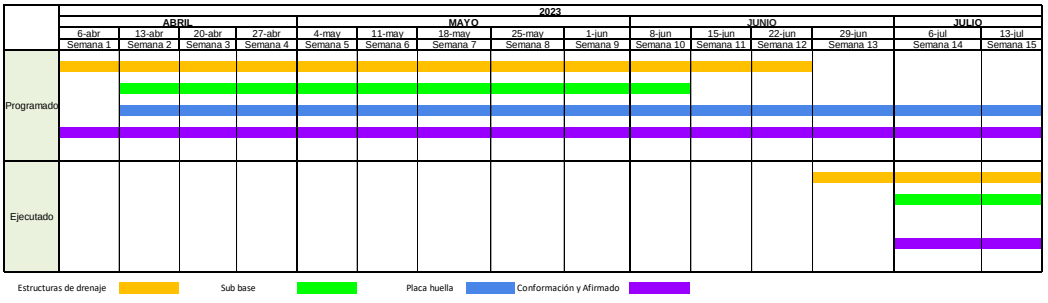

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de la calzada exixtente



Compactación del afirmado



Excavación de la caja de entrada ALC 3

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	



Material acopiado inicio de tramo vial



Conformación de la calzada tramo inicial



Maquinaria amarilla en el frente de obra

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 14/7/2023 al 20/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMCONSUT SAS
REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
CONTRATO No. ARG-OBRA-009-2022 — VALOR INICIAL: $ 958,081,628.00
FECHA DE INICIO: 3 DE ABRIL DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 18/7/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 958,081,628.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/9/2023 — VALOR ANTICIPO: $ 287,424,488.40
PRORROGA N°1 19/7/2023 1/9/2023 45 dias — VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 287,424,488.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958,081,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 282,557,258			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 675,524,370			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958,081,628.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 948,381,479.97	98.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 282,557,258.00	29.49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (665,824,221.97)	-69.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 948,381,479.97	98.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282,257,258.00	29.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (665,824,221.97)	-69.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se firma acta de inicio el 3 de abril de 2023, el porcentaje programado de 98,99 % versus un porcentaje ejecutado de 29,49 %, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 69,5%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 287,424,488.40
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 287,424,488.40

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.38
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 98.99% — Avance o Atraso Físico %: -69.50%
Meta Física Ejecutada %: 29.49%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100.0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
						Ejec					
*	Mantenimiento periódico	M2	1500			Prog		1500		1500	100.0%
						Ejec		1500		1500	100.0%
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

Vereda el Encanto — Programado: 450 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas
Ejecutado: Se inicia con la excavación de alcantarillas, inicio de encofrado de obra de encole ALC 1

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de vía
Ejecutado: En esta semana se ejecuta los 1500 m2 de mantenimiento periodico

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-125-2023, se emiten observaciones a la Versión 1 del documento PAGA el 23 de mayo
*Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa
Se recibe resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
* Se solicita inicio de las actividades por parte del municipio e interventoría.
* Menciona la interventoría que el contratista presenta un presunto incumplimiento de contrato, debido a que aún no hay adelanto de las actividades de obra.
* Se transporta la tubería de 36"al corredor vial.
* Se inicia con el acopio de material cemento, acero y material granular en el corredor vial.
* Excavación cuerpo de obra de la alcantarilla 1 y 2
* Solado de limpieza alcantarilla 1 y alcantarilla 2
* Instalación de tubería concreto de 36"
* Conformación de calzada existente corredor vial
* Excavación de cuerpo de obra, obra de entrada, obra de salida alcantarilla 3 y 4
* Afirmado tramo inicial
* Relleno con material de sitio, cuerpo de obra ALC 1, ALC 2, ALC 3 y ALC 4
* Solicitud de prorroga 45 días por parte del contratista, la interventoría avala el documento
* Suscripcion de prorroga de tiempo el día 11 de julio 2023. tiempo avalado y aprobado 45 días
* Mantenimiento periodico de la vía
* Conformación de la calzada existente
* Solicitud afiliaciones de personal y planillas pagas de seguridad social del personal en obra.
* Se inicia con la perfilación de la excavación de la obra de encole, posteriormente encofrado e instalación de acero de refuerzo losa inferior

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Afiliación del personal que se va a contratar, envió de planillas de seguridad a la interventoría.
* Encofrado y fundición de obra de salida y obra de entrada ACL 1
* Encofrado de obras de salida y obra de entrada de ALC 2
* Relleno con material del sitio, para cuerpo de obra.
* Entrega de cronograma de actividades, polizas actualizadas teniendo encuenta el tiempo prorrogado
* Fundición de obra de encole ALC 1, fundicion de obra de descole ACL 1
* Encofrado de obra de descole, corte, figuración e instalación del acero ALC 2
* Se solicita el cronograma y el flujo de caja actualizado, teniendo en cuenta la prorroga 1, la cual amplio el tiepo en 45 días

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

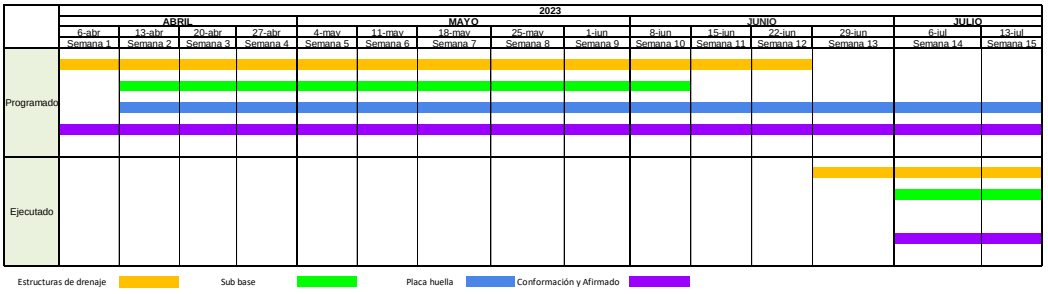

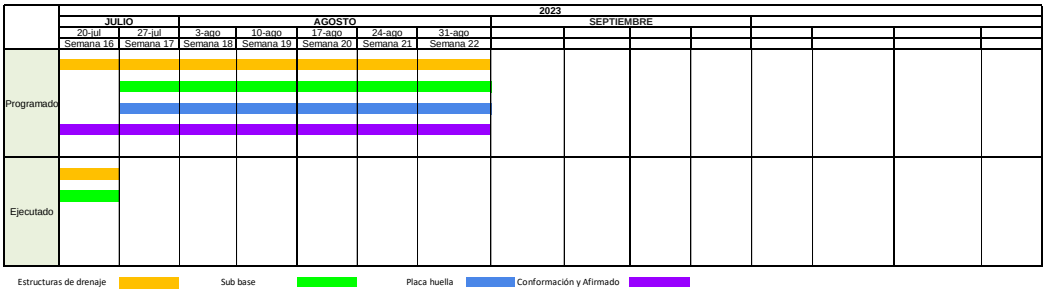

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 1



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 2



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 3



Instalación de tuberia ALC 4



Conformación de la calzada tramo inicial



Material acopiado frente de obra

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 21/7/2023 al 27/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Encanto en el municipio de Argelia – Cauca, se construirá Placa Huella, alcantarillas de 36" tipo Invias y mejoramiento con adición de material.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMCONSUT SAS
REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
CONTRATO No. ARG-OBRA-009-2022
FECHA DE INICIO: 3 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 18/7/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/9/2023
PRORROGA N°1 19/7/2023 1/9/2023 45 días

VALOR INICIAL: $ 958,081,628.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 958,081,628.00
VALOR ANTICIPO: $ 287,424,488.40
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 287,424,488.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 958,081,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 297,032,585			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 661,049,043			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 958,081,628.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 948,381,479.97	98.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 297,032,585.00	31.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (651,348,894.97)	-67.98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 948,381,479.97	98.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282,257,258.00	31.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (651,348,894.97)	-67.98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se firma acta de inicio el 3 de abril de 2023, el porcentaje programado de 98,99 % versus un porcentaje ejecutado de 31,0 %, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 67,98%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 287,424,488.40
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 287,424,488.40

INDICADOR IIC	
En el mes:	1.41
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98.99%
Meta Física Ejecutada %: 31.00%
Avance o Atraso Físico %: -67.98%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	450			Prog	450			450	100.0%
					Ejec					
Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
Mantenimiento periódico	M2	1500			Prog		1500		1500	100.0%
					Ejec		1500		1500	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico	1	
Trompo 2 sacos	1	
Volqueta 7 M3 (2 unidades)	2	
Retroexcavadora Rueda	1	
Rana mecánica	1	
Motoniveladora	1	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda el Encanto — Programado: 450 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado: Perfilación de obra de encole y descole de alcantarilla ALC 1

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Mantenimiento de 1500 M2 de vía
Ejecutado: En esta semana se ejecuta los 1500 m2 de mantenimiento periódico

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....
DISPONIBLE

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES:.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-125-2023, se emiten observaciones a la Versión 1 del documento PAGA el 23 de mayo
*Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa
Se recibe resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
* Se solicita inicio de las actividades por parte del municipio e interventoría.
* Menciona la interventoría que el contratista presenta un presunto incumplimiento de contrato, debido a que aún no hay adelanto de las actividades de obra.
* Se transporta la tubería de 36"al corredor vial.
* Se inicia con el acopio de material cemento, acero y material granular en el corredor vial.
* Excavación cuerpo de obra de las alcantarillas en el Km 0+255m, Km 1+034, Km 1+556m y Km 2+207m.
* Solado de limpieza en las alcantarillas Km 0+255m, Km 1+034, Km 1+556m y Km 2+207m.
* Instalación de tubería concreto de 36"
* Conformación de calzada existente corredor vial
* Excavación de cuerpo de obra, obra de entrada, obra de salida alcantarilla Km 1+556m y Km 2+207m.
* Afirmado tramo inicial
* Relleno con material de sitio, cuerpo de obra en las alcantarillas de las abscisas Km 0+255m, Km 1+034, Km 1+556m, Km 2+207m.
* Suscripción de prorroga de tiempo el día 11 de julio 2023. tiempo avalado y aprobado 45 días
* Mantenimiento periódico de la vía
* Conformación de la calzada existente
* Solicitud afiliaciones de personal y planillas pagas de seguridad social del personal en obra.
* Se inicia con la perfilación de la excavación del encole, posteriormente encofrado e instalación de acero de refuerzo losa inferior alcantarilla Km 2+207m.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Afiliación del personal que se va a contratar, envió de planillas de seguridad a la interventoría.
* Encofrado y fundición de obra de salida y obra de entrada de la alcantarilla Km 2+207m
* Encofrado de obras de salida y obra de entrada de Km 2+207m
* Relleno con material del sitio, para cuerpo de obra.
* Entrega de cronograma de actividades, pólizas actualizadas teniendo encuentra el tiempo prorrogado
* Fundición de obra de encole y descole de la alcantarilla Km 2+207m.
* Encofrado de obra de descole, corte, figuración e instalación del acero de la alcantarilla Km 1+556m.
* Se solicita el cronograma y el flujo de caja actualizado, teniendo en cuenta la prorroga 1, la cual amplio el tiempo en 45 días

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

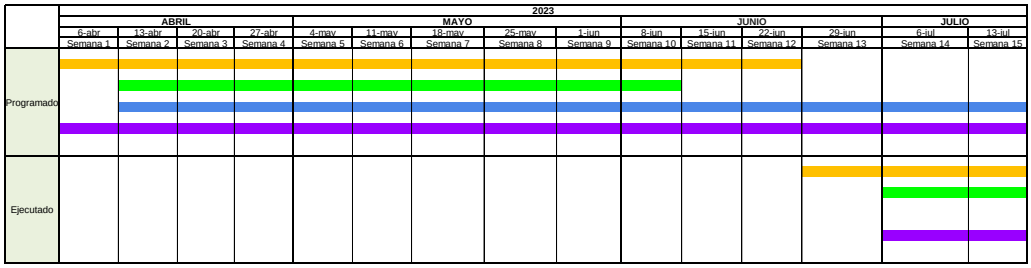

Estructuras de drenaje — Sub base — Placa huella — Conformación y Afirmado



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fundición de solado limpieza descole Km 2+207m


Fundición solado de limpieza inferior encole Km 2+207m


Corte, figuración e instalación de acero descole Km 2+207m


Corte, figuración e instalación de acero descole Km 2+207m


Corte, Figuración e instalación de parrilla losa inferior Km 2+207m


Corte, figuración e Instalación de acero poceta Km 2+207m

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1,124,307,500.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0.00	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1,124,307,500.00
Amortizado $	$	
Saldo $	$	1,124,307,500.00

INDICADOR IFC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%
Meta Física Ejecutada % 0.00%
Avance o Atraso Físico % 0.00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
						Ejec	0			0	
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se desarrolla reunión en la vereda la Despensa con el fin de dar respuesta a oficio emitido por la comunidad con la solicitud de cambiar un tramo de placa huella. Una vez iniciada la reunión se da a conocer que la respuesta es negativa ya que el tramo no se encuentra en el corredor vial a ejecutar, la comunidad manifiesta su descontento e insisten en realizar una solicitud nuevamente con el acompañamiento del secretario de planeación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Al momento de elaboración del informe no se tiene acta de inicio, sin embargo el contratista ha avanzado con actividades administrativas para la agilización del anticipo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco se ha suscrito acta de inicio para la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al Municipio de Mercaderes los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1894-2021 INVIAS y a su vez al contratista, los demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 (Numeración consecutiva) del 7/7/2023 al 13/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1,124,307,500.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0.00	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 0.00%
Meta Física Ejecutada %: 0.00%
Avance o Atraso Físico %: 0.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
					Ejec	0			0	
Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
					Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-176-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se desarrolla reunión en la vereda la Despensa con el fin de dar respuesta a oficio emitido por la comunidad con la solicitud de cambiar un tramo de placa huella. Una vez iniciada la reunión se da a conocer que la respuesta es negativa ya que el tramo no se encuentra en el corredor vial a ejecutar, la comunidad manifiesta su descontento e insisten en realizar una solicitud nuevamente con el acompañamiento del secretario de planeación.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A la fecha no se tiene acta de inicio firmada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco se ha suscrito acta de inicio para la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al Municipio de Mercaderes los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1894-2021 INVIAS y a su vez al contratista, los demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADERES 23		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA		
CONSORCIADOS	FB INGENIEROS SAS (85%) CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%) EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)		
CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1,124,307,500.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0.00	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1,124,307,500.00
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 0.00%
Meta Física Ejecutada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023
*	Alcantarillas	UND	15	15	
*	Placa Huella	ML	1850	1850	
*					
*					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	15			15	100.0%
Ejec	0			0	
Prog	1850			1850	100.0%
Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO		N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-176-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se desarrolla reunión en la vereda la Despensa con el fin de dar respuesta a oficio emitido por la comunidad con la solicitud de cambiar un tramo de placa huella. Una vez iniciada la reunión se da a conocer que la respuesta es negativa ya que el tramo no se encuentra en el corredor vial a ejecutar, la comunidad manifiesta su descontento e insisten en realizar una solicitud nuevamente con el acompañamiento del secretario de planeación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A la fecha no se tiene acta de inicio firmada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco se ha suscrito acta de inicio para la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1
Indicar localización y actividad

FOTO 2
Indicar localización y actividad

FOTO 3
Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al Municipio de Mercaderes los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1894-2021 INVIAS y a su vez al contratista, los demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (85%); CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)

CONTRATO No.: ...
FECHA DE INICIO: ...
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/9/2023

VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00
VALOR ANTICIPO: $ 1,124,307,500.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 0.00	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: ...
PERIODO FACTURADO: ...
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha del presente informe no se tiene acta de inicio del contrato de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 0.00%
Meta Física Ejecutada %: 0.00%
Avance o Atraso Físico %: 0.00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
						Ejec	0			0	
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella. Ejecutado: ...
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: ... Ejecutado: ...
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: ... Ejecutado: ...

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ... — PERMISO MINERO: SI ... NO ... — LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ... — DISPONIBLE ...
UBICACIÓN: ... — PERMISO MINERO: SI ... NO ... — LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO	...	N/A	...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO	...	N/A	...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO	...	N/A	...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO	...	N/A	...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO	...	N/A	...
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO	...	N/A	...
EMISIONES:	SI	...	NO	...	N/A	...
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO	...	N/A	...

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-176-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se desarrolla reunión en la vereda la Despensa con el fin de dar respuesta a oficio emitido por la comunidad con la solicitud de cambiar un tramo de placa huella. Una vez iniciada la reunión se da a conocer que la respuesta es negativa ya que el tramo no se encuentra en el corredor vial a ejecutar, la comunidad manifiesta su descontento e insisten en realizar una solicitud nuevamente con el acompañamiento del secretario de planeación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En comité virtual donde estuvieron presentes todas las partes se dieron directrices para subsanar la documentación contractual requerida y de esta manera poder dar inicio a las obras del contrato.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado actual de los convenios.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay programación de obra, tampoco se ha suscrito acta de inicio para la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al Municipio de Mercaderes los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1894-2021 INVIAS y a su vez al contratista, los demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.3 SUCRE 1866 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA BPIM 2018130101785

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO			REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	258	VALOR INICIAL:	$ 4,306,911,911.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4,306,911,911.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1,292,073,573.30	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,292,073,573.30			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 51,682,943			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,255,228,968			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,316,687,916.93	53.79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51,682,942.90	1.20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,265,004,974.03)	-52.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,316,687,916.93	53.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 51,682,942.90	1.20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2,265,004,974.03)	-52.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023, el porcentaje programado de 53,79% versus un porcentaje ejecutado de 1,2%, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 52,59%, presenta un plan de contingencia aún no está avalado por la interventoría.

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
	$ 29,720,132.28	1.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones. El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,292,073,573.30

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 53.79%
Meta Física Ejecutada % 1.20%
Avance o Atraso Físico % -52.59%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Pavimento rígido	ML	2125			Prog	2125			2125	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100.0%
						Ejec				0	
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado: Se inicia con la excavación de 5 alcantarillas, instalación de tubería y relleno con material de sitio

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra evidenciando inicio de construcción de alcantarillas, se solicita al contratista el envío de actas de vecindad de inicio puesto que ya beben estar entregadas.
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa, como también acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023.
2. Traslado de tubería de concreto 36" pulgadas al frente de la obra.
3. Inicio de la excavación de alcantarillas ALC 1. ALC2, ALC3, ALC4, ALC5.
4. Relleno del cuerpo de la obra ALC1, ALC2, ALC3
5. Instalación de tubería de 36" concreto, en las alcantarillas ALC 1, ALC 2, ALC 3, ALC 4, ALC 5.
6. Solicitud de afiliaciones de personal. (salud, pensión y riesgos).
7. Encofrado y fundición de obra de salida ALC 2.
8. Encofrado y Fundicion de obra de salida ALC 1

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1. Verificar que se cumplan los compromisos acordados en comité.
2. Excavación de alcantarillas y remoción de alcantarillas existentes.
3. Plan de contingencia debido al atraso de las actividades según programación.
4. Inicio de la fundición de concreto 21 Mpa, obras de entrada y salida ALC 1, ALC 2, ALC 3.
5. Inicio de instalación de mejoramiento de la subrasante con adición de material.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

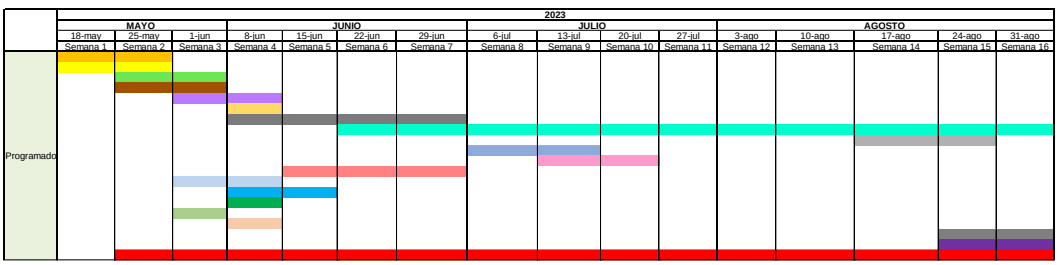

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

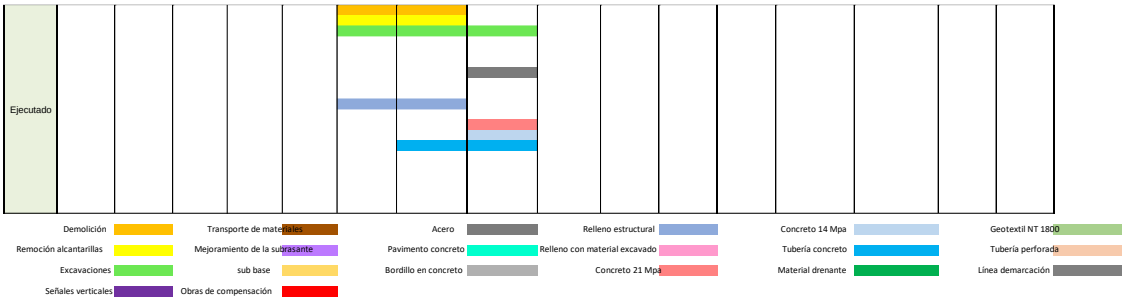

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio de tubería de 36 "



Desencoffre de alcantarilla encole ALC 1



Fundición de obra de entrada ALC 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matricula Profesional No.: 2520236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUOBRAS	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	258	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	16/5/2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 4,306,911,911.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4,306,911,911.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,292,073,573.30	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,292,073,573.30	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 51,926,379			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,254,985,532			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,548,399,777.74	59.17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51,926,378.84	1.21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,496,473,398.90)	-57.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,548,399,777.74	59.17%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 51,926,378.84	1.21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2,496,473,398.90)	-57.96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

Observaciones: Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023, el porcentaje programado de 59,17% versus un porcentaje ejecutado de 1,21%, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 57,96%, presenta un plan de contingencia que se encuentra en revisión por la interventoría.

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1,292,073,573.30
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	1,292,073,573.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	6.95
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 59.17%
Meta Física Ejecutada % 1.21%
Avance o Atraso Físico % -57.96%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rígido	ML	2125			Prog	2125			2125	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100.0%
					Ejec	1			1	4.3%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado: Se inicia con la excavación de 5 alcantarillas, una alcantarilla terminada

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....
UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	DISPONIBLE			
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitd de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria y actas de vecin de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023.
* Traslado de tubería de concreto 36" pulgadas al frente de la obra.
* Inicio de la excavación de alcantarillas ALC 1. ALC2, ALC3, ALC4, ALC5.
* Relleno del cuerpo de la obra ALC1, ALC2, ALC3
* Instalación de tubería de 36" concreto, en las alcantarillas ALC 1, ALC 2, ALC 3, ALC 4, ALC 5.
* Solicitud de afiliaciones de personal. (salud, pensión y riesgos).
* Encofrado y fundición de obra de entrada ALC 2.
* Encofrado y Fundicion de obra de entrada ALC 1.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Verificar que se cumplan los compromisos acordados en comité.
* Excavación de alcantarillas y remoción de alcantarillas existentes.
* Plan de contingencia debido al atraso de las actividades según programación.
* Inicio de la fundición de concreto 21 Mpa, ALC 3, ALC 4
* Inicio de instalación de mejoramiento de la subrasante con adición de material.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

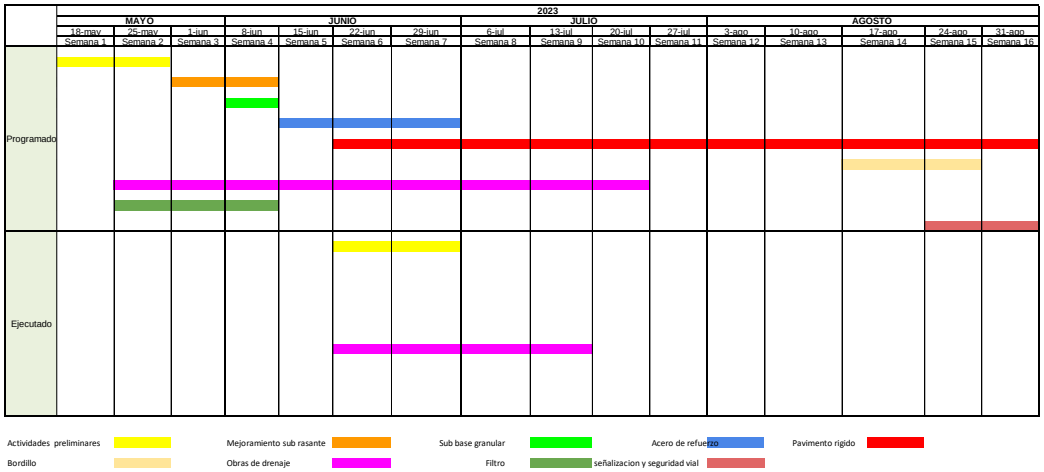

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tubería de concreto 36" pulgadas



Maquinaria amarilla en el frente de obra



Fundicion de obra de entrada y de salida ALC 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 14/7/2023 al 20/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS GIA S.A.S		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	258	VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	16/5/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2023	VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2023	VALOR ANTICIPO: $ 1,292,073,573.30	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,292,073,573.30			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54,185,460			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,252,726,451			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,767,190,902.82	64.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54,185,460.10	1.26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,713,005,442.72)	-62.99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,767,190,902.82	64.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 54,185,460.10	1.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2,713,005,442.72)	-62.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023, el porcentaje programado de 64,25% versus un porcentaje ejecutado de 1,26%, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 62,99%, presenta un plan de contingencia que se encuentra en revisión por la interventoría.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,292,073,573.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	7.20
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64.25%
Meta Física Ejecutada % 1.26%
Avance o Atraso Físico % -62.99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rígido	ML	2125			Prog	2125			2125	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100.0%
					Ejec	1			1	4.3%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.
Ejecutado: Se inicia con la excavación de 5 alcantarillas, una alcantarilla terminada

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: En los recorridos de obra, se evidencia excavaciones para alcantarillas con escasa señalización, así mismo no se tiene implementado el plan de manejo de tránsito para los transeúntes de la vereda; Por otro lado, la maquinaria evidenciada en obra, no ha sido enviada su documentación para su aprobación de la interventoría, según el factor de calidad ofertado.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitd de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023.
* Traslado de tubería de concreto 36" pulgadas al frente de la obra.
* Inicio de la excavación de alcantarillas ALC 1. ALC2, ALC3, ALC4, ALC5.
* Relleno del cuerpo de la obra ALC1, ALC2, ALC3
* Instalación de tubería de 36" concreto, en las alcantarillas ALC 1, ALC 2, ALC 3, ALC 4, ALC 5.
* Solicitud de afiliaciones de personal. (salud, pensión y riesgos).
* Encofrado y fundición de obra de entrada ALC 2.
* Encofrado y Fundicion de obra de entrada ALC 1.
* Encofrado, figuración e instalación de acero de refuerzo obra de descole ALC 1
* Perfilación de excavación obra de descole, corte, figuración e instalación de acero ALC 2.
* Demolicion de estructuras, remoción de alcantarillas ALC 6

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Excavación de alcantarillas y remoción de alcantarillas existentes.
* Plan de contingencia debido al atraso de las actividades según programación.
* Inicio de la fundición de concreto 21 Mpa, ALC 3, ALC 4
* Inicio de instalación de mejoramiento de la subrasante con adición de material.
* Fundición de obra de descole ALC 3
* Fundición de obra de encole ALC 3

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

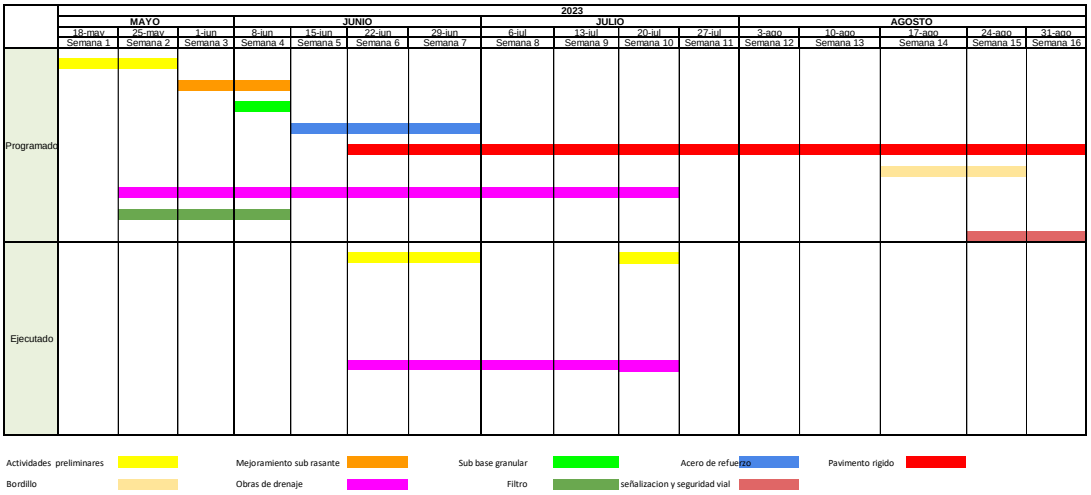

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Acopio de material en frente de obra


Alineación de tubería de 36" ALC 1


Perfilación de excavación de obra de encole ALC 1

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023



Equipo y maquinaria en el frente de obra



Remoción de estructuras ALC 6



Fundición de obra de encole ALC 1 terminada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara a la entidad los Estudios y Diseños de las obras objeto del Convenio 1866-2021 y a su vez al contratista demás documentos necesarios previos al inicio de ejecución de las obras.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 21/7/2023 al 27/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS GIA S.A.S.		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	258	VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	16/5/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2023	VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2023	VALOR ANTICIPO: $ 1,292,073,573.30	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,292,073,573.30			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 65,414,701			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,241,497,210			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,985,120,645.51	69.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65,414,701.39	1.52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,919,705,944.12)	-67.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,985,120,645.51	69.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65,414,701.39	1.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2,919,705,944.12)	-67.79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023, el porcentaje programado de 69,31% versus un porcentaje ejecutado de 1,52%, el desarrollo de las actividades contractuales reporta un atraso de 67,79%, presenta un plan de contingencia que se encuentra en revisión por la interventoría.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,292,073,573.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	6.42
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 69.31% — Avance o Atraso Físico % -67.79%
Meta Física Ejecutada % 1.52%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Pavimento rígido	ML	2125			Prog	2125			2125	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	23			Prog	23			23	100.0%
						Ejec	2			2	8.7%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibrocompactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido y construcción de 23 alcantarillas.

Ejecutado: Se inicia con la excavación de 7 alcantarillas, 2 alcantarillas terminadas

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: En los recorridos de obra, se evidencia excavaciones para alcantarillas con escasa señalización, así mismo no se tiene implementado el plan de manejo de tránsito para los transeúntes de la vereda; Por otro lado, la maquinaria evidenciada en obra, no ha sido enviada su documentación para su aprobación de la interventoría, según el factor de calidad ofertado.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de la información para el diseño de la valla publicitaria ya que ya se cuenta con acta de inicio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Suscripción de acta de inicio 16 de mayo 2023.
* Traslado de tubería de concreto 36" pulgadas al frente de la obra.
* Inicio de la excavación de alcantarillas ALC 1. ALC2, ALC3, ALC4, ALC5,m ALC 6, ALC 7.
* Relleno del cuerpo de la obra ALC1, ALC2, ALC3
* Instalación de tubería de 36" concreto, en las alcantarillas ALC 1, ALC 2, ALC 3, ALC 4, ALC 5.
* Solicitud de afiliaciones de personal. (salud, pensión y riesgos).
* Encofrado y fundición de obra de entrada ALC 2.
* Encofrado y Fundición de obra de entrada ALC 1.
* Encofrado, figuración e instalación de acero de refuerzo obra de descole ALC 1
* Perfilación de excavación obra de descole, corte, figuración e instalación de acero ALC 2.
* Demolición de estructuras, remoción de alcantarillas ALC 6
* Encofrado y fundición de obra de salida ALC 1
* Encofrado y fundición de obra de salida ALC 2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Excavación de alcantarillas y remoción de alcantarillas existentes.
* Plan de contingencia debido al atraso de las actividades según programación.
* Inicio de la fundición de concreto 21 Mpa, ALC 3, ALC 4
* Inicio de instalación de mejoramiento de la subrasante con adición de material.
* Fundición de obra de descole ALC 3
* Fundición de obra de encole ALC 3

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

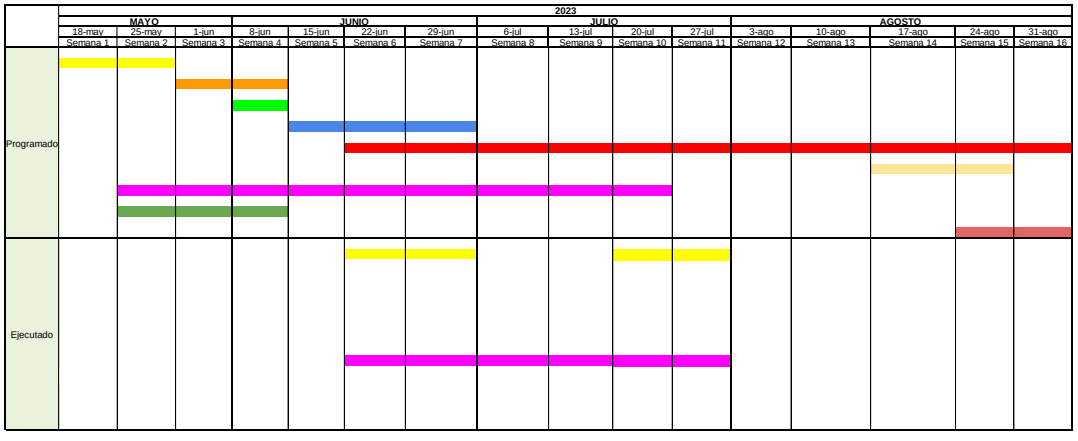

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maquinaria en el frente de obra



Equipo y maquinaria en el frente de obra



Acopio de materiales

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORO

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ



Remoción y excavación de alcantarilla ALC 6



Corte, figuración e instalación de acero obra de descole ALC 2



Fundición de obra de descole ALC 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
La Interventoría solicitara reiteradamente al contratista la entrega de documentos previos a inicio de las obras del convenio. Revisión de programado y flujo de caja.	FIRMA NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.4 SUCRE 1769 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	LP-090-2023	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 1,065,446,290.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,446,290.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 319,633,887.00	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 319,633,887.00	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 109,136,993.50	10.24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (109,136,993.50)	-10.24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109,136,993.50	10.24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (109,136,993.50)	-10.24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,127,479.50	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Con firma del acta de inicio el 16 de mayo de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 10,24% versus un ejecutado de 0,00% generando un retraso del 10,24%. Se ajusta el valor del contrató por modificatorio numero 1.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografia, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR IFC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10.24% — Avance o Atraso Físico % -10.24%
Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec				0	
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36"
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-138-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa, como también acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista de obra envió ordenes de giro 2 y 3 para la consignación del anticipo, dichas ordenes están revisadas y aprobadas por la interventoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

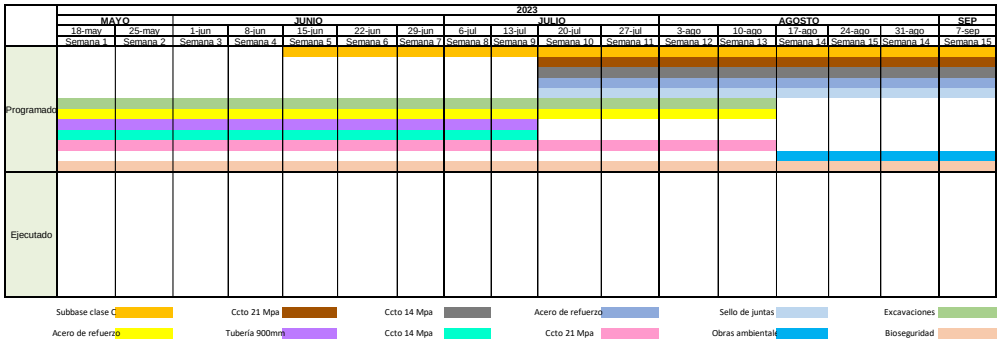

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1
Indicar localización y actividad

FOTO 2
Indicar localización y actividad

FOTO 3
Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP-090-2022	VALOR INICIAL: $ 1,065,446,290.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16/9/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,065,446,290.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/9/2023	VALOR ANTICIPO: $ 319,633,887.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 319,633,887.00			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 130,264,448.00	12.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (130,264,448.00)	-12.23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130,264,448.00	12.23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (130,264,448.00)	-12.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,127,479.50	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 16 de mayo de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 10,24% versus un ejecutado de 0,00% generando un retraso del 10,24%. Se ajusta el valor del contrató por modificatorio numero 1.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 12.23% — Avance o Atraso Físico %: -12.23%
Meta Física Ejecutada %: 0.00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
						Ejec				0	
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-138-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, En comite virtual se socializaron los inconvenientes que presenta el contratista para el inicio de la ejecucion de obra, pues a la fecha tiene el 12,23 % de atraso ya que tiene fecha de inicio el 16 de mayo y no presenta ejecucion alguna del objeto contractual.
2, El municipio intervendra sitios criticos con el fin de garantizarle al contratista acceso al sitio de la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

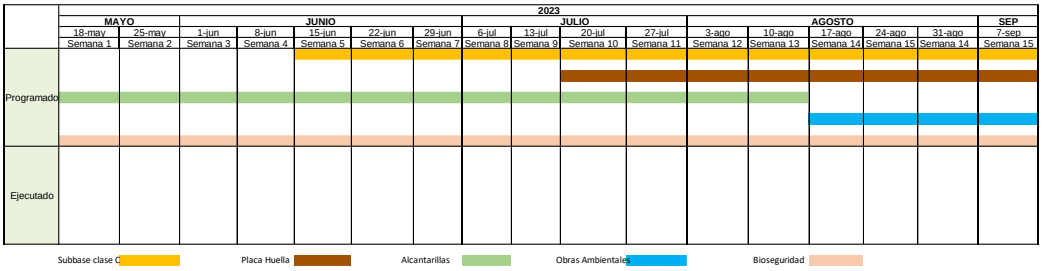

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-3 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%), YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)
CONTRATO No. LP-090-2023
FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/9/2023

VALOR INICIAL:	$ 1,065,446,290.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,446,290.00
VALOR ANTICIPO:	$ 319,633,887.00
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 319,633,887.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 236,321,848.50	22.18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (236,321,848.50)	-22.18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 236,321,848.50	22.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 0.00	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (236,321,848.50)	-22.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,127,479.50	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 16 de mayo de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 22,18% versus un ejecutado de 0,00% generando un retraso del 22,18%. Se ajusta el valor del contrató por modificatorio numero 1.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 22.18%
Meta Física Ejecutada %: 0.00%
Avance o Atraso Físico %: -22.18%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
						Ejec				0	
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36".
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-138-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Pese a que el contratista tiene acta de inicio con fecha de 16 de mayo de 2023 a la fecha 20 de julio de 2023 no ha ejecutado actividades que representen avance fisico del objeto contractual del contrato de obra, sin embargo la parte administrativa se han pagado ordenes de giro para anticipo.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Estado actual de la via


Estado actual de la via


Material acopiado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 21/7/2023 al 27/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%), YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)
CONTRATO No.: LP-090-2023 — VALOR INICIAL: $ 1,065,446,290.00
FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16/9/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1,065,446,290.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/9/2023 — VALOR ANTICIPO: $ 319,633,887.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 319,633,887.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,541,230			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,062,905,060			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 236,321,848.50	22.18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,541,230.00	0.24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (233,780,618.50)	-21.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 236,321,848.50	22.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,541,230.00	0.24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (233,780,618.50)	-21.94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,127,479.50	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,541,230.00	12.03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 16 de mayo de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 22,18% versus un ejecutado de 0,24% generando un retraso del 21.94%. Se ajusta el valor del contrató por modificatorio numero 1.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 22.18%
Meta Física Ejecutada % 0.24%
Avance o Atraso Físico % -21.94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	706			Prog	706			706	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec				0	
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Contrucción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36"
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia excavaciones con retroexcavadora tipo pajarita para alcantarillas, sin contar con señalización vertical como manejo de tránsito para el cierre de vía, así mismo, la documentación de la maquinaria no ha sido enviada por la interventoría para su aprobación según el factor de calidad ofertado; Por otro lado, la obra no cuenta con ningún tipo de señalización y/o delimitación o demarcación de áreas de trabajo

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-138-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de la información para el diseño de la valla publicitaria ya que ya se cuenta con acta de inicio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, El contratista realizo actividades de replanteo para iniciar con la construcción de alcantarillas.
2, El contratista inicia la construcción de la alcantarilla K0+216, en la cual instalo 6 tubos y realizo el atraque para contener la calzada existente.
3, El contratista inicia con la excavación e instalación de tubos de la alcantarilla K0+400.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Informar al INVIAS el estado Actual de los convenios

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

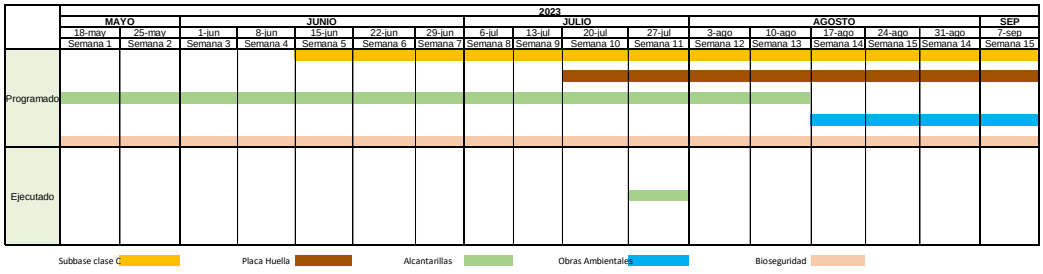

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


MAQUINARIA INSTALANDO TUBERIA


ALCANTARILLA K0+216


INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA K0+400

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.1.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolívar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	VALOR INICIAL: $ 3,478,131,956.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/9/2023	VALOR ACUMULADO: $ 3,478,131,956.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/9/2023	VALOR ANTICIPO: $ 1,043,439,587.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 1,043,439,587.00			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,478,131,956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 334,965,261			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,143,166,695			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3,478,131,956.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 282,654,737.44	8.13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 334,965,261.00	9.63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 52,310,523.56	1.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 282,654,737.44	8.13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 334,965,261.00	9.63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 52,310,523.56	1.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,047,739.05	2.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,723,128.00	0.25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 31 DE mayo DE 2023
PERIODO FACTURADO: abril-2023
VALOR FACTURA: $ 258,271,253.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 25 de abril de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 8,13% versus un ejecutado de 9,63% generando un avance de 1,5% respecto al programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,043,439,587.00
Amortizado $	$ 77,481,376.00
Saldo $	$ 965,958,211.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.99
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8.13%
Meta Física Ejecutada % 9.63%
Avance o Atraso Físico % 1.50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100.0%
					Ejec	43.66			43.66	4.16%
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec	1			1	3.33%
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100.0%
					Ejec	6			6	66.67%
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100.0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100.0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100.0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100.0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100.0%
					Ejec					
* Señales de transito	UND	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	2
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	3	3
Total	7	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de transito.
Ejecutado: Se inicia con las actividades correspondientes a la construcción de las alcantarillas, conformación de calzada existente, extensión y compactación de subbase granular, construcción de placa huella.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023, se emiten observaciones a la Versión 2 del documento PAGA el 6 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V2 del documento PAGA.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El día 15 de abril de 2023 se realiza visita en el sector donde se van a realizar las actividades constructivas, para definir los sitios donde se construirán las 30 alcantarillas y 2 box culvert, se verifico el estado actual del puente ubicado en la vereda Milagros que por las fuertes lluvias presentadas sufrió daños y tendrá actividades constructivas encaminadas al reforzamiento estructural del mismo.
2. Mejoramiento de la rasante con ayuda de maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
3. Excavaciones y ampliación del ancho de vía, corte sobre taludes con maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
4. Retiro de material sobrante.
5. Acondicionamiento de drenajes laterales (acondicionamiento de cunetas).
6. Extensión de material de mejoramiento (recebo).
7. Excavación y retiro de fallos sobre talud (sitios con material de tipo arcilloso y presencia de aguas superficiales).
8. Se adelantaron demoliciones de estructuras existentes en concreto, tipo alcantarilla.
9. Acondicionamiento, seriado y compactación de material de subbase con maquinaria especializada, (motoniveladora, vibro compactador).
10. Toma de densidades de campo para verificar el nivel de compactación de la subbase granular.
11. Corte y figurado de acero (refuerzo vigas riostras y bordillos tipo 1 y tipo 2)
12. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
13. Instalación de tubería de 36´de concreto reforzado en la alcantarilla No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 construcción de relleno compactado.
14. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+000 – k0+037.74.
15. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+000 – k0+037.74
16. Construcción de bordillo cuenta lado derecho entre las abscisas K0+000 – k0+037.74
17. Construcción de bordillo cuneta lado izquierdo entre las abscisas K0+000 – K0+019.98
18. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+037.74 – k0+043.66
19. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+037.74 – k0+066.92
20. Se solicita las respectivas planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo de todo el personal.
21. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas k0+043.66– k0+066.92
2. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
3. Construcción de bordillo cuenta lado izquierdo entre las abscisas K0+019.98 – k0+066.92
4. Construcción de bordillo cuenta lado derecho entre las abscisas K0+043.66 – k0+066.92

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

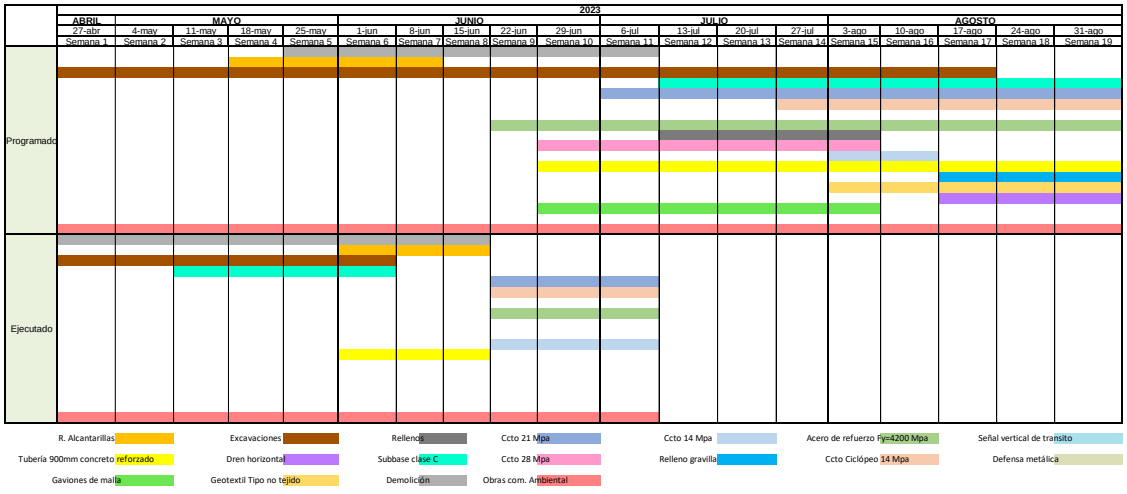



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Ejecutado

R. Alcantarillas | Excavaciones | Rellenos | Ccto 21 Mpa | Ccto 14 Mpa | Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa | Señal vertical de transito

Tubería 900mm concreto reforzado | Dren horizontal | Subbase clase C | Ccto 28 Mpa | Relleno gravilla | Ccto Ciclópeo 14 Mpa | Defensa metálica

Gaviones de malla | Geotextil Tipo no tejido | Demolición | Obras com. Ambiental

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación formaleta concreto ciclópeo K0+037 - K0+067



Construcción concreto ciclópeo K0+037 - K0+067



Excavación vigas riostras K0+037 - K0+067

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36¨en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolívar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	LP 005-003-15 05/059	CONTRATO No.	1100 de 2022
VALOR INICIAL:	$ 3,478,131,956.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
VALOR ACUMULADO:	$ 3,478,131,956.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR ANTICIPO:	$ 1,043,439,587.00	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,043,439,587.00	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,478,131,956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 432,676,447			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,045,455,509			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3,478,131,956.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495,185,185.44	14.24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 432,676,447.00	12.44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (62,508,738.44)	-1.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 495,185,185.44	14.24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 432,676,447.00	12.44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62,508,738.44)	-1.80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 212,530,448.00	6.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 97,711,186.00	2.81%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 25 de abril de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 14,24% versus un ejecutado de 12,44% generando un atraso de obra de 1,8% respecto al programado.

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,043,439,587.00
Amortizado $	$ 77,481,376.00
Saldo $	$ 965,958,211.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.83
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 14.24%
Meta Física Ejecutada % 12.44%

Avance o Atraso Físico % 1.80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100.0%
					Ejec	90.55			90.55	8.62%
* Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec	1			1	3.33%
* Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100.0%
					Ejec	6			6	66.67%
* Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100.0%
					Ejec					
* Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100.0%
					Ejec					
* Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100.0%
					Ejec					
* Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100.0%
					Ejec					
* Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100.0%
					Ejec					
* Señales de tránsito	UND	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	2
Retro cargador	1	1
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	3
Total	**7**	**6**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de tránsito.

Ejecutado: Se inicia con las actividades correspondientes a la construcción de 1 alcantarilla, conformación de calzada existente, extensión y compactación de 800 metros lineales de subbase granular, construcción de 90,55 metros de placa huella.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023, se emiten observaciones a la Versión 2 del documento PAGA el 6 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se realiza la solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El día 15 de abril de 2023 se realiza visita en el sector donde se van a realizar las actividades constructivas, para definir los sitios donde se construirán las 30 alcantarillas y 2 box culvert, se verificó el estado actual del puente ubicado en la vereda Milagros que por las fuertes lluvias presentadas sufrió daños y tendrá actividades constructivas encaminadas al reforzamiento estructural del mismo.
2. Mejoramiento de la rasante con ayuda de maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
3. Excavaciones y ampliación del ancho de vía, corte sobre taludes con maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
4. Retiro de material sobrante.
5. Acondicionamiento de drenajes laterales (acondicionamiento de cunetas).
6. Extensión de material de mejoramiento (recebo).
7. Excavación y retiro de fallos sobre talud (sitios con material de tipo arcilloso y presencia de aguas superficiales).
8. Se adelantaron demoliciones de estructuras existentes en concreto, tipo alcantarilla.
9. Acondicionamiento, seriado y compactación de material de subbase con maquinaria especializada, (motoniveladora, vibro compactador).
10. Toma de densidades de campo para verificar el nivel de compactación de la subbase granular.
11. Corte y figurado de acero (refuerzo vigas riostras y bordillos tipo 1 y tipo 2)
12. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
13. Instalación de tubería de 36´de concreto reforzado en la alcantarilla No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 construcción de relleno compactado.
14. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+000 – k0+090.55
15. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+000 – k0+090.55
16. Construcción de bordillo cuneta lado derecho entre las abscisas K0+000 – k0+043.66
17. Construcción de bordillo cuneta lado izquierdo entre las abscisas K0+000 – K0+043.66
18. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 1 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
19. El día 13 de julio se realizó reunión con veeduría ciudadana para tratar temas respecto a la programación, avance y ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la placa huella.
20. Se solicita las respectivas planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo de todo el personal.
21. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
2. Construcción de bordillo cuneta lado izquierdo entre las abscisas k0+043.66 – k0+090.55
3. Construcción de bordillo cuneta lado derecho entre las abscisas k0+043.66 – k0+090.55
4. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas k0+090.55 + K0+108.97
5. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas k0+090.55 + K0+108.97

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

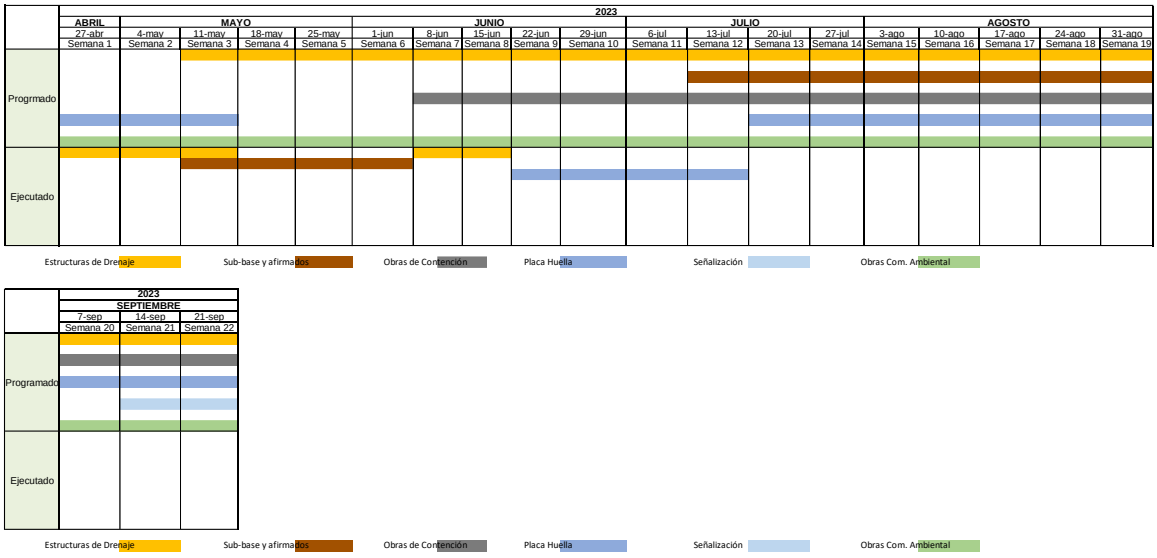

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación formaleta concreto ciclópeo K0+079.56



Construcción bordillo cuneta K0+056.45



Reunion comite de veeduria ciudadana

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36´´en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolívar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM
REPRESENTANTE LEGAL: JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONSORCIADOS: CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA (90%) GRUPO EMPRESARIAL L Y F ONIX SAS (10%)
CONTRATO No. LP 005-003-15.05/059
FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/9/2023

VALOR INICIAL:	$ 3,478,131,956.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 3,478,131,956.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,043,439,587.00
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,043,439,587.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,478,131,956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 473,166,764			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,004,965,192			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3,478,131,956.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 805,099,407.70	23.15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 473,166,764.00	13.60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (331,932,643.70)	-9.54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 805,099,407.70	23.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 473,166,764.00	13.60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (331,932,643.70)	-9.54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 309,914,222.26	8.91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40,490,317.00	1.16%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 25 de abril de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 23,15% versus un ejecutado de 13,60% generando un atraso de obra de 9,54% respecto al programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN	$ 29,514,533.55	1.70%
PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,043,439,587.00
Amortizado $	$ 77,481,376.00
Saldo $	$ 965,958,211.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.82
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 23.15%
Meta Física Ejecutada % 13.60%
Avance o Atraso Físico % -9.54%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100.0%
						Ejec	95.55			95.55	9.10%
*	Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100.0%
						Ejec	1			1	3.33%
*	Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100.0%
						Ejec	6			6	66.67%
*	Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100.0%
						Ejec					
*	Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100.0%
						Ejec					
*	Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100.0%
						Ejec					
*	Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100.0%
						Ejec					
*	Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100.0%
						Ejec					
*	Señales de tránsito	UND	30			Prog	30			30	100.0%
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	2
Retro cargador	1	1
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	3
Total	**7**	**6**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de tránsito.

Ejecutado: Se inicia con las actividades correspondientes a la construcción de 1 alcantarilla, conformación de calzada existente, extensión y compactación de 800 metros lineales de subbase granular, construcción de 95,55 metros de placa huella.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: SAN PABLO - NARIÑO — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO (DISPONIBLE)

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: RES. 601 de CORPONARIÑO, donde se concede la licencia ambiental, a la asociación de arenas del mayo "ASOMAYO" y registro minero ARE-TB8-10401

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023, se emiten observaciones a la Versión 2 del documento PAGA el 6 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se realiza la solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 15 de abril de 2023 se realiza visita en el sector donde se van a realizar las actividades constructivas, para definir los sitios donde se construirán las 30 alcantarillas y 2 box culvert, se verificó el estado actual del puente ubicado en la vereda Milagros que por las fuertes lluvias presentadas sufrió daños y tendrá actividades constructivas encaminadas al reforzamiento estructural del mismo.
2. Mejoramiento de la rasante con ayuda de maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
3. Excavaciones y ampliación del ancho de vía, corte sobre taludes con maquinaria especializada (moto niveladora, vibro compactador, retrocargador y volquetas).
4. Retiro de material sobrante.
5. Acondicionamiento de drenajes laterales (acondicionamiento de cunetas).
6. Extensión de material de mejoramiento (recebo).
7. Excavación y retiro de fallos sobre talud (sitios con material de tipo arcilloso y presencia de aguas superficiales).
8. Se adelantaron demoliciones de estructuras existentes en concreto, tipo alcantarilla.
9. Acondicionamiento, seriado y compactación de material de subbase con maquinaria especializada, (motoniveladora, vibro compactador).
10. Toma de densidades de campo para verificar el nivel de compactación de la subbase granular.
11. Corte y figurado de acero (refuerzo vigas riostras y bordillos tipo 1 y tipo 2)
12. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
13. Instalación de tubería de 36´de concreto reforzado en la alcantarilla No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 construcción de relleno compactado.
14. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+000 – k0+090.55
15. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+000 – k0+090.55
16. Construcción de bordillo cuneta lado derecho entre las abscisas K0+000 – k0+043.66
17. Construcción de bordillo cuneta lado izquierdo entre las abscisas K0+000 – K0+043.66
18. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 1 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
19. El día 13 de julio se realizó reunión con veeduría ciudadana para tratar temas respecto a la programación, avance y ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la placa huella.
20. Se solicita las respectivas planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo de todo el personal.
21. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.


Actividades ejecutadas en la semana

* Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
* Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+114.23 – k0+143.38
* Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+114.23 – k0+119.23
* Construcción de bordillo cuneta lado derecho entre las abscisas k0+043.66 - k0+090.55
* Construcción de bordillo cuneta lado izquierdo entre las abscisas k0+043.66 - k0+090.55

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
2. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas k0+119.23 + K0+143.38
3. Construcción de bordillo cuenta lado izquierdo entre las abscisas k0+114.23 + K0+143.38
4. Construcción de bordillo cuenta lado derecho entre las abscisas k0+114.23 + K0+143.38

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

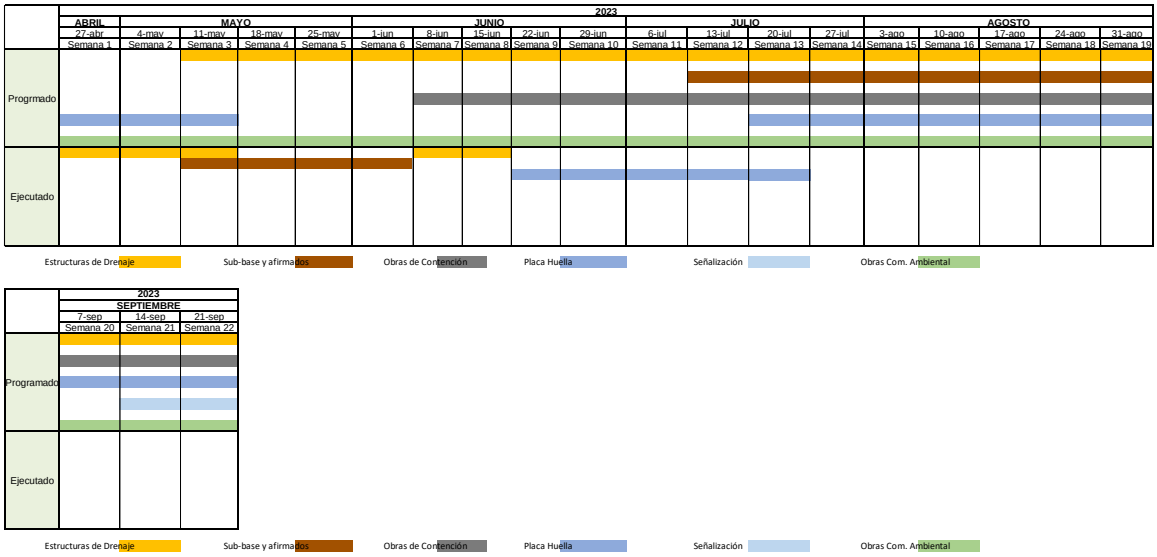

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción Bordillo Cuneta K0+050



Construcción Bordillo Cuneta K0+050



Mezcla concreto 21 MPa in situ

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE AGUAS GORDAS - EL CARMEN - LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 1050 ml de placa huella, demolición de 9 alcantarillas, demolición de una batea en concreto reforzado, construcción de 30 alcantarillas de 36´en concreto reforzado, construcción de 3 box culvert en concreto reforzado Tipo C, construcción de 393 ml de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de 6m y 20m en concreto reforzado, construcción de un muro de contención en gaviones de 4x4m, instalación de 30 señales de transito verticales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la vía terciaria que comunica las veredas Aguas Gordas, El Carmen, Los Milagros en el Municipio de Bolívar-Cauca presentan problemáticas que afectan su funcionalidad y condiciones óptimas de servicio como: la falta de alcantarillas que generan encharcamientos en la carpeta de rodadura, la carencia de muros de contención que genera perdida de banca, y la generación de lodo y baches que dificulta la movilidad en las vías. Este proyecto pretende la construcción de placa huella, alcantarillas, muros de contención y drenes horizontales a lo largo del corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO ONIX CCM		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHANER SEGOVIA QUINTERO		
CONSORCIADOS	CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA (90%) GRUPO EMPRESARIAL L Y F ONIX SAS (10%)		
CONTRATO No.	LP 005-003-15.05/059	VALOR INICIAL:	$ 3,478,131,956.00
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,478,131,956.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/9/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1,043,439,587.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,043,439,587.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,478,131,956			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 488,064,185			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,990,067,771			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3,478,131,956.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,161,963,436.86	33.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 488,064,185.00	14.03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (673,899,251.86)	-19.38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,161,963,436.86	33.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 488,064,185.00	14.03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (673,899,251.86)	-19.38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 356,864,029.16	10.26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14,897,421.00	0.43%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 25 de abril de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 33,41% versus un ejecutado de 14,03% generando un atraso de obra de 19,38% respecto al programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,043,439,587.00
Amortizado $	$ 77,481,376.00
Saldo $	$ 965,958,211.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.86
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 33.41%
Meta Física Ejecutada %: 14.03%
Avance o Atraso Físico %: -19.38%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	1050			Prog	1050			1050	100.0%
						Ejec	143.38			143.38	13.66%
*	Alcantarillas	UND	30			Prog	30			30	100.0%
						Ejec	1			1	3.33%
*	Demolición Alcantarilla	UND	9			Prog	9			9	100.0%
						Ejec	6			6	66.67%
*	Box Culvert	UND	3			Prog		3		3	100.0%
						Ejec					
*	Dren Horizontal	ML	393			Prog	393			393	100.0%
						Ejec					
*	Muros de Contención en concreto reforzado	UND	2			Prog			2	2	100.0%
						Ejec					
*	Demolición de batea	UND	1			Prog		1		1	100.0%
						Ejec					
*	Muros de Contención en gaviones	UND	1			Prog			1	1	100.0%
						Ejec					
*	Señales de tránsito	UND	30			Prog	30			30	100.0%
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	2
Retro cargador	1	1
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	3
Total	**7**	**6**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 1050 metros lineales de placa huella, construcción de 30 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado, demolición de 9 alcantarillas, construcción de 393 metros lineales de dren horizontal e instalación de 30 señales de tránsito.

Ejecutado: Se inicia con las actividades correspondientes a la construcción de 1 alcantarilla, conformación de calzada existente, extensión y compactación de 800 metros lineales de subbase granular, construcción de 143,38 metros de placa huella.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Construcción de 3 box culvert y demolición de una batea

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: construcción de 2 muros de contención en concreto reforzado y construcción de 1 muro de contención en gaviones
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: SAN PABLO - NARIÑO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: RES. 601 de CORPONARIÑO, donde se concede la licencia ambiental, a la asociación de arenas del mayo "ASOMAYO" y registro minero ARE-TB8-10401

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023, se emiten observaciones a la Versión 2 del documento PAGA el 6 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se realiza la solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se emite diseño de valla publicitaria por el grupo de comunicaciones

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


18. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 1 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
19. El día 13 de julio se realizó reunión con veeduría ciudadana para tratar temas respecto a la programación, avance y ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la placa huella.
20. Se solicita las respectivas planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo de todo el personal.
21. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
22. Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas K0+114.23 – k0+143.38
23. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+114.23 – k0+119.23

Actividades ejecutadas en la semana
*Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36".
*Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas k0+090.55 - k0+114.23
*Instalación de formaleta y fundición de concreto de 14Mpa tipo ciclópeo entre las abscisas k0+143.38 - k0+169.78
*Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas k0+090.55 - k0+114.23
*Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas k0+119.23 - k0+143.38
*Instalación de acero de refuerzo y formaleta de poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla K0+172.65

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Construcción de tubería en concreto reforzado de 28MPa, con un diámetro de 36"
2. Instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundición de concreto de 21Mpa (huellas, sobreanchos y vigas riostras) entre las abscisas K0+143.38 + K0+169.78
3. Fundición concreto 21Mpa poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla K0+172.65
4. Construcción de bordillo cuenta lado derecho entre las abscisas k0+90.55 + K0+143.38

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

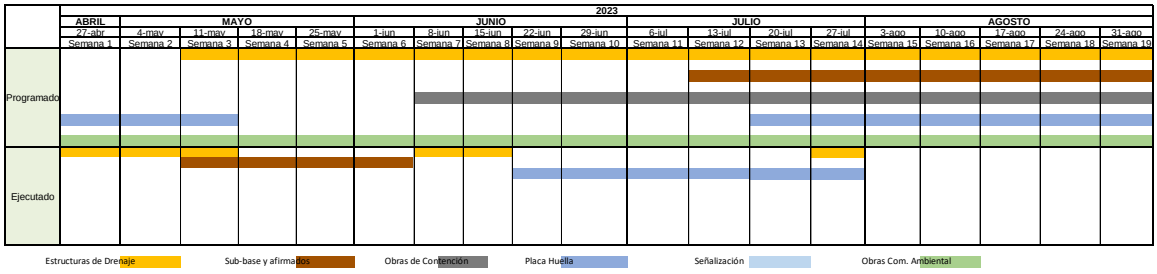



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción Concreto Ciclópeo K0+169



Construcción Huellas K0+130



Instalación Acero de Refuerzo Alcantarilla K0+172.65

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales. Revisión de la calidad de los materiales empleados. Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.	FIRMA NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de placa huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	VALOR INICIAL: $ 1,063,184,929.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	3 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3/9/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,063,184,929.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/9/2023	VALOR ANTICIPO: $ 318,955,478.70	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 318,955,478.70			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,063,184,929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 136,546,351			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 926,638,578			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,063,184,929.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 690,128,648.00	64.91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136,546,351.00	12.84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (553,582,297.00)	-52.07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0.00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 690,128,648.00	64.91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136,546,351.00	12.84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (553,582,297.00)	-52.07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102,557,135.00	9.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,214,512.00	0.58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 3 de abril de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 64,91% versus un ejecutado de 12,84% generando un retraso del 52,07%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318,955,478.70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318,955,478.70

INDICADOR I/C	
En el mes:	2.43
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64.91% — Avance o Atraso Físico % -52.07%
Meta Física Ejecutada % 12.84%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100.0%
						Ejec				0	
*	Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100.0%
						Ejec				0	
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Se están realizando actividades constructivas de las estructuras de drenaje y ampliación de la calzada..

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa, como también acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
2. Se continua con las actividades de demolición de estructuras, excavaciones varias y remoción de alcantarillas para la construcción de las estructuras de drenaje.
3. Se inicia con la actividad de ampliación de calzada a 5 metros en varios sectores a lo largo del proyecto.
4. Se han ejecutado actividades que no estaban contempladas contractualmente, pero si se necesitan para lograr el objeto y el alcance físico del proyecto, se adelantan trámites para realizar el modificatorio no. 1 en cantidades al contrato inicial.
5. Construcción de alcantarillas con tubería de 36´de concreto reforzado.
Verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
7. Se verifica las respectivas planillas de seguridad social enviadas por el contratista.
8. Remoción de derrumbes.

6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con las actividades de demolición de estructuras y excavaciones varias para la construcción de las estructuras de drenaje.
2. Continuar el trámite para realizar el modificatorio no. 1 al contrato inicial.
3. inicio de la conformación de la calzada para la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

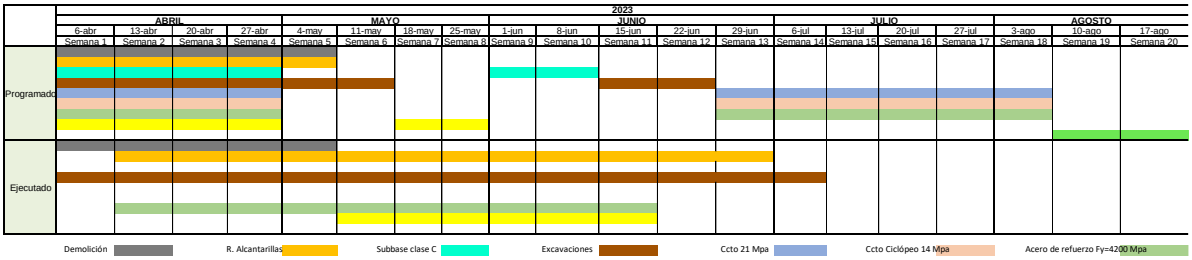

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar de entrada alcantarilla 5

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	LP 004-003-15,05/058	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	3 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 1,063,184,929.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,063,184,929.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 318,955,478.70	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 318,955,478.70	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,063,184,929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 131,346,386			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 931,838,543			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,063,184,929.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131,346,386.00	12.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (647,235,634.00)	-60.88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131,346,386.00	12.35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (647,235,634.00)	-60.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102,557,135.00	9.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,014,547.00	0.10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 3 de abril de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 64,91% versus un ejecutado de 12,84% generando un retraso del 52,07%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318,955,478.70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318,955,478.70

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2.75**
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 73.23% — Avance o Atraso Físico %: -60.88%
Meta Física Ejecutada %: 12.35%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100.0%
					Ejec				0	
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec				0	
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	1
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Se están realizando actividades constructivas de las estructuras de drenaje y ampliación de la calzada..
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:Uso del suelo (escombrera) en la Vereda CAJETE ALTO DE SAN LUIS, cuyo establecimiento se denomina LA LAJITA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-186-2023 del 13 de julio, se emiten observaciones a la V1 del documento PAGA

OBSERVACIONES:N/A

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, como también acta de resolución de veeduría
se revisan actas de vecindad de inicio dando aprobación a las mismas.
se realiza revisión de documento PAGA emitiendo observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
2. Se continua con las actividades de demolición de estructuras, excavaciones varias y remoción de alcantarillas para la construcción de las estructuras de drenaje.
3. Se inicia con la actividad de ampliación de calzada a 5 metros en varios sectores a lo largo del proyecto.
4. Se han ejecutado actividades que no estaban contempladas contractualmente, pero si se necesitan para lograr el objeto y el alcance físico del proyecto, se adelantan trámites para realizar el modificatorio no. 1 en cantidades al contrato inicial.
5. Construcción de alcantarillas con tubería de 36´de concreto reforzado.
6. Verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
7. Se verifica las respectivas planillas de seguridad social enviadas por el contratista.
8. Remoción de derrumbes.
9. Empieza con el acopio de material de Sub Base para conformar la calzada.
10. Se verifica en campo que el personal cuente con los respectivos EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con las actividades de demolición de estructuras y excavaciones varias para la construcción de las estructuras de drenaje.
2. Continuar el trámite para realizar el modificatorio no. 1 al contrato inicial.
3. inicio de la conformación de la calzada para la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Volqueta transportando Material

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO
REPRESENTANTE LEGAL: HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO
CONSORCIADOS: HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO (60%); HLDD SAS BIC (40%)
CONTRATO No.: LP 004-003-15.05/058
FECHA DE INICIO: 3 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 3/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3/9/2023

VALOR INICIAL:	$ 1,063,184,929.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,063,184,929.00
VALOR ANTICIPO:	$ 318,955,478.70
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 318,955,478.70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,063,184,929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 131,477,623			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 931,707,306			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,063,184,929.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131,477,623.00	12.37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (647,104,397.00)	-60.86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131,477,623.00	12.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (647,104,397.00)	-60.86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102,557,135.00	9.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,145,784.00	0.11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 3 de abril de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 64,91% versus un ejecutado de 12,84% generando un retraso del 52,07%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 318,955,478.70
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 318,955,478.70

INDICADOR I/C	
En el mes:	2.97
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 73.23%
Meta Física Ejecutada % 12.37%
Avance o Atraso Físico % -60.86%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100.0%
						Ejec				0	
*	Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100.0%
						Ejec				0	
*	Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100.0%
						Ejec				0	
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	1
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Se están realizando actividades constructivas de las estructuras de drenaje y ampliación de la calzada..
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:Uso del suelo (escombrera) en la Vereda CAJETE ALTO DE SAN LUIS, cuyo establecimiento se denomina LA LAJITA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-186-2023 del 13 de julio, se emiten observaciones a la V1 del documento PAGA

OBSERVACIONES:Realizado el recorrido de obra, se evidencian tramos con señalización, punto ecológico y campamento para el almacenamiento de materiales, organizados y limpios; en cuanto a la maquinaria, se evidencia una retro tipo oruga y una volqueta que no ha sido entregada su documentación a la interventoría para su aprobación según el factor de calidad ofertado. Por otro lado, se dispone el material de excavación en un predio el cual no sido certificado su uso para tal fin.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, como también acta de resolución de veeduría
se revisan actas de vecindad de inicio dando aprobación a las mismas.
se realiza revisión de documento PAGA emitiendo observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
2. Se continua con las actividades de demolición de estructuras, excavaciones varias y remoción de alcantarillas para la construcción de las estructuras de drenaje.
3. Se inicia con la actividad de ampliación de calzada a 5 metros en varios sectores a lo largo del proyecto.
4. Se han ejecutado actividades que no estaban contempladas contractualmente, pero si se necesitan para lograr el objeto y el alcance físico del proyecto, se adelantan trámites para realizar el modificatorio no. 1 en cantidades al contrato inicial.
5. Construcción de alcantarillas con tubería de 36´de concreto reforzado.
6. Verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
7. Se verifica las respectivas planillas de seguridad social enviadas por el contratista.
8. Remoción de derrumbes.
9. Empieza con el acopio de material de Sub Base para conformar la calzada.
10. Se verifica en campo que el personal cuente con los respectivos EPP.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con las actividades de demolición de estructuras y excavaciones varias para la construcción de las estructuras de drenaje.
2. Continuar el trámite para realizar el modificatorio no. 1 al contrato inicial.
3. inicio de la conformación de la calzada para la placa huella.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion para descole Alcantarilla 3

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36",Construcción de 456 ml de placa huella, Demolición de una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía terciaria 12KA04-4 que comunica las veredas Chalguayaco, Sestiadero, Mercado-Cucho en el Municipio de Bolívar-Cauca se realizara limpieza de alcantarillas, conformación de la calzada, reconstrucción de alcantarillas y Construcción de 0,5 Km de

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONSORCIADOS	HEBERT LIZANDRO DORADO DORADO (60%) HLDD SAS BIC (40%)		
CONTRATO No.	LP 004-003-15.05/058	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	3 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/9/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 1.063.184.929,00	VALOR INICIAL:	$ 1.740.313.120,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.063.184.929,00	VALOR ACUMULADO:	$ 1.740.313.120,00
VALOR ANTICIPO:	$ 318.955.478,70	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 318.955.478,70	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,063,184,929			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 130,653,290			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 932,531,639			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,063,184,929.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130,653,290.00	12.29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (647,928,730.00)	-60.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 778,582,020.00	73.23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 130,653,290.00	12.29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (647,928,730.00)	-60.94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102,557,135.00	9.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 321,451.00	0.03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	0

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 3 de abril de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 64,91% versus un ejecutado de 12,84% generando un retraso del 52,07%.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	318,955,478.70
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	318,955,478.70

INDICADOR I/C	
En el mes:	3.21
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 73.23%
Meta Física Ejecutada % 12.29%

Avance o Atraso Físico % -60.94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	456			Prog	456			456	100.0%
					Ejec				0	
* Alcantarillas	UND	6			Prog	6			6	100.0%
					Ejec				0	
* Demolición Alcantarilla	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec				0	
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	3	1
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: 456 metros lineales de placa huella y construcción de 10 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Se están realizando actividades constructivas de las estructuras de drenaje y ampliación de la calzada..

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Uso del suelo (escombrera) en la Vereda CAJETE ALTO DE SAN LUIS, cuyo establecimiento se denomina LA LAJITA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-186-2023 del 13 de julio, se emiten observaciones a la V1 del documento PAGA

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencian tramos con señalización vertical como inicio de obra y vía cerrada, punto ecológico y campamento para el almacenamiento de materiales, organizados y limpios; En cuanto a la maquinaria, se encuentra una retro tipo oruga y una volqueta que no ha sido entregada su documentación a la interventoría para su aprobación según el factor de calidad ofertado. Por otro lado, se dispone el material de excavación en un predio el cual no sido certificado su uso para tal fin.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se emite diseño de valla publicitaria por el grupo de comunicaciones
se realiza visita a la propietaria de la vivienda dando a conocer las acciones a ejecutar en su predio ya que el descole de la alcantarilla afectaba a la misma. una vez explicada las acciones la propietaria acepta que se ejecute un disipador y encauce por tubería .

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suscripción acta de inicio el día 03 de abril 2023.
2. Se continua con las actividades de demolición de estructuras, excavaciones varias y remoción de alcantarillas para la construcción de las estructuras de drenaje.
3. Se inicia con la actividad de ampliación de calzada a 5 metros en varios sectores a lo largo del proyecto.
4. Se han ejecutado actividades que no estaban contempladas contractualmente, pero si se necesitan para lograr el objeto y el alcance físico del proyecto, se adelantan trámites para realizar el modificatorio no. 1 en cantidades al contrato inicial.
5. Construcción de alcantarillas con tubería de 36´de concreto reforzado.
6. Verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
7. Se verifica las respectivas planillas de seguridad social enviadas por el contratista.
8. Remoción de derrumbes.
9. Empieza con el acopio de material de Sub Base para conformar la calzada.
10. Se verifica en campo que el personal cuente con los respectivos EPP.
11. El contratista realiza actividades de excavación para la construcción de filtro.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con las actividades de demolición de estructuras y excavaciones varias para la construcción de las estructuras de drenaje.
2. Continuar el trámite para realizar el modificatorio no. 1 al contrato inicial.
3. inicio de la conformación de la calzada para la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION DE FILTRO



EXCAVACION DE FILTRO

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS			INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS			REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1,799,782,602.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1,799,782,602.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899,891,301.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 899,891,301.00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,799,782,602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 177,621,758			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,622,160,844			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,799,782,602.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 453,190,514.12	25.18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 177,621,758.00	9.87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (275,568,756.12)	-15.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 453,190,514.12	25.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,621,758.00	9.87%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (275,568,756.12)	-15.31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 96,933,466.27	5.39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54,268,394.00	3.02%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 11 de mayo de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 25,18% versus un ejecutado de 9,87% generando un atraso de 15,31%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899,891,301.00
Amortizado $	$
Saldo $	$ 899,891,301.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1.87**
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25.18% Avance o Atraso Físico % -15.31%
Meta Física Ejecutada % 9.87%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100.0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
						Ejec	5			5	50.0%
*	Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100.0%
						Ejec	12			12	80.0%
*	Filtro	ML	34			Prog	34			34	100.0%
						Ejec					
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	1
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	1
Total	7	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro.
Ejecutado: Se están realizado actividades correspondiente al ítem de estructuras de drenaje y construcción del muro de contención.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-141-2023, se realiza la primera solicitud de documentos ambientales el día 16 de junio.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
se realiza recorrido de obra evidenciando buzón de sugerencias, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 11 de mayo de 2023 se realiza visita en el sector donde se va a realizar el proyecto para poder dar inicio a las actividades constructivas y que el contratista aprobara los diseños entregados por el municipio de Almaguer, se realizaron unas pequeñas observaciones en campo con referente a los diseños presentados y tanto interventoría como municipio y contratista de obra estuvieron de acuerdo realizarlas para optimizar los recursos del proyecto, dando así por aprobados los inicios de las actividades constructivas.
2. Se firma acta de inicio el día 11 de mayo de 2023.
3. Se realiza la excavación de tres alcantarillas, la instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado y la construcción del relleno compactado.
4. Se realiza la construcción de la poceta de encole y el descole de las alcantarillas No. 1, No. 2 y No. 3.
7. Se realiza la excavación del muro de contención, construcción del solado de limpieza, instalación de acero de refuerzo, fundición de concreto 21Mpa (zapata y pantalla).
8. Excavaciones varias sin clasificar provenientes de la construcción de la alcantarilla No. 4 (tubería, poceta de encole y descole).
9. Construcción de solados de 14 Mpa, instalación de tubería de 36¨en concreto reforzado y construcción de poceta de encole y descole de la alcantarilla No. 4.
11. Se realiza inspección en el sector de la obra para definir con la comunidad la ubicación de la alcantarilla No. 5, ya que donde se tenía prevista según visita del 11 de mayo de 2023 se tiene una no conformidad con los habitantes de la viviendas donde se construiría el descole.
12. Excavaciones varias sin clasificar provenientes de la construcción de la alcantarilla No. 5 (tubería, poceta de encole y descole).
13. Construcción de filtro con tubería perforada 4¨en muro de contención y posterior construcción de relleno compactado con material proveniente de la misma excavación.
14. Construcción de solados de 14 Mpa, instalación de tubería de 36¨en concreto reforzado de la alcantarilla No. 5
15. Corte, flejado e Instalación de acero de refuerzo Fy = 420 Mpa poceta de encole y descole de la alcantarilla No. 5
16. Construcción de concreto de 21 Mpa de poceta de encole y descole de la alcantarilla No. 5.
17. Excavaciones varias sin clasificar provenientes de la construcción de la alcantarilla No. 6 (tubería, poceta de encole y descole).
18. Se solicita planillas de seguridad social pagas de todo el personal, correspondiente al mes de mayo ya que a la fecha no han enviado.
19. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar la instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado en la alcantarilla No. 6 y posteriormente la construcción del relleno compactado de las mismas.
2. Corte e instalación de acero de refuerzo de la poceta de encole y descole de las alcantarillas No. No. 6.
3. Realizar la excavación en material común provenientes de la construcción de la alcantarilla No. 7 (tubería, poceta de encole y descole).
4. Realizar una actualización del cronograma de obra para poder cumplir con las actividades contractuales en el tiempo estipulado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

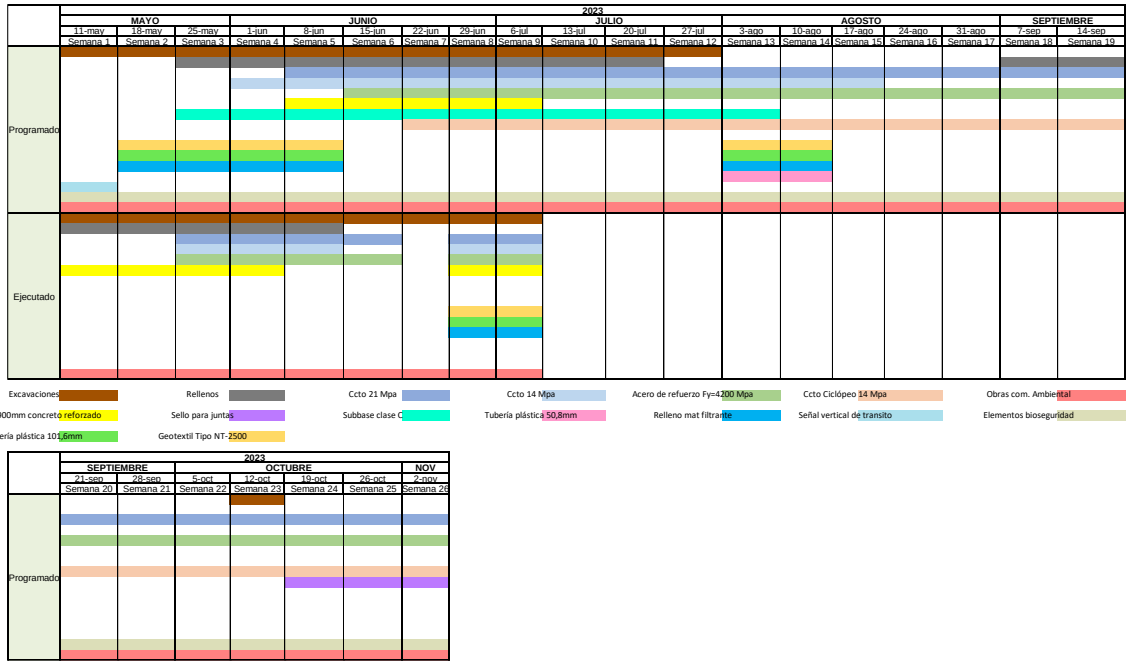

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación Alcantarilla No. 6



Instalación tuberia de 36" Alcantarilla No. 5



Construcción poceta de encole Alcantarilla No. 5

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Items contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 (Numeración consecutiva) del 7/7/2023 al 13/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que inciden favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS				
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS				
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL:	$ 1,799,782,602.00		
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1,799,782,602.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 899,891,301.00		
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -		
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 899,891,301.00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,799,782,602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 190,310,798			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,609,471,804			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,799,782,602.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 550,219,956.53	30.57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 190,310,798.00	10.57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (359,909,158.53)	-20.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 550,219,956.53	30.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 190,310,798.00	10.57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (359,909,158.53)	-20.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 97,029,442.41	5.39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,689,040.00	0.71%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Con firma del acta de inicio el 11 de mayo de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 30,57% versus un ejecutado de 10,57% generando un atraso de 20,00%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899,891,301.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899,891,301.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.90
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 30.57%
Meta Física Ejecutada %: 10.57%
Avance o Atraso Físico %: -20.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec	7			7	70.0%
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100.0%
					Ejec	12			12	80.0%
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100.0%
					Ejec	12			12	35.3%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	1
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	1
Total	**7**	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro horizontal.
Ejecutado: Se están realizado actividades correspondiente al ítem de estructuras de drenaje, la construcción de 12 metros lineales de muro de contención y la construcción de 12 metros lineales de filtro horizontal.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-141-2023, se realiza la primera solicitud de documentos ambientales el día 16 de junio.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra evidenciando buzón de sugerencias, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la val informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 11 de mayo de 2023 se realiza visita en el sector donde se va a realizar el proyecto para poder dar inicio a las actividades constructivas y que el contratista aprobará los diseños entregados por el municipio de Almaguer, se realizaron unas pequeñas observaciones en campo con referente a los diseños presentados y tanto interventoría como municipio y contratista de obra estuvieron de acuerdo realizarlas para optimizar los recursos del proyecto, dando así por aprobados los inicios de las actividades constructivas.
2. Se firma acta de inicio el día 11 de mayo de 2023.
3. Se realiza inspección en el sector de la obra para definir con la comunidad la ubicación de la alcantarilla No. 5, ya que donde se tenía prevista según visita del 11 de mayo de 2023 se tiene una no conformidad con los habitantes de la viviendas donde se construiría el descole.
4. Excavación en material común pertenecientes al replanteo del muro de contención, construcción del solado de limpieza de 14 Mpa, instalación de acero de refuerzo según diseño aprobado por interventoría, Instalación de formaleta y fundición de concreto 21Mpa (zapata y pantalla).
5. Construcción de filtro horizontal en tubería perforada de 4 pulgadas, material filtrante y geotextil tipo no tejido a lo largo de la estructura del muro de contención.
Construcción de relleno compactado con material de sitio en la parte interna del muro de contención.
6. Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado en las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 y su posterior construcción de relleno compactado.
7. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
8. El día 10 de julio con comunicado DON-1100-INV-178-2023 se da a conocer el presunto incumplimiento al plazo contractual de las obras solicitando el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.
9. Se solicita planillas de seguridad social pagas de todo el personal, correspondiente al mes de mayo y junio ya que a la fecha no han enviado.
10. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado en la alcantarilla No. 8 y su posterior construcción de relleno compactado.
2. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 8 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
3. Realizar el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación acero de refuerzo, encole alcantarilla No. 7



Fundición, encole alcantarilla No. 7



Instalación acero de refuerzo, descole alcantarilla No. 7

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 14/7/2023 al 20/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que inciden favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEG	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	VALOR INICIAL: $ 1,799,782,602.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO: $ 1,799,782,602.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2023	VALOR ANTICIPO: $ 899,891,301.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
PRORROGA No. 1:	31/12/2022	VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 899,891,301.00			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,799,782,602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 217,681,326			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,582,101,276			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,799,782,602.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 654,896,407.55	36.39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 217,681,326.00	12.09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (437,215,081.55)	-24.29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 654,896,407.55	36.39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 217,681,326.00	12.09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (437,215,081.55)	-24.29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 104,676,451.02	5.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,370,528.00	1.52%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Con firma del acta de inicio el 11 de mayo de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 36,39% versus un ejecutado de 12,09% generando un atraso de 24,29%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899,891,301.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899,891,301.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.79
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 36.39% — Avance o Atraso Físico %: -24.29%
Meta Física Ejecutada %: 12.09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
* Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec	7			7	70.0%
* Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100.0%
					Ejec	12			12	80.0%
* Filtro	ML	34			Prog	34			34	100.0%
					Ejec	12			12	35.3%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	1
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	1
Total	**7**	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro horizontal.

Ejecutado: Se están realizado actividades correspondiente al ítem de estructuras de drenaje, la construcción de 12 metros lineales de muro de contención, la construcción de 12 metros lineales de filtro horizontal, se realiza acopio de material de subbase y corte y flejado de acero de refuerzo de vigas riostras.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-141-2023, se realiza la primera solicitud de documentos ambientales el día 16 de junio.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra evidenciando buzón de sugerencias, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El día 11 de mayo de 2023 se realiza visita en el sector donde se va a realizar el proyecto para poder dar inicio a las actividades constructivas y que el contratista aprobara los diseños entregados por el municipio de Almaguer, se realizaron unas pequeñas observaciones en campo con referente a los diseños presentados y tanto interventoría como municipio y contratista de obra estuvieron de acuerdo realizarlas para optimizar los recursos del proyecto, dando así por aprobados los inicios de las actividades constructivas.
2. Se firma acta de inicio el día 11 de mayo de 2023.
3. Se realiza inspección en el sector de la obra para definir con la comunidad la ubicación de la alcantarilla No. 5, ya que donde se tenía prevista según visita del 11 de mayo de 2023 se tiene una no conformidad con los habitantes de la viviendas donde se construiría el descole.
4. Excavación en material común pertenecientes al replanteo del muro de contención, construcción del solado de limpieza de 14 Mpa, instalación de acero de refuerzo según diseño aprobado por interventoría, Instalación de formaleta y fundición de concreto 21Mpa (zapata y pantalla).
5. Construcción de filtro horizontal en tubería perforada de 4 pulgadas, material filtrante y geotextil tipo no tejido a lo largo de la estructura del muro de contención.
Construcción de relleno compactado con material de sitio en la parte interna del muro de contención.
6. Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36´de concreto reforzado en las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 y su posterior construcción de relleno compactado.
7. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
8. El día 10 de julio con comunicado DON-1100-INV-178-2023 se da a conocer el presunto incumplimiento al plazo contractual de las obras solicitando el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.
9. Se solicita planillas de se}guridad social pagas de todo el personal, correspondiente al mes de mayo y junio ya que a la fecha no han enviado.
10. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.


Actividades realizadas en la semana
* Acopio de material de subbase en el sitio del proyecto.
* Corte y flejado de acero de refuerzo de vigas riostras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36´de concreto reforzado en la alcantarilla No. 8 y su posterior construcción de relleno compactado.
2. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 8 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
3. Transporte de maquinaria especializada (Motoniveladora y vibrocompactador) al sitio del proyecto para la construcción de subbase granular clase C.
4. Realizar el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 15202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 21/7/2023 al 27/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 10 alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5 metros y construcción 15 metros de muro en concreto reforzado de 3 metros de altura.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará mejoramiento a las vías rurales del Municipio de Almaguer, conformando la banca, realizando obras de drenaje y contención que inciden favorablemente en las condiciones de transitabilidad.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JULIÁN LIZANDRO GÒNZALES CASAS	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIÁN LIZANDRO GÒNZALES CASAS	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	F1-F14-289-2022	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
PRORROGA No. 1:	31/12/2022		
VALOR INICIAL:	$ 1,799,782,602.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,799,782,602.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 899,891,301.00	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 899,891,301.00	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,799,782,602			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 251,788,457			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,547,994,145			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,799,782,602.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 759,893,662.97	42.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 251,788,457.00	13.99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (508,105,205.97)	-28.23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 759,893,662.97	42.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 251,788,457.00	13.99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (508,105,205.97)	-28.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 104,997,255.42	5.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,107,131.00	1.90%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Con firma del acta de inicio el 11 de mayo de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 42,22% versus un ejecutado de 13,99% generando un atraso de 28,23%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 899,891,301.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 899,891,301.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.67
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 42.22%
Meta Física Ejecutada %: 13.99%
Avance o Atraso Físico %: -28.23%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa huella	ML	885			Prog	885			885	100.0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	10			Prog	10			10	100.0%
						Ejec	8			8	80.0%
*	Muro de contención en concreto reforzado	ML	15			Prog	15			15	100.0%
						Ejec	12			12	80.0%
*	Filtro	ML	34			Prog	34			34	100.0%
						Ejec	12			12	35.3%
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de Concreto	2	1
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora	1	
Volqueta (7m3)	1	1
Total	**7**	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 885 metros lineales de placa huella, 10 alcantarillas en tubería de 36¨ en concreto reforzado, 15 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado y 34 metros lineales de filtro horizontal.
Ejecutado: Se están realizado actividades correspondiente al ítem de estructuras de drenaje (construcción 8 alcantarillas), la construcción de 12 metros lineales de muro de contención, la construcción de 12 metros lineales de filtro horizontal, se realiza acopio de material de subbase y corte y flejado de acero de refuerzo de vigas riostras.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-141-2023, se realiza la primera solicitud de documentos ambientales el día 16 de junio.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra evidenciando buzón de sugerencias, se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 11 de mayo de 2023 se realiza visita en el sector donde se va a realizar el proyecto para poder dar inicio a las actividades constructivas y que el contratista aprobara los diseños entregados por el municipio de Almaguer, se realizaron unas pequeñas observaciones en campo con referente a los diseños presentados y tanto interventoría como municipio y contratista de obra estuvieron de acuerdo realizarlas para optimizar los recursos del proyecto, dando así por aprobados los inicios de las actividades constructivas.
2. Se firma acta de inicio el día 11 de mayo de 2023.
3. Se realiza inspección en el sector de la obra para definir con la comunidad la ubicación de la alcantarilla No. 5, ya que donde se tenía prevista según visita del 11 de mayo de 2023 se tiene una no conformidad con los habitantes de la viviendas donde se construiría el descole.
4. Excavación en material común pertenecientes al replanteo del muro de contención, construcción del solado de limpieza de 14 Mpa, instalación de acero de refuerzo según diseño aprobado por interventoría, Instalación de formaleta y fundición de concreto 21Mpa (zapata y pantalla).
5. Construcción de filtro horizontal en tubería perforada de 4 pulgadas, material filtrante y geotextil tipo no tejido a lo largo de la estructura del muro de contención.
Construcción de relleno compactado con material de sitio en la parte interna del muro de contención.
6. Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado en las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 y su posterior construcción de relleno compactado.
7. Instalación de acero de refuerzo poceta de encole y muro tipo aleta del descole de las alcantarillas No.1, No, 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
8. El día 10 de julio con comunicado DON-1100-INV-178-2023 se da a conocer el presunto incumplimiento al plazo contractual de las obras solicitando el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.
9. Se solicita planillas de seguridad social pagas de todo el personal, correspondiente al mes de mayo y junio ya que a la fecha no han enviado.
10. Se verifica en obra que mantengan los elementos de protección personal adecuados.
Actividades realizadas en la semana
*Excavación en material común, construcción de solados de limpieza e instalación de tubería de 36¨de concreto reforzado en la alcantarilla No. 8 y No. 9 y su posterior construcción de relleno compactado.
*Instalación de acero de refuerzo y fundición poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 8 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Transporte de maquinaria especializada (Motoniveladora y vibrocompactador al sitio del proyecto para la construcción de subbase granular clase C.
2. Instalación de acero de refuerzo y fundición poceta de encole y muro tipo aleta del descole de la alcantarilla No. 9 según especificaciones de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa ¨Colombia rural¨
3. Realizar el transporte y acopio de material de Sub base granular clase C.
4. Realizar el plan de contingencias para mitigar el atraso reportado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación Acero de Refuerzo Alcantarilla No. 8


Construcción Poceta de Encole Alcantarilla No. 8


Construcción Descole Alcantarilla No. 8

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.1.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tamo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	93	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	4/7/2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 795,011,198.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 795,011,198.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795,011,198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 22,530,870			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 772,480,328			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795,011,198.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20,464,531.20	2.57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22,530,870.00	2.83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2,066,338.80	0.26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20,464,531.20	2.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22,530,870.00	2.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2,066,338.80	0.26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,464,531.20	2.57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22,530,870.00	2.83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023, se proceden a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 2,57% versus un ejecutado de 0,00% generando un atraso de 2,57%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografia, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	14.70
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,57% — Avance o Atraso Físico % 0,26%
Meta Física Ejecutada % 2,83%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100.0%
						Ejec					
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
						Ejec					
*	Mantenimiento Vial	M2	6665			Prog		6665		6665	100.0%
						Ejec		6665		6665	100.0%
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	1
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	1
Total	**6**	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36 en concreto reforzado
Ejecutado: Se realizan actividades correspondientes al capitulo de mantenimiento

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: Realizar el mantenimiento vial de 6665 M2.
Ejecutado: Se realiza el mantenimiento vial de 6665 M2

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:		
	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A ____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A ____

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:N/A

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 8 de junio de 2023 se realizó reunión con la comunidad, alcaldía, contratista e interventoría en el sitio del proyecto donde se socializo el proyecto a ejecutar, se realizó recorrido en la vía a intervenir donde se evidencio un tramo donde para lograr los 5 metros de ancho de calzada se tiene que realizar la construcción de muros de contención, por lo que conjuntamente se decidió construir la placa huella en dos tramos saltando este sector, otra problemática que se evidencia es la construcción de las alcantarillas teniendo solamente el consentimiento por la comunidad para construir una de las cuatro alcantarillas, se recomienda a la alcaldía adelantar el permiso para la construcción de las tres alcantarillas restantes.
2. El día 22 de junio de 2023 se realizó reunión virtual entre contratista de obra, municipio e interventoría con el fin de tratar el tema de los permisos para la construcción de las 3 alcantarillas y ver el cumplimiento de la documentación para firma del acta de inicio.
3. Firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023.
4. Transporte de maquinaria (motoniveladora y retroexcavadora de ruedas) al sitio de la obra.
5. Se realizo conformación de calzada existen correspondiente al capitulo mantenimiento vial del presupuesto contractual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Transportar retroexcavadora de ruedas, para realizar la ampliación de la calzada en el tramo donde se va a construir la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

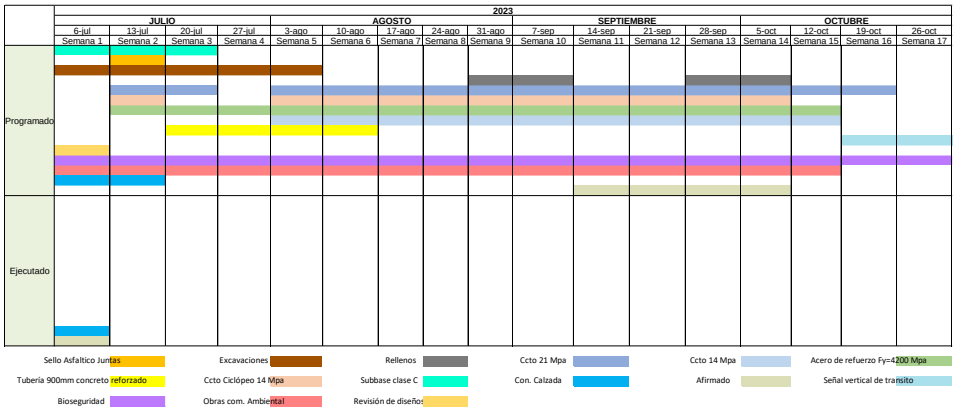

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de calzada existente K0+150



Conformación de calzada existente K0+450



Conformación de calzada existente K0+680

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matricula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 (Numeración consecutiva) del 7/7/2023 al 13/7/2023 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEG	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	93	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	4/7/2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 795,011,198.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 795,011,198.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795,011,198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 88,595,599			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 706,415,599			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795,011,198.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 40,929,062.60	5.15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 88,595,599.00	11.14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 47,666,536.40	6.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40,929,062.60	5.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88,595,599.00	11.14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 47,666,536.40	6.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,464,531.20	2.57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 66,064,729.00	8.31%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 5,15% versus un ejecutado de 11,14% generando un avance de de obra de 6,00%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSION PROGRAMADA EN LA INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	4.07
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 5.15%
Meta Física Ejecutada %: 11.14%
Avance o Atraso Físico %: 6.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec					
* Mantenimiento Vial	M2	6665			Prog		6665		6665	100.0%
					Ejec		6665		6665	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	1
Retroexcavadora	1	1
Volqueta 7 m3	1	1
Total	**6**	**3**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36´´en concreto reforzado
Ejecutado: Se realizan actividades correspondientes al capítulo de mantenimiento

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: Realizar el mantenimiento vial de 6665 M2.
Ejecutado: Se realiza el mantenimiento vial de 6665 M2.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-177-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 8 de junio de 2023 se realizó reunión con la comunidad, alcaldía, contratista e interventoría en el sitio del proyecto donde se socializo el proyecto a ejecutar, se realizó recorrido en la vía a intervenir donde se evidencio un tramo donde para lograr los 5 metros de ancho de calzada se tiene que realizar la construcción de muros de contención, por lo que conjuntamente se decidió construir la placa huella en dos tramos saltando este sector, otra problemática que se evidencia es la construcción de las alcantarillas teniendo solamente el consentimiento por la comunidad para construir una de las cuatro alcantarillas, se recomienda a la alcaldía adelantar el permiso para la construcción de las tres alcantarillas restantes.
2. El día 22 de junio de 2023 se realizó reunión virtual entre contratista de obra, municipio e interventoría con el fin de tratar el tema de los permisos para la construcción de las 3 alcantarillas y ver el cumplimiento de la documentación para firma del acta de inicio.
3. Firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023.
4. Transporte de maquinaria (motoniveladora y retroexcavadora de ruedas) al sitio de la obra.
5. Se realizó conformación de calzada existen correspondiente al capítulo mantenimiento vial del presupuesto contractual.
6. Instalación de afirmado en puntos específicos a lo largo del corredor vial en intervención correspondiente al capítulo mantenimiento vial de las obligaciones contractuales.
7. Excavaciones varias sin clasificar correspondientes a la ampliación de calzada (5 metros) a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
8. Relleno con suelo de excavación a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
9. Transporte y acopio de subbase granular clase C al sitio del proyecto donde se desarrollará la construcción de placa huella.
10. El día 12 de julio de 2023 se realizó comité virtual conjuntamente con contratista de obra, interventoría y municipio para poder definir la ubicación definitiva de las alcantarillas contempladas en el proyecto.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar la visita en campo para tratar el tema de la ubicación de las alcantarillas y sus respectivos permisos el día 17 de julio de 2023 conjuntamente con contratista de obra, interventoría y municipio.
2. Realizar la extensión y compactación de material de subbase clase C.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

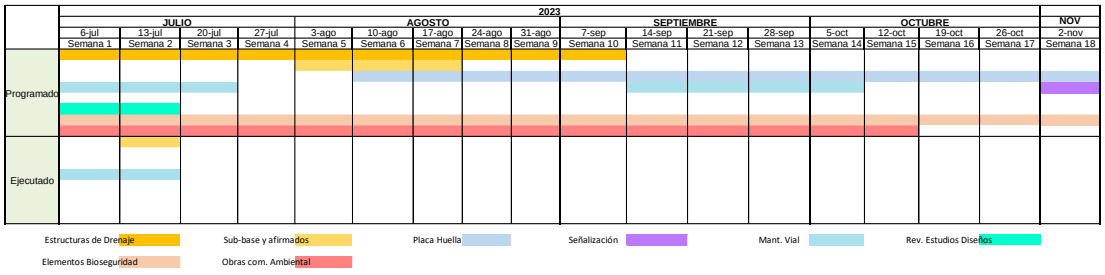

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de afirmado K0+680



Conformación de calzada existente K0+680



Transporte y acopio de subbase granular K0+030

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEG	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	93	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	4/7/2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 795,011,198.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 795,011,198.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 795,011,198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 98,037,892			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 696,973,306			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795,011,198.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69,008,831.60	8.68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 98,037,892.00	12.33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29,029,060.40	3.65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,008,831.60	8.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98,037,892.00	12.33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29,029,060.40	3.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28,079,769.00	3.53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,442,293.00	1.19%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 8,68% versus un ejecutado de 12,33% generando un avance de de obra de 3,65%

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veeduríias técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

INDICADOR I/C	
En el mes:	3.98
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 8.68%
Meta Física Ejecutada % 12.33%

Avance o Atraso Físico % 3.65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec					
* Mantenimiento Vial	M2	6665			Prog		6665		6665	100.0%
					Ejec		6665		6665	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	
Motoniveladora	1	1
Retroexcavadora	1	1
Volqueta 7 m3	1	1
Total	**6**	**3**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Se realizan actividades correspondientes al capítulo de mantenimiento

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: Realizar el mantenimiento vial de 6665 M2.
Ejecutado: Se realiza el mantenimiento vial de 6665 M2.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-177-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El día 8 de junio de 2023 se realizó reunión con la comunidad, alcaldía, contratista e interventoría en el sitio del proyecto donde se socializo el proyecto a ejecutar, se realizó recorrido en la vía a intervenir donde se evidencio un tramo donde para lograr los 5 metros de ancho de calzada se tiene que realizar la construcción de muros de contención, por lo que conjuntamente se decidió construir la placa huella en dos tramos saltando este sector, otra problemática que se evidencia es la construcción de las alcantarillas teniendo solamente el consentimiento por la comunidad para construir una de las cuatro alcantarillas, se recomienda a la alcaldía adelantar el permiso para la construcción de las tres alcantarillas restantes.
2. El día 22 de junio de 2023 se realizó reunión virtual entre contratista de obra, municipio e interventoría con el fin de tratar el tema de los permisos para la construcción de las 3 alcantarillas y ver el cumplimiento de la documentación para firma del acta de inicio.
3. Firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023.
4. Transporte de maquinaria (motoniveladora y retroexcavadora de ruedas) al sitio de la obra.
5. Se realizo conformación de calzada existen correspondiente al capítulo mantenimiento vial del presupuesto contractual.
6. Instalación de afirmado en puntos específicos a lo largo del corredor vial en intervención correspondiente al capítulo mantenimiento vial de las obligaciones contractuales.
7. Excavaciones varias sin clasificar correspondientes a la ampliación de calzada (5 metros) a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
8. Relleno con suelo de excavación a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
9. Transporte y acopio de subbase granular clase C al sitio del proyecto donde se desarrollará la construcción de placa huella.
10. El día 12 de julio de 2023 se realizó comité virtual conjuntamente con contratista de obra, interventoría y municipio para poder definir la ubicación definitiva de las alcantarillas contempladas en el proyecto.

Actividades realizadas en la semana
* Acopio, extensión y compactación de material de subbase clase C del corredor vial en intervención.
* Reunión el día 17 de julio de 2023 en el sitio del proyecto conjuntamente entre comunidad, contratista de obra, interventoría y municipio para poder definir los sitios donde se construirán las estructuras de drenaje (Alcantarillas) contempladas en el proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Transporte, extensión y compactación de material de subbase clase C.
2. Presentar el diseño y el balance de obra según lo tratado en comité del día 17 de julio de 2023 para atender el sector critico solicitado por la comunidad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

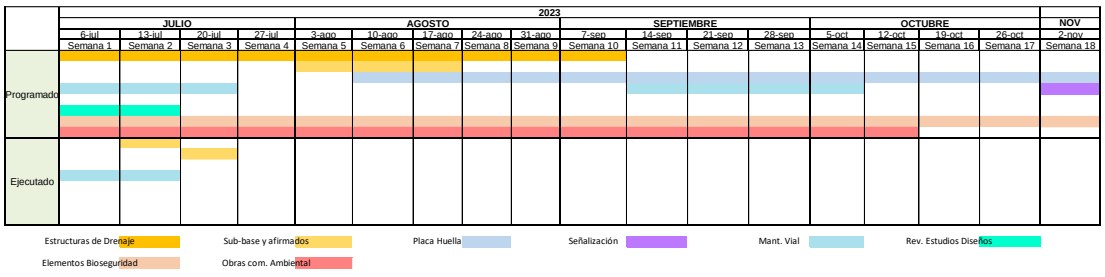

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion Dia 17 de julio de 2023



Extensión y Compactación de subbase granular



Transporte y acopio de subbase granular K0+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" y construcción de 415 ml de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán obras de drenaje y de contención que mejoren considerablemente la transitabilidad, dentro de las cuales se encuentra: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Construcción de placa huella y Mantenimiento vial

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEG	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	93	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	4/7/2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/11/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 795,011,198.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 795,011,198.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 795,011,198			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 152,578,375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 642,432,823			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 795,011,198.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 103,545,630.51	13.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152,578,375.00	19.19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 49,032,744.49	6.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103,545,630.51	13.02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 152,578,375.00	19.19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 49,032,744.49	6.17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 34,536,798.92	4.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54,540,483.00	6.86%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Con firma del acta de inicio el 4 de julio de 2023, se procede a realizar las obras programas, con el cronograma actualizado con acta de inicio se tiene un porcentaje programado de 13,02% versus un ejecutado de 19,19% generando un avance de obra de 6,17%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2.75
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 13.02%
Meta Física Ejecutada %: 19.19%
Avance o Atraso Físico %: 6.17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	415			Prog	415			415	100.0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec					
* Mantenimiento Vial	M2	6665			Prog		6665		6665	100.0%
					Ejec		6665		6665	100.0%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	
Compactador de placa o rana	2	1
Motoniveladora	1	1
Retroexcavadora	1	
Volqueta 7 m3	1	1
Total	**6**	**3**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Agosto 10 de 2023	

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 415 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas en tubería de 36¨en concreto reforzado
Ejecutado: Se realizan actividades correspondientes al capítulo de mantenimiento

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: Realizar el mantenimiento vial de 6665 M2.
Ejecutado: Se realiza el mantenimiento vial de 6665 M2.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

*Mediante oficio DON-1100-INV-177-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud de documentos socio ambientales
*Mediante oficio DON-1100-INV-195-2023, del 24 de julio, se emiten observaciones a la V1 del PAGA.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

4. Transporte de maquinaria (motoniveladora y retroexcavadora de ruedas) al sitio de la obra.
5. Se realizo conformación de calzada existen correspondiente al capítulo mantenimiento vial del presupuesto contractual.
6. Instalación de afirmado en puntos específicos a lo largo del corredor vial en intervención correspondiente al capítulo mantenimiento vial de las obligaciones contractuales.
7. Excavaciones varias sin clasificar correspondientes a la ampliación de calzada (5 metros) a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
8. Relleno con suelo de excavación a lo largo del corredor vial donde se realizará la construcción de la placa huella.
9. Transporte y acopio de subbase granular clase C al sitio del proyecto donde se desarrollará la construcción de placa huella.
10. El día 12 de julio de 2023 se realizó comité virtual conjuntamente con contratista de obra, interventoría y municipio para poder definir la ubicación definitiva de las alcantarillas contempladas en el proyecto.
11. El día 17 de julio de 2023 se realizó reunión en el sitio del proyecto conjuntamente entre comunidad, contratista de obra, interventoría y municipio para poder definir los sitios donde se construirán las estructuras de drenaje (Alcantarillas) contempladas en el proyecto.
Actividades realizadas en la semana
* Acopio, extensión y compactación de material de subbase clase C del corredor vial en intervención.
* El día 26 de julio de 2023 se realiza reunión virtual para analizar el pre balance presentado por el contratista de obra donde se evidencia la factibilidad para la construcción de la alcantarilla con doble tubería de 36¨ en concreto reforzado y una altura de 4.5 metros.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Transporte, extensión y compactación de material de subbase clase C.
2. Presentar el diseño de la alcantarilla con doble tubería de 36¨en concreto reforzado y una altura de 4.5 metros para poder actualizar el balance de obra inicial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

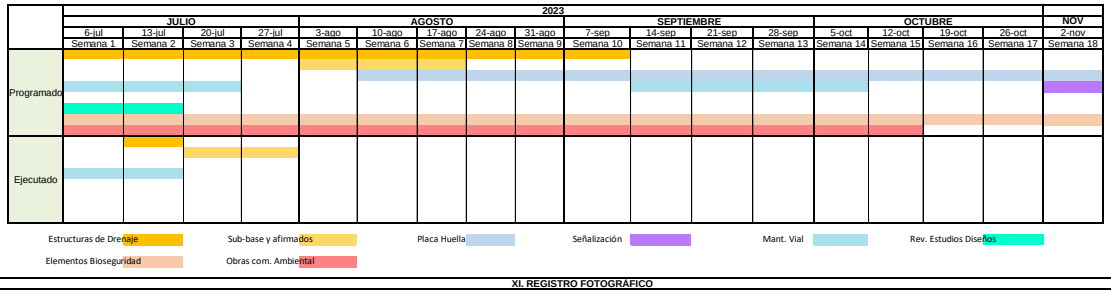

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


Extensión y nivelación de material de Subbase


Compactación de material de subbase


Extensión y nivelación de material de subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
Revisión de la calidad de los materiales empleados.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, lo anterior buscando dinamizar el avance del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.1.9 INZA 1983 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 30 del 30/6/2023 al 6/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	141 DE 2022	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 608,231,289.49	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 608,231,289.49	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 182,469,386.85	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 182,469,386.85	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 608,231,289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 87,147,295			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 521,083,994			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 608,231,289.49**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 516,064,075.91	84.85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87,147,295.00	14.33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (428,916,780.91)	-70.52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 516,064,075.91	84.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 87,147,295.00	14.33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (428,916,780.91)	-70.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades de acopio de material y forja de acero para la ejecución de obra, por tanto, la obra ejecutada acumulada está en 14,33. Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 84,85% ejecutado 14,33% atraso de 70,52%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 182,469,386.85
Amortizado $	$
Saldo $	$ 182,469,386.85

INDICADOR IFC	
En el mes:	**3.80**
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84.85% — Avance o Atraso Físico % -70.52%
Meta Física Ejecutada % 14.33%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
*	Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100.0%
						Ejec	0.00			0.00	
*	Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Afirmado	KM	3.07	3.07		Prog	3.07			3.07	100.0%
						Ejec				0	
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	**4**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado: Aún no se inician las actividades en obra
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-139-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-150-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza recorrido de obra solicitando al contratista el envío de las actividades pendientes, Se realiza oficio con solicitud de envío de información como lo es el plan de gestión social, actas de vecindad e información de la valla informativa, como también acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El día 28 de abril se firma el acta de inicio en una reunión entre, jefe de infraestructura, contratista e interventoria.
2. El día 08 de mayo se realiza la socialización del contrato, en reunión con la comunidad.
3. El día 1 de junio se envía oficio DON-1100-INV-129-2023a contratista y municipio Con asunto de PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONVENIO 1983-2023.
4. El día 5 de junio se realiza una reunión virtual con contratista, interventoría y municipio.
5. El día 7 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia que aún no se han empezado obras por parte del contratista.
6. El día 23 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia la ausencia de trabajadores en la obra por parte del contratista puesto que indican que tuvieron inconvenientes con la maquinaria, de igual manera se evidencia que intentaron intervenir los puntos críticos para mejorar el acceso a la zona y por ende la llegada de todo el material para continuar con los trabajos por parte del contratista, pero el material que se utilizó no fue el adecuado.
7. Para el día 28 de junio el contratista ya cuenta con acopio de material tanto para la conformación, recuperación de alcantarillas y para la placa huella.
8. El día jueves 6 de julio se realizo la visita al punto de obra y se evidencia que en cuanto a acero se lleva un avance de un 30% y para lo que se refiere a el mejoramiento de el tramo un avance desde el punto de inicio hasta 3 km mas adelante, pero se obsrva que el material utilizado para el mejoramiento no responde adecuadamente para el mejoramiento como tal del tramo vial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

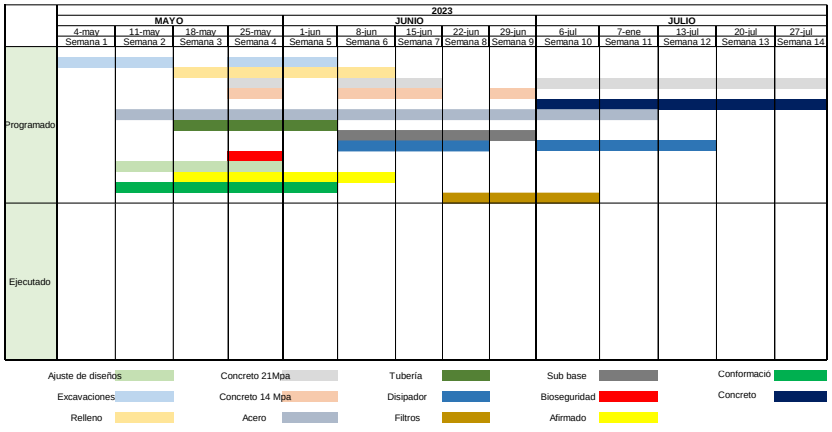

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Visita Tomichuque


Visita Tombichucue


Visita Tombichucue

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Matrícula Profesional No.: 252022362260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	141 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 608,231,289.49	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/7/2023	VALOR ACUMULADO: $ 608,231,289.49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/7/2023	VALOR ANTICIPO: $ 182,469,386.85	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR $ 182,469,386.85			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608,231,289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 112,017,576			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 496,213,713			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,379,526,878			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608,231,289.49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 569,201,215.42	93.58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (457,183,639.42)	-75.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 569,201,215.42	93.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (457,183,639.42)	-75.17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52,597,136.61	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,870,280.90	4.09%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades de acopio de material y forja de acero para la ejecución de obra, por tanto, la obra ejecutada acumulada está en 14,33. Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 84,85% ejecutado 14,33% atraso de 70,52%.

ANTICIPOS		
Otorgado $		$ 182,469,386.85
Amortizado $		$ -
Saldo $		$ 182,469,386.85

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

INDICADOR I/C	
En el mes:	3.22
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 93.58%
Meta Física Ejecutada % 18.42%
Avance o Atraso Físico % -75.17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad		Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Estudios y diseños	GLB	1		1		Prog	1			1	100.0%
						Ejec	0.00			0.00	
* Placa Huella	ML	240		240		Prog	240			240	100.0%
						Ejec	0			0	
* Alcantarillas	UND	4		4		Prog	4			4	100.0%
						Ejec	0			0	
* Afirmado	KM	3.07		3.07		Prog	3.07			3.07	100.0%
						Ejec				0	
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado: Aún no se inician las actividades en obra
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	**4**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

*Mediante oficio DON-1100-INV-139-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-150-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-170-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

1. El día 28 de abril se firma el acta de inicio en una reunión entre, jefe de infraestructura, contratista e interventoría.
2. El día 08 de mayo se realiza la socialización del contrato, en reunión con la comunidad.
3. El día 1 de junio se envía oficio DON-1100-INV-129-2023a contratista y municipio Con asunto de PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONVENIO 1983-2023.
4. El día 5 de junio se realiza una reunión virtual con contratista, interventoría y municipio.
5. El día 7 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia que aún no se han empezado obras por parte del contratista.
6. El día 23 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia la ausencia de trabajadores en la obra por parte del contratista puesto que indican que tuvieron inconvenientes con la maquinaria, de igual manera se evidencia que intentaron intervenir los puntos críticos para mejorar el acceso a la zona y por ende la llegada de todo el material para continuar con los trabajos por parte del contratista, pero el material que se utilizó no fue el adecuado.
7. Para el día 28 de junio el contratista ya cuenta con acopio de material tanto para la conformación, recuperación de alcantarillas y para la placa huella.
8. El día jueves 6 de julio se realizo la visita al punto de obra y se evidencia que en cuanto a acero se lleva un avance de un 30% y para lo que se refiere a el mejoramiento de el tramo un avance desde el punto de inicio hasta 3 km mas adelante, pero se obsrva que el material utilizado para el mejoramiento no responde adecuadamente para el mejoramiento como tal del tramo vial.
9. El dia 10 de julio se realiza reunion junto a contratista, municipio para dialogar acerca de presuntos inconvenientes que se han llevado para la ejecución de este contrato.
10. Se continua con acopio de material y trabajos de conformacion con material de una cantera diferente para dar solucion al capitulo de conformacion en calzada existente.


ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

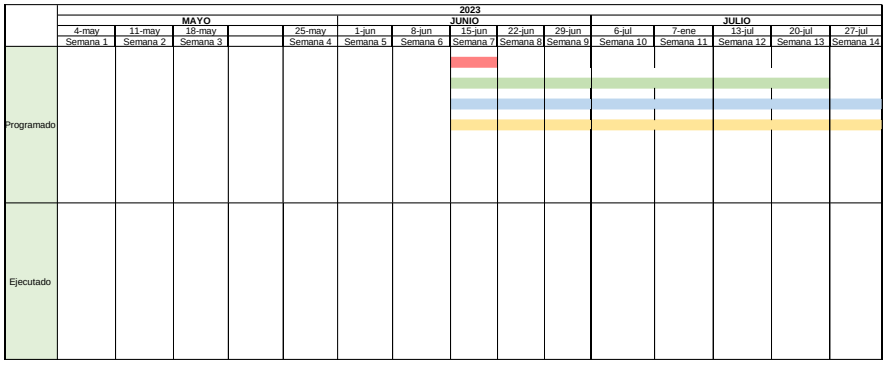

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión Popayán, contratista, interventoria y municipio.



Conformación calzada existenteTombichucue



Conformación calzada existenteTombichucue

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INZA 2022	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PIAMBA HOYOS	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONSORCIADOS	MARNDURAN COLOMBIA S.A.S (5%) CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO (95%)		
CONTRATO No.	141 DE 2022	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/7/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 608,231,289.49	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 608,231,289.49	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ 182,469,386.85	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 182,469,386.85	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 608,231,289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 112,017,576			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 496,213,713			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608,231,289.49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 593,701,276.31	97.61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (481,683,700.31)	-79.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593,701,276.31	97.61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (481,683,700.31)	-79.19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,500,060.89	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades de acopio de material y forja de acero para la ejecución de obra, por tanto, la obra ejecutada acumulada está en 18,42% Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 97,61% ejecutado 18,42% atraso de 79,19%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93,026,869.60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	182,469,386.85
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	182,469,386.85

INDICADOR I/C	
En el mes:	3.48
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 97.61%
Meta Física Ejecutada %: 18.42%
Avance o Atraso Físico %: -79.19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Estudios y diseños	GLB	1	1		Prog	1			1	100.0%
						Ejec	0.00			0.00	
*	Placa Huella	ML	240	240		Prog	240			240	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Alcantarillas	UND	4	4		Prog	4			4	100.0%
						Ejec	0			0	
*	Afirmado	KM	3.07	3.07		Prog	3.07			3.07	100.0%
						Ejec				0	
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado: Aún no se inician las actividades en obra

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

*Mediante oficio DON-1100-INV-139-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-150-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-170-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

1. El día 28 de abril se firma el acta de inicio en una reunión entre, jefe de infraestructura, contratista e interventoría.
2. El día 08 de mayo se realiza la socialización del contrato, en reunión con la comunidad.
3. El día 1 de junio se envía oficio DON-1100-INV-129-2023a contratista y municipio Con asunto de PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONVENIO 1983-2023.
4. El día 5 de junio se realiza una reunión virtual con contratista, interventoría y municipio.
5. El día 7 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia que aún no se han empezado obras por parte del contratista.
6. El día 23 de junio se realiza visita al punto de obra donde se evidencia la ausencia de trabajadores en la obra por parte del contratista puesto que indican que tuvieron inconvenientes con la maquinaria, de igual manera se evidencia que intentaron intervenir los puntos críticos para mejorar el acceso a la zona y por ende la llegada de todo el material para continuar con los trabajos por parte del contratista, pero el material que se utilizó no fue el adecuado.
7. Para el día 28 de junio el contratista ya cuenta con acopio de material tanto para la conformación, recuperación de alcantarillas y para la placa huella.
8.El día jueves 6 de julio se realizo la visita al punto de obra y se evidencia que en cuanto a acero se lleva un avance de un 30% y para lo que se refiere a el mejoramiento de el tramo un avance desde el punto de inicio hasta 3 km mas adelante, pero se obsrva que el material utilizado para el mejoramiento no responde adecuadamente para el mejoramiento como tal del tramo vial.
9. El día 10 de julio se realiza reunion junto a contratista, municipio para dialogar acerca de presuntos inconvenientes que se han llevado para la ejecución de este contrato.
10. Se continua con acopio de material y trabajos de conformacion con material de una cantera diferente para dar solucion al capitulo de conformacion en calzada existente.
11. Para el dia 18 se tiene programada reunión en el municipio de inza, para concretar temas relacionados con incumplimiento del contratista en lo que se refiere a el mejoramiento de la via y por deslizamientos en la via que comunica popayán - inza no es posible la llegada a la reunión.
12.se realiza comite virtual el dia 18 de julio donde se encuentran, comunidades, municipio, interventoria y contratista donde se le observa a el contratista acerca del material que esta utilizando para el mejoramiento ya que no sigue siendo el adecuado, se le solicita al contratista realizar ensayos de laboratorio del material nuevo a utilizar y se programa para el dia siguiente la visita a la zona.
13. El 19 de julio la via popayán - inza sigue igual con un fuerte deslizamiento y no es posible llegar a realizar la visita a la zona y reunión con municipio, contratista y comunidad, se espera que se den las condiciones para poder realizar la visita.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Ejecutado																	

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



eunión Popayán, contratista, interventoria y municipio. Derrumbe en la vi

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto – long = 240m - conformación de calzada existente y afirmado, recuperación de alcantarillas, intervención en la vía San Andrés - Pisimbala - Alto Pisimbala - Tumbichucue con 14.2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El corredor postulado VIA SAN ANDRES – PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE, mediante el mantenimiento de la vía donde comprende la conformación, riego de material granular y compactación del mismo, la recuperación de bateas, pontones, alcantarillas, y demás estructuras que estén afectadas y mediante obras de mitigación se pueda prolongar la vida útil.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022
REPRESENTANTE LEGAL: JAMES PIAMBA HOYOS
CONSORCIADOS: MARNDURAN COLOMBIA S.A.S (5%); CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO (95%)

CONTRATO No.	141 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 608,231,289.49
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/7/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 608,231,289.49
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/7/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 182,469,386.85
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 182,469,386.85

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 608,231,289			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 112,017,576			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 496,213,713			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 608,231,289.49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 601,516,253.67	98.90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (489,498,677.67)	-80.48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,516,253.67	98.90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,017,576.00	18.42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (489,498,677.67)	-80.48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,814,977.36	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades de acopio de material y forja de acero para la ejecución de obra, por tanto, la obra ejecutada acumulada está en 18,42% Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 98,90% ejecutado 18,42% atraso de 80,48%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	182,469,386.85
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	182,469,386.85

INDICADOR I/C	
En el mes:	3.75
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 98.90%
Meta Física Ejecutada % 18.42%
Avance o Atraso Físico % -80.48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad		Vigencia 2022	Vigencia 2023
* Estudios y diseños	GLB	1		1	
* Placa Huella	ML	240		240	
* Alcantarillas	UND	4		4	
* Afirmado	KM	3.07		3.07	
*					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	1			1	100.0%
Ejec	0.00			0.00	
Prog	240			240	100.0%
Ejec	0			0	
Prog	4			4	100.0%
Ejec	0			0	
Prog	3.07			3.07	100.0%
Ejec				0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado : 240 ml de placa huella, 4 alcantarillas y 3.07 km de afirmado
Ejecutado: Aún no se inician las actividades en obra
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador 7 Ton	1	
Retrocargador	1	
Volqueta 6	1	
Total	**4**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN		
	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

*Mediante oficio DON-1100-INV-139-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-150-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-170-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socioambientales.

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

8.El día jueves 6 de julio se realizo la visita al punto de obra y se evidencia que en cuanto a acero se lleva un avance de un 30% y para lo que se refiere a el mejoramiento de el tramo un avance desde el punto de inicio hasta 3 km mas adelante, pero se observa que el material utilizado para el mejoramiento no responde adecuadamente para el mejoramiento como tal del tramo vial.
9. El día 10 de julio se realiza reunión junto a contratista, municipio para dialogar acerca de presuntos inconvenientes que se han llevado para la ejecución de este contrato.
10. Se continua con acopio de material y trabajos de conformación con material de una cantera diferente para dar solución al capitulo de conformación en calzada existente.
11. Para el día 18 se tiene programada reunión en el municipio de Inzá, para concretar temas relacionados con incumplimiento del contratista en lo que se refiere a el mejoramiento de la vía y por deslizamientos en la vía que comunica Popayán - Inzá no es posible la llegada a la reunión.
12.se realiza comité virtual el día 18 de julio donde se encuentran, comunidades, municipio, interventoría y contratista donde se le observa a el contratista acerca del material que esta utilizando para el mejoramiento ya que no sigue siendo el adecuado, se le solicita al contratista realizar ensayos de laboratorio del material nuevo a utilizar y se programa para el día siguiente la visita a la zona.
13. El 19 de julio la vía Popayán - Inzá sigue igual con un fuerte deslizamiento y no es posible llegar a realizar la visita a la zona y reunión con municipio, contratista y comunidad, se espera que se den las condiciones para poder realizar la visita.
14. Continúan los inconvenientes en cuanto a deslizamientos para desplazarse hacia el municipio de INZA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

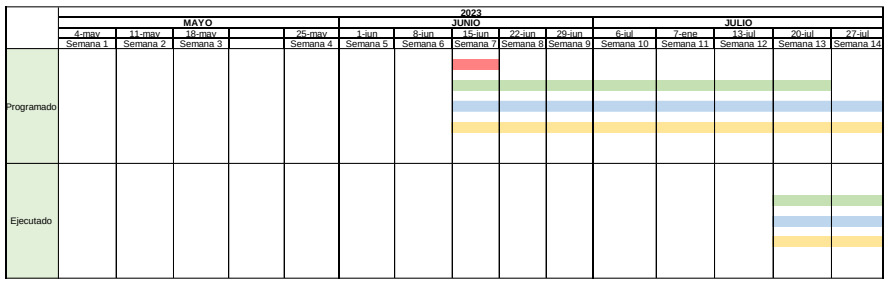

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Deslizamientos en la vía

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de la obligación del contratista. Verificar cantidades, diseño y correcta ejecución de las actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPINAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

- Informe Semanal 30 - 20230630 – 20230706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 30 (Numeración consecutiva) del 30/6/2023 al 6/7/2023 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA LOPEZ ERASO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022		
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO		
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL:	$ 912,367,379.00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 912,367,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
MODIFICATORIO No. 1:	30/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912,367,379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 41,858,460			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 870,508,919			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 331,271,709			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,409,041,411			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912,367,379.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 179,028,418.79	19.62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41,858,460.00	4.59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (137,169,958.79)	-15.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,028,418.79	19.62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41,858,460.00	4.59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (137,169,958.79)	-15.03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 0.00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades para las alcantarillas,por lo tanto, la obra ejecutada acumulada está en 4,59. Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 19,62% ejecutado 4,59% atraso de 15,03%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331,271,708.61	19.04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,720,132.28	1.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/07/2023
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA: $ 132,658,820.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	7.91
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19.62%
Meta Física Ejecutada % 4.59%
Avance o Atraso Físico % -15.03%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100.0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100.0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: *Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Se realiza acompañamiento para levantamiento de actas de vecindad en la vereda Mandivá contando con el acompañamiento del contratista y el representante del grupo de Veeduría.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría pólizas actualizadas y el Otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.
3. Comité en infraestructura del municipio de Santander de Quilichao entre el contratista, supervisor e interventoría, se solicita nuevamente los estudios y diseños por parte de la interventoría, solicitud de acta de inicio con inicio del 01 de junio del 2023 por parte del contratista.
4. Se firma acta de inicio el día 1 de junio de 2023.
5. Mediante correo electrónico enviado el día 28 de junio de 2023 la interventoría solicita al contratista de obra la actualización de pólizas, programación de obra y flujo de caja actualizado con fecha de acta de inicio.
6. El día 7 de julio se realiza visita al punto de obra y se evidencia que el contratista ya dio inicio a el contrato, en la visita se evidencia que ya se realizaron actividades con respecto a las alcantarillas donde se refleja un avance en la instalación de 4 tuberías.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista de obra para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.
2. Verificar el cumplimiento de las solicitudes enviadas mediante correo del 28 de junio de 2023.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha no hay Programación de obra, tampoco hay acta de inicio de la ejecución de la obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación tubería 36"



Conformación de calzada existente



Conformación de calzada existente

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
La Interventoría solicitara reiteradamente al contratista la entrega de estudios y diseños y documentos previos a inicio de las obras del convenio. Revisión de programado y flujo de caja.	FIRMA NOMBRE: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ Matrícula Profesional No.: 25202236260-CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 31 - 20230707 – 20230713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 31 del 7/7/2023 al 13/7/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022		INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	
CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL: $ 912,367,379.00	CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO: $ 912,367,379.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/10/2023	VALOR ANTICIPO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:
MODIFICATORIO No. 1:	30/12/2022	VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO:
		SALDO POR AMORTIZAR $ -			SALDO POR AMORTIZAR:

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912,367,379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53,818,020			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 858,549,359			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	#¡REF!			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 360,786,242			
	SALDO DE VIGENCIA	#¡REF!			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912,367,379.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 236,145,753.70	25.88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53,818,020.00	5.90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (182,327,733.70)	-19.98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 236,145,753.70	25.88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53,818,020.00	5.90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (182,327,733.70)	-19.98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57,117,334.80	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,258,874.80	1.67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades para las alcantarillas,por lo tanto, la obra ejecutada acumulada está en 4,59. Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 19,62% ejecutado 4,59% atraso de 15,03%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,786,242.16	20.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	6.70
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 25.88%
Meta Física Ejecutada %: 5.90%
Avance o Atraso Físico %: -19.98%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100.0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100.0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
*										

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	6	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN	Municipio de caloto, Vereda la Dominga, mina patigordo	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Título minero EJ3-102 y Resolución 0794 del 18 de diciembre del 2007 de la C.R.C, vigente hasta el 2038

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-166-2023 del 07 de julio de junio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-185-2023 del 12 de julio de junio, se emiten observaciones a la V1 del PAGA

OBSERVACIONES:N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Realiza comité contando con la participación del contratista, secretaria de planeación del Municipio e interventoría en ella se solicitó el envió de PAGA, información del diseño de valla publicitaria, resolución de veeduría y actas de vecindad de inicio
se realiza revisión de PAGA emitiendo observaciones al documento.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría pólizas actualizadas y el Otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.
3. Comité en infraestructura del municipio de Santander de Quilichao entre el contratista, supervisor e interventoría, se solicita nuevamente los estudios y diseños por parte de la interventoría, solicitud de acta de inicio con inicio del 01 de junio del 2023 por parte del contratista.
4. Se firma acta de inicio el día 1 de junio de 2023.
5. Mediante correo electrónico enviado el día 28 de junio de 2023 la interventoría solicita al contratista de obra la actualización de pólizas, programación de obra y flujo de caja actualizado con fecha de acta de inicio.
6. El día 7 de julio se realiza visita al punto de obra y se evidencia que el contratista ya dio inicio a el contrato, en la visita se evidencia que ya se realizaron actividades con respecto a las alcantarillas donde se refleja un avance en la instalación de 4 tuberías.
7. Se continua con la excavación e instalación de la tuveria para las alcantarillas se realizan 2 mas, puesto que se presentan inconvenientes con la comunidad a la hora del cierre de la via para realizar las actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista de obra para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.
2. Verificar el cumplimiento de las solicitudes enviadas mediante correo del 28 de junio de 2023.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

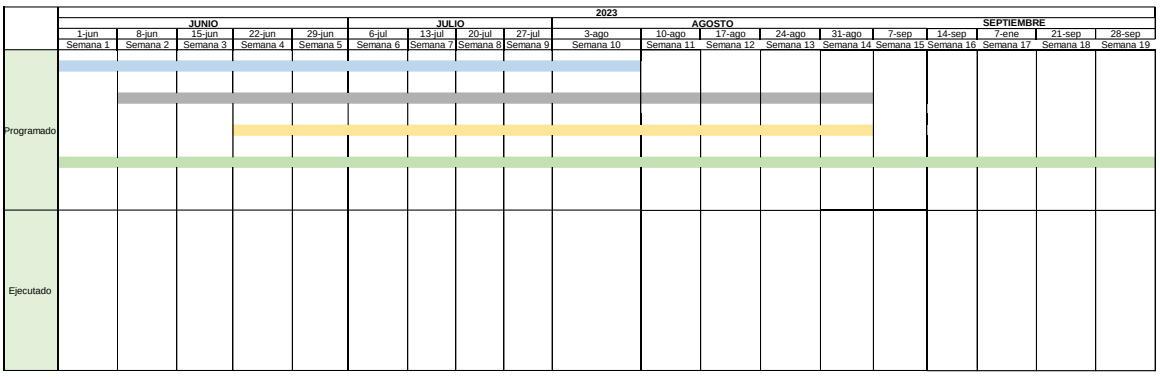

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación



Excavación para instalación de tuberia



ión para instalación de tuberia, mandiva santander de c

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al contratista la entrega de estudios y diseños y documentos previos a inicio de las obras del convenio.
Revisión de programado y flujo de caja.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 32 - 20230714 – 20230720

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 32 del 14/7/2023 al 20/7/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURAL 2022	INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONSORCIADOS	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (70%) HEBERT LIZARDO DORADO DORADO (30%)		
CONTRATO No.	484 2022	CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/10/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023
MODIFICATORIO No. 1:	30/12/2022		
VALOR INICIAL:	$ 912,367,379.00	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 912,367,379.00	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912,367,379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54,860,479			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 857,506,900			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 390,300,776			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,350,012,344			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	912,367,379.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	285,586,674.00	31.30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	54,860,478.80	6.01%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(230,726,195.20)	-25.29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	285,586,674.00	31.30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	54,860,478.80	6.01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(230,726,195.20)	-25.29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	49,440,930.30	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	1,042,458.75	0.11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades para las alcantarillas,por lo tanto, la obra ejecutada acumulada está en 6,01. Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un programado 31,30% ejecutado 6,01% atraso de 25,29%.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	390,300,775.71	22.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	390,300,775.71	22.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	7.11
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada: 31.30%
Meta Física Ejecutada %: 6.01%
Avance o Atraso Físico %: -25.29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100.0%
						Ejec					
*	Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100.0%
						Ejec					
*	Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100.0%
						Ejec					
*	Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100.0%
						Ejec					
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de caloto, Vereda la Dominga, mina patigordo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero EJ3-102 y Resolución 0794 del 18 de diciembre del 2007 de la C.R.C, vigente hasta el 2038

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-166-2023 del 07 de julio de junio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-185-2023 del 12 de julio de junio, se emiten observaciones a la V1 del PAGA

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra el día 17 de julio, se evidencia escasa señalización de las excavaciones hechas para alcantarillas y filtro, así mismo la obra no cuenta con acopio temporal para las bolsas de cemento, que se encuentran en algunos tramos de la vía sin disponer; Mencionado lo anterior, se recomienda señalizar más los frentes de obra, con avisos como "excavación profunda" y más hiladas de cinta amarilla, para una mayor prevención a los transeúntes de la vereda. Por otro lado, la maquinaria evidenciada en obra, retroexcavadora tipo pajarita y volqueta doble troque, no ha sido enviada su documentación para ser aprobada por la interventoría, según el factor de calidad ofertado.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El 17 de julio se realiza reunión con propietario del predio de la alcantarilla N1 ya que realizó la solicitud de que no se realizará reposición ya que afectaría más el predio, en la visita se estableció realizar la alcantarilla metros más arriba contando con los permisos de los propietarios. ya que se encontraba presente la veeduría y representante de la alcaldía se comunicó que las personas de la zona de influencia no están respetando los pares y se pasan estando la maquinaria trabajando, se solicitó se coordinará reunión para poder socializar los cierres una vez se inicie con la contracción de la placa huella.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría polizas actualizadas y el Otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.
3. Comité en infraestructura del municipio de Santander de Quilichao entre el contratista, supervisor e interventoría, se solicita nuevamente los estudios y diseños por parte de la interventoría, solicitud de acta de inicio con inicio del 01 de junio del 2023 por parte del contratista.
4. Se firma acta de inicio el día 1 de junio de 2023.
5. Mediante correo electrónico enviado el día 28 de junio de 2023 la interventoría solicita al contratista de obra la actualización de pólizas, programación de obra y flujo de caja actualizado con fecha de acta de inicio.
6. El día 7 de julio se realiza visita al punto de obra y se evidencia que el contratista ya dio inicio a el contrato, en la visita se evidencia que ya se realizaron actividades con respecto a las alcantarillas donde se refleja un avance en la instalación de 4 tuberías.
7. Se continua con la excavación e instalación de la tuveria para las alcantarillas se realizan 2 mas, puesto que se presentan inconvenientes con la comunidad a la hora del cierre de la via para realizar las actividades.
8. Continuan con la excavación e instalación para alcantarillas y de igual manera excavación para filtro.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista de obra para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.
2. Verificar el cumplimiento de las solicitudes enviadas mediante correo del 28 de junio de 2023.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	2023																			
	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					
	1-jun	8-jun	15-jun	22-jun	29-jun	6-jul	13-jul	20-jul	27-jul	3-ago	10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	7-sep	14-sep	7-ene	21-sep	28-sep	
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	
Programado																				

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Ejecutado																				

CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ALCANTARILLAS

CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO

CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO

CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Maquinaria en obra



escasa señalizacion en excavaciones profundas



Bolsas de cemento sin disponer

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al contratista la entrega de estudios y diseños y documentos previos a inicio de las obras del convenio.
Revisión de programado y flujo de caja.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 33 - 20230721 - 20230727

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/7/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECT: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 21/7/2023 al 27/7/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR RUIZ SANTOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción y recuperación alcantarillas, construcción de placa huella en concreto longitud = 496m, conformación de calzada existente y afirmado, construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En el corredor vial Panamericana - Alto san José, se realizarán obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades constructivas a desarrollar: Construcción de placa huella, Construcción y/o reparación de obras de drenaje (alcantarillas y bateas), construcción de Muros de contención.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURAL 2022
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCISAR CALVO CASTRO (70%); HEBERT LIZARDO DORADO DORADO (30%)

CONTRATO No.	484 2022	VALOR INICIAL:	$ 912,367,379.00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 912,367,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
MODIFICATORIO No. 1:	30/12/2022	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 912,367,379			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70,931,828			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 841,435,551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,740,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419,815,309			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,320,497,811			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 912,367,379.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 304,194,049.00	33.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70,931,828.40	7.77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (233,262,220.60)	-25.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 304,194,049.00	33.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70,931,828.40	7.77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (233,262,220.60)	-25.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,607,375.00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,992,599.60	1.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419,815,309.26	24.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,514,533.55	1.70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 65120 - 19/07/2023
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: 93.026.869,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

Observaciones: A la fecha el contratista sigue con las actividades para las alcantarillas, Teniendo en cuenta la programación entregada el contratista se tiene un porcentaje de programado de 33,34%, ejecutado 7,77% atraso de 25,57%.

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de directora de interventoría, residente técnico 1, residente auxiliar 3, Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra 3. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 1 camioneta y de 7 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán, comunicación, edición de informes, topografía, ensayos de laboratorio de suelos y veedurías técnicas comunitarias.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

INDICADOR I/C	
En el mes:	5.92
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada 33,34% Avance o Atraso Físico % -25,57%
Meta Física Ejecutada % 7,77%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Recuperación de Alcantarillas	UND	3			Prog	3			3	100.0%
					Ejec					
* Placa Huella	ML	496			Prog	496			496	100.0%
					Ejec					
* Muro reforzado H=4m	ML	30			Prog	30			30	100.0%
					Ejec					
* Muro en gaviones H=3m	ML	10			Prog	10			10	100.0%
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Compactador Manual	1	
Volqueta	2	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 496 ml de placa huella, reparación de 3 alcantarillas, un muro de contención y un muro en gavión
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN Municipio de caloto, Vereda la Dominga, mina patigordo — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero EJ3-102 y Resolución 0794 del 18 de diciembre del 2007 de la C.R.C, vigente hasta el 2038

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023, se hace la primera solicitud de documentos ambientales referentes al PAGA, el 16 de junio.
*Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-166-2023 del 07 de julio de junio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-185-2023 del 12 de julio de junio, se emiten observaciones a la V1 del PAGA

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra el día 17 de julio, se evidencia escasa señalización de las excavaciones hechas para alcantarillas y filtro, así mismo la obra no cuenta con acopio temporal para las bolsas de cemento, que se encuentran en algunos tramos de la vía sindisponer; Mencionado lo anterior, se recomienda señalizar más los frentes de obra, con avisos como "excavación profunda" y más hiladas de cinta amarlla, para una mayor prevención a los transeúntes de la vereda. Por otro lado, la maquinaria evidenciada en obra, retroexcavadora tipo pajarita yvolqueta doble troque, no ha sido enviada su documentación para ser aprobada por la interventoría, según el factor de calidad ofertado.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El 17 de julio se realiza reunión con propietario del predio de la alcantarilla N1 ya que realizó la solicitud de que no se realizará reposición ya que afectaría más el predio, en la visita se estableció realizar la alcantarilla metros más arriba contando con los permisos de los propietarios. ya que se encontraba presente la veeduría y representante de la alcaldía se comunicó que las personas de la zona de influencia no están respetando los pares y se pasan estando la maquinaria trabajando, se solicitó se coordinará reunión para poder socializar los cierres una vez se inicie con la contracción de la placa huella.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicación CVR22-004-2023 del 20 de febrero el contratista allego a la interventoría pólizas actualizadas y el Otro si firmado.
2. El 23 de febrero se realizó comité técnico en la territorial Cauca, donde el contratista y la entidad se comprometieron a dar celeridad al proceso de legalización del contrato para inicio de las obras del contrato.
3. Comité en infraestructura del municipio de Santander de Quilichao entre el contratista, supervisor e interventoría, se solicita nuevamente los estudios y diseños por parte de la interventoría, solicitud de acta de inicio con inicio del 01 de junio del 2023 por parte del contratista.
4. Se firma acta de inicio el día 1 de junio de 2023.
5. Mediante correo electrónico enviado el día 28 de junio de 2023 la interventoría solicita al contratista de obra la actualización de pólizas, programación de obra y flujo de caja actualizado con fecha de acta de inicio.
6. El día 7 de julio se realiza visita al punto de obra y se evidencia que el contratista ya dio inicio a el contrato, en la visita se evidencia que ya se realizaron actividades con respecto a las alcantarillas donde se refleja un avance en la instalación de 4 tuberías.
7. Se continua con la excavación e instalación de la tuveria para las alcantarillas se realizan 2 mas, puesto que se presentan inconvenientes con la comunidad a la hora del cierre de la via para realizar las actividades.
8. Continuan con la excavación e instalación para alcantarillas y de igual manera excavación para filtro.
9. Se evidencia la ejecución e instalacion completa de tuberia para 8 alcantarillas, de igual manera excavación para filtro y un avance de 20% en actividades de trabajo de acero para la construcción y recuperacción de las alcantarillas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista de obra para la entrega de documentos previos al inicio de las obras.
2. Verificar el cumplimiento de las solicitudes enviadas mediante correo del 28 de junio de 2023.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

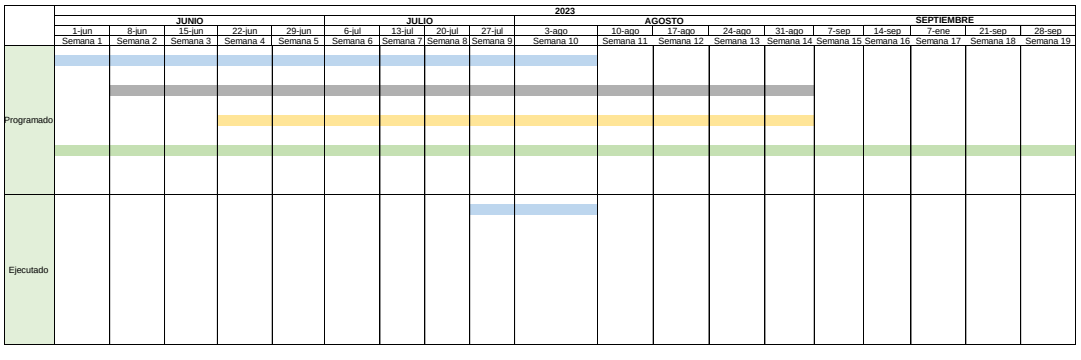

CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ALCANTARILLAS
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO
CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO REFORZADO
CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORO

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entrada a la obra



Actividades de acero para alcantarillas



Actividades de acero para alcantarillas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría solicitara reiteradamente al contratista la entrega de documentos previos a inicio de las obras del convenio.
Revisión de programado y flujo de caja.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se realiza seguimiento de maquinaria y equipos mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 maquinaria y equipo cto obra para los municipios que se encuentran en ejecución.

4.2.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

CONTRATO No. ARG-OBRA-009-2022 **CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA (pajarita)	CASE		V. El encanto			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
VIBROCOMPACTADOR			V. El encanto			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
MOTONIVELADORA			V. El encanto			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo mínimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: William Alcides Sanchez fajardo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO No. 258-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G I A S. A. S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE		V. La Ceja																	A	A													
MINICARGADOR	BOBCAT		V. La Ceja																	A	A	A	A	A										
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo minimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Paola Andrea Arteaga Jaramillo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO No. LP-090-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE 580		V. La Balastrera																										A	A	A	A		
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23

PROYECTO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO No. 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROCARGADOR	JCB EX												A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jhaner Segovia Quinteto
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO No. LP 04-003-15.05/058 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA (oruga)	CAT		CHALGUAYACO																															
VOLQUETA	DODGE	8M3	CHALGUAYACO																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo minimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Habert Lizardo Dorado Dorado
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO No. F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA	DODGE	8M	HATO HUMUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo mínimo en obra, según pliego de condiciones.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.7 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATO No. No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 **CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHAMPION 720A	6,7LIT	CHILCO						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	4.5	CHILCO						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETAS	CHEVROLET	6M3	CHILCO						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA	DIESEL	1 BULTO	CHILCO						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo minimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Henry Andres Gomez Rengifo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.8 INZA 1983 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATO No. 141 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR		CALDERAS			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		CALDERAS			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		CALDERAS			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo mínimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: James Piamba Hoyos
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.9 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO No. 484-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE		V. Mandiva																	A	A	A	A	A										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha del siguiente reporte, no se tiene aprobada el equipo mínimo en obra, según pliego de condiciones y/o anexo tecnico.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se realiza seguimiento al personal y pago de seguridad social mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 personal control aportes legales y seguridad social obra.

4.3.1 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO | VERSIÓN: 1 | PÁGINA | FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	QUINTO TORRES GRATINIANO	10526433	Maestro	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Asmet salud		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
2	SACANAMBOY MUÑOZ AMADOR	4628251	Ayudante Obra	$ 1,160,000																														×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 2,700	V	AIC		$ 1,600	Porvenir		$ 6,200	$ 1,600	$ -	$ -	RETIRO
3	BENAVIDEZ IMBACHI BRAYAN ARIEL	1058972340	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Asmet salud		$ 46,400	proteccion		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
4	BENAVIDES SACANAMBOY EDUARDO ARIEL	76221937	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Asmet salud		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
5	GOMEZ SAMBONI MANUEL FERNANDO	1144068385	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Sanitas		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
6	GALINDEZ ZUÑIGA URIEL	1002805762	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Asmet salud		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
7	ANACONA OLMER	10316081	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Nueva eps		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
8	BENAVIDES VELASCO ALEJANDRO	1002805834	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Nueva eps		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
9	BENAVIDES NELSON	1058969724	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	AIC		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
10	CARLOSAMA CARLOS	1007311034	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	AIC		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
11	MARTINEZ YHAN	1002806128	Ayudante Obra	$ 1,160,000																											×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 8,100	V	AIC		$ 4,700	Porvenir		$ 18,600	$ 4,700	$ -	$ -	RETIRO
12	PEREZ JUAN	1002805701	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Asmet salud		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	RETIRO
13	PEREZ NILSON	1058977115	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Sanitas		$ 46,400	proteccion		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
14	SACANAMBOY CESAR	1002806335	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Nueva eps		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
15	VARGAS JORGE	1061738306	Ayudante Obra	$ 1,160,000	×	×	×		×	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,800	V	Emssanar		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
16	CAICEDO JAVIER	10317005	Ayudante Obra	$ 1,160,000																	×				×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 80,801	V	Emssanar		$ 46,400	Porvenir		$ 185,600	$ 46,600	$ -	$ -	
17	IMBACHI ELIAN	1058962621	Ayudante Obra	$ 1,160,000																	×				×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 29,700	V	Emssanar		$ 17,101	Porvenir		$ 68,100	$ 17,100	$ -	$ -	
18	JURADO EDWIN	4666942	Ayudante Obra	$ 1,160,000																	×				×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 29,700	V	Emssanar		$ 17,102	Porvenir		$ 68,100	$ 17,100	$ -	$ -	
19	ORTIZ EDINSON	1058967027	Ayudante Obra	$ 1,160,000																											×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 13,500	V	Asmet salud		$ 7,800	Porvenir		$ 31,000	$ 7,800	$ -	$ -	
20	ZUÑIGA ELMER	87246819	Ayudante Obra	$ 1,160,000																	×				×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	Consorcio Onix CCM	$ 1,160,000	$ 29,700	V	Emssanar		$ 17,102	Porvenir		$ 68,100	$ 17,100	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A la fecha no han enviado planillas de seguridad social de los profesionales.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: Jhaner Segovia Quinteto
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3.2 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058
CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE ARL:
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	HEBERT LIZARDO DORADO D	76316092	Director	$ 4,500,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 4,500,000	$ 313,200	V	SANITAS	7880598807	$ 562,500	COLPENSIONES	7880598807	$ 720,000	$ -	$ -	$ -	
2	DAVID GERARDO MUÑOZ	1061742861	Residente Obra	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 1,160,000	$ -	V	NUEVA EPS	7879892033	$ 146,100	PORVENIR	7883221526	$ 187,000	$ -	$ -	$ -	Falta Cotizar ARL
3	MAURICIO ALEXIS JIMENEZ	108593632	Ing. Residente Aux.	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 1,160,000	$ -	V	NUEVA EPS	7880572840	$ 145,000	PORVENIR	7880572840	$ 185,600	$ -	$ -	$ -	Falta Cotizar ARL
4	HERNAN DIEGO GUAMANGA	16786372	Maestro obra	$ 1,160,000						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	$ 1,005,334	$ 70,000	V	NUEVA EPS	9452558048	$ 40,300	PORVENIR	9452558048	$ 160,900	$ -	$ -	$ -	
5	EUFREDIS BENAVIDES IMBACHI	18494880	Ayudante de Obra	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	$ 1,160,000	$ 80,800	V	NUEVA EPS	9452558048	$ 46,400	PORVENIR	9452558048	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
6	JAIRO ALBERTO GARCES	10317484	Ayudante de Obra	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	$ 1,160,000	$ 80,800	V	ASMET SALUD	9452558048	$ 46,400	PORVENIR	9452558048	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
7	FERNANDO NAVIA CERON	1058968805	Ayudante de Obra	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	$ 1,160,000	$ 80,800	V	AIC	9452558048	$ 46,400	PORVENIR	9452558048	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
8	JAIRO TULIO PABON QUINTERO	10316876	Ayudante de Obra	$ 1,160,000	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO PH CHALGUAYACO	$ 1,160,000	$ 80,800	V	NUEVA EPS	9452558048	$ 46,400	PROTECCION	9452558048	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: Hebert Lizardo Dorado Dorado
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3.3 ALMAGUER 1749 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANTIMO OMEN QUINAYAS	76294903	Ayudante de obra	$ 1,160,000	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$80,800.00	v	AIC	9452142367	$ 46,400	porvenir	9452142367	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
2	EDILZON CASTILLO JIMENEZ	4620182	Ayudante de obra	$ 1,160,000	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$80,800.00	v	AIC	9452142367	$ 46,400	porvenir	9452142367	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
3	JOSE DIMER BURBANO	1061990007	Ayudante de obra	$ 1,160,000	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$80,800.00	v	AIC	9452142367	$ 46,400	porvenir	9452142367	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
4	JOSE OLIVER CAICEDO NAVIA	76265148	Ayudante de obra	$ 1,160,000	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$80,800.00	v	Asmet	9452142367	$ 46,400	porvenir	9452142367	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
5	WILSON BUESACO OMEN	76294572	Ayudante de obra	$ 1,160,000																							x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$16,200.00	v	Asmet	9452142367	$ 9,300	porvenir	9452142367	$ 37,200	$ 9,300	$ -	$ -	RETIRO
	JUAN DAVID GARZON	10297111	Ayudante de obra	$ 1,160,000															x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$35,000.00	v	AIC	9452142367	$ 20,200	Proteccion	9452142367	$ 502,000	$ 20,200	$ -	$ -	
	DIANER QUINAYAS	1002879376	Ayudante de obra	$ 1,160,000								x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$51,200.00	v	AIC	9452142367	$ 29,400	porvenir	9452142367	$ 117,600	$ 29,400	$ -	$ -	
6	HUGO HERNAN ANACONA	1061739446	Ayudante de obra	$ 1,160,000	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		JAIRO CAMPO		$80,801.00	v	Asmet	9452142367	$ 46,400	porvenir	9452142367	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	INGRESO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se tramita acta de cobro por parte del consorcio ONIX CCM (contratista del contrato de obra con el municipio de Bolívar y convenio 1867), de manera que se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 informe financiero y presupuestal obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 005-003-15.05/059 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

MES INFORME MENSUAL: jul-23 — **PROYECTO:** REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 — **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	20221021002			Nacion	Contrato Principal	$ 3,478,131,956	$ 3,478,131,956
			TOTAL			$ 3,478,131,956	$ 3,478,131,956

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		Junio	$ 258,271,253	$ -	$ 258,271,253	$ -	$ 258,271,253	$ -	891 del 11/12/2021	$ 3,219,860,703	$ 3,219,860,703	-		X	Pagada
2															
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 3,445,219,240	$ -	**$ 3,445,219,240**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 32,912,716	$ -	**$ 32,912,716**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 3,478,131,956	$ -	**$ 3,478,131,956**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Jhaner Segovia Quinteto
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, se realiza seguimiento de tiempo mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 estado general del tiempo.

4.5.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022 **CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	21	24	24	23	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	732
Lluvias moderadas	0	3	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: William Alcides Sanchez fajardo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Fecha	Valor
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	1/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	2/07/2023	10
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	3/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	4/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	5/07/2023	2
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	6/07/2023	17
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	7/07/2023	20
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	8/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	9/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	10/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	11/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	12/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	13/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	14/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	15/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	16/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	17/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	18/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	19/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	20/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	21/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	22/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	23/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	24/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	25/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	26/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	27/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	28/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	29/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	30/07/2023	0
BALBOA [52010020]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Balboa	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	31/07/2023	0

4.5.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 258-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G Y A S. A. S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	19	22	24	22	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Paola Andrea Arteaga Jaramillo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/07/2023	24.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/07/2023	2.8
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/07/2023	2.7
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/07/2023	9.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	11/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	12/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	13/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	14/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	17/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	30/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/07/2023	0

4.5.3 SUCRE 1769– CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP-090-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	19	22	24	22	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/07/2023	24.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/07/2023	2.8
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/07/2023	2.7
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/07/2023	9.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	11/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	12/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	13/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	14/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	17/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	30/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/07/2023	0

4.5.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

[illegible] EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	19	22	24	22	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jhaner Segovia Quintero
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/07/2023	24.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/07/2023	2.8
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/07/2023	2.7
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/07/2023	9.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	11/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	12/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	13/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	14/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	17/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	30/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/07/2023	0

4.5.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	19	22	24	22	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Habert Lizardo Dorado Dorado
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/07/2023	24.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/07/2023	2.8
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/07/2023	2.7
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/07/2023	9.2
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	11/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	12/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	13/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	14/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	17/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	30/07/2023	0
RODEO EL [52020050]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	Bolívar	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/07/2023	0

4.5.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	23	24	20	21	23	23	23	22	23	23	24	24	23	21	23	23	23	24	23	23	24	24	24	24	24	23	24	23	717
Lluvias moderadas	0	0	1	1	0	3	3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	22
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Pabla Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Fecha	Valor
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	1/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	2/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	3/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	4/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	5/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	6/07/2023 0:00	11.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	7/07/2023 0:00	9.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	8/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	9/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	10/07/2023 0:00	0.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	11/07/2023 0:00	4.2
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	12/07/2023 0:00	2.9
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	13/07/2023 0:00	0.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	14/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	15/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	16/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	17/07/2023 0:00	9.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	18/07/2023 0:00	2.1
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	20/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	21/07/2023 0:00	0.2
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	22/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	23/07/2023 0:00	1.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	24/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	25/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	26/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	27/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	28/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	29/07/2023 0:00	2.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	30/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	31/07/2023 0:00	0.9

4.5.7 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: lo. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 202 **CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	23	24	20	21	23	23	23	22	23	23	24	24	23	21	23	23	23	24	23	23	24	24	24	24	24	23	24	23	717
Lluvias moderadas	0	0	1	1	0	3	3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	22
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Henry Andres Gomez Rengifo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Fecha	Valor
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	1/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	2/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	3/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	4/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	5/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	6/07/2023 0:00	11.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	7/07/2023 0:00	9.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	8/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	9/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	10/07/2023 0:00	0.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	11/07/2023 0:00	4.2
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	12/07/2023 0:00	2.9
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	13/07/2023 0:00	0.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	14/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	15/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	16/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	17/07/2023 0:00	9.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	18/07/2023 0:00	2.1
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	20/07/2023 0:00	0.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	21/07/2023 0:00	0.2
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	22/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	23/07/2023 0:00	1.7
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	24/07/2023 0:00	0.8
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	25/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	26/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	27/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	28/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	29/07/2023 0:00	2.4
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	30/07/2023 0:00	0
SANTIAGO [52020070]	Pluviométrica	IDEAM	07 - Nariño-Putumayo	Cauca	San Sebastián	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	31/07/2023 0:00	0.9

4.5.8 INZA 1983 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: James Piamba Hoyos
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Fecha	Valor
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	1/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	2/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	3/07/2023	1
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	4/07/2023	5
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	5/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	6/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	7/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	8/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	9/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	10/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	11/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	12/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	13/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	14/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	15/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	16/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	17/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	18/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	19/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	20/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	21/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	22/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	23/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	24/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	25/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	26/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	27/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	28/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	29/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	30/07/2023	0
SILVIA PTA ELECTRI [26020020]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Silvia	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	31/07/2023	0

4.5.9 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 484-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	19	24	22	23	21	24	24	23	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	2	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NombreEstacion	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Fecha	Valor
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	1/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	2/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	3/07/2023	72
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	4/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	5/07/2023	16
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	6/07/2023	2
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	7/07/2023	38
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	8/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	9/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	10/07/2023	1
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	11/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	12/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	13/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	14/07/2023	5
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	15/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	16/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	17/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	18/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	19/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	20/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	21/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	22/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	23/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	24/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	25/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	26/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	27/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	28/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	29/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	30/07/2023	0
JAPIO [26020470]	Pluviométrica	IDEAM	09 - Cauca-Valle-Caldas	Cauca	Santander De Quilichao	PRECIPITACION	Día pluviométrico (convencional)	31/07/2023	0

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, el contratista del municipio de Almaguer con convenio 1749 presenta ensayos de laboratorio, de manera que se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 de INVÍAS con los ensayos realizados y los resultados obtenidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/07/2023 - 17/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3695	SI	Edad de ensayo 49-51 días
2	15/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	2	3000 PSI	3939	SI	Edad de ensayo 47 días
3	15/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	4397	SI	Edad de ensayo 43 días
4	15/07/2023 - 22/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	4517	SI	Edad de ensayo 40 días
5	15/07/2023 - 17/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3342	SI	Edad de ensayo 33-35 días
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se validaron las garantías de los contractos de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. ARG-OBRA-009-2022 **CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO

FECHA DE INICIO: 3/04/2023

PLAZO INICIAL: 3.5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/07/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 958,081,628.00

VALOR ACUMULADO: $ 958,081,628.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 95,808,162.80	7 10 2022	30/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 287,424,488.40	7 10 2022	30/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.0%	$ 47,904,081.40	7 10 2022	28 1 2026
Estabilidad y calidad de la obra	20.0%	$ 191,616,325.60		5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101003017

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	7 10 2022	30/07/2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101001658 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 95,808,162.80	3	4	2023	24/01/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 287,424,488.40	3	4	2023	15/03/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.0%	$ 47,904,081.40	3	4	2023	15/01/1900	9	2026
Estabilidad y calidad de la obra	20.0%	$ 191,616,325.60				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101003017

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/07/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	3	4	2023	15/09/2023		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101001658 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/07/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. L.P. 003 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: 3
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 224,861,500.00	30/12/2022	30/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100.0%	$ 2,248,615,000.00	30/12/2022	30/9/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 449,723,000.00	30/12/2022	30/9/2025
Calidad de la revisión, ajustes y diseños	30.0%	$ 674,584,500.00	30/12/2023	30/9/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 674,584,500.00	30/12/2022	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 300,000,000.00	27/9/2022	30/9/2023
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-002-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G Y AS. A. S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÌA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 16/05/2023

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 430,691,191.10	16/5/2023	18/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,292,073,573.30	16/5/2023	18/7/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 646,036,786.65	16/5/2023	19/3/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 861,382,382.20		5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101261798

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9.3%	$ 400,000,000.00	16/5/2023	18/3/2024
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101046612 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 430,691,191.10	16	5	2023	18	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,292,073,573.30	16	5	2023	18	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 646,036,786.65	16	5	2023	19	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 861,382,382.20				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101261798

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/05/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9.3%	$ 400,000,000.00	16	5	2023	18	3	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101046612 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/05/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.4 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 16/05/2023

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,078,384,354.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,078,384,354.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 107,838,435.40	1 / 2 / 2023	1 / 10 / 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 323,515,306.20	1 / 2 / 2023	1 / 10 / 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 161,757,653.10	1 / 2 / 2023	1 / 6 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 215,676,870.80	1 / 2 / 2023	1 / 6 / 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100018793

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18.5%	$ 200,000,000.00	27 / 9 / 2022	27 / 12 / 2022
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	9.9%	$ 106,318,492.90	3	4	2023	3	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	29.6%	$ 318,955,478.70	3	4	2023	3	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19.7%	$ 212,636,985.80	3	4	2023	3	9	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	29.6%	$ 318,955,478.70	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.5%	$ 232,000,000.00	25	4	2023	25	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/04/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

FECHA DE INICIO: 25/04/2023

PLAZO INICIAL: 5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3,478,131,956.00

VALOR ACUMULADO: $ 3,478,131,956.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 347,813,195.56	13	12	2022	13/09/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,043,439,586.00	13	12	2022	13/09/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 695,626,391.00	13	12	2022	13	5	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 1,043,439,586.00				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40-44-101058457

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 464,000,000.00	13	12	2022	13	12	2027
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 40-40-101015399 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 347,813,195.56	25	4	2023	25	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,043,439,586.00	25	4	2023	25	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 695,626,391.00	25	4	2023	25	9	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 1,043,439,586.00	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40-44-101058457

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/05/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 464,000,000.00	25	4	2023	25	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 40-40-101015399 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/05/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP 004-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 3/04/2023

PLAZO INICIAL: 5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,063,184,929.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,063,184,929.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 106,318,492.90	13/12/2022	13/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 318,955,478.70	13/12/2022	13/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 212,636,985.80	13/12/2022	13/5/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 318,955,478.70		5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día/Mes/Año)	VIGENCIA Hasta (Día/Mes/Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	43.6%	$ 464,000,000.00	13/12/2022	13/12/2027
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 106,318,492.90	3	4	2023	3	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 318,955,478.70	3	4	2023	3	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 212,636,985.80	3	4	2023	3	9	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 318,955,478.70	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.8%	$ 232,000,000.00	25	4	2023	25	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/04/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñán Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 3.5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,799,782,602.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,799,782,602.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 179,978,260.20	21	12	2022	30/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	49.4%	$ 889,891,301.40	21	12	2022	30/04/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 359,946,520.40	21	12	2022	31	12	2025
Estabilidad de la obra	30.0%	$ 539,934,780.60	21	12	2022	31	12	2027
Calidad	0.0%	$ 444,816.30	21	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16.7%	$ 300,000,000.00	21	12	2022	30/04/2023		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 179,978,260.20	31	12	2022	31	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	49.4%	$ 889,891,301.40	31	12	2022	31	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 359,946,520.40	31	12	2022	30	6	2026
Estabilidad de la obra	30.0%	$ 539,934,780.60	30	6	2023	30	6	2028
Calidad	0.0%	$ 444,816.30	30	6	2023	30	6	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/06/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	19.34%	$ 348,000,000.00	21	12	2022	30	6	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/06/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 93-2023 **CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 795,011,198.00

VALOR ACUMULADO: $ 795,011,198.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 79,501,119.80	14	3	2023	13/07/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 159,002,239.60	14	3	2023	13	7	2026
Calidad de la revisión, ajustes y diseños	30.0%	$ 238,503,359.40	14	3	2023	13	7	2028
Estabilidad y calidad de las obras	30.0%	$ 238,503,359.40	14	3	2023	13	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	29.2%	$ 232,000,000.00	14	3	2023	13/07/2023		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 79,501,119.80	4	7	2023	4/03/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 159,002,239.60	4	7	2023	4	11	2026
Calidad del servicio		$ 1,510,521.28	4	7	2023	4	7	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 238,503,359.40	4	11	2023	4	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100051548

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/07/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	29.2%	$ 232,000,000.00	14	3	2023	4/11/2023		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100013052 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/07/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.9 INZÁ 1983 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 8 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP No 01 DE 2.022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

FECHA DE INICIO: 28/04/2023

PLAZO INICIAL: 3

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 608,231,289.00

VALOR ACUMULADO: $ 608,231,289.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10.0%	$ 60,823,129.00	27/9/2022	27/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 182,469,387.00	27/9/2022	27/04/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 121,646,258.00	27/9/2022	27/12/2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 182,469,387.00		5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	32.9%	$ 200,000,000.00	27/9/2022	27/12/2022
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 60,823,129.00	28	4	2023	14	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 182,469,387.00	28	4	2023	14	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 121,646,258.00	28	4	2023	14	9	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 182,469,387.00	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/07/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	38.1%	$ 232,000,000.00	28	7	2023	14	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/07/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 30/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 912,367,379.00

VALOR ACUMULADO: $ 912,367,379.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20.0%	$ 182,473,475.80	7/9/2022	31/12/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20.0%	$ 182,473,475.80	7/9/2022	31/12/2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 273,710,213.70	7/9/2022	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.9%	$ 200,000,000.00	7/9/2022	31/12/2022
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20.0%	$ 182,473,475.80	1	6	2023	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 182,473,475.80	1	6	2023	1	10	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 273,710,213.70	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000051957

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	25.4%	$ 232,000,000.00	7	1	2023	1	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido ningún plan de calidad de los contratos asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

4.9.1.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 1			
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	SEMANAL 33	
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO.								
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO								
1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	2,925.60	$ 1,020	$ 2,984,112.00	2527.2	$ 2,577,744.00	2527.2	$ 2,577,744
2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	438.84	$ 281,980	$ 123,744,103.00	463.460001	$ 130,686,451.08	463.46	$ 130,686,451
3	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	M	1,950.40	$ 3,040	$ 5,929,208.00	1647	$ 5,006,880.00	0	$ -
4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	225.03	$ 13,620	$ 3,064,909.00	225.030029	$ 3,064,908.99	225.03	$ 3,064,909
5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	M3	99.36	$ 18,300	$ 1,818,288.00	99.36	$ 1,818,288.00	0	$ -
6	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	39.74	$ 249,430	$ 9,912,348.00	39.7399992	$ 9,912,348.00	0	$ -
7	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D)	M3	368.17	$ 826,140	$ 304,159,964.00	396.45	$ 327,523,203.00	0	$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	173.88	$ 551,760	$ 95,940,029.00	102.38	$ 56,489,188.80	0	$ -
9	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	16,547.10	$ 7,860	$ 130,060,206.00	17014.9399	$ 133,737,427.61	0	$ -
10	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO SANITARIA NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO 101.6 MM	M	110.40	$ 33,170	$ 3,661,968.00	110.4	$ 3,661,968.00	0	$ -
11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2,252.16	$ 9,030	$ 20,336,995.00	2252.15891	$ 20,336,994.96	0	$ -
				SUBTOTAL	**$ 701,612,130.00**		**$ 694,815,402.00**	0	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 36"							0	
12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	56.00	$ 36,690	$ 2,054,641.00	23	$ 843,870.00	23	$ 843,870
13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	535.53	$ 13,620	$ 7,293,977.00	168.1	$ 2,289,522.00	168.1	$ 2,289,522
14	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	M3	36.00	$ 18,300	$ 658,800.00	273.22	$ 4,999,926.00	273.22	$ 4,999,926
15	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D)	M3	98.00	$ 826,140	$ 80,961,720.00	105.15	$ 86,868,621.00	12.3	$ 10,161,522
16	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	18.00	$ 551,760	$ 9,931,680.00	3.77	$ 2,080,135.20	3.77	$ 2,080,135
17	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	7,354.20	$ 7,880	$ 57,951,096.00	3846.44	$ 30,309,947.20	565.2667	$ 4,454,302
18	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	70.00	$ 556,010	$ 38,920,700.00	23	$ 12,788,230.00	23	$ 12,788,230
				SUBTOTAL	**$ 197,772,614.00**		**$ 140,180,251.40**	0	
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							0	
19	ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (SEGÚN COMPROBANTE POR MES)	GL	1.0	$ 1,095,274	$ 1,095,274.00	0	$ -	0	$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,095,274.00**			0	
	SECCION 2 -ACTIVIDAES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							0	
20	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,500.00	$ 1,020	$ 1,530,000.00	3259.925	$ 3,325,123.50	3259.925	$ 3,325,124
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO	M3	189.24	$ 245,040	$ 46,371,462.00	488.74	$ 119,760,849.60	488.74	$ 119,760,850
				SUBTOTAL	**$ 47,901,462.00**		**$ 123,085,973.10**		
	TOTAL COSTOS OBRA CIVIL				**$ 948,381,480.00**		**$ 958,081,626.50**		
	COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIA				**$ 9,492,046.00**				
	VALOR IVA (CONSULTORIA, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD) (19%) =				**$ 208,102.00**				
				VALOR TOTAL	**$ 958,081,628.00**		**$ 958,081,627.00**		

4.9.1.2 SUCRE 1866 – CAUCA

PRESUPUESTO SUCRE 1866							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 33	
	PRELIMINARES						
1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	93.6	$ 174,588.00	$ 16,341,437	24.42	$ 4,263,438.96
2	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	84	$ 88,711.00	$ 7,451,724	18.26	$ 1,619,862.86
	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO						$ -
3	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	7599.75	$ 10,023.00	$ 76,172,294		$ -
4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100M) Y MIL METROS (1000M) DE DISTANCIA	M3/KM	65357.85	$ 1,690	$ 110,454,767		$ -
5	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	M3	1174.51	$ 109,444	$ 128,543,072		$ -
6	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	2062.5	$ 182,499	$ 376,404,188		$ -
7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	21100.67	$ 9,886	$ 208,601,224		$ -
8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 4,1 MPA	M3	2612.5	$ 826,511	$ 2,159,259,988		$ -
9	BORDILLO EN CONCRETO 21 MPA VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	5000	$ 71,860	$ 359,300,000		$ -
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨						$ -
10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1012	$ 32,640	$ 33,031,680	308	$ 10,053,120.00
11	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	402.5	$ 101,680	$ 40,926,200		$ -
12	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	172.5	$ 13,551	$ 2,337,548	15	$ 203,265.00
13	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	179.4	$ 823,608	$ 147,755,275	23.4	$ 19,272,427.20
14	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	13340	$ 9,886	$ 131,879,240	1510	$ 14,923,198.57
15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	18.4	$ 677,782	$ 12,471,189	2.4	$ 1,626,676.80
16	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE CON SUB BASE GRANULAR)	ML	161	$ 960,908	$ 154,706,188	14	$ 13,452,712.00
	CONSTRUCCION DE FILTRO						$ -
17	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	753.12	$ 32,640	$ 24,581,837		$ -
18	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	740.4	$ 199,407	$ 147,640,943		$ -
19	GEOTEXTIL NT 1800 RESISTENCIA A LA TENSION 470 N	M2	5491.5	$ 6,088	$ 33,432,252		$ -
20	TUBERIA PERFORADA DE 4 PULGADAS	ML	1569	$ 34,199	$ 53,658,231		$ -
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL						$ -
21	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (AMARILLA O BLANCA)	ML	7499	$ 2,520	$ 18,897,480		$ -
22	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO X (75X75) CM	UND	51	$ 654,496	$ 33,379,296		$ -
	VALOR TOTAL				$ 4,277,226,053		$ 65,414,701.39
							1.53%
							$ 11,427,119

4.9.1.3 SUCRE 1769 – CAUCA

PRESUPUESTO SUCRE 2							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 33	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							
1	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	630	$ 190,127.00	$ 119,780,010		
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	634	$ 777,315.00	$ 492,817,710		
3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	227	$ 439,460.00	$ 99,757,420		
4	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	21090	$ 9,942.00	$ 209,676,780		
5	SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL	ML	2800	$ 4,090.00	$ 11,452,000		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨							
6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	358	$ 36,671	$ 13,128,218	69.30	$ 2,541,230
7	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	3474	$ 9,942	$ 34,538,508		
8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	36	$ 851,010	$ 30,636,360		
9	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	1	$ 575,351	$ 575,351		
10	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	56	$ 777,315	$ 43,529,640		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL							
11	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	%		$ 7,517,969	$ 7,517,969		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
11	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	1	$ 1,711,197	$ 1,711,197		
VALOR TOTAL					$ 1,065,121,163		$ 2,541,230
							0.24%
							$ 2,541,230

4.9.1.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

PRESUPUESTO BOLIVAR 1867 - MILAGROS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 33	
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES							
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	142	$ 181,764.00	$ 25,810,488	35.32	$ 6,419,904.48
2	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	89	$ 81,042.00	$ 7,212,738	24	$ 1,945,008.00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	86	$ 91,174.00	$ 7,840,964		
B. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES							
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	950	$ 311,091	$ 295,536,450	604.06	$ 187,917,629.46
C. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							
5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	102	$ 24,000	$ 2,448,000	533.79	$ 12,810,960.00
6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	690	$ 765,385	$ 528,115,650	78.87	$ 60,365,914.95
7	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa - CICLÓPEO	M3	445	$ 554,024	$ 246,540,680	150.38	$ 83,314,129.12
8	DEFENZA METÁLICA	M	12	$ 218,922	$ 2,627,064		
9	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	63500	$ 9,700	$ 615,950,000	6548	$ 63,515,600.00
D. ESTRUCTURAS DE DRENAJE							
10	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	2350	$ 24,000	$ 56,400,000	110.73	$ 2,657,520.00
11	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	285	$ 91,174	$ 25,984,590		
12	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	538	$ 204,226	$ 109,873,588	149.28	$ 30,486,857.28
13	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) - MEZCLA IN SITU	M3	80	$ 1,036,426	$ 82,914,080		
14	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	903	$ 765,385	$ 691,142,655	7.8	$ 5,970,003.00
15	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	5	$ 727,128	$ 3,635,640	0.8	$ 581,702.40
16	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	37500	$ 9,700	$ 363,750,000	1157.8	$ 11,230,660.00
17	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	180	$ 868,679	$ 156,362,220	24	$ 20,848,296.00
18	RELLENO DE GRAVILLA	M3	87	$ 269,491	$ 23,445,717		
19	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	826	$ 10,205	$ 8,429,330		
20	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	393	$ 38,199	$ 15,012,207		
E. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN							
21	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	150	$ 24,000	$ 3,600,000		
22	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	73	$ 204,226	$ 14,908,498		
23	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA	M3	52	$ 765,385	$ 39,800,020		
24	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	2	$ 727,128	$ 1,454,256		
25	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	7923	$ 9,700	$ 76,853,100		
26	RELLENO CON GRAVILLA	M3	15	$ 269,491	$ 4,042,365		
27	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA	M2	120	$ 10,205	$ 1,224,600		
28	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A	M3	26	$ 38,199	$ 993,174		
29	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO	M3	24	$ 475,149	$ 11,403,576		
F. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL							
30	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP	UND	30	$ 730,253	$ 21,907,590		
31	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O	GLB	1	$ 32,912,716	$ 32,912,716		
VALOR TOTAL					$ 3,478,131,956		$ 488,064,185
							14.03%
							$ 14,897,421

4.9.1.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

PRESUPUESTO BOLIVAR 1750 - CHALGUAYACO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 33**	
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES							
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	27.13	$ 153,105.00	$ 4,153,739	4.4	$ 673,662.00
2	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	44	$ 55,477.00	$ 2,440,988	6	$ 332,862.00
B. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES						0	$ -
3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	573	$ 258,200	$ 147,948,600	0	$ -
C. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						0	$ -
4	EXCAVACIONES MANUAL PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA	M3	48	$ 26,725	$ 1,282,800	0	$ -
5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS)	M3	597	$ 715,730	$ 427,290,810	61.84	$ 44,260,743.20
6	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa - CICLÓPEO	M3	207	$ 544,008	$ 112,609,656	0	$ -
7	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	22975	$ 9,843	$ 226,142,925	6	$ 59,058.00
D. ESTRUCTURAS DE DRENAJE						0	$ -
8	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE RETIRO)	M3	392	$ 26,725	$ 10,476,200	415.77	$ 11,111,506.70
9	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	5255	$ 9,843	$ 51,724,965	5066.76	$ 49,872,118.68
10	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE D DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	62	$ 817,200	$ 50,666,400	37	$ 30,236,400.00
E. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL						0	$ -
11	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75X75	UND	24	$ 746,991	$ 17,927,784	0	0
18	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	GLB	1.00	$ 10,520,062	$ 10,520,062	0	
VALOR TOTAL					$ 1,063,184,929		$ 136,546,351
							12.84%
							$ 136,546,351

4.9.1.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

PRESUPUESTO ALMAGUER 1749 - HATO HUMUS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 33	
A. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	440	$ 41,553.00	$ 18,283,320	392	$ 16,288,776.00
2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	206	$ 17,081.00	$ 3,518,686	96.5	$ 1,648,316.50
3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	78	$ 992,126.00	$ 77,385,828	55.1	$ 54,666,142.60
4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	8	$ 796,325.00	$ 6,370,600	8	$ 6,370,600.00
5	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	5789	$ 9,554.00	$ 55,308,106	4618	$ 44,120,372.00
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	70	$ 978,297.00	$ 68,480,790	63	$ 61,632,711.00
B. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	803.49	$ 41,553.00	$ 33,387,420		
8	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	484.96	$ 17,081.00	$ 8,283,602		
9	SUBBASE GRANULAR TIPO C	M3	769.09	$ 405,758	$ 312,064,420	24	$ 9,738,192.00
10	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	13.9	$ 796,325.00	$ 11,068,918		
11	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	615.760704	$ 992,126.00	$ 610,912,204		
12	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G)	M3	223.94	$ 703,771	$ 157,602,478		
13	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	27059.6	$ 9,554	$ 258,527,418	1604.16	$ 15,326,144.64
14	SELLO PARA JUNTAS	ML	6978	$ 6,406	$ 44,701,068		
C. CONSTRUCCIÓN DE FILTRO							
15	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	20.4	$ 41,553.00	$ 847,681		
16	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO	M2	132.4	$ 9,959	$ 1,318,572		
17	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC	ML	34	$ 41,858	$ 1,423,172		
18	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	20.4	$ 353,593	$ 7,213,297		
D. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN							
19	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	129.03	$ 41,553.00	$ 5,361,584	55.5	$ 2,306,191.50
20	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	18.34	$ 353,593	$ 6,484,896	4	$ 1,414,372.00
21	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	37.35	$ 992,126.00	$ 37,055,906	20.91	$ 20,745,354.66
22	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	2.1	$ 796,325.00	$ 1,672,283	1.1	$ 875,957.50
23	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	4862.28	$ 9,554	$ 46,454,223	1508.35	$ 14,410,775.90
24	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC	ML	15.03	$ 41,858	$ 629,126	11.45	$ 479,274.10
25	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC	ML	15.73	$ 23,883	$ 375,680		
26	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO	M2	121.13	$ 9,959	$ 1,206,334	45.55	$ 453,632.45
27	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	41.26	$ 17,081	$ 704,762	24	$ 409,944.00
E. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							
28	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III	UND	6	$ 637,799	$ 3,826,794		
F. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	1	$ 1,482,696	$ 1,482,696		
30	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O	GLB	1%	$ 17,766,424	$ 17,766,424		
SUB TOTAL					$ 1,799,718,288		$ 250,886,757
VALOR IVA CONSULTORIA					$ 281,712.00		13.94%
VALOR TOTAL					$ 1,800,000,000		$ 33,205,431

4.9.1.7 ALMAGUER 1982 – CAUCA

PRESUPUESTO ALMAGUER 1982 - CHILCO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 33**	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
1	SUBBASE GRANULAR TIPO C	M3	336.15	$ 449,633.00	$ 151,144,133	186.3	$ 83,766,627.90
2	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	ML	3240	$ 6,406.00	$ 20,755,440		
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	243.45	$ 40,201.00	$ 9,786,933	217.4	$ 8,739,697.40
4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO EXCAVACIÓN	M3	74.7	$ 17,081.00	$ 1,275,951	56.91	$ 972,079.71
5	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	250.45	$ 1,039,446.00	$ 260,329,251		
6	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	104	$ 746,653.00	$ 77,651,912		
7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	12501.56	$ 9,696.00	$ 121,215,126		
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	12.9	$ 846,011.00	$ 10,913,542		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 36¨							
9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176	$ 40,201	$ 7,075,376		
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	82.4	$ 17,081	$ 1,407,474		
11	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	31.2	$ 1,039,446	$ 32,430,715		
12	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	3.22	$ 846,011	$ 2,724,155		
13	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2315	$ 9,696	$ 22,446,240		
14	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	28	$ 100,548	$ 2,815,344		
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL							
15	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75x75)	UND	4	$ 637,799	$ 2,551,196		
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
16	REVISION Y/O AJUSTEN DE DISEÑOS BASE DE	GLB	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
17	ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN	GLB	1	$ 1,287,132	$ 1,287,132		
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							
18	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O	%	1	$ 7,335,318	$ 7,335,318		
MANTENIMIENTO VIAL							
19	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	6665	$ 1,158	$ 7,718,070	6665	$ 7,718,070.00
20	AFIRMADO CON MATERIAL DE LA ZONA	M3	333	$ 154,300	$ 51,381,900	333	$ 51,381,900.00
VALOR TOTAL					$ 797,245,208		$ 152,578,375
							19.14%
							$ 54,540,483

4.9.1.8 INZÁ 1983 – CAUCA

PRESUPUESTO INZA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 33	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176	$ 46,820.00	$ 8,240,320		
2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	108	$ 44,989.00	$ 4,858,812		
3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	31.2	$ 746,667.00	$ 23,296,010		
4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	3.2	$ 640,953.00	$ 2,051,050		
5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2316	$ 8,565.00	$ 19,836,540		
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	28	$ 684,124.00	$ 19,155,472		
7	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO	M3	28	$ 518,499.00	$ 14,517,972		
8	GEOTEXTIL	M2	381.59	$ 11,908.00	$ 4,543,974		
9	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	55.26	$ 180,900.00	$ 9,996,534		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	53.73	$ 46,820	$ 2,515,639		
11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	34	$ 44,989	$ 1,529,626		
12	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	80.48	$ 746,667	$ 60,091,760		
13	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	2.4	$ 640,953	$ 1,538,287		
14	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	53.76	$ 449,355	$ 24,157,325		
15	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	7759	$ 8,565	$ 66,455,835	2377.7	$ 20,365,001
16	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO	M3	31.36	$ 763,663	$ 23,948,472		
17	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU;	M3	11	$ 846,718	$ 9,313,898		
18	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	180	$ 231,682	$ 41,702,760		
AJUSTES DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL							
19	REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE	GLB	1	$ 6,100,000	$ 6,100,000		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
20	ELEMENTOS DE BIOSEGUIRDAD	GLB	1	$ 1,830,000	$ 1,830,000		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO							
21	CONFORMACION DE CALZADA	M2	58500	$ 1,119	$ 65,461,500	25000	$ 27,975,000
22	AFIRMADO	M3	2300	$ 68,646	$ 157,885,800	927.62	$ 63,677,576
23	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	32	$ 46,820	$ 1,498,240		
24	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	6	$ 44,989	$ 269,934		
25	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	12	$ 746,667	$ 8,960,004		
26	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	1	$ 640,953	$ 640,953		
27	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	920	$ 8,565	$ 7,879,800		
28	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	6	$ 684,124	$ 4,104,744		
29	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO	M3	21	$ 518,499	$ 10,888,479		
VALOR TOTAL					$ 603,269,740		$ 112,017,576
							18.57%

4.9.1.9 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

PRESUPUESTO SANTANDER DE QUILICHAO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 33**	
CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ALCANTARILLAS							
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	338	$ 37,224.00	$ 12,581,712	300	$ 11,167,200.00
2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	194.12	$ 65,424.00	$ 12,700,107	170	$ 11,122,080.00
3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	74.9	$ 626,360.00	$ 46,914,364	20	$ 12,527,200.00
4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	8	$ 457,304.00	$ 3,658,432	0.4	$ 182,921.60
5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	5629.07	$ 7,454.00	$ 41,959,088	1235.69	$ 9,210,826.55
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	59	$ 668,040.00	$ 39,414,360	40	$ 26,721,600.00
CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO							
7	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	120	$ 37,224	$ 4,466,880		
8	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	314	$ 65,424	$ 20,543,136		
9	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	58.5	$ 626,360	$ 36,642,060		
10	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	4.1	$ 457,304	$ 1,874,946		
11	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2969.02	$ 7,454	$ 22,131,075		
CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO							
12	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	120	$ 37,224	$ 4,466,880		
13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	314	$ 65,424	$ 20,543,136		
14	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	12	$ 359,419	$ 4,313,028		
15	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO	M3	60	$ 329,854	$ 19,791,240		
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO							
16	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	730	$ 37,224	$ 27,173,520		
17	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	219	$ 65,424	$ 14,327,856		
18	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	238	$ 626,360	$ 149,073,680		
19	CONCTERO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	22	$ 457,304	$ 10,060,688		
20	CONCTERO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	80	$ 359,419	$ 28,753,520		
21	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	16690.03	$ 7,454	$ 124,407,484		
22	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;	M3	104	$ 694,126	$ 72,189,104		
23	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU;	ML	1216	$ 69,980	$ 85,095,680		
24	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	791	$ 143,735	$ 113,694,385		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
25	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	1	$ 2,820,000	$ 2,820,000		
VALOR TOTAL					$ 919,596,361		$ 70,931,828
							7.71%
							$ 16,071,350

4.9.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

4.9.2.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. ARG-OBRA-009-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: EMCONSUT S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO
BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
SEGUMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 3/4/202 **FECHA TERMINACION INICIAL**:18/7/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 1/9/23
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: SI, APROBADO por los especialistas de interventoría **PRORROGAS:**
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: Falta actualización de pólizas de la prórroga 1
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: *Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la solicitud. **PERSONAL APROBADO:** A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista hoja de vida del maestro de obra. **PMT:** *Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se hace la solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales *Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud de documentos socio ambientales
METAS FISICAS INICIALES: 0,46 Km de placa huella, 4 alcantarillas y 1500 metros cuadrados de actividades de mantenimiento periódico
AVANCE META FISICA: % EJECUCION: 29,46%
PAGA: Mediante oficio DON-1100-INV-125-2023 DEL 23 de mayo, se emiten observaciones a la V1 del PAGA. * Mediante oficio DON-1100-INV-154-2023, del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud del documento. *Mediante oficio DON-1100-INV-167-2023, del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud del documento.
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: A la fecha no ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa, se emitió oficio solicitando la misma el día 26 de junio del 2023 y el día 07 de julio de 2023 se emitió nuevamente oficio DON-1100-INV-170-2023 solicitando la información.
ESTADO DEL ANTICIPO: Se anularon las ordenes de giro 1,2,3,4,5,6 fueron aprobadas por la interventoría las ordenes de giro 7, 8 , 9 y 10 y consignadas por la fiducia al contratista un total de 4 órdenes de giro, se anuló la orden de giro 11 y se encuentra en revisión la orden de giro número 12 por parte de la representante legal. VALOR: 287.424.488 $

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, seguidamente la interventoria realiza la presentación con la información del contrato. Por parte de la gestora técnica se solicita claridad en el nombre de la vía donde se llevara a cabo la construcción de la placa huella, frente a la valla informativa se informa que no ha sido emitida la información para aprobación por la interventoría, el contratista manifiesta dificultad frente a que la comunidad no quiere dejar instalar la valla al inicio de la obra por otras que se encuentran instaladas en el sitio, se le solicita buscar un lugar con la aprobación de la comunidad. En cuanto al PAGA el contratista manifiesta que en conjunto con el municipio no evidencia afectación ambiental y por ello no han continuado con la generación del documento, por parte de la interventoría se manifiesta que existe una guía la cual se debe de tener en cuenta para que conozcan la complejidad del contrato y si necesita o no el PAGA esto debe estar sustentado como lo establece la guia, adicionalmente se informa que al documento PAGA entregado por el contratista fueron emitidas observaciones y se está a la espera de la subsanación de las observaciones, se solicita que estas observaciones se realicen teniendo en cuenta la nueva resolución denominada modo carretero, el contratista manifiesta un compromiso para el día viernes entregar lo pendiente en cuanto a lo administrativo, como también entregar la actualización del programa de obra, tambien solicita adicional en tiempo para la ejecución de obra, a lo cual se solicita envié la información a la interventoría. El contratista solicitara una prorroga hasta el 1 de septiembre en donde según lo programado y si se desarrollan las actividades según el cronograma de obra existe la posibilidad de terminar en el plazo establecido. El contratista deberá enviar plan de contingencia

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de documentos administrativos (PAGA, informacion de la valla, entre otros)	viernes, 28 de julio de 2023	contratista
Entrega de Plan de contingenia	viernes, 28 de julio de 2023	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Yimar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Andres Rey	Ingeniero Residente de obra	EMCONSUT SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 258-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS G Y A S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÌA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 16/5/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 31/8/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31/8/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO, falta que el municipio envié subsanaciones del estudio hidráulico y diseño geométrico
PRORROGAS:
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: si
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: *Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud *Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud. **PERSONAL APROBADO**: A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista las hojas de vida de los siguientes profesionales: director de Obra, residente de obra, Ing Civil con especialización en Geotecnia, un técnico constructor o maestro de obra, un tecnólogo en topografía., Solicitud que se realizó en la reunión de contratistas del pasado 29 de mayo y primero de Junio de 2023. **PMT:** *Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud *Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud
METAS FISICAS INICIALES: 2,125 Km de pavimento rígido y 23 alcantarillas
AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 1,21%
PAGA: Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V1 del **PAGA.** *Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la solicitud de documentos socioambientales. *Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: No ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa, por parte de la interventoría se emitió oficio solicitando la misma el día 26 de junio del 2023, posteriormente mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud
ESTADO DEL ANTICIPO: No ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa, por parte de la interventoría se emitió oficio solicitando la misma el día 26 de junio del 2023, posteriormente mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud **INCONVENIENTES ENCONTRADOS:** Aprobación de documentos iniciales (equipo, personal, PMT,etc),cambio de punto inicial por falla geologica, dificultad en subsanación de observaciones de los diseños por parte del municipio, dificultades en la aprobación del anticipo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, por parte de la gestora tecnica solicita que el nombre del tramo de la vía sea el mismo en todos los documentos, frente a los inconvenientes encontrados del cambio del punto de inicio, debe sustentarse muy bien, frente al PAGA se enviaron observaciones por parte de la interventoría y a la fecha no se ha enviado subsanación por ello se emitieron dos solicitudes más, en cuanto a la valla informativa se solicita al contratista envié la información para aprobación de la interventoría, la representante legarl del contrato manifiesta que no se ha remitido la información de la valla, debido a que se ha solicitado una prorroga y debe realizarse con esta información, la gestora tecnica le aclara que se debe realizar con la información del contrato el cual ya está establecido, el contratista manifiesta que emitió un correo solicitando una prórroga el 17 de may,o el cual no a obtenido respuesta a lo que la interventoría da a conocer que dicho correo no ha llegado al correo de la intervnetoria en la fecha indicada, la interventoría manifiesta recibir en el trascurso de la reunión el correo y revisando dicha solicitud carece de sustento para aprobación de una prorroga. Frente a los estudios y diseños se solicita se envíen completos con la información que se solicita, adicionalmente por parte de por parte del secretario de planeación e infraestructura supervisión del contrato solicita se inicie con la ejecución de obras, en lo que se pueda desarrollar dentro del tramo, adicionalmente agilizar en el sustento tecnico de la prórroga. La interventoría debe entregar el día viernes la repuesta de los estudios y diseños. En cuanto a la modificación de la localización del tramo no se puede cambiar el punto de inicio si no esta dentro de lo estipulado en el convenio.

Las prórrogas no se pueden pasar de la contratación de la interventoría, para el anticipo se debe coordinar lo de la prórroga primero, debido a que se tiene una clausula que establece que este se debe amortizar el 100% del anticipo un mes antes de la fecha de finalización del contrato.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de Prorroga por parte del contratista, cronograma de actividades	viernes, 28 de julio de 2023	Contratista
Pólizas actualizadas con fecha de prorroga hasta el 31 de octubre del 2023		
Entrega de revisiones completas de de los diseños	viernes 28 de julio	Interventoria
Entrega de subsanación de observaciones de estudios y diseños	viernes 4 de agosto del 2023	Entidad contratante /Alcaldia de Sucre

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Yimar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Daniel Alejandro Mañunga	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Jhon Edinson Ordoñez Toro	Ingeniero auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Juan David Ordoñez	Inspector de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Camilo Ernesto Esguerra Losada	Secretaria de planeación e Infraes	Alcaldia Sucre	
Erika Guerrero	Ingeniera Residente de Obra	Construobras	
Cristian Nicolas Ortiz Alape	Ing apoyo secretaria de Planeación	Alcaldia Sucre	
Paola Andrea Arteaga Jaramillo	Representante legal	Construobras	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP-090-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 16/5/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 16/9/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/9/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: SI
PRORROGAS:
OTROS ACTOS ADMNISTRATIVOS: MODIFICATORIOS: Modificatorio N° 1 del 17 de mayo de 2023 por medio del cual se ajusta el valor del contrato a $ 1.065.446.290, 00
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: si
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud. **PERSONAL APROBADO:** A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista las hojas de vida de los siguientes profesionales: un director de obra, un residente de obra y un profesional SISO. Solicitud que se realizó en las reuniones sostenidas con el contratista el pasado 29 de mayo y primero de junio de 2023. **PMT** *Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud.
METAS FISICAS INICIALES: 0,706 Km de placa huella y 4 alcantarillas
AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 0,00%
PAGA: *Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la solicitud *Mediante oficio DON-1100-INV-149-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la tercera solicitud
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: A la fecha no ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa, la interventoría emitió oficio solicitando la misma el día 26 de junio del 2023, posteriormente mediante oficio DON-1100-INV-169-2023 del 07 de julio, se realiza la segunda solicitud.
ESTADO DEL ANTICIPO: Fueron aprobadas 4 órdenes de giro y autorizadas a la fiducia, de las cuales la orden de giro 1 y 2 se consignaron al contratista **INCONVENIENTES ENCONTRADOS:Aprobación de documentos iniciales (equipo, personal, PMT,etc) y dificultades en el acceso al sitio de la obra, debido al mal estado de la vía.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, la intervnetoria informa que en cuanto al anticipo ya están aprobadas 4 actas de giro, se le informa a la gestora tecnica que en este convenio fueron consigando el recurso del convenio 1866 a la cuenta del convenio 1769, y se solicitó por parte del municipio realizar el respectivo traslado, la gestora tecnica solicita corroborar el nombre del tramo y que este se encuentre igual en todos los documentos, minuta, convenio, estudios previos y si es el caso de encontrar diferencias se debera informar al municipio para que se realice el modificatorio en los documentos, en cuanto a la ejecucion de las actividades contractuales el contratista manifiesta que las dificultades para iniciar han sido por el mal estado de la vía de acceso, por parte del municipio el secretario de planeación manifiesta que ya se realizaron las adecuaciones y arreglo de la via, el contratista manifiesta faltan 200 metros por adecuar, el contratista se compromete a ingresar la tuberia el 25 de julio para inciar con las actividades de obras de drenaje.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ingreso de tuberia para contruccion de alcantarillas	martes, 25 de julio de 2023	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Daniel Alejandro Mañunga	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Camilo Ernesto Esguerra Losada	Secretaria de planeación e Infraes	Alcaldia Sucre	
Erika Guerrero	Ingeniera Residente de Obra	Construobras	
Andres Ruiz	Ing apoyo secretaria de Planeación	Alcaldia Sucre	
Jesus Ancizar Calvo Castro	Representante legal	Consorcio Sucre 22	
Yaneth Stella Avirama Paz	Consorciada	Consorcio Sucre 22	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-003- 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO ALAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 25/4/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 24/9/2023
fECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 24/9/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: si
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se realiza la solicitud **PERSONAL APROBADO:** A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista las hojas de vida de los siguientes profesionales: director de Obra y residente de obra.
La solicitud de las hojas de vida se realizó en las reuniones sostenidas con el contratista el pasado 29 de mayo y primero de Junio de 2023
PMT: Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se realiza la solicitud del documento.
METAS FISICAS INICIALES: 1,05 Km de placa huella, 30 alcantarillas, demolición de 9 alcantarillas y 1 batea en concreto reforzado existentes, 3 box coulvert, 393 m de dren horizontal, 2 muros de contención en concreto reforzado L = 6 m y L = 20 m, 1 muro en gaviones L = 4m y h = 4 m, 30 señales verticales
AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 13,60%
PAGA: *Mediante oficio DON-1100-INV-099-2023 del 24 de abril se emiten observaciones a la V1 del documento. *Mediante oficio DON-1100-INV-131-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la V2 del documento. *Mediante oficio DON-1100-INV-171-2023 del 07 de julio, se reitera dicha solicitud
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: se emitió información para el diseño de la valla por el contratista el día 23 de mayo del 2023, se aprobó por la interventoría el 24 de mayo y se emitió a gerencia de comunicaciones sin obtener respuesta, se emitió nuevamente el requerimiento a gerencia de comunicaciones el 16 de junio del 2023 sin obtener respuesta
ESTADO DEL ANTICIPO: A la fecha se han autorizado 5 órdenes de giro correspondientes a la 1,2,3,4 y 7, la orden de giro 5 y 6 no fueron aprobadas por la interventoría, posteriormente enviaron 2 órdenes de giro de las cuales solo se aprobó la de pago de mano de obra y se enviaron observaciones mediante correo electrónico el día 12 de julio de las razones, por la cuales no se aprobaba la orden de giro de compra de materiales. **INCONVENIENTES ENCONTRADOS:** Orden Público y presencia de grupos armados en el sitio de la obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación del estado actual del contrato, posteriormente el contratista informa que se están implementando planes de choque para poder ejecutar las actividades contractuales, da a conocer que el porcentaje bajo en la ejecución, se debe a que se han tenido inconvenientes en el acopio de materiales por parte de la cantera, la cual no cuenta con la demanda suficiente, sumado a ello las diificultades por el daño en la maquinaria y los grupos armados que hacen presencia en la zona. En cuanto a la ejecucion del contrato se ve la necesidad de hacer un mejoramiento en los puntos criticos, por lo cual se requiere incluir un item no previsto y anexarlo en el capitulo de placa huella, la interventoria informa que para la inclusión de este item se debe realizar la solicitud mediante un oficio el cual justifique y contenga las acciones a ejecutar para su aprobación, la gestora tecnica manifiesta que este proceso se debe hacer mediante un acta de modificación.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Yimar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Daniel Alejandro Mañunga	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Jhon Edinson Ordoñez Toro	Ingeniero auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Juan David Ordoñez	Inspector de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Mario Rendon	Secretario de planeación e Infraes	Alcaldia Bolivar	
Hanner Segovia	Representante legal	Consorcio Onix	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. P 04-003-15.05/05
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 3/4/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 3/9/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 3/9/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: SI
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: Si
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: *Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023 del 16 de junio, se realiza la primera solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. m*Mediante oficio DON-1100-INV-172-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud. **PERSONAL APROBADO:** SI El contratista envió hojas de vida del director y residente de Obra. según su personal requerido.
PMT: *Mediante oficio DON-1100-INV-140-2023 del 16 de junio, se realiza la primera solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-151-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-172-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud
METAS FISICAS INICIALES: 0,456 Km de placa huella, 6 alcantarillas, demolición de 1 alcantarilla existente.
A**VANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 12,35% % METAS FISICAS EJECUTADAS:** 7 alcantarillas demolición de 1 alcantarilla existente
PAGA: Mediante oficio DON-1100-INV-186-2023 del 13 de julio, se emiten observaciones a la V1 del documento PAGA
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: se emitió información para el diseño de la valla por el contratista el día 26 de junio del 2023, se aprobó por la interventoría el 26 de junio y se emitió a gerencia de comunicaciones sin obtener respuesta a la fecha
ESTADO DEL ANTICIPO: El anticipo se encuentra consignado a la fiducia, las ordenes de operacion1,2 NO fueron aprobadas por la interventoría y la orden de operación 3 se encuentra en proceso de firmas de la representante legal de la interventoría

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, dando a conocer sus características, frente al PAGA el contratista manifiesta que se está realizando las subsanaciones para enviarlo nuevamente. en cuanto al avance de obra manifiesta que se han tenido dificultades por las características del proyecto las pendientes que existen son muy altas, ocasionando que las volquetas no puedan acceder al sitio de obra con toda su capacidad, frente a lo contractual realizaron una propuesta de acta de modificación la cual no está en parobación y firmas de la interventoria. el contratista se compromete el 28 de julio entregar subsanación de observaciones del PAGA, en cuanto al anticipo se envió 1 orden de giro avalada por la interventoría, pero se rechazó por la firma de la representante legal lo cual se revisará lo más pronto posible, se presento un inconveniente con la propietaria de un predio, debido a que el descole de la alcantarilla estaba afectando al predio, pero ya se han iniciado actividades con apoyo del municipio para subsanar las afectaciones.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de subsanacion de observaciones emitidas al PAGA	viernes, 28 de julio de 2023	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Interventc	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Daniel Alejandro Mañunga	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Mario Rendon	Secretaria de planeación e Infraes	Alcaldia Bolivar	
Hebert Lizardo Dorado Dorado	Representante legal	Consorcio PH Chalguayaco	
Mauricio Jimenez	Inspector Obra	Consorcio PH Chalguayaco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. F1-F14-289-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 11/5/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 11/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 11/11/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: SI
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: SI
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: *Mediante comunicado DON-1100-INV-141-2023 del 16 de junio, se realiza se realiza la primera solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud **PERSONAL APROBADO:** El contratista envió hojas de vida del director, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente de SST, Residente social y maestro de obra según su personal requerido. **PMT:** *Mediante comunicado DON-1100-INV-141-2023 del 16 de junio, se realiza se realiza la primera solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud
METAS FISICAS INICIALES: 0,885 Km de placa huella, 10 alcantarillas, 1 muro en concreto reforzado, L = 15 m, h = 3 m
AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 10,57%
PAGA: *Mediante comunicado DON-1100-INV-141-2023 del 16 de junio, se realiza se realiza la primera solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-152-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud.
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: el contratista emitió información para el diseño de la valla el 26 de junio del 2023, se emitieron observaciones por la interventoría
ESTADO DEL ANTICIPO: El contratista no ha enviado solicitud ni plan de inversión a la fecha, para ser aprobado por parte de la interventoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, dando a conocer sus características y las acciones que se han ejecutado. En cuanto al anticipo el contratista emitió una orden de giro que fue enviada a la interventoría para la revisión, se manifiesta por parte de la gestión técnica que el no pago del anticipo no es una excusa para el atraso del contrato, le solicita a la interventoria realizar un requerimiento al contratista y municipio para conocer el proceso del anticipo. El contratista manifiesta que si el municipio no está a la disposición de cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago de actas y anticipo solicitara liquidación del contrato en 15 días posteriores a la reunión. Se hará requerimiento al municipio por parte del gestor técnico revisando las causas pueden ser imputables a cada una de las partes del atraso que se está presentando en cuanto al desembolso del anticipo, adicionalmente la gestora tecnica informa que la fecha de la terminación del contrato de obra no puede exceder la terminación del contrato de la interventoría, se solicita al contratista enviar la subsanacion de las observaciones emitidas a la valla informativa, frente al PAGA se han emitido 3 solicitudes de entrega de las cuales no se ha obtenido respuesta, el contratista manifiesta que el viernes 28 de julio del 2023 enviara diseño de valla y el documento PAGA. la interventoria solicita que sean enviadas las hojas de vida del personal y información de la maquinaria.

Finalizando la reunión se conectó el municipio dando a conocer que el anticipo ha estado pausado por falta de información en el expediente coontractual, ya que el contratista emitió un 80% de la información, faltando un 20%. se establece que deben coincidir todas las fechas de terminación del contrato con la fecha de terminación de la interventoría, se solicita al contratista dejar el programa de obra y flujo de caja hasta el 31 de octubre, Una vez se subsane el acta de inicio se enviará a la interventoría para las firmas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar informacion socio-ambiental y del area administrativa	viernes 28 de julio del 2023	contratista
Enviar nuevo cronograma y flujo de caja con fecha de 31 de octubre	viernes 28 de julio del 2023	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Jhon Edinson Ordoñez Toro	Ingeniero auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Fernely Campo	Secretario de Infraestructura	Alcaldia Almaguer	
Julian Lizandro Gonzales Casas	Contratista	Contratista	
Luis Eduardo Fernandez	Ing apoyo	Sec. Infraestructura	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.7 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 93 -2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A ALAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 4/7/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 4/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4/11/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: SI
ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO: SI
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS: Mediante oficio DON-1100-INV-177-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud.
PERSONAL APROBADO: A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista las hojas de vida de los siguientes profesionales: director de Obra, Residente de obra, residente ambiental, Residente en SST, Residente social y maestro de obra, solicitud que se realizó en las reuniones sostenidas con el contratista e 29 de mayo y 01 de Junio de 2023.
PMT: Mediante oficio DON-1100-INV-177-2023, del 10 de julio, se realiza la primera solicitud
METAS FISICAS INICIALES: 0,415 Km de placa huella y 4 alcantarillas
AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 11,14%
PAGA: Mediante oficio DON-1100-INV-195-2023, del 24 de julio, se emiten observaciones a la V1 del PAGA.
VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: Se envió información para el diseño de la valla informativa, pendiente respuesta de comunicación de INVIAS y mediante comunicado DON-1100-INV-173-2023 del 7 de julio, se realiza nuevamente solicitud de la información de la valla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se da inicio a la reunión con la presentación del estado actual del contrato de obra, dando a conocer sus características y las acciones que se han ejecutado, el contratista manifiesta que la comunidad ha solicitado hacer un cambio en las alcantarillas, cambiarla por una de doble tuberia, debido a que no se ha sido posible contar con el permiso de servidumbre, la interventoría se compromete a revisar el balance del contrato para ver si se puede realizar la aprobación de los nuevos ítems y ver las soluciones mas apropiadas en la construcción de las alcantarillas. La interventoría solicita se continue con las actividades que se puedan desarrollar ya que no se puede parar la obra por el inconveniente de las alcantarillas, adicionalmente la interventoria requiere al contratista enviar el PAGA subsanando las observaciones enviadas. El contratista manifiesta enviará el día 28 de julio esta información, la residente social informa que una vez se emita diseño de valla por el grupo de comunicaciones se enviará al contratista para su impresión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar Documento PAGA subsnado	viernes, 28 de julio de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Intervento	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Yimar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Daniel Alejandro Mañunga	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Jhon Edinson Ordoñez Toro	Ingeniero auxiliar de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Juan David Ordoñez	Inspector de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Fernely Campo	Secretario de Infraestructura	Alcaldia Almaguer	
Eduar Ceron Sotelo	Director de obra	Contratista	
Luis Eduardo Fernandez	ing. Apoyo	Sec. De infraestructura	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.8 INZÁ 1983 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

FECHA ORDEN DE INICIO: 28/4/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:**28/7/2023
APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO

METAS FISICAS INICIALES: 0,24 Km de placa huella, 4 alcantarillas, conformación de calzada existente y 3.07 km de afirmado en sitios críticos

AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 18,42%

PAGA: *Mediante oficio DON-1100-INV-139-2023 del 16 de junio, se realiza la primera solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-150-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-170-2023 del 7 de julio, se realiza la tercera solicitud.

VALLAS APROBADAS E INSTALADAS: A la fecha no se ha enviado información para el diseño de la valla informativa, la interventoría emitió oficio solicitando la misma el día 16,26 de junio y 7 de julio del 2023

ESTADO DEL ANTICIPO: Se encuentra consignado el valor del anticipo a la fiducia y se está a la espera del documento de prórroga del contrato, para autorizar la orden de pago N°1 a la fiducia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, las acciones que se han ejecutado hasta la fecha, se solicita al contratista por parte de la interventoría la entrega de información de la valla informativa para el 1 de agosto del 2023, en cuanto al PAGA se da a conocer que este tiene un plazo máximo de entrega maximo hasta el 15 % de avance del proyecto por lo cual se solicita se haga el envío del mismo para su revisión lo antes posible. El contratista manifiesta tener inconvenientes por las lluvias para el manejo del material y conformación del mismo, informa que en los puntos críticos en donde se ha instalado el material se ha perdido, frente a ello manifiesta su interés por ejecutar la placa huella y hacer un plan de contingencia para trabajar esperando que el clima mejore, realizando actividades como usar plásticos para las fundiciones, la interventoria le solicita la implementacion de un plan de contingencia y la entrega de los estudios y diseños, se informa al finalizar la reunion que el secretario de planeacion informo via a whatsApp que no se tenia energia en el municipio por lo cual no fue posible conectarse a la reunion.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del PAGA y informacion de la valla informativa	martes 1 de agosto del 2023	contratista
Entrega del plan de contingencia	10 de agosto del 2023	contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Interventc	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Juan David Ordoñez	Inspector de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Hames Piamba Hoyos	Consorciado	CONSORCIO INZA 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2.9 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 484-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
FECHA ORDEN DE INICIO: 1/06/2023 **FECHA TERMINACION INICIAL:** 1/10/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 1/10/2023 **APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** SI **ESTADO REVISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ORDEN DE INICIO:** SI **APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INCIALES: EQUIPOS APROBADOS:** *Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023 del 16 de junio, se realiza la primera solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. **PERSONAL APROBADO:** A la fecha se tiene pendiente enviar por parte del contratista las hojas de vida de los siguientes profesionales: director de Obra, Residente de obra, residente SISO, residente Ambiental, residente Social y maestro de obra. Solicitud que se realizó en las reuniones sostenidas con el contratista el pasado 29 de mayo y primero de junio de 2023. **PMT:** NO **METAS FISICAS INICIALES:** 0,496 Km de placa huella, 8 alcantarillas, 1 muro en concreto reforzado, 1 muro en gaviones, conformación de calzada existente y afirmado **AVANCE META FISICA: % DE EJECUCION: 5,90%** **PAGA:** *Mediante oficio DON-1100-INV-142-2023 del 16 de junio, se realiza la primera solicitud. *Mediante oficio DON-1100-INV-153-2023 del 26 de junio, se realiza la segunda solicitud. **VALLAS APROBADAS E INSTALADAS:** A la fecha no ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa. la interventoría emitió oficio solicitando la misma el día 26 de junio del 2023 **ESTADO DEL ANTICIPO:** N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, posteriormente se realiza la presentación del contrato, por parte de la gestora tecnica solicita que el nombre del tramo de la vía sea el mismo en todos los documentos.La interventoria da ha conocer las acciones y requerimientos que se han ejecutado hasta la fecha, El municipio manifiesta que se ha realizado el mejoramiento de la vía alterna, aunque la comunidad de otras veredas han solicitado se mejoren otras vías, lo cual no no fue el compromiso que se realizó al inicio del contrato. En cuanto a los rendimientos financieros el municipio informa que son muy pocos, por lo cual no se han enviado, se le solicita que estos de deben realizar mensuales segun obligaciones del convenio. Frente a los cierres es importante realizar acompañamiento social desde los tres entes. Hay un atraso del 19,08% en relación al programado, se está a la espera de la firma de ítems no previstos para la construcción del filtro, la inspectora SST de la intervnetoria recomienda la señalización de la vía para evitar accidentes en los sitios de excavaciones profundas. Se solicita al municipio dar respuesta frente a lo enviado de los rendimientos financieros. la residente social infirma que la valla informativa se aprobó por parte de la interventoría y se esta a la espera del diseño emitido por grupo de comunicaciones, en cuanto al PAGA el residente ambiental informa que se hará reunión del componente ambiental, con el contratista y la interventoría para dar explicación de las observaciones realizadas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunion ambiental para la realizacion del PAGA		Interventoria y contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Lopez	Gestora Tecnica Saliente	INVIAS	
Oscar Ruiz Santos	Gestor Tecnico Entrante	INVIAS	
Cristian Estupiñan Santacruz	Director de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Paola Fernanda Erazo R	Residente de interventoria	Donovan/Interventoria	
Leonel Enrique Camacho Granados	Residente Ambiental de Interventc	Donovan/Interventoria	
Keren Yireth Sanchez Meneses	Ingeniera Auxiliar Administrativa	Donovan/Interventoria	
Sonia Constanza Perez Motta	Residente Social de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Juan David	Inspector de Interventoria	Donovan/Interventoria	
Ana lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	Donovan/Interventoria	
Jesus Ancizar Calvo Castro	Representante legal	Consorcio Vias Rural 2022	
Yaneth Stella Avirama Paz	Consorciada	Consorcio Vias Rural 2022	
Jorge Armando Valero Hernandez	Secretario de Planeación y equipamient	Alcaldia de Santander Q	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.3 ACTAS DE REUNIÓN

4.9.3.1 MERCADERES 1894 – CAUCA – 5 DE JULIO DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 05-07-2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Vías Regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 21-TIA-240-2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Mercaderes 23

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización de respuesta a solicitud, realizada por la comunidad.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se da inicio a la reunión dando a conocer como fue el proceso y quienes intervinieron para dar respuesta ante la solicitud de la comunidad de agregar un tramo de placa huella.

La respuesta es negativa, ya que si se da aprobación se entraría a un precedente, lo cual es ingresar recursos a otras obras que no tienen que ver con el presupuesto del INVIAS.

La comunidad solicita la información del proyecto el cual se envía a la veeduría.


La comunidad manifiesta su inconformidad frente a la respuesta y busca soluciones para poder ejecutar el tramo que se ubica dentro de la misma vereda.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2
FECHA (Día / Mes / Año)	05-07-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

la comunidad manifiesta al contratista que se inicie las obras y el almacenamiento de materiales, como el cargue de los trenes mas criticos ya que el clima les esta colaborando.

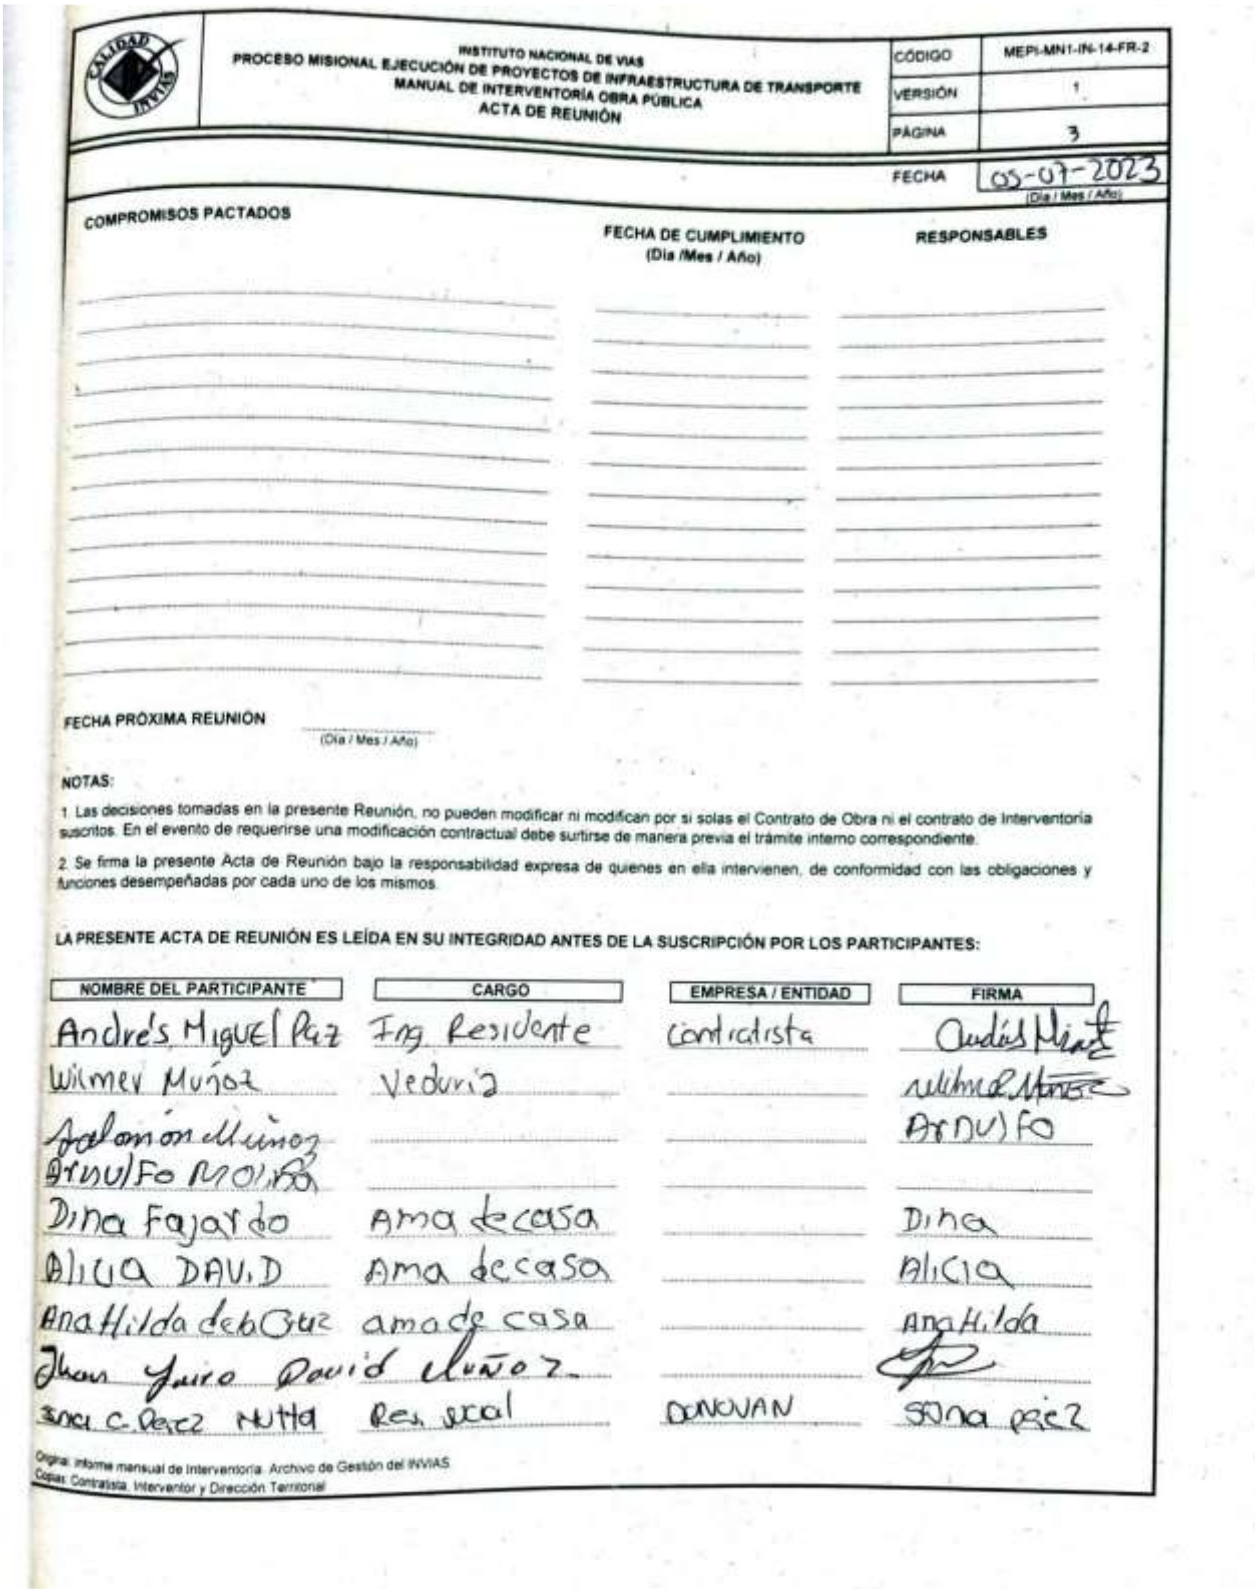

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA 05-07-2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:


1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Andrés Miguel Paz	Ing Residente	Contratista	
Wilmer Muñoz	Veduría		
Salomón Muñoz			
Arnulfo Moreno			
Dina Fajardo	Ama de casa		Dina
Alicia David	Ama de casa		Alicia
Anahilda Deb Cruz	ama de casa		Anahilda
Jhon Jairo David Muñoz			
Sonia C. Perez Nuttla	Residente	DONOVAN	

Original: informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

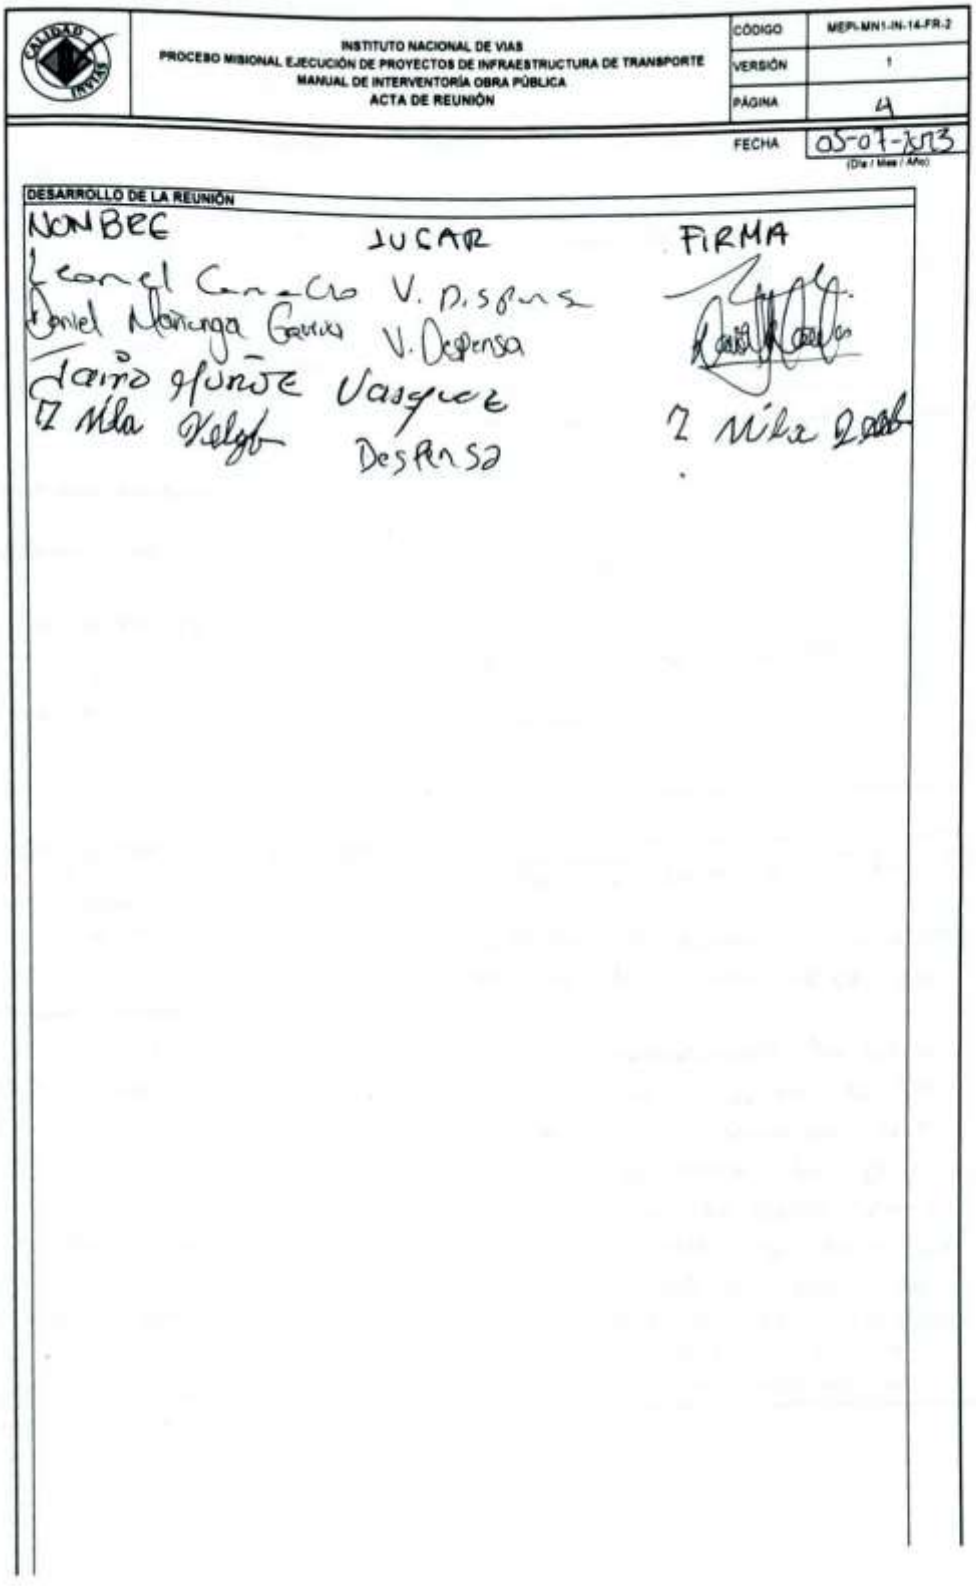

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 4
FECHA: 05-07-2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Leonel Carrillo	V. Defensa	
Daniel Manzanga Garcia	V. Defensa	
Laura Munoz Vasquez	Defensa	
Z Nila Velez		

4.9.3.2 BOLÍVAR 1750 – CAUCA – 26 DE JULIO DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	26-07-23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. P 04-003-15 05/05/
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNION
Socializar accionel a desarrollo en el predio afectado por el deicde de la una alcantarilla

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
Se socializa a la propietaria del predio las accio-ones que se realizaran en el predio, en donde se determina realizar un disipador de energia el cual disminuye la fuerza del agua, y una vez caiga en la vivienda encausar por tuberia, se hace la recomendación de ampliar el diametro de la tuberia.
la propietaria del predio manifiesta estar de acuerdo con las acciones a realizar en el predio.

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMN1.IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNION _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Mery Janeth Hoyos	propietario		
Leonel Camacho	Res Amb	Donovan	
Dra Lucy Moreno	Res SST	DONOVAN	
Yilmer Sanchez	Ing Aux. Interventoría	Donovan	

4.9.3.3 INZA 1983 – CAUCA – 10 DE JULIO DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10-07-23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____ (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 141-2022 (Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio inza 22

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-202 (Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Consultoría donduan S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a las actividades contractuales

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

El contratista manifiesta dificultad para la compactación del material, ya que se ha realizado la adecuación del mismo pero hay tramos donde se acidchara.

Se solicita al contratista realizar la toma de densidades una vez se conformen los tramos.

Se solicita que el Municipio apruebe los estudios y diseños para dar inicio con la construcción de la Placa huella.

Frente al alcantarillado se realizara una revisión para el cambio en el canto rodado.

Se realizara un nuevo balance con las nuevas acciones a ejecutar.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2
FECHA	10-07-23 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El contratista debe solicitar una galvoga evidenciando avance de obra.

- Se solicita al contratista el envio del la información para la valla informativa y resolución de vecedurio.
- se solicita al contratista el envio de los actas de vecindad de inicio.
- se solicita el envio del PAGA en los diferentes componentes
- Certificado de la Sec. de Planeación para uso de suelo para disposicion de RCD.
- Se solicita al contratista se inicie con la execución de la Placa Huella una vez se tenga la aprobacion de estudios y diseños por parte de l Municipio.
- se solicita al contratista el envio de planillas de pago de seguridad social, y los hojas de vida de los profesionales.
- Certificado de contera

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA: 10-07-23 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Entrega del PAGA	17-07-23	Contratista
• Entrega de intimación de valla publicidad	"	Contratista
• Entrega de resolución de vecindad	"	Contratista
• Entrega de actas de vecindad	"	Contratista
• Inicio de ejecución de placa huella.	"	Contratista.
• Envio de solicitud de los descuentos	11-07-23	Contratista
• envio de hojas de vida de los Profesionales y afiliaciones y afiliaciones con pago de planilla	17-07-23	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Erica Perez	Res social	DONOVAN	Erica Perez.
David Puchicue Medina	Jefe Infraestructura Inza	Alcaldia	
James Flamba	Representante legal	Consorcio Inte	
Paola Ferreira Ortiz	Residente de obra de interventoria	Donovan.	
CHRISTIAN ESTUPIÑAN	DIRECTOR INTERVENTORIA	DONOVAN	
Juan Ordoñez	Inspector interventoria	Donovan	Juan Ordoñez
Leonel Camacho	Res. Amb.	Donova	
Drahury Marcos M.	Res. SST.	DONOVAN SAS	Drahury Marcos

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.3.4 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CUACA – 17 DE JULIO DE 2023

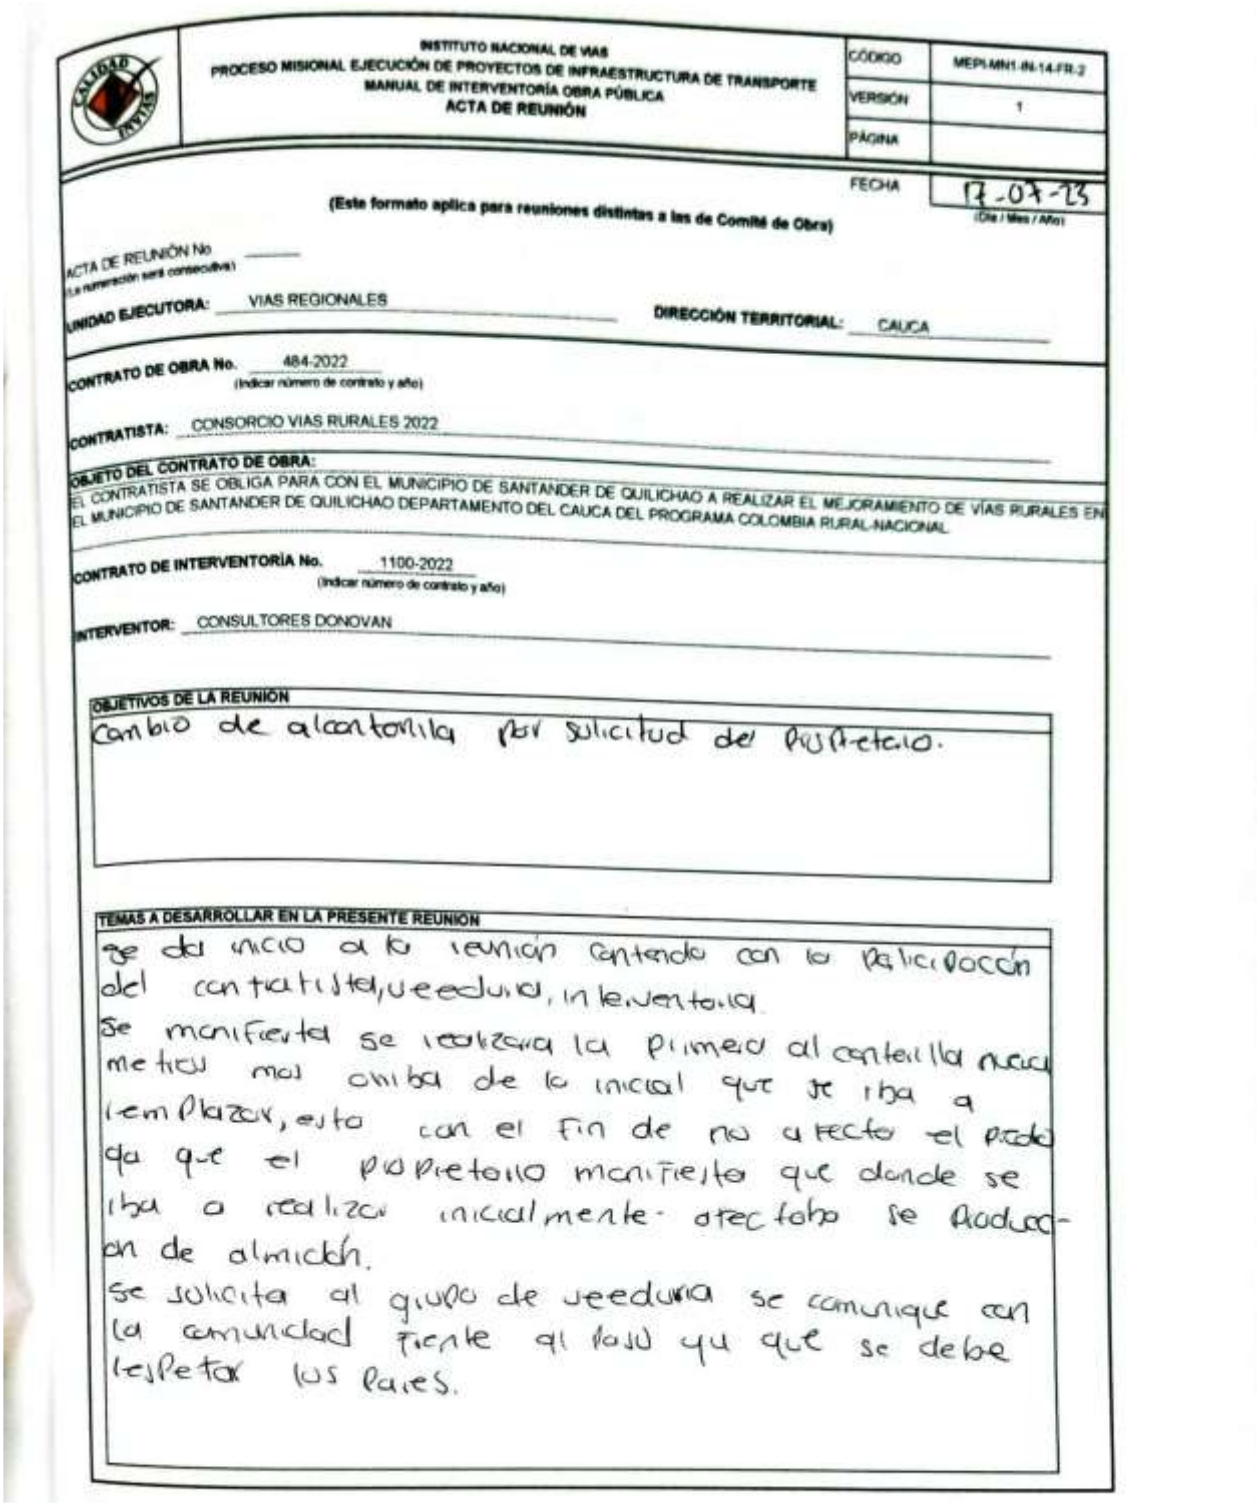

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEPI.MN1.IN.14.FR.2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 17-07-23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 484-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Cambio de alcantarilla por solicitud del Propietario.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
se da inicio a la reunión contando con la participación del contratista, veeduria, interventoria.
Se manifiesta se realizara la primera alcantarilla mas metros mas arriba de la inicial que se iba a remplazar, esto con el fin de no afectar el predio ya que el propietario manifiesta que donde se iba a realizar inicialmente afectaba la producción de almidón.
Se solicita al grupo de veeduria se comunique con la comunidad frente al paso ya que se debe respetar los Retiros.

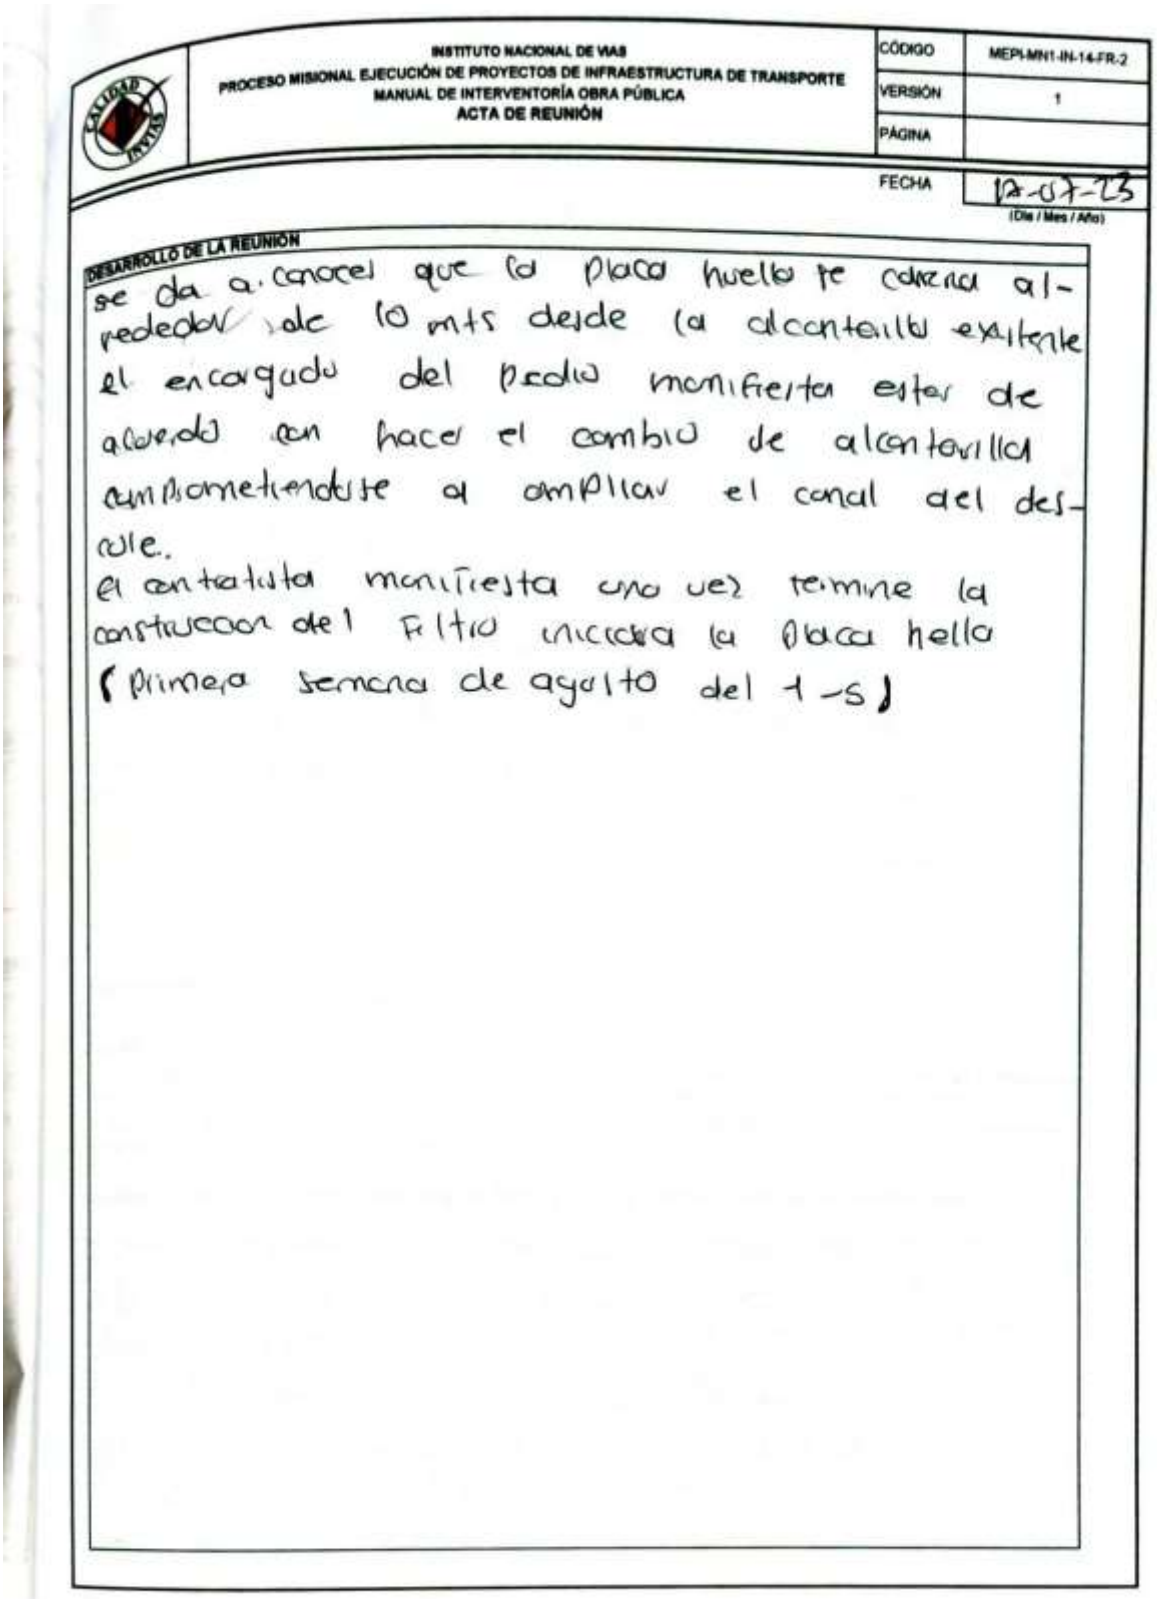


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	12-07-23

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se da a conocer que la placa huella se cerrara alrededor de 10 mts desde la alcantarilla existente
el encargado del predio manifiesta estar de acuerdo con hacer el cambio de alcantarilla cumpliendo se al ampliar el canal del desarrollo.
El contratista manifiesta una vez termine la construccion del Filtro iniciara la placa huella (primera semana de agosto del 1-5)

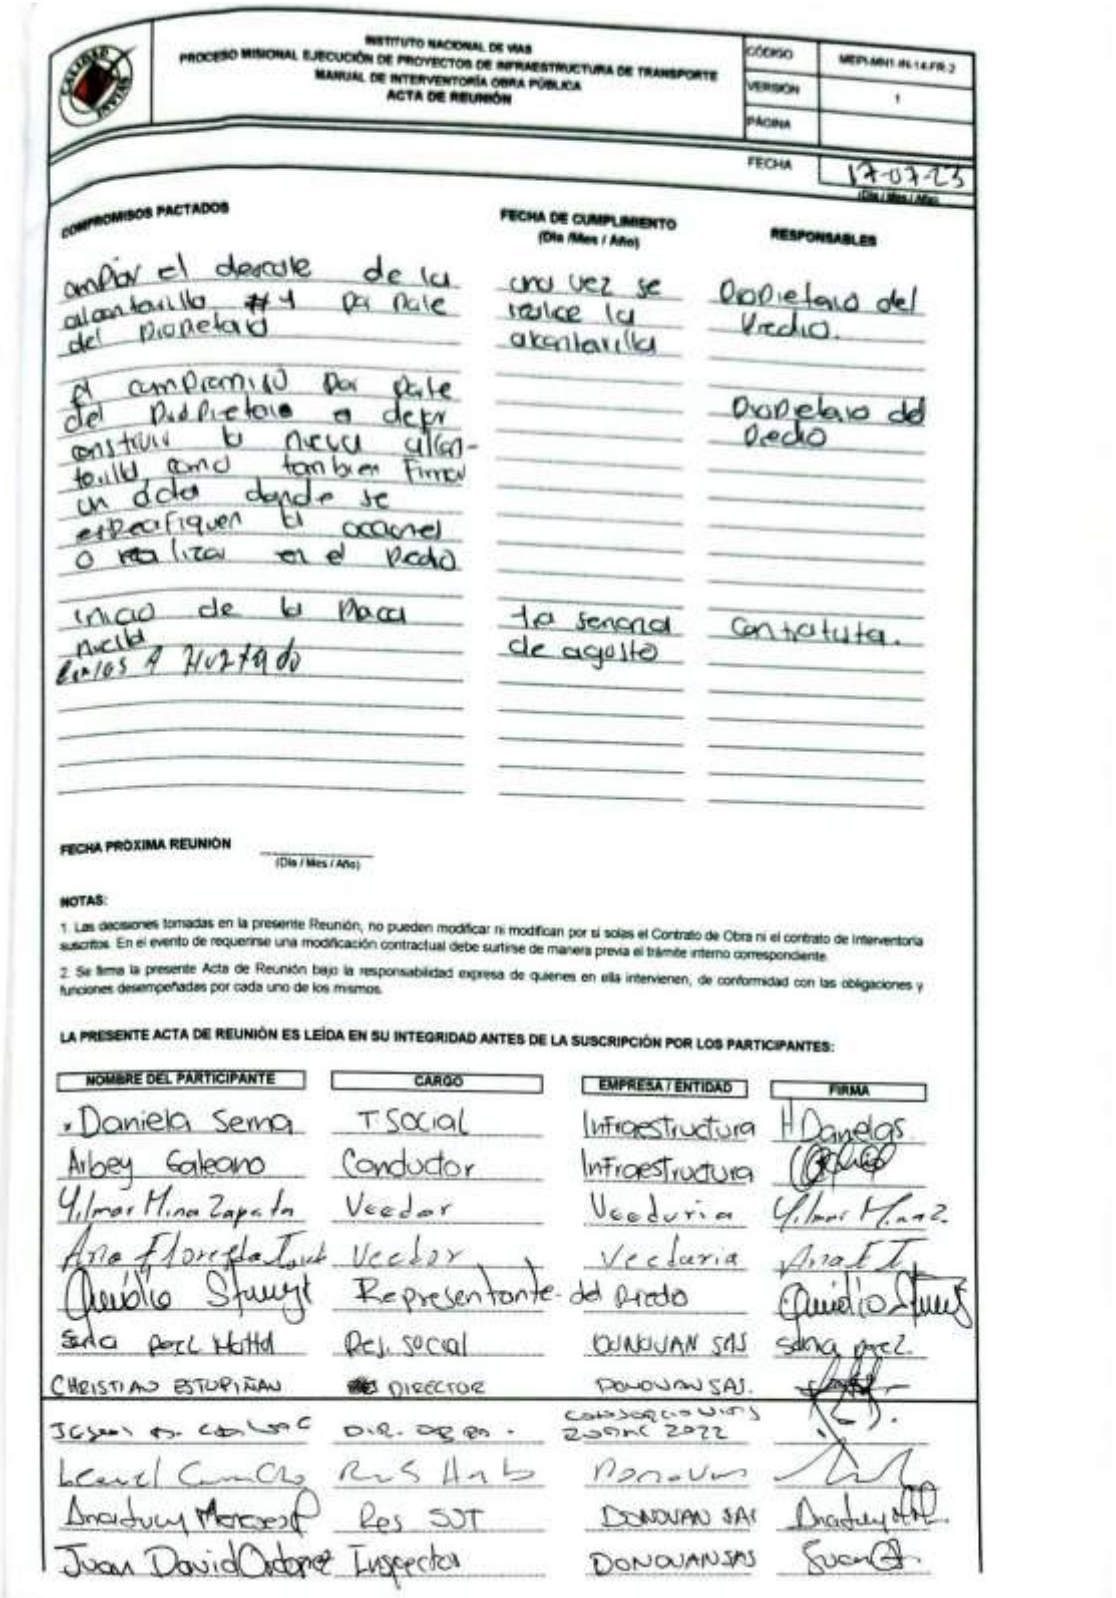

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEPLMINT-IN-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 17-07-23 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ampliar el derecho de la alcantarilla #4 por parte del Propietario	una vez se realice la alcantarilla	Propietario del Predio.
El compromiso por parte del Propietario es dejar construir la nueva alcantarilla como tambien Firmen un acta donde se especifiquen el acuerdo o realizado en el Predio		Propietario del Predio
inicio de la Pacca Nueva Radios A Hurtado	1a semana de agosto	Contratista.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Daniela Serna	T Social	Infraestructura	
Arbey Galeano	Conductor	Infraestructura	
Yilmar Mina Zapata	Veedor	Veeduria	
Ana Florelia Tuta	Veedor	Veeduria	
Quidio Stuyt	Representante del Predio		
Sara Perez Hoffd	Res. social	DONOVAN SAS	
CHRISTIAN ESTUPIÑAN	DIRECTOR	DONOVAN SAS.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ING. ROSA MARIA CORDERO CELIS Representante Legal
No. del Contrato de Interventoría	1100 DE 2022
Objeto del Contrato de Interventoría	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9”
Valor del Contrato de Interventoría	$1.740.313.120
Fecha suscripción Contrato	12 de diciembre de 2021
Fecha Orden de Inicio	12 de diciembre de 2022
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de octubre De 2023

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los siguientes documentos:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Carpeta de la etapa de Pre-Contractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.).
- Programa de obra e inversión
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades de control y seguimiento:

- Generar comunicaciones a los contratistas dando respuesta a inquietudes y a su vez solicitando la información referente al contrato.
- Revisar, verificar y corroborar la documentación entregada por el contratista, velando por la calidad de la información suministrada.
- Emitir las observaciones y recomendaciones a los documentos exigidos por los contratos y pliegos de condiciones, siguiendo las instrucciones que se describen en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVÍAS en su versión del 2022.
- Dar aprobación a la información que sea suministrada sin observaciones o subsanando las que se hayan generado por Interventoría.
- Se reiteran solicitud de información técnica para el inicio de obras conforme los documentos contractuales, especificación y normatividad del INVÍAS, resaltando la urgencia de estos.
- Efectuar seguimiento a las actividades ejecutadas de cada contrato, velando por la calidad y cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

A continuación se presenta los conceptos técnicos emitidos por los especialistas realizados en el presente mes:

Bogotá, 8 de junio de 2023
159-23-GDING-V180

Señores
CONSORCIO DONOVAN CAUCA
Atención Ingeniero Diego Arenas.
Bogotá D.C. .

ASUNTO: Estudio de suelos, Proyecto de mejoramiento de vías rurales en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, **Vía Mandiva-alto Paraíso**.

Respetados Señores:

El estudio de suelos efectuado por el ingeniero José Andrés Martínez Dorado determinó que la subrasante presenta un CBR mayor al 3% y por lo tanto recomienda un espesor de la subbase granular de 15 centímetros y con esto se ajusta a la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella.

Adicionalmente el informe presenta los parámetros para el diseño de un muro de contención en gaviones ubicado en la abscisa K+106 y la aplicabilidad de la cartilla Colombia Rural para el dimensionamiento del muro de gaviones.

Con base en lo anterior, el Estudio de Suelos cumple con lo requerido para el proyecto de construcción de la placa Huella.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración que se requiera al respecto.

Cordialmente,
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A



ING. MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHÁVEZ
Especialista en Geotecnia y pavimentos.

Bogotá, 7 de julio de 2023
157-23-GDING-V180

Señores
CONSORCIO DONOVAN CAUCA
Atención Ingeniero Diego Arenas.
Bogotá D.C. .

ASUNTO: Estudio de suelos, Proyecto de mejoramiento de vías rurales en el departamento del Cauca, municipio de Sucre, Vereda Peña Blanca.

Respetados Señores:

El estudio de suelos efectuado por el ingeniero Héctor Narváez Montealegre, presenta los trabajos de exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio para la vía del asunto, sin embargo **no** define la estructura del pavimento, por lo que es necesario que defina el CBR de diseño y con base en la "Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella" defina si con los resultados del estudio se puede acoger al diseño de la estructura de la placa huella en lo que hace referencia al espesor de la subbase granular y la losa de concreto o si se requieren actividades o procedimientos de estabilización de la subrasante y sus recomendaciones particulares.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración que se requiera al respecto.

Cordialmente,
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A



ING. MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHÁVEZ
Especialista en Geotecnia y pavimentos.

Bogotá, 21 de julio de 2023
181-23-GDING-V180

Señores
CONSORCIO DONOVAN CAUCA
Atención Ingeniero Diego Arenas.
Bogotá D.C. .

ASUNTO: Estudio de suelos, Proyecto de mejoramiento de vías rurales en el departamento del Cauca, municipio de Sucre, corregimiento el **Paraíso, sector la Ceja**.

Respetados Señores:

El informe presentado por el ingeniero Juan Pablo Ruiz sobre el diseño de la estructura del pavimento concluye:

El CBR dela subrasante es mayor de 3.0% (3.1%).
El estudio plantea un material de nivelación de 14 cm
Una base granular de 15 cm
Y una losa de concreto de 19 cm de espesor, MR de 4.0 Mpa.

Los diseños fueron verificado por el ingeniero Juan Pablo Ruiz por los métodos del INVIAS, AASHTO Y PCA, **por lo cual se Aprueba la estructura propuesta**.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración que se requiera al respecto.

Cordialmente,
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A

ING. MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHÁVEZ
Especialista en Geotecnia y pavimentos.

Bogotá, 21 de julio de 2023
186-23-GDING-V180

Señores
CONSORCIO DONOVAN CAUCA
Atención Ingeniero Diego Arenas.
Bogotá D.C. .

ASUNTO: Estudio de suelos, Proyecto de mejoramiento de vías rurales en el departamento del Cauca, municipio de Sucre, corregimiento el **Paraíso, sector la Ceja**.

Respetados Señores:

Con respecto al informe de ensayos de geotecnia para el sector del asunto, se ejecutaron 8 apiques, a partir de los cuales se tomaron muestras para ensayos de laboratorio tanto de clasificación, como límites de consistencia, granulometría-pasa tamiz 200% y CBR, con lo que se obtuvo información básica para el diseño de la estructura del pavimento, **por lo cual se Aprueba el informe de ensayos de geotecnia.**

Con gusto atenderemos cualquier aclaración que se requiera al respecto.

Cordialmente,
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A



ING. MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHÁVEZ
Especialista en Geotecnia y pavimentos.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se hace seguimiento al equipo y vehículos del contrato de interventoría mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUL/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DONOVAN SAS

CONTRATO DE OBRA No.

	CONTRATISTA:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINT	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CAST	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAN	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
0	Convenio 2496 de 2019

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**JUL/2023**																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el mes de junio se realizó seguimiento a los contratos de obra con el siguiente personal:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN REAL MENSUAL
Christian Camilo Estupiñán Santacruz	Director de Interventoría	100%
Paola Fernanda Erazo Rodríguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	100%
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	100%
Yilmar Rene Sánchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	100%
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	100%
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	100%
Sonia Constanza Pérez Motta	Profesional social	100%
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniera auxiliar administrativa	100%
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	100%
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	100%
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	100%

De igual manera, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA:

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Agosto 10 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUL/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 9".

CONTRATO DE OBRA No.:

	CONTRATISTA:
141 DE 2.022	CONSORCIO INZA 22 RL JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-288-2022	JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022	EMCONSUT S.A.S. RIL WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP-04-003-16.05/058	CONSORCIO PH CHALGUAYACO RIL HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/023.15.5/099	CONSORCIO CNNK CCM RIL JHANER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022	CONSORCIO MERCADERES 23 RIL JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 RIL JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUOBRAS GYA SAS RIL PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	CONSORCIO SUCRE 22 RILJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Convenio 2496 de 2019	0

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	JUL/2023																																	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1085270769	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 6,950,000	$ 483,720	V	Sanitas	9454859981	$ 278,000	Porvenir	9454859981	$ 1,112,000		$ -	$ -	
2	Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1085289652	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	Asmet Salud	9454859981	$ 220,000	Porvenir	9454859981	$ 880,000		$ -	$ -	
3	Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1061784737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
4	Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1061757234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
5	Jhon Edison Ordoñez Toro	1085311045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
6	Mauricio Hernan Camargo Chavez	79334503	Especialista en Geologia y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 3,380,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,380,000	$ 235,248	V	Salud Total	9452884232	$ 135,200	Porvenir	9452884232	$ 540,800		$ -	$ -	
7	Leonel Enrique Camacho Granados	85154105	Profesional ambiental	$ 3,800,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
8	Sonia Constanza Perez Motta	1061800536	Profesional social	$ 3,800,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	A.I.C	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
9	Keren Yireth Sánchez Meneses	1005874974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 3,000,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	Sanitas	9454859981	$ 120,000	Colpensiones	9454859981	$ 480,000		$ -	$ -	
10	Ana Lucy Meneses Muñoz	25299410	Inspector SST	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Sanitas	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
11	Juan David Ordoñez Daza	1058973435	Inspector	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
12	Carlos Gerardo Hoyos Medina	10,316,935	Inspector	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva EPS Movilidad	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
N																																														
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 42,930,000																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 11/08/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio mediante concurso de méritos No.CMA-DO-SRT-062-2021, la oferta económica adjudicada es:

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000
1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,500,000.00		18	$ 99,000,000
1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,500,000.00		16	$ 56,000,000
	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)				$ 87,500,000
1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
1	Inspector	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48	$ 10,560,000
	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA				
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000
1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000
1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000
	OTROS COSTOS				
1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16	$ 40,000,000

1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$	16,000,000
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$	16,000,000
1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$	3,300,000
1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$	2,400,000
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$	261,460,000
*				**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**	$	1,389,186,000
				PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	$	73,262,000
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$	1,462,448,000
*				**IVA = 19% * (E) = (F)**	$	277,865,120
*				**COSTO TOTAL = (E) + (F)**	**$**	**1,740,313,120**

En este sentido se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT en donde se evidencia el avance financiero de Interventoría conforme a las actas de cobro tramitadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 — **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: JUL/2023 — **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2 022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/L JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:** 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ -
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,437,454,764
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120**	**$ 1,437,454,764**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,740,313,120

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,652	$ 1,679,543,652	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,272	$ 1,660,025,272	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,870**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402	$ 1,566,998,402	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764	$ 1,437,454,764	-	-
8	JUL/23	$ 119,134,800	$ 22,635,612	**$ 141,770,412**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,295,684,352	$ 1,295,684,352	-	-
9		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
10		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
TOTALES		**$ 373,637,620**	**$ 70,991,148**	**$ 444,628,768**	$ -	$ -	$ -		**$ 1,295,684,352.00**	**$ 1,295,684,352**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 314,468,820	$ 59,749,076	$ 374,217,896
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 59,168,800	$ 11,242,072	$ 70,410,872
VALOR TOTAL	$ 373,637,620	$ 70,991,148	**$ 444,628,768**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como parte de los compromisos de esta Interventoría se relaciona el seguimiento de las garantías del contrato mismo:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

PLAZO INICIAL: 10,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,740,313,120.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 174,031,312	22	7	2022	30	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 292,489,600	22	7	2022	30	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 348,062,624	22	7	2022	31	10	2026
Calidad del servicio	30%	$ 522,093,936	31	10	2023	31	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100216606

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 3/05/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	0%	$ -		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	0%	$ -		
Calidad del servicio	0%	$ -		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100216606

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.05.03 15:30:00 -05:00

Código de Seguridad: HsRJ/kzQBrjtpQ8Q32DBkw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1517-P-05-[illegible]

No. PÓLIZA	NB-100216606	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71590046	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/07/2022	24:00 Horas Del	22/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSULTORES DONOVAN S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.644.351-9
DIRECCIÓN	CALLE 17 # 10-16 OF 803	TELÉFONO	7460535
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 2 BIS N 53 A 59	TELÉFONO	7856000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 2 BIS N 53 A 59	TELÉFONO	7856000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1100 DE 2022 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: A) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/09/2024	174.031.312,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/09/2024	292.489.600,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/12/2022	24:00 Horas Del 22/03/2027	348.062.624,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 22/03/2024	24:00 Horas Del 22/03/2029	522.093.936,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.336.677.472,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - APP

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El 12 de diciembre, la interventoría firmo Acta de inicio del contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" "LOTE 9".
- En el transcurso del contrato la interventoría solicito a las Alcaldías Municipales del Cauca, que suscribieron convenio con el INVIAS y que son objeto de seguimiento de esta interventoría, el envío de los Estudios y Diseños de las obras para revisión y aprobación de los especialistas de la interventoría.
- A la fecha del presente informe se avanzó en la entrega de documentos previos por parte de los contratistas de obra para revisión y aprobación de la interventoría, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoría del INVIAS.
- Luego de la revisión de la documentación requerida y bajo mutuo acuerdo entre las partes (Contratista, Interventoría y Municipio) se suscriben los contratos de obra:

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MUNICIPIO
ARG-OBRA-009-2022	03/04/2023	Argelia 1984
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	16/05/2023	Sucre 1866
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	16/05/2023	Sucre 1769
LP 005/003-15.5/059	25/04/2023	Bolívar 1867
LP 04-003-15.05/058	3/04/2023	Bolívar 1750
F1-F14-289-2022	11/05/2023	Almaguer 1749
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	4/07/2023	Almaguer 1982
141 DE 2.022	28/04/2023	Inzá 1983
484 de 2022	01/06/2023	Santander de Quilichao 1768

- De acuerdo con lo anterior, se solicitó a los contratistas de obra la información de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, así mismo, se requirió el inicio de las actividades constructivas respectivas. Sin embargo, a la fecha del presente informe, los municipios de: Sucre convenio 1866 presenta un porcentaje de avance del 2.06%, Sucre convenio 1769 presenta un porcentaje de avance del 0.24% y Santander de Quilichao convenio 1768 presenta un porcentaje de avance del 9.00%, siendo así los convenios con mejor porcentaje de ejecución.
- Se espera para el siguiente periodo que el municipio de Mercaderes convenio 1894, el contratista de obra pendiente, suscriba acta de inicio, para iniciar la ejecución de la obra y cumplir el objeto contractual del mismo, de igual forma se realizara seguimiento a los trámites administrativos y entrega de documentación.

- Considerando el plazo contractual de Interventoría, se requiere que el municipio de Puerto Tejada adelante y agilice la adjudicación del contrato de obra, lo anterior para el cumplimiento de las obligaciones de esta interventoría conforme al seguimiento y control de obras pertenecientes al Lote 9 del programa Colombia Rural del departamento del Cauca, así como del convenio interadministrativo No. 2496-2019.
- A los municipios que presentan porcentajes de atraso superiores al 8% se realiza el debido llamado de atención de presunto incumplimiento; para este periodo mediante oficio DON-1100-INV-178-2023 se realiza un presunto incumplimiento al municipio de Almaguer convenio 1749; mediante oficio DON-1100-INV-194-2023 se realiza un presunto incumplimiento al municipio de Sucre convenio 1769.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

MUNICIPIO DE ARGELIA – CAUCA – CONVENIO: 1984

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-159-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ARGELIA CONVENIO N° 1984 de 2021	CORREO ELECTRONICO
5/07/2023	FIRMAS AUTORIZADAS EN FORMATO SEBRA REINTEGRO RENDIMIENTOS.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-167-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO
17/07/2023	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA Y POLIZAS ACTUALIZADAS.	CORREO ELECTRONICO
31/07/2023	DON-1100-INV-199-2023 RESPUESTA INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO ARG-OBRA-009-2022 - PÓLIZA NO. 57-44-101003017.	CORREO ELECTRONICO
31/07/2023	DON-1100-INV-201-2023 SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA CONTRATO N° ARG-OBRA-009-2022. Convenio 1984.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE MERCADERES – CAUCA – CONVENIO: 1894

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-160-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE MERCADERES CONVENIO N° 1894 de 2021	CORREO ELECTRONICO
10/07/2023	DON-1100-INV-176-2023 SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
21/07/2023	DON-1100-INV-193-2023 REITERACIÓN SOLICITUD DE AJUSTES A DISEÑOS ENTREGADOS.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1866

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-161-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE SUCRE 1 CONVENIO N° 1866 de 2021	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO PARA EL	CORREO

	DIA MARTES 11 DE JULIO DEL 2023.	ELECTRONICO
7/07/2023	AUTORIZACIÓN PARA CONSIGNAR CHEQUE 525023.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-168-2023 SEGUNDA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
11/07/2023	OBSERVACIONES DESEMBOLSO DE ANTICIPO.	CORREO ELECTRONICO
18/07/2023	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CONVENIO 1866-2021 MUNICIPIO DE SUCRE	CORREO ELECTRONICO
18/07/2023	SOLICITUD DE ENSAYOS Y/O CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TUBERIA EN CONCRETO CONVENIO 1866 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
24/07/2023	DON-1100-INV-196-2023 SOLICITUD PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.	CORREO ELECTRONICO
31/07/2023	DON-1100-INV-200-2023 OBSERVACIONES VISITA 26 DE JULIO DEL 2023.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1769

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-162-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE SUCRE 2 CONVENIO N° 1769 de 2021	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	FIRMA Orden de Giro 1 Anticipo convenio 1769 Sucre.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO PARA EL DIA MARTES 11 DE JULIO DEL 2023.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	AUTORIZACIÓN PARA CONSIGNAR CHEQUE 525023.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-169-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
8/07/2023	DON-1100-INV- 174-2023 RESPUESTA OFICIO CS22-007-2023 REVISION DE ITEMS NO PREVISTOS.	CORREO ELECTRONICO
11/07/2023	DON-1100-INV-181-2023 RESPUESTA OFICIO CS22-009-2023 DIFICULTADES INICIO DE OBRA CONTRATO DE OBRA N°	CORREO ELECTRONICO

	LP-090-2023 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023.	
12/07/2023	ENTREGA DE OBSERVACIONES ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE REFERENCIA	CORREO ELECTRONICO
17/07/2023	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TUBERIA EN CONCRETO CONVENIO 1769 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
21/07/2023	DON-1100-INV-192-2023 RESPUESTA OFICIO SP 000188: SOLICITUD DE INFORMACION.	CORREO ELECTRONICO
21/07/2023	DON-1100-INV-194-2023 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO LP- 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1867

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	ACTA DE OBRA 1 -MODIFICADA CONVENIO 1867.	CORREO ELECTRONICO
10/07/2023	Firmas Acta de Pago 1 CTO LP 005-V6 Convenio 1867 - 2021 Bolivar.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-171-2023 SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
14/07/2023	DON-1100-INV-187-2023 REVISIÓN DOCUMENTO PAGA V3.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1750

FECHA	OBJETO	MEDIO
6/07/2023	ACTA DE MODIFICACION No1 CONVENIO 1750 CHALGUAYACO.	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-172-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
11/07/2023	DON-1100-INV-182-2023 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 1 MAYO CONVENIO 1750- BOLIVAR.	CORREO ELECTRONICO
13/07/2023	DON-1100-INV-186-2023 REVISION DOCUMENTO PAGA.	CORREO ELECTRONICO
28/07/2023	CAMBIO DE FIRMAS TARJETA CONVENIO 1750 BOLÍVAR 2.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1749

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/07/2023	DON-1100-INV-173-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
10/07/2023	DON-1100-INV-178-2023 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONVENIO 1749 ALMAGUER.	CORREO ELECTRONICO
12/07/2023	DON-1100-INV-184-2023 APROBACIÓN HOJAS DE VIDA Y OBSERVACIONES.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1982

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-163-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ALMAGUER 2 CONVENIO N° 1982 de 2021	CORREO ELECTRONICO
6/07/2023	ACTA DE INICIO CTO OBRA No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 CONVENIO 1982 ALMAGUER.	CORREO ELECTRONICO
10/07/2023	DON-1100-INV-177-2023 SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
24/07/2023	DON-1100-INV-195-2023 REVISION DOCUMENTO PAGA V1.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE INZÁ – CAUCA – CONVENIO: 1983

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/07/2023	DON-1100-INV-170-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
12/07/2023	REQUISITOS DESEMBOLSO DE ANTICIPO A LAS CUENTAS.	CORREO ELECTRONICO
17/07/2023	DON-1100-INV-189-2023 SOLICITUD PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA 141 DE 2022.	CORREO ELECTRONICO
17/07/2023	DON-1100-INV-190-2023 SOLICITUD DE DISEÑOS.	CORREO ELECTRONICO
19/07/2023	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA CONVENIO 1983 INZA.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA – CONVENIO: 1768

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/07/2023	DON-1100-INV-164-2023 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CONVENIO N° 1768 de 2021	CORREO ELECTRONICO
7/07/2023	DON-1100-INV-166-2023 TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOCIOAMBIENTALES.	CORREO ELECTRONICO
10/07/2023	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO CON ACTA DE INICIO MUNCIPIO SANTANDER CONVENIO 1768.	CORREO ELECTRONICO
11/07/2023	DON-1100-INV-183-2023 RESPUESTA OFICIO CVR22-008-2023 INCONVENIENTES AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES DE OBRA.	CORREO ELECTRONICO
12/07/2023	DON-1100-INV-185-2023 REVISION DOCUMENTO PAGA.	CORREO ELECTRONICO
17/07/2023	SOLICITUD DE ENSAYOS DE CALIDAD DE LA TUBERIA.	CORREO ELECTRONICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

- INFORME SEMANAL 29 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 5/07/2023.
- MATRIZ INTERVENTORIA CTO 1100 – 6/07/2023.
- INFORME SEMANAL 30 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 11/07/2023.
- INFORME SEMANAL 31 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 17/07/2023.
- INFORME SEMANAL 31 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 19/07/2023.
- RADICACIÓN ACTA DE COSTOS No 6. MAYO DE 2023 – 19/07/2023.
- SOLICITUD DE APROBACIÓN REEMPLAZO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO. 26/07/2023.
- INFORME SEMANAL 32 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 26/07/2023.
- INFORME SEMANAL 33 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022 – 31/07/2023.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ARGELIA 1984



Acero de refuerzo acopiado



Excavación de alcantarilla ALC 1 obra de entrada



Afirmado de tramo 1



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 1



Acopio de material granular



Instalación de tuberia de 36 pulgadas ALC 4



Relleno de cuerpo de obra ALC 3



Excavación de la caja de entrada ALC 3



Conformación de la calzada exixtente



Conformación de la calzada tramo inicial



Material acopiado inicio de tramo vial



Maquinaria amarilla en el frente de obra

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ARGELIA 1984



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 2



Limpieza, perfilación obra de encole ALC 3



orte, Figuración e instalación de parrilla losa inferior Km 2+20



Compactación del afirmado



Fundición de solado limpieza descole Km 2+207m



Fundición solado de limpieza inferior encole Km 2+207m



Corte, figuración e instalación de acero descole Km 2+207



Corte, figuración e Instalación de acero poceta Km 2+207

CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUCRE 1866



Acopio de tubería de 36 "



Tuberia de concreto 36" pulgadas



Desencoffre de alcantarilla encole ALC 1



Fundición de obra de entrada ALC 2



Maquinaria amarilla en el frente de obra



Remoción de estructuras ALC 6



Fundicion de obra de entrada y de salida ALC 2



Maquinaria en el frente de obra



Acopio de materiales



orte, figuración e instalación de acero obra de descole ALC



Fundición de obra de descole ALC 1



Equipo y maquinaria en el frente de obra

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUCRE 1866



Equipo y maquinaria en el frente de obra



Acopio de material en frente de obra



Perfilación de excavación de obra de encole ALC 1



Remoción y excavación de alcantarilla ALC 6



Fundición de obra de encole ALC 1 terminada

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUCRE 1769



Estado actual de la via



Estado actual de la via



Material acopiado



MAQUINARIA INSTALANDO TUBERIA



ALCANTARILLA K0+216



INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA K0+400

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO BOLIVAR 1867



Instalación formaleta concreto ciclópeo K0+037 - K0+067



Construcción concreto ciclópeo K0+037 - K0+067



Excavación vigas riostras K0+037 - K0+067



Instalación formaleta concreto ciclópeo K0+079.56



Construcción bordillo cuneta K0+056.45



Construcción Bordillo Cuneta K0+050



Reunion comite de veeduria ciudadana



Mezcla concreto 21 MPa in situ



Construcción Bordillo Cuneta K0+050



Construcción Concreto Ciclópeo K0+169



Construcción Huellas K0+130



Instalación Acero de Refuerzo Alcantarilla K0+172.65

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO BOLIVAR 1750



Lugar de entrada alcantarilla 5



Volqueta transportando Material



Excavacion para descole Alcantarilla 3



EXCAVACION DE FILTRO



EXCAVACION DE FILTRO

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALMAGUER 1749



Excavación Alcantarilla No. 6



Instalación tuberia de 36¨Alcantarilla No. 5



Construcción poceta de encole Alcantarilla No. 5



Instalación acero de refuerzo, encole alcantarilla No. 7



Fundición, encole alcantarilla No. 7



Instalación acero de refuerzo, descole alcantarilla No. 7



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras



Corte y flejado acero de refuerzo vigas riostras



Construcción Poceta de Encole Alcantarilla No. 8



Construcción Descole Alcantarilla No. 8



Instalación Acero de Refuerzo Alcantarilla No. 8

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CH\LCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALMAGUER 1982



Conformación de calzada existente K0+150



Conformación de calzada existente K0+450




Conformación de calzada existente K0+680



Instalación de afirmado K0+680



Conformación de calzada existente K0+680

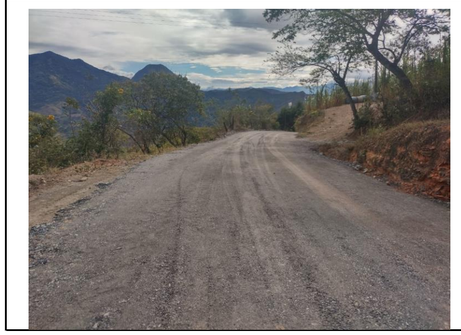

Extensión y Compactación de subbase granular



Transporte y acopio de subbase granular K0+030



Transporte y acopio de subbase granular K0+050



Reunion Dia 17 de julio de 2023



Extensión y nivelación de material de Subbase



Compactación de material de subbase



Extensión y nivelación de material de subbase

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN CORCONDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO INZA 1983



Visita Tomichuque



Visita Tombichucue



Visita Tombichucue



Reunión Popayán, contratista, interventoria y municipio.



Conformación calzada existenteTombichucue



Conformación calzada existenteTombichucue



Derrumbe en la via

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SANTANDER DE QUILICHAO 1768



Instalación tubería 36¨



Conformación de calzada existente



Conformación de calzada existente



Excavación



Excavación para instalación de tuberia



Excavación para instalación de tuberia



Excavación para instalación de tuberia



escasa señalizacion en excavaciones profundas



Visita de obra



Entrada a la obra



Fundición



Actividades de acero para alcantarillas

8.3 BITÁCORAS

BITACORA DE OBRA
SUCRE 1866
MES DE JULIO

06/07/2023 al 06/07/2023 Las actividades que se realizaron en este intervalo de Tiempo son las siguientes:
El equipo de Topografia por parte del contratista inicia con la Localización de las alcantarillas existentes. Niveletas para alcantarilla ALC 1, ALC.2, en ese orden de ideas y Teniendo encuenta que ya a la fecha esta fundida un caja de entrada de la alcantarilla ALC 1. Se evidencia que puede haber errores en los niveles finales de la estructura, es decir se debe verificar los niveles del guardavereda y de los muros laterales ALC1.

07/07/2023 Actividades realizadas en este dia.
Se inicia con un recorrido por parte de Inguniero Auxiliar a las 10:40 Am en compañia de Ingeniero de Apoyo por parte del municipio de sucre, Se identifica personal de obra Elaborando tubería de concreto 36" (3 personas) En Total se tienen elaborados a la fecha 65 Tubos.
Se hace la anotación de que ela entidad Interventoria solicita los Ensayos pertinentes a la fabricación de la Tubería, Teniendo encuenta que se estan elaborando en el sitio,
Siguiendo el recorrido de obra en la alc 1 Se esta perfilando y acondicionando la excavación de la obra de desvio de la alcantarilla. (3personas Trabajando)
Se solicita que el Personal Se le de la dotación de Protección Personal (EPP).

08/07/2023 al 16/07/2023 No hay actividades de obra en esta semana
Se adelantan Temas y Trámites administrativos (Antiguos)

17/07/2023 Actividades realizadas en este dia
Se inicia el dia con la organización y Perfilación de la obra de desvio. Se hace la nivelación para instalación de soldado de limpieza de la Alcantarilla ALC1. Hay 4 obreros en el sitio de Trabajo.

18/07/2023 al 25/07/2023 Las Actividades realizadas durante este lapso de tiempo Son las Siguientes:

Teniendo encuenta que Como ya habia mencionado anteriormente la obra de encole (Poceta) de las alcantarillas ALC1, ALC2 se hicieron las fundiciones sin tener un previo levantamiento Topografico para obtener los niveles reales para los cuales la via va a quedar luego de Ejecutada. Se hicieron unas correcciones de nivel. por tanto se debio completar los muros laterales en altura. para que llegaran a la H de Estimada en el Plano de diseño

Por otro lado se hace la figuración, corte e instalación del acero de refuerzo de la obra encole. se verifica las cantidades y las dimensiones del encofrado para su posterior fundición en campo. la fundición se realiza con Mezcladora de un bulto Alcantarilla N° 1

En la alcantarilla ALC2 Se inicio con la Perfilación de la Excavación de la obra de encole para iniciar con la nivelación del Terreno, esto con la idea de instalar el concreto Solado de limpieza.

Se continua con la remoción de las alcantarillas existentes, hasta el momento se han removido un total de 4 alcantarillas

26/07/2023 Actividades realizadas en este dia:

Recorrido de obra con el equipo de Trabajo interventoria

Se inicia el recorrido a las 3:00 Pm. Avance de obra.

Remoción de alcantarillas (5 alcantarillas) existentes, hasta el momento hay intervención de un total de 7 Alcantarillas.

* Encofrado de obra descole (Aletas) alcantarilla (2). Se verifica el acero instalado en la obra, ademas de las dimensiones y espesores.
* 6 personas en obra. Se reitera que para la fundición de concreto Utilizar y Ceñirse al Diseño de la mezcla.
* Se Solicita realización de los cilindros (Pruebas) de concreto, hasta el momento no se evidencia realización de los cilindros.

Yilmer Sanchez
Ing. Interventor

Realizado el recorrido de obra, se evidencia Maquinaria como retroexcavadora tiro para el

y un manifiesto de marca BobCAT, que se desconoce, no ha sido enviado a la interventoría, para su aprobación; Así mismo, la obra no cuenta con señalización vertical, como implementación de PMT y sus actividades de excavación, no están señalizadas y delimitadas de tal forma que puedan ser observadas, en horas de la noche, dado que son excavaciones profundas.

En cuanto al campamento, se encuentra construido con tela Sarán verde y lonas de Zinc, Junto a un vivero para el almacenamiento de materiales sin contar con punto ecológico ni señalización.

Leonel Camacho
Prof. Ambiental

De acuerdo a las visitas realizadas y terminando el recenido en obra se encuentra personal realizando diferentes actividades los cuales se encuentran sin los elementos de protección personal adecuados además no me han enviado las aplicaciones y/o pago de la planilla de seguridad social de todo el personal tanto de obra y como del personal profesional. En obra cuenta con 8 trabajadores. Recuerdo que debe atender a lo establecido en la normatividad legal vigente sobre sus obligaciones frente al sistema general de seguridad Social, prevención y promoción de riesgos laborales.
Por otra parte no se evidencia en obra el kit de emergencias tales como botiquín, extintor, camilla, señalización.
Se recuerda señalizar y demarcar de manera correcta las zonas intervenidas para evitar cualquier tipo de accidentes o incidentes.

Deadury Mercado
Res SST.

En cuanto al componente social el contratista frente Acta de inicio desde el 16 de mayo del 2023 y a la Fecha no ha sido enviada la información para el diseño de la valla informativa por parte del contratista.

Sonia Perez
Prof. Social Inte

26/07/2023 Se ratera por parte de la interventoría que los tubos en concreto reforzado constados en sitio de obra deben cumplir con las especificaciones tecnicas estipuladas en la normativa NTC 401, donde los extremos de los tubos y reverzos de las juntas deberan garantizar un encaje adecuado entre secciones continuas, de manera que se garantice un conducto continuo libre de irregularidades en la linea de flujo.

Yilmar Sanchez
Ing interventoria

27/07/2023 Jueves 27 de Julio 2023.
Estado del tiempo: Soleado
Equipos Herramienta menor, Mezcladora., formaleta para tubos 36".
Personal en obra 1 maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, Ing Aux. Interventoria.
Actividades de obra.

- Se hace fundición de descole de alcantarillo Nº 2
- Se Verifican aceros que se instalaran en campo y se hacen observaciones: Teniendo en Cuenta la cartilla de Colombia Rural se hace anotación de que no se tuvo en cuenta al 100% a cabalidad los diseños tipos enunciados en el documento en este se expresa que el muro de cabeza de salida (descole) debe ir con un apoyo para evitar el Volcamiento de la estructura. como se evidencia en la pagina 27 de la Cartilla, hasta la fecha no se Subsana esta medida Correctiva.
- Se reitera a él encargado por parte del Contratista la implementación de los elementos de protección personal.

Yilmor Sanchez
Ing interventoria

Powered by CamScanner

28/07/23 Viernes 28 de Julio 2023

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: Herramienta menor, Mezcladora, formaleta para tubos 36"

Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes.

Actividades de obra.

- Alcantarillo Nº2 terminado.
- Se continua con la elaboración de tubería de 36", se reitera de que el hecho de que la tubería sea construido en sitio, se debe demostrar que los tubos en concreto garanticen la estabilidad de la obra, de esta manera se solicita los ensayos de resistencia, la caracterización de los materiales, además de la buena funcionalidad de la tubería

Yilmar Sanchez
Ing Interventoria.

Julio 24 a 3 Agosto del 2023

No hubo actividades durante estos días, hasta el momento en ejecución acumulada se tiene dos alcantarillas con sus obras de encole y descole, instalación de tubería y 6 alcantarillas intervenidas con obras preliminares.

Yilmar Sanchez
Ing Interventoria

04/08/2023 Viernes 04 de Agosto 2023.

Estado del Clima: Soleado

Personal en obra: 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Actividades de obra: Se reinician labores de obra, con la perfilación de la excavación de la alcantarillo N° 3 Seguidamente se procede a la instalación de acero de refuerzo y posterior encofrado de la obra de encole.

05/08/23 Sabado 05 Agosto 2023.

Yilmar Sanchez
Ing Bau Interventor

Estado Clima Soleado

Personal en obra: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes

Actividades de obra. Se realiza fundición de Muros de pareto de alcantarilla N= 3, se sigue en la elaboración de tubería de 36", se realiza perfilación excavación para obras de descole alcantarilla N° 3

Yilmar Sanchez
Ing Interventoria

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
BOLIVAR 1687
MES DE JULIO

- Se realiza las adecuaciones e instalaciones de formaleta pro construcción de concreto ciclopeo.
- Visita del Ing. Jhon residente de interventoría.

30/06/2023

- Trabajos en figurado de acero ϕ 3/8 para refuerzos de bordillos y tubería
- Tareas en fundiciones de alcantarillas en Abj Km 22 +680. Obricado sobre alcantarillo.
- Se llevan a cabo las fundiciones de huellas en concreto de 21 Mpa
- Se realiza la fundición de placas en concreto ciclopeo.
- Se toman muestras de concreto - Cilindros de 8"


01/07/2023

- Tareas adelantadas en la instalación de aceros de refuerzo ϕ 3/8" en las huellas.
- Se llevan a cabo fundiciones en concreto de 21 Mpa drenajes laterales (cunetas) lado derecho.
- Trabajos en fundición de sobre anchos que requerido concreto de 21 Mpa Abj Km 22 +680 y Toma de muestras Cilindros 8"
- Se adelanta la instalación de formaleta - pro construcción de concreto ciclopeo

02/07/2023


- Arribo de materiales - camión.
  - 150 - Bastidores
  - 150 - Crucetas
  - 100 - Sacos de cemento
  - 5 - Docenas guantes
  - 8 pares de botas
  - 2 Cajas de demarcación - Peligro
  - 3 Cascos Amarillos.
  - 32 Tapaoidos
  - 11 Frascos - Bronfe
  - 1 Botiquín
  - 54 Tapabocas
  - 4 Cunetas.

- Descargue de material por parte de trabajadores de la obra — pago acordado $150.000 esto debido a que es día domingo, pago por medio de caja menor




28/06/23

- Inicio de labores en la fundición de concreto de 21 Mpa concreto que requerido.
- Trabajos adelantados en la fundición de concreto para los huellas - concreto 21 Mpa
- Tareas realizadas con formaleta para bordillos laterales.
- Mantenimiento a equipos - vibradora por parte del señor Silder Benavides.
- Uso general de planta electrica.



4/07/23

- Tareas adelantadas en la instalación de formaleta - pa fundición de concreto ciclopeo.
- Trabajos de fundicion de concreto para tubería Concreto 28 Mpa - tubería 36' de diametro
- Trabajos de perfilamiento sobre pista - Trabajos con maquinaria amarilla especializada - Motoniveladora.
- Corte y figurado de acero para tubería de diametro 36"
- Mantenimiento de motores de gasolina y diesel.
- Entrega de EPP.
- Uso general de planta electrica.



5/07/23

- Trabajos realizados en la fundicion de eje central - placas concreto de 21 Mpa
- Actividades adelantadas en la fundición de concreto de ciclopeo
- Manejo de material - compactacion de subase con maquinaria especializada vibrocompactados.
- Trabajos adelantados con maquinaria especializada motoniveladora - perfilación de subase
- Fundición de concreto, tubería 36" - concreto 28 Mpa - tubería Ø 36"
- Perfilamiento de empalme sobre pavimento - Centro de salud.

Powered by CamScanner

- Mantenimiento de motores - Diesel y Gasolina. - Mezcladoras
- Inicio de fundición de tuberías ø 36" - Concreto 28 Mpa
- Arribo de material de triturado 7 m³

06/07/2023

- Trabajos en fundición de tubería reforzada ø 36", concreto de 28 Mpa.
- Manejo de concreto ciclopeo - formaleta y fundición del mismo.
- Excavaciones para vigas riostra.
- Se adelanta las instalaciones de mangueras para la llegada de agua potable al sitio de fundiciones.
- Adecuaciones para las instalaciones de formaleta para concretos.
- Mantenimiento de motores
  - Apoyo al Ing Jhon Jurado con herramienta.
    - 3 palas
    - 2 picas
    - 3 Buguies
- Manejo y fegurado de acero para tubería de 36"
- Arribo de Jaltrain
- Arribo de 6m³ de material de río (mixto)


07/07/2023

- Se adelantan excavaciones para vigas riostra
- Se lleva a cabo la fundición de modulos para concreto ciclopeo
- Se realiza la fundición de tubería de 36" - Concreto 28 Mpa
- Se continua con el fegurado de acero para tubería ø 36"
- Arribo de 6m³ de material de río (mixto)
- Acondicionamiento de formaletas para tuberías.

Powered by CamScanner


8/07/23

- Se adelantan excavaciones para vigas riostra
- Se realiza la fundición de solados de limpieza sobre vigas riostras
- Se lleva a cabo la fundicion de tuberia reforzada - Concreto 28 Mpa ϕ 36"
- Arribo de retrocargador al sitio de trabajo.




9/07/23

- Manejo de acero para vigas riostra) - instalación de acero
- Manejo e instalacion de acero de refuerzos para huellas.
- Arribo de material de rio - 24 m³ de mixto
- Arribo de material de sobbago - 6 m³
- Fundicion de tuberia reforzada concreto 28 Mpa.
- Fundicion de Concreto de 24 Mpa - Huellas centrales.
- Transporte de materia - ayuda del retrocargador.




11/07/23

- Fundicion de Concreto 24 Mpa - Huellas y placas centrales.
- Inicio de trabajos de excavaciones para alcantarillados con ayuda del retrocargador
- Instalación de tuberia para alcantarillado km 22 + 927
- Trabajo del retrocargador 8 horas.



12/07/23

- Se llevan acabo trabajos con maquinaria retrocargador, instalacion de tuberia Alc 4,22+927 rellenos y compactacion sobre la misma. Trabajos de excavacion para instalacion de tuberia Km 23 + 165
- Fundición de Concreto de 24 Mpa - Huellas
- Manejo formaleta para concreto ciclopeo.
- Arribo de material: 550 varillas ϕ 3/8", 1 cuñete de grasa - 200 kg alambre - 2 galones Antibacterico - 1 galon pare.



13/07/2023

- Se addelanta en horas de la mañana, reunion programada con representantes de las veedurias ciudadanas e integrantes de la comunidad.
- Para el dia de hoy contamos con las visitas de supervisores.
- Se llevaron a cabo trabajos de excavaciones para las instalaciones de tuberias reforzadas de 36"
- Se realize la instalacion de 4 tubos reforzados de 36"
- Se realizan traslados de material con ayuda del retroexcavador para acondicionamiento de la pista
- Manejo de acero de refuerzo para cunetas y bordillos.
- Instalacion y acondicionamiento de formaleta para fundicion de concreto 14 Mpa (Vidagua)
- Arribo descargue y acopio de 200 sacos de cemento - descargue con personal de obra.

14/07/2023

- Se llevo a cabo la fundicion de 33 mL de cunetas y bordillos. - 149 sacos de cemento usados
- Se realizan excavaciones para la instalacion de tuberia reforzada de 36" Ø
- Se addelanta la instalacion de 6 mL de tuberia Ø 36" para alcantarillado.
- Se transporta sacos de cemento al sitio de trabajo, desde la bodega con ayuda del retroexcavador.
- Manejo de acero de refuerzo Ø 3/8" para cunetas y bordillos
- Se presentan retrasos en los trabajos de excavacion debido a fallas mecanicas en el retroexcavador.
- Arriban a la obra 200 sacos de cemento, acopiados en bodega.

17/07/2023

- Se addelantan trabajos en la fundicion de concreto 14 Mpa (Vidagua) - 30 mL. x 40 sacos usados
- Manejo e instalacion de formaleta para cunetas y bordillos.
- Manejo e instalacion de acero de refuerzo para cunetas y bordillos

Powered by CamScanner

- Maquinaria a la espera de repuestos – Manguera Hidráulica. - se le realiza mantenimiento general.
- Llegada de 18m³ de arena (material de río) en 3 volquetes de 6 m³ c/u.

3/07/23

- Se llevo a cabo la fundición de 35 m/l de cunata y bordillos laterales. - (33 Juntas viertas)
- Se adelanto la instalación de aceros de refuerzos para cunata y bordillos
- Retroexcavadora parada por falta de aparato (Manguera Hidráulica)
- Llegada de material: 44 tablas x 0,15m
  10 " x 0,25m
  18 m³ de material de río (mixto)
- Inicio con la elaboración de filtro francés.

19/07/23

- Trabajos en la instalación de formaleta para cunetas y bordinete lado derecho.
- Trabajos en la instalación de formaleta para concretos ciclopeo.
- Visita de la Ing Laura, ingeniera Ambiental y el residente Jaime Jaramillo realizan charlas de accidente laborales y manejo ambiental de residuos entre otros temas.
- Excavaciones para vigas riostras.
- Almaco de acero para aletas y cabezal de lagrado alcantarilla K22 + 927

20/07/23

- Se llevo a cabo la fundación de 40 metros lineales de cunata y bordillos
- Se realizo la fundación de 12 modulos de concreto ciclopeo x 0.45 x 2.8m
- Se vieron 50 sacos de cemento.

- De adelanta trabajos en la instalación y acondicionamiento de acero de refuerzo para huellas. ø 3/8"
- Uno ven sorteados la fallas en el retrocargador se adelantan trabajos de excavacion para la instalación de tubería de 36"/ km 22+232
- Se realiza la instalación de 2 tubos para alcantarillado ø 36" sobre km 22+23
- Nuevamente la maquinaria presenta fallas, esta vez en uno de sus gatos hidraulicos.
- De presenta accidente con volqueta, esta es la encargada del acarreo de material, debido a esto los trabajos se ven afectados presentando retrasos.
- Arribo de 12 m3 de material de rio.

21/07/2023

- Se realizan trabajos de fundación de concreto de 21 Mpa - 27 mf de huellas.
- Se lleva acabo la fundición de 4 modulos de concreto ciclopeo - (2.9 x 2.8) m²
- Fundiciones de placas de descole - Alcantarilla sobre km 22+927.
- Uso de tacos de concreto 65 unidades.
- Se hace el manejo del acero de refuerzo para huellas ø 3/8".
- Con fallos el retrocargador realiza trabajos de transporte de material - tacos de concreto.
- Manejo e instalación de formaleta para concreto ciclopeo.

22/07/2023

- Manejo e instalación de formaleta para concreto ciclopeo.
- Instalacion de formaleta para obras de alcantarillado, aletas y cabezal de descole, alcantarilla sobre km 22+927
- Instalación de formaleta para cunetas y bordillos laterales.

Powered by CamScanner

24/07/23

- Manejo de formaleta para fundación de concreto ciclopeo.
- Fundación de 4 modulos de concreto ciclopeo → (0.45 x 2.8) m²
- Transporte de sacos de cemento desde bodega - Apoyo de retroalcargador.
- Se utilizan 17 sacos de cemento.
- Instalación formaleta para fundacion de muerta y bordillos laterales.
- Figurado de acero Ø 3/8" y 1/2" para cajas de encole, Alcantarilla Km 22+929
- Arribo de 12m³ de material de rio (mixto) - Vaque de 6 m³ c/u - 2 viajes

25/07/23


- Fundacion de 14 modulos de concreto ciclopeo de (0.45 x 2.8) m²
- Fundacion de 10 modulos de concreto ciclopeo de (0.9 x 2.8) m²
- Fundición de solado de limpieza para vigas riostras.
- Se utilizan 46 sacos de cemento.
- Transporte de cemento desde bodega a sitio de trabajo con ayuda de retroalcargador.
- Retiro de gato hidraulico que presenta fallas - retroalcargador.
- Instalación de formaleta para fundición de cunetas y Bordillos laterales.
- Instalacion y manejo de acero de refuerzo Ø 3/8" - cunetas y bordillos.
- Instalación de acero para vigas riostras - Refuerzo horizontal Placa Huella.

26/07/23

- Fundación de concreto de 21 mpa - 9 ml de huellas
  8 ml de muertas y bordillos
- Fundación de concreto de 21 mpa - Vigas riostras, como solados para los mismos.
- Instalación y manejo de acero de refuerzo Ø 3/8" para huellas
- Manejo e instalación de acero de refuerzo transversal de PH - Vigas riostras.
- Se adelantan trabajos en la instalación de formaleta para la fundación de concreto ciclopeo.
- Instalación y atraque de formaleta para cabeza de alcantarilla Km 22+929 caja de encole.


Powered by CamScanner

- Se adelanta trabajos de excavaciones y adecuaciones en el alcantarillo de km 23+232
- Manejo e instalacion de acero de refuerzo ϕ 3/8" para cunetas y bordillos laterales



27/07/2023

- Se realizaron trabajos de fundición de concreto de 21 Mpa - 17 m/ de huellas.
- Se realizaron tareas de fundicion de 10 m/ de cuneta y Bordillos - cto 21 Mpa
- Fundicion de refuerzos transversales - Vigas riostras - PH
- Manejo de acero para las huellas a fundir - proximas
- Instalación de acero para nuevas cunetas y bordillos a fundir
- Manejo de acero de refuerzo ϕ 3/8" y 1/2" para cajas de encole - km 23+232
- Fundicion de placa de entrada Alc - km 23+232
- 40 sacos de cemento utilizados
- Arribo de material: 300 sacos de cemento
  Acero #3
  Acero #4



28/07/2023

- Se llevan a cabo la fundición de obras de alcantarillas.
  - Aletas y cabezal - Alcantarilla km 22+927
  - Caja de encole - Alcantarilla Km 22+927
- Fundación solado de limpieza - vigas riostras
- Se adelantan excavaciones para nuevas vigas riostras.
- Instalacion y Manejo de aceros de refuerzo ϕ 3/8"
  - Vigas riostras - Refuerzo transversal
  - Aceros Huellas
- Inicio de trabajos en la instalación de formaleta para cunetas y bordillos laterales
- Arribo de materiales: 12 m³ de material de rio.

Powered by CamScanner

Se emplearon en las labores 37 sacos de cemento.

29/07/23

- Se adelanto lo fundieron de muro lateral sobre alcantarilla - Km 22,+734
- Manejo de acero de refuerzo para huellas Ø 3/8"
- Acondicionamiento de alcantarilla Km 22+927
- Arribo de 18m3 de material de rio - 3 volqueta x 6m3 c/u.
- Manejo de acero de refuerzo para cunetas y bordillos laterales.

31/07/23

- Se adelanto trabajos de fundicion - concreto de 21 Mpa y 14 Mpa
  - 27 m/ de huellas
  - 7 modulos de $(0.45 \times 2.8) m^2$
- Manejo e instalación de acero para caja de encole alcantarilla Km 23 + 165
- Instalación de formaleta cuneta y bordillos laterales.
- Se utilizan 47 sacos de cemento
- Descofre de obras de alcantarilla: Cabezal, Aletas y caja de encole - Alcantarilla Km 22+92

01/08/23


- Se adelantan fundiciones de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa - Vaciado
  - 43m/ lineales de cunetas y bordillos
  - 5 modulos de $(0.45 \times 2.8) m^2$ - Vaciado
- Figurado, manejo e instalación de acero de refuerzo - Alcantarilla Km 23 + 165 - caja de encole.
- Instalacion y manejo de formaleta para cunetas y bordillos laterales - izquierdo
- Se emplean 50 sacos de cemento

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
ALMAGUER 1749
MES DE JULIO

Equip. No se hace uso de equip

Clima. Soleado




Martes 04 de Julio de 2023.

- Encofrado y fundición descole alc. #5.
- Excavación alc. #6.
- fundición Solado tubería alc. #6.

- Personal en obra. 5 ayudantes
  1 oficial
  1 maestro
  1 ing. Residente

Equip. Mezcladora, vibro.

Clima. Lluvias en horas de la tarde, suspensión de obra de 90 minutos aproximadamente.



Miércoles 05 de Julio de 2023


- Colocación tubo 36" en alcantarilla #6.
- Relleno y compactación sobre tubería en alc. #6
- fundición Bloques descole y encole alc #6.
- Se inicia excavación en alc #7.

Personal en obra. 5 ayudantes
1 oficial


1 maestro
1 Residente.

Equipo. Mezcladora.
Saltarin.

Clima. Seco.



Jueves 07 de Julio 2023
Se Realisa Visita por parte de la interventoria para Revisar Cort
de obra.
Se Recomienda la pronta Colocacion de Señalisacion en la
obra.
Personal en obra
1 ingo Residente
1 Maestro de obra
1 Oficial
5 ayudantes



Personal en obra 5 ayudantes
1 oficial
1 Maestro
1 ing. Residente

Equipo. No se hace uso de equipo. Corrección uso d

Clima Lluvias hasta de 3 o 5 pm que obliga
a parar actividades.

Sábado 8 de Julio de 2023.

- Fundición encofrado y desencofrado de #8.
- Jornada de limpieza de obra.

Personal en obra 5 ayudantes
1 oficial
1 maestro
1 ing. Residente

Equipo. Mezcladora, Vibrador concreto

Clima. Soleado


Lunes 10 de Julio de 2023

- Se termina excavación encofrado y desencofrado de #7.
- Se desformaletean de # 5 y #6.
- Limpieza total en tramo #2 y de #C.
- Fundición Solado encofrado #3

Personal en obra 4 ayudantes
1 oficial
1 maestro
1 ing. Residente

Equipo. Sin uso de equipo

Clima. Soleado



Martes 11 de Julio de 2023

- Corte, flejado y amarre de acero ole. #7.
- Transporte de materiales hasta tramo 3
- Amarre de camastillas para tubos de 36"
- Formaleteando encole ole #7.

- Personal en obra. 4 ayudantes.
1 oficial
1 maestro
1 ing. Residente

- Equipo. Sin uso de equipo.
- Clima. Soleado



Miércoles 12 de julio de 2023

- Fundición piso descole ale #7
- Fundición de pocata de entrada
- Amarre de canastillas para tubos de 36"
- fundición tubos 36"
- Personal en obra 5 ayudantes.
  1 oficial
  1 maestro
  1 ing. Residente.
- Equipo. Mezcladora, vibrador concreto.
- clima. Soleado

Jueves 13 de Julio de 2023.

- Fundición descole ale #7.
- Amarre canastillas para tubos 36"
- fundición tubos 36"
- Personal en obra 5 ayudantes.
  1 oficial
  1 maestro
  1 ing. Residente.
- Equipo. Mezcladora, Vibrador concreto
- Clima. Soleado

Viernes 14 de Julio de 2023

Tramo de #8
Excavación Encofr y descofr (Parcial) de #8.
Fundición tubos 36"
Personal en obra 5 ayudantes
1 oficial
1 maestro
1 ing. Residente.
Equipo. Mezcladora, Vibrador concreto
Clima. Soleado

Sábado 15 de Julio de 2023.

- Continúa excavación encofr y descofr
- armado canastillas tubos 36"
- Personal en obra 5 ayudantes
1 oficial
1 maestro
1 ing. Residente.
Equipo. No se hace uso de equipos.
Clima. Soleado.

Lunes 17 de Julio de 2023

- fundición tubos 36"
- Armado Canastillas tubos 36"
- Corte y figurado acero para riostras y bord
- Personal en obra 5 ayudantes

2 oficiales.
1 maestro
1 ing. Residente
Equipo. Mezcladora, vibrador etc.
Clima. Soleado

Martes 18 de Julio de 2023

-fundicion Losas 36"
- Corte y flejado de acero para riostras y bord.
Personal en obra. 5 ayudantes.
2 oficiales.
1 maestro
1 ing. Residente
Equipo No se hace uso de equipo
Clima. Soleado

Miércoles 19 de Julio de 2023

-flejado y armado de Castillos de riostras y bordillos.
Personal en obra. 5 ayudantes.
2 oficiales.
1 maestro
1 ing. Residente.
Equipo. No se hace uso de equipo.
Clima. Soleado

Jueves 20 de Julio de 2023.


- Excavación alcantarillas 8 y 9 (tubería)
- fundición de Solado cimentación de tubería alcantarillas 8 y 9.
- Excavación encofre y desencofre alc. #9.
- Personal en obra 5 ayudantes
  2 oficiales.
  1 maestro
  1 ing. Residente
- Equipo Mezcladora.
- Maquinaria 1 retro excavadora
Clima. Soleado

Viernes 21 de Julio de 2023.

- Instalación tubería 36" alc. 8 y 9.
- Relleno Sobre tubería alc. 8 y 9
- Personal en obra 5 ayudantes
  2 oficiales.
  1 maestro
  1 ing. Residente
- Equipo. Saltarín
- Maquinaria. 1 retro excavadora.
- Clima. Soleado.


Sábado 22 de Julio de 2023

- fundición pisos encole y descole ale # 8.
- Hincado, corte y armado acero de refuerzo al
- Personal en obra 5 ayudantes.
  2 oficiales
  1 maestro
  1 ing Residente
- Equipo Mezcladora vibrador c/o.
- Clima Soleado



Lunes 24 de Julio de 2023


- fundición encole ale # 8.
- Replanteo tramo 3 placa huella
- Personal en obra 5 ayudantes
  2 oficiales.
  1 maestro
  1 ing. Residente
- Equipo. Mezcladora, vibrador c/o.
- Clima. Soleado



Martes 25 de Julio de 2023

- fundición descole ale #8
- Armado descole ale #8
- fundición Solados ale # 9
- Mejoramiento tramo 3 con retroexcava
- Personal en obra 5 ayudantes
  2 oficiales.
  1 maestro


1 ing Residente
Equipo. Mezcladora, Vibrador etc.
Maquinaria. 1 retro excavadora.
Clima. Soleado.



Miércoles 26 de Julio de 2023

- Excavaciones en tramo 3 con retroexcavadora por ampliación de vía.
- Fundición encole ale. #9 (P.150)
- Trazado tramo 2.
- Personal en obra 5 ayudantes
2 oficiales.
1 maestro
1 ing. Residente

Equipo. Mezcladora, vibra cho.
Maquinaria 1 retro excavadora.
Clima Soleado




Jueves 27 de Julio de 2023

- Corte, flejado y amarre poceta (Muros) alcantarilla #
- Corte, flejado y amarre acero de placa huella
- Trazado tramo 1
- Personal en obra 5 ayudantes.
2 oficiales.
1 maestro
1 ing Residente

Equipo. No se hace uso de equipo

Clima. Soleado.




Viernes 28 de Julio de 2023

- Excavación y descapote tramo 2.
- Corte, flejado y amarre acero de refuerzo placa huella
- Personal en obra - 5 ayudantes
  - 2 oficiales
  1 maestro
  - 1 residente de obra

Maquinaria: Retro - Volqueta.

Clima Soleado




Sabado 29 de Julio de 2023

- Excavación y descapote tramo 3
- Personal en obra 2 maquinistas
  1 maestro
  1 ayudante.

Maquinaria - Retro, Volqueta

Clima. Soleado



Lunes 31 de Julio de 2023

- fundicion paredes pocetq de entrada de #9

BITACORA DE OBRA
INZÁ 1983
MES DE JULIO

30-jn-2023	se presentan lluvias toda la mañana y se extienden hasta medio día, motivo por el cual se suspenden actividades.
01-jul-2023	en este día no se ejecutaron trabajos
03-jul 2023	Día festivo

04-Jul-2023

La motoniveladora presenta daño en una de sus llantas delanteras y problemas de encendido por lo cual no se ejecutan actividades en el mantenimiento.

Se continua con labores de Bote y Nivelado de acero en el lugar de Placa Huela.

Juan Ordoñez

05-Jul-2023

Se reparan los daños en llanta delantera y problema de encendido hacia las 11:20 am y se procede a continuar con actividades de conformación, riego y extendida de material de cantera de la vereda Pijimbala.

Traslado de material de cantera vereda Pijimbala hasta algunos sectores ubicados en el tramo. Pr 1+ 7. hasta punto critico 1

Se observa y evidencia que los materiales utilizados anteriormente para mejoramiento no son aptos.

Se continua con labores de Nivelado y armada de Cunetas de rastros. en el lugar de Placa Huela.

Juan Ordoñez

06-Jul-2023

Se continua con labores de conformación, riego y extendida de material de cantera.

Visita de Interventoría, a la cual se le muestra los avances del mantenimiento de Vía.
Se observa inconvenientes con material utilizado para mantenimiento.
En el lugar de placa Huella se observa como algunos Pecamoras, se localizan entre 0.60 a 0.80 cm mas abajo del nivel de Vía del cual la Interventoría toma reporte para dar Soluciones.

Juan Ordoñez

07-Jul-2023 Se presenta lluvia en horas de la madrugada y lloviznas en horas de la mañana, que retrasan el inicio de actividades hasta las 11:00am.

Se realizan labores de extracción de material de Cantera de la vereda Pisimbala.

Se continua con labores de fraguado y armado de Cortinas en el lugar de placa Huella.

Juan Ordoñez

15-Jul-2023 Traslado de tubería en Concreto de 36" hasta Tumbichucue para alcantarilla de placa Huella.

Traslado de pajarita para extracción de material en la Cantera ubicada en la vereda Tumbichucue.

Juan Ordoñez

Comunicación con don Yair por Recomendarle lo establecido en la mesa técnica, de dejar un Comunero para que este al pendiente de las labores ejecutadas.

Ámbito de Vibrocompactador e inicio con actividad de Compactación en el tramo PR 7m+ - punto crítico + anteriormente conformado.

Se continua con labores de figurado y armado de castillos para riostras en el lugar de placa huella.

11/Jul-2023

Traslado de motoniveladora hasta pueblo nuevo tumbichucue para dar inicio con actividades de Conformación de via para placa huella.

Conformación de via con motoniveladora. lugo placa huella, ademas riego y extendida de material de Cantera Vereda tumbichucue.

Comunicación con el Comunero delgado encargado por parte de la comunidad en horas de la mañana para definir actividades ha realizar.

Se realizan labores de extracción y transporte de material cantera vereda tumbichucue.

Se continua con labores de figurado y armado de castillos para riostras en el lugar placa huella.

Se continua con labores de Compactacion con Vibrocompactador.
Para la fecha siguen las inconformidades para el item mantenimiento se evidencia daños que perjudican el tramo de via intervenido
Juan Ordoñez

12-Jul-2023

Se da inicio con actividades de Conformacion Iniciando desde el puente PR 12,000 en el Sentido Tumbichucue - San Andres.

Traslado de Vibrocompactador de San Andres a Tumbichucue Caminando, y se gasta 3 horas en el recorrido, llegando a Tumbichucue a las 11:50 am.

Se realizan trabajos de Compactacion en el frente placa huella y posteriormente se traslada el Vibrocompactador hasta Inicio Mantenimiento

Se continuan labores de Nivelacion y armado de Gaviones para rocheo.

Extraccion de material de Cantera Vereda Tumbichucue con Retroexcavadora y Cargue y Riego con Volquetas.

Material utilizado para mantenimiento no cumple expectativas cual proceso con maquinaria, se evidencia tramos de la via en muy mal estado
Juan Ordoñez

13-Jul-2023

Se continuan con labores de Conformacion y Compactacion en la Zona alta Vereda Tumbichucue

Dano en una de las llantas traseras de motoniveladora a las 9:20 am y Reparacion en sitio

Zona en vía de los llantos tramos de pavimento a la 2:35 pm que no afecta la actividad de extracción y Cargue de material.

actividades de Conformación y extendida de material parte baja Vereda Piedrahita. Con motoniveladora.

Transporte de material de cantera hacia parte baja Vereda Piedrahita.

Se Continúa Con labores de armado de Cantilos para fundir en la zona de placa huella.
Continua la vía en algunos tramos en muy mal estado. Juan Ordoñez

Zona en Vibrocompactador, presenta avería en el arranque a las 4:25 pm, y en Consecuencia se da por terminado el día.

17-jul/2023 Llueve en horas de la madrugada.
Se Continua Con labores de Conformación en la zona alto de Tumbichucue y extensión de material.

Transporte de material de Cantera vereda Tumbichucue hasta alto de Tumbichucue.

Se espera el reporte del vibroCompactador, motivo por el Cual no se ejecutan actividades de Compactación

Ausencia por parte de maquinaria para item de mantenimiento, el tramo de vía intervenido sigue en muy mal estado. Juan Ordoñez.

15-Jul-2023 Se presentan lluvias desde las 6:00pm del día anterior y se extienden en la madrugada y se mantienen hasta medio día.

17-Jul-2023 Ausencia de maquinaria para item mantenimiento tramos de vía continuan en muy mal estado

Juan Ordoñez

18-Jul-2023 Se programa visita, comunidad, municipio, contratista e interventoria, para definir diferentes inconformidades. Es imposible llegar a el municipio de inza por deslizamientos vía popayan - inza.

Juan Ordoñez

19-Jul-2023 Continuan los deslizamientos y por ende imposible el acceso a inza para visita a cantera propuesta para item mantenimiento y mejoramiento.

24-Jul-2023 Para la semana comprendida entre el 24 y el 29
25-Jul-2023 de julio se realiza trabajos de fresa de acero y
26-Jul-2023 se espera realizar un estudio y analisis
27-Jul-2023 para el tema de unas camaras de inspeccion
28-Jul-2023 que se encontraron en el tramo de placa huella y estan en malas condiciones.

Juan Ordoñez

31-Jul-2023 Ausencia de maquinaria para realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Juan Ordoñez

BITACORA DE OBRA
SANTANDER DE QUILICHAO 1768
MES DE JULIO

1 de julio	Conformacion y adecuacion de espacios estrategicos para la ejecucion del proyecto.
4 de julio	Excavacion, demolicion de alcantarilla existente, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en la abscisa k00+503 Juan Ordoñez
5 de julio	Excavacion, demolicion de alcantarilla existente, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en la abscisa k00+390 Juan Ordoñez
6 de julio	Excavacion, demolicion de alcantarilla existente, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en la abscisa k00+166 Juan Ordoñez
	Ocurre un altercado con el señor Rubicl, habitante de la vereda Alto Paraiso, debido a un incidente que ocurrio en horas de la [illegible] cuando el personal de obra accede a dar permiso amablemente

F	FECHA	DESCRIPCION
2		a un habitante quien se transporta en un vehiculo tipo camion, éste al transitar accidentalmente daña un vidrio de la maquina con la que se trabaja en obra.
		La comunidad se manifiesta mencionando que la alcaldia les ha incumplido con la conformacion de la via alterna, ellos dicen que la via no se ejecuto de la mejor manera y que por el sector no se puede transitar en los tipo de vehiculos que ellos se transportan, por tanto la comunidad exige
1		una reunion con personal del area de infraestructura del municipio de Santander de Quilichao para el dia 7 de julio en horas de la tarde.
	7 de julio	Debido a las fuertes lluvias presentadas en la madrugada de este dia, se hace mantenimiento al avance de las alcantarillas ejecutadas ya que éstas se miraron afectadas por lo mencionado anteriormente.
2		Se realiza una reunion con pesonal del area de infraestructura de la alcaldia de Santander de Quilichao, comunidad del sector y contratista, la comunidad reclama el incumplimiento en la conformacion de la via alterna por pate de la alcaldia. La alcaldia en representacion del area de infraestructura se compromete en trasladar la maquinaria hasta el sitio donde se planea conformar la vias alterna, para el dia 10 de julio
1		en horas de la mañana y poder asi subsanar el problema.
	8 de julio	Mantenimiento a alcantarillas que ya se han empezado a ejecutar.
	9 de julio	Inicio de excabacion y demolicion de alcantarilla existente ubicada en la abscisa K00+065

Juan Ordoñez

FECHA	DESCRIPCION
11 de julio	Continuacion de excabacion y demolicion de alcantarilla existente, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en la abscisa K00+065. Juan Ordoñez
12 de julio	Inicio de excavacion de alcantarilla nueva ubicada en la abscisa K00+336. Juan Ordoñez
13 de julio	Continuacion en excavacion de alcantarilla nueva, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en abscisa K00+336 Juan Ordoñez
14 de Julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y de la volqueta. Se inicia con la excavacion del filtro, en la abscisa K00+166 hasta la abscisa K00+248,1, para un total de 82,1 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Se realiza el transporte de material de excavacion hasta sitio autorizado. Juan Ordoñez
15 de julio	Dia soleado, Se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y el de la volqueta. Se continua con excavacion de filtro en la abscisa K00+248,1 hasta la abscisa K00+262,1, y desde la abscisa K00+268 hasta la abscisa K00+299,4, para un total de 45,4 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Juan Ordoñez Se realiza transporte de material de excavacion hasta sitio autorizado.

FECHA	DESCRIPCION
17 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y el de la volqueta. Se realiza excavacion de filtro en la abscisa K00+299,4 hasta la abscisa K00+335 y desde la abscisa K00+336,8 hasta la abscisa K00+379,2, para un total de 78 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Juan Ordoñez Se realiza traslado de material sobrante de excavacion a sitio autorizado. Se realiza reunion con interventoria, infraestructura en representacion de la Alcaldia Municipal, pobladores y contratista, con el fin de definir la ubicacion de alcantarilla que inicialmente se situaba en la abscisa K00+002. Se toma la desicion de construir la alcantarilla en la abscisa K00+020, debido a que no cumplia con la profundidad minima y que ademas ocacionaria posibles daños por inundaciones en tiempos de lluvia, por tal razon y con la autorizacion de interventoria se toma la desicion de reubicarla hasta la abscisa K00+020. Juan Ordoñez
18 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y el de la volqueta. Se trabajo en excavacion de filtro desde la abscisa K00+379,2 hasta la abscisa K00+389 y desde la abscisa K00+390,8 hasta la abscisa K00+456,2, para un total de 75,2 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Juan Ordoñez

FECHA	DESCRIPCION
18 de julio	Se realiza el traslado de material de excavacion hasta sitio autorizado
19 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y el de la volqueta. Se realiza la compra, traslado y ubicacion en la obra de 10 tubos de concreto reforzado de 36" Se trabaja en excavacion de filtro desde la abscisa K00+456.2 hasta la abscisa K00+476,5 y desde la abscisa K00+065,8 hasta la abscisa K00+125,6, para un total de 80,1 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Juan Ordoñez Se realiza transporte de material de excavacion hasta sitio autorizado.
20 de julio	Dia soleado, se conto con 5 trabajadores en obra y el operador de la maquina. Se realiza excavacion, colocacion de tubos de concreto reforzado de 36" y relleno con material seleccionado en alcantarilla ubicada en abscisa K00+020. Juan Ordoñez
21 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra, el operador de la maquina y el de la volqueta. Se realiza excavacion de filtro en la abscisa K00+125,6 hasta la abscisa K00+162,2, para un total de 39,6 metros lineales de excavacion de filtro en este dia. Juan Ordoñez

FECHA	DESCRIPCION
21 de julio	Se transporta material de excavacion sobrante hasta sitio autorizado.
	Se coloca 1 tubo de concreto reforzado de 36" adicional a los existentes en la alcantarilla ubicada en la abscisa K00+065, debido a que el borde derecho de la via intersecta con el muro cabezal de la alcantarilla.
	Se colocan 2 tubos de concreto reforzado de 36" adicionales a los existentes en la alcantarilla ubicada en la abscisa K00+396 debido a que el borde derecho de la via intersecta con el muro cabezal de la alcantarilla.
22 de julio	Dia soleado, en obra se conto con 6 trabajadores
	Se realizo corte en las paredes de la poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+020. Juan Ordoñez
	Se realizo mantenimiento al avance que se lleva en las alcantarillas ya ejecutada.
24 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra y el operador de la volqueta. y de maquina
	Compra, transporte y corte de material como madera, alambre y puntillas, para elaboracion de formaleta de poceta y aletas de alcantarilla.
	se realiza excavacion de filtro desde la abscisa K00+162,2 hasta la abscisa K00+166, se traslada el material de excavacion hasta sitio autorizado. Juan Ordoñez

FECHA	DESCRIPCION.
25 de julio	Compra, recepcion y ubicacion de acero en campamento, las cuales son de uso para el refuerzo de poceta y aletas en las alcantarillas. Juan Ordoñez Dia soleado, en obra se conto con 6 trabajadores. Se realizo excavacion y adecuacion en poceta de alcantarilla ubicada en abscisa K00+583 Juan Ordoñez
26 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra. Compra, recepcion y ubicacion de cemento en el campamento, compra y transporte de arena de fundicion hasta la obra. Juan Ordoñez Se trabajo en flejado de varillas de 1/2" y 3/8" para poceta en alcantarilla ubicada en abscisa K00+583 Juan Ordoñez
27 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra. Se continua con el flejado de varillas de 1/2" y 3/8" para poceta, se realiza el armado de parillas de 1/2" y 3/8" para la losa de poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+583 Juan Ordoñez Se realiza la fundicion de concreto pobre para el soleado de limpieza de poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+583 Juan Ordoñez
28 de julio	Dia soleado, en obra se conto con 7 trabajadores. Se realizo fundicion de concreto para losa en la poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+583 Juan Ordoñez

FECHA	DESCRIPCION
28 de julio	Se trabaja en el flejado de varillas de 1/2" y 3/8" para el refuerzo de paredes de poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+583. Juan Ordoñez
	Compra y transporte de material petreo hasta la obra, el cual sera utilizado para el relleno de filtro. Juan Ordoñez
29 de julio	Dia Soleado, se conto con 7 trabajadores en obra.
	Se Realizo armado de acero de refuerzo de varillas de 1/2" y 3/8" para paredes de poceta de allcantarilla ubicada en abscisa K00+583 Juan Ordoñez
	Se inicio con la colocacion de formaleta en poceta de alcantarilla ubicada en la abscisa K00+583. Juan Ordoñez
31 de julio	Dia soleado, se conto con 6 trabajadores en obra.
	Se trabajo en la terminacion, colocacion de formaleta, y se realizo la fundicion de concreto en paredes de poceta de alcantarilla ubicada en abscisa K00+583. Juan Ordoñez
