Expediente: 379-2022
Radicado: DC-01190-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Document : Informe de Supervision (** NO para pagos **)
Fecha: 24/08/2023 Hora: 10:03:54 Folios: 1

INFORME DE AVANCE N°1 Y FINAL CONVENIO 379-2022

FECHA DEL INFORME: 15 de mayo 2023

MUNICIPIO: NARIÑO ANTIOQUIA

PROYECTO: "FOMENTAR LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS BIOFISICAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LA VEREDA LA BALVANERA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.POR MEDIO DE METODOLOGIA PRISER

CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO 379- 2022

SUPERVISOR: JORGE ALEXANDER MUÑOZ BETANCUR

ASISTENCIA TECNICA WILSON DIAZ ESTRADA

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: FOMENTAR LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS BIOFISICAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LA VEREDA LA BALVANERA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.POR MEDIO DE METODOLOGIA PRISER. **OBJETIVO 1:** Desarrollar un proceso de capacitación y educación ambiental con el fin de fortalecer los componentes del proyecto **OBJETIVO 2**: Brindar acompañamiento técnico y administrativo para la correcta ejecución del proyecto. **OBJETIVO 3**: Realizar rocería, limpieza manual de quebradas y revegetalizacion de zonas afectadas por escorrentía. **OBJETIVO 4**:Proteger y recuperar el suelo en zonas de deslizamientos, mediante la implementación y construcción de obras biofisicas (trinchos gaviones, revegetalizacion).

Productos y Resultados Esperados

- Realizar una adecuada inversión de los recursos económicos e insumos entregados durante la ejecución del PRISER y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
- Fortalecer el tejido social y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad.
- Generar espacios para la recuperación de saberes ancestrales que se han perdido con el tiempo.
- Asistencia y participación activa de cada uno de los beneficiarios en la socialización y talleres del proyecto PRISER.
- Implementación de obras biofísicas como trinchos en guadua, perfilada de talud, y su revegetalización para facilitar los proyectos de restauración t regeneración natural.
- Recuperación de la capacidad hidráulica de tramos de la quebrada la Balvanera.
- Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.
- Apoyo técnico y administrativo para la ejecución del proyecto

Actividades programadas:

- Apoyo técnico y administrativo para la ejecución del proyecto

- Eventos educación ambiental

_Construcción de trinchos en guadua

_Perfilada de talud

_Revegetalización de taludes y control de erosión

_Limpieza manual de cauces

_Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua

_Valla Publicitaria

Actividades realizadas

- Eventos de capacitación: 4 eventos enfocados en temáticas (Gestión del riesgo, mediadas de mitigación del riesgo, Implementación de obras biofísicas Manejo integrado de residuos solidos, aprovechamiento y reutilización de residuos reciclables; además en cada uno de los eventos se realizó la socialización del proyecto con la comunidad, Seguimiento de las actividades y la evaluación final del proyecto.
- Valla Publicitaria: Se elaboró valla publicitaria cumpliendo con los requerimientos de CORNARE la cual fue instalada en un lugar visible para toda la comunidad.
- Limpieza de quebradas: Se limpió un total de 350 mts del cauce en la vereda La Balvanera
- Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua: Se trabajó en el aislamiento de 230 mts del predio del cual se abastecen una gran número de personas de la vereda.
- Implementación de obras biofísicas como trinchos en guadua, perfilada de talud, y su revegetalización para facilitar los proyectos de restauración t regeneración natural.
- Asistencia técnica para garantizar la adecuada ejecución y administración del proyecto.

Actividades contratadas VS actividades ejecutas

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT PROGAMADA	CANT EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUCION
Perfilada de talud	m2	200	200	100%
Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua	ml	230	230	100%
Construcción de trincho en guadua	ml	220	220	100%
Educación ambiental	taller	4	4	100%
Apoyo técnico y administrativo para la ejecución del proyecto	mes	6	6	100%
Revegetalización de taludes y control de erosión.	m2	250	250	100%
Limpieza manual de cauces	ml	350	350	100%
Valla publicitaria	valla	1	1	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

_Todas las actividades fueron ejecutadas de manera satisfactoria, en los tiempos estipulados y según la propuesta técnica de ejecución.

_La comunidad se involucró de manera directa, lo que demuestra su compromiso en el desarrollo de cada una de los componentes, asi como el compromiso por su sostenibilidad de las actividades establecidas.

_La comunidad utilizara los excedentes que género el proyecto para obras de beneficio comunitario.

_Los eventos de educación ambiental ayudan a la comunidad a ser más conscientes de la importancia de conservar y preservar el medio ambiente.

CLARISA ALZATE RUIZ

DIRECTORA UMATA

Se anexa: Listados de asistencia de los eventos de capacitación,


REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES

Limpieza de quebradas

COPIA CONTROLADA






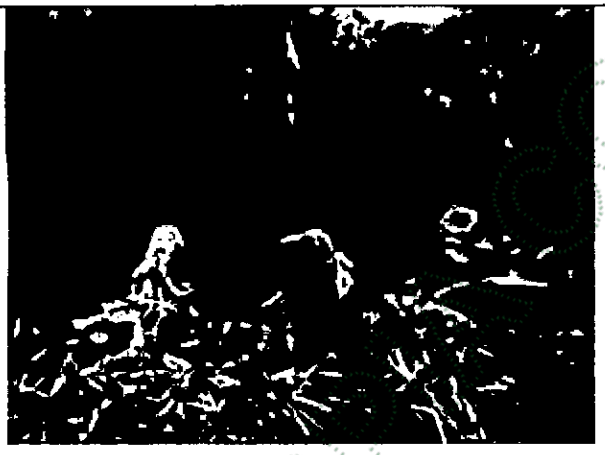


Limpieza de quebradas y ampliacion capaciad hidraulica



Limpieza de quebradas y ampliacion capaciad hidraulica

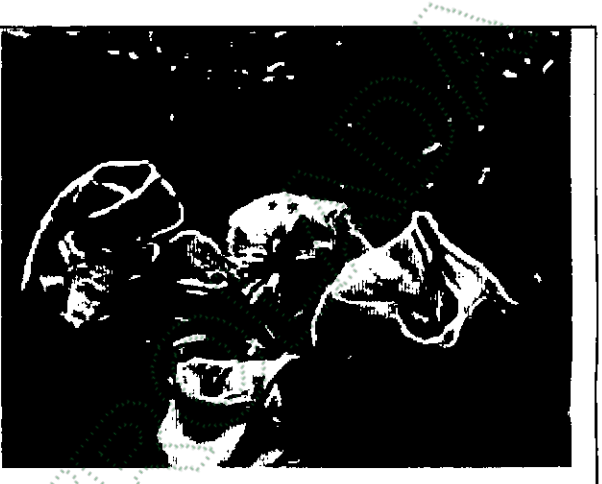
 Limpieza de quebradas y ampliacion capaciad hidraulica	 Limpieza de quebradas y ampliacion capaciad hidraulica

AISLAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SITIOS DE CAPTACIÓN DEL AGUA

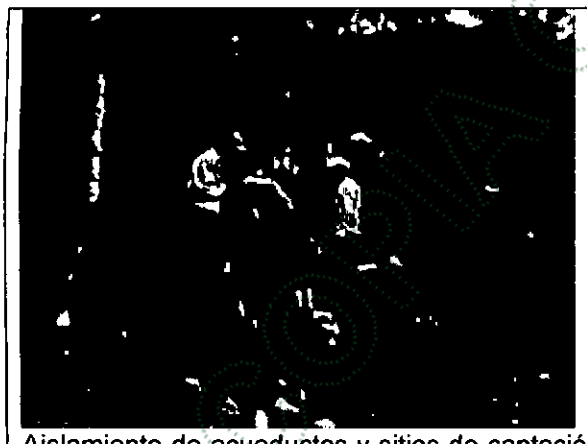 Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.	 Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.



Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.

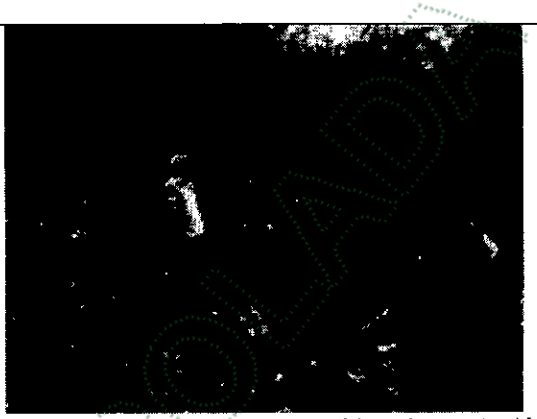

Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.



Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.



Aislamiento de acueductos y sitios de captación del agua.



Construcción de trinchos y revegetalizacion de taludes




Construcción de trinchos y revegetalizacion de taludes




Construcción de trinchos y revegetalizacion de taludes



Construcción de trinchos y revegetalizacion de taludes



Construcción de trinchos y revegetalizacion de taludes

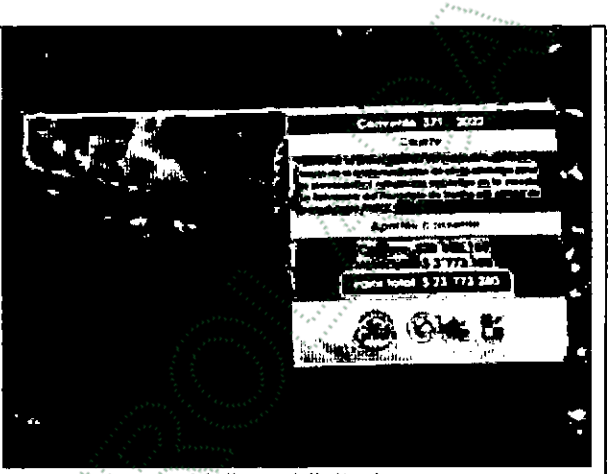

Valla publicitaria.

COPIA CONTROLADA
