INFORME SEMANAL DE OBRA No 28

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 8 de julio de 2023

- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Encofrado caisson #43 y 44 de 1.50m a 3.00m.
- Excavación de caisson #39, 40 y 41 de 0.00 a1.50m
- Excavación manual entre ejes A-B-1-2.
- Excavación mecánica y retiro de material entre ejes E-F-1-2.

Domingo 9 de julio de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 10 de julio de 2023

- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación para zarpa en el eje 1.
- Encofrado caisson #36 y 39 de 1.50m a 3.00m.
- Excavación de caisson 40 y 41 de 0.00 a1.50m

Martes 11 de julio de 2023

- Fundición de caisson #43 y 44 a 1,50 a 3,00m.
- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación de caisson #31 de 1,50 a 3,00m.
- Armado acero caisson #36 segundo anillo.

Miércoles 12 de julio de 2023

- Desencofrado de caisson #43 y 44 a 1,50 a 3,00m.
- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación de caisson #31 de 1,50 a 3,00m.
- Armado acero caisson #36 segundo anillo.

Jueves 13 de julio de 2023

- Descargue de acero de cimentación.
- Fundición en caisson # 1.
- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación de caisson #31 de 1,50 a 3,00m.

Viernes 14 de julio de 2023

- Fundición en caisson # 2 y 3.
- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación de caisson #31 de 1,50 a 3,00m.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 25 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo
SST – Karen Soto
Operativos: 29 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: RAMON ASCANIO
Operario máquina – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	%	16.70%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO								x	x	x	x	x		x																	
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO													x																		

Nota: Se suspenden actividades durante la jornada laboral por las lluvias, desde las 2:00 pm hasta las 3:00 pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continua con la excavación para cimentaciones entre ejes E-F y 1-2, retiro de material sobrante, se espera que haya el retiro completo de redes de telefonía para continuar con las actividades programadas de los caisson del 46 al 49.


REGISTRO FOTOGRÀFICO





Fundicion de caissons / Figurado y armado de acero para caissons



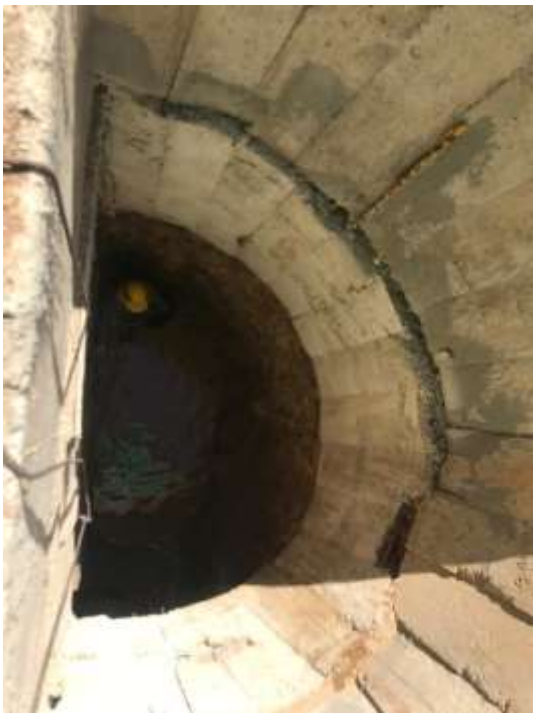

Encofrado de caissons / Excavacion caissons nivel 3.0m a 4.50m





Descargue de acero para vigas de cimentacion / Excavacion a maquina para zapatas centrales
