MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

INFORME FINAL





Responsable:
ING. ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS
CC. 1.098.687,947 de Bucaramanga, Santander



1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO 2
2. PLAN DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
3. GESTIÓN DOCUMENTAL 3
15. INTRODUCCIÓN 9
16. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
17. LOCALIZACIÓN 10
18. PRESUPUESTO 11
19. INFORMACIÓN DE CONTRATO 12
19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 12
19.2 RELACIÓN DE ACTAS 12
20. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 13
20.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS (BALANCE) 13
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
20.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA 14
20.2.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS 14
21 VALOR POR EJECUTAR 15
22 ACCIDENTES DE TRABAJO 15
23 REGISTRO FOTOGRÁFICO 16



2. PLAN DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El proyecto cuenta con Programa de Gestión De Seguridad y Salud conforme a esto, se presenta a continuación los ítems del informe, con la información suministrada por el Residente HSE y la Obra.
Para el periodo del informe final se desarrollaron las siguientes actividades de obra:

- Desmonte de Cubierta de Asbesto Cemento
- Desmonte de Cielo Raso
- Desmonte de Estructura de soporte del Cielo Raso
- Desmonte de Luminarias Eléctricas
- Suministro e Instalación de Cubierta Tipo Sandwich
- Mantenimiento y aplicación de pintura para cerchas
- Aplicación de pintura para bajantes y canales

En el presente documento se describen las actividades para la prevención, control mitigación de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo generados en el proyecto. En concordancia se presenta el Informe FINAL HSE por parte del contratista a interventoría.

ADONAÍ RALLON CASTELLANOS certifica que la información contenida en el presente documento es veraz, legal y está vigente a la fecha de entrega del Informe HSE correspondiente. La información consolidada es producto de los registros consignados en el informe mensual, cuya información se considera válida partiendo del principio constitucional de la “buena fe”.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se evidencia cumplimiento de:

- Entrega del informe de interventoría HSE del proyecto.
- Documentación original y actualizada del proyecto, reposará en el campamento de obra.
- El contratista de obra documentó y soportó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones.

Todo esto en busca de mejorar en forma continua todos los procesos y la eficacia del sistema de gestiónde seguridad y salud en el trabajo.

- Se realizan inspecciones
- Análisis del trabajo seguro
- Revisión de la documentación del personal de ingreso, garantizando condiciones óptimas.



4. OBJETIVO GENERAL

El sistema de seguridad y salud en el trabajo de **ADONAI RALLON CASTELLANOS - INTERVENTORIA** tiene como fin la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina en el trabajo, higiene y seguridad industriales, para preservar, mantener, mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores de la organización en sus ocupaciones y que deben serdesarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria

5. PLAN DE EMERGENCIAS

Se cuenta con un MEDEVAC y flujograma en el área de la obra bajo custodia del Profesional SST y estána disposición del personal que está realizando labores de obra, adicional tenemos disponible para su uso un extintor y un botiquín en el área de ejecución de las actividades.

6. REGISTROS DE INSPECCIÓN

- **EXTINTOR:** se encuentra en la bodega temporal de almacenaje de la obra, su inspección serealizó el día 26 de julio de 2023 como se muestra en el anexo

- **BOTIQUÍN:** se encuentra en la bodega temporal de almacenaje de la obra, su inspección serealizó el día 26 de julio de 2023 como se muestra en el anexo

7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

En el siguiente cuadro se describen los principales peligros a los que están expuestos los trabajadores, sus consecuencias y respectivos controles:



CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CONTROL
FÍSICO	Trabajos a altas temperaturas	Golpes de calor o frío, dolores de cabeza	Uso de EPP y dotación designada
FÍSICO	Ruido	Dolor de cabeza	Uso de EPP
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Terrenos irregulares. Acopio de materiales y herramientas de forma inadecuada. Inadecuada demarcación. Presencia de zanjas producto de la excavación.	Caídas al mismo y diferente nivel, fracturas, esguinces, golpes.	Demarcación áreas de trabajo. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Uso de botas de seguridad y suela antideslizante, gafas de seguridady guantes.
SEGURIDAD PÚBLICA	Robos, atracos, asaltos, alteración del orden público.	Golpes, fracturas, contusiones, lesiones múltiples, impactos, heridaspor armas de fuego o armas cortopunzantes, luxaciones, esguinces.	Charlas en riesgo público, manejo asertivo en situaciones de emergencias.
QUÍMICO	Inhalación de humo de vehículos y polvo	Irritación de la piel, afectación de víasrespiratorias. Lesiones en los ojos.	Uso de gafas de seguridad protección respiratoria, uso de guantes de caucho



CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CONTROL
SICOSOCIAL	Condiciones de la tarea. Carga laboral.	Estrés, fatiga.	Realizar descansos a intervalos durante cada jornada.
BIOLÓGICO	Virus Covid-19, picaduras y/o mordeduras de animales. Alergias por contacto con plantas	Afectación del Sistema Respiratorio. Alergias, infecciones, picaduras, enfermedades transmitidas por vectores ETV.	Mantener limpia el área de trabajo, asignación deprotección respiratoria. Evitar contacto y mantenersealejado de animales. Aseo personal y lavar dotación y EPP.
BIOMECÁNICOS	Posturas prolongadas o esfuerzos	Fatiga muscular, espasmos musculares, desbalance muscular, alteraciones musculo esqueléticas.	1. Charla en higiene postural, posturas durante el trabajo y estilos de vida saludable. 2. Calistenia y pausas activas durante las jornadas laborales.
BIOMECÁNICOS	Movimiento repetitivo	Fatiga muscular, espasmos musculares.	Calistenia y pausas activas durante las jornadas laborales
BIOMECÁNICAS	Manipulación manual de cargos	Golpes, contusiones,fatiga muscular, espasmos musculares	Uso adecuado de EPPCalistenia y pausas activas durante las jornadas laborales.

8. COPAAST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día 14 de abril de 2023 el contratista realizó reunión del Copasst en la institución educativa FRANCISCO DE ASIS dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 del 2015,resolución 1562 de 2012, decreto Ley 1295 de 1994, Resolución 2013 de 1986, “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo” como tema a tratar la accidentalidad y riesgos que se pueden presentar en los sitios de trabajo., para el comité



de convivencia laboral se realiza reunión el día 13 de junio de 2023 con los temas tratados de manejo del estrés laboral, el suicidio , liderazgo en las cuadrillas de trabajo.

9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

De acuerdo con la metodología de trabajo empleada se establece realizar ATS con una durabilidad semanal, se identificaron los ATS por parte del contratista para el periodo comprendido.

10. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

El contratista presento Curso de Alturas en la institución educativa FRANCISCO DE ASIS de Santander sede Bucaramanga.

11. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Durante el periodo se realiza actividades de trabajo en alturas, lo cual se realizaron todas las inspecciones necesarias para cada uno de los elementos en uso.

12. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO,ENFERMEDADES GENERARESL Y LABORALES

Dando cumplimiento a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, realiza la tabulación y seguimiento a los incidentes, accidentes y casos de ausentismo, acorde al personal operativo y administrativo, charlas diarias en temáticas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, capacitaciones sobre los principales riesgos, inspecciones de elementos de protección personal, herramientas, vehículos, instalaciones, botiquín, y extintor, el contratista no presenta ninguna información sobre accidentes laborales o ausentismo.



PERIODO	META	Total Trabajadores	Total accidentesde trabajo	FA (%)
Junio	≤ 1	**4**	**0**	**0**
Julio	≤ 1	**4**	**0**	**0**
Agosto	≤ 1	**4**	**0**	**0**

13. REGISTRO DE CHARLAS PREOPERACIONALES EN HSE

En el Periodo comprendido se realizaron charlasHSE contempladas en el anexo

14. REPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECUALES GENERADOS

El contratista presenta certificación final de la escombrera el parque como disposición final de residuosgenerados en obra.



15. INTRODUCCIÓN

Desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación de obra SAMC – IESFA - 0, los cuales hacen parte integral del presente contrato, que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". El cual abarca el desmonte total de la cubierta, el cielo raso, las instalaciones eléctricas existentes, igualmente como lo es el suministro e instalación de cubierta tipo sándwich, en conjunto con la pintura de las cerchas existentes, suministro e instalación de drywall divisorio entre cada uno de los salones de la Institución Educativa, instalaciones eléctricas existentes, pintura de canales, pintura de paredes internas y pintura de alfajía interna. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios y actividades cotizados en la propuesta, con sus propios medios: materiales y herramientas, equipos, transporte y personal idóneo para el desarrollo funcional de la obra, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

16. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO	DIRECCIÓN	ÁREA DE PROMEDIO (M2)	ÁREA DE INTERVENCIÓN (M2)
MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CALLE 30 # 1 occ – 01 Barrio Santander, Bucaramanga	680 m2	680 m2

Este proyecto ubicado en la dirección Calle 30 # 01 occ - 01 Bucaramanga - Santander; brindará espacios adecuados para que los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asis, Cuenten con una cubierta totalmente segura, dándole cumplimiento a la normatividad y lineamientos vigentes, especificados en la cartilla de Colegio 10, planteada por el Ministerio de Educación, garantizando la seguridad e integridad de la comunidad educativa en general, para que puedan desarrollar sus actividades educativas de forma idónea. Así mismo, este proyecto de adecuación en la entrada principal de la Institución Educativa brindará una mejor visualización y confort para que los estudiantes y los profesionales que allí trabajan puedan mejorar sus condiciones educativas y laborales. De forma general, las Actividades allí realizadas fueron las siguientes:

17. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ubica en la Institución Educativa San Francisco de Asis – Sede A, cuya dirección es Calle 30 # 01 occ – 01, Barrio Santander, Bucaramanga, Santander.





18. PRESUPUESTO

Codigo CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - MANTENIMIENTO DE CUBIERTASS								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1			PRELIMINARES				
	1.1		1.1	MEDICIONES				
	1.1.1		1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	625,00	$ 1.564,00	$ 977.500,00
	1.1		1.1	DESMONTES				
	1.1.1		1.1.1	Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final	m2	625,00	$ 14.593,00	$ 9.120.625,00
	1.1.2		1.1.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	625,00	$ 10.325,00	$ 6.453.125,00
Subtotal								**$ 16.551.250,00**
	2			CUBIERTAS Y CANALES				
	2.1		2.1	CUBIERTAS				
	2.1.1		2.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super	m2	625,00	$ 263.265,00	$ 164.540.625,00
Subtotal								**$ 164.540.625,00**
	4			ASEO Y LIMPIEZA				
	4.1.1		4.1.1	Aseo y limpieza	m2	625,00	$ 2.618,00	$ 1.636.250,00
Subtotal								**$ 1.636.250,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 182.728.125,00
							TOTAL OBRA	$ 182.728.125,00
						ADMINISTRACIÓN	25,00%	$ 45.682.031,00
						UTILIDAD	4,00%	$ 7.309.125,00
						INTERVENTORIA		$ 20.516.582,00
						VALOR TOTAL DE PROYECTO		$ 256.235.863,00



19. INFORMACIÓN DE CONTRATO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA SAMC – IESFA – 0
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS – SEDE PRINCIPAL
RECTOR (A)	FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
NIT	804.003.944 – 8
INTERVENTORIA	ADONAÍ RALLON
CC	1.098.687.947
CONTRATISTA	ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
NIT	804011230 - 1
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR	DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
FECHA INICIAL	16 DE JUNIO 2023
FECHA FINAL	28 DE JULIO 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	CL. 30 # 1 occ - 1, BARRIO SANTANDER, BUCARAMANGA, SANTANDER

19.2 RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE APROBACIÓN
01	Acta de inicio de contrato	16/06/2023
02	Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades	06/07/2023
03	Acta parcial N°1	07/07/2023
04	Acta de prorroga N°1	25/07/2023
05	Acta de recibo final de obra	25/08/2023



20. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

20.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS (BALANCE)

PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - MANTENIMIENTO DE CUBIERTASS

	CONTRATO							BALANCE				ACTA N-1		
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICA GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYOR (+)	MENOR (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		PRELIMINARES											
	1.1	1.1	MEDICIONES											
	1.1.1	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	625,00	$ 1.564,00	$ 977.500,00	680		$ 1.564,00	$ 1.063.520,00	500	$ 1.564,00	$ 782.000,00
	1.2	1.2	DESMONTES											
	1.2.1	1.2.1	Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final	m2	625,00	$ 14.593,00	$ 9.120.625,00	680		$ 14.593,00	$ 9.923.240,00	500	$ 14.593,00	$ 7.296.500,00
	1.2.2	1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	625,00	$ 10.325,00	$ 6.453.125,00			$ 10.325,00	$ 6.453.125,00	500	$ 10.325,00	$ 5.162.500,00
Subtotal							$ 16.551.250,00				$ 17.439.885,00			$ 13.241.000,00
	2		CUBIERTAS Y CANALES											
	2.1	2.1	CUBIERTAS											
	2.1.1	2.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintada en acería en resinas de super	m2	625,00	$ 263.265,00	$ 164.540.625,00			$ 263.265,00	$ -		$ 263.265,00	$ -
Subtotal							$ 164.540.625,00				$ -			$ -
	3		ASEO Y LIMPIEZA											
	3.1.1	3.1.1	Aseo y limpieza	m2	625,00	$ 2.618,00	$ 1.636.250,00			$ 2.618,00	$ 1.636.250,00	500	$ 2.618,00	$ 1.309.000,00
Subtotal							$ 1.636.250,00				$ 1.636.250,00			$ 1.309.000,00
	4		NO PREVISTOS											
	4.1.1	4.1.1	Suministro e Instalación de cubierta tipo Sandwich, Lámina interna y externa CAL 28	m2		$ 240.664,69	$ 0,00	680		$ 240.664,69	$ 163.651.990,00	455	$ 240.664,69	$ 109.503.973,21
Subtotal							$ 0,00				$ 163.651.990,00			$ 109.503.973,21
						SUBTOTAL OBRAS	$ 182.728.125,00				$ 182.728.125,00			$ 124.053.973,21
						TOTAL OBRA	$ 182.728.125,00			TOTAL OBRA	$ 182.728.125,00		TOTAL OBRA	$ 124.053.973,21
					ADMINISTRACIÓ	25,00%	$ 45.682.031,00		ADMINIS	25,00%	$ 45.682.031,00		25,00%	$ 31.013.493,00
					UTILIDAD	3,36%	$ 6.142.121,00		UTILIDAD	3,36%	$ 6.142.121,00		3,36%	$ 4.168.214,00
					IVA SOBRE UTILIDAD		$ 1.167.002,99		IVA SOBRE LA UTILIDAD		$ 1.167.002,99		IVA SOBRE LA UTILIDAD	$ 791.960,66
					VALOR TOTAL DE PROYECTO		$ 235.719.280,0		VALOR TOTAL DE PROYECTO		$ 235.719.280,0		VALOR TOTAL	$ 160.027.640,9

Página 1

CONTRATISTA
AFER

INTERVENTORIA
Ing. Adonai Rallon Castellanos



ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades de tipo administrativas desarrolladas en el presente periodo son las siguientes:

- Seguimiento a la programación de obra
- Pagos a proveedores y personal contratado
- Comunicación con la interventoría
- Diligenciamiento de Actas
- Exámenes de ingreso
- Afiliaciones al sistema general de seguridad social
- Radicación de documentos ante la entidad contratante
- Presentación de informes de avance de obra.

20.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA

Según la programación de obra o cronograma presentado, se realizó al respectivo tiempo planteado y en el periodo correspondiente a los 8 días hábiles en el que se contrató:

% PROGRAMADO DEL CONTRATO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	ATRASO
100%	100%	0%

20.2.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

A la fecha del presente informe, no se han generado pagos a favor del contratista dado que el acta de ejecución adjunta es la primera acta de pago a presentar.


21 VALOR POR EJECUTAR

VALOR CONTRACTUAL	**$ 235.719.281,00**
ADICIONAL	**$ 0**
VALOR EJECUTADO	**$ 235.719.281,00**

22 ACCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo de tiempo de ejecución de la obra no se presentaron accidentes de trabajo ni incapacidades de tipo general, ni laboral.

24 REGISTRO FOTOGRÁFICO

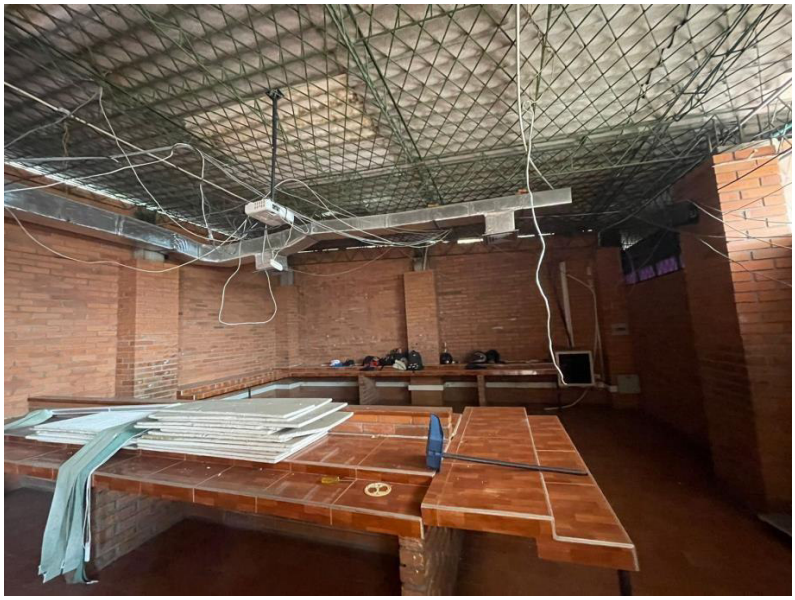ACTIVIDADES PRELIMINARES	
 	**Preliminares.** • Localización y replanteo • Desmonte de Cielo raso • Desmonte de cubierta existente de asbesto cemento • Desmonte de luminarias eléctricas • Desmonte de estructura de cielo raso existente • Acopio de material sobrante • Retiro de escombros







SUMINISTRO E INSTALACIONES





SUMINISTRO, PINTURA, E INSTALACIONES.

- Instalación de teja tipo sándwich
- Mantenimiento general de cerchas metálicas existentes.
- Suministro e instalación de aislante térmico
- Suministro e instalación de Drywall
- Mantenimiento de canales metálicos existentes
- Pintura de alfajía de pasillo
- Instalación de cámaras, ventiladores e instalaciones eléctricas.












VENVENI






















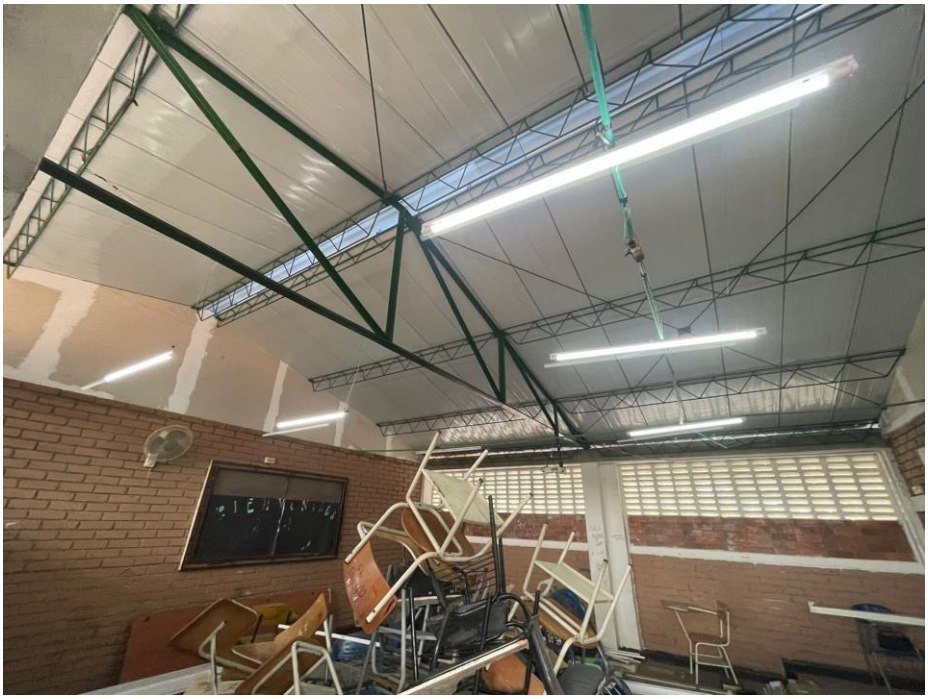

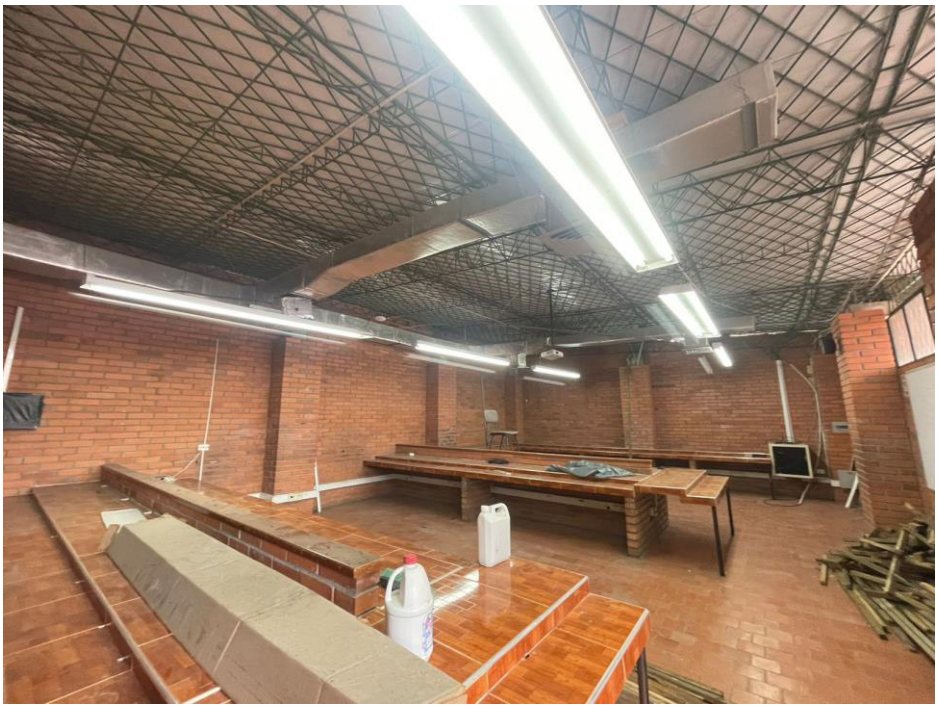

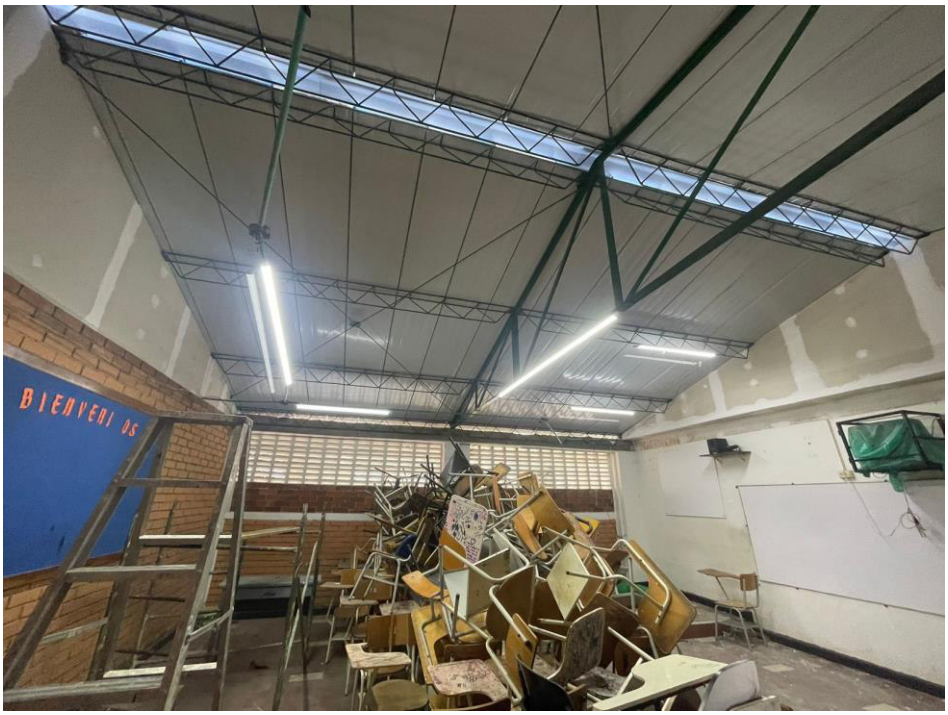
BIENVENI DS



ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS
INGENIERO CIVIL
CC. 1.098.687,947 de Bucaramanga, Santander

	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	ACTA DE INICIO CONTRATO

DATOS DE CONTRATO		
ENTIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATO No Y FECHA	23 - 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 804.003.944 - 8	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE	ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
	C.C./NIT	804011230-1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EVA MARTÍNEZ PERÉZ
	C.C	63.312.443 expedida en Bucaramanga
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ
	CARGO	Rector de la institución
	C.C.	88.155.316 de Pamplona
INTERVENTOR	NOMBRE:	ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS
	C.C./NIT	1.098.687.947 de Bucaramanga
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($235.719.281),	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	23-00005
	FECHA:	10 DE ABRIL DE 2023
RP	NÚMERO	23-00007
	FECHA	13 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2023
	FECHA FIN:	28 DE JULIO DE 2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ, en calidad de Rector, y quien obra como representante legal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, NIT 804.003.944-8 en adelante la "ENTIDAD" por una parte y por la otra EVA MARTÍNEZ PERÉZ, mayor de edad identificada con cedula No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga, representante legal de ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO identificada con NIT. 804011230-1, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA en los siguientes términos:

1. Que el día 16 de junio de 2023, se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato comorequisito para su ejecución.

	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	ACTA DE INICIO CONTRATO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

Aseguradora	ASE(URADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario	INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS NIT 804.003.944-8			
Afianzado	ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO NIT 804.011.230-1			
Amparo	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	465 - 47 - 994000007753	13/06/2023	28/07/2023	$23.571.928,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465 - 47 - 994000007753	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENEN VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$23.571.928,10
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	465 - 47 - 994000007753	13/06/2023	28/07/2026	$23.571.928,10

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario	INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS NIT 804.003.944-8 y TERCEROS AFECTADOS			
Afianzado	ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO NIT 804.011.230-1			
Amparo	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Hasta	
CONTRATO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	465 – 74 - 994000002137	13/06/2023	28/07/2023	$232.000.000
NOTA 1:	DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
NOTA 2:	LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUBRE ADEMAS DE LA COBERTURA BASICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, LOS SIGUIENTES AMPAROS: 1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. 3. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y			

	SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS. 4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL. 5. COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

2. Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.
3. Que el Contrato No. 23 - 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2023

Por la Entidad,

FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
Rector
Ordenador de gasto

Por el contratista,

EVA MARTÍNEZ PERÉZ,
C.C No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga
Representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO**
NIT. 804011230-1
CONTRATISTA

Proyectó Aspectos jurídicos: Jeferson Arley Jaimes Laguado – Abogado Contratista
VoBo Freddy Martin Duarte Ramírez- Rector

PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - MANTENIMIENTO DE CUBIERTASS

CONTRATO								BALANCE				ACTA N-1			
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYOR (+)	MENOR (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		PRELIMINARES											
	1.1	1.1	MEDICIONES											
	1.1.1	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	625,00	$ 1.564,00	$ 977.500,00	680		$ 1.564,00	$ 1.063.520,00	500	$ 1.564,00	$ 782.000,00
	1.2	1.2	DESMONTES											
	1.2.1	1.2.1	Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final	m2	625,00	$ 14.593,00	$ 9.120.625,00	680		$ 14.593,00	$ 9.923.240,00	500	$ 14.593,00	$ 7.296.500,00
	1.2.2	1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	625,00	$ 10.325,00	$ 6.453.125,00			$ 10.325,00	$ 6.453.125,00	500	$ 10.325,00	$ 5.162.500,00
Subtotal							**$ 16.551.250,00**				**$ 17.439.885,00**			**$ 13.241.000,00**
	2		CUBIERTAS Y CANALES											
	2.1	2.1	CUBIERTAS											
	2.1.1	2.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super	m2	625,00	$ 263.265,00	$ 164.540.625,00			$ 263.265,00	$ -		$ 263.265,00	$ -
Subtotal							**$ 164.540.625,00**				**$ -**			**$ -**
	3		ASEO Y LIMPIEZA											
	3.1.1	3.1.1	Aseo y limpieza	m2	625,00	$ 2.618,00	$ 1.636.250,00			$ 2.618,00	$ 1.636.250,00	500	$ 2.618,00	$ 1.309.000,00
Subtotal							**$ 1.636.250,00**				**$ 1.636.250,00**			**$ 1.309.000,00**
	4		NO PREVISTOS											
	4.1.1	4.1.1	Suministro e Instalación de cubierta tipo Sandwich, Lámina interna y externa CAL 28	m2		$ 240.664,69	$ 0,00	680		$ 240.664,69	$ 163.651.990,00	455	$ 240.664,69	$ 109.503.973,21
Subtotal							**$ 0,00**				**$ 163.651.990,00**			**$ 109.503.973,21**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 182.728.125,00**				**$ 182.728.125,00**			**$ 124.053.973,21**

						TOTAL OBRA	**$ 182.728.125,00**			**TOTAL OBRA**	**$ 182.728.125,00**		**TOTAL OBRA**	**$ 124.053.973,21**
						ADMINISTRACIÓN	**25,00%**	**$ 45.682.031,00**		**ADMINISTRA**	**25,00%**	**$ 45.682.031,00**	**25,00%**	**$ 31.013.493,00**
						UTILIDAD	**3,36%**	**$ 6.142.121,00**		**UTILIDAD**	**3,36%**	**$ 6.142.121,00**	**3,36%**	**$ 4.168.214,00**
						IVA SOBRE UTILIDAD		**$ 1.167.002,99**		**IVA SOBRE LA UTILIDAD**		**$ 1.167.002,99**	**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	**$ 791.960,66**
						VALOR TOTAL DE PROYECTO		**$ 235.719.280,0**		**VALOR TOTAL DE PROYECTO**		**$ 235.719.280,0**	**VALOR TOTAL**	**$ 160.027.640,9**

CONTRATISTA
AFER

INTERVENTORIA
Ing. Adonaí Rallon Castellanos

	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**

ACTA PARCIAL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTA No. 01

CONTRATO NO. 23 - 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**
FECHA DEL CONTRATO	**13 DE JUNIO DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($235.719.281)** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE PUEDAN GENERAR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 23-00005 de fecha 10 de abril de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 23-00007 de fecha 13 de junio de 2023
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	**ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO con NIT 804011230-1,** representado legalmente por **EVA MARTÍNEZ PERÉZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga
SUPERVISORA:	**FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ,** en calidad de rector, quien contará con el apoyo jurídico, técnico y financiero de la **INTERVENTORIA.**
PLAZO:	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.**
FECHA DE INICIO:	DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2023.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	**SIETE (07) DE JULIO DE 2023**
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO:	SESENTA POR CIENTO **(60%)**
VALOR DEL ACTA PARCIAL A COBRAR	CIENTO SESENTA MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($160.027.640,69)
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN:	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($75.691.640,51)

En Bucaramanga, a los siete (07) días del mes de julio de 2023, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS**, se reunieron, **FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ** - **SUPERVISOR** del Contrato, **ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.687.947 de Bucaramanga, ingeniero civil, matricula profesional 68202-420353 STD, en calidad de **INTERVENTORÍA,** y **EVA MARTÍNEZ PERÉZ,** mayor de edad identificada con cedula No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga, representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO** identificada con NIT. 804011230-1, en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de elaborar el **ACTA PARCIAL No. 01, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO NO. 23 - 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023**

De acuerdo, a las obligaciones contenidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el **DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2023 – SIETE (7) DE JULIO DE 2023**, se ejecutaron las siguientes actividades:

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	UND.	CANTIDAD EJECUTADA
1	**PRELIMINARES**		
1,1	**MEDICIONES**		
1,1,1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	500,00
1,2	**DESMONTES**		
1,2,1	Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final	m2	500,00
1,2,2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	500,00
Subtotal			
2	**CUBIERTAS Y CANALES**		
2,1	**CUBIERTAS**		
2,1,1	Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super	m2	00,00
Subtotal			
3	**ASEO Y LIMPIEZA**		
3,1,1	Aseo y limpieza	m2	500,00
Subtotal			
4	**NO PREVISTOS**		
4,1,1	Suministro e Instalación de cubierta tipo Sandwich, Lámina interna y externa CAL 28	m2	455,00
Subtotal			

Adicionalmente, el contratista presente **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL,** y evidencias de la ejecución contractual la cual esta adjunta a la presente acta de ejecución.

Por la Entidad,

FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
Rector
Ordenador de gasto

Por el Interventor,

ADONAI RALLÓN CASTELLANOS
C.C No. 1.098.687.947 de Bucaramanga

Por el contratista,

EVA MARTÍNEZ PERÉZ,
C.C No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga
Representante legal de ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
NIT. 804011230-1
CONTRATISTA

MINUTA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 23 – 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023

Entre **FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ,** en calidad de Rector, y quien obra como representante legal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS,** NIT 804.003.944-8 en adelante la "ENTIDAD" por una parte; y, por la otra, **EVA MARTÍNEZ PERÉZ,** mayor de edad identificada con cedula No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga, representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO** identificada con NIT. 804011230-1, en adelante el **"CONTRATISTA"**, hemos convenido celebrar **PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 23 – 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la institución educativa San Francisco de Asís y el contratista ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO celebraron el contrato de obra pública 23 -007 del 17 de junio de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

2. Que en los comités técnicos realizados en la sede de la institución educativa San Francisco de asís que se relacionan a continuación:

ACTAS Y VISITAS DE COMITÉ No.	FECHA
ACTA DE INICIO	16/06/2023
ACTA PARCIAL No. 1	06/07/2023

La interventoría expuso en detalle las consideraciones técnicas de las obras adicionales que surgieron durante la ejecución del contrato desde el inicio, 16 de junio de 2023, hasta el último comité el cual fue realizado el 06 de junio de 2023.

3. Que, de acuerdo, a las consideraciones técnicas de la interventoría, a los comités de obra, el contratista presenta balance de cantidades, a la supervisión e interventoría con el fin de realizar un análisis y posterior un acta mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítem no previstos, descritos a continuación:

   - Se ha constatado en visita técnica en el desarrollo de la obra que se hace necesario aumentar la cantidad de metros en la cubierta.

MINUTA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA

La Interventoría y el contratista de presenta a ustedes el balance de obra de mayores y menores cantidades de obra y de las actividades NO PREVISTAS inicialmente, así como no contempladas económicamente en el alcance del proyecto y que son necesarias para culminar a satisfacción y cumplir el fin de dejar terminado, habilitado con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual que tiene por objeto ""MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

4. Que el acta inicial del contrato quedo a partir del 16 de junio de 2023 con fecha de terminación del 28 de julio de 2023.

5. Que actualmente la ejecución del CONTRATO No. 23-007 del 13 de junio de 2023, cuyo objeto consiste en el **"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",** está **VIGENTE**

6. Que, el 25 de julio de 2023, el contratista **EVA MARTÍNEZ PERÉZ,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 63.312.443 expedida en la ciudad de Bucaramanga, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la **ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO – AFER**, identificada con el NIT. No. 804011230-1, presento a la institución solicitud de prorroga en tiempo al plazo de ejecución del contrato No. 23-007 del 13 de junio de 2023, cuyo objeto consiste en el **"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",** en un plazo de UN (1) MES, toda vez que la ejecución requiera, para su cumplimiento total, un tiempo adicional, para fundamentar lo anterior, me permito poner a consideración lo siguiente:

   El trabajo en obra ha tenido serios y constantes impedimentos ajenos a nuestra voluntad que retrasan significativamente el trabajo inicialmente proyectado y por ende, afectan directamente el tiempo mediante el cual se pretendía surtir las actividades propuestas contractualmente, para fundamentar lo enunciado me permito referenciar lo siguiente: i) Las fuertes lluvias de los días en que nos encontramos en trabajo de campo, ha generado dificultad en la movilidad de las herramientas y materiales al sitio a intervenir, así como de los trabajo acordado ii) de conformidad con el balance presentado, se hizo necesario organizar el cumplimiento de actividades, dando alcances adicionales que ameritan un tiempo mayor para su debida ejecución.

   Por lo anterior, es viable precisar, que a la ejecución del contrato han sobrevenido circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, ajenas a la voluntad de las partes, que afectan

y retrasan notablemente las labores y tiempos proyectados inicialmente, por lo que, le solicitamos a la Institución Educativa la prórroga en tiempo del plazo de ejecución en UN (01) MES.

7. Que, para la ejecución de lo solicitado, el contratista de obra requiere de una prórroga en tiempo de **UN (1) MES,** tiempo mediante el cual se culminaran las actividades descritas.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto de la presente minuta es la suscripción del PRORROGA No. 23-007 del 13 de junio de 2023, cuyo objeto consiste en el **"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",** así:

- **TIEMPO** de **UN (1) MES**

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Se entienden incluidos dentro de los alcances contractuales establecidos en la cláusula tercera del contrato No. 23-007 del 13 de junio de 2023, cuyo objeto consiste en el **"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",,** las señaladas en los siguientes documentos,

- Se anexa documento: MAYORES y MENORES

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato se prorrogará por **UN (1) MES,** para la cual se tendrá como fecha de terminación el día **VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2022.**

MINUTA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato del contrato quedara igual, es decir la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($235.719.281),** que incluye todos los costos directos e indirectos que se puedan generar.

CLAUSULA 18. GARANTÍAS

El Contratista está obligado a AMPLIAR las garantías allegadas al inicio de la ejecución contractual. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 26. VIGENCIA.

Las demás clausulas no modificadas en la presente minuta, continúan VIGENTES.

MINUTA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
SELECCIÓN ABREVIADA

En constancia se firma el contrato en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2023

Por la Entidad,

FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
Rector
Ordenador de gasto

Por el contratista,

EVA MARTINEZ PERÉZ,
C.C No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga
Representante legal de ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
NIT. 804011230-1
CONTRATISTA

Por el Interventor,

ADONAI RALLÓN CASTELLANOS
C.C 1.098.687.947 de Bucaramanga
Matricula profesional 68202-420353 STD,

Proyectó Aspectos jurídicos: Jeferson Arley Jaimes Laguado – Abogado Contratista
VoBo Freddy Martin Duarte Ramírez- Rector

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - MANTENIMIENTO DE CUBIERTASS

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			**PRELIMINARES**				
	1.1		**1.1**	**MEDICIONES**				
	1.1.1		1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	625,00	$ 1.564,00	$ 977.500,00
	1.1		**1.1**	**DESMONTES**				
	1.1.1		1.1.1	Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final	m2	625,00	$ 14.593,00	$ 9.120.625,00
	1.1.2		1.1.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	625,00	$ 10.325,00	$ 6.453.125,00
Subtotal								**$ 16.551.250,00**
	2			**CUBIERTAS Y CANALES**				
	2.1		**2.1**	**CUBIERTAS**				
	2.1.1		2.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super	m2	625,00	$ 263.265,00	$ 164.540.625,00
Subtotal								**$ 164.540.625,00**
	4			**ASEO Y LIMPIEZA**				
	4.1.1		4.1.1	Aseo y limpieza	m2	625,00	$ 2.618,00	$ 1.636.250,00
Subtotal								**$ 1.636.250,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 182.728.125,00**
							TOTAL OBRA	**$ 182.728.125,00**
						ADMINISTRACIÓN	**25,00%**	**$ 45.682.031,00**
						UTILIDAD	**4,00%**	**$ 7.309.125,00**
						INTERVENTORIA		**$ 20.516.582,00**
						VALOR TOTAL DE PROYECTO		**$ 256.235.863,00**

Aldahir Peña Hernandez
Ing. Civil
Mat. Prof. 151037-0531966 STD
Proyectó

NOTA: * Mediante Circular 305 del 27 de agosto de 2021, los rectores de las Instituciones Educativas, enviaron el requerimiento técnico, análisis de precios unitarios, cantidades y presupuesto necesario para adelantar las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas, con el fin de garantizar la presencialidad en las IE. Presupuesto elaborado y firmado por un profesional de la Ingeniería Civil y/o Arquitecto. Cada IE manejó precios unitarios diferentes para la misma actividad, por lo cual la Secretaría de Educación ajustó el presupuesto teniendo en cuenta los Análisis de Precios Unitarios de la Base de Datos del Taller de Arquitectura adscrito a la Secretaría de Infraestructura municipal, los cuales se adjuntan.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.1.1

DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo manual para el proyecto

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		**$ -**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 142,17*	*$ 142,17*
			TOTAL EQUIPOS	**$ 142,17**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1,00	*$ 33.725,00*	*54,00%*	*$ 51.936,50*	97,00	*$ 535,43*
Oficial	1,00	*$ 55.821,00*	*54,00%*	*$ 85.964,34*	97,00	*$ 886,23*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 1.421,66**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.563,83**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$ -**
UTILIDAD	**0,00%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 1.563,83**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 1.564,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.2.1

DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, retiro y disposición final

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.2.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"	*Und*	0,05	0%	*$ 7.500,00*	*$ 375,00*
			TOTAL MATERIALES	**$ 375,00**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 993,61*	*$ 993,61*
Sección de andamio certificado	*Día*	0,017	*$ 41.055,00*	*$ 697,94*
Pulidora de mano	*Día*	0,017	*$ 22.941,00*	*$ 390,00*
			TOTAL EQUIPOS	**$ 2.081,55**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*N/A*	0,10	*$ 22.000,00*	*$ 2.200,00*
				TOTAL TRANSPORTE	**$ 2.200,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	5,00	*$ 34.000,00*	*54,00%*	*$ 52.360,00*	35,00	*$ 7.480,00*
Oficial	1,00	*$ 55.821,00*	*54,00%*	*$ 85.965,00*	35,00	*$ 2.456,14*
					TOTAL MANO DE OBRA	**$ 9.936,14**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 14.592,69**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$ -**
UTILIDAD	**0,00%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 14.592,69**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 14.593,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 1.2.2

DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 1.2.2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"	*Und*	0,06	0%	*$ 7.500,00*	*$ 450,00*
			TOTAL MATERIALES		**$ 450,00**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 381,37*	*$ 381,37*
Pulidora de mano	*Día*	0,02	*$ 22.941,00*	*$ 458,82*
Sección de andamio certificado	*Día*	0,02	*$ 41.055,00*	*$ 821,10*
		TOTAL EQUIPOS		**$ 1.661,29**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*N/A*	0,20	*$ 22.000,00*	*$ 4.400,00*
			TOTAL TRANSPORTE		**$ 4.400,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	2,00	*$ 34.000,00*	*54,00%*	*$ 52.360,00*	50,00	*$ 2.094,40*
Oficial	1,00	*$ 55.821,00*	*54,00%*	*$ 85.965,00*	50,00	*$ 1.719,30*
			TOTAL MANO DE OBRA			**$ 3.813,70**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 10.324,99**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$ -**
UTILIDAD	**0,00%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 10.324,99**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 10.325,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016 Versión: 2.24 Fecha aprobación: Junio 2020 Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 2.1.1

DESCRIPCIÓN: Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super Poliéster. Ancho Útil 500mm. Calibre 26 (0,45mm) y 28 (0,35mm). Color Blanco, Incluye accersorios de intalación y estructura metálica de soporte.

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 2.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad pur, espesor 5 cm, ancho útil 1.00 m	*m2*	1	4%	*$ 180.000,00*	*$ 187.200,00*
Tubo estructural rectangular 76 X 38 1.5 MM	*ML*	2	5%	*$ 17.366,66*	*$ 36.469,99*
			TOTAL MATERIALES		**$ 223.669,99**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 3.122,08*	*$ 3.122,08*
Pulidora de mano	*Día*	0,05	*$ 22.941,00*	*$ 1.147,05*
Sección de andamio certificado	*Día*	0,10	*$ 41.055,00*	*$ 4.105,50*
		TOTAL EQUIPOS		**$ 8.374,63**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	7,00	*$ 34.000,00*	*54,00%*	*$ 52.360,00*	20,00	*$ 18.326,00*
Oficial	3,00	*$ 55.821,00*	*54,00%*	*$ 85.965,00*	20,00	*$ 12.894,75*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 31.220,75**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 263.265,37**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$ -**
UTILIDAD	**0,00%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 263.265,37**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 263.265,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ÍTEM: 3.1.1

DESCRIPCIÓN: Aseo y limpieza.

UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: 3.1.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Elementos de aseo y limpieza	*m2*	1	0%	*$ 1.177,95*	*$ 1.177,95*
			TOTAL MATERIALES		**$ 1.177,95**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	1,00	*$ 130,90*	*$ 130,90*
		TOTAL EQUIPOS		**$ 130,90**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
		TOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	2,00	*$ 34.000,00*	*54,00%*	*$ 52.360,00*	80,00	*$ 1.309,00*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 1.309,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.617,85**
ADMINISTRACIÓN	**0%**	**$ -**
UTILIDAD	**0%**	**$ -**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 2.617,85**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 2.618,00**

LISTA DE EQUIPOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

Código	Descripción	Unidad	Valor Unidad
EQU	HERRAMIENTA Y EQUIPOS	UND	VALOR DÍA
EQU.007	Sección de andamio certificado	Día	$ 41.055
EQU.019	Herramienta menor	Gb	
EQU.020	Martillo demoledor eléctrico	Día	$ 109.480
EQU.003	Pulidora de mano	Día	$ 22.941

LISTA DE TRANSPORTES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

Código	Descripción	Unidad	Valor Unidad
TRA.001	Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	m3	$ 22.000,00
TRA.002	Tarifa escombrera disposición final	m3	$ 7.000,00

LISTA DE SALARIOS PERSONAL DE OBRA									
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - MANTENIMIENTO DE CUBIERTASS									
Código	**Descripción**	**Valor Hora Sin Prestaciones Sociales**	**Valor Día Sin Prestaciones Sociales**	**Valor Mes Sin Prestaciones Sociales**	**% Prestaciones Sociales 2021**	**Valor Total Prestaciones Sociales Mes**	**Valor Total**	**Valor Total Día**	**Valor Total Hora**
	TIPO	**HORA**	**DÍA**	**MES**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**SUBTOTAL**	**TOTAL MES**	**TOTAL DÍA**	**TOTAL HORA**
MO.001	Ayudante	$ 4.250,00	*$ 34.000,00*	$ 1.020.000,00	54,0%	$ 550.800,00	$ 1.570.800,00	$ 52.360,00	$ 6.545,00
MO.002	Oficial	$ 6.977,63	*$ 55.821,00*	$ 1.674.630,00	54,0%	$ 904.300,20	$ 2.578.930,20	$ 85.964,34	$ 10.745,54

LISTA DE MATERIALES E INSUMOS			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS			
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Valor Unidad con iva**
FER	**FERRETERÍA**		
FER.013	Brocha mona 2"	Und	$ 5.300,00
FER.014	Rodillo felpa 9"	Und	$ 11.667,84
FER.024	Elementos de aseo y limpieza	m2	$ 1.177,95
FER.025	Lija	Kg	$ 1.933,00
FER.009	Cinta de enmascarar 24mm 40m	Und	$ 5.729,00
FER.005	Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"	Und	$ 7.500,00
FER.006	Tubo estructural rectangular 76 X 38 1.5 MM	ml	$ 17.366,66
FER.025	Alambre negro # 17	kg	$ 11.400,00
PIN	**PINTURAS**		
PIN.007	Pintura acrílica para exteriores	Gln	$ 75.891,66
CON	**CONCRETOS**		
CON.014	Impermeablizante integral para hormigón y mortero	Kg	$ 21.783,00
CON.010	Mortero 1:4 mezclado en sitio	m3	$ 664.210,00
CON.009	Mortero 1:3 mezclado en sitio	m3	$ 707.072,00
CON.001	Concreto 1500 psi mezclado en sitio	m3	$ 588.157,00
CON.004	Concreto 3000 psi mezclado en sitio	m3	$ 681.854,00
CON.012	Desencofrante para concreto	Lt	$ 13.804,00
CON.011	Curador de concreto tipo antisol o similar	Lt	$ 6.621,35
CUB	**CUBIERTAS**		
CUB.002	Panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad pur, espesor 5 cm, ancho útil 1.00 m	m2	$ 180.000,00
MET	**ACEROS Y METALES**		
MET.008	Acero de 4200 Kg/cm2, PDR-60	kg	$ 7.297,00

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CAMBIO DE CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITCUIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO SANTANDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DE 2022

CAMBIO DE CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITCUIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

ESPECIFICACIONES GENERALES 3
OBJETIVO. 4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 4
PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 4
LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROYECTO. 7
GENERALIDADES 9
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 9
CRONOGRAMA DE OBRA 13
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 13
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 13
AUTOCONTROL 13
MANEJO AMBIENTAL. 14
PERMISOS Y LICENCIAS 14
DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 14
CONCRETOS 20
ACERO 34
ELEMENTOS METÁLICOS 39
1 PRELIMINARES. 45
1.1 DESMONTES 45
1.1.1 Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro. 45
1.1.2 Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro. 46
1.1.3 Desmonte de estructura de cubierta, incluye cargue y retiro. **¡Error! Marcador no definido.**
2 CUBIERTAS Y CANALES 47
2.1 CUBIERTAS 47
2.1.1 Cubierta en Teja Thermoacústica C-22 47
3 ASEO Y LIMPIEZA 48
3.1.1 Aseo y limpieza. 48

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, forman parte del contrato celebrado para el proyecto “CAMBIO DE CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITCUIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS”

OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control del presente proyecto.

El presente documento se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno del ítem del presupuesto y los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras CAMBIO DE CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITCUIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones.

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos estructurales y arquitectónicos y de otras especialidades. El contratista se ceñirá de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez

como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (Estructurales, hidráulicos, Eléctricos, etc.) Indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia, ésta deberá ser consultada con la Interventoría. En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos estructurales. El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto.

Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del PROYECTO no exoneran al CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad.

Si EL CONTRATISTA encuentra inexactitudes o errores en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Interventoría, y ésta realizará dicha gestión ante la oficina de diseño antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos.

Todos los materiales empleados para la construcción de los bienes que suministrará EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. Para cada uno de los materiales suministrados, EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría los certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones, y los certificados de producción de lote de los productos y de la empresa que los produce.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con las normas técnicas que apliquen.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad y/o especificación técnica, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la Interventoría.

Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano urbanístico, prevalecerán los planos técnicos cuando las diferencias sean de carácter técnico.

Es responsabilidad del contratista el análisis de todos los documentos técnicos que hacen parte del proyecto a fin de coordinar directamente la ejecución de las redes eléctricas, de voz y datos, acueducto, alcantarillado y los sistemas estructural y arquitectónico detectando interferencias entre sí. Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado previamente con la interventoría del proyecto y no podrá ejecutarse sin previa autorización. Será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la interventoría técnica del proyecto, en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, serán por cuenta y responsabilidad del contratista.

El contratista mantendrá al día los juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, los cuales se utilizarán para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra estos juegos de planos deberán servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra.

LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROYECTO.

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción.

Cuando se mencionan normas específicas, debe entenderse que no se excluyen otras normas diferentes siempre y cuando la norma propuesta sea equivalente a la especificada y sea aprobada por El Municipio.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción:

ESTRUCTURAS

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10

Asociación colombiana de ingeniería sísmica AIS

Instituto Colombiano de Normas técnicas (ICONTEC)

Building Code Requirements for Structural Concrete ACI

Reglamento para concreto Estructural ACI 318S-14

American Welding Society (AWS)

American Institute for Steel Construction (AISC)

Manual of Steel Construction

Especificaciones técnicas de los fabricantes y productos utilizados

Steel Structures Painting Council (SSPC)

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

ASTM International

Especificaciones técnicas de los fabricantes y productos utilizados

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA.

Redes internas NTC 1500 tercera actualización 2017

Resolución 0330 de 2017

VIAS Y ESPACIO PUBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 2012

Artículo 232-07 Estabilización de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil.

Artículo 220-07 Terraplenes.

Artículo 340-07 Base estabilizada con emulsión asfáltica

Artículo 420-07 Riego de imprimación.

Artículo 421-07 Riego de Liga.

Artículo 450-07 Mezcla densa en caliente (concreto Asfáltico).

GENERALIDADES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

-Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, presentará muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor.

-Se asume que las cotas y dimensiones corresponden a las especificadas en los planos, sin embargo, será de carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas será por cuenta del contratista.

-Es obligación del Contratista verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con la Interventoría. Las cantidades contratadas pueden acercarse por exceso o por defecto a las cantidades necesarias a ejecutar.

-Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre y cuando sean técnicamente similares y se cuente con las exigencias indicadas tanto en planos como en las especificaciones técnicas, previa aprobación previa del Interventor.

-El contratista deberá suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos, así como los equipos, maquinaria, herramientas, dotaciones, personal directo e indirecto, gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente (incluida la dirección), elementos y sistemas de protección al

personal, insumos, materiales auxiliares y de consumo, materiales consumibles y elementos para el control ambiental y seguridad industrial y cualquier otro que se requiera, aunque no sea mencionado específicamente, en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra

-Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

-Suministrar los materiales, equipo, herramientas y personal calificado para ejecutar los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas para todas las disciplinas, los cuales serán realizadas por su cuenta y riesgo, con el fin de verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, de dichos ensayos se dejará trazabilidad en el dossier de construcción.

-Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

-Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que la administración municipal, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista.

-Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y El Municipio.

-Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra.

-Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.

-Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

-Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y por el director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes del Municipio.

-Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

-Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.

-Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación requerida por el Interventor o por El Municipio.

-Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por El Municipio, únicamente para el desarrollo del objeto contractual. --Revisar, junto con la interventoría, dentro de los diez (10)

días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

-Informar oportunamente al interventor y al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

-Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato.

-Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

-Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los planos récord de la misma incorporando las modificaciones sucedidas en obra, así como el Dossier de construcción que incluye toda la documentación, protocolos, procedimientos, hojas de datos técnicos, manuales, catálogos, certificados, planos y otros documentos inherentes al proyecto que respalden las inspecciones y pruebas a las instalaciones, equipos, subsistemas y sistemas, individualmente y en conjunto, en cumplimiento con las especificaciones técnicas, el diseño y planos del proyecto.

-Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos.

-El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.

-Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra.

CRONOGRAMA DE OBRA

Antes de iniciar la obra, el contratista deberá presentar un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra, así como la gestión de compras o adquisición principalmente de los materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento importado, o traído de otra localidad, requerido para la ejecución, desarrollo y entrega de la obra, así como los hitos de tiempo de fabricación, pruebas en fábrica, pruebas instalación parcial, pruebas de sistemas, por lo tanto, no se aceptaran retardos en la terminación del proyecto por ninguna de estas causas.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL

El Contratista deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de Colombia, además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los órganos legislativos regionales y locales, que pudieran afectar de alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de ellos.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Contratista deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad. La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la Administración Municipal o sus representantes, se hará para verificar su cumplimiento, y no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de las obras, compras y estudios objeto del contrato.

AUTOCONTROL

El contratista deberá contar con laboratorios con personal calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por la Interventoría técnica que le

permita realizar todas las pruebas de diseño y control de calidad exigidas en las presentes especificaciones, las cuales tienen carácter de preceptivo.

Todos los elementos del laboratorio deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y aquellos que lo requieran deben tener al día su certificado de calibración.

MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista deberá obtener y presentar a la interventoría todos los permisos y licencias que correspondan para la ejecución correcta y legal de las obras, compras y estudios contemplados en el contrato, así como el pago de todos los impuestos y derechos de los cuales no esté exonerado.

DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

Movilización

El contratista deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al oportuno y cuidadoso embarque y transporte de los materiales y equipos requeridos para la ejecución de la obra, con el fin de asegurar el avance normal de los trabajos de acuerdo con el programa aprobado.

Equipos

El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices de calidad exigidos en la especificación respectiva.

La interventoría se reservará el derecho de exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o insuficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Las condiciones de operación de los equipos deben ser tales que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.

Transporte de equipos y materiales

El transporte de quipos y materiales se hará por las rutas aprobadas por la Interventoría, sin interrupción del tránsito normal. Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los vehículos empleados en el transporte de materiales.

Por ningún motivo se permitirá la circulación autopropulsada de los equipos de construcción por las vías públicas.

Limpieza permanente del área de los trabajos

El Contratista deberá mantener el área de los trabajos, campamentos, almacén, depósitos de materiales entre otros, permanentemente limpias y organizadas, evitando cualquier riesgo de accidentes, daños en personas, o al medio ambiente.

El contratista está obligado a mantener las Obras siempre limpias con sitios destinados para la recolección de basura (en forma reciclada), además de

efectuar continuos riegos para evitar emisión de partículas sólidas (polvo). El acopio de los materiales debe ser una forma ordenada sobre un área delimitada.

No se reconocerá pago alguno por esta labor, solo se reconocerá de acuerdo con la especificación técnica correspondiente, la limpieza final de obra.

Medida de la obra ejecutada

Con la frecuencia que se haya acordado con la interventoría, se medirán las cantidades de obra realizadas, aplicando los procedimientos y unidades de medida contemplado para cada ítem. Se medirán y pagarán exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras previamente aceptadas por la Interventoría técnica, ejecutadas de acuerdo con las instrucciones, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato. Nunca se medirán cantidades de obra en exceso de las autorizadas por la Interventoría.

Pago de la obra ejecutada

Los precios unitarios definidos para cada ítem, cubrirán los costos de todos los suministros y las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras especificadas, excepto aquellos costos correspondientes a las actividades que se indiquen explícitamente.

Los precios unitarios deberán incluir los costos requeridos para el suministro de materiales en el sitio de las obras, desperdicios, transporte, almacenamiento, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, aportes parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por los gobiernos nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, patentes, permisos, derechos, regalías, servidumbres, el cumplimiento de todas las disposiciones sobre seguridad, salubridad y ambiente, las construcción de caminos, canalizaciones y obras provisionales, así como todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de cada partida de pago,

incluyendo los imprevistos, los gastos de administración y la utilidad del contratista.

El pago por la obra ejecutada en cada partida de trabajo, se determinará multiplicando las cantidades aprobadas por su respectivo precio unitario, descontando de dicha suma los valores fijados en el contrato y las tasas, contribuciones e impuestos por las disposiciones legales vigentes.

Mantenimiento de Equipos

Solo se permitirá el mantenimiento de las máquinas en los lugares aprobados por la interventoría técnica al inicio de las obras, y solo se permitirá en las primeras 24 horas, transcurrido este tiempo el contratista deberá sacar el equipo de obra y remplazarlo inmediatamente para que no se incurra en atrasos importantes para la obra.

El sitio que se disponga para las reparaciones de las maquinas deberán tener señalización adecuada para indicar el camino de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados.

Abastecimiento de combustibles para los Equipos

El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo.

Planos Record, Manuales, Bitácora de obra, Dossier de construcción.

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la interventoría los planos récord, manuales, Dossier de construcción y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la

dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción.

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

Modificaciones.

Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al interventor; quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con la administración municipal. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas. El constructor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser aprobados por el Interventor.

Mano de obra.

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán por cuenta del contratista. Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. Cuando a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. El

personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, la administración se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para ello.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con La Administración Municipal y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.

Pruebas y Ensayos

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoría.

Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas.

Obras Mal Ejecutadas.

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones.

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoría le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

Varios.

El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría.

La reparación de daños, si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la Interventoría.

Tan pronto se terminen los trabajos correspondientes a las presente especificaciones técnicas y antes de que se efectue la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.

CONCRETOS

Se refiere a la construcción de todos los elementos contemplados en la obra. Comprende el suministro de materiales (mezcla de concreto más acero de refuerzo entre otros), equipo, transporte, preparación de formaletas, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Pórtland. El tipo de concreto que se permitirá mezclar en obra será el concreto de limpieza para el solado y el concreto específicamente indicado como preparado en obra, dentro de los ítems contractuales y detallado en las Especificaciones Técnicas. Las mezclas de concreto reforzado serán suministradas por una Central de Mezclas de reconocida idoneidad en la localidad, con el compromiso de que su suministro contenga los términos de

calidad certificada. En los casos en los que se indique concreto preparado en la obra, deberá ajustarse al cumplimiento de los requisitos que se tratan más adelante.

Materiales:

CEMENTO

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland tipo I, que cumpla con las especificaciones. El cemento deberá cumplir con lo estipulado en las normas ICONTEC NTC 121 y 321 y ASTM C-150. El cemento deberá almacenarse de tal forma que garantice una perfecta protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo; el cemento que se haya compactado o que haya sufrido deterioro por cualquier causa, o que haya expirado en su fecha de vencimiento, no podrá usarse en las estructuras de concreto de la obra.

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento empacado en bolsas rotas o parcialmente deterioradas, así no presente grumos al tacto.

No será permitido utilizar diferentes marcas de cemento en una misma fundida.

Se recomienda que en los diseños de mezcla se utilicen diferentes tipos de cemento (tanto a granel como en bolsa) y diferentes marcas, con el fin de poder tener datos para tomar decisiones objetivas en obra, en caso de tener que realizar un cambio forzado en ellos.

AGUA

El agua para el concreto, mortero o lechadas de cemento, deberá ser limpia y estar libre de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, limo, materias orgánicas, sulfatos de magnesio, sodio y calcio, y otras impurezas que, en opinión de la Administración Municipal y/o su representante, puedan afectar adversamente la resistencia, durabilidad y calidad del concreto. Los materiales tales como cemento, agua y aditivos, deberán cumplir con las normas NTC y los numerales aplicables del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

AGREGADOS

Los agregados gruesos y finos deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-C33 y cumplir con las normas ICONTEC NTC174. El agregado fino deberá tener arena limpia, de granos duros y libres de polvo, álcalis, ácidos, materia orgánica o cualquier otra sustancia nociva. El agregado grueso consistirá en fragmentos de roca duros, durables y limpios, libres de polvo, materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. No debe contener piedra o mica desintegrada ni cal libre.

El agregado grueso no deberá tener una pérdida mayor del 40% en el ensayo de abrasión en la máquina de los ángeles. El Contratista deberá solicitar la aprobación de La Administración Municipal y/o su representante, de las instalaciones para descargue y almacenamiento de los agregados. Lo anterior no exonera al Contratista de la obligación de controlar permanentemente la calidad de los materiales provenientes de las fuentes aprobadas para uso en la obra, debidamente licenciadas.

La arena y el agregado grueso deberán ser almacenados separadamente. Los depósitos o apilamientos de agregados deberán estar construidos o dispuestos de tal forma que no haya segregación de las partículas o presencia de materiales extraños. El contenido de humedad en la arena y el agregado grueso no deberá variar de forma apreciable y se controlará mediante adición de agua a los apilamientos. Se proveerá drenaje apropiado para asegurar distribución uniforme de la humedad en el momento de utilización de los agregados.

ARENA

El término arena designa el agregado fino con un tamaño máximo de partícula de 3/16". La arena deberá tener la gradación de la Tabla:

Gradación de la arena

TAMIZ	(%) PORCENTAJE QUE PASA
3/8”	100
No. 4	95 - 100
8	80 - 95
16	45 - 80
30	30 – 60
50	10 – 30
100	2 – 10

El porcentaje de carbón, pizarra y arcilla no será mayor del 1% en peso y el agregado fino debe presentar un máximo de 4-5% del porcentaje que pasa en peso el tamiz 200.

AGREGADO GRUESO

El término de agregado grueso designa al agregado de tamaño variable entre 3/16" y 1 1/2", bien gradados dentro de estos límites y consistentes en fragmentos de roca densos, durables y limpios.

El porcentaje de pizarra, carbón y materiales deleznables no será mayor del 1% en peso. El porcentaje en peso de sulfato ferroso no será mayor de 0,30% y la gravedad específica de cualquier muestra del agregado grueso no será menor de 2,60. El tamaño máximo del agregado grueso, aunque esté dentro de los límites fijados, no será mayor de la quinta parte del espesor mínimo del elemento de concreto, ni de las tres cuartas partes de la distancia mínima entre las varillas de refuerzo.

Para el agregado grueso se aplicará la gradación de la Tabla:

Gradación del agregado grueso

TAMIZ	(%)PORCENTAJE RETENIDO EN PESO
2 1/2"	0
2"	0 a 5
1"	30 a 65
3/8"	70 a 90
No. 4	95 a 100

TIPOS DE CONCRETO:

El Contratista suministrara las diferentes clases de concreto que se requieran, de acuerdo con lo especificado en la Tabla, además de cualquier otra mezcla que ordene la Administración Municipal y/o su representante.

Tamaño máximo de agregado para cada tipo de concreto:

RESISTENCIA DE DISEÑO A LOS 28 DÍAS – f'c		TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADOS		
Tipo	kg/cm2	psi	mm	Pulgadas
A	280	4.000	19	3/4
A1	250	3.500	19	3/4
B	210	3.000	19	3/4
C	210	3.000	38	1 1/2
D	175	2.500	38	1 1/2
E	140	2.000	38	1 1/2
F	105	1.500	38	1 1/2
G	Ciclópeo	305		12

Concreto ciclópeo: consiste en una mezcla de piedras grandes y concreto clase D, en proporción 60% de piedra - 40% de concreto y se usará donde lo indiquen los planos o lo ordene la interventoría técnica. Las piedras para este concreto deben ser de 15 a 30 cm, de calidad aprobada, sólida y libre de segregaciones, fracturas, grietas y otras imperfecciones. Las piedras deben estar exentas de superficies redondeadas o meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite o de cualquier otra impureza que pueda afectar su adherencia con el mortero. Las piedras se colocarán cuidadosamente, sin dejarlas caer o arrojarlas para evitar que se ocasionen daños a las formaletas o a la mampostería adyacente. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de un tercio del volumen total de la parte de la obra en que sean colocadas

ADITIVOS

El Contratista puede utilizar aditivos para el concreto según sea indicado en los planos y/o autorizado por la interventoría técnica, con el objeto de mejorar las condiciones o propiedades de la mezcla o dar celeridad a los procesos constructivos.

Los aditivos e impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades básicas, ni la resistencia especificada del concreto en el cual se empleen, ni deteriorar los elementos embebidos.

Los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar condiciones de impermeabilidad al concreto ya sea para conveniencia de la obra o del Contratista, deben ser previamente autorizados por La Administración Municipal y/o su representante. Para el efecto el Contratista debe presentarle, con suficiente antelación a su uso, muestras de los aditivos propuestos, así como las especificaciones del fabricante. No pueden utilizarse aditivos que contengan cloruro de calcio o iones de cloruro, en concreto pre-esforzado, en concreto que contenga elementos embebidos de aluminio o en concreto fundido utilizando formaletas permanentes galvanizadas.

El Contratista debe suministrar certificados sobre ensayos, en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia del concreto con edades hasta de un año, y con gamas de temperatura iniciales entre 10 y 32 grados centígrados. La aceptación previa de los aditivos no exime al Contratista de la responsabilidad que tiene de suministrar concretos con las calidades especificadas. Los ensayos suministrados no deberán exceder de 30 días de realizados (antes de permitir ser usados los aditivos en obra) y se deberá asegurar que son utilizados, mezclados con los agregados que realmente fueron verificados y aprobados por La Administración Municipal y/o su representante.

El costo de las operaciones de medida, mezcla y aplicación de los aditivos debe incluirse en el precio unitario del concreto.

Los aditivos deben ser manejados y almacenados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la Administración Municipal. y/o su representante.

Los aditivos deben cumplir con los requisitos de las siguientes normas:

Aditivos incorporadores de aire: Norma ASTM C 260.

Aditivos reductores de agua: Norma ASTM C 494 o ASTM C 1017.

Aditivos retardadores o acelerantes: Norma ASTMC 494 o ASTM C 1017.

Aditivos puzolánicos: Norma ASTM C 618.

Los aditivos no mencionados aquí y que sean aprobados por la Administración Municipal y/o su representante, deberán cumplir las normas ASTM correspondientes.

El uso de aditivos será aprobado por la Administración Municipal y/o su representante y su utilización estarán de acuerdo a los requerimientos de la obra sin afectar las condiciones de las estructuras.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO EN LOS SITIOS DE LAS OBRAS

Solo se autorizará por parte de La Administración Municipal S.A. y/o sus representantes en obra la preparación de concreto en obra para concretos solados y concreto para estructuras tales como andenes, rampas y escaleras sobre piso, el diseño de mezcla debe ser aprobado previamente con anterioridad; para los concretos estructurales se utilizarán concretos premezclados con sus respectivos certificados de calidad y con la resistencia especificada para la estructura a construir, a menos que en el ítem y/o en la especificación técnica se indique lo contrario.

El concreto que se prepare en los sitios de las obras se hará en mezcladoras de concreto del tipo de carga, accionadas mecánica, hidráulica o eléctricamente, garantizando un control estricto de las cantidades, determinadas por peso, de los distintos ingredientes que entran en la mezcla, así como su distribución homogénea en toda la masa, acordes con los diseños de mezcla aprobados previamente por la interventoría técnica.

El agua se añadirá antes, durante y después de la operación de mezclado y se dosificará por peso con un recipiente patronado. La consistencia del concreto deberá ser uniforme en cada mezclada y entre mezcladas distintas. La cantidad de agua mezclada será la suficiente y mínima (según el diseño de mezcla) para asegurar una buena consistencia a la mezcla y compensar cualquier variación en el contenido natural de humedad de los agregados. No se admitirá ninguna adición de agua para ablandar una mezcla que haya salido de la mezcladora.

El concreto se mezclará en las cantidades que se necesiten para su uso inmediato. No se permitirá el uso de ningún concreto en que se haya iniciado el fraguado o que haya estado mezclado por más de 30 minutos antes de colocarlo. Cualquier mezcladora que en algún momento deje de producir resultados satisfactorios, deberá repararse o cambiarse de manera inmediata.

Sólo podrá mezclarse concreto a mano con la previa autorización de la interventoría técnica. La mezcla que se prepare deberá ser utilizada en su totalidad antes de preparar otra tanda.

EQUIPO

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la construcción de estructuras con dicho material, son los siguientes:

Elementos de transporte: La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto deberá contar con la aprobación del Interventor. Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por el Constructor y se da bajo la condición de que el uso del sistema de conducción o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la segregación de la mezcla exceden los límites especificados.

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300m), no se podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Interventor. Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores a seiscientos metros (600 M), el transporte se deberá efectuar en camiones mezcladores.

Elementos para la colocación del concreto

El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo.

Vibradores

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y deberán operar a una frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales.

Para fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente diseñadas para resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos de formaleta.

Equipos Varios

El Constructor deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc.

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión promedio lo suficientemente elevada, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

La aprobación que dé el Interventor al diseño de la mezcla no implica necesariamente la aceptación posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni exime al Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las Ítems y los planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión mínima especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que será comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras

La colocación no podrá comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este método no es obligatorio.

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocación de la mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el concreto fresco.

CURADO

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el Interventor, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar.

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período no menor de catorce (14) días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto; en algunas estructuras no masivas, este período podrá ser disminuido, pero en ningún caso será menor de siete (7) días.

CURADO CON AGUA

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, cubriéndolo con tejidos de fique o algodón saturados de agua, o por medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados.

No se permitirá el humedecimiento periódico; este debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

CURADO CON COMPUESTOS SELLANTES

Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el Interventor lo autorice, previa aprobación de este sobre los compuestos a utilizar y sus sistemas de aplicación.

El equipo y métodos de aplicación del compuesto sellante deberán corresponder a las recomendaciones del fabricante, esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal manera que se obtenga una membrana impermeable, fuerte y continua que garantice la retención del agua, evitando su evaporación. El compuesto sellante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-309 para compuestos líquidos del tipo 2, y deberá ser de consistencia y calidad uniformes.

Por cada diez metros cúbicos (10m3) o fracción colocada en una jornada de trabajo, se tomará una muestra compuesta por cuatro (4) especímenes, con

los cuales se fabricarán probetas cilíndricas según la norma, para ensayos de resistencia a compresión, de las cuales se fallarán dos (2) a siete (7) días y dos (2) a veintiocho (28) días, luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete (7) días sólo se emplearán para verificar la regularidad de la calidad de la producción del concreto, mientras que los obtenidos a veintiocho (28) días se emplearán para la comprobación de la resistencia del concreto.

El promedio de resistencia de los dos (2) especímenes tomados simultáneamente de la misma mezcla, se considera como el resultado de un ensayo. La resistencia del concreto será considerada satisfactoria, si ningún ensayo individual presenta una resistencia inferior en más de treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (35 kg/cm2 o su equivalente en psi) de la resistencia especificada y, simultáneamente, el promedio de tres ensayos consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de diseño especificada en los planos.

Si alguna o las dos (2) exigencias recién indicadas son incumplidas, el Interventor ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en duda, utilizando métodos idóneos para detectar las zonas más débiles y requerirá que el Constructor, a su costa, tome núcleos de dichas zonas, en acuerdo a la norma.

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada resultado de ensayo inconforme. Si el concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secarán al aire durante siete (7) días a una temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16ºC - 27ºC) y luego se probarán secos. Si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua por cuarenta y ocho (48) horas y se fallarán a continuación.

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres (3) núcleos, corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento

(85%) de la resistencia especificada en los planos, siempre que ningún núcleo tenga menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia.

FORMALETAS

El Contratista suministrará e instalará todas las formaletas en donde sea necesario confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, para dar la forma y dimensiones requeridas.

Las formaletas para concretos que queden a la vista tendrán acabado liso y uniforme. Con anticipación al inicio de su fabricación, el Contratista deberá presentar a la interventoría para su aprobación, el diseño de todas las formaletas, así como su sistema de fabricación, soporte y manejo, indicando los materiales que se propone utilizar y las especificaciones correspondientes. La aprobación por parte de la Administración Municipal y/o su representante no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones.

Las formaletas deberán ser lo suficientemente fuertes y rígidas para soportar todas las cargas a resistir, incluyendo las cargas producidas por la colocación y el vibrado de la mezcla. Además, deberán permanecer rígidas en sus posiciones iniciales hasta cuando la mezcla de concreto se haya endurecido lo suficiente, para sostenerse por sí misma.

Todas las formaletas deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas de lechadas de la mezcla y deberán diseñarse de tal manera que permitan la colocación y compactación adecuada de la mezcla en su posición final, su fácil inspección, revisión y limpieza.

No se permitirán remiendos ni reparaciones con pedazos de madera o láminas que modifiquen la conformación de las formaletas. Las superficies de concreto en proceso de curado deberán conservarse húmedas por métodos aprobados por la interventoría técnica, por lo menos, durante siete (7) días después de su colocación. El agua usada para el curado deberá llenar los requisitos de estas especificaciones, referentes al agua para mezclas de concreto.

El Contratista será el responsable del cálculo e instalación de la estructura de soporte de la formaleta para que ésta resista adecuadamente las cargas del peso del concreto hasta el fraguado del mismo, y garantice la seguridad del personal de obra civil que participe en la fundida, colocación, vibrado y curado del hormigón y el posterior retiro de la cimbra de apoyo de los tableros de la formaleta.

Los materiales de la estructura de soporte deben ser de excelente calidad, libres de defectos, dobleces, hendiduras, rebabas, nudos, corrosión etc., que puedan producir colapsos.

Los apoyos de parales, gatos, codales, puntales, etc., en sus extremos, deben ser rígidos y bien adheridos. No se permitirá utilizar pedazos de madera como suplemento para lograr niveles.

El contratista debe seguir los procedimientos dados en el capítulo C.6 de la NSR-10 para la remoción de formaletas y soportes.

ACABADOS

A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberán ser lisas, sólidas, suaves y estar libres de escamas, depresiones, huecos, manchas y cualquier otro defecto o irregularidad, y deberán así mismo cumplir con todos los requisitos establecidos para el acabado correspondiente especificado, o indicado en los planos. Los acabados de las superficies de concreto deberán ser ejecutados por personal especializado en este trabajo. A menos que los planos o los documentos técnicas o la interventoría técnica, indique algo diferente, todas las superficies expuestas a la lluvia o al agua, y que en los planos se muestran como horizontales, deberán tener pendientes de aproximadamente medio centímetro por cada metro (0.5 cm/m). Las superficies extensas deberán tener pendientes en más de una dirección con el fin de facilitar la escorrentía, según lo determine la interventoría técnica.

ACERO

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, este ítem y las instrucciones del Interventor. De ninguna manera se permitirá instalar en predios de la obra, talleres de corte y figuración del acero de refuerzo. Todo el acero de refuerzo será cortado y figurado en un taller externo a los predios de la obra.

El Contratista será el único responsable por la calidad de dicho suministro y tendrá a su cargo el control para que se cumplan en lo pertinente, las siguientes Ítems.

MATERIALES

Barras de refuerzo. Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca en los planos del proyecto: ICONTEC 161, 245 y 248; AASHTO M-31 y ASTM A-706.

EQUIPO

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo.

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su posición, así como herramientas menores.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Planos y despiece

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista para la aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, el Contratista deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta.

Si el Contratista desea relocalizar una junta de construcción en cualquier parte de una estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de refuerzo y listas de despiece, y dicha relocalización es aprobada por el Interventor, el Contratista deberá revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a la junta propuesta, y someter las modificaciones respectivas a aprobación del Interventor, cuando menos treinta (30) días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento del refuerzo para dicha parte de la obra. Si, por cualquier razón, el Contratista no cumple este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin modificación alguna, según se muestre en los planos suministrados por el Interventor.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada correspondiente.

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.

DOBLAMIENTO

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el Interventor.

COLOCACIÓN Y AMARRE

Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero.

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera.

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos menores de treinta centímetros (30cm), en el cual se amarrarán alternadamente.

El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 0.0625 o 0.00800 pulgadas (1.5875 o 2.032 mm), o calibre equivalente. No se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo.

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25mm), ni menor de una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas superiores deberán colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros (25 mm).

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras.

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación.

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto.

TRASLAPOS Y UNIONES

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto.

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras adyacentes queden alternados según lo exija este, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor.

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del concreto.

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Constructor.

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán

asegurar en los extremos y bordes. El traslapo de borde deberá ser, como mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho.

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS

CALIDAD DEL ACERO

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM correspondientes.

El Contratista deberá suministrar al Interventor una copia certificada de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra. En caso de que el Contratista no cumpla este requisito, el Interventor ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización.

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en las normas colombianas para tal fin

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán rechazadas.

CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo:

Desviación en el espesor de recubrimiento:

Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros	($\leq$ 5cm)	0.5cm
Con recubrimiento superior a cinco centímetros	($>$ 5cm)	1.0cm

AREA

No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los de diseño.

Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de este ítem, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de este.

Para la construcción de la estructura metálica para cubiertas se debe tener en cuenta, las especificaciones del diseño y utilización las estructuras deben estar fabricadas en perfiles angulares en celosía o en perfiles de alma llena.

SUSTITUCIONES

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con autorización del Interventor. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño.

ELEMENTOS METÁLICOS

REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

El alcance del trabajo será a partir de las características técnicas básicas entregadas por el Municipio. Para el diseño, suministro, fabricación y montaje de una estructura metálica (en caso de que el alcance del contrato incluya el diseño de la misma) el proveedor debe cumplir con:

Ejecución del diseño con la correspondiente memoria de cálculo, revisada y aprobada por un ingeniero calculista con matrícula profesional vigente, por parte del proveedor.

En los planos se debe incluir la información completa respecto a la localización, tipo, tamaño y extensión de todas las juntas soldadas. Estos planos distinguirán claramente entre las soldaduras de taller y las de montaje.

En los planos se deben mostrar aquellas juntas o grupo de juntas en las cuales sea especialmente importante controlar la secuencia y técnica de soldadura para minimizar los esfuerzos de deformación y distorsión.

Es importante además que los planos señalen las juntas de penetración parcial o completa indicando los requerimientos propios de la soldadura. Para

ello se debe tener en cuenta la utilización de los símbolos de soldadura establecidos por AWS A2.4.

El proveedor suministrará la mano de obra, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance y detalle de los planos, normas, y especificaciones técnicas enumeradas en el presente manual.

Cuando por falta de disponibilidad comercial no sea posible la consecución de un material o equipo, el proveedor deberá someter a aprobación del municipio un material o equipo de similares o mejores características técnicas adjuntando copia de la especificación respectiva o de catálogo para comprobar que sí cumple con los requerimientos mínimos exigidos.

Todos los materiales suministrados por el proveedor, serán completamente nuevos, de primera calidad, libres de imperfecciones y ajustados a las normas y especificaciones técnicas requeridas. Los materiales suministrados deben ser productos normalizados de fabricantes ya establecidos que hayan producido en forma continua esa clase de materiales.

Todos los materiales suministrados deben tener los Certificados de materiales emitidos por el fabricante en donde se pueda verificar la clase, grado, composición química y demás características físicas y mecánicas.

El proveedor debe tener por escrito los procedimientos de fabricación más importantes que vaya a utilizar durante dicha fabricación o en el montaje. Estos procedimientos describirán de manera clara las secuencias necesarias para completar una o varias operaciones. El municipio se reserva el derecho de solicitar y revisar dichos procedimientos y de hacer observaciones sobre los mismos, las cuales el proveedor deberá tener en cuenta.

El proveedor debe presentar por escrito los procedimientos de soldadura a emplear en la fabricación o el montaje; dichos procedimientos deben estar debidamente calificados; es decir la Especificación del Procedimiento (BPS) deberá estar demostrada por la Calificación (PAR) soportada por las pruebas

mecánicas avaladas por un laboratorio de pruebas, suficientemente reconocido por las normas nacionales.

Cuando se disponga de un procedimiento con juntas precalificadas de acuerdo con el código ABS, el proveedor debe presentar la Especificación del Procedimiento (BPS) indicando en el mismo que se utilizarán juntas precalificadas.

Los soldadores que participen de la fabricación deberán estar calificados de acuerdo con el código ABS debiendo el proveedor presentar los Certificados de calificación con fecha reciente antes del inicio de los trabajos. En caso de no estar calificados los soldadores, el proveedor debe programar dicha calificación antes del inicio de los trabajos de soldadura.

El proveedor deberá garantizar durante el tiempo de fabricación y montaje que los trabajos realizados se efectúan de acuerdo con los códigos y especificaciones requeridas.

La superficie del metal base (ángulos, perfiles, láminas) deberá ser uniforme y estar libre de óxidos, pintura, calamina, grietas, y cualquier otra discontinuidad que pueda afectar la calidad de las soldaduras.

Las partes o elementos a ser juntados por soldadura de filete deberán estar ensamblados en contacto tanto como sea posible, con las tolerancias descritas en el Código AWS.

Los puntos de soldadura utilizados para el ensamble de las piezas, tendrán los mismos requerimientos de calidad de las soldaduras finales.

El perfil de los filetes de soldadura deberá ser ligeramente convexo, plano o ligeramente cóncavo y no se aceptan perfiles irregulares tal como los no aceptados por el Código AWS. Las dimensiones de los filetes de soldadura serán las establecidas por los planos de fabricación o montaje con las tolerancias que incluye el Código AWS.

Las dimensiones (longitud, diámetro de huecos, rectitud, deformaciones, etc.) de los elementos de la estructura soldada deberán estar conformes con las

dimensiones de los planos dentro de las tolerancias que contemplan las especificaciones y el Código AWS.

Las soldaduras terminadas tanto de juntas de filete como de juntas a tope deberán estar libres de grietas, escorias, socavados, poros y cualquier discontinuidad que afecte la resistencia de la soldadura; solamente se aceptan las discontinuidades y tolerancias establecidas por el Código AWS.

La utilización de métodos de fabricación adecuados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las recomendaciones de los fabricantes deberán garantizar la sanidad de las soldaduras.

El proveedor deberá demostrar por medio de Ensayos No Destructivos la sanidad de las soldaduras. El municipio se reserva el derecho de solicitar y presenciar la ejecución de las pruebas en la extensión y cantidad establecidas por el Código AWS tanto en juntas de filete como en juntas a tope.

Si el resultado de los Ensayos No Destructivos muestra soldaduras defectuosas, el contratista deberá remover esas soldaduras y realizar la comprobación de la sanidad utilizando nuevas pruebas.

La inspección y pruebas durante la fabricación y el montaje son responsabilidad del proveedor, a menos que el municipio especifique lo contrario en el contrato. Todas las partes o juntas inspeccionadas y aceptadas deberán ser identificadas con una marca o cualquier otro método previamente establecido.

En la inspección de soldaduras en filete se aplicarán END para detectar discontinuidades superficiales tales como Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas las cuales se ejecutarán e interpretarán de acuerdo con lo establecido por el Código AWS.

En la inspección de soldaduras a tope se utilizarán ensayos como Radiografía o Ultrasonido los cuales se ejecutarán e interpretarán de acuerdo con lo establecido por el Código AWS.

Las juntas soldadas que requieran ser inspeccionadas por especificación, deberán ser aprobadas por muestreo, a menos que se especifique inspección total.

El municipio establecerá en la especificación o de acuerdo con el Código AWS el número de muestreos (spots) en cada categoría de juntas de soldadura que deberán ser probados. Cada muestreo (spot) deberá cubrir al menos 100 mm (4”) de la longitud de la soldadura.

Cuando el muestreo revele discontinuidades que son rechazadas por el código la extensión del muestreo debe ser ampliada. Se tomarán dos muestreos adicionales en el mismo segmento de soldadura lejos del sitio del muestreo original. La localización de los muestreos adicionales será establecida por el municipio

Cuando cualesquiera de los dos muestreos adicionales muestren defectos que deban ser reparados, el segmento completo de la soldadura deberá ser probado en toda su longitud.

El proveedor deberá preparar las superficies metálicas de las piezas, quedando libres de humedad, polvo, grasa, agentes químicos o cualquier otro material contaminante, antes de la aplicación de la pintura de protección.

Cuando esté especificado, la superficie metálica se limpiará mediante chorro de arena hasta obtener el grado de limpieza de acuerdo con la norma SSPC-SP10. El municipio se reserva el derecho de verificar el grado de limpieza de las superficies.

Efectuada la limpieza y de acuerdo con la especificación se aplicarán las pinturas de base (anticorrosivo) y acabado con los espesores mínimos de película especificados.

Cualquier aprobación dada por el municipio no libera al fabricante de su responsabilidad principal y única en lo concerniente al diseño, fabricación o montaje.

PINTURA

El acabado para las superficies metálicas será el indicado en las especificaciones técnicas del ítem correspondiente y siguiendo la normativa vigente.

MONTAJE

Antes de iniciar el montaje de las estructuras metálicas, deberán verificarse todos los ejes de la referencia y los niveles de muros, vigas y columnas de apoyos para corroborar que están de acuerdo con los planos.

Las estructuras que se van a montar en la edificación se irán armando en el orden conveniente colocándolas a plomo y en las posiciones requeridas, según los planos y soportándolas temporalmente por medio de puntales y diagonales hasta cuando la construcción pueda sostenerse por si misma sin peligro de colapsar o producir accidentes al personal.

No deberán remacharse o soldarse definitivamente las uniones de las armaduras sino hasta cuando se compruebe su posición perfecta dentro del sistema y que forme un tramo completo. Las armaduras que vayan apoyadas sobre soportes de concreto se pondrán a su nivel correcto por medio de cuñas de acero y platinas provisionales y el concreto de lechada se colocará solamente cuando estén aseguradas todas las otras armaduras que tienen relaciones con ellas.

INSPECCIÓN DEL MONTAJE

El contratista deberá prestar colaboración completa y sin restricciones al interventor, para practicar las inspecciones consecutivas de la obra durante el montaje y suministrar el personal, las herramientas y andamiajes que se le soliciten sin que estos servicios impliquen mayor costo en el valor del contrato.

TOLERANCIA EN EL MONTAJE

En el montaje de estructuras de acero, en la posición individual de las piezas se admite una diferencia máxima equivalente a 1.500 entre las medidas del plano y las tomadas en el terreno tanto para el plomo como para las otras posiciones, por ejemplo: si una correa tiene 8.00 metros de longitud entre

apoyos se tolera una deflexión de: 800/600 La posición de las estructuras que deben quedar a plomo se rectificará por medio de plomadas en los nudos principales de la armadura de tal manera que se obtenga un plano vertical el cual puede referirse la posición de los elementos de la estructura. Cada elemento deberá tener la apreciación de 2 mm en su posición según lo estipulado.

1 PRELIMINARES.

1.1 DESMONTES

1.1.1 Desmonte de cubierta lámina de asbesto cemento y estructura existente, incluye cargue y retiro.

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta en asbesto cemento previamente indicada en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se incluye la disposición final del material retirado.

El procedimiento para retirar la cubierta consiste en la observación del área a intervenir, el retiro de las tejas quitando previamente estructura, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura y seguir las indicaciones del interventor para su retiro y disposición final.

MATERIALES:

- Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8"

MEDIDA Y PAGO:

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cubierta, el valor incluye el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo necesario, cargue, retiro y disposición final de la cubierta desmontada, así como todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad.

1.1.2 Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro.

DESCRIPCION:

Esta actividad se refiere al desmonte de cielo raso de cualquier tipo y material, existente en proyecto. Este desmonte incluye la estructura de soporte de las láminas de cielo raso con cortadora de disco abrasivo con corte de metal de 7” x 1/8”. Dicha actividad deberá contar con la autorización de la interventoría para su posterior ejecución. Esta autorización no eximirá al contratista de la responsabilidad de ejecutar la actividad en su totalidad y en los tiempos indicados.

MATERIALES:

- Disco abrasivo de corte metal 7"x1/8”

MEDIDA Y PAGO:

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cielo raso con estructura de soporte desmontado del lugar donde está actualmente instalado y retirado al lugar final de disposición, el valor incluye el costo de la mano de obra, equipos, el cargue, el retiro de los materiales desmontados, así como todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad.

Todo desmonte que no esté contemplado en las actividades del proyecto o que se vea afectado por equivocación en la ejecución de los trabajos será repuesto y el valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista.

2 CUBIERTAS Y CANALES

2.1 CUBIERTAS

2.1.1 Cubierta en panel doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super Poliéster. Ancho Útil 500mm. Calibre 26 (0,45mm) y 28 (0,35mm). Color Blanco, Incluye accersorios de intalación y estructura metálica de soporte.

DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de doble tendido tipo sandwich metálica sin traslapo, elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero aluminizado, prepintada en acería con resinas de poliéster estándar y/o Acero galvanizado, prepintanda en acería en resinas de super Poliéster. Ancho Útil 500mm. Calibre 26 (0,45mm) y 28 (0,35mm). Color Blanco, Incluye accersorios de intalación y estructura metálica de soporte

La instalación de las tejas deberá realizarse sobre correas metálicas según las indicaciones de los planos de diseño estructural, respetando las pendientes indicadas en los planos de diseño arquitectónico.

La instalación de los paneles de cubierta se deberá iniciar en el lado opuesto al viento predominante con una hilera de tornillos alineados con hilo, asegurando la perpendicularidad del Panel con relación a la canal de aguas lluvias o borde de la cubierta y a las correas metálicas.

MATERIALES:

- Cub. Deska ss panel prep. Blanco 500MM 1.5 ^ C-26-28 Aisl. P.U.R (38.1mm)
- Remate fachada U prep. Blanco D=0.14 mt C-26
- Remate c vol. Panel prep. Blanco D=0.20 mt C-26
- Remate especial prep. Blanco D=0.20 – 0.29 mt C-26
- Clips Z 1.1/2 *
- Tornillo 10x3/4 Pb cabeza redonda
- Clips J 2.1/2*
- Tornillo cabeza lenteja 8x1/2 P.A
- Tornillo autoperf. Fij techo 12x3/4 P.B
- Tornillo autoperf. Fij Ala 14x 7/8 P.B
- Tubo estructural rectangular 76x 38 1.5mm

MEDIDA Y PAGO:

Se pagará por metro cuadrado (M2) de cubierta instalada de acuerdo con las especificaciones, planos y detalles de diseño e indicaciones de la interventoría. El valor de este ítem incluye el suministro, colocación de los materiales, la mano de obra, las herramientas y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría para ejecutar debidamente este trabajo.

3 ASEO Y LIMPIEZA

3.1.1 Aseo y limpieza.

DESCRIPCIÓN:

Esta actividad se refiere al aseo y limpieza final de toda el área intervenida para adelantar el proyecto en su totalidad.

MATERIALES:

- Elementos de aseo y limpieza

MEDIDA Y PAGO:

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de área aseada y limpiada a un grado satisfactorio aprobado y aceptado por la Interventoría.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra necesarios para el lavado de las áreas que así lo requieran, así como del barrido de las áreas pavimentadas, la limpieza de los equipos instalados, de las superficies adoquinadas y demarcadas, el desmontaje de las últimas instalaciones provisionales de obra, retiro de elementos y sobrantes, recuperación de las áreas ocupadas temporalmente por la administración de la obra, retiro de maleza y objetos extraños en las áreas empradizadas, en fin, de un aseo nítido y de una limpieza cabal de todas las áreas intervenidas del proyecto.

Se incluirán también en el precio, todos los costos de los utensilios y herramienta menor, así como el retiro definitivo de la obra de todos los sobrantes anteriormente mencionados. De no efectuarse una limpieza a grado cabal, no se podrá adelantar la liquidación final de la obra.
