FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 2 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

FECHA	DIA	22	MES	4	AÑO	2023

SEMANA N°	2	DEL	lunes, 17 de abril de 2023	AL	sábado, 22 de abril de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANA No.2

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	PORCENTAJE CONTRACTUAL GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 2
1. TOMA DE NIVELES Y LOCALIZACION DE PUNTOS PARA MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	70,00%	100,00%
2. COLOCACION DE HILOS DE NIVEL Y PERFORACIONES PARA INSTALACION DE MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	30,00%	100,00%
3. INSTALACION DE MENSUALAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	30,00%	100,00%
4. INSTALACION DE TUBERIA PERIMETRAL DE HANGAR CON ACCESORIOS PERTINENTES.	100,00%	15,00%	100,00%
5. LOCALIZACION DE PUNTOS PARA INSTALACION DE BAJANTES.	100,00%	0,00%	60,00%
6. INSTALACION DE TUBERIA DE BAJANTES CON ACCESORIOS EN LOS PUNTOS LOCALIZADOS PREVIAMENTE.	100,00%	0,00%	0,00%
7. INSTALACION Y CONEXIÓN DE TUBERIA PARA COMPRESOR.	100,00%	0,00%	0,00%
8. PRUEBAS DE PRESION EN TUBERIA INSTALADA.	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO		15,00%	35,00%

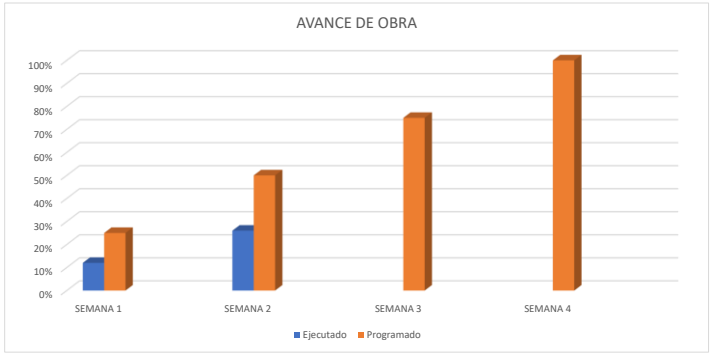

SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Ejecutado	12%	26%		
Programado	25%	50%	75%	100%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Ingenieros	1	AYUDANTE	3
Oficial	1		
SISO	1		

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: TIEMPO COMPLETO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	17/04/2023	Soleado	Soleado	
	18/04/2023	Soleado	Soleado	
	19/04/2023	Soleado	Soleado	N/A
	20/04/2023	Soleado	Soleado	
	21/04/2023	Soleado	Soleado	
	22/04/2023	Soleado	Soleado	

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de andamio para dar inicio de actividades en Hangar 1
Se realiza actividad de localizacion de puntos para instalacion de soportes en Hangar 1, Modulos 1,2,3 y 4.
Se realiza actividad de toma de niveles para instalacion de soportes en Hangar 1.
Se realiza actividad de instalacion completa de tuberia perimetral en los Modulos 1,2,3 y 4 del Hangar 2.
Se realiza actividad de instalacion de tuberia perimetral en Modulo 1 y 2 de Hangar 1.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 2 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

SEMANA N°	2	DEL	lunes, 17 de abril de 2023	AL	sábado, 22 de abril de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 1: Instalacion de tuberia perimetral en Modulos 1, 2, 3 y 4 de Hangar 2.



. Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 2: Instalacion de tuberia perimetral en Modulos 1, 2, 3 y 4 de Hangar 2



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 3: Instalacion de tuberia perimetral en Modulos 1, 2, 3 y 4 de Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 4: Armado e instalacion de bajantes para puntos en Modulo 4 de Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 5: Armado e instalacion de bajantes para puntos en Modulo 4 de Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 6: Toma de niveles y lo calizacion de puntos para soportes de tuberia en Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 7: Toma de niveles y lo calizacion de puntos para soportes de tuberia en Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 8: Perforaciones para soportes de tuberia en Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 9: Instalacion de soportes de tuberia en Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 10: Instalacion de tuberia perimentral en Hangar 2.
