FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 4 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

FECHA	DIA	7	MES	5	AÑO	2023

SEMANA N°	4	DEL	lunes, 1 de mayo de 2023	AL	domingo, 7 de mayo de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANA No.4

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	PORCENTAJE CONTRACTUAL GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 2
1. TOMA DE NIVELES Y LOCALIZACION DE PUNTOS PARA MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
2. COLOCACION DE HILOS DE NIVEL Y PERFORACIONES PARA INSTALACION DE MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
3. INSTALACION DE MENSUALAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
4. INSTALACION DE TUBERIA PERIMETRAL DE HANGAR CON ACCESORIOS PERTINENTES.	100,00%	100,00%	100,00%
5. LOCALIZACION DE PUNTOS PARA INSTALACION DE BAJANTES.	100,00%	60,00%	100,00%
6. INSTALACION DE TUBERIA DE BAJANTES CON ACCESORIOS EN LOS PUNTOS LOCALIZADOS PREVIAMENTE.	100,00%	40,00%	80,00%
7. INSTALACION Y CONEXIÓN DE TUBERIA PARA COMPRESOR.	100,00%	100,00%	100,00%
8. PRUEBAS DE PRESION EN TUBERIA INSTALADA.	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO		60,00%	90,00%

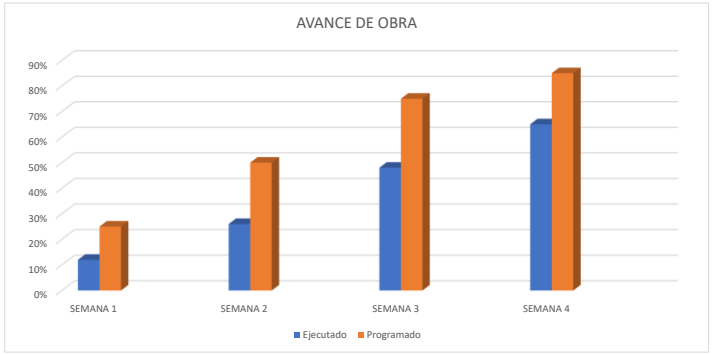

SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Ejecutado	12%	26%	48%	65%
Programado	25%	50%	75%	85%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Ingenieros	1	AYUDANTE	3
Oficial	1		
SISO	1		

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	1/05/2023	Soleado	Soleado	
	2/05/2023	Soleado	Soleado	
	3/05/2023	Soleado	Soleado	N/A
	4/05/2023	Soleado	Soleado	
	5/05/2023	Soleado	Soleado	
	6/05/2023	Soleado	Soleado	
	7/05/2023	Soleado	Soleado	

TIEMPO COMPLETO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza actividad de instalacion de tuberia perimetral para anillo correspondiente en Hangar 1.
Se realiza conexión de tuberia para compresor en Hangar 1 y Hangar 2.
Se realiza localizacion de puntos para bajantes en cubiculos de Hangar 1.
Se realiza instalacion de tuberia con respectivos accesorios para puntos de bajantes en cubiculos de Hangar 1.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 4 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

SEMANA N°	4	DEL	lunes, 1 de mayo de 2023	AL	domingo, 7 de mayo de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 1: Instalacion de tuberia perimetral para anillo Hangar 1.




. Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 2: Instalacion de tuberia perimetral para anillo Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 3: Instalacion de tuberia perimetral para anillo Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 4: Instalacion de tuberia perimetral para anillo Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 5: Instalacion de tuberia y accesorios de conexión a compresor en Hangar 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 6: Instalacion de tuberia y accesorios de conexión a compresor en Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 7: Instalacion de tuberia y accesorios de bajantes para puntos en Hangar 1.




Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 8: Instalacion de tuberia y accesorios de bajantes para puntos en Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 9: Instalacion de tuberia y accesorios de bajantes para puntos en Hangar 1.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 10: Instalacion de tuberia y accesorios de bajantes para puntos en Hangar 1.
