FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 6 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

FECHA	DIA	17	MES	8	AÑO	2023

SEMANA N°	6	DEL	martes, 15 de agosto de 2023	AL	viernes, 18 de agosto de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANA No.4

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	PORCENTAJE CONTRACTUAL GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HANGAR 2
1. TOMA DE NIVELES Y LOCALIZACION DE PUNTOS PARA MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
2. COLOCACION DE HILOS DE NIVEL Y PERFORACIONES PARA INSTALACION DE MENSULAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
3. INSTALACION DE MENSUALAS O SOPORTES DE TUBERIA.	100,00%	100,00%	100,00%
4. INSTALACION DE TUBERIA PERIMETRAL DE HANGAR CON ACCESORIOS PERTINENTES.	100,00%	100,00%	100,00%
5. LOCALIZACION DE PUNTOS PARA INSTALACION DE BAJANTES.	100,00%	100,00%	100,00%
6. INSTALACION DE TUBERIA DE BAJANTES CON ACCESORIOS EN LOS PUNTOS LOCALIZADOS PREVIAMENTE.	100,00%	100,00%	100,00%
7. INSTALACION Y CONEXIÓN DE TUBERIA PARA COMPRESOR.	100,00%	100,00%	100,00%
8. PRUEBAS DE PRESION EN TUBERIA INSTALADA.	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL PROYECTO		100,00%	100,00%

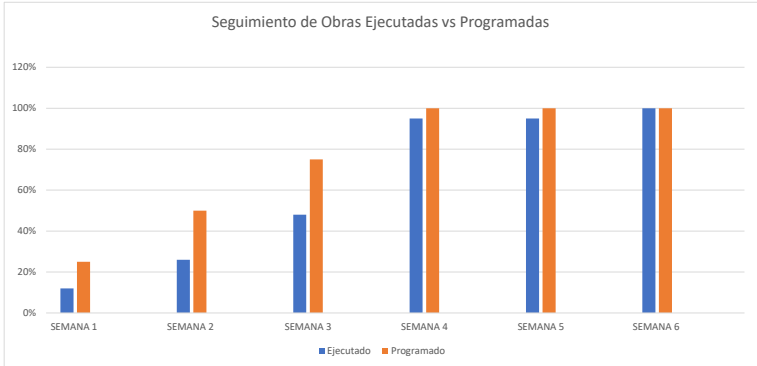

SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Ejecutado	12%	26%	48%	95%	95%	100%
Programado	25%	50%	75%	100%	100%	100%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Ingenieros	1	AYUDANTE	1
Oficial	1		
SISO	1		

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	15/08/2023	Soleado	Soleado	
	16/08/2023	Soleado	Soleado	
	17/08/2023	Soleado	Soleado	N/A
	18/08/2023	Soleado	Soleado	

TIEMPO COMPLETO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza actividad de pruebas de presion en tuberias perimetrales y bajantes en Hangar 1 y 2.
Se realiza actividad de capacitaciones y charlas operacionales a trabajadores y personal del batallon acerca del correcto uso y manejo de compresores instalados en Hngar 1 y 2.
Se realiza actividad de instalacion de accesorios pendientes como pistolas y carretes en Hangar 1 y 2.
Se realiza prueba de presion de accesorios instalados.
Se realiza actividad de cambios de breaker y y totalizadores en Hangar 1 y 2, actividad no prevista, pero ejecutada por parte del contratista con el fin de dar cumplimiento a fechas contractuales.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 6 ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8

SEMANA N°	6	DEL	martes, 15 de agosto de 2023	AL	viernes, 18 de agosto de 2023

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022 cuyo objeto es LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA - A EJECUTAR EN EL LA VIGENCIA 2022				
INTERVENTOR	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT O C.C.	901389503-1	CONTRATO N°	233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.544.043 - 1	CONTRATO N°	230-COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 1: Pruebas de presion en Hangares 1 y 2.



. Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 2: Pruebas de presion en Hangares 1 y 2.




Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 3: Instalacion y cambio de accesorios en tuberia perimetral para sub sanar fugas encontradas.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 4: Instalacion de accesorios (Pistolas) en Hangares 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 5: Instalacion de accesorios (Carretes) con respectivos soportes en Hangares 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 6: Instalacion de accesorios (Carretes) con respectivos soportes en Hangares 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 7: Capacitaciones tecnicas y charlas opracionales de uso de Compresor en Hangares 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 8: Capacitaciones tecnicas y charlas opracionales de uso de Compresor en Hangares 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 9: Cambio de breaker y totalizadores para puesta en marcha de compresor en Hangar 1 y 2.



Ubicación: Distraccion, La Guajira.

FOTO 10: Cambio de breaker y totalizadores para puesta en marcha de compresor en Hangar 1 y 2.
