CODIGO TRD: 232				
ACTA No. INTV-COMCEL-0102	**LUGAR:** Virtual/TEAMS	**FECHA:** 19 de abril 2022	**HORA DE INICIO:** 10:30 a.m.	**HORA FINAL:** 12:30 pm.

OBJETO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a compromisos
2. Avance Estudios de Campo Grupo 3
3. Avance instalación y puesta en servicio Grupo 2
4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los CD que se encuentran en Fase de Operación 1A y 1B
5. Estado de PQRSD.
6. Estado de los Aspectos Financieros.
7. Varios

---

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	En proceso MinTIC.
2	Remitir el inventario con ID beneficiario y seriales del Grupo 1A, Grupo 1B y Grupo 2. Compromiso permanente.	En proceso Se acordó el nuevo formato – Compromiso de entrega para el 30 de abril de 2022.
3	Radicar alcance a la transferencia de bienes con los ajustes correspondientes	Pendiente La fiduciaria envió respuesta y solicitud a observaciones sin gestión por parte de COMCEL
4	Seguimiento de avance de modificación contrato de Aporte 1042 (Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic)	En proceso. Aún no hay retroalimentación de Mintic
5	Respuesta observaciones legalización 7	Culminado 13/04/2022
6	Radicar legalización de recursos a diciembre de 2021 y de enero y febrero de 2022	En proceso Radicaron legalización 8 pendiente respuesta observaciones anteriores
7	Realizar mesa de trabajo para la revisión de la medición de indicadores	Culminado Se realizó mesa de trabajo el día 7 de abril de 2022.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría y la presentación realizada por el contratista ejecutor (COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A), hará parte integral de la presente acta.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

El contratista reporta con corte al 13 de abril de 2022 el avance de los Estudios de Campo:

ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	2419
Rechazados	512
En revisión Interventoría	0
Aprobado Parcial	103
Total	3034

Comunicados Comcel

Comunicado COMCEL	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0551-22	Subsanación 37 Estudios de Campo Grupo 3	221022677	23/03/2022	37
CD-COMCEL-INTV-0569-22	Subsanación 543 Estudios de Campo Grupo 3	221024679	29/03/2022	543
CD-COMCEL-INTV-0614-22	Alcance Subsanación 51 Estudios de Campo Grupo 3	221029757	12/04/2022	51

Comunicados Interventoría

Aprobados	Rechazados	En revisión	Aprobado parcial	En iteración	Fecha	Comunicado	MINTIC
2003	50	975	6	3034	15/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0460-22	221015692
2149	857	0	28	3034	23/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0473-22	221022454
2202	290	542	0	3034	31/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0496-22	221025975
2419	512	0	103	3034	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0511-22	221028491

COMCEL S.A manifiesta que en el periodo comprendido entre el 7 de abril de 2022 y el 13 de abril de 2022 a consecuencia de semana santa no fue posible realizar visitas a Centros Digitales.

La interventoría da a conocer en la siguiente tabla el consolidado con el estado de revisiones con corte al 18 de abril de 2022:

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	APROBADO PARCIAL	TOTAL PRESENTADOS
2.419	231	281	103	3.034

Causales de rechazo de los 231 CD

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE FALLA
1	¿ Se Anexa y Cumple el Formato Estudio de Campo de forma General?	214	**93%**
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	141	**61%**
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	141	**61%**
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	140	**61%**
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	138	**60%**
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	126	**55%**
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	125	**54%**
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		**231**	

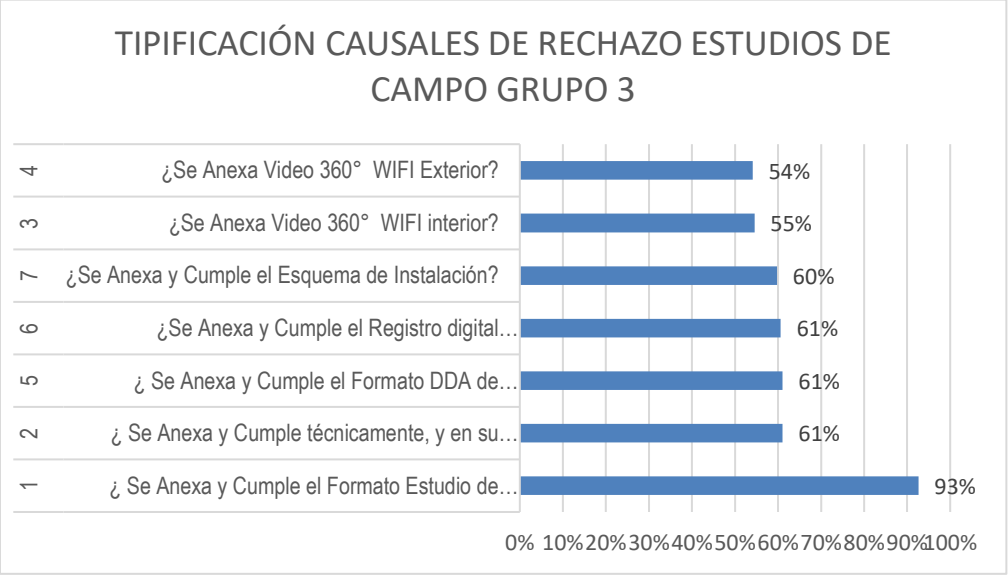

3. AVANCE DE INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTROS DIGITALES POR GRUPOS

A) Grupo 2.

El contratista realiza la presentación del avance de la Instalación del Grupo 2 y reporta con fecha de corte 13/04/2022

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO GRUPO 2 Y GRUPO 3

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	GRUPO 2	GRUPO 3
Meta	2919	3034
Sitios instalados	2919 Instalados*	340 Instalados
Reportes instalación	2309 Aprobados 280 En Interventoría 330 Rechazados	340 En Interventoría 0 Aprobados
Pruebas remotas	2594 Aprobados 17 En interventoría 56 Por Enviar 2611 En iteración	
Visitas Interventoría	171 Aprobados 124 Revisión RETIE 1335 Rechazadas 205 Fallidas 146 En revisión interv. 625 Programadas	

COMUNICADOS INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO GRUPO 2

Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0546-22	Alcance CD-COMCEL-INTV-0523-22- Reporte de cumplimiento Meta 10.	221021097	17/03/2022	16
CD-COMCEL-INTV-0561-22	Subsanación 281 Reporte de Instalaciones Grupo 2- Meta 10	221023648	25/03/2022	281
CD-COMCEL-INTV-0580-22	Subsanación 163 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221026855	04/04/2022	163
CD-COMCEL-INTV-0595-22	Subsanación 31 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221027896	06/04/2022	31
CD-COMCEL-INTV-0608-22	Subsanación 21 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221028871	08/04/2022	21
CD-COMCEL-INTV-0617-22	Subsanación 65 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221029877	12/04/2022	65

Comunicados Interventoría

Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MINTIC
2057	846	16	0	22/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0470-22	221022403
2069	850	0	0	24/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0481-22	221023423
2309	447	163	0	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0508-22	221023648

A continuación, la interventoría da a conocer los consolidados de los reportes y revisiones de la de aprobación de los Centros Digitales:

- **Reporte de Instalación Grupo 2**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
2.309	330	280	2.919	2.919

Causales de rechazo de los 330 CD

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
2	Acta de socialización	315	95%
1	Acta de instalación	310	94%
6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	305	92%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	304	92%
4	Fotografías de equipos AP interior y exterior	300	91%
7	Video 360 interior	299	91%
3	Coordenadas geográficas	299	91%
8	Video 360 exterior	298	90%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		330	

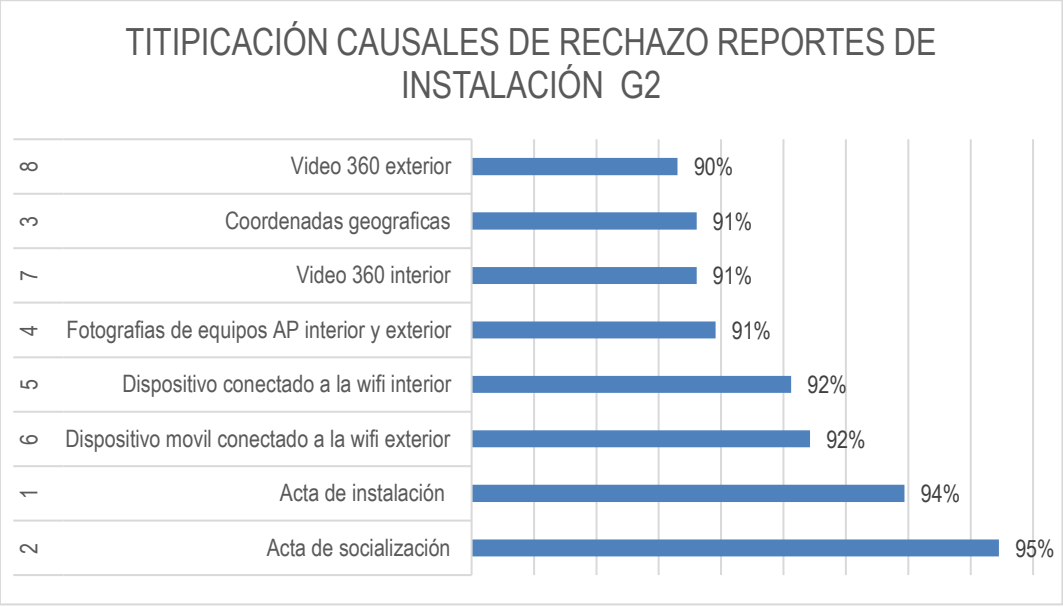

Fecha de corte 18-04-2022

- **Pruebas de verificación remotas Grupo 2**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

CONSOLIDADO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
2.594	0	57	2.651	2.919

No se registran Causales de rechazo. Fecha de corte 18-04-2022

Estado de Aprobación de Centros Digitales.

La Interventoría relaciona el estado de aprobación de los Centros Digitales del grupo 2, con corte al 18 de abril de 2022.

ESTADO DE APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS GRUPO 2				
APROBADAS	RECHAZADOS	FALLIDAS	VISITAS ADICIONALES (a programar)	META GRUPO 2
176	1360	177	167	2.919

Causales de rechazo de 1360 Centros Digitales.

Fecha de corte 18-04-2022

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

4. **Estado de la Operación y Mantenimiento de los centros digitales**

- **Grupo 1A**

El contratista manifiesta que se encuentran 114 CD con parada de reloj, con corte al 13/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	75	75
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	24	24
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	6	6
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	2	2
FUERZA MAYOR - HURTO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	1	1
Total	114	114

- **Grupo 1B**

El contratista manifiesta que se encuentran 111 CD con parada de reloj, con corte al 13/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

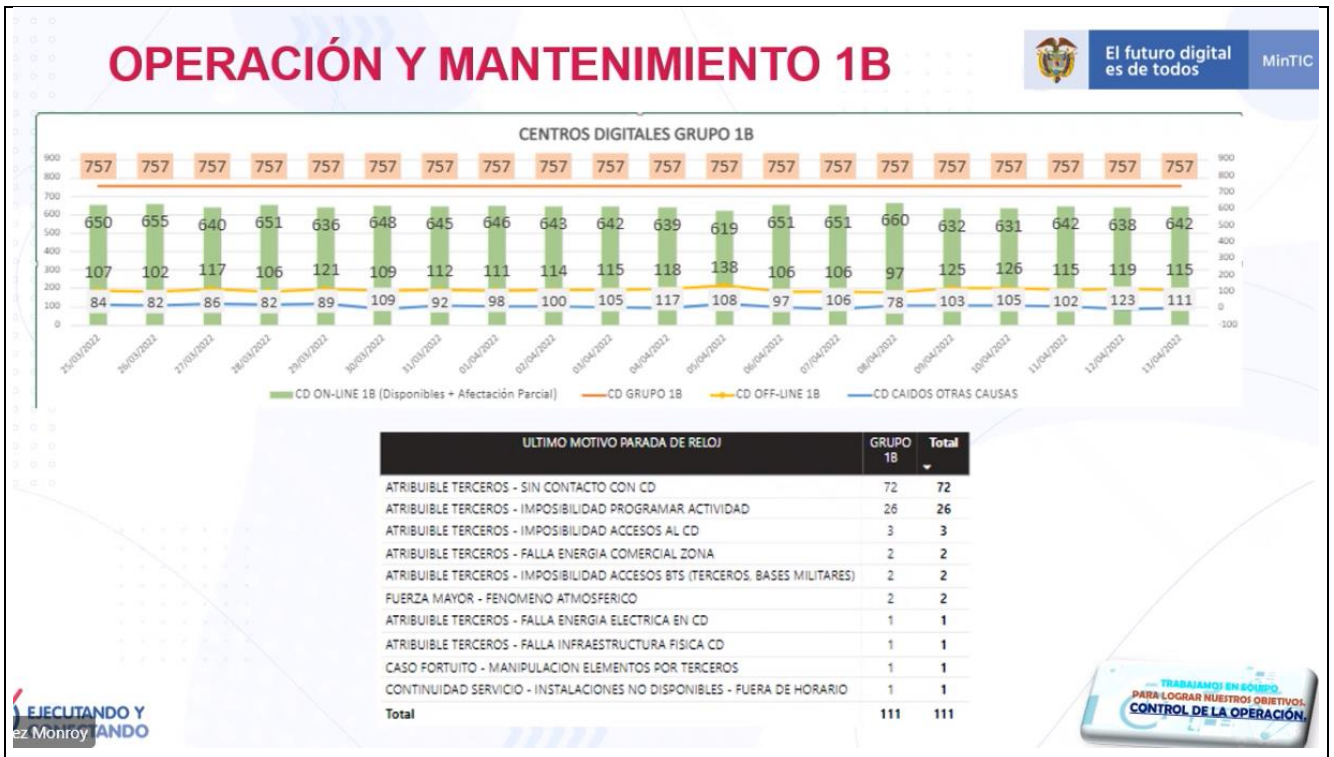

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	72	72
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	26	26
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	2	2
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	1	1
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	1
Total	**111**	**111**

- **Grupo 2**

El contratista manifiesta que se encuentran 413 CD con parada de reloj, con corte al 13/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

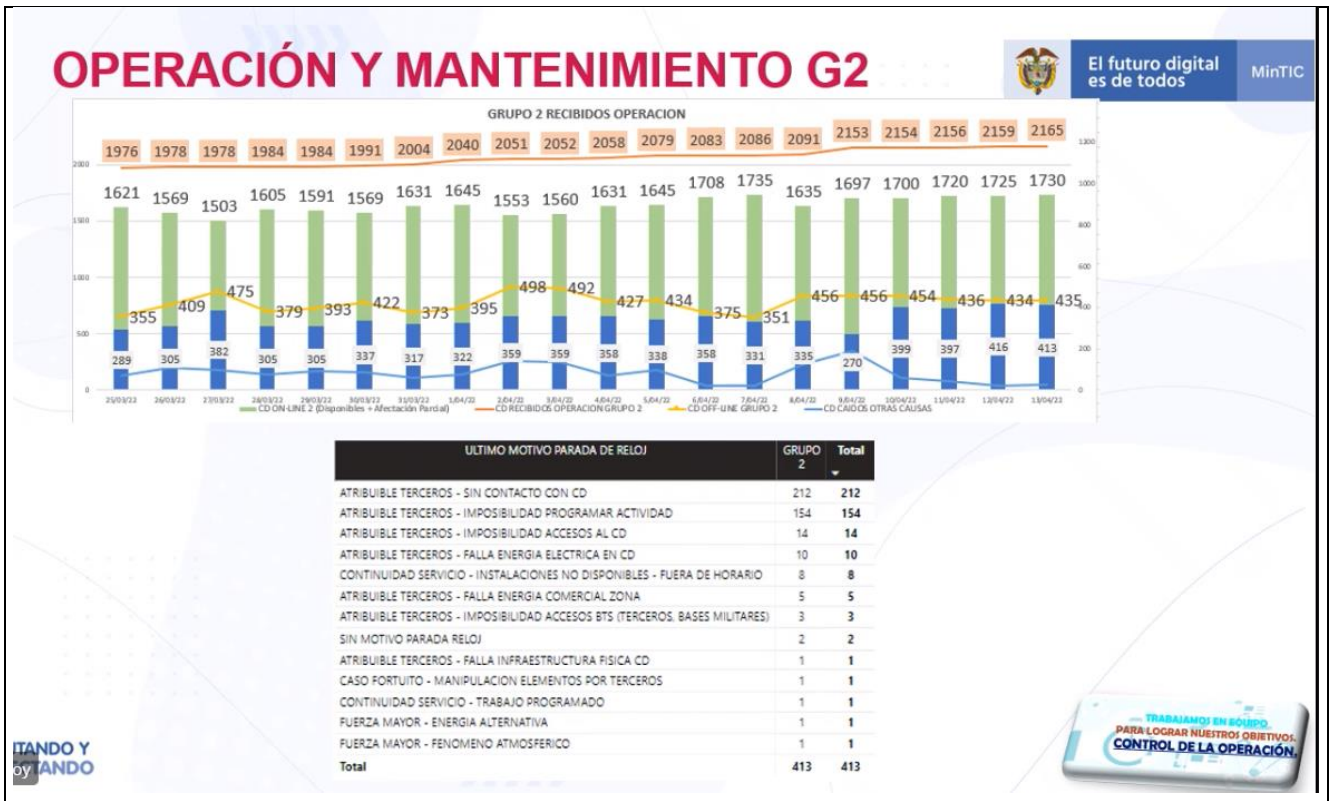

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 2	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	212	212
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	154	154
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	14	14
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	10	10
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	8	8
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	5	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	3	3
SIN MOTIVO PARADA RELOJ	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	1	1
Total	**413**	**413**

La Interventoría da a conocer que el reporte anterior del Grupo 2 corresponde al seguimiento interno por parte del contratista y confirma que al 13 de abril del 2022 aún no se ha aprobado la meta 16 correspondiente a la entrada en operación del Grupo 2.

5. Estado de PQRSD.

El contratista realiza la presentación de PQRSD y presenta el siguiente consolidado:

PQRSD

El futuro digital es de todos | MinTIC

Tipo de Solicitud / Mes Traslado	Mes Respuesta: NA	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD								
Sep-21		2						2
Oct-21		3						3
Nov-21		6						6
Ene-22			5	3				8
Feb-22				2				2
Mar-22					1	3	2	6
Abr-22						1	5	6
Solicitud Información								
Dic-21	17							17
Ene-22			10	2				12
Feb-22				1				1
Mar-22					1		1	2
Abr-22	1						1	2
Traslado								
Mar-22					1			1
Abr-22						1		1
Cambio/Traslado								
Mar-22					2			2
Cambio								
Dic-21				8				8
Ene-22				1				1
Feb-22				1	1			2
Mar-22					7			7
Abr-22						1	3	4
Total general	18	11	15	18	13	6	12	93

+16 respecto a semana anterior

Cuenta de Tipo de información / Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD							
Sep-21	2						2
Oct-21	3						3
Nov-21	6						6
Ene-22		5	3				8
Feb-22			2				2
Mar-22				1	3	2	6
Abr-22					1	5	6
Total general	11	5	5	1	4	7	33

+8 respecto a semana anterior

Cifras por tipo de información y PQRSD

PQRSD

El futuro digital es de todos | MinTIC

Remitente	Descripción de la Solicitud	Radicado MinTIC	Fecha Traslado Operador	Mes Recepción	Fecha del comunicado adjunto	Mes Traslado Operador	Respuesta dada por el Operador	Estado (Abierto / Cerrado)	Tipo de información
Mintic	Traslado radicado 221003347- Santander	221003347	1/03/2022	Mar-22	18/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado de Radicados 221004588 y 221004592 (Gob. Antioquia)	221004588 221004592	3/03/2022	Mar-22	17/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221006039	221006039	4/03/2022	Mar-22	NA	Mar-22	7/03/2022	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221009414 (NO forma parte de contrato - Florian Santnader)	221009414	11/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	11/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado 221009416	221009416	14/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221008643	221008643	15/03/2022	Mar-22	1/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado Mintic 221008661- La Jagua de Ibirico - Cesar	221008661	17/03/2022	Mar-22	2/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado Radicado 221011474 - Centro Educativo Buenos Aires de Campana	221011474	18/03/2022	Mar-22	14/02/2022	Mar-22	29/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado Mintic 221014617 - Florencia Caqueta	221014617	22/03/2022	Mar-22	25/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Radicado # 221026447 - La Jaguade Ibirico - Cesar	221026447	23/03/2022	Mar-22	03/02/2022 07/02/2022 08/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado de Radicado 221018488 - Girón - Santander	221018488	23/03/2022	Mar-22	9/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221013908 - Florián Santander	221013908	30/03/2022	Mar-22	17/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	Traslado
Mintic	Traslado radicado 221012951 - Caldas - Aranzazu	221012951	30/03/2022	Mar-22	21/02/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221020697 - Meta - villavicencio	221020697	28/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221012246 (Huila - cumplimiento cronograma)	221012246	30/03/2022	Mar-22	16/02/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021368 - SANTANDER - GIRON - ID 45593	221021368	25/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Intervento	OFICIO SOLICITUD INSTITUCIÓN EDUCATIV A SAN LUIS DE NEIRA CALDAS	NA	31/03/2022	Mar-22	19/03/2022	Mar-22	31/03/2022	Cerrado	Cambio
Intervento	I. E. de Leña	NA	31/03/2022	Mar-22	1/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221022069 -Neira Caldas	221022069	6/04/2022	Abr-22	19/03/2022	Abr-22	6/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	TRASLADO RADICADO 221020391 - Yolombo Antioquia	221020391	1/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	TRASLADO RAD 221026121 - Alcaldia Municipial de Valledupar	221026121	7/04/2022	Abr-22	31/03/2022	Abr-22	NA	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	traslado radicado 221016515 - Ronesvalles Tolima	221016515	7/04/2022	Abr-22	2/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021045 - Solita Caqueta	221021045	7/04/2022	Abr-22	16/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	Traslado rad. 221025465 -	221025465	7/04/2022	Abr-22	9/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221020655	221020655	8/04/2022	Abr-22	10/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	ID 10001121 BEN 68347 Comunidad Indigena de las Delicias Defensoriadel Pueblo 211105722 - Inclusión centros poblados en próximos proyectos		8/04/2022	Abr-22	3/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	Solicitud insumos PQRS 221020615 Y 221020625 (vereda Guayabal, del municipio de Barichara)	221020615 221020625	11/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RADICADO 221022163 (Municipio del carmen norte de santander C.E. R Santa ines sede principal)	221022163	12/04/2022	Abr-22	20/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD No. 221024135 (Institución Villa de San Andrés del corregimiento de Villa de San Andrés del Municipio de Aguachica)	221024135	13/04/2022	Abr-22	28/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221025482 (CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL)	221025482	13/04/2022	Abr-22	30/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Traslado
Intervento	TRASLADO RADICADO 221025161 - Barrancabermeja	221025161	13/04/2022	Abr-22	29/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD

Mes/Tipo solicitud / Etiquetas de fila	Estado: Cerrado	En proceso	Total general
Mar-22	15	3	18
Cambio	7		7
Cambio/Traslado	2		2
PQRSD	4	2	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Abr-22	4	9	13
Cambio	1	3	4
PQRSD	1	5	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Total general	19	12	31

Tabla de seguimiento de Marzo - Abril

EJECUTANDO Y

COMCEL S.A da a conocer que a corte del 13 de abril de 2022 ha atendido todas y cada una de las solicitudes realizadas, a la fecha se encuentra tan solo 12 en estado “Abierto”.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La Interventoría está validando el cierre de los PQRSD de los meses de febrero y marzo y reporta el estado de las PQRSD con corte al 30 de marzo de 2022 en la Siguiente tabla resumen:

MES	TOTAL PQRSD RECIBIDAS	PQRSD CERRADOS	PQRSD ABIERTOS
FEBRERO	14	7	7
MARZO	19	11	8

6. Estado de los Aspectos Financieros.

El contratista realiza la presentación de los aspectos financieros:

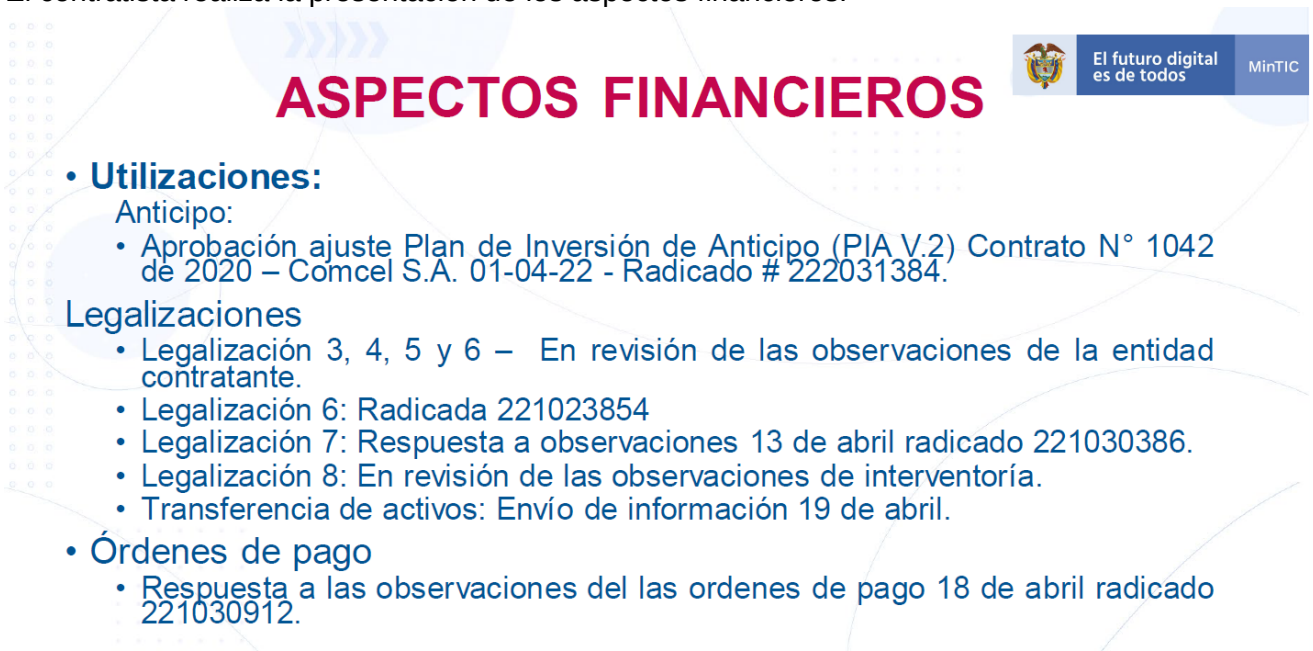

La Interventoría informa lo siguiente:

- **Legalización de recursos**:

COMCEL radicó el 13 de abril de 2022 la legalización 7 ajustada, está se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de COMCEL a las observaciones de la legalización 8. Se reitera la solicitud de que a la mayor brevedad se respondan y se remita el informe corregido.

Es de anotar que la Supervisión el 12 de abril de 2022 remitió observaciones a las legalizaciones 3, 4, 5 y 6 y fueron enviadas a COMCEL para respuesta a más tardar el 20 de abril de 2022. En la presentación COMCEL no indica que recibió observaciones de la Supervisión a la legalización 6.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Sobre los informes de legalización de recursos de los meses de enero y febrero de 2022 continúan pendientes de radicación y el informe del mes de marzo de 2022 tiene fecha de vencimiento el lunes 25 de abril de 2022 para ser radicado ante la Supervisión, por lo que se reitera la radicación de los informes pendientes a más tardar el 19 de abril de 20222 para subsanar la obligación y el informe del mes de marzo a más tardar el 22 de abril de 2022.

- **Transferencia de bienes:**

En cuanto a la transferencia de bienes, continúa pendiente la radicación con los ajustes correspondientes, luego de que la Fiduciaria aclarara los temas de depreciación quien respondió el 5 de abril de 2022. Con base en dicha respuesta la Interventoría solicitó el 7 de abril de 2022 al Contratista COMCEL agilizar de manera urgente realizar los ajustes solicitados y continuar con el proceso que permita concluir con el registro de los bienes en la contabilidad del P.A., sin que a la fecha se haya recibido.

El acta de la reunión de inventarios realizada el 1 de abril de 2022 con la Supervisión, COMCEL e Interventoría, fue revisada y observada por COMCEL el día 8 de abril de 2022, a la cual la Interventoría dio respuesta. El acta será cerrada y socializada el día 19 de abril de 2022.

- **Plan de inversión del anticipo**

El 1 de abril de 2022, se recibió aprobación de la Supervisión al ajuste realizado por el Contratista COMCEL.

- **Órdenes de pago:**

La Interventoría informa que con el Plan de Inversión del anticipo aprobado ha emitido concepto sobre dos órdenes de pago adicionales y sobre las demás presentadas para aprobación se realizaron observaciones que llevaron a su devolución.

COMCEL dio respuesta el 18 de abril de 2022 y se encuentra en proceso de revisión por la Interventoría.

- **Plan de Difusión**

El 7 de abril de 2022, con radicado 221028529 la Interventoría solicitó al Contratista indicar cómo será ejecutado el cronograma de plan de difusión aprobado, de acuerdo con lo indicado por la Supervisión en comité operativo del 31 de marzo de 2022. COMCEL solicitará conforme a lo acordado en el último comité operativo una mesa de trabajo con la Supervisión para definir la ejecución del cronograma. Se recibió comunicación por parte de COMCEL el 18 de abril de 2022 y la Supervisión cita a reunión para el 21 de abril de 2022, con el fin de definir las piezas y medios que deben ser utilizados por COMCEL para la ejecución del plan.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Otros temas financieros:

El 18 de abril de 2022 se recibió respuesta a los siguientes comunicados, la cual será revisada por la Interventoría y se pronunciará en lo que sea necesario:

- Solicitud Estados Financieros del contratista a dic 31 de 2021, radicado 221023707 del 25 de marzo de 2022.
- Propuesta reinversión de recursos, radicados 221022477 y 221022478 del 22 de marzo de 2022, sin embargo, no hay respuesta sobre la solicitud de creación de cuenta (Fiducia) para depositar lo que correspondería a los valores descontados por indicadores, en caso de que aplique.

7. Varios

- Sigue pendiente de respuesta el requerimiento sobre ejecución del anticipo, radicado 221017846 del 7 de marzo de 2022. Tiene más de 30 días de remitido y no ha sido atendido por parte de COMCEL.

- **Actualización Inventario**:

  Pendiente la remisión del inventario actualizado de acuerdo con el compromiso de la reunión del 1 de abril de 2020 debió realizarse el 15 de abril de 2022.

  COMCEL presentará el inventario de lo presentado (Grupo 1A, Grupo 1B y Grupo 2) en el formato ajustado el 30 de abril de 2022, el cual fue enviado por la Interventoría el 8 de abril de 2022.

- **Traslado de Centros Digitales:**
  A la fecha no se tiene solicitudes de Traslado de Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B.

- **Reubicaciones**

  Actualmente se encuentra en revisión 10 solicitudes de reubicaciones, pendiente por definir con Supervisión – Interventoría – COMCEL el tema de los tiempos y los costos.

- **Medición de Indicadores**

  Se realizó reunión el 13-04-2022 en las instalaciones del MinTic entre Interventoría, Supervisión y COMCEL S.A, en la cual se acordó la metodología a implementar para la medición de los indicadores y el cálculo de las utilizaciones, la propuesta será presentada en el próximo comité operativo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
ítem	**ACCIÓN POR EJECUTAR**	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
1	Radicar transferencia de bienes ajustada.	COMCEL	19/04/2022
2	Dar Respuesta comunicado anticipo.	COMCEL	19/04/2022
3	Dar Respuesta observaciones Interventoría legalización de recursos 8 ajustada, enero y febrero pendientes.	COMCEL	19/04/2022
4	Dar Respuesta observaciones a legalizaciones 3,4,5 y 6 presentadas por la Supervisión.	COMCEL	20/04/2022
5	Realizar mesa de trabajo avance de instalación de CD y aclaración de observaciones.	INTERVENTORÍA /COMCEL	20/04/2022
6	Realizar mesa de trabajo entre La Interventoría, Supervisión y COMCEL S.A sobre el Plan de Difusión.	INTERVENTORÍA /COMCEL/SUPER VISIÓN	21/04/2022
7	Enviar informe de novedades (estudios de campo e instalaciones) en campo.	COMCEL	22/04/2022

ANEXOS

1.Evidencia de participación
2.Listado de asistencia
3.Presentación del Contratista.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

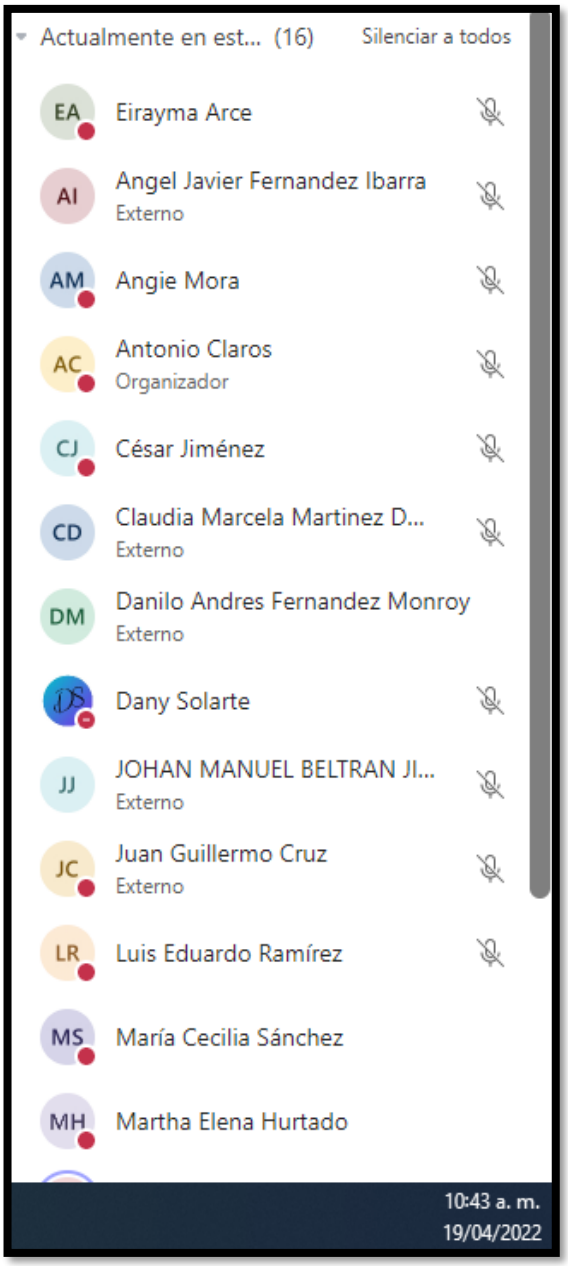

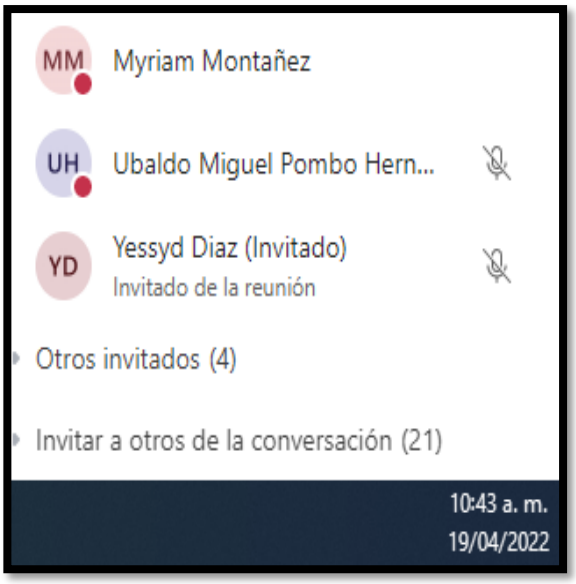

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

LISTADO DE ASISTENCIA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA: 19 de Abril de 2022 **LUGAR:** Virtual (Teams)

HORA INICIO: 10:30 A.M **HORA FINAL:** 12:30 P.M **RESPONSABLE:** INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÒN	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Antonio Claros Ciceri	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	aclaros@pmoconsultoria.com	
2	Angie Mora	1.085.289.290	Interventoría	Asesora Juridica	3225349860	amora@pmoconsultoria.com	
3	César Augusto Jiménez	19.458.480	Interventoría	Director Sistemas de Información	3195926513	cjimenes@pmoconsultoria.com	
4	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
5	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
6	Maria Cecilia Sanchez	41.594.455	Interventoría	Asesora Juridica	3158474554	msanchez@pmoconsultoria.com	
7	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
8	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
9	Ubaldo Pombo	92.533.658	Interventoría	Apoyo Técnico	3015015646	upombo@pmoconsultoria.com	
10	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	320 2256293	lramirez@pmoconsultoria.com	
11	Juan Guillermo Cruz	9.774.416	Interventoría	Profesional Técnico	3103713639	jguillermo@pmoconsultoria.com	
12	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
13	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
14	Claudia Marcela Martínez Duarte	37.948.667	COMCEL SA	Ing Mejora Operacional	3102002349	claudia.martinez.d@claro.com.co	
15	Johan Manuel Beltran	80.120.803	COMCEL SA	Lider Implementación	3143289802	johan.beltran@claro.com.co	
16	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la *Política de Tratamiento de los Datos Personales* del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: *http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html*

El futuro digital es de todos

MinTIC

INFORME DE AVANCE CENTROS DIGITALES

Avance semanal

19 de abril de 2022

EJECUTANDO Y CONECTANDO

El futuro digital es de todos

MinTIC

AGENDA

Abril 08 de 2022

1. Avance instalación y puesta en servicio grupo 2 y grupo 3.
2. Avance estudios de campo grupo 3.
3. Estado operación y mantenimiento 1A y 1B.
4. Estado de PQRSD.
5. Aspectos financieros.

Claro

EJECUTANDO Y CONECTANDO

El futuro digital es de todos | MinTIC

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2 y G3

	GRUPO 2	GRUPO 3
Meta	2919	3034
Sitios instalados	2919 Instalados*	340 Instalados
Reportes instalación	2309 Aprobados 280 En Interventoría 330 Rechazados	340 En Interventoría 0 Aprobados
Pruebas remotas	2594 Aprobados 17 En interventoría 56 Por Enviar 2611 En iteración	
Visitas Interventoría	171 Aprobados 124 Revisión RETIE 1335 Rechazadas 205 Fallidas 146 En revisión interv. 625 Programadas	

* Comunicación alcance sitios FM

Claro

EJECUTANDO Y CONECTANDO

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2

El futuro digital es de todos

MinTIC

Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0546-22	Alcance CD-COMCEL-INTV-0523-22- Reporte de cumplimiento Meta 10.	221021097	17/03/2022	16
CD-COMCEL-INTV-0561-22	Subsanación 281 Reporte de Instalaciones Grupo 2- Meta 10	221023648	25/03/2022	281
CD-COMCEL-INTV-0580-22	Subsanación 163 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221026855	04/04/2022	163
CD-COMCEL-INTV-0595-22	Subsanación 31 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221027896	06/04/2022	31
CD-COMCEL-INTV-0608-22	Subsanación 21 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221028871	08/04/2022	21
CD-COMCEL-INTV-0617-22	Subsanación 65 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221029877	12/04/2022	65

Comunicados Interventoría

Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MINTIC
2057	846	16	0	22/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0470-22	221022403
2069	850	0	0	24/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0481-22	221023423
2309	447	163	0	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0508-22	221023648

EJECUTANDO Y CONECTANDO

Claro

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G3

El futuro digital es de todos

MinTIC

Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0547-22	Primera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12 - Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020	221021100	17-03-22	23	23
CD-COMCEL-INTV-0571-22	Segunda Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221025681	31/03/2022	102	125
CD-COMCEL-INTV-0579-22	Tercera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221026850	04/04/2022	58	183
CD-COMCEL-INTV-0594-22	Cuarta Entrega Reporte de Cumplimiento 61 CD - Meta 12	221027893	06/04/2021	61	244
CD-COMCEL-INTV-0606-22	Quinta Entrega Reporte de Cumplimiento 26 CD - Meta 12	221028864	08/04/2022	26	270
CD-COMCEL-INTV-0607-22	Sexta Entrega Reporte de Cumplimiento 10 CD - Meta 12	221028868	08/04/2022	10	280
CD-COMCEL-INTV-0616-22	Septima Entrega Reporte de Cumplimiento 60 CD - Meta 12	221029873	12/04/2022	60	340

EJECUTANDO Y CONECTANDO

Claro

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

El futuro digital es de todos
MinTIC

ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	2419
Rechazados	512
En revisión Interventoría	0
Aprobado Parcial	103
Total	3034

Comunicados Comcel

Comunicado COMCEL	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0551-22	Subsanación 37 Estudios de Campo Grupo 3	221022677	23/03/2022	37
CD-COMCEL-INTV-0569-22	Subsanación 543 Estudios de Campo Grupo 3	221024679	29/03/2022	543
CD-COMCEL-INTV-0614-22	Alcance Subsanación 51 Estudios de Campo Grupo 3	221029757	12/04/2022	51

Comunicados Interventoría

Aprobados	Rechazados	En revisión	Aprobado parcial	En iteración	Fecha	Comunicado	MINTIC
2003	50	975	6	3034	15/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0460-22	221015692
2149	857	0	28	3034	23/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0473-22	221022454
2202	290	542	0	3034	31/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0496-22	221025975
2419	512	0	103	3034	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0511-22	221028491

EJECUTANDO Y CONECTANDO

Claro

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A

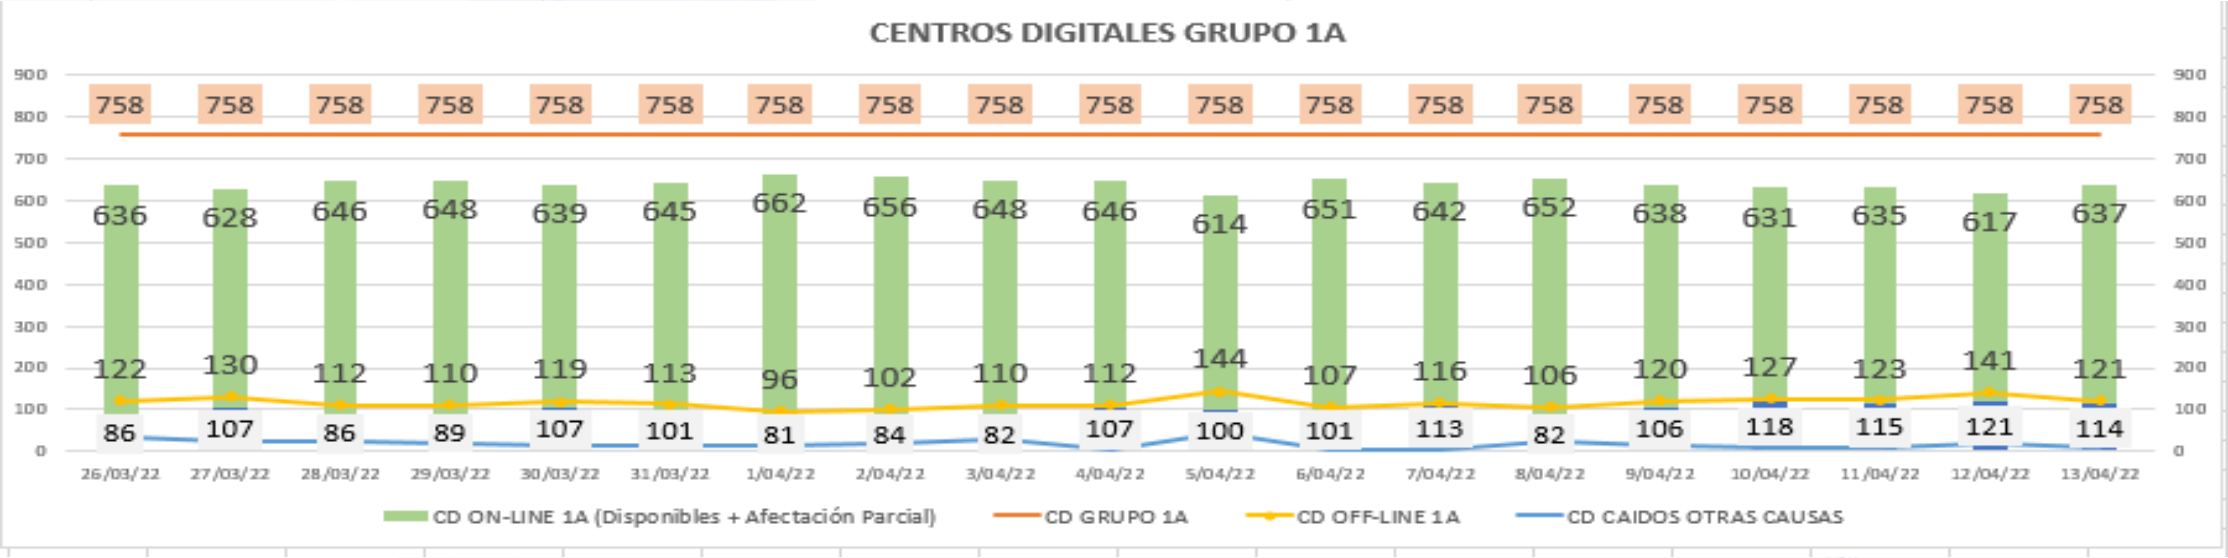

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	75	75
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	24	24
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	6	6
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	2	2
FUERZA MAYOR - HURTO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	1	1
Total	**114**	**114**

El futuro digital es de todos
MinTIC
EJECUTANDO Y CONECTANDO
TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS.
CONTROL DE LA OPERACIÓN.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B

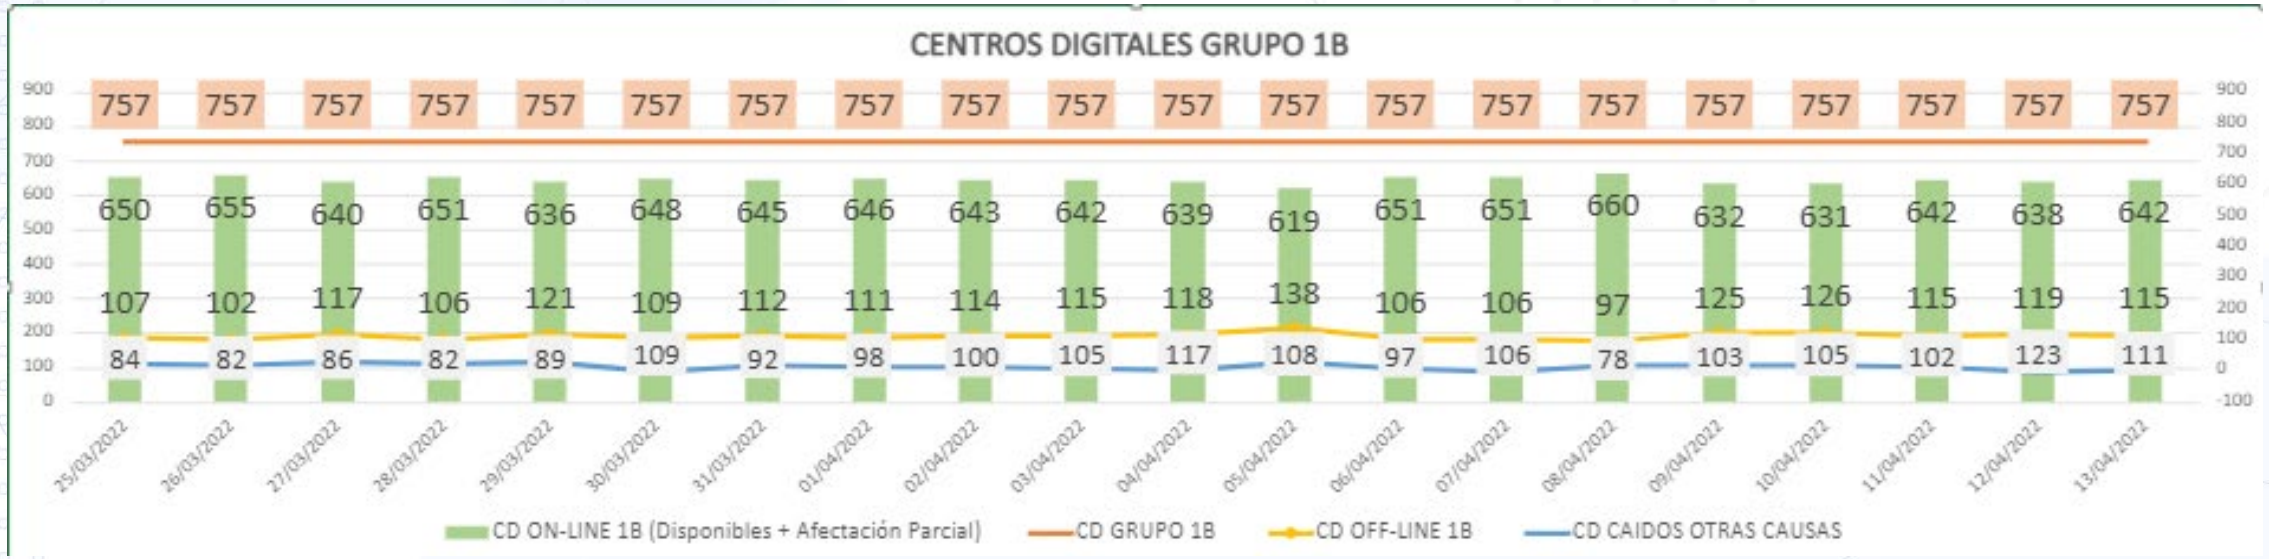

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	72	**72**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	26	**26**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	3	**3**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	2	**2**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	2	**2**
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	2	**2**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	1	**1**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	**1**
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	**1**
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	**1**
Total	**111**	**111**



EJECUTANDO Y CONECTANDO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO G2

El futuro digital es de todos

MinTIC

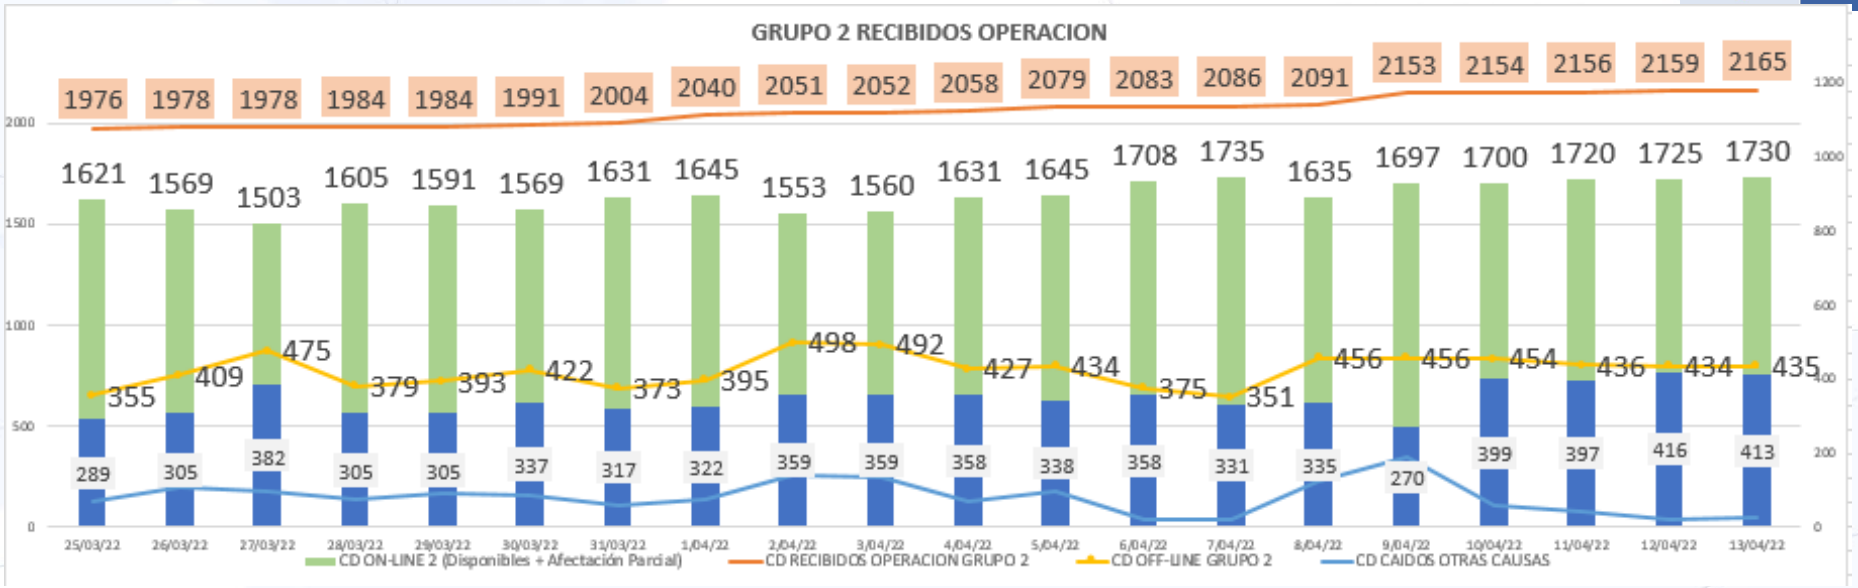

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 2	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	212	**212**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	154	**154**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	14	**14**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	10	**10**
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	8	**8**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	5	**5**
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	3	**3**
SIN MOTIVO PARADA RELOJ	2	**2**
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	**1**
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	**1**
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	**1**
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	**1**
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	1	**1**
Total	**413**	**413**

EJECUTANDO Y CONECTANDO

TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS.
CONTROL DE LA OPERACIÓN.

PQRSD

El futuro digital es de todos

MinTIC

Tipo de Solicitud / Mes Traslado	Mes Respuesta: NA	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD								
Sep-21		2						2
Oct-21		3						3
Nov-21		6						6
Ene-22			5	3				8
Feb-22				2				2
Mar-22					1	3	2	6
Abr-22						1	5	6
Solicitud Información								
Dic-21	17							17
Ene-22			10	2				12
Feb-22				1				1
Mar-22					1		1	2
Abr-22	1						1	2
Traslado								
Mar-22					1			1
Abr-22						1		1
Cambio/Traslado								
Mar-22					2			2
Cambio								
Dic-21				8				8
Ene-22				1				1
Feb-22				1	1			2
Mar-22					7			7
Abr-22						1	3	4
Total general	18	11	15	18	13	6	12	93

+16 respecto a semana anterior

Cuenta de Tipo de información / Mes Traslado	Mes Respuesta: Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD							
Sep-21	2						2
Oct-21	3						3
Nov-21	6						6
Ene-22		5	3				8
Feb-22			2				2
Mar-22				1	3	2	6
Abr-22					1	5	6
Total general	11	5	5	1	4	7	33

+8 respecto a semana anterior

Cifras por tipo de información y PQRSD

EJECUTANDO Y CONECTANDO

Claro

PQRSD

El futuro digital es de todos

MinTIC

Remitente	Descripción de la Solicitud	Radicado MInTIC	Fecha Traslado Operador	Mes Recepción	Fecha del comunicado adjunto	Mes Traslado Operador	Respuesta dada por el Operador	Estado (Abierto / Cerrado)	Tipo de información
Mintic	Traslado radicado 221003347- Santander	221003347	1/03/2022	Mar-22	18/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado de Radicados 221004588 y 221004592 (Gob. Antioquia)	221004588 221004592	3/03/2022	Mar-22	17/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221006039	221006039	4/03/2022	Mar-22	NA	Mar-22	7/03/2022	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221009414 (NO forma parte de contrato - Florian Santnader)	221009414	11/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	11/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado 221009416	221009416	14/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221008643	221008643	15/03/2022	Mar-22	1/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado Mintic 221008661- La Jagua de Ibirico - Cesar	221008661	17/03/2022	Mar-22	2/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado Radicado 221011474 - Centro Educativo Buenos Aires de Campana	221011474	18/03/2022	Mar-22	14/02/2022	Mar-22	29/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado Mintic 221014617 - Florencia Caqueta	221014617	22/03/2022	Mar-22	25/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Radicado # 222026447 - La Jagua de Ibirico - Cesar	222026447	23/03/2022	Mar-22	03/02/2022 07/02/2022 08/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado de Radicado 221018488 - Girón - Santander	221018488	23/03/2022	Mar-22	9/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221013908 - Florián Santander	221013908	30/03/2022	Mar-22	17/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	Traslado
Mintic	Traslado radicado 221012951 - Caldas - Aránzazu	221012951	30/03/2022	Mar-22	21/02/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221020697 - Meta - villavicencio	221020697	28/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221012246 (Huila - cumplimiento cronograma)	221012246	30/03/2022	Mar-22	16/02/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021368 - SANTANDER - GIRON - ID 45593	221021368	25/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Intervent	OFICIO SOLICITUD INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE NEIRA CALDAS	NA	31/03/2022	Mar-22	19/03/2022	Mar-22	31/03/2022	Cerrado	Cambio
Intervent	I. E. de Leña	NA	31/03/2022	Mar-22	1/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221022069 -Neira Caldas	221022069	6/04/2022	Abr-22	19/03/2022	Abr-22	6/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	TRASLADO RADICADO 221020391 - Yolombo Antioquia	221020391	1/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	TRASLADO RAD 221026121 - Alcaldía Municipial de Valledupar	221026121	7/04/2022	Abr-22	31/03/2022	Abr-22	NA	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	traslado radicado 221016515 - Roncesvalles Tolima	221016515	7/04/2022	Abr-22	2/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021045 - Solita Caquetá	221021045	7/04/2022	Abr-22	16/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	Traslado rad. 221025465 -	221025465	7/04/2022	Abr-22	9/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221020655	221020655	8/04/2022	Abr-22	10/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	ID 10001121 BEN 68347 Comunidad Indigena de las Delicias Defensoría del Pueblo 211105722 - Inclusión centros poblados en próximos proyectos		8/04/2022	Abr-22	3/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Cambio
Mintic	Solicitud insumos PQRS 221020615 Y 221020625 (vereda Guayabal, del municipio de Barichara)	221020615 221020625	11/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RADICADO 221022163 (Municipio del carmen norte de santander C.E.R Santa ines sede principal)	221022163	12/04/2022	Abr-22	20/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD No. 221024135 (Institución Villa de San Andrés del corregimiento de Villa de San Andrés del Municipio de Aguachica)	221024135	13/04/2022	Abr-22	28/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221025482 (CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL)	221025482	13/04/2022	Abr-22	30/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Traslado
Intervent	TRASLADO RADICADO 221025161 - Barrancabermeja	221025161	13/04/2022	Abr-22	29/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD

Mes/Tipo solicitud	Estado		
Etiquetas de fila	Cerrado	En proceso	Total general
Mar-22	**15**	**3**	**18**
Cambio	7		7
Cambio/Traslado	2		2
PQRSD	4	2	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Abr-22	**4**	**9**	**13**
Cambio	1	3	4
PQRSD	1	5	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Total general	**19**	**12**	**31**

Tabla de seguimiento de Marzo - Abril

EJECUTANDO Y CONECTANDO

Claro

ASPECTOS FINANCIEROS

- **Utilizaciones:**

  Anticipo:

  - Aprobación ajuste Plan de Inversión de Anticipo (PIA V.2) Contrato N° 1042 de 2020 – Comcel S.A. 01-04-22 - Radicado # 222031384.

Legalizaciones

- Legalización 3, 4, 5 y 6 – En revisión de las observaciones de la entidad contratante.
- Legalización 6: Radicada 221023854
- Legalización 7: Respuesta a observaciones 13 de abril radicado 221030386.
- Legalización 8: En revisión de las observaciones de interventoría.
- Transferencia de activos: Envío de información 19 de abril.

- Órdenes de pago
  - Respuesta a las observaciones del las ordenes de pago 18 de abril radicado 221030912.
