Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	IMDER PALMIRA		
NIT Compañía:	0815000340		
Fecha Actual:	Lunes, 28 de agosto de 2023 - 14:39 PM		
Número de cuenta:	306-154418-83	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	TECNICOS ESPECIALI	Documento:	000000800074273
Valor:	69.160.435,00	Cheque:	0
Concepto:	25019	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Agosto de 2023		

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2023/08/28, 11:12:18
Pag 1 de 1

Fecha: AGOSTO 28 de 2023

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-025019

Pagado a.: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI
CL 71 27B 12 IN Tel. 61114286 - BARRANCABERMEJA

NIT: 800,074,273-3
Codigo: 800074273
El valor de ...: $69,160,435.00

Concepto.: CONSTITUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
SE CANCELA RESERVA PRESUPUESTAL

Forma pago: TRANSFERENCI CA #212121 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -001688

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
800074273	51	FAT -FET169	1	3	69160435		69160435

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100508			800074273	69,160,435.00CR
240101			800074273	69,160,435.00

69160435	69160435	Imputacion Contable.....	69,160,435.00	69,160,435.00

Preparado	APROBADO	APROBADO	Aprobado	Recibi conforme
	JHON JAIRO ROJADA AMAYA	MARTHA ISABEL MEJIA C	CARLOS ANDRES REYES KURI	
	DIR.FINANCIERO (E	TEC.ADMINISTRATIV	GERENTE	NIT/CC

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - RESERVAS *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-001688
Vigencia: 2023
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT 800,074,273-3
Direccion...: CL 71 27B 12 IN
Telefono(s).: 61114286 Ciudad: BARRANCABERMEJA
D E T A L L E: CONSTITUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
SE CANCELA RESERVA PRESUPUESTAL

TOTAL PAGADO ==> $****79,954,260.00
Son: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.005.02 Fuente 01 CPC 62199 Proyec 2100034	2.SUMINIST.E INTALAR ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS	CR -001690	79,954,260.00

TOTAL => 79,954,260.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 25 dias de AGOSTO de 2023.

ELABORADO	APROBADO	APROBADO	Aprobado
FRANCISCA ALEGRIA	JHON [illegible] TEJADA A	MARTHA ISABEL MEJIA	CARLOS ANDRES REYE
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO (E	TEC.ADMINISTRATIV	GERENTE

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FET169

Fecha: AGOSTO 25 de 2023
Señores..: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT: 800,074,273-3
CL 71 27B 12 IN Tel. 61114286 - BARRANCABERMEJA Codigo: 800074273
Concepto.: CONSTITUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL Subtotal...: $79,954,260.00
SE CANCELA RESERVA PRESUPUESTAL IVA .....:
Ret+Est+Ded: $10,793,825.00
Total .....: $69,160,435.00

Obligacion: CR -001690

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
800074273	51		1	23/09/25	69,160,435		69,160,435
					69,160,435		69,160,435

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor------*
55050516			800074273	79,954,260.00
24402301			800074273	1,599,085.00CR
24402302			800074273	799,543.00CR
24402303			800074273	799,543.00CR
24402304			800074273	1,599,085.00CR
24402305			800074273	3,997,713.00CR
24402306			800074273	399,771.00CR
44289002			800074273	1,599,085.00CR
p11020600600610	Fte: 03			1,599,085.00CR
				79,954,260.00

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO	APROBADO			
JHON JAIRO ALVARADA AMAYA	JHON JAIRO ALVARADA AMAYA			
PROF. UNIVERSITAR	DIR.FINANCIERO (E			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - RESERVAS *

REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-001690
Vigencia: 2023
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT 800,074,273-3
Direccion...: CL 71 27B 12 IN
Telefono(s).: 61114286 Ciudad: BARRANCABERMEJA
D E T A L L E: CONSTITUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
SE CANCELA RESERVA PRESUPUESTAL

TOTAL OBLIGACION ==> $****79,954,260.00
Son: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESE
NTA PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Reserva	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.005.02 Fuente 01 CPC 62199 Proyec 2100034	2.SUMINIST.E INTALAR ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS	NP -000026	237,788,132	79,954,260.00

TOTAL => 79,954,260.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 25 dias de AGOSTO de 2023.

ELABORADO	APROBADO	APROBADO	Aprobado
FRANCISCA ALEGRIA TEC.ADMINISTRATIV	JHON [illegible] TEJADA A DIR.FINANCIERO (E	CARLOS ANDRES REYES GERENTE	

TECNISA NIT: 800.074.273-3	**PROYECTO** **POLIDEPORTIVO EL** **RECREO** **OFICIO 007-2023**	PROYECTO JUAN DAVID MAPURA ADMINISTRATIVO REVISO: DIEGO PARRA RESIDENTE APROBO: ANDRÉS BEDOYA Página 1 de 1

Palmira, 24 de Agosto de 2023 Polideportivo el Recreo 007-2023

Señores/Señoras:

MAURICIO CASTRO SORIANO E IMDER

Ref.: Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en teja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LEO, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

Asunto: RADICADO DOCUMENTACIÓN PARA FACTURACIÓN ACTA #4 SEGÚN AVANCES DE OBRA

Por medio del presente oficio, me dirijo a ustedes con el fin de hacer constar la entrega de la documentación necesaria para la facturación del Acta #4 de la obra que se está llevando a cabo en el marco del contrato suscrito entre nuestra empresa y la Secretaría.

En tal sentido, les remitimos los siguientes documentos requisitos para la facturación del Acta #4 según el anexo técnico del respectivo contrato:

- Acta de avance #4.
- Memorias gráficas y de cálculo actividades acta #4.
- Factura.
- Informe de avance de obra.
- Informe de la supervisión.
- Seguridad social, certificado pagos parafiscales, tarjeta profesional y documento contador.
- Fotocopia bitácora de obra.
- Copia cronograma.
- Flujo de inversión.

Es importante señalar que estos documentos se han generado conforme a los requerimientos del contrato y que se encuentran sellados por interventoría.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo, atentamente,

20230033081
24-08-2023
9:23am. 70 -

JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
CC.1.098.636.992 B/bermeja
Representante Legal
TECNISA SAS
NIT 800.074.273-3

ACTA DE AVANCE DE OBRA

No. 4

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en baja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

CONTRATO No. 308-2022

ACTIVIDADES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		15 DICIEMBRE DE 2022 ACTA DE AVANCE No.1		may-23 ACTA DE AVANCE No.2		jul-25 ACTA DE AVANCE No.3		ago-04 ACTA DE AVANCE No.4		Acumulado TOTAL A LA FECHA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	RESTANTE	VALOR
1	PRELIMINARES																	
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	202,87	$ 12.000,00	$ 2.434.440,00	147,82	$ 1.771.440,00	147,80	$ 1.770.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,12	$ 1.440,00	147,82	-	$ 1.771.440,00
1,02	SEÑALIZACION DE OBRA	GLB	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	-	$ 1.500.000,00
1,03	DESMONTE POSTE ILUMINACION + RETIRO LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	UND	4,00	$ 232.500,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	-	$ 928.000,00
1,04	PODA ARBOL + RETIRO	UND	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00	2,00	$ 260.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	2,00	$ 0,00
1,05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONI	M2	718,31	$ 5.000,00	$ 3.591.550,00	713,31	$ 3.566.550,00	713,26	$ 3.566.250,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,05	$ 300,00	715,31	0,00	$ 3.566.550,00
1,06	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	3,12	$ 22.200,00	$ 69.264,00	3,12	$ 69.264,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	3,12	$ 0,00
1,07	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	3,12	$ 58.000,00	$ 184.080,00	3,12	$ 184.080,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	3,12	$ 0,00
Subtotal					$ 8.942.334,00		$ 8.279.334,00		$ 7.764.250,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.740,00			$ 7.766.990,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																	
2,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.30 MTS	M2	80,87	$ 5.400,00	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	80,87		$ 436.698,00
2,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	103,00	$ 17.000,00	$ 1.796.480,00	103,00	$ 1.802.500,00	103,00	$ 1.802.500,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	105,09	-	$ 1.802.500,00
2,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	65,21	$ 17.200,00	$ 1.139.812,00	65,21	$ 1.139.812,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
2,04	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJON DE PIEDRA PARA RELLENO E=0.30MTS	M3	34,29	$ 68.200,00	$ 2.382.332,00	20,88	$ 2.050.416,00	20,88	$ 2.050.416,00		$ 0,00	-	$ 0,00	35,10	$ 668.320,00	35,10	35,11	$ 569.320,00
2,05	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR.	M3	13,13	$ 120.000,00	$ 1.485.600,00	12,82	$ 1.560.400,00	12,82	$ 1.560.400,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	12,82	-	$ 1.560.400,00
2,06	GEOTEXTIL NT 1800	M2	218,56	$ 5.600,00	$ 1.289.445,00	218,56	$ 1.289.445,00	218,56	$ 1.289.445,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	218,56	-	$ 1.289.445,00
2,07	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	66,34	$ 21.200,00	$ 1.448.808,00	66,43	$ 1.460.716,00	-	$ 0,00	66,43	$ 1.460.716,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	66,43	-	$ 1.460.716,00
2,08	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	66,34	$ 58.000,00	$ 4.032.000,00	46,00	$ 2.300.000,00	-	$ 0,00	46,00	$ 2.300.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	46,00	-	$ 2.300.000,00
Subtotal					$ 13.976.256,00		$ 12.979.067,00		$ 7.139.058,00		$ 3.810.716,00		$ 0,00		$ 668.320,00			$ 11.098.466,00
3	CIMENTACION																	
3,01	SOLADO ESPESOR E=0,08M 3000 PSI 210 MPA ZAPATAS Y VIGAS CIMIENTO	M2	80,87	$ 30.100,00	$ 2.434.187,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
3,03	CONCRETO 3000 PSI 210 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	38,77	$ 420.600,00	$ 16.461.786,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
3,08	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	3.298,62	$ 6.300,00	$ 20.784.084,00	3.317,00	$ 27.188.400,00	3.316,00	$ 27.181.200,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 8.200,00	3.317,00	-	$ 27.189.400,00
Subtotal					$ 44.486.638,00		$ 27.188.400,00		$ 27.181.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 8.200,00			$ 27.189.400,00
4	ESTRUCTURA																	
4,01	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS	KLS	11.986,66	$ 17.800,00	$ 213.362.548,00	11.986,66	$ 213.362.548,00	-	$ 0,00		$ 0,00	3.268,00	$ 57.982.400,00	4.490,00	$ 79.864.000,00	7.668,00	4.298,66	$ 136.846.400,00
4,02	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PS + AUTOBOMBA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS.	M3	34,05	$ 542.000,00	$ 18.460.620,00	33,31	$ 18.054.020,00	33,31	$ 18.054.020,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	33,31	-	$ 18.054.020,00
4,03	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	7.721,74	$ 8.200,00	$ 63.318.268,00	8.553,00	$ 70.134.600,00	8.553,00	$ 70.134.600,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	8.553,00	-	$ 70.134.600,00
Subtotal					$ 295.141.436,00		$ 301.551.168,00		$ 88.188.620,00		$ 0,00		$ 57.982.400,00		$ 79.864.000,00			$ 325.035.020,00
5	CUBIERTA																	
5,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	723,54	$ 265.000,00	$ 191.738.100,00	723,54	$ 191.738.100,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	723,54	$ 0,00
5,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS:0.9M	ML	62,00	$ 114.000,00	$ 7.068.000,00	62,00	$ 7.068.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	62,00	$ 0,00
5,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBO SANITARIA DE 4" PVC-S LLUVIAS + ABRAZADERA +	ML	37,84	$ 25.000,00	$ 941.080,00	112,82	$ 2.823.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	112,82	$ 0,00
Subtotal					$ 199.747.180,00		$ 201.629.100,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
6	PISOS																	
6,01	LAVADO DE SUPERFICIE EQUIPO A PRESION	M2	527,00	$ 3.600,00	$ 1.897.200,00	527,00	$ 1.897.200,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	527,00	$ 0,00
6,02	SUMIN. INSTALAC. SIKAFLEX 401 PAVEMENT SL + SIKAROAD IP 1M" (6 MM) O SIMILAR	ML	373,60	$ 5.200,00	$ 1.942.720,00	373,60	$ 1.942.720,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	373,60	$ 0,00
6,03	REVESTIMIENTO COMPUESTO DE PINTURA BASE ACRILICA Y CUARZO	M2	527,00	$ 94.000,00	$ 49.538.000,00	178,14	$ 16.839.396,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	178,14	$ 0,00
6,04	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA @ 50, OJO 10X10.	M2	594,84	$ 22.000,00	$ 13.088.480,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
Subtotal					$ 66.484.400,00		$ 20.679.296,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
7	SISTEMA SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS																	
7,01	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	61,82	$ 1.000,00	$ 61.820,00	60,00	$ 60.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	60,00	$ 60.000,00	60,00	-	$ 60.000,00
7,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	19,43	$ 17.000,00	$ 279.310,00	19,48	$ 280.180,00	-	$ 0,00	3,00	$ 51.000,00	3,00	$ 51.000,00	6,00	$ 102.000,00	6,00	10,48	$ 102.000,00
7,04	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	6,09	$ 22.000,00	$ 133.760,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,05	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	6,09	$ 58.500,00	$ 355.650,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,06	TUBERIA PVC SANITARIA 6"-(INCLUYE ACCESORIOS)	ML	84,71	$ 36.000,00	$ 1.969.560,00	63,00	$ 2.268.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	63,00	$ 0,00
7,07	TUBERIA PVC SANITARIA 8"-(INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60,89	$ 54.000,00	$ 2.748.060,00	40,00	$ 2.160.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	40,00	$ 0,00
7,08	ABRAZADERAS 4"	UND	13,00	$ 22.000,00	$ 284.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,09	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.0M	UND	2,00	$ 390.000,00	$ 780.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,1	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.2M	UND	1,00	$ 468.000,00	$ 468.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 780.000,00	2,00	($ 780.000,00)	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,11	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.5M	UND	3,00	$ 585.000,00	$ 1.189.500,00	7,00	$ 4.185.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
7,12	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO	ML	6,00	$ 560.000,00	$ 3.360.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 1.190.000,00	2,00	5,00	$ 1.190.000,00
7,13	CONEXION DOMICILIARIA	UND	1,00	$ 238.000,00	$ 238.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
Subtotal					$ 12.219.340,00		$ 8.933.180,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 831.000,00		$ 521.000,00			$ 1.362.000,00

9	PROYECTO ELECTRICO Y DE ILUMINACION COMPLETO																						
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO PARA 2 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 112.000,00	$ 112.000,00	1,00	$ 112.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	1,00	$ 0,00
	ILUMINACION																						
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	1,00	$ 326.000,00	$ 326.000,00	1,00	$ 326.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN	UND	12,00	$ 130.000,00	$ 1.560.000,00	12,80	$ 1.340.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	1,00	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA AREA 1,	UND	12,00	$ 3.100.000,00	$ 37.200.000,00	12,80	$ 37.280.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	12,80	$ 0,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3 Ø 12 THHN/THWN 90° 600V (1P+1N+1T)	ML	70,00	$ 39.000,00	$ 2.730.000,00	78,90	$ 2.730.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	12,00	$ 0,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT 3/4 "	ML	85,00	$ 16.000,00	$ 1.091.000,00	95,00	$ 1.901.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	70,00	$ 0,00
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	85,00	$ 0,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO COPPERWELD 2.44M	UND	1,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	1,00	$ 246.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA SPT	UND	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1,00	$ 180.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	1,00	$ 0,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA	GL	1,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	1,00	$ 340.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	1,00	$ 0,00
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1 Ø 12	ML	8,00	$ 115.000,00	$ 920.000,00	8,00	$ 920.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	8,00	$ 0,00
9,11	SUMINISTRO E INSTAL PRODUCTO QUÍMICO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	GL	1,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	1,00	$ 560.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	1,00	$ 0,00
Subtotal					$ 46.293.000,00		$ 46.293.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
8	PAISAJISMO Y ZONAS VERDES																						
8,01	TIERRA NEGRA PARA VEGETACION E= 10CM SUMINISTRO E INSTALACION	M3	9,57	$ 25.000,00	$ 239.250,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
8,02	PRADO TRENZA SUMINISTRO E INSTALACION	M2	63,80	$ 9.700,00	$ 623.660,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-	$ 0,00
Subtotal					$ 861.250,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ 47.154.250,00		$ 46.293.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
COSTO DIRECTO					$ 47.154.250,00		$ 46.293.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
ADMINISTRACION			10%	$ 4.715.425,00	$ 4.715.425,00		$ 4.629.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
UTILIDAD			0%	$ -	$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ 51.869.675,00		$ 50.922.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
COSTO DIRECTO					$ 51.869.675,00		$ 50.922.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
ADMINISTRACION			10%	$ 5.186.967,50	$ 5.186.967,50		$ 5.092.230,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
UTILIDAD			0%	$ 31.894.295,00	$ 31.894.295,00		$ 28.617.707,20		$ 4.165.764,20		$ 121.843,91		$ 1.990.346,80		$ 2.598.694,89			$ 6.731.081,35
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ 89.050.937,50		$ 84.632.237,20		$ 4.165.764,20		$ 121.843,91		$ 1.990.346,80		$ 2.598.694,89			$ 6.731.081,35
COSTO DIRECTO					$ 89.050.937,50		$ 84.632.237,20		$ 4.165.764,20		$ 121.843,91		$ 1.990.346,80		$ 2.598.694,89			$ 6.731.081,35
ADMINISTRACION			10%	$ 8.905.093,75	$ 8.905.093,75		$ 8.463.223,72		$ 416.576,42		$ 12.184,39		$ 199.034,68		$ 259.869,49			$ 673.108,14
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -
UTILIDAD			0%	$ 21.372.225,00	$ 21.372.225,00		$ 20.311.736,93		$ 1.000.383,41		$ 29.242,54		$ 477.683,23		$ 623.686,78			$ 1.615.945,94
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ 119.328.256,25		$ 113.407.197,85		$ 5.582.724,03		$ 163.270,84		$ 2.667.064,71		$ 3.482.250,16			$ 9.020.135,43
COSTO DIRECTO					$ 119.328.256,25		$ 113.407.197,85		$ 5.582.724,03		$ 163.270,84		$ 2.667.064,71		$ 3.482.250,16			$ 9.020.135,43
ADMINISTRACION			10%	$ 11.932.825,63	$ 11.932.825,63		$ 11.340.719,79		$ 558.272,40		$ 16.327,08		$ 266.706,47		$ 348.225,02			$ 902.013,54
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -
UTILIDAD			0%	$ 28.638.781,50	$ 28.638.781,50		$ 27.217.727,48		$ 1.339.853,77		$ 39.185,00		$ 640.095,53		$ 835.740,04			$ 2.164.832,50
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ 159.899.863,38		$ 151.965.645,12		$ 7.480.850,20		$ 218.782,92		$ 3.573.866,71		$ 4.666.215,22			$ 12.086.981,47
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS NO PREVISTAS																						
10,01	COMPENSACION AMBIENTAL RAICES SAMAN	GL		$ 2.415.000,00	$ 0,00	1,00	$ 2.415.000,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.415.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	-	$ 2.415.000,00
10,02	DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 220W EN LAMPARAS EXIST.	GL		$ 100.320,00	$ 0,00	1,00	$ 100.320,00	-	$ 0,00	1,00	$ 100.320,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	-	$ 100.320,00
10,03	DESMONTE Y REBTLACION DE MOBILIARIO EXISTENTE	UND		$ 44.638,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	-	$ -
10,04	DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDEN (LADO NORTE CANCHA)	M2		$ 64.730,00	$ 0,00	4,60	$ 297.758,00	-	$ 0,00	4,60	$ 297.758,00		$ 0,00		$ 0,00	4,60	-	$ 297.758,00
10,05	LIMPIEZA, DESMONTE E INSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUBBARBANTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA	M2		$ 46.033,00	$ 0,00	28,00	$ 1.800.926,00	-	$ 0,00	35,00	$ 1.800.926,00		$ 0,00		$ 0,00	28,00	-	$ 1.800.926,00
10,06	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA CON BANA AL 1,80 %	M3		$ 134.000,00	$ 0,00	4,31	$ 577.691,00	-	$ 0,00	4,31	$ 577.691,00		$ 0,00		$ 0,00	4,31	-	$ 577.691,00
10,07	SOLADO LIMPIEZA ESPESOR E=0,05M 2500PSI 14MPA	M2		$ 22.626,00	$ 0,00	69,87	$ 1.829.822,00	-	$ 0,00	69,87	$ 1.829.822,00		$ 0,00		$ 0,00	69,87	-	$ 1.829.822,00
10,08	CONCRETO 4000 PSI 280 MPA / CONGRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS IN SITU	M3		$ 506.625,89	$ 0,00	38,98	$ 19.709.264,00	-	$ 0,00	38,98	$ 19.709.264,00		$ 0,00		$ 0,00	38,98	-	$ 19.709.264,00
10,9	DESARME ACERO REFUERZO LONGITUDINAL 3 COLUMNAS 60000 PSI FY = 420 MPA	UND		$ 4.802.757,00	$ 0,00	1,00	$ 4.802.757,00						$ 4.802.757,00	1,00	$ 0,00	1,00	-	$ 4.802.757,00
10,10	REARME ACEROS LONGITUDINALES 3 COLUMNAS 60000 PSI FY= 420 MPA	UND		$ 9.310.950,00	$ 0,00	1,00	$ 9.310.950,00						$ 9.310.960,00	1,00	$ 0,00	1,00	-	$ 9.310.960,00
10,11	ALQUILER FORMALETA METÁLICA 3 COLUMNAS, 3 VIGAS AEREAS Y SOPORTE VIGAS AEREAS MIN 45 DÍAS	DÍA		$ 691.109,00	$ 0,00	30,00	$ 20.733.000,00						$ 20.733.000,00	30,00	$ 0,00	30,00	-	$ 20.733.000,00
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ -		$ 61.455.648,00		$ -		$ 30.500.576,00		$ 34.846.707,00		$ -			$ 125.511.280,00
COSTO DIRECTO					$ -		$ 46.104.510,00		$ -		$ 27.977.160,00		$ 31.951.188,00		$ -			$ 115.032.852,00
ADMINISTRACION			10%	$ -	$ -		$ 15.324.648,00		$ -		$ 2.523.416,00		$ 2.895.519,00		$ -			$ 10.478.428,00
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -
UTILIDAD			0%	$ -	$ -		$ 1.965.990,97		$ -		$ 661.490,58		$ 1.115.994,62		$ -			$ 3.955.191,34
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ -		$ 63.421.638,97		$ -		$ 31.161.666,58		$ 35.962.701,62		$ -			$ 130.546.007,34
COSTO DIRECTO					$ -		$ 63.421.638,97		$ -		$ 31.161.666,58		$ 35.962.701,62		$ -			$ 130.546.007,34
ADMINISTRACION			10%	$ -	$ -		$ 6.342.163,90		$ -		$ 3.116.166,66		$ 3.596.270,16		$ -			$ 13.054.600,73
IMPREVISTOS			0%	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -
UTILIDAD			0%	$ -	$ -		$ 11.852.280,29		$ -		$ 5.822.783,25		$ 6.719.794,78		$ -			$ 24.394.858,32
SUB TOTAL CONSTRUCTORA (COSTO DIRECTO MAS ADMINISTRACION)					$ -		$ 81.616.083,16		$ -		$ 40.100.616,49		$ 46.278.766,56		$ -			$ 167.995.466,39

JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
CC.1.096.636.952 B/barmeja
Representante Legal
TECNIBA SAS
NIT 800.074.273-3

DIRECTOR RESIDENTE INTERVENTORIA
MARÍA VICTORIA RENDON
MAURICIO CASTRO SORIANO

REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD CONTRATANTE
CARLOS ANDRES REYES KURI
GERENTE IMDER PALMIRA


INFORME DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA / TECNISA / AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	
Ing Civil	Juan David Maqueira
Vigila Obra	Darley Villada
Personal de Obra	Agroindustrial Montajes GV

1 LOCALIZACION



DESCRIPCION

Soldado y armado de cercha 1 100%, CON MONTAJE

Soldado y armado de cercha 2 100%, CON MONTAJE

Soldado y armado de cercha 3 100%, CON MONTAJE

Soldado y armado de cercha 4 50% SIN MONTAJE

Platinas y pernos de anclaje para las 3 respectivas cerchas

68 Correas 22.85x6.35cm
TENSORES, PORTACORREAS Y ANGULOS 1 1/2 X1/8"


5 MEMORIA GRAFICA Y DE CÁLC **EJECUTADO** **100%** **ACERO ASTM A36** ✔

Tipo de perfil	# de perfil	Longitud [mm]	Peso [Kg]
L 4"X5/16"	1	3959	69.72
L 2 1/2"X3/16"	2	1556	8.94
L 4"X5/16"	3	11376	181.77
L 4"X5/16"	4	11376	181.77
L 4"X5/16"	5	9251	147.81
L 4"X5/16"	6	9251	147.81
L 2 1/2"X3/16"	7	1482	8.67
L 2 1/2"X3/16"	8	1482	8.67
L 2 1/2"X3/16"	9	1775	10.38
L 2 1/2"X3/16"	10	1181	6.91
L 2 1/2"X3/16"	11	805	4.71
L 2 1/2"X3/16"	12	823	4.81
L 2 1/2"X3/16"	13	803	4.70
L 2 1/2"X3/16"	14	771	4.51
L 2 1/2"X3/16"	15	803	4.70
L 2 1/2"X3/16"	16	1064	6.22
L 2 1/2"X3/16"	17	719	4.21
L 2 1/2"X3/16"	18	1179	6.87
L 2 1/2"X3/16"	19	1181	6.91
L 2 1/2"X3/16"	20	805	4.71
L 2 1/2"X3/16"	21	803	4.81
L 2 1/2"X3/16"	22	803	4.70
L 2 1/2"X3/16"	23	771	4.51
L 2 1/2"X3/16"	24	803	4.70
L 2 1/2"X3/16"	25	1064	6.22
L 2 1/2"X3/16"	26	719	4.21
L 4"X5/16"	27	1616	25.60
L 2 1/2"X3/16"	28	177	1.04
L 2 1/2"X3/16"	29	551	3.22
L 4"X5/16"	30	567	8.98
L 4"X5/16"	31	1090	17.27
L 4"X5/16"	32	1069	17.27
L 4"X5/16"	33	567	8.98
L 2 1/2"X3/16"	34	551	3.22
L 2 1/2"X3/16"	35	177	1.04
L 4"X5/16"	36	1616	25.60
		TOTAL [Kg]	959.30

# de cercha	% Completado	Peso [Kg]
Tipo A	45%	431.64
Tipo B	55%	527.56
Tipo C	75%	719.4
Tipo D	50%	479.6
Tipo E	30%	287.76
Tipo F	0%	0
	Total [Kg]	2446.96

ELEMENTOS	UBICACION	Peso [Kg]
PERNOS 3/8"	3 CERCHAS	69.39
PERNOS 5/8"	3 CERCHAS	97.53
ANGULO 1 1/2 x 1/8"	5 ejes	195.9
PORTACORREAS	6 CERCHAS	240.97
TENSORES		307.692
CORREAS 22.85X6.35cmX3mm	CERCHAS	1052.63
	Total [Kg]	1984.112

TOTAL ACERO ASTM A36 POR FACTURAR [Kg]	4430

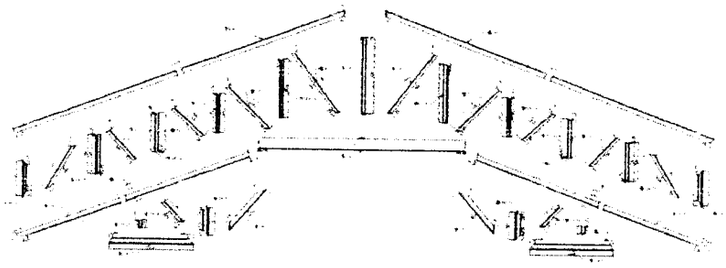

diegoparra@arquitecto.com

TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S

NIT: 800.074.273-3

TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S. - TECNISA S.A.S.

Dir: CL 71 27B 12 IN 1
Tel:6114286-3165294341
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: jtecnisa@yahoo.com

NIT 800074273-3
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN RENTA: ORDINARIO AGENTE RETENEDOR EN LA FUENTE CIIU: 7110

Resolución DIAN N° 18764036925023 del 28/09/2022 valida desde 28/09/2022 Hasta 28/09/2023, Numeración Autorizado del FETE117 al FETE240

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FETE169**

Señor(es)
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA
NIT: 815000340-6
CALLE 27 35 00
Tel:
imderpal@gmail.com
VERSALLES - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
23/08/2023 05:24 PM		

Condición/Forma de pago			Remision/Pedido #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	308-2022
Crédito	Transferencia Débito Bancaria	22/09/2023	

Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Valor Total
Obra0	CERRAMIENTO TELA FIB	0.12	unidad	$9,600.00	$1,152.00
Obra0	LOCALIZACION -REPLANTEO OBRA	0.06	unidad	$4,000.00	$240.00
Obra0	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTO	33.10	unidad	$13,760.00	$455,456.00
Obra0	ACERO REFUERZO FLEJADO	1.00	unidad	$6,560.00	$6,560.00
Obra0	ACERO ESTRUCTURAL ASTMA-36+ANCLAJES+TORNILLOS	4430.00	unidad	$14,240.00	$63,083,200.00
Obra0	LOZALIZACION-REPALNTEO PARQUES-Z VERDES	60.00	unidad	$800.00	$48,000.00
Obra0	EXCAVACION TIERRA A MANO	3.00	unidad	$13,600.00	$40,800.00
Obra0	CAJA DE INSPECION EN MAMPOSTERIA	1.00	unidad	$328,000.00	$328,000.00
AIU-ADMIN	Administracion 21%	1.00	unidad	$13,432,316.00	$13,432,316.00
AIU-UTILI	Utilidad 4%	1.00	unidad	$2,558,536.00	$2,558,536.00

Son: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$79,954,260.00
Base Imponible	$0.00
Total Factura	$79,954,260.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30615441883 a nombre de TECNICOS ESPECIALISTAS Y INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS

Enviar copia de pago a correo: jtecnisa@yahoo.com

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Comprador y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura Electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008.

CODIGO CUFE

354e4a502b5db3d183d4959c0e47dac8be4129b22644fe7f770cba21582208f0d94d25ca1ba17ed6877faf0f089b3506b

Documento Generado por: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ NIT 91.231.130-7 SOFTWARE JALT www.softwarejalt.com / P.T. Carvajal IT S.A.S www.carvajalit.com

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	No. 308-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"
CONTRATISTA	TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
VALOR INICIAL	SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL Y UN PESO M/CTE ($687.009.001)
PLAZO	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REINICIO	08 DE MAYO 2023

FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JULIO 2023
MAIL	jtecnisa@yahoo.com, proyectos@tecnisa.com.co

1. INTRODUCCION

El siguiente informe técnico N°002 contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada, durante el periodo comprendido entre el 8 de mayo al 17 de mayo por parte del contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** representada legalmente por el señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**, ejecutor del Contrato de Obra **No. 308-2022**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD,** y del **CONSORCIO UNION**

2 RESUMEN EJECUTIVO

El contrato de Obra No. 308-2022 tiene un plazo de ejecución comprendido según el reinicio de obra **entre el 08 mayo hasta el 31 de Agosto**, tiempo durante el cual el contratista de obra deberá realizar las diferentes actividades contractuales conforme a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad y de esta manera dar total cumplimiento al objeto contractual.

. En cuanto al avance de obra acumulado se tiene que hasta el cierre del presente control de avance (17 de mayo) según lo estipulado como actividades a realizar según el reinicio y prorroga, en el proyecto se evidencia una **ejecución del 65%.**

3 LOCALIZACION GENERAL

Las obras por desarrollar en el contrato de obra **No 308-2022**, se localizan en el municipio de Palmira, el cual se ubica dentro de la región sur del valle del Cauca, sobre las coordenadas 3°31´48" de latitud norte y 76°81´13" de la longitud al oeste0020X2xzzde Greenwich. Colinda al norte con el municipio de El Cerrito, al este con el departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes., La obra se ubica en el casco urbano del municipio en el polideportivo barrio el recreo con dirección - carrera 24 # 19 – 91. Frente al coliseo de ferias de Palmira.

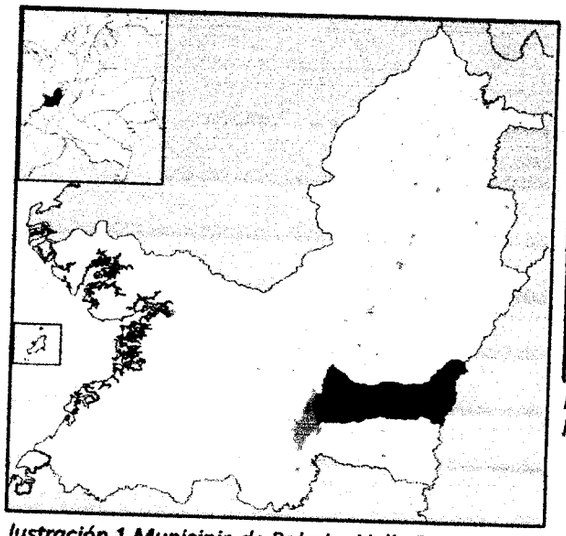


Ilustración 1 Municipio de Palmira Valle Fuente: Wikipedia

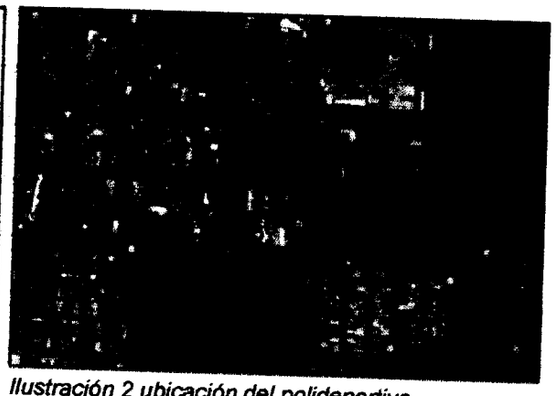


Ilustración 2 ubicación del polideportivo
Fuente: Google maps

4 ACTIVIDADES REALIZADAS:

4.1 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS

Soporte: HASTA LA FECHA DE CORTE SE HAN REALIZADO TRES CERCHA AL 100% CON SU RESPECTIVO MONTAJE Y UNA CERCHA EN PISO AL 100%. PARALELAMENTE SE HAN INSTALADO PLATINAS, TORNILLOS Y ANCLAJES PARA TODAS LAS COLUMNAS.







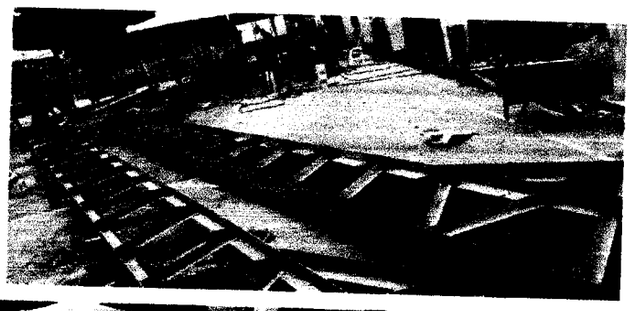




Ilustración 3,4,5,6,7,8 y 9: Cerchas armadas y soldadas en el suelo, platinas, ménsulas, pernos.

4.2 CONCRETO PREMEZCLADO 4000PSI+ AUTOBOMBA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS

Soporte: FUNDICIÓN DE TODAS LAS COLUMNAS CON CONCRETO PREMEZCLADO 4000PSI CON SUS RESPECTIVAS VIGAS AEREAS

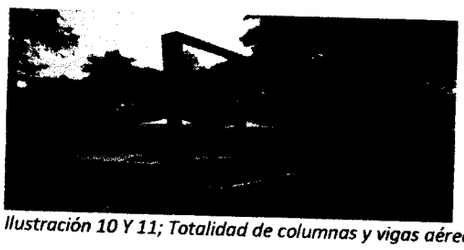



Ilustración 10 Y 11; Totalidad de columnas y vigas aéreas fundidas.

4.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION

Soporte: EL CORTE, FLEJADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO SE REALIZÓ PARA LAS 12 COLUMNAS EN UN 100% ESTE PROCESO DE AVANCE PARA VIGAS AEREAS SE COMPLETÓ IGUALMENTE EN UN 100%.





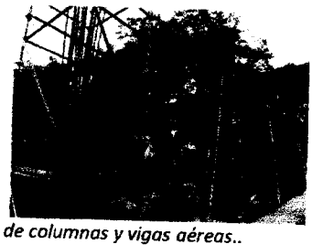


Ilustración 12, 13, 14, 15 y 16. Cortado, flejado y armado de columnas y vigas aéreas..

7.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARQUES Z VERDES

Soporte: SE REALIZA LA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DE LAS EXCAVACIONES Y DEL DISEÑO APROBADO EN ACTA DE MODIFICACIÓN #2.




Ilustración 17 y 18. Localización nuevo diseño y excavación.

7.02 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO

Soporte: SE REALIZA PARCIALMENTE LA EXCAVACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE DESAGUE EJE 2, SOPORTE ITEM ANTERIOR (ILUSTRACIONES 17 Y 18).

7.11 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA H=1.5M

Soporte: SE REALIZAN LAS TAPAS DE ESTAS CAJAS DE DIMENSIONES 70X70 CM.



Ilustración 19. Tapas de cajas de inspección.

10.1 COMPENSACION AMBIENTAL RAICES SAMAN

Soporte: COMPENSACIÓN AMBIENTAL AL SAMAN QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA SUR ORIENTAL Y EL CUAL CUENTA CON RAICES MUY GRANDES Y PROFUNDAS, DONDE SE CORTARON ESTAS RAICES QUE ALCANZABAN EL HUECO DE LA ZAPATA LONGITUDINALMENTE Y SE APLICÓ CICATRIZANTE SEGÚN CRITERIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL.



Ilustración 20, 21, 22 y 23. Compensación ambiental.

10.2 DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 220W EN LAMPARAS EXIST.

Soporte: AL INICIAR LAS EXCAVACIONES DE LA CANCHA SE ENCUENTRAN 4 POSTES PERIMETRALES A LA CANCHA CON LUMINARIAS DE 220W, CADA POSTE CON CAJAS DE CONCRETO Y LINEAS DE CABLEADO #10 ENTERRADAS, SE COORDINA CON ALUMBRADO PÚBLICO PARA DESENERGIZAR ESTOS CABLES Y RETIRAR ESTO.



Ilustración 24,25,26,27. Desmonte cableado

10.3 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE

Soporte: SE ENCUENTRAN 4 SILLAS DE CONCRETO Y 4 BASURAS EN LÁMINA, SEMBRADOS CON CONCRETO EN TERRENO NATURAL, UBICADOS JUSTOS EN LAS ÁREAS EN DONDE SE DEBERÍAN REALIZAR LAS EXCAVACIONES.

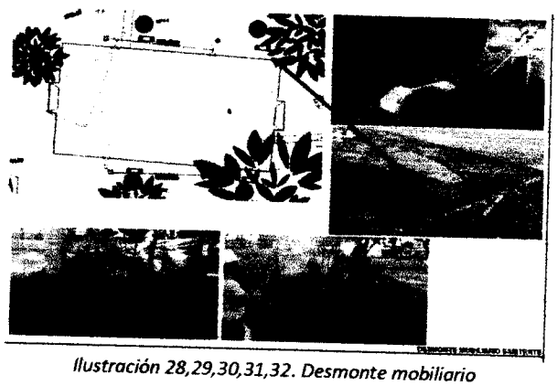


Ilustración 28,29,30,31,32. Desmonte mobiliario

10.4 DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDEN (LADO NORTE CANCHA)

Soporte: EN EL LADO NORTE DE LA CANCHA SE ENCUENTRA UN ANDÉN DE ACCESO, QUE SE UBICA JUSTO POR DONDE PASARAN LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO. EL TRAMO DEL ANDÉN DEBE SER DEMOLIDO Y RETIRADO SUS ESCOMBROS, POSTERIORMENTE DEBE SER RECONSTRUIDO.

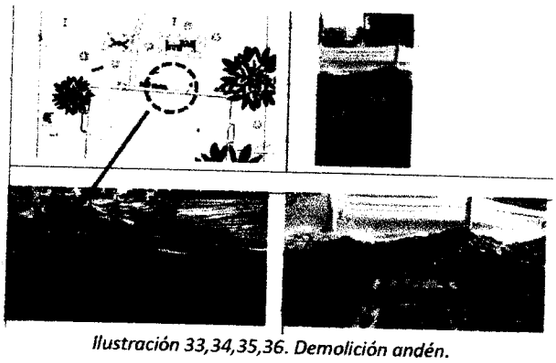


Ilustración 33,34,35,36. Demolición andén.

10.5 LIMPIEZA, DESMONTE E INSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUBBARSANTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA

Soporte: EN EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE POR LA CARRERA 24, SE OBSERVA UN PISO EN ADOQUINES QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL INGRESO DE VEHÍCULOS A LA OBRA SI NO SE RETIRAN.

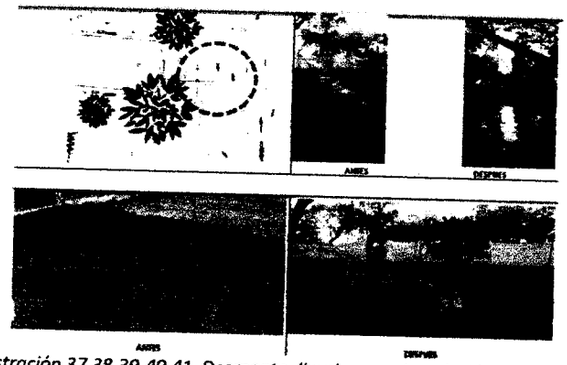


Ilustración 37,38,39,40,41. Desmonte, limpieza y reinstalación adoquines.

10.7 SOLADO LIMPIEZA ESPESOR E=0.05M 2000PSI 14MPA

Soporte: EL SOLADO Y LA FUNDICIPON DE LA CIMENTACIÓN SE REALIZÓ EN 2 ETAPAS, PRIMERO SE FUNDIERON LAS DEL EJE A Y DESPUÉS LAS DEL EJE B.




Ilustración 42, 43. Solado de limpieza, vigas de cimentación y zapatas.

10.8 CONCRETO 4000 PSI 28 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS IN SITU

Soporte: SE REALIZÓ CAMBIO EN EL DISEÑO ORIGINAL DE CONCRETO DE 3000 PSI POR UNO DE 4000 PSI SEGÚN PETICIÓN DEL CLIENTE.






Ilustración 44, 45, 46 y 47. Fundición de concreto 4000 psi para la cimentación.

Soporte: EL DESARME DEL REFUERZO LONGITUDINAL DE LAS COLUMNAS SE REALIZÓ SEGÚN PETICIÓN DEL CLIENTE. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ PARA 3 COLUMNAS.



Ilustración 48 y 49. Desarme y rearme acero de refuerzo longitudinal.

10.10 REARME ACEROS LONGITUDINALES 3 COLUMNAS 60000 PSI FY= 420 MPA

Soporte: EL REARME DE LOS ACEROS LONGITUDINALES SE REALIZÓ SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN INDICADA POR EL CLIENTE, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ PARA 3 COLUMNAS.




Ilustración 50 y 51: Desarme y rearme acero de refuerzo longitudinal.

10.11 ALQUILER FORMALETA METÁLICA 3 COLUMNAS, 3 VIGAS AEREAS Y SOPORTE VIGAS AEREAS.

Soporte: LAS FORMALETAS SE SOLDARON, PERFORARON Y ARMARON EN TALLER PERO SE ENSAMBLARON EN OBRA.





Ilustración 52, 53 y 54. Fabricación formaletas.

Gracias por su atención, atentamente;

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA (IMDER)
SISTEMA DE GESTIÓN
INFORME DE AVANCE DE OBRA

FECHA	2023/8/20	SEMANA No.	15 AL 16	DEL	2023/7/17	AL	2023/8/20

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA No 001-2022, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREO PALMIRA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PARQUE INFANTIL DE EL RECREO - CARRERA 24 # 18 - 91 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRATO No.:	MINC-001-2022		CONTRATO No.:	308-2022	
INTERVENTOR	MAURICIO CASTRO BORJANO		CONTRATISTA	CARLOS ANDRES REYES KURI	
PLAZO INICIAL:	68 DIAS		PLAZO INICIAL:	85 DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN ANTERIOR:	14/10/2022		FECHA DE INICIACIÓN ANTERIOR:	14/10/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR:	31/01/2023		FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR:	31/01/2023	
FECHA DE INICIACIÓN ACTUAL:	14/04/2023		FECHA DE INICIACIÓN ACTUAL:	8/05/2023	
**PRORROGA 1:	7/07/2023		**PRORROGA 1:	17/07/2023	
**PRORROGA 2:	17/07/2023		**PRORROGA 2:	31/08/2023	
**PRORROGA 3:	31/08/2023		**PRORROGA 3:	N/A	
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/01/2023		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/01/2023	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	14/04/2023		**FECHA DE REINICIACIÓN:	8/05/2023	
PLAZO ANTERIOR EN DIAS:	106		PLAZO ANTERIOR EN DIAS:	106	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/08/2023		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/08/2023	
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS:	139		PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS:	115	
PLAZO TRANSCURRIDO:	126 EQUIVALE AL 92%		PLAZO TRANSCURRIDO:	104 EQUIVALE AL 90%	
VALOR INICIAL :	$ 28.384.061,00		VALOR INICIAL :	$ 867.009.001,00	
VALOR ADICION(ES):	$ -		VALOR ADICION(ES):	$	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 28.384.061,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 867.009.001,00	
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	$ 254.363.309,00	
VALOR POR PAGAR:	$ 28.384.061,00		VALOR POR PAGAR:	$ 432.645.791,90	
SUPERVISOR IMDER PALMIRA:	CLEMENCIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARIA VICTORIA RENDON OSORIO	

2. CONTROL DE ACTIVIDADES, RUTA CRITICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO (NO ALTERAR LA FORMULA)
	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30/03/2023	8/05/2023	26/05/2023	-12
1	REINICIO DE OBRA - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	8/05/2023	2/07/2023	-55
2	CIMENTACIÓN	8/05/2023	8/05/2023	0
3	FABRICACIÓN DE CASTILLOS PARA COLUMNAS, VIGAS AEREAS Y FUNDICIÓN CONCRETO 4000 PSI	31/05/2023	21/06/2023	10
4	FABRICACIÓN DE 8 CERCHAS EN ÁNGULO	1/06/2023	18/06/2023	-17
5	FABRICACIÓN DE SOPORTES ENTRE CORREAS	29/06/2023	29/06/2023	0
6	CUBIERTA POLIDEPORTIVO	29/06/2023	29/06/2023	0
7	TUBERIA HIDRAULICA			no iniciado
8	SISTEMA ELECTRICO			no iniciado
9	DEMARCACIÓN CANCHA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON			no iniciado
10	ZONAS VERDES			no iniciado
	NO PREVISTOS (NPs)			no iniciado
11	DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 220W EN LAMPARAS EXIST.			no iniciado
12	DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDEN (LADO NORTE CANCHA)			no iniciado
13	LIMPIEZA, DESMONTE E INSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUBGRASANTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA			no iniciado
14	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA AL 1,30 %	17/10/2022	15/11/2022	-29
15	SOLADO LIMPIEZA ESPESOR E=0.05M 2500PSI 14MPA	17/10/2022	15/11/2022	-29
16	CONCRETO 4000 PSI 280 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS IN SITU	17/10/2022	15/11/2022	-28
17	DESARME ACERO REFUERZO LONGITUDINAL 3 COLUMNAS 60000 PSI FY = 420 MPA	27/06/2023	30/06/2023	-3
18	REARME ACEROS LONGITUDINALES 3 COLUMNAS 60000 PSI FY= 420 MPA	27/06/2023	30/06/2023	-3
19	ALQUILER FORMALETA METÁLICA 3 COLUMNAS, 3 VIGAS AEREAS Y SOPORTE VIGAS AEREAS MIN 45 DÍAS	27/06/2023	30/06/2023	-3
20	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ITO OBLIGATORIO)			no iniciado

*** Insertar las filas que requiera según el número de actividades de la ruta crítica teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 actividades adicionales a las siguientes de inicio y terminación.

Se realiza la gestion de cobro para el corte No 4 del contratista, por un valor de $ 79.954.260
Teniendo en cuenta las actividades realizadas tanto en campo como en talleres, se calcula a la fecha el siguiente avance

No.	INDICADORES PRESUPUESTALES - AVANCE FISICO	VALORES	PORCENTAJE	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	450.938.120,29	66%	16%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	563.385.843,57	82%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registra la situación problemática identificada y describe las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad Industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

PROGRAMACION, CRONOGRAMA: DE ATRASO A LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESENTAN UN ATRASO DEL 16%
CALIDAD DE LOS TRABAJOS:
MANEJO AMBIENTAL: CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS.
SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL: CUENTAN CON SG-SST, EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, CUMPLE CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EXIGIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD.
ASPECTOS SOCIALES:

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SE SOLICITA LA CONTRATISTA EL ARREGLO DE LAS COLUMNAS, CON UN ACABADO ES DE CONCRETO A LA VISTA	TECNISA	28-ago-23
ACTA DE COBRO - CORTE No 4 CONTRATISTA	INTERVENTORIA	22-ago-23

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA (IMDER)
SISTEMA DE GESTIÓN

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FECHA	2023/8/20	SEMANA No.	15 AL 19	DEL	2023/7/17	AL	2023/8/20

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para este periodo no se presenta ningun Item no previsto. Continuan los anteriores, enumerados en el siguiente listado

10.01	COMPENSACION AMBIENTAL RACES SAMAN	1.00	$ 2,415,000.00
10.02	DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 22OW EN LAMPARAS EXIST	1.00	$ 108,320.00
10.03	DESMONTE Y REINSTALACION DE MOBILIARIO EXISTENTE	4.00	$ 179,312.00
10.04	DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDEN (LADO NORTE CANCHA)	4.88	$ 267,566.00
10.05	LIMPIEZA, DESMONTE E INSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUBBARSANTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA	25.00	$ 1,500,825.00
10.06	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA AL 1.30 %	4.31	$ 577,691.00
10.07	BOLADO LIMPIEZA ESPESOR E=0.05M 2000PSI 14MPA	80.87	$ 1,909,322.00
10.08	CONCRETO 4000 PSI 280 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS IN SITU	39.98	$ 19,709,204.00
10.9	DESARME ACERO REFUERZO LONGITUDINAL 3 COLUMNAS 60000 PSI FY = 420 MPA	1.00	$ 4,802,757.00
10.10	REARME ACEROS LONGITUDINALES 3 COLUMNAS 60000 PSI FY= 420 MPA	1.00	$ 8,310,960.00
10.11	ALQUILER FORMALETA METÁLICA 3 COLUMNAS, 3 VIGAS AEREAS Y SOPORTE VIGAS AEREAS MIN 45 DIAS	30.00	$ 28,733,080.00

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (MINIMO 6 FOTOS)



DESCRIPCIÓN: (Fundida de vigas aereas)



DESCRIPCIÓN: (Instalacion de tubería sanitaria)



DESCRIPCIÓN: (Fundida de columnas)



DESCRIPCIÓN: (Retiro de formaleta de columnas)



DESCRIPCIÓN: (Prueba de tintas penetrantes para soldaduras)



DESCRIPCIÓN: (Montaje de cerchas para cubiertas)

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: MARIA VICTORIA RENDON OSORIO
CARGO: DIRECTOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA

V.B. SUPERVISOR IMDER PALMIRA O APOYO A LA SUPERVISION
NOMBRE: CLEMENCIA DEL PILAR MARTINEZ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173898882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2077791800	9450865656	E	2023/05/12	2023/05/12	BANCOLOMBIA	0	$1,550,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso/Retiro/Tas/Cdp/Tap/Vsp/Cor/Vst/Sln/Ige/Lma/Vac/Avp/Vct/Irl/Vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSITORIOS (3 Afiliados)							$5,005,633	$801,000			$5,005,633	$200,300			$5,005,633	$200,300			$5,005,633		$348,600		$0	$0		$1,550,200
Centro de Trabajo: RIESGO V (2 Afiliados)							$3,845,633	$615,400			$3,845,633	$153,900			$3,845,633	$153,900			$3,845,633		$267,800		$0	$0		$1,191,000
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (2 Afiliados)							$3,845,633	$615,400			$3,845,633	$153,900			$3,845,633	$153,900			$3,845,633		$267,800		$0	$0		$1,191,000
1	CC	16264464	MOLINA HERIBERTO	X	25-14	30	$2,206,167	$353,000	EPS037	30	$2,206,167	$88,300	CCF57	30	$2,206,167	$88,300	14-11	30	$2,206,167	6.960%	$153,680	30	$0	$0	SI	$683,280
2	CC	1113629973	VILLADA DURLEY	X	23030 1	30	$1,639,466	$262,400	EPS037	30	$1,639,466	$65,600	CCF57	30	$1,639,466	$65,600	14-11	30	$1,639,466	6.960%	$114,200	30	$0	$0	SI	$507,800
Centro de Trabajo: RIESGO VI (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
3	CC	1006324417	MONTAÑO KEVIN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(3)							$5,005,633	$801,000			$5,005,633	$200,300			$5,005,633	$200,300			$5,005,633		$348,600		$0	$0		$1,550,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173898882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2077791800	9450865656	E	2023/05/12	2023/05/12	BANCOLOMBIA	0	$1,550,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$801,000	$0	$0	$801,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$353,000	$0	$0	$353,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$348,600	$0	$0	$348,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$348,600	$0	$0	$348,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$200,300	$0	$0	$200,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$200,300	$0	$0	$200,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$200,300	$0	$0	$200,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,900	$0	$0	$153,900
TOTAL				3	$1,550,200	$0	$0	$1,550,200

2023/05/15 04:14 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173698882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2142844487	94523364S3	E	2023/06/14	2023/06/20	BANCOLOMBIA	6	$6,339,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				HOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingreso	Retiro	Tda	Sde	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Evp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSITORIOS (16 Afiliados)																						$19,342,196	$3,095,600			$21,398,873	$856,800			$21,294,473	$852,600			$21,398,873		$1,490,100		$0	$0		$6,295,100
Centro de Trabajo: RIESGO V (10 Afiliados)																						$11,538,639	$1,846,600			$13,595,316	$544,600			$13,595,316	$544,600			$13,595,316		$946,800		$0	$0		$3,882,200
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (10 Afiliados)																						$11,538,639	$1,846,600			$13,595,316	$544,600			$13,595,316	$544,600			$13,595,316		$946,800		$0	$0		$3,882,200
1	CC	6312584	CAICEDO JULIAN	X							X									25-14	30	$2,009,625	$321,600	EPS018	30	$2,009,625	$80,400	CCF57	30	$2,009,625	$80,400	14-11	30	$2,009,625	6.960%	$139,900	30	$0	$0	SI	$632,300
2	CC	1114455154	CAMACHO JONATHAN								X									23030 1	30	$1,567,827	$250,900	ESSC18	30	$1,567,827	$62,800	CCF57	30	$1,567,827	$62,800	14-11	30	$1,567,827	6.960%	$109,200	30	$0	$0	SI	$485,700
3	CC	1007894016	CASTILLO ADRIAN	X							X									23030 1	30	$1,678,125	$268,500	ESSC18	30	$1,678,125	$67,200	CCF57	30	$1,678,125	$67,200	14-11	30	$1,678,125	6.960%	$116,800	30	$0	$0	SI	$519,700
4	CC	1113692483	CASTRO MICHAEL	X	X						X									23030 1	9	$486,000	$73,000	EPS005	9	$486,000	$18,300	CCF57	9	$486,000	$18,300	14-11	9	$486,000	6.960%	$31,800	9	$0	$0	SI	$141,400
5	PT	3841703	LEDESMA DORYBAL	X							X									25-14	12	$485,500	$77,700	EPS012	12	$485,500	$19,500	CCF57	12	$485,500	$19,500	14-11	12	$485,500	6.960%	$33,800	12	$0	$0	SI	$150,500
6	CC	16164164	MOLINA HERIBER TO								X									25-14	30	$2,159,696	$345,600	EPS037	30	$2,159,696	$86,400	CCF57	30	$2,199,696	$86,400	14-11	30	$2,199,696	6.960%	$150,400	30	$0	$0	SI	$668,400
7	CC	1112224580	SIERRA DAYSURI	X							X									23030 1	13	$698,367	$111,800	ESSC18	13	$698,367	$28,000	CCF57	13	$698,367	$28,000	14-11	13	$698,367	6.960%	$48,700	13	$0	$0	SI	$216,500
8	CC	1114457131	SOLARTE JOHN	X							X									23030 1	13	$610,667	$97,800	ESSC62	13	$610,667	$24,500	CCF57	13	$610,667	$24,500	14-11	13	$610,667	6.960%	$42,600	13	$0	$0	SI	$189,400
9	CC	12096756	TEJADA . OSE								X										0	$0	$0	EPS037	30	$2,056,677	$82,300	CCF57	30	$2,056,677	$82,300	14-11	30	$2,056,677	6.960%	$143,200	30	$0	$0	SI	$307,800
10	CC	1113629973	VILLADA DURLEY								X									23030 1	30	$1,872,832	$299,700	EPS037	30	$1,872,832	$75,000	CCF57	30	$1,872,832	$75,000	14-11	30	$1,872,832	6.960%	$130,400	30	$0	$0	SI	$580,100
Centro de Trabajo: RIESGO VI (6 Afiliados)																						$7,803,557	$1,249,000			$7,803,557	$312,400			$7,699,157	$308,200			$7,803,557		$543,300		$0	$0		$2,412,900
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (6 Afiliados)																						$7,803,557	$1,249,000			$7,803,557	$312,400			$7,699,157	$308,200			$7,803,557		$543,300		$0	$0		$2,412,900
11	CC	1090487280	COLONIA JOSE	X																23030 1	27	$1,844,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,008	$41,800	CCF57	27	$939,600	$37,600	14-11	27	$1,844,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	SI	$319,200
12	CC	1006439420	GALEANO CARLOS	X																23030 1	12	$464,000	$74,300	ESSC62	12	$464,008	$18,600	CCF57	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
13	CC	16772370	MARIN LEONARDO	X																23020 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	SI	$347,400
14	CC	1006324417	MONTAÑO KEVIN								X									23030 1	30	$2,006,923	$321,200	EPS012	30	$2,006,923	$80,300	CCF57	30	$2,006,923	$80,300	14-11	30	$2,006,923	6.960%	$139,700	30	$0	$0	SI	$621,500
15	CC	1108640079	MONTERO SANTIAGO								X									23030 1	30	$2,005,300	$320,900	EPS002	30	$2,005,368	$80,300	CCF57	30	$2,005,300	$80,300	14-11	30	$2,005,300	6.960%	$139,600	30	$0	$0	SI	$621,100
16	CC	6322585	MONTOYA ANDRES	X							X									23030 1	12	$1,162,000	$186,000	EPS018	12	$1,162,000	$46,500	CCF57	12	$1,162,000	$46,500	14-11	12	$1,162,000	6.960%	$80,900	12	$0	$0	SI	$359,900
Total Afiliados(16)																						$19,342,196	$3,095,600			$21,398,873	$856,800			$21,294,473	$852,600			$21,398,873		$1,490,100		$0	$0		$6,295,100

2023/07/15 08:50 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173698882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2142944487	94523364S3	E	2023/06/14	2023/06/20	BANCOLOMBIA	6	$6,339,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,895,600	$21,800	$0	$3,117,480
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$744,900	$5,300	$0	$750,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,171,200	$15,200	$0	$2,186,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$979,500	$1,300	$0	$180,880
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,490,100	$10,500	$0	$1,500,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,490,100	$10,500	$0	$1,500,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$852,600	$6,000	$0	$858,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$852,600	$6,000	$0	$858,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$856,800	$6,400	$0	$863,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$43,100	$400	$0	$43,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$99,800	$700	$0	$100,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$158,000	$1,200	$0	$159,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$243,700	$1,800	$0	$245,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$126,900	$900	$0	$127,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,300	$600	$0	$80,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$105,000	$800	$0	$105,800
TOTAL				16	$6,295,100	$44,700	$0	$6,339,800

2023/07/15 08:50 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173898882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-07	46553515	9453593499	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$6,121,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | Novedades | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173698682	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	46553515	9453593499	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$6,121,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$3,004,600	$0	$0	$3,004,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$520,600	$0	$0	$520,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,227,200	$0	$0	$2,227,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$256,800	$0	$0	$256,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,449,900	$0	$0	$1,449,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,449,900	$0	$0	$1,449,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$833,600	$0	$0	$833,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	$833,600	$0	$0	$833,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				26	$833,600	$0	$0	$833,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$27,200	$0	$0	$27,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$82,800	$0	$0	$82,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$220,900	$0	$0	$220,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$6,100	$0	$0	$6,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$205,700	$0	$0	$205,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$134,600	$0	$0	$134,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$78,500	$0	$0	$78,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$77,800	$0	$0	$77,800
TOTAL				26	$6,121,700	$0	$0	$6,121,700

2023/07/14 03:54 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173698882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	180949040	94548861 94	E	2023/08/14	2023/08/14	BANCOLOMBIA	0	$6,378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSITORIOS (21 Afiliados)																						$19,680,802	$3,149,300			$21,569,352	$863,400			$21,569,352	$863,400			$23,569,352	$1,502,200		$0	$0		$6,378,300
Centro de Trabajo: RIESGO VI (21 Afiliados)																						$19,680,802	$3,149,300			$21,569,352	$863,400			$21,569,352	$863,400			$23,569,352	$1,502,200		$0	$0		$6,378,300
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (21 Afiliados)																						$19,680,802	$3,149,300			$21,569,352	$863,400			$21,569,352	$863,400			$23,569,352	$1,502,200		$0	$0		$6,378,300
1	CC	1114541458	ANDICA BRAYAN		X								X							23030 1	25	$1,149,375	$163,900	ESSC18	25	$1,149,375	$46,000	CCF57	25	$1,149,375	$46,000	14-11	25	$1,149,375	6.960%	$83,800	25	$0	$0	SI	$359,900
2	CC	6322584	CAICEDO JULIAN										X							25-14	30	$1,792,000	$286,800	EPS018	30	$1,792,000	$71,700	CCF57	30	$1,792,000	$71,700	14-11	30	$1,792,000	6.960%	$124,800	30	$0	$0	SI	$555,000
3	CC	1114455238	CAMACHO JONATHAN										X							23030 1	30	$1,419,840	$227,200	ESSC18	30	$1,419,840	$56,800	CCF57	30	$1,419,840	$56,800	14-11	30	$1,419,840	6.960%	$98,900	30	$0	$0	SI	$439,700
4	CC	1007694098	CASTILLO ADRIAN										X							23030 1	30	$1,200,000	$192,000	ESSC18	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
5	CC	1113692483	CASTRO MICHAEL										X							23030 1	30	$1,234,375	$197,500	EPS065	30	$1,234,375	$49,400	CCF57	30	$1,234,375	$49,400	14-11	30	$1,234,375	6.960%	$86,000	30	$0	$0	SI	$382,300
6	CC	1090467280	COLONIA JOSE	X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	94451043	ERAZO ALEXANDER	X	X															23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS018	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
8	PT	3890012	ESPINOZA LUIS		X								X							23020 1	18	$720,000	$115,200	EPS037	18	$720,000	$28,800	CCF57	18	$720,000	$28,800	14-11	18	$720,000	6.960%	$50,200	18	$0	$0	SI	$223,000
9	PT	3641703	LEDESMA DORYBAL	X																25-14	12	$464,000	$74,300	EPS012	12	$464,000	$18,600	CCF57	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
10	CC	1113525486	LOPEZ JESUS	X									X							23020 1	30	$1,382,500	$221,200	ESSC18	30	$1,382,500	$55,300	CCF57	30	$1,382,500	$55,300	14-11	30	$1,382,500	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,100
11	CC	1112791457	LOPEZ ROBINSON	X																23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
12	CC	16772370	MARIN LEONARDO	X																23020 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,100	CCF57	13	$502,667	$20,100	14-11	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
13	CC	16264164	MOLINA HERIBERTO	X									X							25-14	13	$752,267	$120,400	EPS037	13	$752,267	$30,100	CCF57	13	$752,267	$30,100	14-11	13	$752,267	6.960%	$52,400	13	$0	$0	SI	$233,000
14	CC	1006324417	MONTAÑO KEVIN		X								X							23030 1	22	$948,083	$151,700	EPS012	22	$948,083	$38,000	CCF57	22	$948,083	$38,000	14-11	22	$948,083	6.960%	$66,000	22	$0	$0	SI	$293,700
15	CC	11086 40079	MONTERO SANTIAGO										X							23030 1	30	$1,609,375	$257,500	EPS002	30	$1,609,375	$64,400	CCF57	30	$1,609,375	$64,400	14-11	30	$1,609,375	6.960%	$112,100	30	$0	$0	SI	$498,400
16	PT	6943042	ORTIZ CARLOS		X								X							23030 1	25	$1,000,000	$160,000	EPS002	25	$1,000,000	$40,000	CCF57	25	$1,000,000	$40,000	14-11	25	$1,000,000	6.960%	$69,600	25	$0	$0	SI	$309,600
17	CC	94305774	RAMOS JOSE										X							23030 1	30	$1,219,207	$195,100	EPS037	30	$1,219,207	$48,800	CCF57	30	$1,219,207	$48,800	14-11	30	$1,219,207	6.960%	$84,900	30	$0	$0	SI	$377,600
18	CC	1061201978	RODRIGUEZ RAUL		X								X							23030 1	19	$781,875	$125,100	EPS018	19	$781,875	$31,300	CCF57	19	$781,875	$31,300	14-11	19	$781,875	6.960%	$54,500	19	$0	$0	SI	$242,200
19	CC	98624309	SANCHEZ CARLOS	X									X							23100 1	6	$249,375	$39,900	EPS018	6	$249,375	$10,000	CCF57	6	$249,375	$10,000	14-11	6	$249,375	6.960%	$17,400	6	$0	$0	SI	$77,300
20	CC	12058756	TEJADA JOSE										X								0	$0	$0	EPS037	30	$1,889,350	$75,600	CCF57	30	$1,889,350	$75,600	14-11	30	$1,889,350	6.960%	$131,900	30	$0	$0	SI	$282,700
21	CC	1113629973	VILLADA DURLEY										X							23030 1	30	$1,785,729	$285,800	EPS037	30	$1,785,729	$71,500	CCF57	30	$1,785,729	$71,500	14-11	30	$1,785,729	6.960%	$124,300	30	$0	$0	SI	$553,100
Total Afiliados(21)																						$19,680,802	$3,149,300			$21,569,352	$863,400			$21,569,352	$863,400			$21,569,352	$1,502,200		$0	$0		$6,378,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901298155	0	AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AGROINDUSTRIAL02	CRA 27 27 43	PALMIRA-VALLE	3173698882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	100949040	9454886194	E	2023/08/14	2023/08/14	BANCOLOMBIA	0	$6,378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$3,149,300	$0	$0	$3,149,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$39,900	$0	$0	$39,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$481,500	$0	$0	$481,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,211,000	$0	$0	$2,211,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$416,900	$0	$0	$416,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,502,200	$0	$0	$1,502,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,502,200	$0	$0	$1,502,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$863,400	$0	$0	$863,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	21	$863,400	$0	$0	$863,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$863,400	$0	$0	$863,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$56,600	$0	$0	$56,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$206,100	$0	$0	$206,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$254,800	$0	$0	$254,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$114,600	$0	$0	$114,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$115,300	$0	$0	$115,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$116,000	$0	$0	$116,000
TOTAL				21	$6,378,300	$0	$0	$6,378,300

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE NOMINA Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Guadalajara de Buga, julio 14 de 2023

CERTIFICACION

Yo, **LUIS ALEJANDRO LUCERO SAÉNZ** , Identificado con cedula de ciudadanía No 1.112.879.327 expedida en Calima Darién - Valle, en mi calidad de contador público de la empresa **AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV SAS** con NIT **901.298.155-0**, manifiesto que la empresa ha cumplido a la fecha con los pagos de nómina, prestaciones sociales y al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes a parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, que siguiendo lo establecido en el artículo 35 de la ley 1607 de 2012 y el artículo 65 de la lay 1819 de 2016, que ningún trabajador devenga considerado individualmente 10 o más salarios minimos mensuales legales vigentes estando así, exonerada la empresa del pago de los parafiscales Sena e Icbf, además del 8.5% en salud correspondiente al empleador, por lo que declaro que a la fecha nos encontramos al dia en el pago de los aportes correspondiente a Pensión AFP (Junio) y EPS (Julio), por lo tanto se encuentra a **PAZ Y SALVO a la fecha**, con las Empresas Promotoras de Salud EPS, fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Luis Alejando Lucero Saénz

LUIS ALEJANDRO LUCERO SAÉNZ
Contador Público
C.C 1.112.879.327 de Calima
T.P 296085-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

296085-T



LUIS ALEJANDRO
LUCERO SAENZ
C.C. 1112879327
RES. INSCRIPCION 961 DEL 20/04/2022
UNIVERSIDAD DEL VALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
319076 DIRECTOR GENERAL 342250

VALIDAD PARA CERTIFICADO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO-14-2023

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

Luis Alejandro Lucero Saenz

FIRMA

Comfandi

Santiago de Cali, julio 15 de 2023

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI
HACE CONSTAR QUE:

Para los efectos del Articulo 3° de la ley 21 de 1982. Comfandi certifica que la empresa **AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV SAS, NIT 9012981550** ha cancelado aportes a la Caja de Compensación Familiar por valor de **$ 8.900.400** de los periodos relacionados a continuación.

MES	VALOR
2023-01	$ 1.675.600
2023-02	$ 1.210.000
2023-03	$ 1.947.300
2023-04	$ 2.268.600
2023-05	$ 1.798.900
Total	$ 8.900.400

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y **no es válida como paz y salvo para efectos de afiliación a otra Caja de Compensación.**
Cordialmente,

Mauricio Mejia
Jefe Afiliaciones y Aportes
Caja de compensación del Valle del Cauca
NIT 890.303.208-5

La Caja de Compensación Familiar (Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera beneficios en el marco de la Ley 789 de 2002 y sus normas reglamentarias.
VIGILADO SuperSubsidio
VIGILADO SuperSubsidio

Comfandi

Santiago de Cali, julio 15 de 2023

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI
HACE CONSTAR QUE:

Para los efectos del Articulo 3° de la ley 21 de 1982. Comfandi certifica que la empresa **AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV SAS, NIT 9012981550** ha cancelado aportes a la Caja de Compensación Familiar por valor de **$ 8.900.400** de los periodos relacionados a continuación.

MES	VALOR
2023-01	$ 1.675.600
2023-02	$ 1.210.000
2023-03	$ 1.947.300
2023-04	$ 2.268.600
2023-05	$ 1.798.900
Total	$ 8.900.400

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y **no es válida como paz y salvo para efectos de afiliación a otra Caja de Compensación.**
Cordialmente,

Mauricio Mejia
Jefe Afiliaciones y Aportes
Caja de compensación del Valle del Cauca
NIT 890.303.208-5

La Caja de Compensación Familiar (Comfandi), miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera beneficios en salud a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.

VIGILADO SuperSubsidio

VIGILADO SuperSubsidio

Comfandi

Santiago de Cali, julio 18 de 2023

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI
HACE CONSTAR QUE:

Para los efectos del Articulo 3° de la ley 21 de 1982. Comfandi certifica que la empresa **AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV SAS, NIT 9012981550** ha cancelado aportes a la Caja de Compensación Familiar por valor de **$ 11.227.400** de los periodos relacionados a continuación.

MES	VALOR
2023-01	$ 1.675.600
2023-02	$ 1.210.000
2023-03	$ 1.947.300
2023-04	$ 2.268.600
2023-05	$ 2.443.700
2023-06	$ 1.682.200
Total	$ 11.227.400

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y **no es válida como paz y salvo para efectos de afiliación a otra Caja de Compensación.**
Cordialmente,

Mauricio Mejia
Jefe Afiliaciones y Aportes
Caja de compensación del Valle del Cauca
NIT 890.303.208-5

La Caja de Compensación Familiar (Comfandi), miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS) fomenta la protección social de los trabajadores de medios y bajos ingresos y sus familias.
VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

Enero 5 - 2023

Se realizo la fundicion de zapatas y vigas de cimentación del Eje (2) previo a la revision de Aceros.

Se toman muestras para determinar los ensayos de resistencia del concreto.

Enero 9 - 2023.

Se realizo corte y figuración de Aceros para estribos y flejes de las columnas del Eje (1)

INTERVENTORIA

Enero 11 - 2023.

Continuan labores de instalacion

Miercoles, 11 Enero 2023

Se realiza instalacion, corte de flejes de 3/8". en el Eje (1).

INTERVENTORIA

Jueves, 12 Enero 2023.

En el eje (1) se realiza instalacion de flejes 3/8". en las columnas (A) (B) (C).

INTERVENTORIA

Viernes, 13 Enero 2023

En el eje (1) se instalan flejes. se realiza capacitación del tema de alturas y curso actualizacion

INTERVENTORIA

Sabado, 14 Enero 2023

Prolongado lluvias en la noche y se inundan las excavaciones.
se procede a sacar el agua y jornada de Aseo y Limpieza en la obra.

INTERVENTORIA

Lunes. 16 Enero 2023

- Se realizó comite de obra
- Continuan trabajos de realización flejes para el eje (1)

INTERVENTORIA

Lunes Enero 23, 2023.

Se realizan trabajos de Armado de Estructuras de Acero en el Eje #1 flejado

INTERVENTORIA

Miercoles / 25 / 2023

- Se realizan flejado y armado de estructuras metalicas eje ≠ 2.

INTERVENTORIA

Sabado / 27 / 2023.

- Brigada de Aseo, Orden e Inventario de Obra.

Lunes / 29 / 2023.

Reunion y Comite Interno de obra con trabajadores, SISO y Arquitecto.

INTERVENTORIA

Martes / 30 / 2023

Continuan los flejados armados de Acero

INTERVENTORIA.

Mayo 8 / 2023.

Se reinician actividades de obra flejado de Columnas y refuerzos f. / Eje # 1. Terminado.

INTERVENTORA

Lunes / 15 Mayo / 2023.

Comite de Obra, se realizan trabajos de Estructura Metalica, se tienen 3 cerchas despiezadas en la Obra.

INTERVENTORA.

Martes / 16 Mayo / 2023.

Se Inicia el armado de Las cerchas basado en el despiece de los planos Se tienen en la obra, soldadura y corte de los angulos.

INTERVENTORA

Martes, 23 Mayo 2023 - Recreo -

- Comite de obra.
- Participantes = Ing Enrique Martinez Imder
  Ing. Victoria Renolon Interven.
  Andres Beeboya - Contratista
  Juan David Mapura - Agroindust.
  Diego Parra - Arqu. Residente.

Se realiza el comite de obra en las instalaciones del parque del recreo.
Se tratan temas de avance de obra y programacion de actividades.

dparra.

Martes, 23 Mayo 2023 - Recreo -

- Comite de obra -

- Participantes = Ing Enrique Martinez Imder
Ing. Victoria Renolon Interven.
Andres Beabya - Contratista
Juan David Mapura - Agroindust.
Diego Parra - Arqu. Residente.

Se realiza el comite de obra en las instalaciones del parque del recreo.
Se tratan temas de avance de obra y programación de actividades.

Victoria Renolon
Interventoria

dparra.

Lunes, 29 / Mayo / 2023.

- Comite de Obra.

Participantes: Andres Cervino Arq. Imder
Juan Mapura Ing. Tecnisa
Mª Vict. Renolón. Ing. Interventor
Arq. Diego Parra Tecnisa.

- Se realiza el comite de obra siendo las

8:30 am en la cual se solicitan al contratista las memorias de cantidades de obra, para justificar el acta de pago. Se realiza el compromiso por parte del contratista de reiniciar la obra el dia de mañana martes 30 de Mayo del 2023.
en la instalación de formaletas para vigas aereas y de gatos - cerchas y formaletas.

Interventoria. dparra.

Martes, 30 / Mayo / 2023.
- Obra recreo - Visita Interventoria Contraloria - Imder -.
Participantes: Mª Victoria Rendon - Interventora
Andres Cervino Arquitecto Imder.
Enrique Martinez Ingeniero Imder.
Pilar Clemencia. Superv. Imder
Abog. Contraloria
Luis Carlos Cadena Super. Contraloria
Diego Alonso Parra Arq. Contraloria
Arq. Tecnista.

8:30 am. Se solicitan planos de la obra, Cronograma y actas pagadas. se realiza un recorrido por la obra, identifican los materiales de estructura metalica existentes en la obra equivalentes al 50% de la cubierta. (3 cerchas y correas). se revisan las obras realizadas en la cimentacion, vigas y zapatas de igual manera el acero de las columnas, flejes y ganchar, se revisa el cronograma de actividades determinando que la obra esta en los tiempos establecidos de construcción, se analiza el acta pagada y se comparan el avance fisico vs el avance financiero, determinando que se tiene mas en la obra de lo que se ha pagado. Las recomendaciones son acelerar todos los procesos de la obra y continuar avanzando en el tema estructural programar los concretos y adelantar los suministros de teja y el tema electrico

INTERVENTORIA

Miercoles, 31 mayo / 2023.
se reinician labores en el tema de las cerchas metalicas.

INTERVENTORIA

Jueves, 01. Junio / 2023.
se radican los douumento ante interventoria Para su revision del acta #2, continuan obras de soldura y armado de cerchas.

INTERVENTORÍA

Sabado, 03 dunio /2023
se realizan jornadas de aseo, limpieza y orden en la obra, se organizan los castillos armados para la vigas aereas.

INTERVENTORÍA

Lunes, 5 dunio / 2023.
Se aplaza el comite de obra para el dia de mañana martes 6 del junio. — Continuan labores de cerchas metalicas

INTERVENTORIA

Martes / Junio 6 / 2023.

COMITE OBRA. se realiza el comite de obra

- Ingeniera Mª Victoria Rendon - Interventoría.
- Ingeniero Enrique Martinez - Imder.
- Arquitec. Andres Cervino - .Imder.
- Arquitec. Diego Parra - Tecnisa.
- Ingeniero David Mapura - Agroindustriales.

- Se tratan temas administrativos y Documentos para la radicación del Acta #2. - se aprueba el balnce de obra establecido por el contratista. Se solicita una programación real de las fundiciones de concreto de las columnas y vigas aereas. se solicita el armado de la 3 cercha y la soldadura de sus elementos. Se solicita por parte de Interventoria la presentación de informes de tiatas de las soldaduras.

INTERVENTORA

Miercoles / Junio 7 / 2023.

Continuan laboreo en obra de organizacion de vigas, limpieza y soldadura de cerchas

INTERVENTORA

Viernes, 9 Junio /2023.
Se realizan labores de soldadura en las 2 cerchas que se encuentran en la obra, se realizan labores de aseo y limpieza en la obra. Se programa el comite de obra para el proximo martes.


INTERVENTORIA

Martes, Junio 13 /2023.
COMITE OBRA: se realiza comite de obra.
Ingeniera Mª Victoria Rendon - Interventoria.
Ingeniero Enrique Martinez - Imder.
Arquitecto Andres Cervino - Imder.
Arquitecto Diego Parra. - Tecnisa -
Ingeniero Juan Mapura. - Agroindustriales -
— Tema (1). caida de Arbol chiminango.
El dia pasado Domingo 11 Junio 2023, una de las ramas del arbol que se encuentra en el lado Noroeste de la cancha cayo sobre una de los castillos de las Columna del Eje E lado Norte. y se procede a llamar a la persona encargada por parte del imder para proceder

SABADO, 1 DE JULIO DE 2023
LA INTERVENTORIA EVIDENCIA QUE LOS ELEMENTOS PARA FUNDIR SEGUN LA PROGRAMACION, NO SE ENCUENTRAN TERMINADOS, EN CUANTO A INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO DE VIGA AEREA. POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DETERMINA APLAZAR LA FUNDIDA PARA EL DIA MARTES 4 DE JULIO DE 2023 A LAS 2:00PM. LUEGO DE INSPECCIONAR Y REVISAR EL MONTAJE DE FORMALETAS PARA COLUMNAS SE EVIDENCIO, QUE LOS TABLEROS INTERNOS O AREA INTERNA DE LOS ESPACIOS QUE QUEDAN LIBRES, ENTRE LOS BORDES PERNADOS DE CADA FORMALETA, SE ENCUENTRAN SUCEPTIBLES A FALLAS O EMBOMBAMIENTO, POR EL BULBO DE PRESION EJERCIDO POR EL CONCRETO, SE ACLARA QUE EL CALIBRE DE LA LAMINA ES EL MISMO QUE UTILIZAN LAS FORMALETAS DE LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE EQUIPOS,

SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA QUE ESTOS ESPACIOS, SE LES COLOQUEN RIOSTRAS, DE TAL MANERA QUE SE MINIMICEN LAS AREAS LIBRES Y SE EVITEN LOS EMBOMBAMIENTOS EN LAS CARAS DE SECCION DE COLUMNAS.

COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS, EL CONTRATO EXIGE CONCRETO A LA VISTA, POR LO QUE SE DEBEN EVITAR REPARACIONES POSTERIORES A LA FUNDIDA.

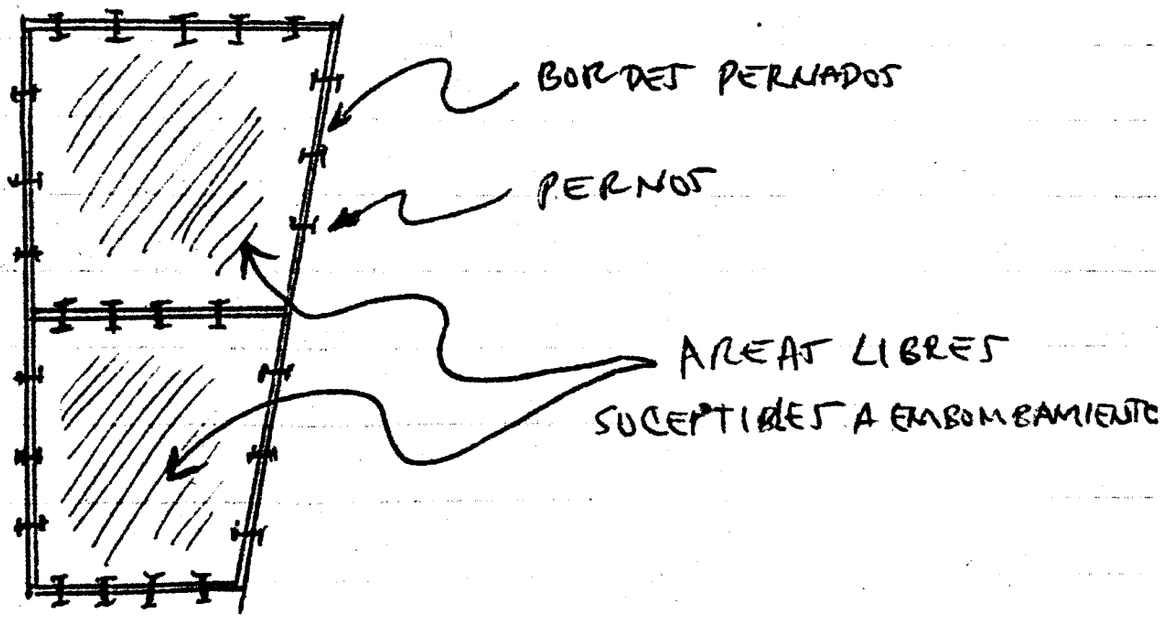

FORMALETA COLUMNAS.

SE RECOMIENDA TENER EN OBRA SUFICIENTES PUNTALES, PARA ARRIOSTRAR LAS 4 CARAS DE CADA COLUMNA.

INTERVENTORIA.

MARTES, 4 DE JULIO DE 2023.

SE REALIZA LA MANIOBRA DE FUNDICION PROGRAMADA PARA EL DIA DE HOY. SE INICIA CON LA LLEGADA Y UBICACION DE LA AUTOBUMBA, POSTERIORMENTE SE RECIBE EL MIXER DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 9 M3, SE PROCEDE A TOMAR LA PRUEBA DE SLUMP ARROJANDO UN RESULTADO DE 5" PARA CONFIRMAR SU PLASTICIDAD, LUEGO SE TOMAN 6 UND DE MUESTRAS DE CILINDROS. SE ACLARA Y DEJA CONSTANCIA, QUE MUCHAS DE LAS RECOMENDACIONES EXPRESADAS POR LA INTERVENTORIA, DIAS ANTES DE LA FUNDIDA, NO FUERON TENIDAS EN CUENTA, COMO EL DEBIDO REFORZAMIENTO CON PUNTALES PARA EVITAR EL DESPLOME DE LOS ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE SON MUY PESADOS. TAMPOCO SE COLOCO LA FORMALETA PARA FUNDIR EL TERCIO DE LA VIGA AEREA, CON SU RESPECTIVO

CORTE A 45° O CHAFLAN. ESTO POR MENCIONAR ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES. LAS CAMARAS DE LAS COLUMNAS QUEDARON EMBOMBADAS; POR TANTO SE DEBEN REPARAR PARA CONSEGUIR QUE QUEDEN A PLOMO; ESTA ACTIVIDAD DE REPARACION ES A CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE LAS FORMALETAS, PARA LAS POSTERIORES FUNDIDAS. NO ESTA DEMAS MENCIONAR QUE LAS REPARACIONES DEL CONCRETO INCLUYEN HORMIGUEOS Y TODO LO QUE ESTETICAMENTE SE HAYA AVERIADO.

INTERVENTORIA

Viernes 5 de Jun
Se realizan actividades de relocalización y replanteo, adicionalmente se realiza comité contratista-interventoría,

se realizan actividades de nivelación y alineación de columnas en EJE A

dfarra.

Jueves 6 de Julio

se comienza segun recomendación de inventario colocamos andamios y formaleta, posteriormente se hormigonan las columnas y vigas y se protegen con Viniol.

Viernes 7 de Julio

se continua con la actividad del día anterior, y se comienza el armado del andamio en las columnas A1-B1-C1, posteriormente el grupo de metalmecánica comienzan labores para enderezar formaletas y refuerzo de estas, colateralmente se realizan excavaciones para drenaje de aguas sobre de la cubierta

dfarra

Sabado 8 de Julio

Se continua con el armado del andamio hasta medio día hora en hque se finaliza, grupo metalmecánica.

continua con refuerzo con platinas y enderezamiento de formaleta, se continua con la excavación del sistema de aguas lluvias contiguo a la caseta comunal.

Lunes 10 de Julio

Se comienza con el armado de formaleta de columna A1 mientras se preparan las tapas de B2, se continua con la excavación de la linea de tubería.

Martes 11 de Julio

Se finaliza el armado, aplomo y alineamiento de formaleta A1, se comienza el armado de B2 y se deja hasta la mitad

Miercoles 12 de Julio

Se finaliza el armado de B2 y se comienza C2, se toman niveles y alineamiento para la cama de la viga aerea. Se finaliza parte de la excavación de sistema de aguas lluvias.

Jueves 13 de Julio

Se realiza simultaneamente armado de castillo de viga cerca y deformaleta de C2, se finaliza armado de C2, queda pendiente su aplome

Hernández.

Viernes 14 de Julio

Se realiza el armado de las vigas aereas y su respectivo encofrado, aplome de columnas,

Hernández.

Sábado 15 de Julio

Se realiza la fundición para columnas A2, B2 y C2 con vigas aereas A2-B2 y B2-C2. Así mismo con el sobrante de concreto se funden 2 tapas de alcantarillas de 70x70 cm y se funden 3 bloques de loseta

Hernández.

Lun 17 de Julio

Se utiliza el día para el desencofre de la ~~las~~ Rendición y así mismo se hidratan los elementos y posteriormente se envuelven en Vinipel. Así mismo se adelanta armé de andamios sobre la disposición E2, F2 y D2.

Martes 18 de Julio

Se arman andamios sobre E2, F2 y D2, se comienza a ensamblar formaleta de columnas

Miercoles 19 de Julio

Se continua el armado de formaleta de columnas y reparaciones en algunas de ellas

Jueves 20 de Julio

No retroaja por ser Festivo

Viernes 21 de julio

Se termina el armado de la formaleta de (columna)

Sábado 22 de julio

Se finaliza el aplome de la formaleta de las (columna) y su respectivo aplome.

Lunes 24 de julio

Se deja en un 30% el armado de las vigas aereas y se empieza a montar formaleta de viga aerea.

Martes 25 de julio

Se realiza el armado, apuntalado de todo el sistema de fundicion de vigas O_2-D_2, E_2-F_2 y D_2-E_2, se arma los castillos y queda dispuesto todo el sistema para fundición el día de mañana a las 8:00 am.

Miércoles 26 de Julio

Se realiza la Fundación en concreto 4000 psi para columnas D_2, E_2 y F_2 con vigas aéreas C_2-D_2, D_2-E_2 y F_2-E_2. Se aplica producto sykadur 32 primer en la unión de la viga C_2-D_2 donde se asienta sobre la columna y se aplica producto.

Ing.

Miércoles 26 de Julio

Se realiza la Fundación en concreto 4000 psi para columnas D_2, E_2 y F_2 con vigas aéreas C_2-D_2, D_2-E_2 y F_2-E_2. Se aplica producto sykadur 32 primer en la unión de la viga C_2-D_2 donde se acuña sobre la columna y se aplica producto.

Jueves 27 de Julio

Se realizan actividades de limpieza y solamado de pretalmecánico,

Viernes 28 de Julio

Se realizan actividades de desmonte de formaleta y sección D_2, E_2 y F_2 con respectivas vigas aéreas

Sabado 29 de Julio

Se realizara y continua actividades de desmonte de andamios y desformaletado, se continua con trabajos de metalmecanico dfarre

Lunes 31 de julio

Se continua con Actividades de desmonte y se procede a reparaciones menores a formaleta de columnas con frente paralelo en metal mecánico dfarre

Martes 1 de Agosto

Se comienza con armado de andamios y montaje formaleta columnas y obra metal mecanica dfarre

Miercoles 2 de Agosto

Se continua con las actividades del día anterior. dfarre

Jueves 6 de agosto

Se continua con las mismas actividades del día anterior, se finaliza la cercha #2. Itzamara

Viernes 4 de Agosto

Se continua con las actividades del día anterior Itzamara

Sabado 5 de Agosto

Se finalizan el armado de andamios sobre de D_1, E_1 y F_1 con su respectiva formaleta de columna Itzamara

Martes 8 de Agosto

Se continua con el armado de la formaleta de vigas aereas C_1-D_1, D_1-E_1 y E_1-F_1. Itzamara

Miercoles 9 de Agosto

Se continua con el formuleteado de las vigas aereas No se realiza cambio de obra

de la ultima fundición y el armado de los respectivos castillos. Paralelamente se tiene un avance del 50% en la cercha #3. Ing. Ferre

Jueves 10 de Agosto

Se continua con el formaleteado y armado de castillos de la última disposición, se avanza la cercha # 3 hasta un 90% y se comienza a armar la siguiente Ing. Ferre

Viernes 11 de Agosto

Se finaliza el armado de los castillos y formaleteado de vigas aereos, se dejan pendientes detalles mientras la fundición es el sábado 12 de Agosto 9:00 am Se finaliza la cercha #3 y se deja la #4 en un 30%. En la semana no se realizó conteo de obra

Ing. Ferre.

Sabado 17 de Agosto

Se realiza Fundación en concreto acelerado a 7 días de 4000psi con tamaño máximo 12,5mm
Se aplica Sykadur primer 32 sobre el concreto de empalme viejo

dfzmz.

Lunes 14 de Agosto de 2023

Se comienza el desFormaleteado de la última Fundación y paralelamente se completa la cercha #4 hasta un 80%.

dfzmz

Martes 15 de Agosto de 2023

Se Finaliza el desarmado de los andamios y formaleta
Se Finaliza la cercha #4 y se perforan correas
y se fijan los portacorreas sobre el la cercha #1


dfzmz

Miercoles, 16 Agosto de 2023.

Comite de Obra. → Se realiza el comite de obra en las Instaciones del inder palmira en donde se tratan los temas correspondientes al acta de obra de pago #4 y la programacion y plan de trabajo estimado para terminar la obra al dia 30 de Agosto.

En la obra continua la elzboracion de la 5ta Cercha correspondiente al eje(E).

Ferz.

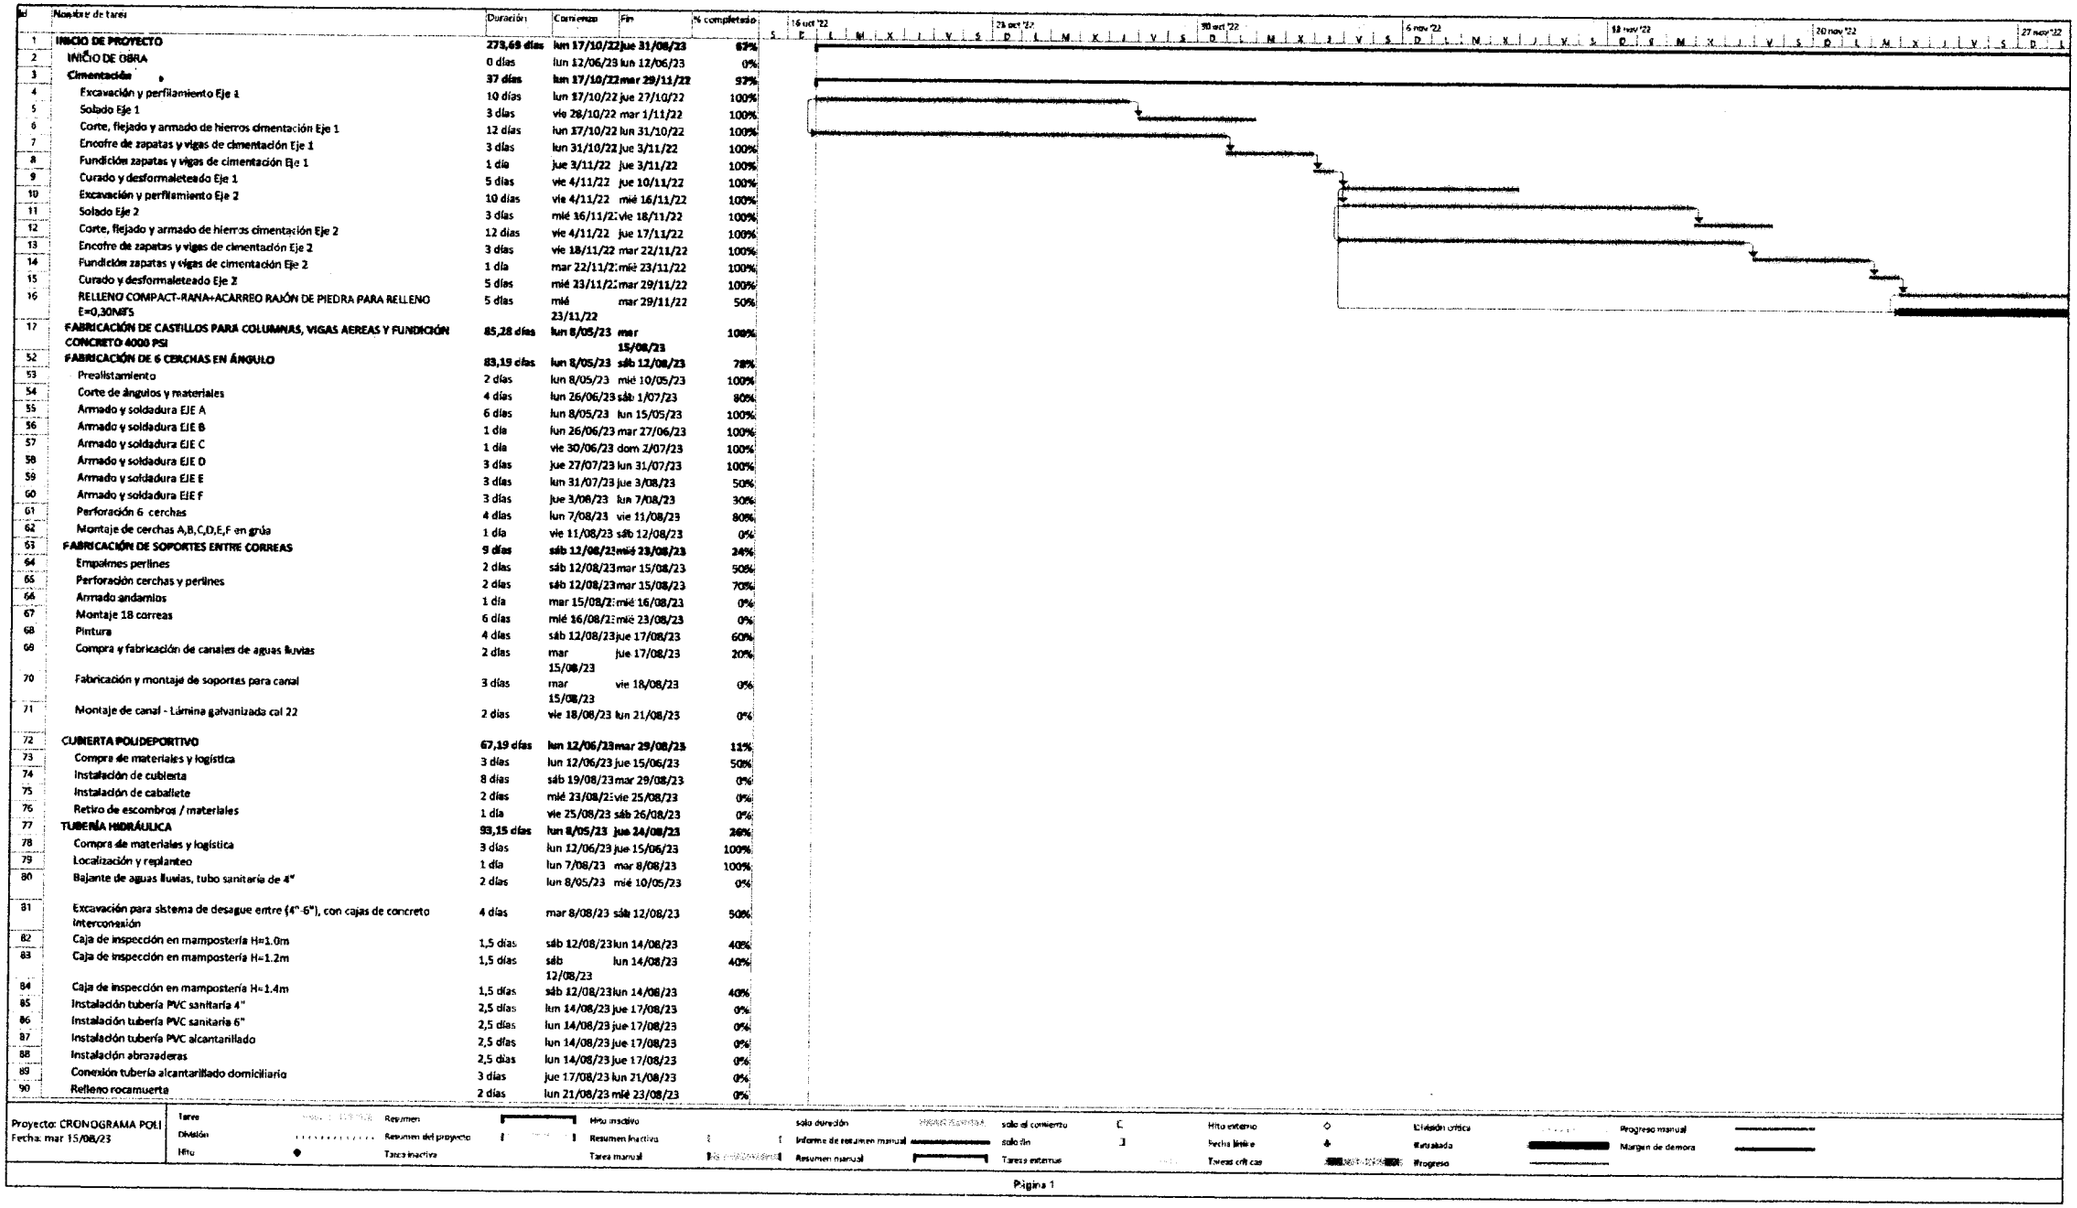


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**INICIO DE PROYECTO**	**279,69 días**	**lun 17/10/22**	**jue 31/08/23**	**62%**
2	INICIO DE OBRA	0 días	lun 12/06/23	lun 12/06/23	0%
3	**Cimentación**	**37 días**	**lun 17/10/22**	**mar 29/11/22**	**97%**
4	Excavación y perfilamiento Eje 1	10 días	lun 17/10/22	jue 27/10/22	100%
5	Solado Eje 1	3 días	vie 28/10/22	mar 1/11/22	100%
6	Corte, flejado y armado de hierros cimentación Eje 1	12 días	lun 17/10/22	lun 31/10/22	100%
7	Encofre de zapatas y vigas de cimentación Eje 1	3 días	lun 31/10/22	jue 3/11/22	100%
8	Fundición zapatas y vigas de cimentación Eje 1	1 día	jue 3/11/22	jue 3/11/22	100%
9	Curado y desformaleteado Eje 1	5 días	vie 4/11/22	jue 10/11/22	100%
10	Excavación y perfilamiento Eje 2	10 días	vie 4/11/22	mié 16/11/22	100%
11	Solado Eje 2	3 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	100%
12	Corte, flejado y armado de hierros cimentación Eje 2	12 días	vie 4/11/22	jue 17/11/22	100%
13	Encofre de zapatas y vigas de cimentación Eje 2	3 días	vie 18/11/22	mar 22/11/22	100%
14	Fundición zapatas y vigas de cimentación Eje 2	1 día	mar 22/11/22	mié 23/11/22	100%
15	Curado y desformaleteado Eje 2	5 días	mié 23/11/22	mar 29/11/22	100%
16	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJÓN DE PIEDRA PARA RELLENO E=0,30MTS	5 días	mié 23/11/22	mar 29/11/22	50%
17	**FABRICACIÓN DE CASTILLOS PARA COLUMNAS, VIGAS AEREAS Y FUNDICIÓN CONCRETO 4000 PSI**	**85,28 días**	**lun 8/05/23**	**mar 15/08/23**	**100%**
52	**FABRICACIÓN DE 6 CERCHAS EN ÁNGULO**	**83,19 días**	**lun 8/05/23**	**sáb 12/08/23**	**78%**
53	Prealistamiento	2 días	lun 8/05/23	mié 10/05/23	100%
54	Corte de ángulos y materiales	4 días	lun 26/06/23	sáb 1/07/23	80%
55	Armado y soldadura EJE A	6 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	100%
56	Armado y soldadura EJE B	1 día	lun 26/06/23	mar 27/06/23	100%
57	Armado y soldadura EJE C	1 día	vie 30/06/23	dom 2/07/23	100%
58	Armado y soldadura EJE D	3 días	jue 27/07/23	lun 31/07/23	100%
59	Armado y soldadura EJE E	3 días	lun 31/07/23	jue 3/08/23	50%
60	Armado y soldadura EJE F	3 días	jue 3/08/23	lun 7/08/23	30%
61	Perforación 6 cerchas	4 días	lun 7/08/23	vie 11/08/23	80%
62	Montaje de cerchas A,B,C,D,E,F en grúa	1 día	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	0%
63	**FABRICACIÓN DE SOPORTES ENTRE CORREAS**	**9 días**	**sáb 12/08/23**	**mié 23/08/23**	**24%**
64	Empalmes perlines	2 días	sáb 12/08/23	mar 15/08/23	50%
65	Perforación cerchas y perlines	2 días	sáb 12/08/23	mar 15/08/23	70%
66	Armado andamios	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	0%
67	Montaje 18 correas	6 días	mié 16/08/23	mié 23/08/23	0%
68	Pintura	4 días	sáb 12/08/23	jue 17/08/23	60%
69	Compra y fabricación de canales de aguas lluvias	2 días	mar 15/08/23	jue 17/08/23	20%
70	Fabricación y montaje de soportes para canal	3 días	mar 15/08/23	vie 18/08/23	0%
71	Montaje de canal - Lámina galvanizada cal 22	2 días	vie 18/08/23	lun 21/08/23	0%
72	**CUBIERTA POLIDEPORTIVO**	**67,19 días**	**lun 12/06/23**	**mar 29/08/23**	**11%**
73	Compra de materiales y logística	3 días	lun 12/06/23	jue 15/06/23	50%
74	Instalación de cubierta	8 días	sáb 19/08/23	mar 29/08/23	0%
75	Instalación de caballete	2 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	0%
76	Retiro de escombros / materiales	1 día	vie 25/08/23	sáb 26/08/23	0%
77	**TUBERÍA HIDRÁULICA**	**93,15 días**	**lun 8/05/23**	**jue 24/08/23**	**26%**
78	Compra de materiales y logística	3 días	lun 12/06/23	jue 15/06/23	100%
79	Localización y replanteo	1 día	lun 7/08/23	mar 8/08/23	100%
80	Bajante de aguas lluvias, tubo sanitaria de 4"	2 días	lun 8/05/23	mié 10/05/23	0%
81	Excavación para sistema de desague entre (4"-6"), con cajas de concreto interconexión	4 días	mar 8/08/23	sáb 12/08/23	50%
82	Caja de inspección en mampostería H=1.0m	1,5 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	40%
83	Caja de inspección en mampostería H=1.2m	1,5 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	40%
84	Caja de inspección en mampostería H=1.4m	1,5 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	40%
85	Instalación tubería PVC sanitaria 4"	2,5 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23	0%
86	Instalación tubería PVC sanitaria 6"	2,5 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23	0%
87	Instalación tubería PVC alcantarillado	2,5 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23	0%
88	Instalación abrazaderas	2,5 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23	0%
89	Conexión tubería alcantarillado domiciliario	3 días	jue 17/08/23	lun 21/08/23	0%
90	Relleno rocamuerta	2 días	lun 21/08/23	mié 23/08/23	0%

Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · Sólo dirección · Informe de resumen manual · Tareas externas · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Tareas crít cas · Hito externo · División crítica · Tarea crítica · Progreso · Progreso manual · Margen de demora


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
91	Retiro de escombros / materiales	1 día	mié 23/08/23	jue 24/08/23	0%
92	**SISTEMA ÉLECTRICO**	**90,19 días**	**lun 15/05/23**	**lun 28/08/23**	**5%**
93	Compra de materiales y logística	3 días	lun 12/06/23	jue 15/06/23	30%
94	**Sistema puesta a tierra**	**2 días**	**vie 25/08/23**	**lun 28/08/23**	**0%**
95	Electrodo copperweld 2.44m, soldadura exotérmica de conductor puesta a tierra 1 # 12	2 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23	0%
96	Suministro e instalación caja de inspeccion 30x30 para SPT	1 día	vie 25/08/23	sáb 26/08/23	0%
97	Producto químico para mejoramiento de terreno	1 día	vie 25/08/23	sáb 26/08/23	0%
98	**Sistema de iluminaria (12) Luminaria área 1 LED**	**90,19 días**	**lun 15/05/23**	**lun 28/08/23**	**0%**
99	Instalacion acometida	2 días	lun 15/05/23	mié 17/05/23	0%
100	Tablero monofásico de barraje para dos circuitos con sus debidas protecciones	1,5 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	0%
101	Instalación de tablero de control de iluminación con dos switches de 30 AMP	1,5 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	0%
102	Suministro e instalación tubo conduit EMT 3/4"	2 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	0%
103	Suministro e instalación cable 3 # 12 THHN / THWN	2 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	0%
104	Instalación salida iluminación	2 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23	0%
105	Instalación luminarias área 1 = 12 luminarias	2 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23	0%
106	**DEMARCACIÓN CANCHA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON**	**3,5 días**	**lun 28/08/23**	**jue 31/08/23**	**0%**
107	Lavado con equipo a presion	1 día	lun 28/08/23	mar 29/08/23	0%
108	Aplicación en las juntas existenes sykaflex 401 pavement SI + sykaroad phi 1/4" (6mm)	1,5 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	0%
109	Revestimiento compuesto de pintura de base acrílica y cuarzo	1 día	mar 29/08/23	mié 30/08/23	0%
110	Resina flexible de poliuterano para formar una película de acabado	1 día	mié 30/08/23	jue 31/08/23	0%
111	ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	0%

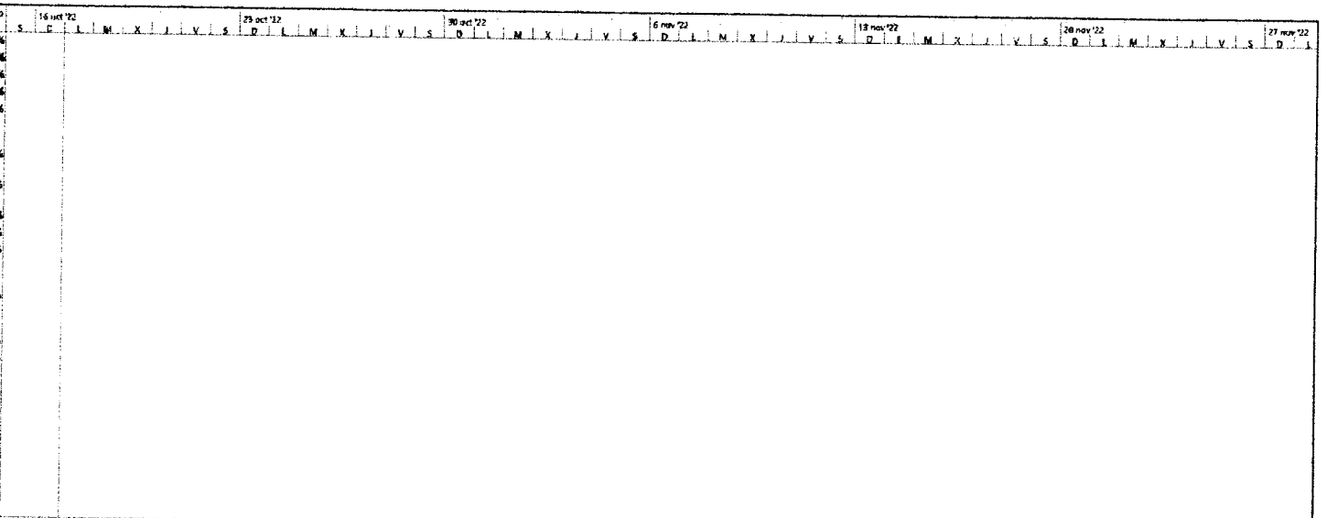



Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · solo duración · Informe de resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Retrasada · Progreso · Progreso manual · Margen de demora

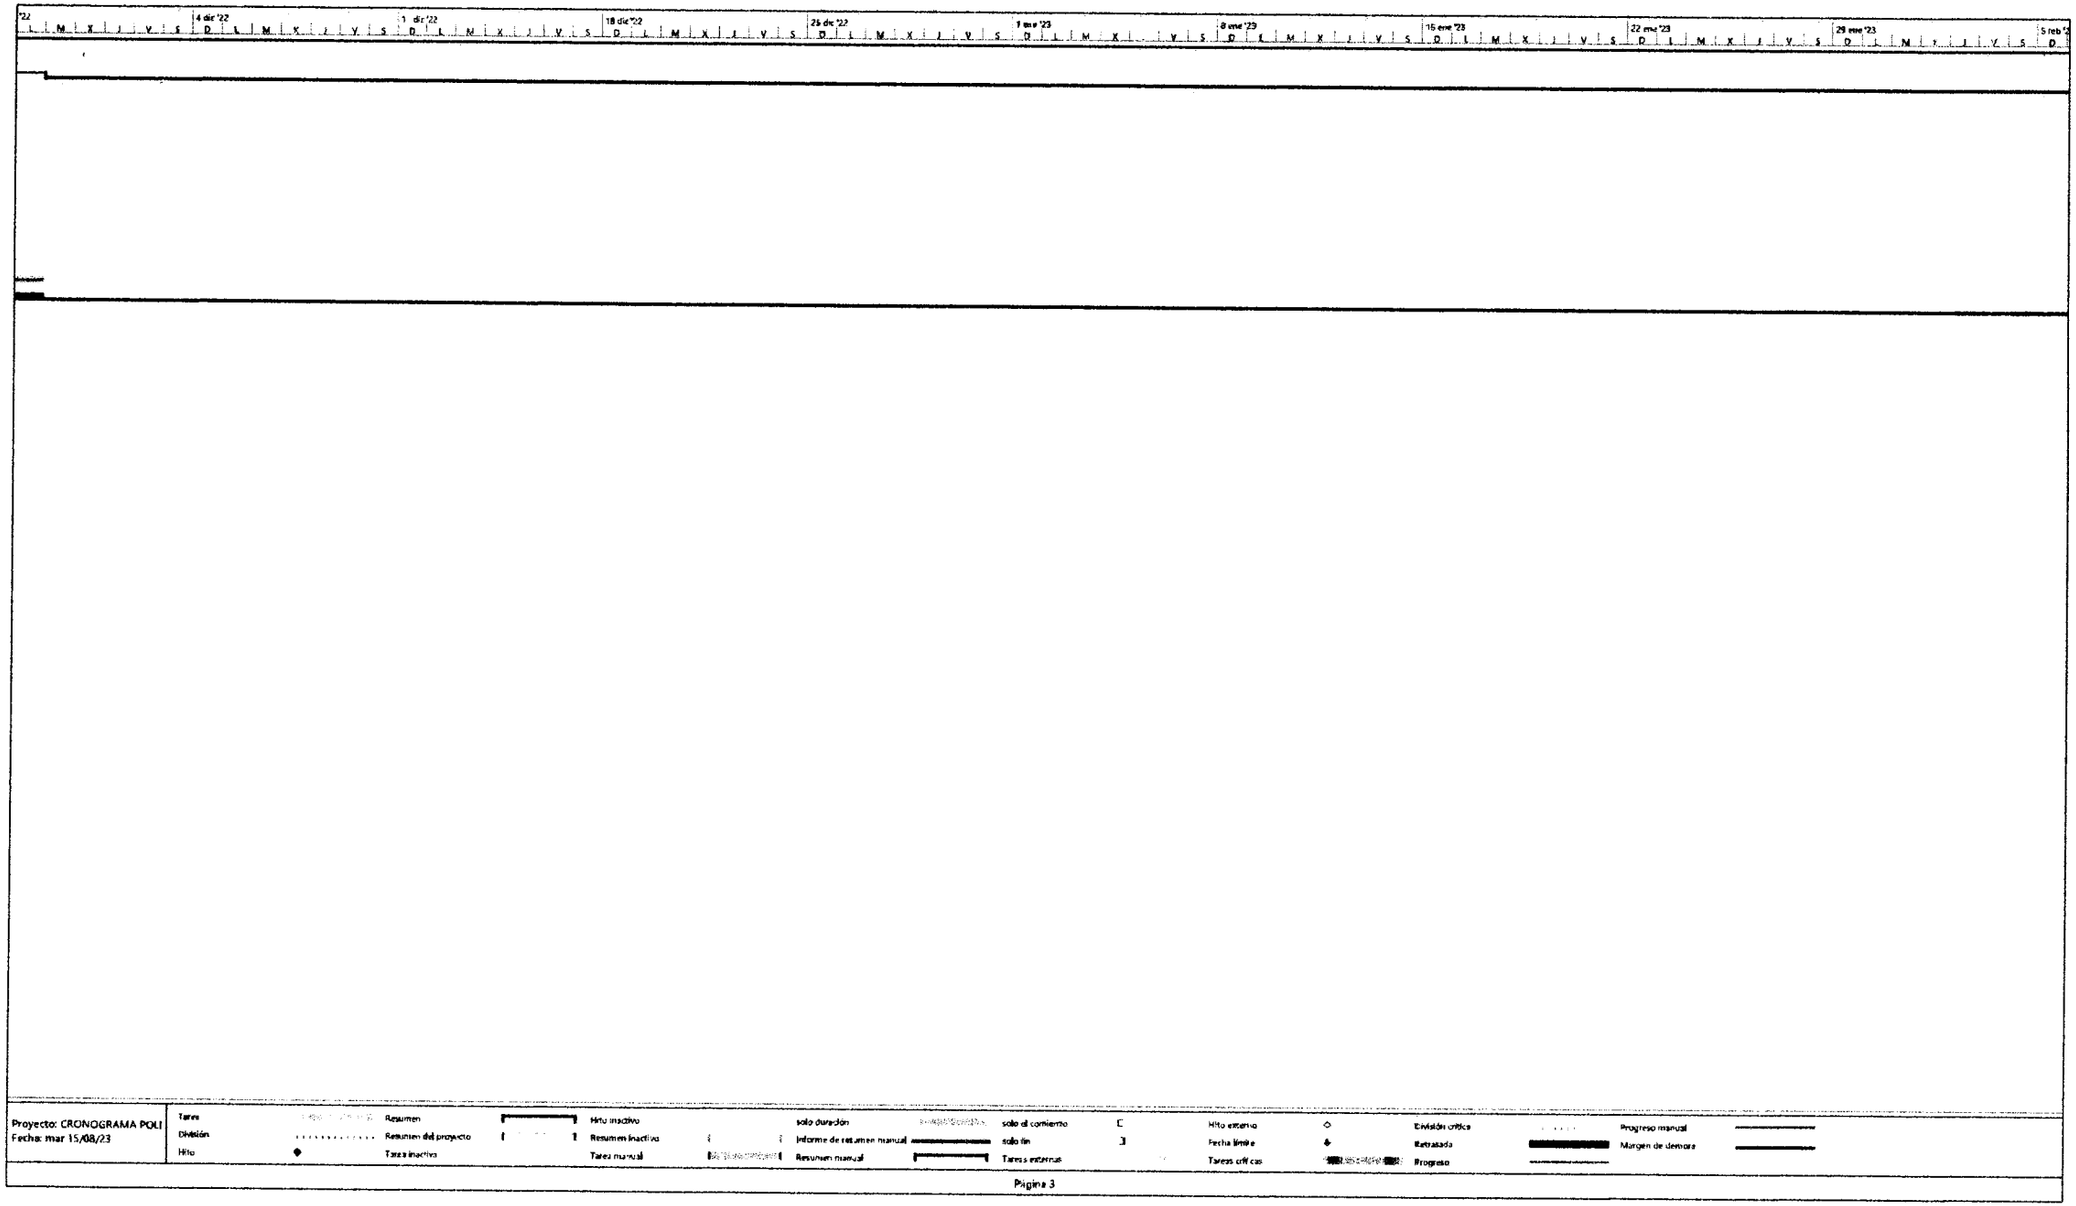

'22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
15 ene '23
22 ene '23
29 ene '23
5 feb '2
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas crít cas
División crítica
Retrasada
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 3

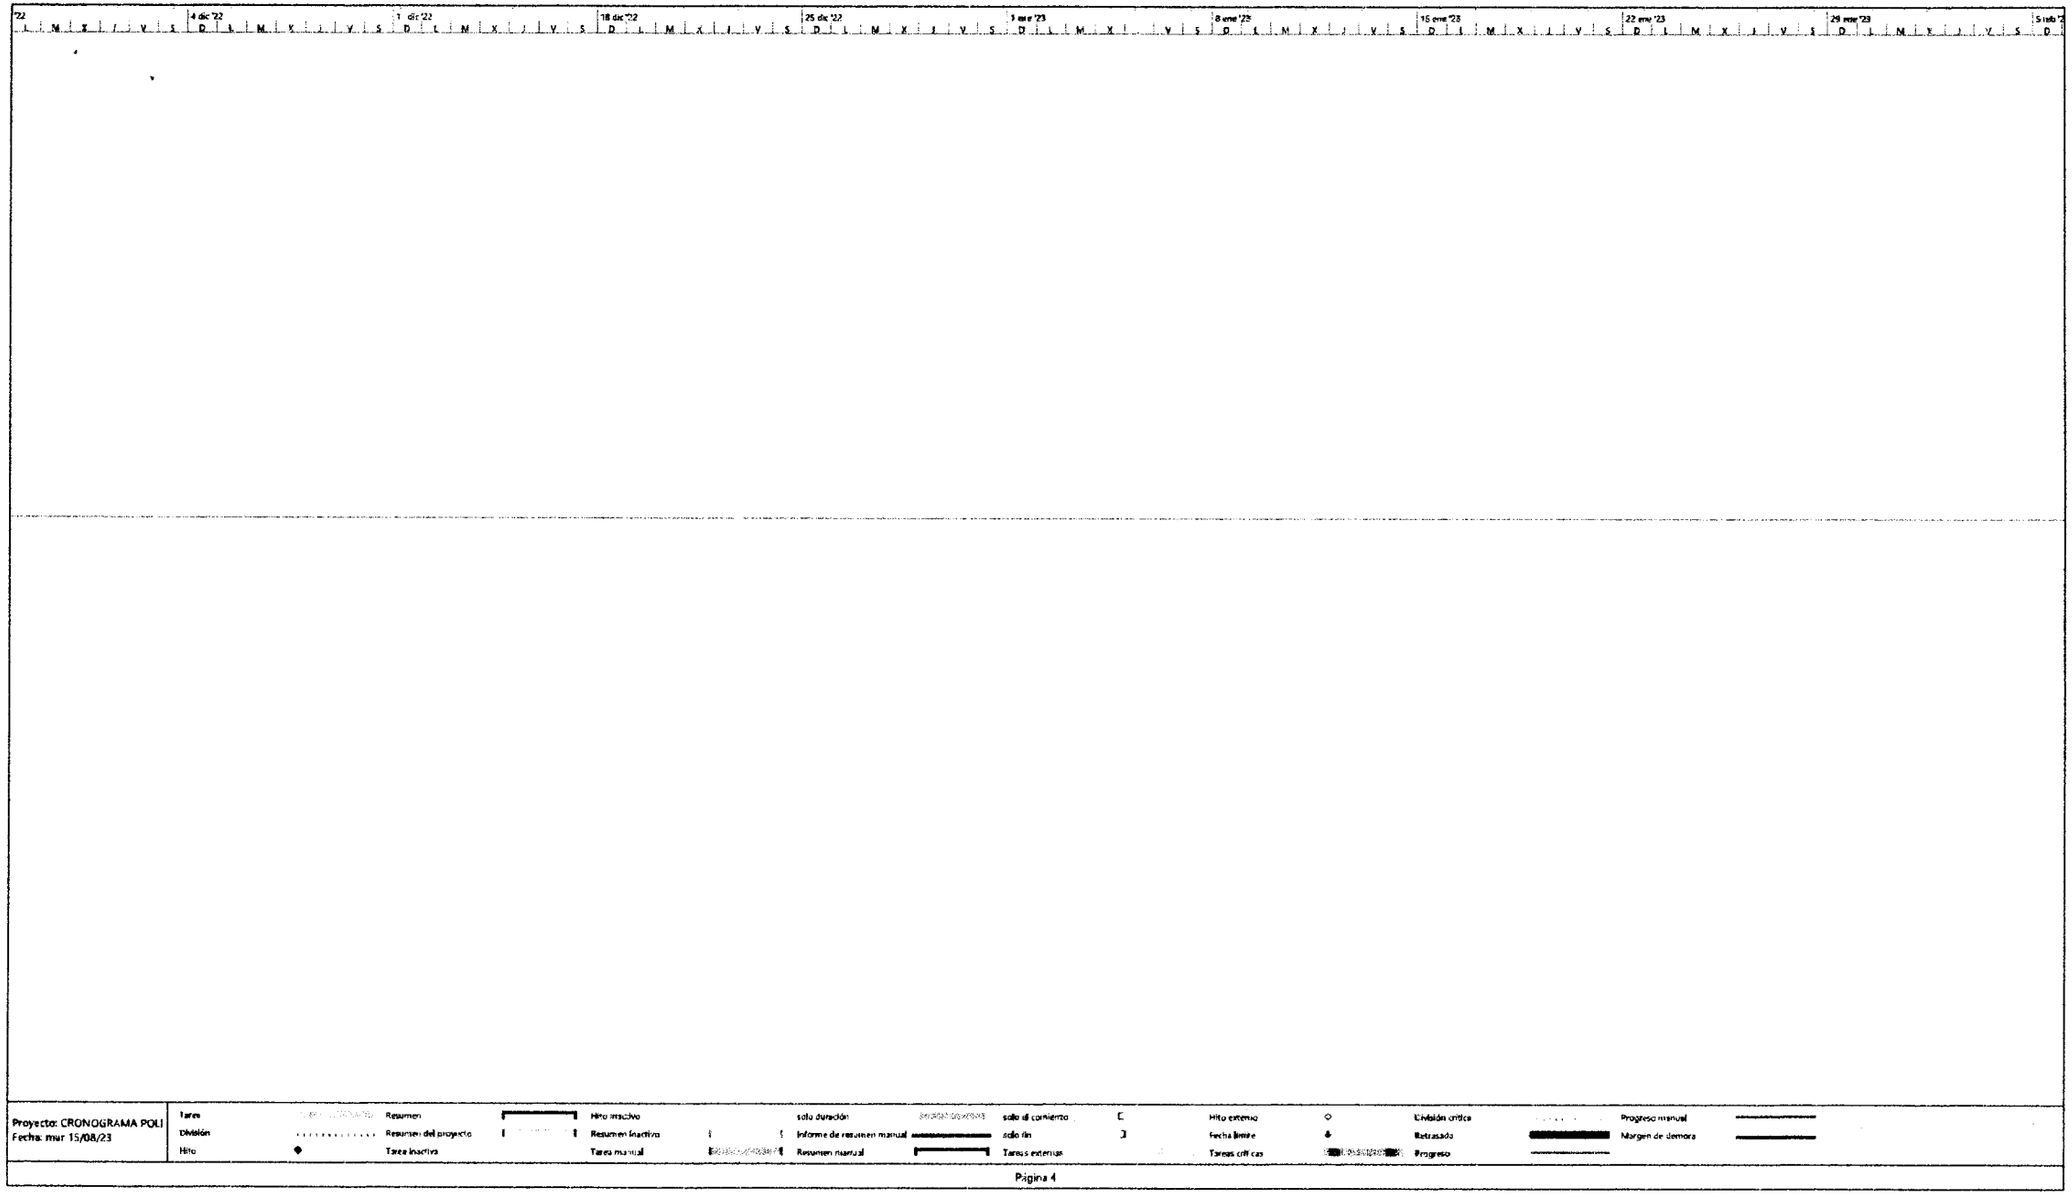

'22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
15 ene '23
22 ene '23
29 ene '23
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo inicio
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasado
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 4

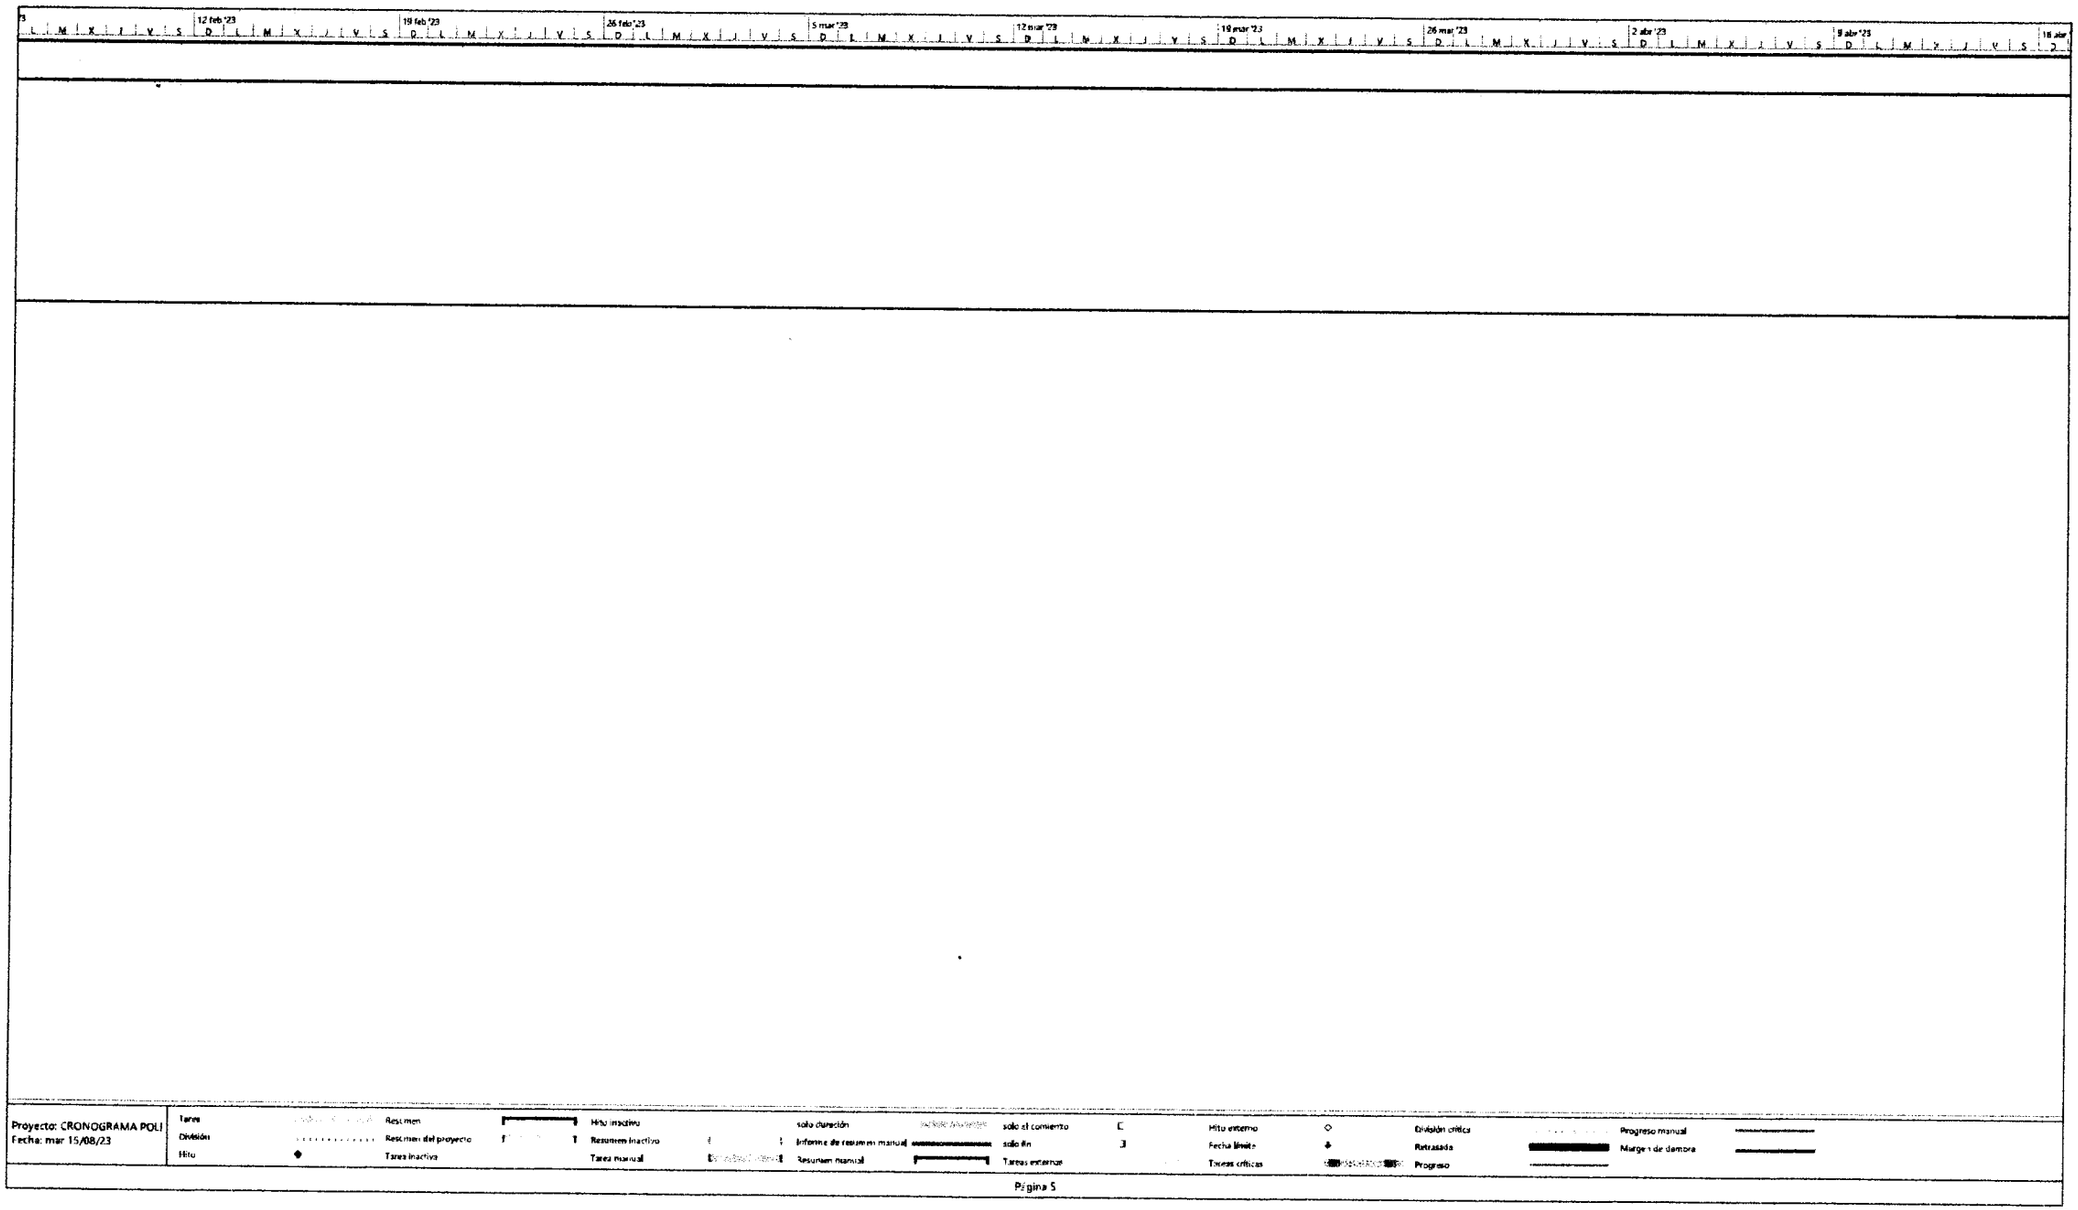

12 feb '23
19 feb '23
26 feb '23
5 mar '23
12 mar '23
19 mar '23
26 mar '23
2 abr '23
9 abr '23
16 abr
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Resumen manual
solo duración
Informe de resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasada
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 5

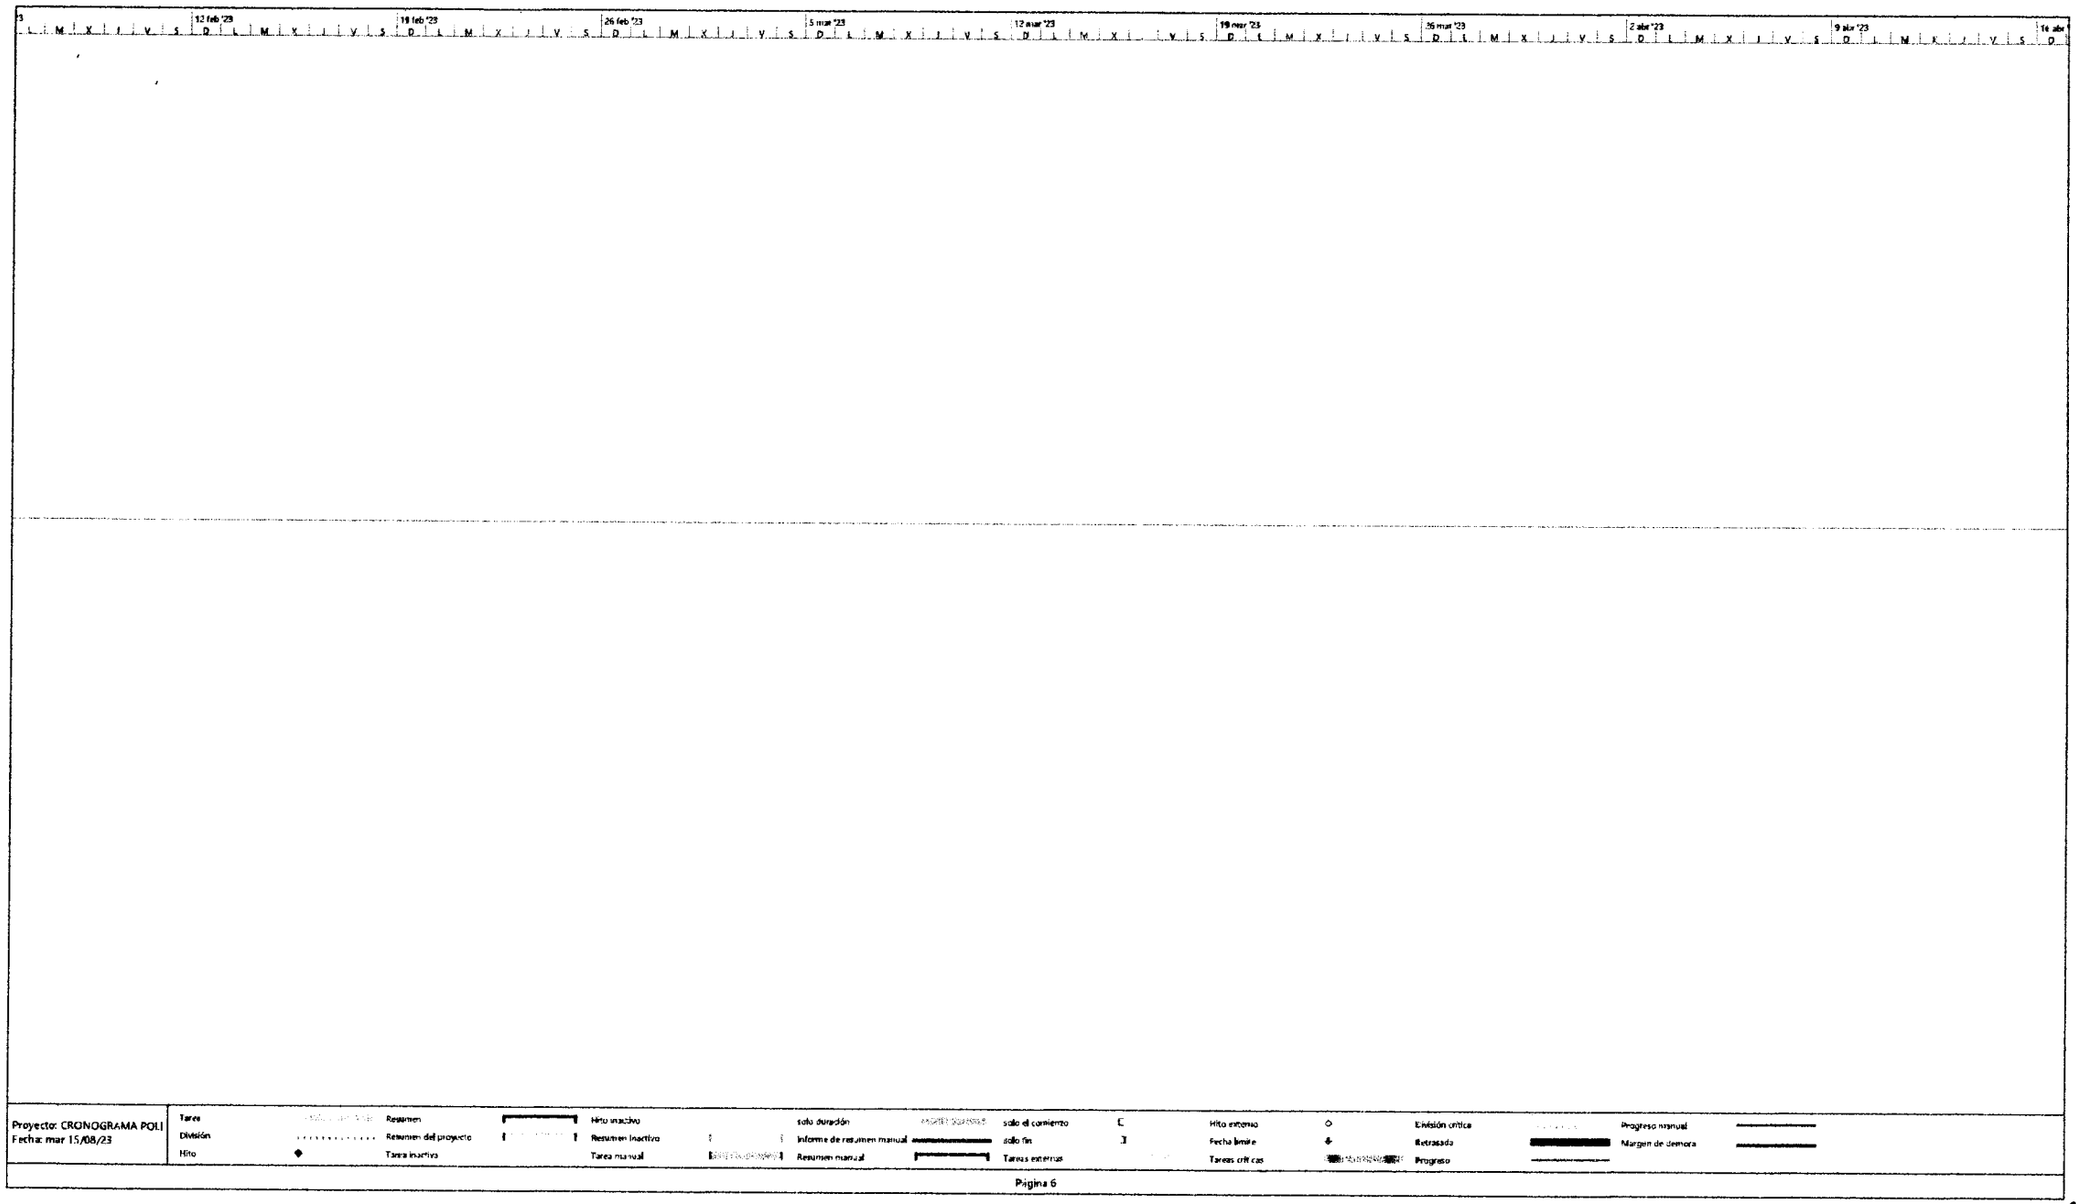
12 feb '23
19 feb '23
26 feb '23
5 mar '23
12 mar '23
19 mar '23
26 mar '23
2 abr '23
9 abr '23
16 abr
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasado
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

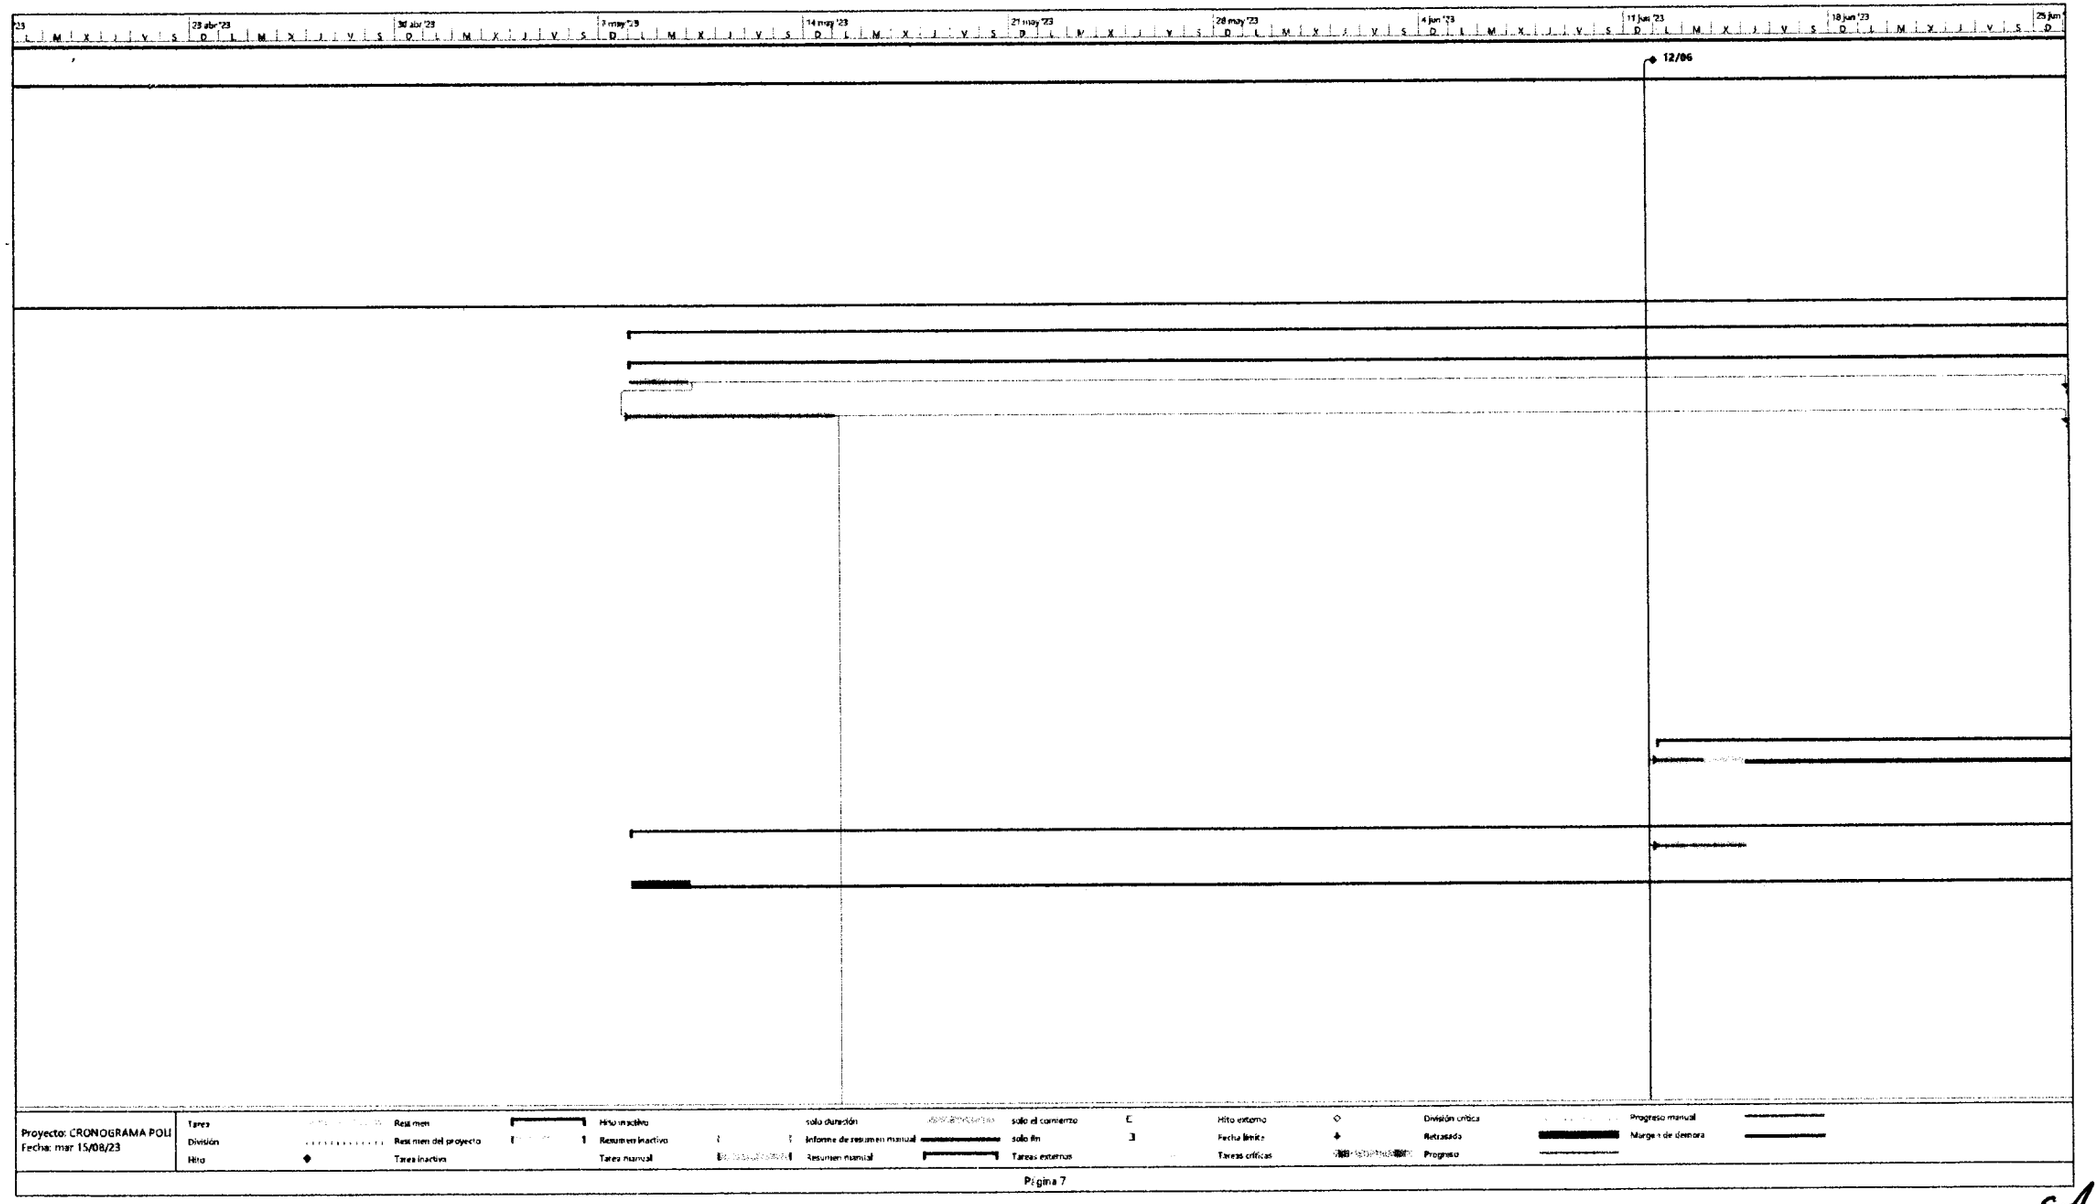
23
23 abr '23
30 abr '23
7 may '23
14 may '23
21 may '23
28 may '23
4 jun '23
11 jun '23
18 jun '23
25 jun
12/06
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo duración
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasado
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

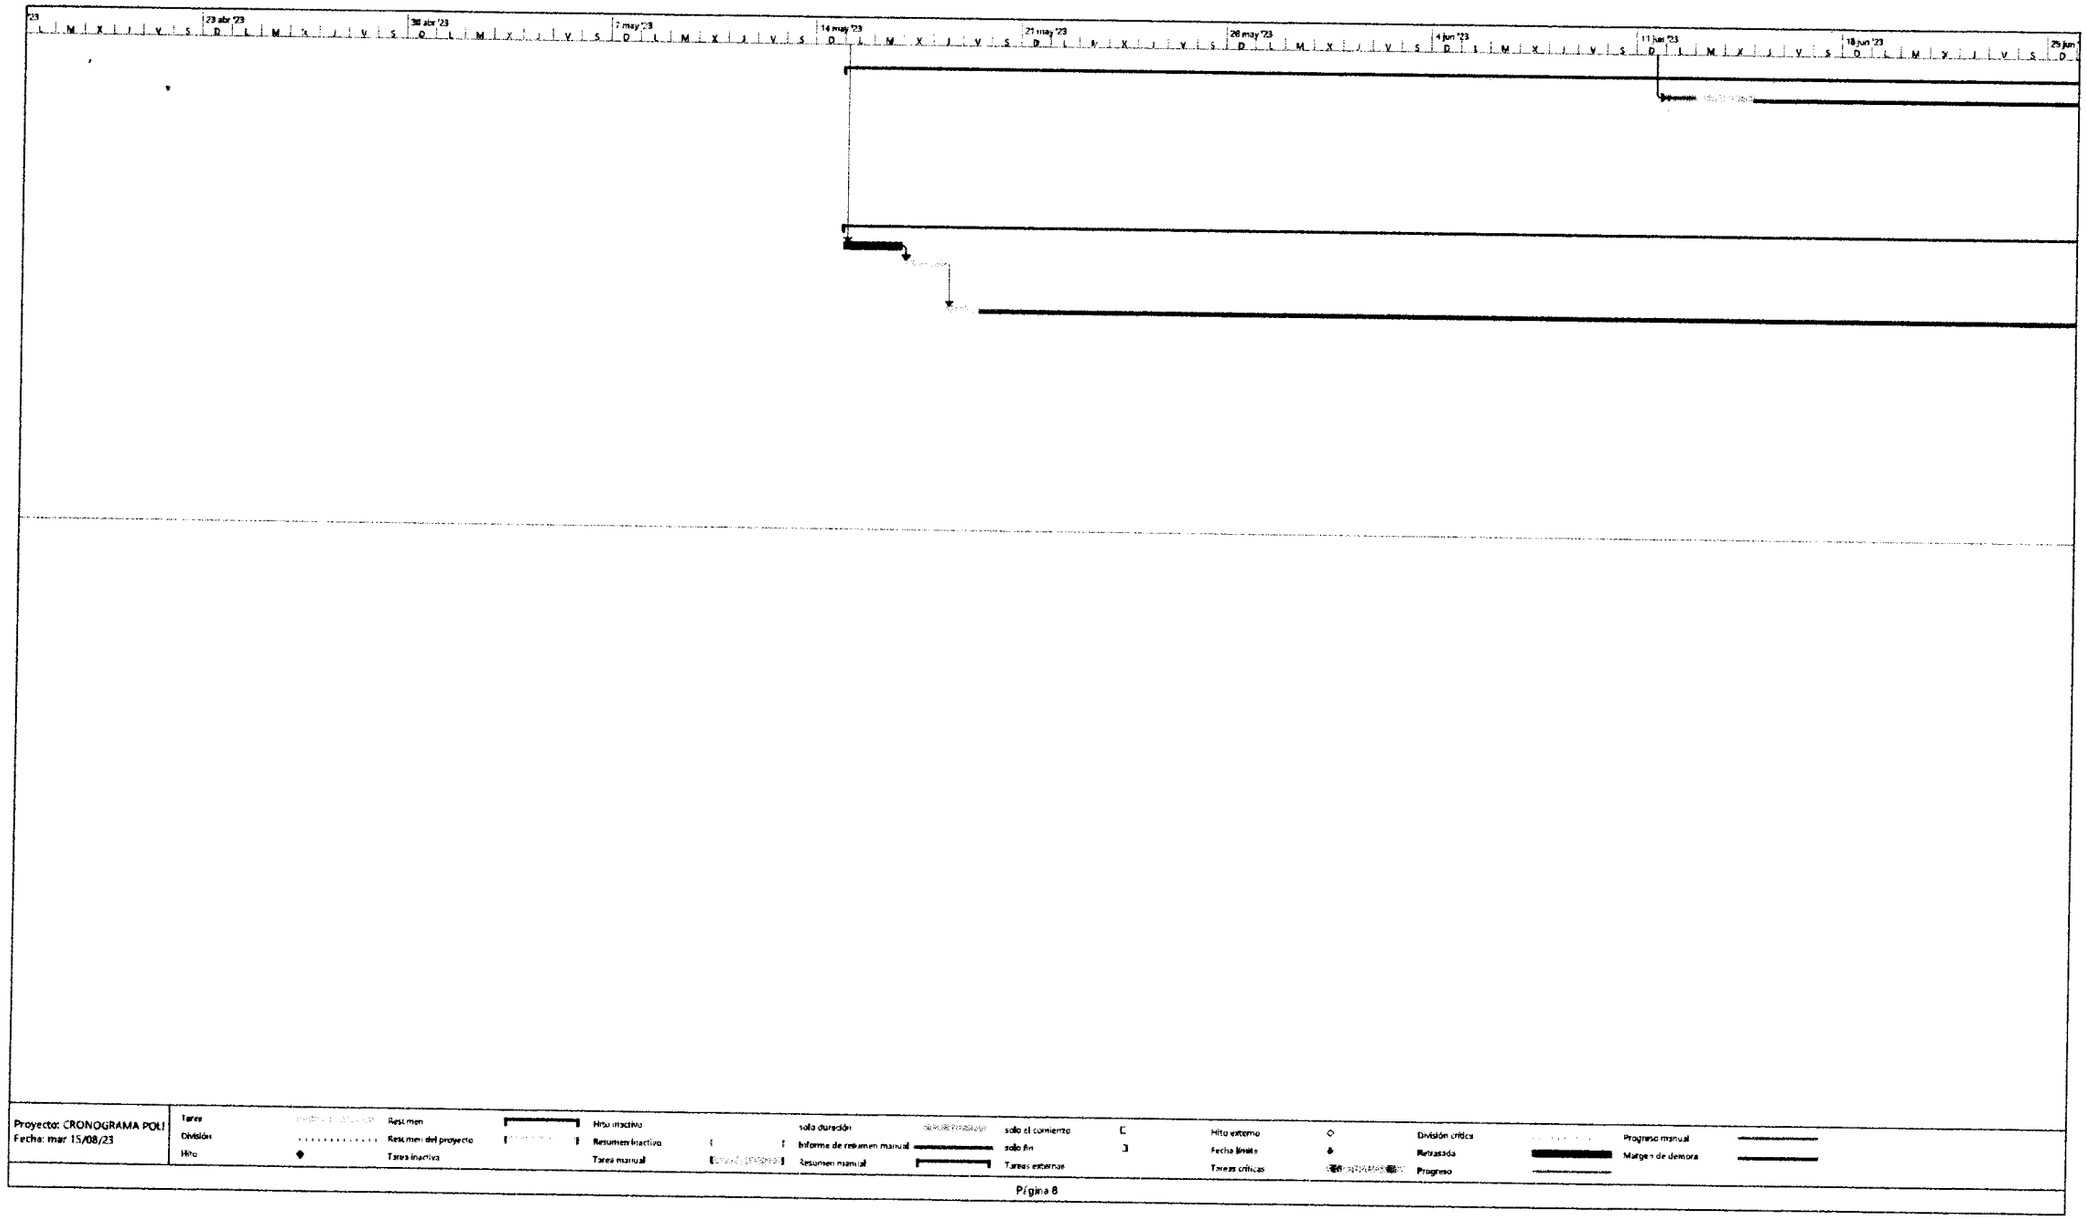
23
23 abr '23
30 abr '23
7 may '23
14 may '23
21 may '23
28 may '23
4 jun '23
11 jun '23
18 jun '23
25 jun
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Resumen manual
solo duración
Informe de resumen manual
solo fin
Tareas externas
solo el comienzo
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasada
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 8

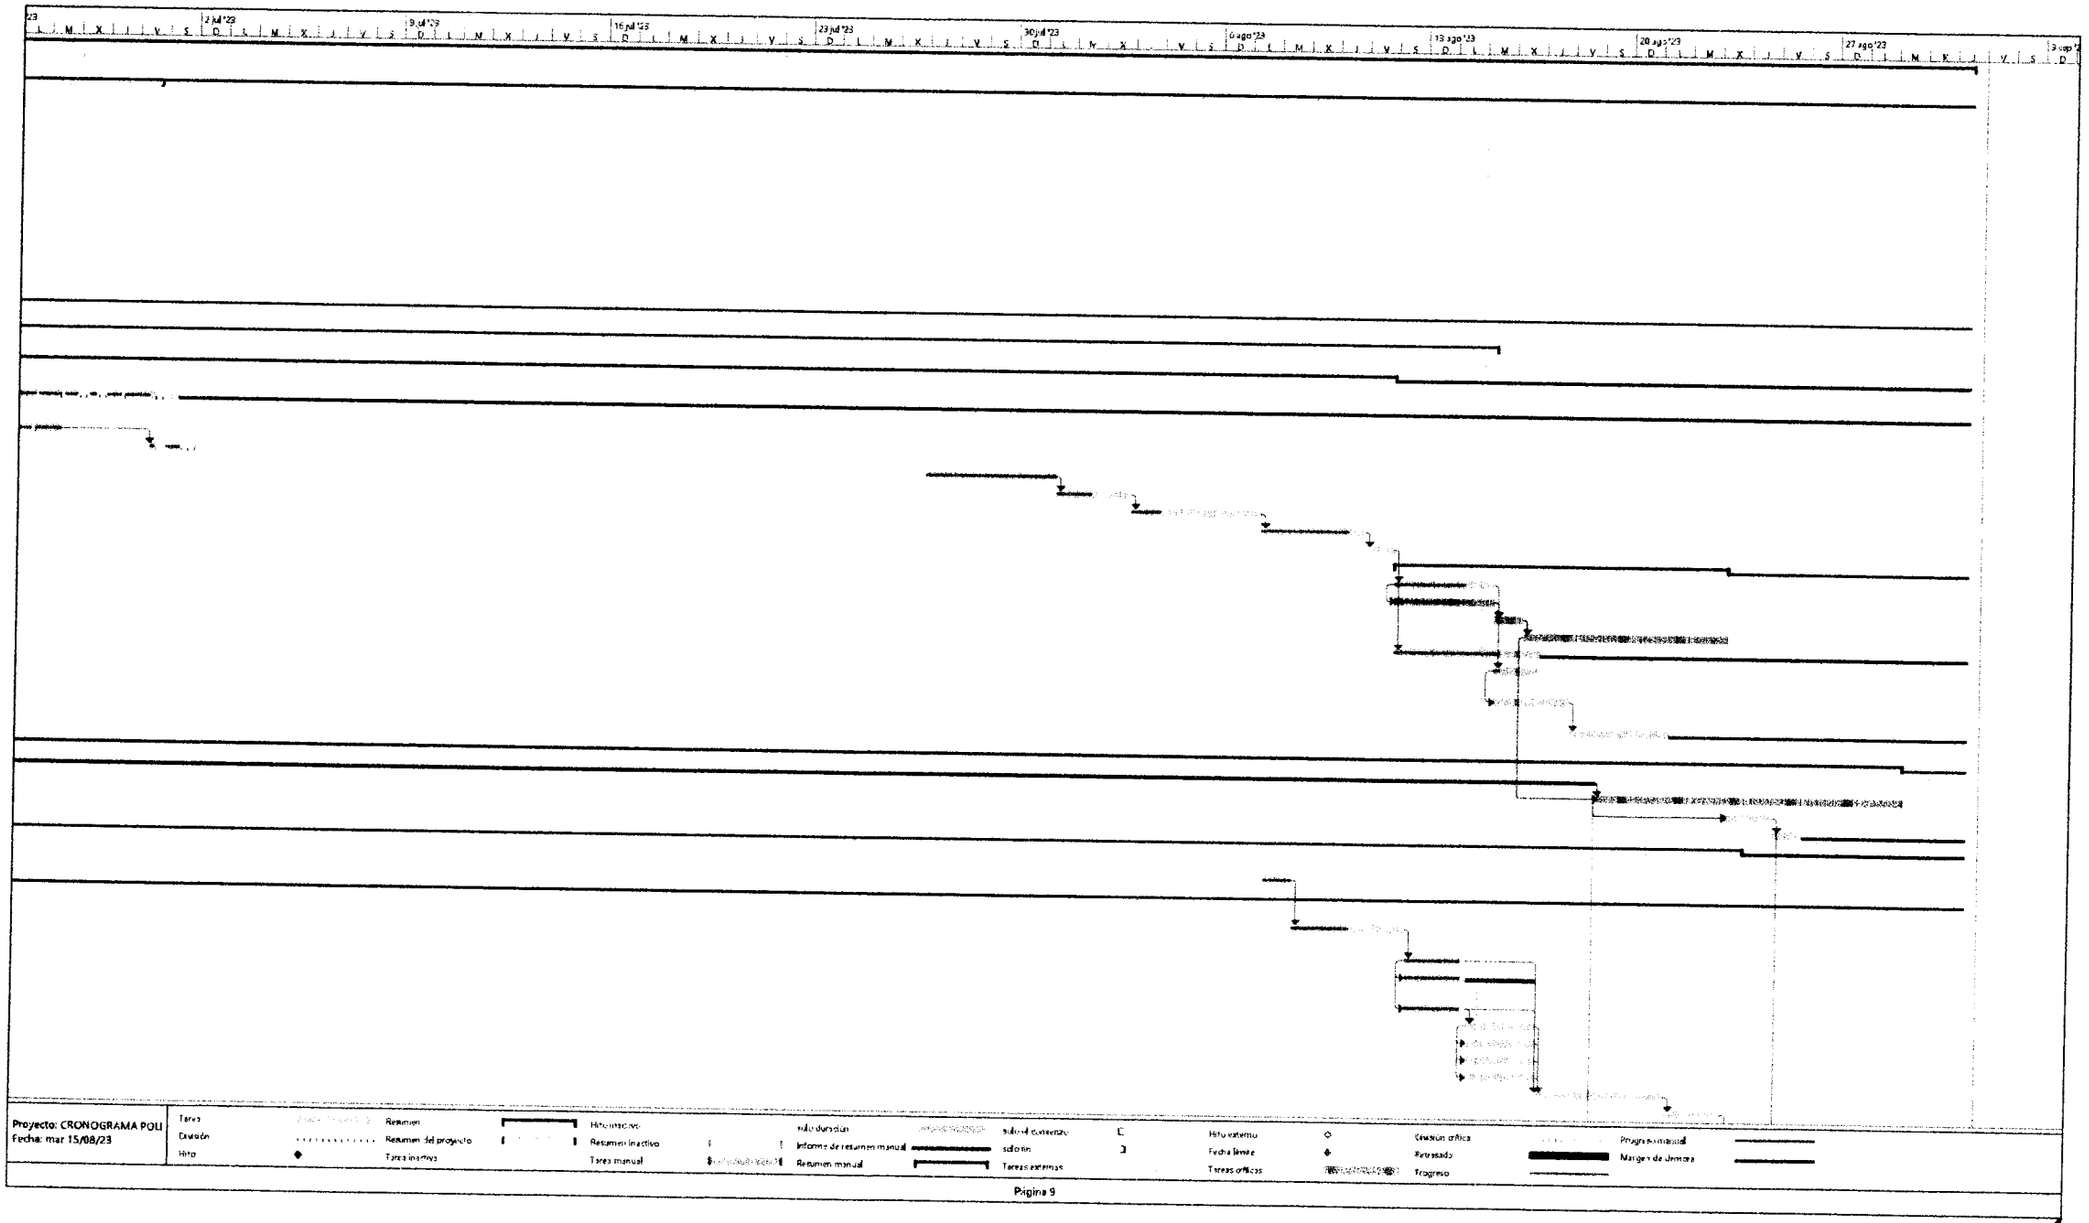
2 jul '23
9 jul '23
16 jul '23
23 jul '23
30 jul '23
6 ago '23
13 ago '23
20 ago '23
27 ago '23
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
Duración
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Informe de resumen manual
Resumen manual
sólo duración
sólo el comienzo
sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasado
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 9

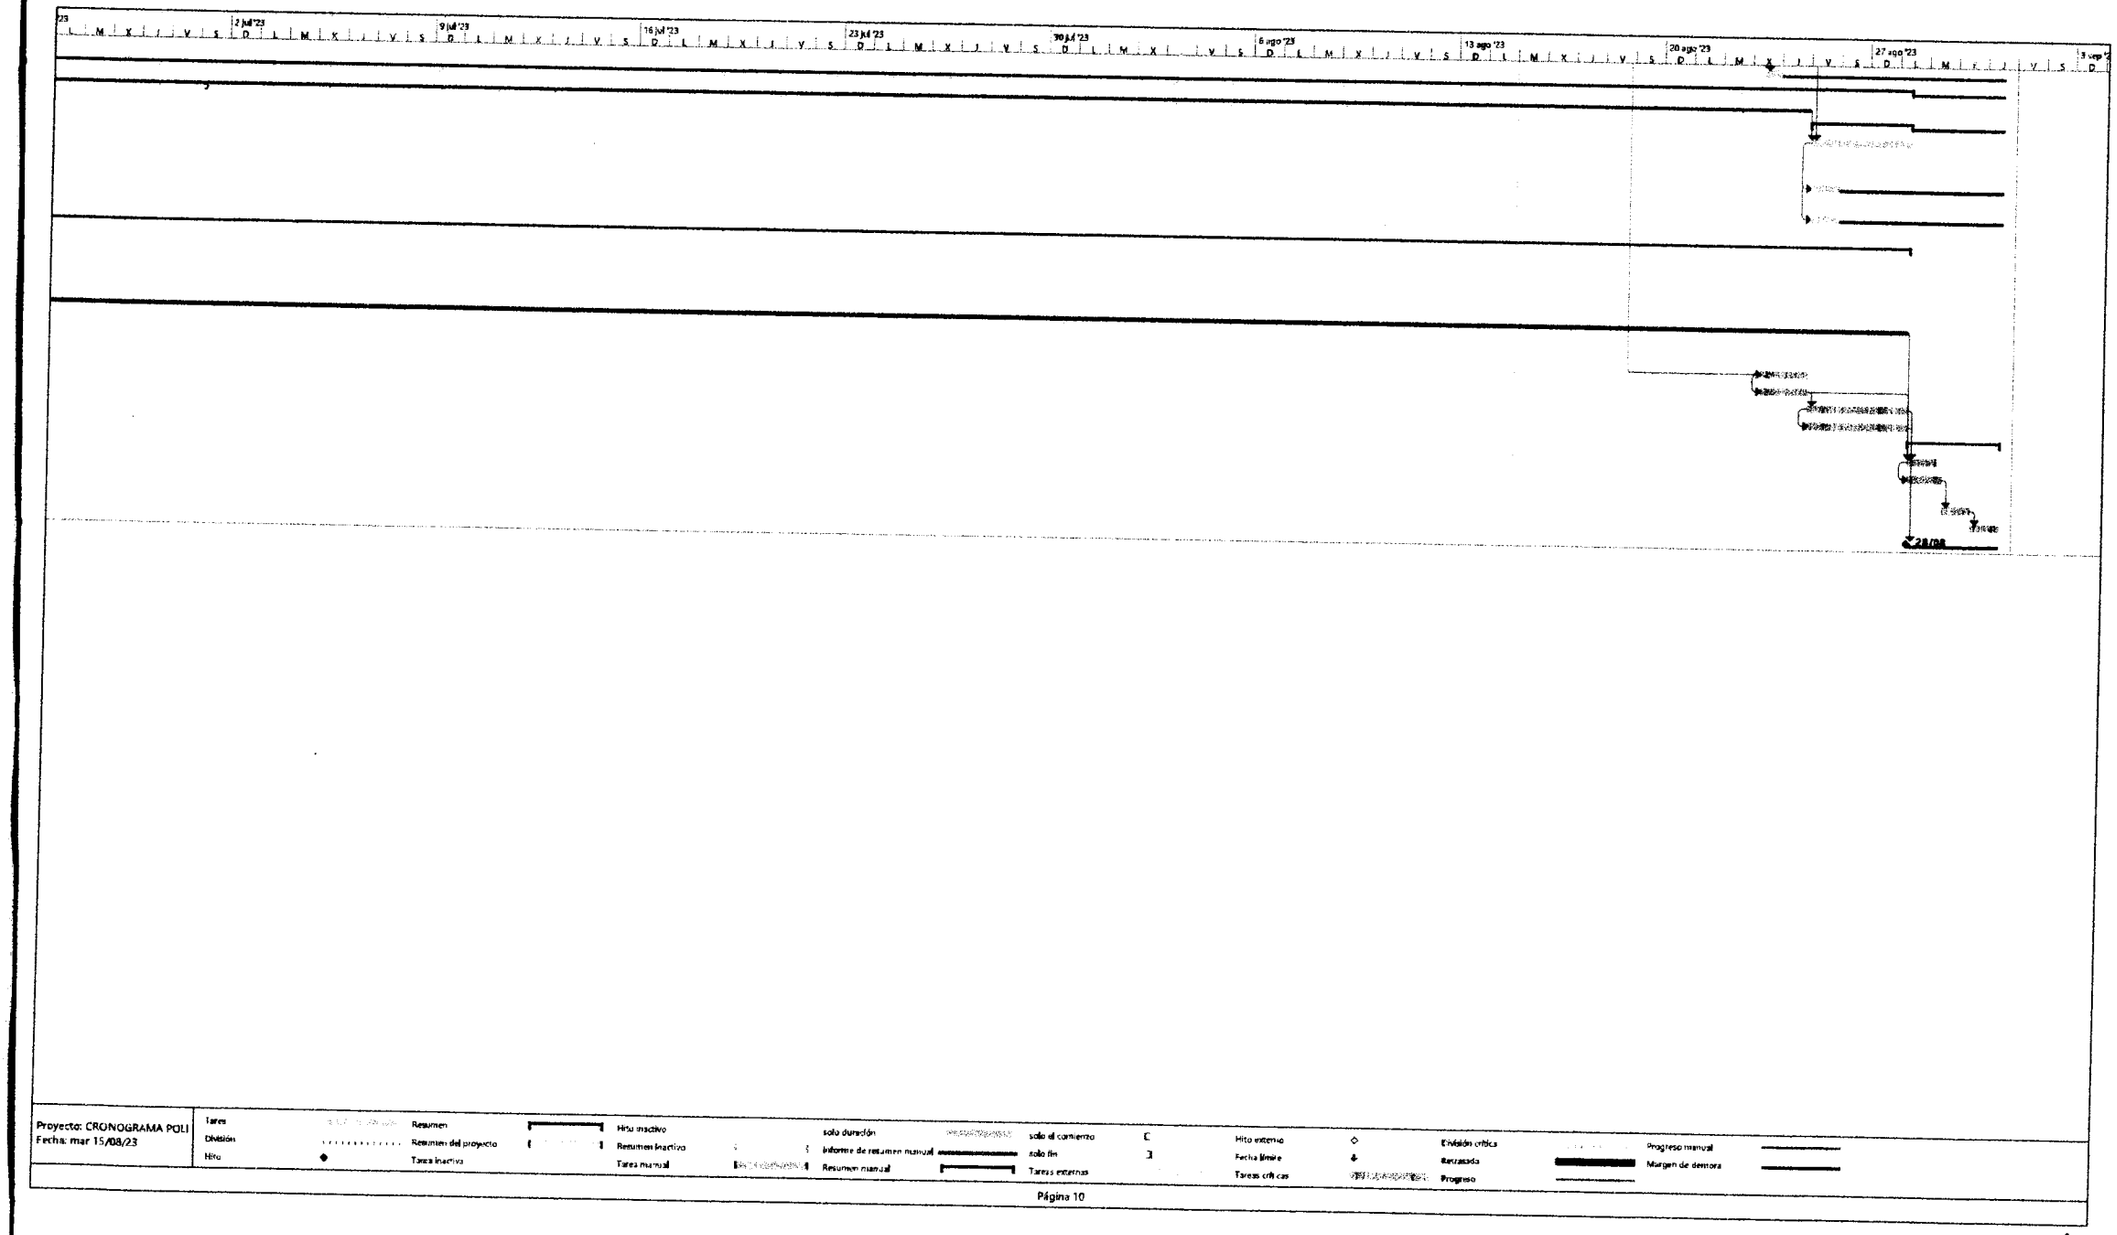
2 jul '23
9 jul '23
16 jul '23
23 jul '23
30 jul '23
6 ago '23
13 ago '23
20 ago '23
27 ago '23
Proyecto: CRONOGRAMA POLI
Fecha: mar 15/08/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasada
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
Página 10

FLUJO INVERSIÓN

