INGECONSULTA SAS

NIT: 829.000.737-7 DIR: Calle 50 N. 19-77 B. Colombia Barrancabermeja

Tel.: 6010454 correo: ingeconsultanotificaciones@hotmail.com
Responsable de IVA CIIU 7110

Factura electrónica de venta
No. FEN193

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCAT	**31/08/2023**	**$ 35.983.161,96**
NIT No. : 829003367-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 62 48 D 10 BRR PABLO ACUÑA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANCABERMEJA **PAIS :** Colombia	02/09/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301002	ACTA No 03 DEL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5063809 (016-2023) CUYO OBJETO ES ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	1 1	$ 35.983.161,96		$ 35.983.161,96

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/09/2023	$ 35.983.161,96

VALOR (en letras) : TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 96 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764036850861. Prefijo: FEN. Rango: 92 al 500. Vigencia: 27/09/2022 hasta 27/09/2023.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 02/09/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
fUcGod1tc6biBpSpd7ZxfbiQA4/e/H+RRR3rh06CHS3gtFjEoX20gbmSHqVE0rc5FVjHp0NjRWiwzcxVzcsnaC/4dEMLWTFVtkFw3064WI8rWX1RFfwFJXie/MapQ2XiOtlN9XVjTHwQeJu0EQXgmdeEFMD89gH4KRXRDq/odAef2L9qQ6YFO52FIkDBzV2PvFLEftqNNs84k8Q1IVA0OfdAZYj6CX6WAUjyTSrXlV3FLyqUSQvnit5Zs3jww/YVtbn6ATydOmsgzR2JNDpBwOQQ3kBFiUwV+EPLzrsaC+wDRRd499GVQRSRBWyoM8Cfd+j86g2yUjGeMA7LfYi5qw==

CUFE: 7520428e8fad88a3f2f6d8a21bb1b1ed8353756c6295cc435ec35cf2dcbedefb647fdfb5d78a683b4c54b4d357b106b2
Fecha emisión: 2023-09-01 11:35:39 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-01 11:27:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ACTA PARCIAL DE PAGO No.03
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5063809 (016-2023)

CONTRATANTE:	CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
NIT:	829.003.367-9
CONTRATISTA:	INGECONSULTA S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 829000737-7
REP. LEGAL:	HERNÁN DAVID FLÓREZ OLIVARES
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 79.419.365 EXPEDIDA EN BOGOTA
TELÉFONOS:	6010454
DIRECCIÓN:	CALLE 50 19 77 BARRIO COLOMBIA, BARRANCABERMEJA, SANTANDER
OBJETO:	"ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE LA IE CIUDADELA MAGDALENA MEDIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"
VALOR:	CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 140.898.406,59).
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO:	20 DE JUNIO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	19 OCTUBRE DE 2023
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($35.983.161,96).
PERIODO A COBRAR:	DEL 09 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2023.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	OCHENTA Y NUEVE COMA DOCE POR CIENTO 89,12%
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-00028 DEL 12 DE MAYO DE 2023.
CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
SUPERVISOR:	MARCOLINO ARIAS GARNICA

En Barrancabermeja, a los treinta y un días (31) días del mes de agosto de 2023, se reunieron por parte: El Lic. **MARCOLINO ARIAS GARNICA**, en su calidad de Supervisor y ordenador del gasto y por la otra parte el contratista el señor **HERNÁN DAVID FLÓREZ OLIVARES,** en su calidad de representante legal de la empresa **INGECONSULTA S.A.S,** identificada con NIT No. NIT No. 829000737-7, con el fin de tramitar el tercer desembolso correspondiente al **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 5063809 (016-2023);** de acuerdo con lo establecido en las condiciones del contrato Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de pago, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el apoyo técnico de la Secretaría de Educación Distrital

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$140.898.406,59**
ADICIONALES	**($ 0.0)**
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	**$45.392.668,35**
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	**$44.197.505,93**
VALOR PARA COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	**$35.983.161,96**
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR	**$15.325.070,36**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. El supervisor del contrato hace constar que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en el presente documento.
2. Hace parte integral a la presente Acta el anexo de avance de obra Acta Parcial No. 03

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por la Institución,

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector CEMM
Ordenador del Gasto

Por el contratista,

HERNÁN DAVID FLÓREZ OLIVARES
CC No. 79419365 expedida en Bogotá
Representante legal
INGECONSULTA SAS

lo tiene todo. Barrancabermeja

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.5063809 (016-2023)

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE LA IE CIUDADELA MAGDALENA MEDIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

CONTRATISTA	INGECONSULTA SAS	FECHA INICIO	20/06/2023	VALOR INICIAL	$140.898.465,93	ACTA PARCIAL N°01	$ 45.392.668,35	ACTA PARCIAL N°02	$44.197.505,93	ACTA PARCIAL N°03	$35.983.161,96	PORCENTAJE ACUMULADO
CONTRATANTE	CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGADALENA MEDIO	FECHA TERMINACION	19/10/2023	VALOR MAYORES Y MENORES CANTIDDES	$140.898.406,59	FECHA ACTA PARCIAL N°01	17 DE JULIO DE 2023	FECHA ACTA PARCIAL N°02	AGOSTO 10 DE 2023	FECHA PRESENTE ACTA	AGOSTO 31 DE 2023	
APOYO TECNICO	INGENIERO RAUL TORRES ALVAREZ	PLAZO	4 MESES	FECHA PRESENTE DEL ACTA	17/07/2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	32,22%	PORCENTALE DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL N°02	31,37%	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL N°03	25,54%	89,12%

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DURACIÓN (semanas)	CANT INICIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES			VALOR TOTAL PROYECCION	ACTA PARCIAL 01 CANTIDADES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR	ACTA PARCIAL 02 CANTIDADES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR	ACTA PARCIAL 03 CANTIDADES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR
5429		Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
	1,0	**Preliminares**		2			$ 25.393.520,00						$ 35.450.030,00									
543	Servicio de preparación de terrenos de construcción																					
	1,1	Localización y Replanteo	m2		602,23	$ 3.000,00	$ 1.806.690,00	0,00		-602,23		0,00	$ -		$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	1,2	Cerramiento provisional en malla polipropileno verde	m		97,00	$ 26.400,00	$ 2.560.800,00	0,00		0,00		97,00	$ 2.560.800,00		$ -	$ 2.560.800,00		$0,00	$ 2.560.800,00	20	$528.000,00	$ 2.032.800,00
	1,8	Desmonte de ventanas existentes	m		13,00	$ 20.000,00	$ 260.000,00	0,00		0,00		13,00	$ 260.000,00	3	$ 60.000,00	$ 200.000,00		$0,00	$ 200.000,00	10	$200.000,00	$ -
	1,9	Mantenimiento a tejas existentes y caballetes. Incluye limpieza, ajuste de amarres y ganchos.	m2		176,84	$ 28.000,00	$ 4.951.520,00	224,21		0,00		401,05	$ 11.229.400,00	208,05	$ 5.825.400,00	$ 5.404.000,00	193	$5.404.000,00	$ -		$0,00	$ -
	2,0	**Movimiento de tierras**		2			$ 2.339.486,00						$ 2.339.486,00		$ -			$0,00			$0,00	
5433	Servicio de excavación y movimiento de tierras														$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	2,1	Excavacion Manual en material común	m3		8,34	$ 48.900,00	$ 407.826,00	0,00		0,00		8,34	$ 407.826,00		$ -	$ 407.826,00		$0,00	$ 407.826,00		$0,00	$ 407.826,00
	2,2	Relleno compactado con material seleccionado recebo (Inc.	m3		3,55	$ 98.000,00	$ 347.900,00	0,00		0,00		3,55	$ 347.900,00		$ -	$ 347.900,00		$0,00	$ 347.900,00		$0,00	$ 347.900,00
	2,3	Cargue y retiro de material sobrante	m3-km		131,98	$ 12.000,00	$ 1.583.760,00	0,00		0,00		131,98	$ 1.583.760,00	54	$ 648.000,00	$ 935.760,00	36	$432.000,00	$ 503.760,00	24	$288.000,00	$ 215.760,00
5462	Servicios de fontanería y de construcción de drenajes														$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	4,1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco de descarga sencilla	un		8,00	$ 320.000,00	$ 2.560.000,00	0,00		-2,00		6,00	$ 1.920.000,00		$ -	$ 1.920.000,00	4	$1.280.000,00	$ 640.000,00		$0,00	$ 640.000,00
	4,2	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana sencillo para colgar. Incluye grifería y llaves de paso.	un		2,00	$ 202.000,00	$ 404.000,00	0,00		0,00		2,00	$ 404.000,00		$ -	$ 404.000,00	1	$202.000,00	$ 202.000,00	1	$202.000,00	$ -
	4,3	Suministro e instalación de tanques de agua de 1000 Litros	un		2,00	$ 1.080.000,00	$ 2.160.000,00	0,00		-2,00		0,00	$ -		$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	4,4	Suministro e instalación de tuberíaa PVC presión 1/2 pulgada	m		60,00	$ 18.000,00	$ 1.080.000,00	0,00		0,00		60,00	$ 1.080.000,00		$ -	$ 1.080.000,00	18	$324.000,00	$ 756.000,00	36	$648.000,00	$ 108.000,00
	6,0	**Puertas y Ventanas**		2			$ 14.446.000,00						$ 14.446.000,00		$ -			$0,00			$0,00	
5476	Servicios de carpintería														$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	6,1	Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada CAL 16 dim 2 x0,64	und		11,00	$ 720.000,00	$ 7.920.000,00	0,00		0,00		11,00	$ 7.920.000,00		$ -	$ 7.920.000,00		$0,00	$ 7.920.000,00	10	$7.200.000,00	$ 720.000,00
	6,2	Suministro e instalación de ventaneria para salones de clase con vidrio transparente 4mm y reja de hierro h=0,50m. Incluye pintura	m		13,00	$ 502.000,00	$ 6.526.000,00	0,00		0,00		13,00	$ 6.526.000,00		$ -	$ 6.526.000,00		$0,00	$ 6.526.000,00	13	$6.526.000,00	$ -
	8,0	**Pisos**		8			$ 16.147.588,00						$ 17.007.700,00		$ -			$0,00			$0,00	
5474	Servicios de acabado para pisos														$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	8,1	Suministro e instalacion de piso cerámico trafico pesado formato	m2		121,58	$ 108.600,00	$ 13.203.588,00	7,92		0,00		129,50	$ 14.063.700,00		$ -	$ 14.063.700,00	70	$7.602.000,00	$ 6.461.700,00	52,09	$5.656.974,00	$ 804.726,00
	8,2	Suministro e instalación de guardaescobas cerámico tráfico pesado formato mediano	m		92,00	$ 32.000,00	$ 2.944.000,00	0,00		0,00		92,00	$ 2.944.000,00		$ -	$ 2.944.000,00		$0,00	$ 2.944.000,00	91	$2.912.000,00	$ 32.000,00
	9,0	**Carpinteria metalica y madera**		4			$ 4.848.590,00						$ 7.001.240,00		$ -			$0,00			$0,00	
5479	Otros servicios de terminación y acabado de edificios														$ -	$ -		$0,00	$ -		$0,00	$ -
	10,1	Aseo en general	m2		602,23	$ 2.000,00	$ 1.204.460,00	0,00		0,00		602,23	$ 1.204.460,00	320	$ 640.000,00	$ 564.460,00	140	$280.000,00	$ 284.460,00	120	$240.000,00	$ 44.460,00
	11,0	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**											$ 13.581.405,00		$ -			$0,00			$0,00	
	11,3	Resane y mantenimiento de pared baños. Incluye frisos, estuco y pintura	m2		19	$ 54.895,00							$ 1.043.005,00		$ -	$ 1.043.005,00	8,5	$466.607,50	$ 576.397,50	10	$548.950,00	$ 27.447,50
	11,4	Suministro e instalacion de llaves tipo push acero inoxidable tomaderos de agua niños	und		9	$ 129.000,00							$ 1.161.000,00		$ -	$ 1.161.000,00		$0,00	$ 1.161.000,00	9	$1.161.000,00	$ -
	11,5	Suministro e instalación de tanques de agua de 500 Litros	und		2	$ 891.500,00							$ 1.783.000,00		$ -	$ 1.783.000,00		$0,00	$ 1.783.000,00	2	$1.783.000,00	$ -
		SUB TOTAL DE LA OBRA					$ 109.223.617,00						$ 109.223.571,00		$ 35.188.115,00	$ 74.035.456,00		$ 34.261.632,50	$ 39.773.823,50		$ 27.893.924,00	$ 11.879.899,50
		Administración 24%					$ 26.213.668,08						$ 26.213.657,04		$ 8.445.147,60	$ 17.768.509,44		$ 8.222.791,80	$ 9.545.717,64		$ 6.694.541,76	$ 2.851.175,88
		Imprevistos 0%					$ -						$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -
		Utilidad 5%					$ 5.461.180,85						$ 5.461.178,55		$ 1.759.405,75	$ 3.701.772,80		$ 1.713.081,63	$ 1.988.691,18		$ 1.394.696,20	$ 593.994,98
		VLR. TOTAL DE LA OBRA					$ 140.898.465,93						$ 140.898.406,59		$ 45.392.668,35	$ 95.505.738,24		$ 44.197.505,93	$ 51.308.232,32		$ 35.983.161,96	$ 15.325.070,36
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO					$ 140.898.465,93															

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
INGECONSULTA SAS

MARCOLINO ARIAS GARNICA
RECTOR

INFORME TÉCNICO			
TIPO DE SOLICITUD: Solicitud verbal			
SOLICITANTE	**PERSONA JURIDICA**		
HEYNER MANCERA RINCON / MARIO CARVAJAL PRADA	**IE JORGE ELIECER GAITAN**		
FECHA DE LA SOLICITUD	22/08/2023	**FECHA DE LA VISITA**	25/08/2023
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	**COMUNA/ CORREGIMIENTO**	**BARRIO/VEREDA**	**LUGAR/SECTOR**
Barrancabermeja	7	JORGE ELIECER GAITAN	BARRANCABERMEJA

UBICACIÓN

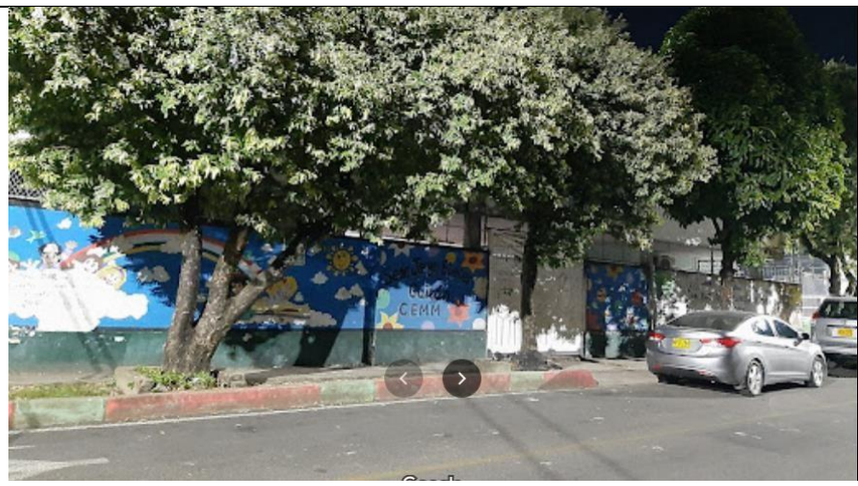


Figura N°1. Localización, IE JORGE ELIECER GAITAN
Coordenadas: 7.0555109177956545, -73.82503529776548

DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA

Se realizó una visita a la IE JORGE ELIECER GAITAN, con la finalidad de realizar toma de medidas en cantidades ejecutadas de la obra “ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITAN DE LA IE CIUDADELA MAGDALENA MEDIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER”, dentro de estas se encuentran los siguientes ítems:

- **1.8** Desmonte de ventanas: Cantidad medida en campo igual a **10 m2**
- **1.2** Cerramiento provisional: cantidad medida en campo: **20 ml**
- **2.3** Cargue y retiro de material sobrante: equivalente a **24 m3** transportados con volquetas y camioneta
- **4.2** Instalación de lavamanos: Cantidad tomada en campo igual a **1 UND**
- **4.4** Suministro e instalación de tubería PVC de ½”: cantidad tomada en campo **36 m2**
- **6.1** Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada: cantidad tomada en campo: **10 UND**
- **6.2** Suministro e instalación de ventanearía: cantidad tomada en campo: **13 ml**
- **8.1** Suministro e instalación de enchape trafico pesado: cantidad tomada en campo: **52.09 m2**
- **8.2** Suministro e instalación guarda escobas: cantidad tomada en campo **91 ml**
- **10.1** Aseo en general: medida de **120 m2**

ITEM NO PREVISTO

11.3 Resane y mantenimiento de pared baños: cantidad medida en campo **10 m2**

11.4 Suministro e instalación llaves tipo push: cantidad tomada en campo: **9 UND**

11.5 Suministro e instalación tanques de 500 lt: **2UND**

A continuación, se anexan imágenes correspondientes a la visita realizada

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía N°01: DESMONTE VENTANAS



Fotografía N°02: CARGUE MATERIAL SOBRANTE



Fotografía N°03: INSTALACION LAVAMANOS



Fotografía N°04: TUBERIA PVC ½”

	
Fotografía N°05: INSTALACIÓN PUERTAS	**Fotografía N°06:** INSTALACION VENTANAS
	
Fotografía N°07: Enchape tipo pesado	**Fotografía N°08:** GUARDA ESCOBAS
	
Fotografía N°09: CERRAMIENTO	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- La visita se realizó y las medidas se realizaron de manera correcta siendo verificadas por la ingeniera residente Verónica Hernández Jalkn y el Maestro de obra Iván Bravo, siendo finalizadas sobre las 11:30 am.

- Este informe no aprueba ni desaprueba el pago de actas de cobro.

RECOMENDACIONES:

Atentamente,

Ing. Raúl Torres Álvarez
Profesional Universitario.
Secretaría de Infraestructura. CPS

ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

INFORME CONTRATISTA

FECHA: 25 DE AGOSTO 2023

POR: INGECONSULTA SAS.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 10 DE 2023-JUEVES

- Se abre libro de obra.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 2 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor
- Máquina de cortar enchape
- Pulidora

.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Continuación del armado de refuerzo del muro de mampostería (vigas aéreas y de cimentación)
- Instalación del cerramiento provisional en tela verde en la fachada del colegio para futuro trabajo de demolición del muro.
- Continuación del enchape de circulación y brechado.

FOTOGRAFIAS



Ilustración 1: Continuación del enchapado de circulación.



Ilustración 2: Armado de acero de refuerzo vigas de cimentación y aérea.









Ilustración 3: Instalación del cerramiento provisional.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 11 DE 2023-VIERNES

- Se abre libro de obra.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 2 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- ➢ Herramienta menor
- ➢ Máquina de cortar enchape
- ➢ Pulidora

.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- ➢ Continuación del armado de refuerzo del muro de mampostería (Viga de cimentación).
- ➢ Continuación del enchape y brechado del piso de circulación restante.

FOTOGRAFIAS



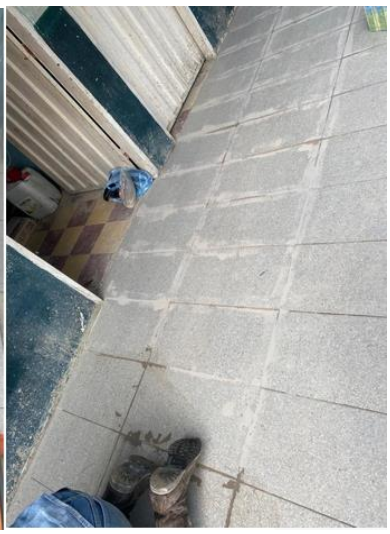




Ilustración 4: Instalación del enchape y brechado del piso de circulación.



Ilustración 5: Armado de acero de refuerzo viga de cimentación.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 12 DE 2023-SABADO

- Se abre libro de obra.
- Llega pulidora de 9'', taladro demoledor y carretilla de alquiler.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 2 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA


- Herramienta menor
- Máquina de cortar enchape
- Pulidora

.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Inicio de actividad del guarda escobas del piso de circulación.
- Brechado del guarda escobas

FOTOGRAFIAS

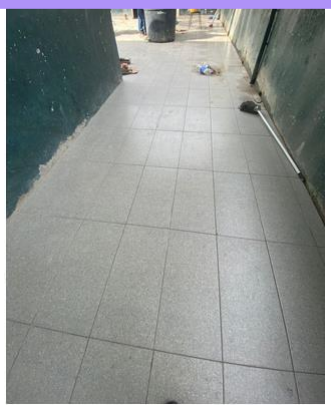



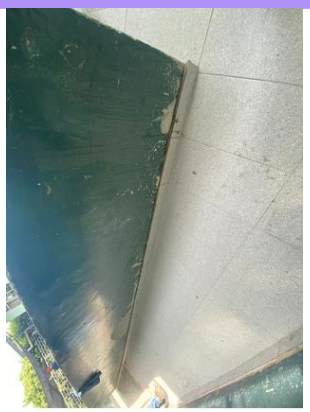




Ilustración 6: Instalación y brechado del guardaescobas.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 14 DE 2023-LUNES.

- Se abre libro de obra.
- Visita por parte del apoyo en supervisión el ingeniero Raúl torres, para medir cantidades y definir cantidades acta adicional.
- Llegaron 11 puertas para instalar.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor
- Máquina de cortar enchape
- Pulidora
- Taladro demoledor
- Pulidora de 9"
- Porra de 15 Lb

.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Terminación del enchape de guardaescobas del piso de circulación.
- Brechado del guardaescobas del piso de circulación.
- Demolición del lavamanos del baño de niñas del primer piso.
- Demolición del muro de mampostería lado izquierdo fachada.
- Inicio de la realización del muro del lavamanos.
- Cambio de tubería sanitaria del lavamanos del baño de niñas del primer piso.

FOTOGRAFIAS









Ilustración 7: Instalación y brechado del guarda escobas.









Ilustración 8: Demolición e inicio de creación del lavamanos con su cambio de tubería.







Ilustración 9: Demolición del muro de mampostería.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 15 DE 2023-MARTES.

- Se abre libro de obra.
- Llega tanque de 600ml de compra.
- Llega trompo.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 2 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor
- Máquina de cortar enchape
- Pulidora
- Taladro demoledor
- Pulidora de 9"
- Porra de 15 Lb

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Continuación del muro del lavamanos
- Continuación de la demolición del muro
- Inicio de demolición de piso y excavación a profundidad de 70 cm.
- Continuación del enchape del baño de niñas del primer piso.

FOTOGRAFIAS



Ilustración 10: Enchape de baño del primer piso niñas



Ilustración 11: Inicio de demolición y excavación.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO NUBLADO, CON PRESENCIA DE LLUVIA., TARDE SOLEADA.



AGOSTO 16 DE 2023-MIERCOLES.

- Se abre libro de obra.
- Llega visita del líder Fernando pacheco con el fin de hacer veeduría y mirar avance de obra.
- Por condiciones climáticas se tuvo que quitar agua estancada.
- Se realiza visita por parte del líder Fernando pacheco para hacer veeduría del estado de la obra.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor
- Máquina de cortar enchape
- Pulidora
- Taladro demoledor
- Pulidora de 9"
- Porra de 15 Lb

.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Continuación de la demolición de piso viga de cimentación y ciclópeo)
- Instalación de las puertas del baño de niñas primer piso.

FOTOGRAFIAS



Ilustración 12: Demolición de viga y ciclópeo.



Ilustración 13: Instalación de puertas.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 17 DE 2023-JUEVES.

- Se abre libro de obra.
- Se entrega de alquiler taladro demoledor y pulidora de 9"

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor
- Pulidora
- Trompo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Se Inicia formaleta y proceso de fundida para la viga en concreto simple.
- Se instala el acero de refuerzo de la viga de cimentación y columnetas.
- Se inicia formaleta y proceso de fundida para la viga de cimentación.

FOTOGRAFIAS



Ilustración 14: Encofrado y vaciado de concreto para la viga de soporte



Ilustración 15: Instalación del armado de refuerzo viga de cimentación y columnetas.



Ilustración 16: Fundida de viga simple y viga de cimentación.



Ilustración 17: Botada de escombros.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 19 DE 2023-viernes.

- Se abre libro de obra.
- Llega 4 secciones de andamios + 2 tablones adicionales

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- ➢ Herramienta menor

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- ➢ Se inicia actividad de instalación de bloques de mampostería ladrillo H-10.

FOTOGRAFIAS




Ilustración 18: Instalación de bloques de ladrillo H-10.

TIEMPO RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO SOLEADO, SIN VIENTO.



AGOSTO 20 DE 2023-SABADO.

- Se abre libro de obra.
- Llegan 3 ventanas para instalar.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Se continua con la actividad de instalación de bloques de mampostería ladrillo H-10.
- Se hace fundida de 3 columnetas con concreto de 3000PSI con su respectiva formaleta.

FOTOGRAFIAS




Ilustración 19: Fundida e instalación de bloques H-10.

TIEMPO RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME



CLIMA: CIELO NUBLADO, SIN VIENTO



AGOSTO 22 DE 2023-MARTES.

- Se abre libro de obra.
- Llegan pedido de ventanas.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Se hace instalación de los 2 tanques de 600 ml, ubicados en la placa del baño del segundo piso con su respectiva tubería.
- Se continua con la instalación de las puertas.
- Se inicia resane en estuco de la placa del paño de niños del segundo piso.

FOTOGRAFIAS



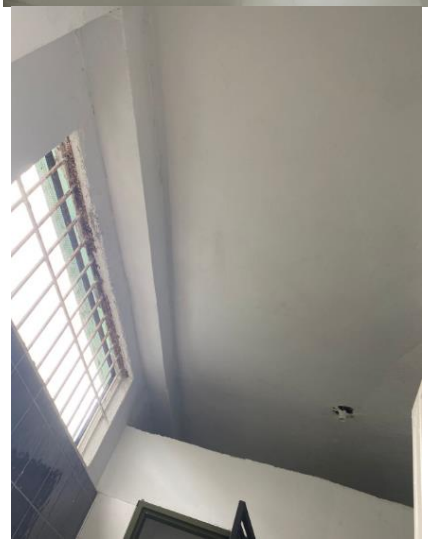
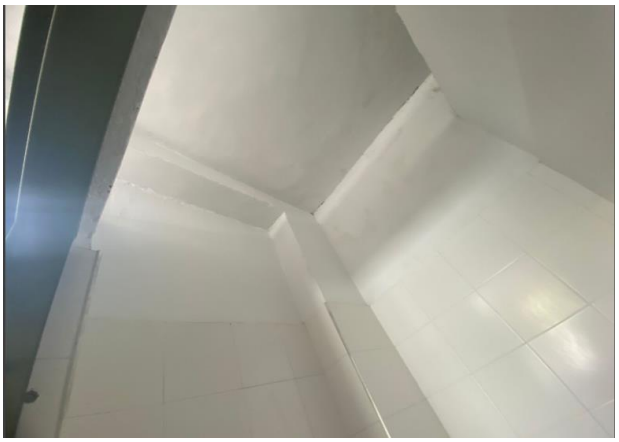



Ilustración 20: Suministro de estuco (resane)

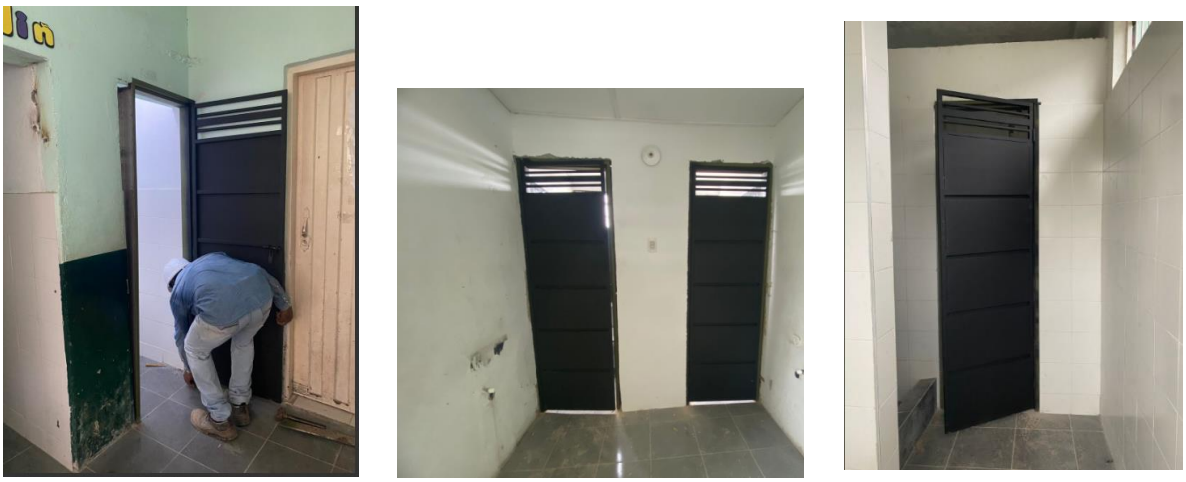


Ilustración 21: Instalación de puertas.



Ilustración 22: Instalación de tanques de 600ml

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME

CLIMA: CIELO NUBLADO, SIN VIENTO



AGOSTO 23 DE 2023-MIERCOLES.

- Se abre libro de obra.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- Herramienta menor

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Se continua con la instalación de la puerta del baño de niñas del segundo piso y puerta del baño principal del primer piso.
- Se inicia desmonte de ventanas.
- Se inicia instalación de ventanas.
- Se instala el acero de refuerzo de la viga aérea con su respectivo encofrado.
- Se instalan llaves de agua tipo push en los lavaderos de manos.

FOTOGRAFIAS





Ilustración 23: Instalación de llaves tipo push




Ilustración 24:Instalación del acero de refuerzo viga aérea y encofrado.




Ilustración 25: Vaciado de concreto.




Ilustración 26: Instalación de ventanas.





Ilustración 27: Instalación de puertas y desmonte de ventanas.

TIEMPO	RANGO CRONOLOGICO DEL INFORME

CLIMA: CIELO NUBLADO, SIN VIENTO

AGOSTO 24 DE 2023-JUEVES.

- Se abre libro de obra.

PERSONAL RESIDENTE EN OBRA:

- ✓ 1 Residente.
- ✓ 1 Maestro
- ✓ 1 Oficial
- ✓ 3 Ayudantes

EQUIPO- MAQUINARIA

- ➢ Herramienta menor
- ➢ Pulidora
- ➢ Trompo

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- ➢ Se desencofra la viga aérea y las columnetas.
- ➢ Se inicia la actividad del friso impermeabilizado en el muro por ambas caras.
- ➢ Se desmonta las ventanas restantes.
- ➢ Se continua y finaliza la instalación de ventanas.
- ➢ Se instala 1 lavamanos en el baño de los niños del segundo piso.

FOTOGRAFIAS



Ilustración 28: Desencofrada de viga aérea y columnetas esquineras.



Ilustración 29: Inicio de frisado impermeabilizado del muro.



Ilustración 30: Desmonte y montaje de ventanas.



Ilustración 31: Instalación de lavamanos.

CANTIDADES EJECUTADAS

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	ACTA PARCIAL 03 CANTIDADES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR
5429		Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería		CANTIDAD	VALOR	
	1,0	Preliminares				
543	Servicio de preparación de terrenos de construcción					
	1,1	Localización y Replanteo	m2		$0,00	$ -
	1,2	Cerramiento provisional en malla polipropileno verde	m	20	$528.000,00	$ 2.032.800,00
	1,8	Desmonte de ventanas existentes	m	10	$200.000,00	$ -
	1,9	Mantenimiento a tejas existentes y caballetes. Incluye limpieza, ajuste de amarres y ganchos.	m2		$0,00	$ -
	2,0	Movimiento de tierras			$0,00	
5433	Servicio de excavación y movimiento de tierras				$0,00	$ -
	2,1	Excavacion Manual en material comin	m3		$0,00	$ 407.826,00
	2,2	Relleno compactado con material seleccionado recebo (Inc.	m3		$0,00	$ 347.900,00
	2,3	Cargue y retiro de material sobrante	m3-km	24	$288.000,00	$ 215.760,00
5462	Servicios de fontanería y de construcción de drenajes				$0,00	$ -
	4,1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco de descarga sencilla	un		$0,00	$ 640.000,00
	4,2	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana sencillo para colgar. Incluye griferia y llaves de paso.	un	1	$202.000,00	$ -
	4,3	Suministro e instalación de tanques de agua de 1000 Litros	un		$0,00	$ -
	4,4	Suministro e instalación de tuberíaa PVC presión 1/2 pulgada	m	36	$648.000,00	$ 108.000,00
	6,0	Puertas y Ventanas			$0,00	
5476	Servicios de carpintería				$0,00	$ -
	6,1	Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada CAL 16 dim	und	10	$7.200.000,00	$ 720.000,00
	6,2	Suministro e instalación de ventaneria para salones de clase con vidrio transparente 4mm y reja de hierro h=0,50m. Incluye pintura	m	13	$6.526.000,00	$ -
	8,0	Pisos			$0,00	
	8,0	Pisos			$0,00	
5474	Servicios de acabado para pisos				$0,00	$ -
	8,1	Suministro e instalacion de piso cerámico trafico pesado formato	m2	52,09	$5.656.974,00	$ 804.726,00
	8,2	Suministro e instalación de guardaescobas cerámico tráfico pesado	m	91	$2.912.000,00	$ 32.000,00
	9,0	Carpinteria metalica y madera			$0,00	
5479	Otros servicios de terminación y acabado de edificios				$0,00	$ -
	10,1	Aseo en general	m2	120	$240.000,00	$ 44.460,00
	11,0	ITEMS COMPLEMENTARIOS			$0,00	
	11,3	Resane y mantenimiento de pared baños. Incluye frisos, estuco y pintura	m2	10	$548.950,00	$ 27.447,50
	11,4	Suministro e instalacion de llaves tipo push acero inoxidable tomaderos de agua niños	und	9	$1.161.000,00	$ -
	11,5	Suministro e instalación de tanques de agua de 500 Litros	und	2	$1.783.000,00	$ -
					$ 27.893.924,00	$ 11.879.899,50
					$ 6.694.541,76	$ 2.851.175,88
					$ -	$ -
					$ 1.394.696,20	$ 593.994,98
					$ 35.983.161,96	$ 15.325.070,36

SEGURIDAD SOCIAL

ING RESIDENTE: VERONICA HERNANDEZ JALKN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.096.251.719
HERNANDEZ JALKN
APELLIDOS
VERONICA
NOMBRES
Veronica Hernandez Jalkn.
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1999
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
24-MAR-2017 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
P-2701900-00906923-F-1096251719-20170523
0055495132A 1
48010528

SEGURIDAD SOCIAL- INDEPENDIENTES IVAN BRAVO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 88.250.862
BRAVO
APELLIDOS
IBAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1980
ARAUQUITA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
07-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4000100-00221618-M-0088250862-20100308
0021499722A 1
1730645232

SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTES- JOSÉ ALEJANDRO BURGOS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.096.242.211
BURGOS ARENIZ
APELLIDOS
JOSE ALEJANDRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1997
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-ABR-2015 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2701900-00712447-M-1096242211-20150604
0044410221A 1
44197647

SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTES- RONALD SALAZAR


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.096.216.723
SALAZAR ULLOA
APELLIDOS
RONALD
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1991
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUL-2010 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECONSULTA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 50 NO 19-77	TELÉFONO:	6023761
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ING 6 - ING 6
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7892207005**	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93833129

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 742.400**	**$ 0**	**$ 742.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													**$ 580.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 580.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 113.200	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 113.200
SUBTOTALES:									**$ 113.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
							COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA																		PENSIÓN							SALUD					ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO			ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096216723	SALAZAR ULLOA RONALD	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	829000737	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1096242211	BURGOS ARENIZ JOSE ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	829000737	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 4992946	HERRERA MONTERROSA GILDARDO DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	829000737	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 88250862	BRAVO IBAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	829000737	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.435.600**

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECONSULTA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 50 NO 19-77	TELÉFONO:	6023761
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ING 2 - ING 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7892208583**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93851951

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 46.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		
