CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	


CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Prórroga No.1	Tres (03) meses, quince (15) días.	**Prórroga No.1**	Tres (03) meses, veinte (20) días
Adición No.1	$5.370.000.000,00	**Adición No.1**	$ 310.122.937,00
Fecha Actualizada de Terminación	jueves, 25 de abril de 2024	**Fecha Actualizada de Terminación**	sábado, 11 de mayo de 2024
Valor Contrato Actualizado	$19.324.280.882,00	**Valor Contrato Actualizado**	$ 1.261.261.675,00
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	jueves, 20 de abril de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 27/10/2024	$ 3.864.856.176,40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 3.864.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 26/04/2027	$ 1.932.428.088,00	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 26/04/2024	$ 966.214.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	48,78%	$ 812.585.091,51	40,14%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 8,64%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	$ 340.655.772,47	16,83%	$ 85.583.162,34	4,23%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de pisos, muros en mampostería, pañete de muros, enchape de muros, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, cubierta, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto y picado de muros en mampostería, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	$ 26.868.888,89	1,33%	$ 172.999.696,15	8,55%	Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa de contrapiso de 10cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica, columnetas y viguetas en concreto.
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	$ -	0,00%	$ 4.619.084,41	0,23%	Muro divisorio en bloque No. 4, anclajes de varilas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	24/08/2023	$ -	0,00%	$ 6.453.238,46	0,32%	Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario y lavamanos y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	$ 67.571.488,03	3,34%	$ -	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	$ 42.254.979,85	2,09%	$ 33.041.703,15	1,63%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación piso cerámica antideslizante tipo Mikonos y suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
8	Mampostería	25/07/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	5/08/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	$ 176.043.916,64	8,70%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, inclue vidrio de 4mm con película de seguridad
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ 269.055.076,56	13,29%	$ 69.544.254,80	3,44%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores.
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ 1.801.552,73	0,09%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ 239.226.604,00	11,82%	$ 5.080.925,38	0,25%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,25, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ 43.103.071,02	2,13%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades No previstas			$ -	0,00%	$ 216.116.039,16	10,68%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato

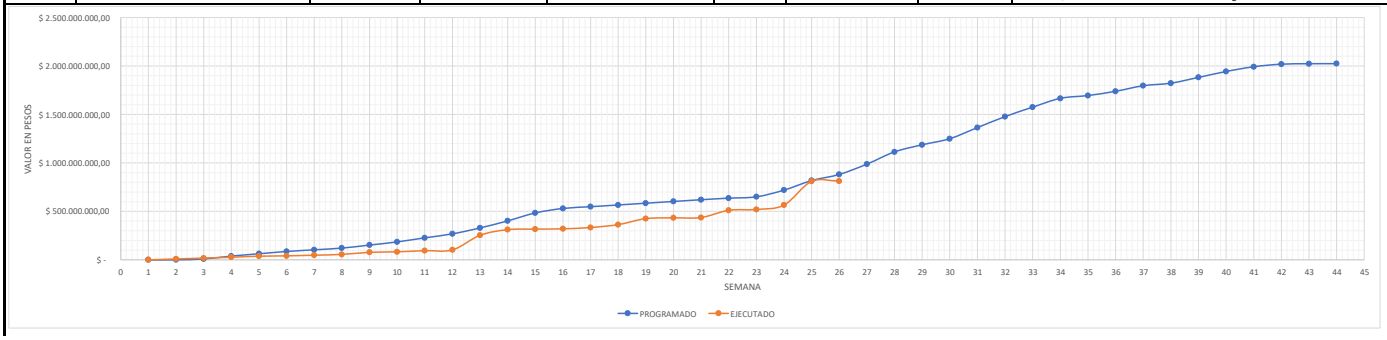


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IT Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	60,06%	$ 1.042.725.877,87	53,13%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 6,93%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 326.307.525,24	16,63%	$ 112.765.086,87	5,75%	Cerramiento en lona, demolición de acabado de pisos, muros, pañete, enchape de muros, encorozado de cubierta, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso, cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, tubería hidrosanitaria existente, lámparas, salidas eléctricas y tubería eléctrica, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 38.299.004,99	1,95%	$ 265.291.075,30	13,52%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado, relleno en recebo común compactado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, recalce de escaleras, suministro de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada, viga cinta de confinamiento.
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 62.444.163,60	3,18%	$ 5.095.470,96	0,26%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ 2.066.803,00	0,11%	$ 14.132.357,83	0,72%	Tubería PVC U.M Extt corrugado/int liso, suministro e instalación de tubería PVCS 4", suministro e instalaciónn tubería PVCS 2", suministro e instalación punto agua fria lavamanos 1/2", suministro e instalación punto sanitario 4", suministro e instalación punto sanitario 2", suministro e instalación registro valvula de bola 1/2", caja de inspección 1.00x1.00, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ 4.790.997,54	0,24%		0,00%	
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 155.963.598,95	7,95%	$ 56.113.491,39	2,86%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante tipo mikonos
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 191.061.475,00	9,74%	$ 125.491.885,02	6,39%	Suministro e instalación de ventana metálica en lámina coldrolled calibre 18 termianda con anticorrosico, pintura en esmalte, incluye vidrio de 4 mm con película de seguridad y herrajes, suministro de ventana en aluminio con rejilla superior, incluye vidrio 4mm incoloro
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 122.153.405,00	6,22%	$ 115.086.903,02	5,86%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 265.721.021,50	13,54%	$ 13.220.761,71	0,67%	Suministro e instalación de teja traslucida, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ 7.780.960,95	0,40%	$ 43.252.366,26	2,20%	Aseo general, disposición y embalaje de teja en asbesto cemento
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	2/09/2023	$ 2.095.554,27	0,11%	$ 292.276.479,50	14,89%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato

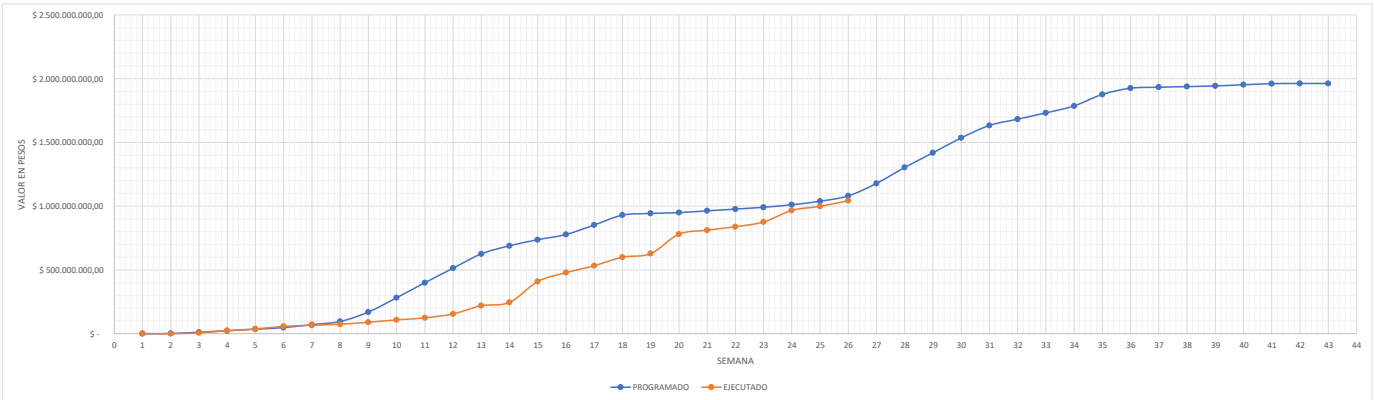


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	94,50%	$ 418.741.570,60	53,20%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 41,30%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 184.231.191,20	23,41%	$ 107.961.127,00	13,72%	Cerramiento en teja de zinc, desmonte de cielo raso, cubierta, desmonte de lámparas y red eléctrica, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de ventanería y puertas y limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ 9.608.600,00	1,22%	$ 146.377.751,07	18,60%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica,.
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 8.208.415,00	1,04%	$ 4.164.556,96	0,53%	Muro en ladrillo prensado macizo
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ 39.390.310,00	5,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ 661.334,00	0,08%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ 56.690.764,00	7,20%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ 11.483.940,00	1,46%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 407.449.082,67	51,77%	$ 19.739.647,64	2,51%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ 26.068.075,00	3,31%	$ 88.311.356,03	11,22%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades no previstas	28/02/2023	16/03/2023	$ 7.998.792,50	1,02%	$ 52.187.131,90	6,63%	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica UPVC


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

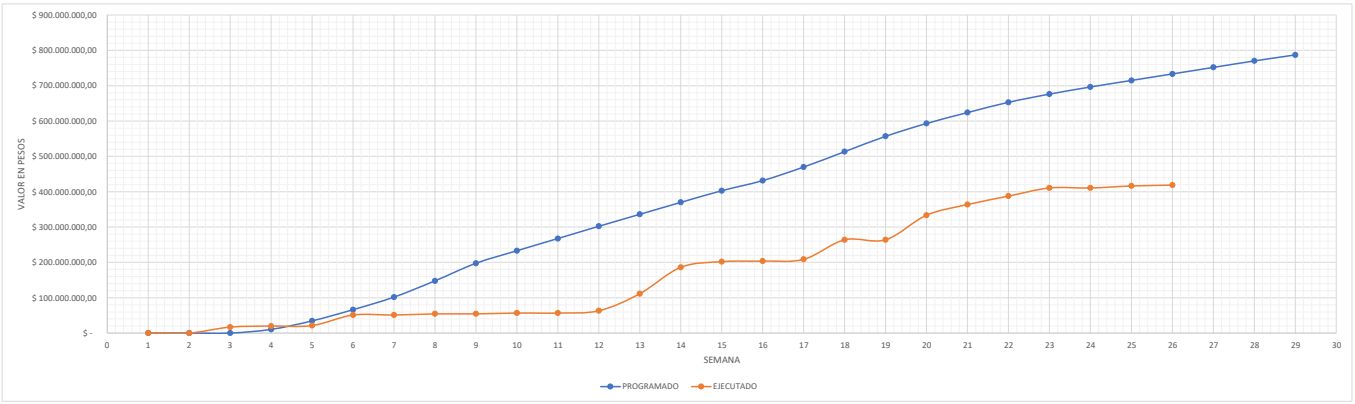

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Floridablanca, sede A		6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	37,53%	$ 285.866.748,29	40,89%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-3,36%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 49.367.448,61	7,06%	$ 53.372.923,06	7,63%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, mantenimiento tapas y marcos, limpieza y mantenimiento a cárcamos.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 126.308.688,00	18,07%	$ 29.549.406,83	4,23%	Excavación manual en material común y recebo compactado, concreto corriente en grava común, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro de malla electro soldada	
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ 25.136.949,61	3,60%	$ -	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ 195.726,00	0,03%	$ 1.599.477,78	0,23%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6", limpieza de cajas de inspección, renivelación de cajas de inspección.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ 20.904.764,64	2,99%	$ 3.336.750,05	0,48%	Suministro e instalación de tubería PVC conduit 3"	
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 13.857.866,64	1,98%	Concreto de limpieza, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado.	
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 7.099.880,70	1,02%	Cerramiento contra impacto H=5,00m	
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ 27.162.890,77	3,89%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 10.149.764,00	1,45%	$ 5.173.943,70	0,74%	Cancha múltiple baloncesto - micofútbol, voleibol.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ 3.176.707,21	0,45%	$ 7.173.115,88	1,03%	Aseo general final y limpieza	
NP	Actividades no previstas	18/07/2023	24/10/2023	$ -	0,00%	$ 164.703.383,67	23,56%	Mejoramiento material granular existente con adición de cemento (incluye extendido, nivelación, humedeciiento y compactación con vibrocompactado), suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.	

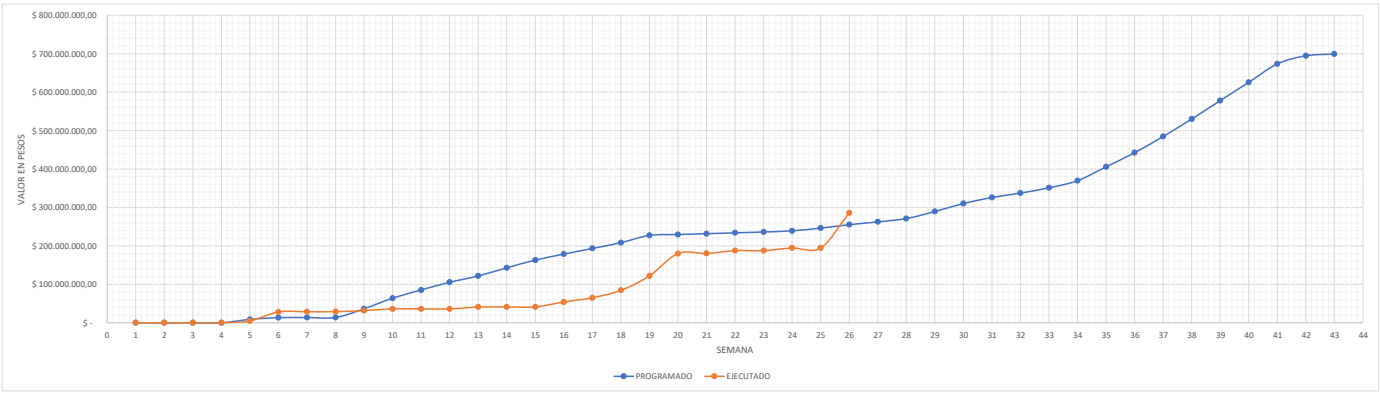


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Miguel Antonio Caro		7/02/2023	15/07/2023	$ 100.231.178,62	100,00%	$ 100.231.178,62	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 30.168.483,73	30,10%	$ 30.168.483,73	30,10%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica, diagnostico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ 22.957.821,67	22,90%	$ 22.957.821,67	22,90%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ 9.089.058,90	9,07%	$ 9.089.058,90	9,07%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ 4.616.550,32	4,61%	$ 4.616.550,32	4,61%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ 4.568.148,99	4,56%	$ 4.568.148,99	4,56%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabillizado.	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ 1.382.430,89	1,38%	$ 1.382.430,89	1,38%	Reparación y adecuación de cunetas existentes
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ 19.578.768,35	19,53%	$ 19.578.768,35	19,53%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ 7.869.915,77	7,85%	$ 7.869.915,77	7,85%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento

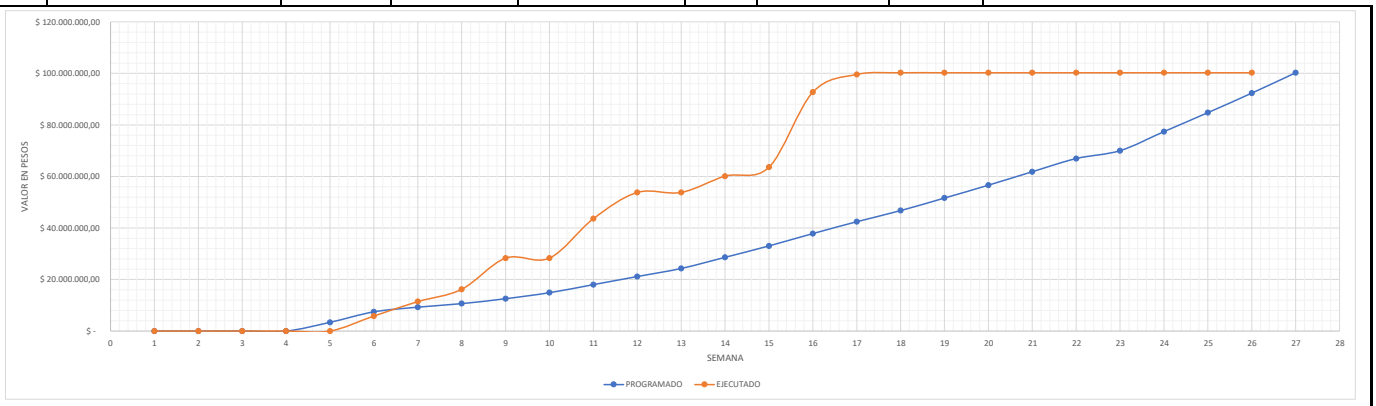

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	99,72%	$ 117.767.795,98	31,88%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 67,84%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 6.699.540,64	1,81%	$ 17.061.113,07	4,62%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21.960.041,00	5,94%	$ 88.403,24	0,02%	Muro divisorio blooque estriado No 4
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ 27.365.680,00	7,41%	$ -	0,00%	
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ 5.437.009,00	1,47%	$ 6.235.330,96	1,69%	Mediacaña en granito, suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 27.180.454,00	7,36%		0,00%	
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ 80.034.190,00	21,66%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ 65.354.718,00	17,69%	$ 28.711.732,23	7,77%	Suministro de lavamanos de incrustar, sanitario línea infantil y orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio.
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ 56.080.542,00	15,18%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ 68.947.126,00	18,66%	$ 18.869.813,75	5,11%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ 8.049.599,00	2,18%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ 1.264.764,43	0,34%	$ 611.734,09	0,17%	Aseo general
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 46.189.668,63	12,50%	Suminsitro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional color blanco.

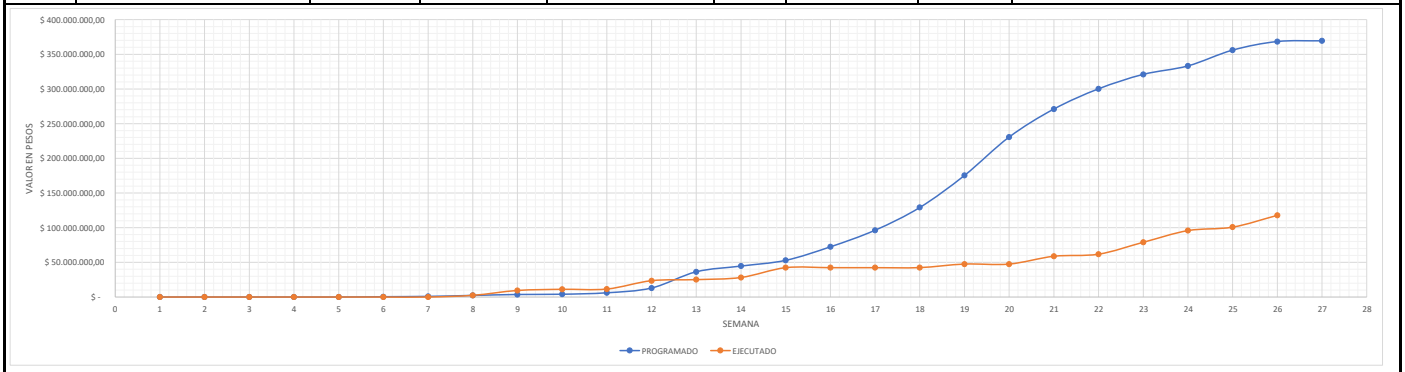


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	25/01/2023	22/08/2023	$ 677.034.595,00	88,92%	$ 329.808.516,29	48,71%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 40,21%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 64.953.808,19	9,59%	$ 58.121.615,98	8,58%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso y placa maciza, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso y cubierta y limpieza de canales y bajantes, corte en concreto con pulidora, espesor de 3mm.
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 13.713.785,00	2,03%	$ 93.455.904,06	13,80%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ 4.596.240,00	0,68%	$ -	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196.992,00	0,03%	$ 1.180.639,84	0,17%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ 124.803.414,20	18,43%	$ 14.348.430,22	2,12%	Alistado de piso en mortero
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0,00%	$ 6.983.157,64	1,03%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ 90.524.521,00	13,37%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ 3.371.592,00	0,50%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ 58.187.692,39	8,59%	$ 34.499.388,66	5,10%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450.384,00	0,07%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 225.429.225,00	33,30%	$ 83.089.929,30	12,27%	Instalación de lámina de policarbonato
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 15.785.365,79	2,33%	$ 2.823.988,58	0,42%	Aseo general y limpieza

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 35.305.462,00	5,21%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico

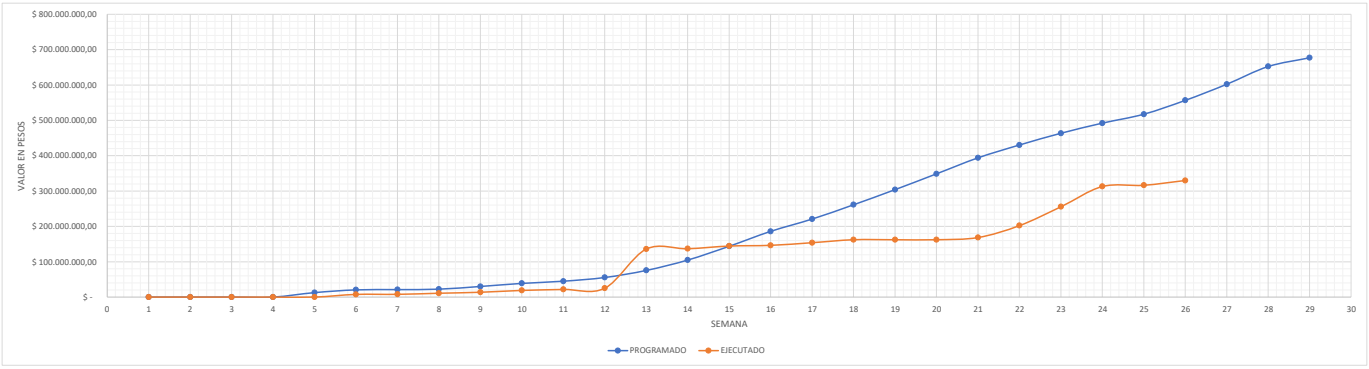

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	41,91%	$ 157.688.884,81	30,09%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 11,81%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 16.542.273,33	3,16%	$ 39.440.918,22	7,53%	Cerramiento en lona, demolición de alistado y acabado de piso, retiro de tuberías, desmonte de cielo raso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso.
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ 15.316.020,00	2,92%	$ 33.285.009,14	6,35%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ 2.886.660,00	0,55%	$ 4.911.604,57	0,94%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", suministro e instalación de accesorios PCV-S 4", suministro e instalacion de tubería PVCS 3" y 2", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ 23.886.908,00	4,56%	$ -	0,00%	
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ 48.692.792,64	9,29%	$ 33.663.792,02	6,42%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ 3.169.590,00	0,60%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0,00%	$ 27.591.455,47	5,27%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos., pintura tipo korasa a 2 manos, emalte sobre cerchas, puente y estructura metálica.
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ 104.982.666,50	20,03%	$ 17.044.619,23	3,25%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 4.118.706,81	0,79%	$ 246.765,90	0,05%	Proteción provisional de elementos y superficies existentes.
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 1.504.720,27	0,29%	Desmonte de flanche

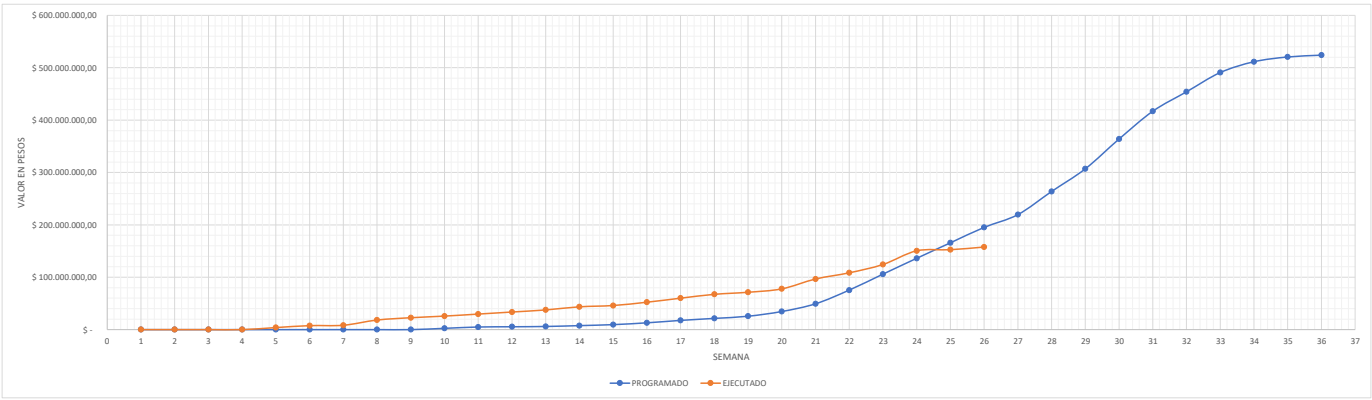


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED San José Norte	12/04/2023	30/04/2024	$ 2.929.420.309,00	1,28%	$ 139.372.351,31	4,76%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -3,48%
1	Preliminares	26/04/2023	28/03/2024	$ 37.536.134,77	1,28%	$ 51.060.503,76	1,74%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza h=010m, demolición placa maciza h=0.15m, demolición placa contra piso h=0.15m, demmolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, demolición muro en mampostería, demolición enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica troquelada, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes.
2	Estructura	9/08/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ 81.392.369,51	2,78%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI, suministro e instalación malla electro soldada 6mm.
3	Mampostería	25/09/2023	23/10/2023	$ -	0,00%	$ 120.152,41	0,00%	Muro divisorio bloque estriado No. 5
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	28/02/2024	2/04/2024	$ -	0,00%	$ 5.031.609,07	0,17%	Suministro e instalación geotextil tejido T1700
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	22/03/2024	11/04/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	25/09/2023	21/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
8	Mampostería seca	24/10/2023	13/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	28/11/2023	21/03/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	3/04/2024	30/04/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	3/04/2024	24/04/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	14/11/2023	27/02/2024	$ -	0,00%	$ 1.767.716,57	0,06%	Pañete muro inclue filos, pañete liso sobre muro
15	Cerraduras, vidrios y espejos	22/03/2024	5/04/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	19/01/2024	25/04/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/10/2023	18/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	17/07/2023	26/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	

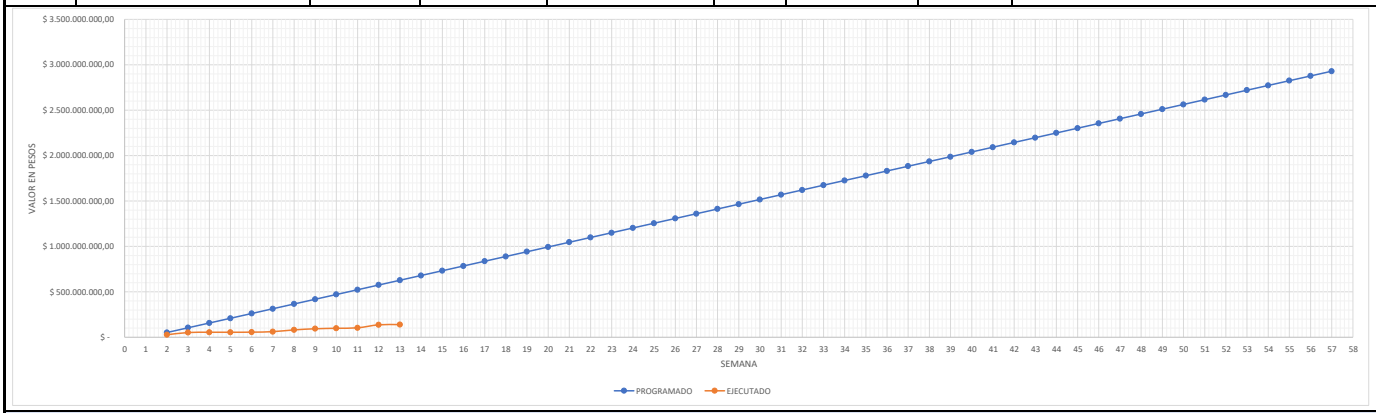

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
IED Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco IED	13/01/2023	21/01/2023					
IED Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023	-					
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023					
IED Nidia Quintero de Turbay, sede A	14/02/2023	6/03/2023					
IED República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023					
Dirección Local de Engativá	8/02/2023	-					
IT Francisco José de Caldas, sede A	30/03/2023	7/04/2023					
IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D	8/03/2023	27/03/2023					
IT Juan del Corral, sede A	2/06/2023	3/06/2023					
IED Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023	16/06/2023					
IED Francisco Berbeo	8/05/2023	-					
IED Naciones Unidas, sede A	21/04/2023	7/06/2023					
IED Antonio Nariño, sede A	21/04/2023	-					
IED Bolívia, sede B	21/04/2023	-					
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	31/05/2023	2/06/2023					
IED Heladia Mejía, sede B	26/05/2023	-					

PROGRAMADO

No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%
3	$ 19.951.637,75	0,10%	$ 21.222.394,68	0,11%
4	$ 50.914.718,24	0,26%	$ 72.137.112,92	0,37%
5	$ 84.783.311,22	0,44%	$ 156.920.424,14	0,81%
6	$ 84.520.694,84	0,44%	$ 241.441.118,98	1,25%
7	$ 79.994.302,15	0,41%	$ 321.435.421,13	1,66%
8	$ 92.371.183,17	0,48%	$ 413.806.604,30	2,14%
9	$ 188.479.295,83	0,98%	$ 602.285.900,13	3,12%
10	$ 221.475.791,25	1,15%	$ 823.761.691,38	4,26%
11	$ 229.916.129,85	1,19%	$ 1.053.677.821,23	5,45%
12	$ 230.178.690,91	1,19%	$ 1.283.856.512,14	6,64%
13	$ 271.119.796,10	1,40%	$ 1.554.976.308,24	8,05%
14	$ 418.493.027,93	2,17%	$ 1.973.469.336,17	10,21%
15	$ 419.346.600,61	2,17%	$ 2.392.815.936,78	12,38%
16	$ 385.041.091,99	1,99%	$ 2.777.857.028,77	14,37%
17	$ 396.837.578,62	2,05%	$ 3.174.694.607,39	16,43%
18	$ 418.989.557,94	2,17%	$ 3.593.684.165,33	18,60%
19	$ 478.583.967,26	2,48%	$ 4.072.268.132,59	21,07%
20	$ 465.184.794,77	2,41%	$ 4.537.452.927,36	23,48%
21	$ 457.480.610,95	2,37%	$ 4.994.933.538,32	25,85%
22	$ 445.302.299,14	2,30%	$ 5.440.235.837,46	28,15%
23	$ 428.293.319,64	2,22%	$ 5.868.529.157,10	30,37%
24	$ 471.933.403,33	2,44%	$ 6.340.462.560,44	32,81%
25	$ 517.957.332,48	2,68%	$ 6.858.419.892,92	35,49%

EJECUTADO


No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%
6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 202.758.289,06	1,45%
7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 224.976.471,55	1,61%
8	$ 40.324.809,10	0,29%	$ 265.301.280,65	1,90%
9	$ 65.485.536,40	0,47%	$ 330.786.817,05	2,37%
10	$ 41.427.564,22	0,30%	$ 372.214.381,27	2,67%
11	$ 49.569.565,98	0,36%	$ 421.783.947,25	3,02%
12	$ 74.571.439,34	0,53%	$ 496.355.386,59	3,56%
13	$ 384.555.815,94	2,76%	$ 880.911.202,53	6,31%
14	$ 175.842.367,10	1,26%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
15	$ 240.754.691,04	1,73%	$ 1.297.508.260,66	9,30%
16	$ 148.581.092,20	1,06%	$ 1.446.089.352,86	10,36%
17	$ 109.142.302,12	0,78%	$ 1.555.231.654,98	11,15%
18	$ 187.805.414,35	1,35%	$ 1.743.037.069,33	12,49%
19	$ 137.179.908,07	0,98%	$ 1.880.216.977,40	13,47%
20	$ 300.346.880,40	2,15%	$ 2.180.563.857,80	15,63%
21	$ 123.130.688,61	0,88%	$ 2.303.694.546,41	16,51%
22	$ 195.093.555,30	1,40%	$ 2.498.788.101,70	17,91%
23	$ 160.591.049,02	1,15%	$ 2.659.379.150,73	19,06%
24	$ 247.864.334,70	1,78%	$ 2.907.243.485,43	20,83%
25	$ 327.467.403,43	2,35%	$ 3.234.710.888,85	23,18%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

26	$ 502.398.796,86	2,60%	$ 7.360.818.689,78	38,09%	26	$ 178.797.642,57	1,28%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
27	$ 596.011.846,91	3,08%	$ 7.956.830.536,69	41,18%	27	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
28	$ 660.478.306,35	3,42%	$ 8.617.308.843,04	44,59%	28	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
29	$ 578.512.115,36	2,99%	$ 9.195.820.958,41	47,59%	29	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
30	$ 544.790.952,11	2,82%	$ 9.740.611.910,52	50,41%	30	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
31	$ 568.215.173,58	2,94%	$ 10.308.827.084,10	53,35%	31	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
32	$ 498.727.100,05	2,58%	$ 10.807.554.184,16	55,93%	32	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
33	$ 484.671.350,33	2,51%	$ 11.292.225.534,49	58,44%	33	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
34	$ 471.917.208,88	2,44%	$ 11.764.142.743,37	60,88%	34	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
35	$ 451.787.732,30	2,34%	$ 12.215.930.475,68	63,22%	35	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
36	$ 419.593.109,31	2,17%	$ 12.635.523.584,99	65,39%	36	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
37	$ 394.915.239,85	2,04%	$ 13.030.438.824,84	67,43%	37	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
38	$ 363.722.866,10	1,88%	$ 13.394.161.690,95	69,31%	38	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
39	$ 400.217.895,43	2,07%	$ 13.794.379.586,38	71,38%	39	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
40	$ 404.941.999,94	2,10%	$ 14.199.321.586,32	73,48%	40	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
41	$ 393.096.931,71	2,03%	$ 14.592.418.518,04	75,51%	41	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
42	$ 336.508.997,74	1,74%	$ 14.928.927.515,78	77,25%	42	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
43	$ 192.836.797,45	1,00%	$ 15.121.764.313,23	78,25%	43	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
44	$ 53.015.551,95	0,27%	$ 15.174.779.865,18	78,53%	44	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%
45	$ 4.149.501.016,82	21,47%	$ 19.324.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 3.413.508.531,43	24,46%

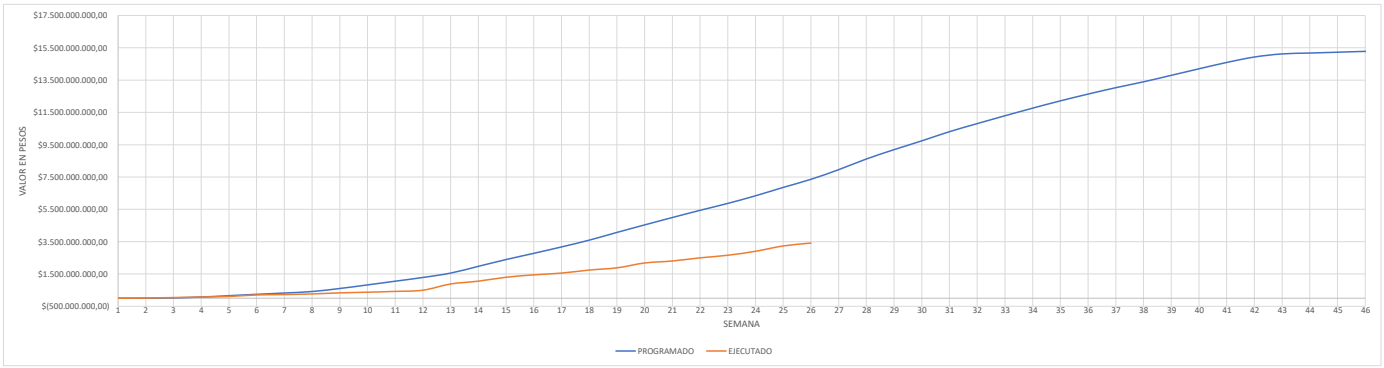

Seguimiento Ruta Crítica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

El día 05 de abril de 2023 se realizó aprobación de Modificatorio No.1 Adición y Prórroga de Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1, No. 2, No.3 , No. 4 de contrato de obra e interventoría acorde a los avances realizados.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

		
Soldadura e instalación de perfiles en área de dibujo	Instalación de ventanas	Aplicación de pintura en fachada

IT Francisco José de Caldas, Sede A

		
Aplicación de boquilla	Instalación de enchape, guarda escobas y gravilla en escaleras.	Aplicación de pañete e instalación de tapas en caja de inspección.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

IED Garcés Navas

		
Instalación de teja	Instalación de manto en viga canal	Aplicación de pintura en salones de bloque B.

IED Floridablanca, sede A

		
Demolición de concreto en parqueadero.	Desmonte de lámparas en aulas bloque SENA	Protección de armarios, canaletas y tableros de aulas.

IED Juan del Corral, sede A

		
Lavado e impermeabilizado muros	Aplicación de pintura en columnas y vigas de puente peatonal	Aplicación de pintura en columnas y vigas de puente peatonal

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

		
Soldadura y aplicación de pintura en perfiles	Soldadura y aplicación de pintura en perfiles en aula múltiple	Instalación de malla de gallinero en muros de shut de basuras

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B



Excavación manual para zapatas de muro en zona de juegos.



Excavación manual para zapatas de muro en zona de juegos.



Demolición de concreto en zona de juegos.

IED Justo Victor Charry



Instalación de enchape de muros en baño niñas bachiller



Instalación de divisiones en baño de niños bachiller.



Muro en bloque en división de baño niñas preescolar.

IED San José Norte, sede A



Demolición de placa en laboratorio.



Compactación de subbase en cocina



Aplicación de pañete en muros de aula múltiple.

IED República de Panamá



Aplicación de pañete en muros de cocina



Aplicación de pañete en muros de cocina



Filos en ventanas de cocinas

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 07 de julio de 2023 en instalaciones de IED Jorge Eliecer Gaitán.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	26	**DEL**	domingo, 2 de julio de 2023	**AL**	sábado, 8 de julio de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	178	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

Aspecto PMT


N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
3/07/2023	7:00 am 5:00 pm	3
4/07/2023	7:00 am 5:00 pm	1
5/07/2023	7:00 am 5:00 pm	0
6/07/2023	7:00 am 5:00 pm	1
7/07/2023	7:00 am 5:00 pm	3
8/07/2023	7:00 am 12:00 pm	3



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitan: Picado de muros en mamposteria, excavación manual en material común, construcción de carcamo en concreto de 3000 PSI de 20 a 30 cm de profundidad con rejilla plastica antideslizante, suministro e instalación de canaleta metalica troquelada, suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1#10, alistado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado, pañete muro 1:3 impermeabilizado, cerramiento en malla eslabonada.
• Colegio Francisco José de Caldas: Bloque I: Suministro e instalación de piso laminado 8 mm, aseo y disposición final. Bloque II: demolición placa maciza H=0.15m, desmonte de todo tipo de cubierta existente, excavación manual en material común, resane de fisuras en muros, suminsitro e instalación de hoja para puerta, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, alistado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado, suministro y montaje de estructura metálica.
• Colegio Garcés Navas: suministro e instalación de teja termoacustica, suministro y montaje de estructura metálica y caballetes para cubierta.
• Colegio Floridablanca: Desmonte de todo tipo de cubierta existente, pintura tipo Korasa o similar para fachada, aseo general final y limpieza.
• Colegio Juan del Corral: tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, pendientado para terrazas en mortero 1:3 E= 0.04 cm, manto asfáltico impermeabilizante, suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica, suministro e instalación de remates laterales para cubierta, lamina ancho 0.09 a 0.15 CAL 12, soldada sobre correas, orden y aseo general.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente tipo T8, suministro e instalación de lámpara colgante en policarbonato tipo campana con tapa inferior, suministro e instalación de baldosa en granito pulido 33 x 33, suministro e instalación piso en gravilla lavada mona, suministro e instalación de guarda escoba en media caña granito pulido, suministro e instalación de piso en gravilla lavada mona, piso virilico heterogéneo tipo Taralay, suministro e instalación de porcelanato 60x60, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato de 8 a 10 cm de alto, suministro e instalación de enchape ceramico brillante, suministro e instalación de muro en dry wall de 12 mm, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura epóxica a 3 manos, pintura repelente humedad a 2 manos, pintura en esmalte, suministro e instalación de pintura para piso tráfico pesado, aseo general final y limpieza.
• Colegio Justo Víctor Charry: Aseo general final y limpieza.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 24,46%, con base en la programación presentada un avance general programado de 38,09%, teniendo una diferencia de 13,63% en el contrato.
• De acuerdo al avance general del contrato se abre frente de obra en IED Simón Bolívar el día 05 de julio de 2023.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos, a la fecha se evidencia atraso en las instituciones por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado, se implementa por parte de contratista de obra plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.
• En atención a emergencias se realiza en IED Heladia Mejía, sede B: Demolición de enchape y alistado, instalación de enchape y resane de pared en aula de preescolar.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 74,30% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 58,50% para IED Francisco José de Caldas; 70,00% para Garcés Navas IED; 55,00% para IED Floridablanca; 100% para IED Miguel Antonio Caro; 55,00% para Justo Víctor Charry; 60,30% para Rafael Bernal Jiménez, sede A, 85,30% para Juan del Corral, 45,00% para San José Norte, 20,00% para Rafael Bernal Jiménez, sede B, 23,00% para República de Panamá y 2,00% para IED Simón Bolívar. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas.	**FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR**

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
