CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Prórroga No.1	Tres (03) meses, quince (15) días.	**Prórroga No.1**	Tres (03) meses, veinte (20) días
Adición No.1	$5.370.000.000,00	**Adición No.1**	$ 310.122.937,00
Fecha Actualizada de Terminación	jueves, 25 de abril de 2024	**Fecha Actualizada de Terminación**	sábado, 11 de mayo de 2024
Valor Contrato Actualizado	$19.324.280.882,00	**Valor Contrato Actualizado**	$ 1.261.261.675,00
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	jueves, 20 de abril de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 27/10/2024	$ 3.864.856.176,40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 3.864.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 26/04/2027	$ 1.932.428.088,00	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 26/04/2024	$ 966.214.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	73,01%	$ 1.081.602.483,92	53,43%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 19,58%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	$ 442.373.294,06	21,85%	$ 104.757.962,63	5,18%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de pisos, muros en mampostería, pañete de muros, enchape de muros, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, cubierta, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto y picado de muros en mampostería, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	$ 71.650.370,38	3,54%	$ 211.054.182,92	10,43%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, concreto corriente grava común 3000 PSI, columnetas y viguetas en concreto, placa de contrapiso de 10cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica.
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	$ -	0,00%	$ 4.024.719,96	0,20%	Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5, anclajes de varilas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	24/08/2023	$ 5.117.289,50	0,25%	$ 12.098.983,60	0,60%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", PVCP RDE 11 de 3/4", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario tanque 1/2", punto de agua frio lavamanos 1/2" y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	$ 115.269.009,00	5,69%	$ -	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	$ 116.822.591,35	5,77%	$ 36.564.581,33	1,81%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, mediacaña en granito H=0.10m, suministro e instalación guarda escoba en media caña granito pulido, paso para escalera en gravilla lavada mona, piso cerámica antideslizante tipo Mikonos, win de aluminio, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
8	Mampostería	25/07/2023	4/08/2023	$ 10.283.154,00	0,51%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	5/08/2023	2/09/2023	$ 75.989.740,68	3,75%	$ 138.138.666,54	6,82%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejiilla superior, terminada, inclue vidrio de 4mm con pelicula de seguridad
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ 387.176.817,49	19,13%	$ 91.536.921,97	4,52%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores.
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ 13.962.033,64	0,69%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ 239.226.604,00	11,82%	$ 9.127.315,18	0,45%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,25, canal de alta capacidad, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ 33.822.246,56	1,67%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades No previstas			$ -	0,00%	$ 440.476.903,23	21,76%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche

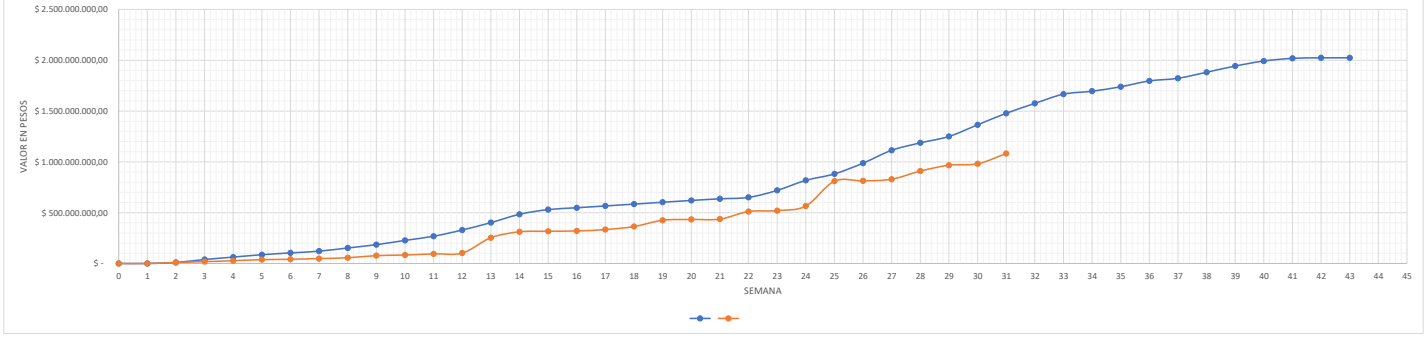


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IT Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	85,74%	$ 1.004.035.139,28	51,16%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 34,58%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 411.745.169,94	20,98%	$ 111.448.187,15	5,68%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza, demolición de alistado y acabado de pisos, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muros, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas, desmonte de ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de división secilla o doble indiferente al material, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte y regatas en concreto, corte en concreto con pulidora, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 53.825.628,63	2,74%	$ 226.372.309,99	11,53%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado, relleno en recebo común compactado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm y 15 cm, recalce de escaleras, suministro e instalación de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada.
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 89.205.948,00	4,55%	$ 2.964.130,59	0,15%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ 2.066.803,00	0,11%	$ 12.994.000,81	0,66%	Tubería PVC U.M Ext corrugado/int liso, suministro e instalación de tubería PVCS 4", tubería PVCS 2", sifón de piso 2", tubería PVCP RDE 9 de 1/2" suministro e instalación punto agua fria sanitario tanque 1/2", punto agua fria lavamanos 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación registro valvula de bola 1/2", caja de inspección 1.00x1.00, limpieza de cajas de inspección, renivelación de cajas de inspeción, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ 7.915.561,15	0,40%	$ 69.716.646,00	3,55%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo instituional, salida para toma corriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15CM, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4", suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación panel LED circular de 18 W 8".
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 248.425.240,38	12,66%	$ 72.431.783,34	3,69%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante tipo mikonos, suministro y aplicación de sellador elástico, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 356.648.086,67	18,17%	$ 131.618.085,74	6,71%	Suministro e instalación de ventana metálica en lámina coldrolled calibre 18, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco, marco de puertas.
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 122.153.405,00	6,22%	$ 102.252.561,53	5,21%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 376.097.445,82	19,16%	$ 10.374.106,65	0,53%	Suministro e instalación de teja traslucida, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ 11.163.987,45	0,57%	$ 33.939.396,00	1,73%	Aseo general, disposición y embalaje de teja en asbesto cemento
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	2/09/2023	$ 3.352.886,83	0,17%	$ 229.923.931,48	11,72%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato

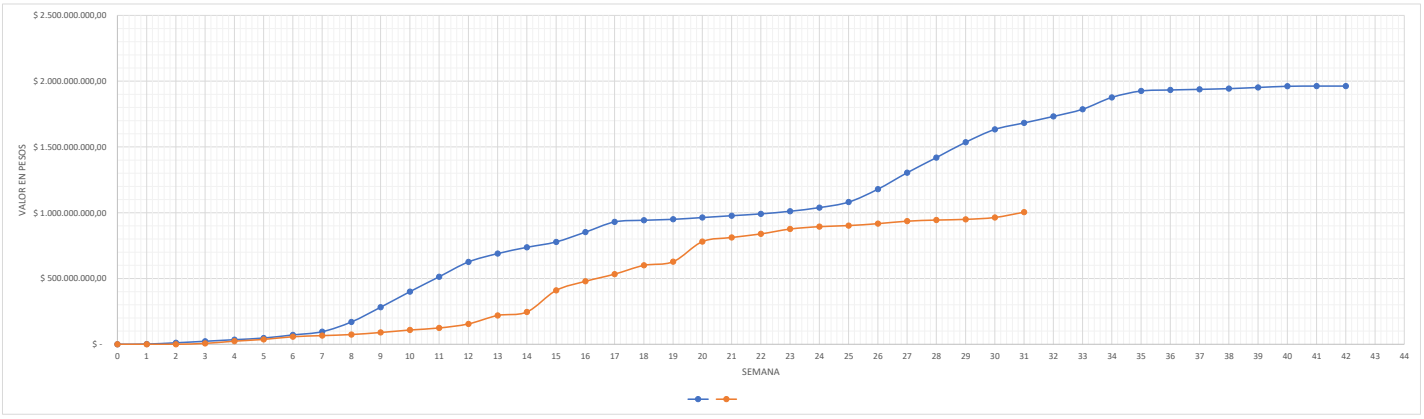


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	100,00%	$ 349.324.622,57	44,38%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 55,62%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 164.792.125,65	20,94%	$ 88.530.876,33	11,25%	Cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición de muro en mamporterría con acabados, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ 9.608.600,00	1,22%	$ 114.860.131,10	14,59%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica,.
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 8.208.415,00	1,04%	$ 3.267.857,00	0,42%	Muro en ladrillo prensado macizo
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ 39.390.310,00	5,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ 661.334,00	0,08%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ 56.690.764,00	7,20%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ 11.483.940,00	1,46%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 462.181.049,00	58,72%	$ 22.941.166,89	2,91%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ 26.068.075,00	3,31%	$ 69.296.418,73	8,80%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades no previstas	28/02/2023	16/03/2023	$ 7.998.792,50	1,02%	$ 50.428.172,52	6,41%	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica UPVC


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

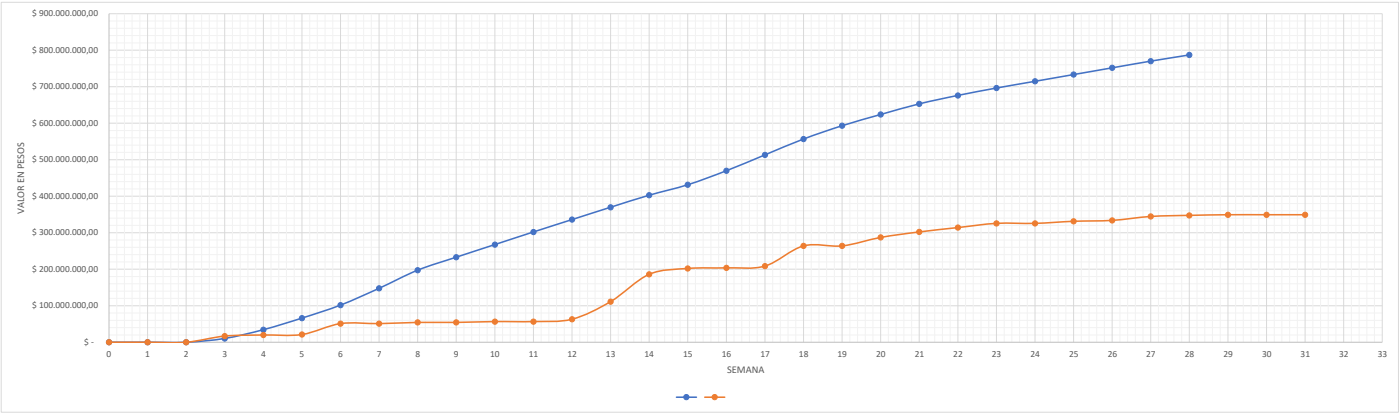

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Floridablanca, sede A		6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	48,25%	$ 317.376.638,85	45,39%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 2,86%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 42.974.683,90	6,15%	$ 64.875.390,18	9,28%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza h=0.10m y h=0.15m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pavimento asfáltico, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, demonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte canecas de basura, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica PVC, mantenimiento tapas y marcos, limpieza y mantenimiento a cárcamos.
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 126.308.688,00	18,07%	$ 73.952.879,29	10,58%	Excavación manual en material común y recebo compactado, excavación mecánica, suministro e instalación de subbase granular B-400, base granular clase C, concreto corriente en grava común, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación malla electro soldada 6 mm, suministro e instalación de estructura metálica
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ 38.848.013,03	5,56%	$ 1.357.215,00	0,19%	Muro ladrillo prensado macizo
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ 195.726,00	0,03%	$ 6.616.723,44	0,95%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6", limpieza de cajas de inspección, renivelación de cajas de inspección, suministro e instalación de geotextil tejido 2400 y 1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ 32.518.522,77	4,65%	$ 2.618.291,00	0,37%	Suministro e instalación de tubería PVC conduit 3"
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 12.630.816,20	1,81%	Concreto de limpieza, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado, suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80.
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 5.571.155,60	0,80%	Cerramiento contra impacto H=5,00m
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ 46.300.382,00	6,62%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 10.149.764,00	1,45%	$ 4.059.905,60	0,58%	Cancha múltiple baloncesto - micofútbol, voleibol.
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ 25.014.993,52	3,58%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ 4.505.148,41	0,64%	$ 16.454.319,30	2,35%	Aseo general final y limpieza, embalaje y dispocisión final de teja en asbesto cemento con vinipel.
NP	Actividades no previstas	18/07/2023	24/10/2023	$ 10.538.850,85	1,51%	$ 129.239.943,24	18,49%	Mejoramiento material granular existente con adición de cemento (incluye extendido, nivelación, humedeciiento y compactación con vibrocompactado), suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.

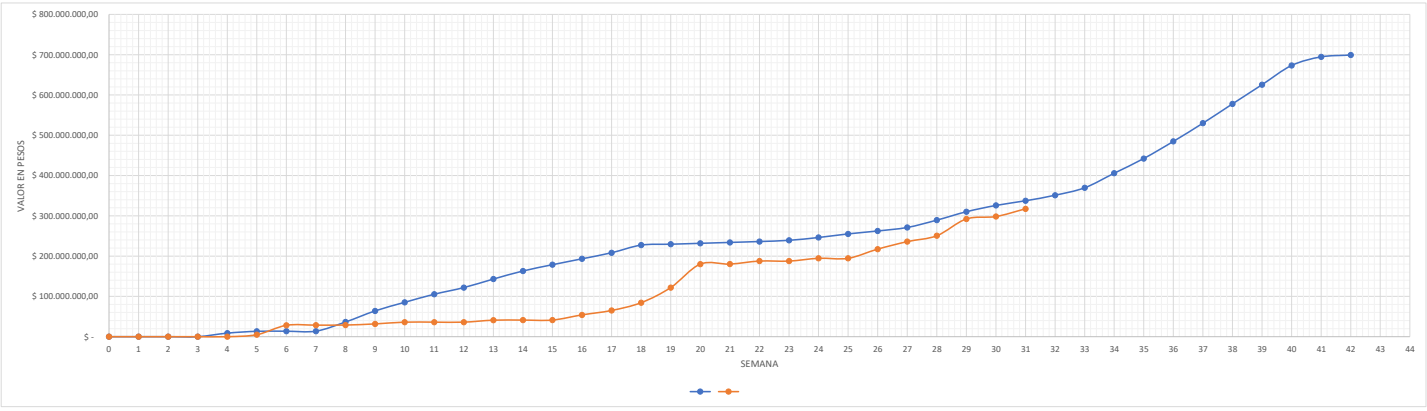


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	IED Miguel Antonio Caro	7/02/2023	15/07/2023	$ 100.231.178,62	100,00%	$ 100.231.178,62	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 30.168.483,73	30,10%	$ 30.168.483,73	30,10%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica, diagnostico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ 22.957.821,67	22,90%	$ 22.957.821,67	22,90%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ 9.089.058,90	9,07%	$ 9.089.058,90	9,07%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ 4.616.550,32	4,61%	$ 4.616.550,32	4,61%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ 4.568.148,99	4,56%	$ 4.568.148,99	4,56%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabillizado.	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ 1.382.430,89	1,38%	$ 1.382.430,89	1,38%	Reparación y adecuación de cunetas existentes	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ 19.578.768,35	19,53%	$ 19.578.768,35	19,53%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.	
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ 7.869.915,77	7,85%	$ 7.869.915,77	7,85%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento	

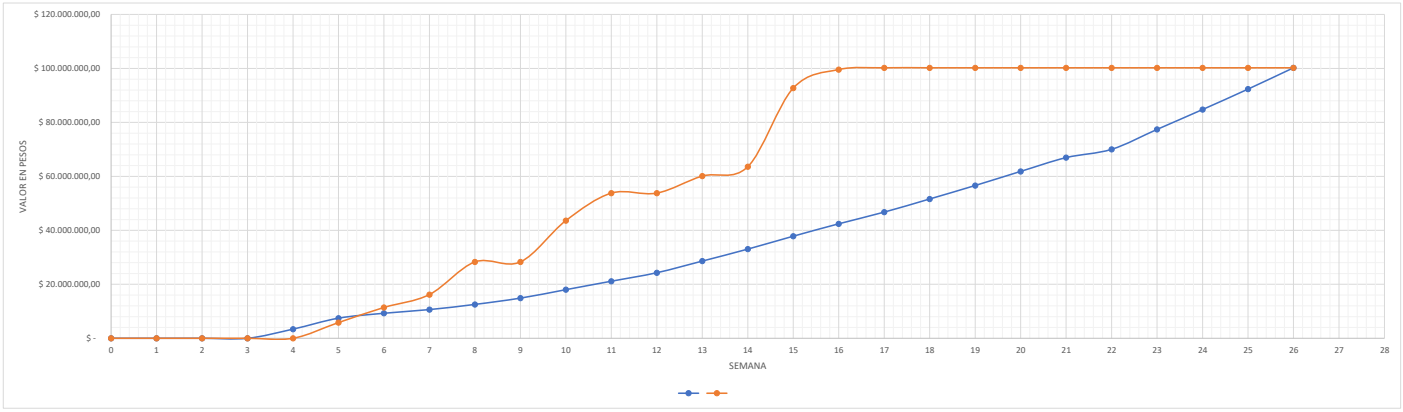


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	IED Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	100,00%	$ 261.736.284,30	70,85%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	29,15%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 7.652.898,97	2,07%	$ 18.774.797,10	5,08%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.	
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21.960.041,00	5,94%	$ 71.147,20	0,02%	Muro divisorio bloque estriado No 4	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ 27.365.680,00	7,41%	$ 1.985.671,00	0,54%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para tomacorriente doble normal GFCI tipo institucional, suministro e instalación de lampara tipo LED hermética.	
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ 5.437.009,00	1,47%	$ 5.702.468,07	1,54%	Mediacaña en granito, suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio	
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 27.180.454,00	7,36%		0,00%		
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ 80.034.190,00	21,66%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ 65.354.718,00	17,69%	$ 44.362.438,60	12,01%	Suministro de lavamanos de incrustar, sanitario línea infantil y orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio.	
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ 56.080.542,00	15,18%	$ 102.325.641,60	27,70%	Suministro e instalación división puertas y panneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable para orinal.	
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ 68.947.126,00	18,66%	$ 19.976.668,90	5,41%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ 8.049.599,00	2,18%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ 1.362.054,00	0,37%	$ 480.017,33	0,13%	Aseo general	
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 68.057.434,50	18,42%	Suminsitro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional color blanco.	


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

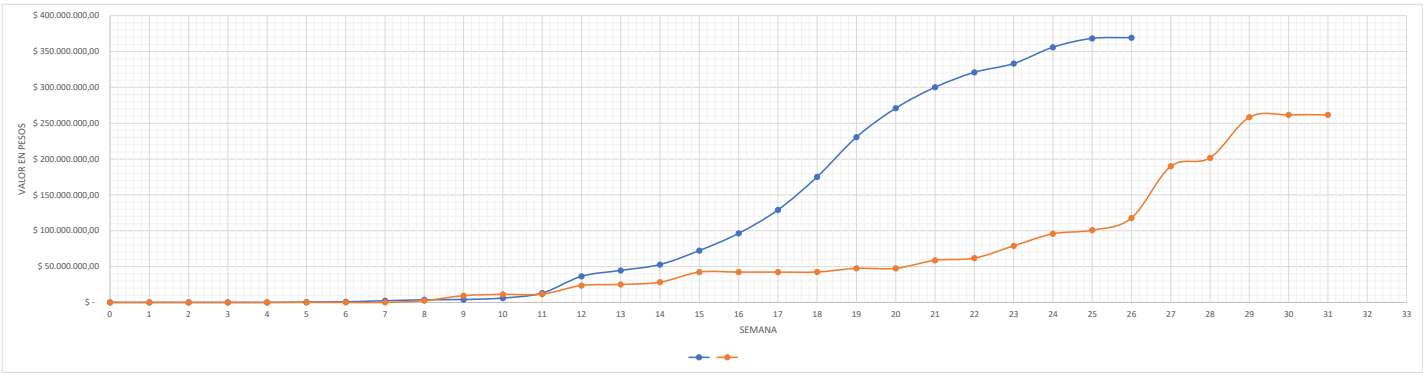

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	7/02/2023	31/07/2023	$ 677.034.595,00	100,00%	$ 373.921.235,04	55,23%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 44,77%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 88.697.521,82	13,10%	$ 55.455.825,38	8,19%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición placa maciza h=0.10m, demolición de alistado de piso, demolición de acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora y limpieza de canales.
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 13.713.785,00	2,03%	$ 76.952.822,60	11,37%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ 4.596.240,00	0,68%	$ 477.150,00	0,07%	Muro traba normal en ladrillo prensado liviano, anclajes varilla 3/8" L=0.25m.
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196.992,00	0,03%	$ 926.428,48	0,14%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ 9.266.137,11	1,37%	$ -	0,00%	
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ 154.647.708,90	22,84%	$ 22.878.302,84	3,38%	Alistado de piso en mortero, suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso.
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ 3.865.792,00	0,57%	$ 5.479.565,00	0,81%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ 90.524.521,00	13,37%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ 3.371.592,00	0,50%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ 64.207.108,85	9,48%	$ 27.071.083,38	4,00%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450.384,00	0,07%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 225.429.225,00	33,30%	$ 65.199.253,68	9,63%	Instalación de lámina de policarbonato
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 18.067.587,35	2,67%	$ 32.064.637,50	4,74%	Aseo general y limpieza, disposición final teja en asbesto cemento.
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 87.416.166,18	12,91%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de ceramica gran formato.

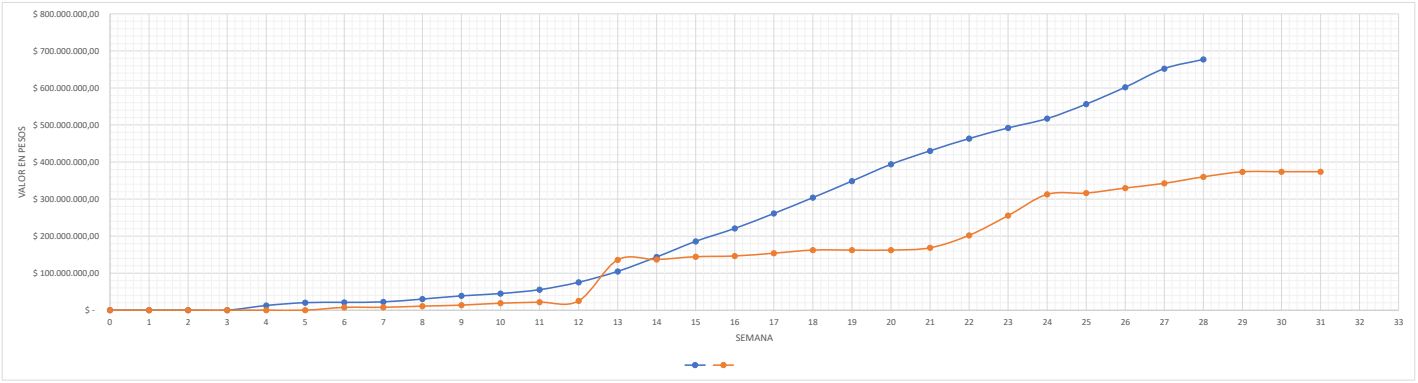


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Instituto técnico Juan del Corral		15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	86,64%	$ 270.843.127,57	51,68%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	34,96%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 124.944.616,22	23,84%	$ 32.022.061,82	6,11%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, demolición de alistado y acabado de piso, desmonte retiro de tuberías, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tuberia de red eléctrica EMT, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de cubierta termo acústica, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, trasiego carretilla.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ 63.816.750,00	12,18%	$ 32.991.801,39	6,30%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ 2.886.660,00	0,55%	$ 3.854.052,55	0,74%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", suministro e instalación de accesorios PCV-S 4", suministro e instalacion de tubería PVCS 3" y 2", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ 23.886.908,00	4,56%	$ 1.447.364,00	0,28%	Suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de kit de guayas para panel LED, reinstalación de lamparas existentes.	
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ 64.069.464,00	12,23%	$ 26.652.175,31	5,09%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero	
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ 3.169.590,00	0,60%	$ 242.209,50	0,05%	Suministro e instalación de muro en Dry wall de 12 mm.	
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ 28.071.970,00	5,36%	$ 33.527.792,69	6,40%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos., pintura tipo korasa a 2 manos, emalte sobre cerchas, puente y estructura metálica.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ 138.135.087,50	26,36%	$ 15.925.534,57	3,04%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.	
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 5.058.061,00	0,97%	$ 9.568.504,04	1,83%	Proteción provisional de elementos y superficies existentes.	
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 114.611.631,70	21,87%	Desmonte de flanche	

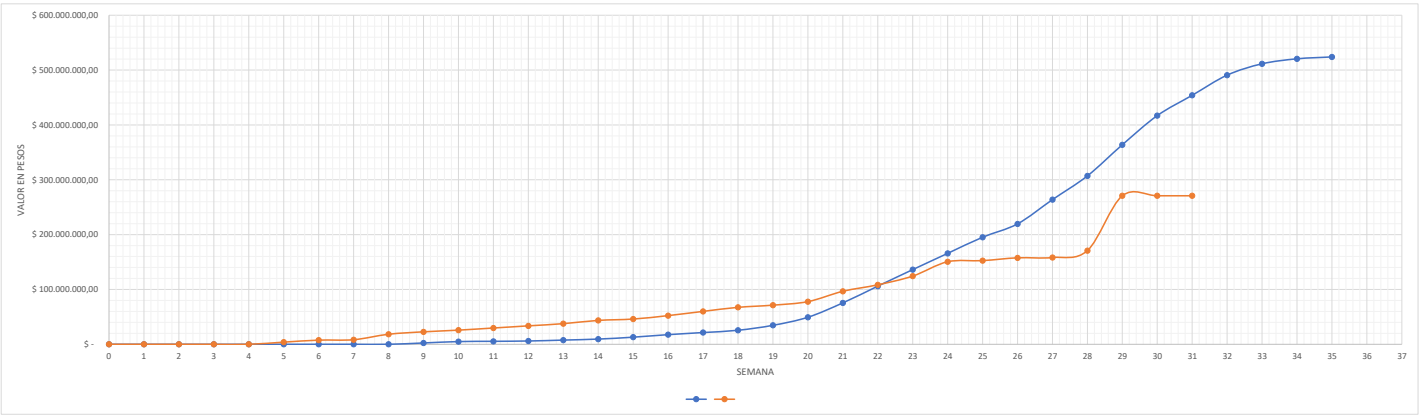


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED San José Norte		10/05/2023	30/11/2023	$ 2.929.420.309,00	5,82%	$ 173.897.888,09	5,94%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-0,12%
1	Preliminares	7/06/2023	30/11/2023	$ 107.901.650,96	3,68%	$ 64.380.554,69	2,20%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de columna existente en concreto, demolición de placa maciza h=010m, demolición placa maciza h=0.15m, demolición placa contra piso h=0.15m, demolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, demolición muro en mampostería, demolición enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica troquelada, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes, corte y regatas en concreto para instalación de tubería.	
2	Estructura	15/07/2023	9/10/2023	$ 35.988.213,18	1,23%	$ 69.355.953,39	2,37%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI, suministro e instalación malla electro soldada 6mm.	
3	Mampostería	23/11/2023	28/11/2023	$ -	0,00%	$ 371.147,37	0,01%	Muro divisorio bloque estriado No. 5	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	22/09/2023	4/12/2023	$ -	0,00%	$ 7.253.703,30	0,25%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación geotextil tejido T1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	9/11/2023	28/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos	4/10/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ 9.202.212,54	0,31%	Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04	
8	Mampostería seca	30/10/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
9	Carpintería metálica	27/10/2023	13/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	14/11/2023	18/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	14/11/2023	23/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	16/10/2023	16/11/2024	$ -	0,00%	$ 23.334.316,80	0,80%	Pañete muro inclue filos, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	25/10/2023	25/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	11/08/2023	28/12/2023	$ 26.614.886,42	0,91%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	21/06/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	20/12/2023	21/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
NP	No Previstos	19/08/2023	28/12/2023	$ -	0,00%				


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

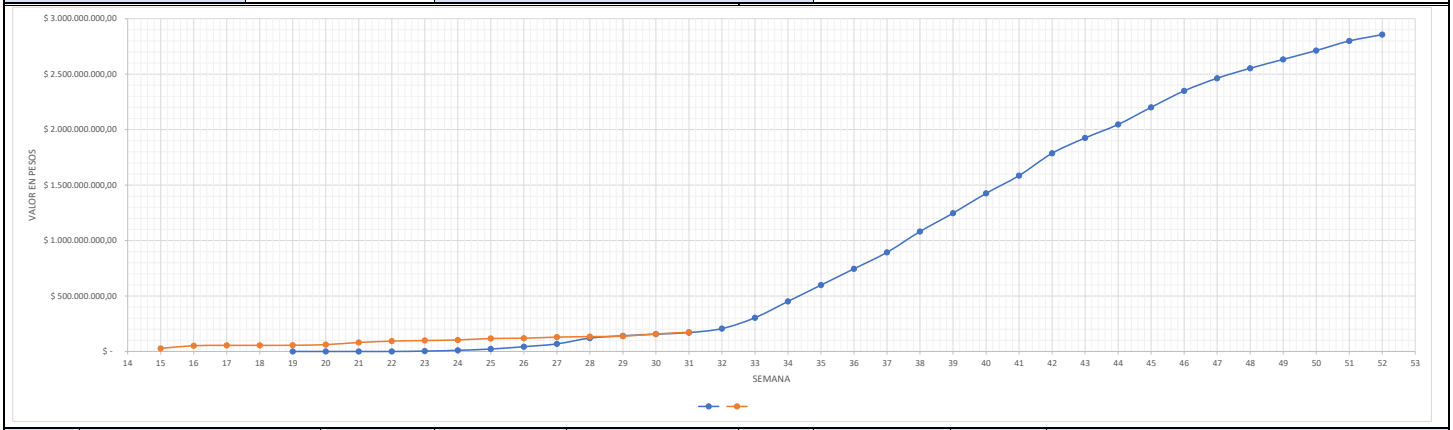

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	IED Rafael Bernal Jiménez, sede B	18/12/2023	25/04/2024	$ 146.249.124,00	0,00%	$ 22.378.672,82	15,30%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-15,30%
1	Preliminares			$ -	0,00%	$ 7.758.782,70	5,31%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso., demolición de placa maciza H=0.10, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 m, desmonte de juego infantil indiferente al material	
2	Estructura			$ -	0,00%	$ 11.769.375,12	8,05%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, zapara en concreto 3000 PSI, viga 30x40 en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	
3	Mampostería			$ -	0,00%	$ 2.850.515,00	1,95%	Muro divisorio bloque estriado No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			$ -	0,00%		0,00%		
7	Pisos			$ -	0,00%		0,00%		
13	Pañete y pintura			$ -	0,00%		0,00%		
16	Obras exteriores			$ -	0,00%		0,00%		
20	Aseo y disposición final			$ -	0,00%		0,00%		

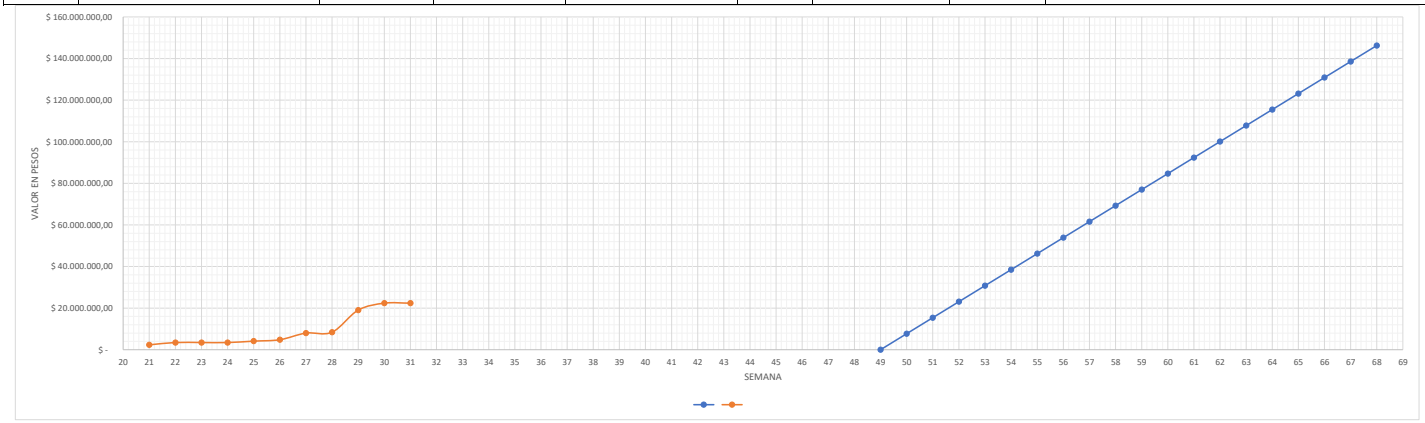


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	IED República de Panamá	17/07/2023	6/01/2024	$ 429.525.634,05	0,36%	$ 24.990.921,16	5,82%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-5,46%
1	Preliminares	21/08/2023	12/10/2023	$ -	0,00%	$ 10.202.485,41	2,38%	Cerramiento en lona con parales de mader anclados al piso, demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a E=0.06 m, demolición de muro en mampostería con acabados E=0.15 m, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas todo tamaño, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.	
2	Estructura	17/07/2023	16/11/2023	$ 1.544.004,00	0,36%	$ 447.956,75	0,10%	Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	
3	Mampostería	30/09/2023	2/10/2023	$ -	0,00%	$ 415.766,45	0,10%	Muro divisorio bloque estriado No. 4	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	17/11/2023	19/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	11/12/2023	16/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
6	Sistema de detección de incendio y red contra incendio	14/12/223	15/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
7	Pisos	25/09/2023	24/10/2023	$ -	0,00%		0,00%		
8	Mampostería seca	25/10/2023	30/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
9	Carpintería metálica	25/10/2023	30/12/2023	$ -	0,00%	$ 7.647.194,10	1,78%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes.	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

10	Carpintería madera	3/01/2024	4/01/2024	$ -	0,00%		0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/10/2023	31/10/2023	$ -	0,00%		0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	31/10/2023	2/11/2023	$ -	0,00%		0,00%	
13	Pañete y pintura	3/10/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 6.277.518,45	1,46%	Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
15	Cerraduras, vidrios y espejos	31/10/2023	8/11/2023	$ -	0,00%		0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	17/11/2023	21/12/2023	$ -	0,00%		0,00%	
20	Aseo y disposición final	13/10/2023	6/01/2024	$ -	0,00%		0,00%	

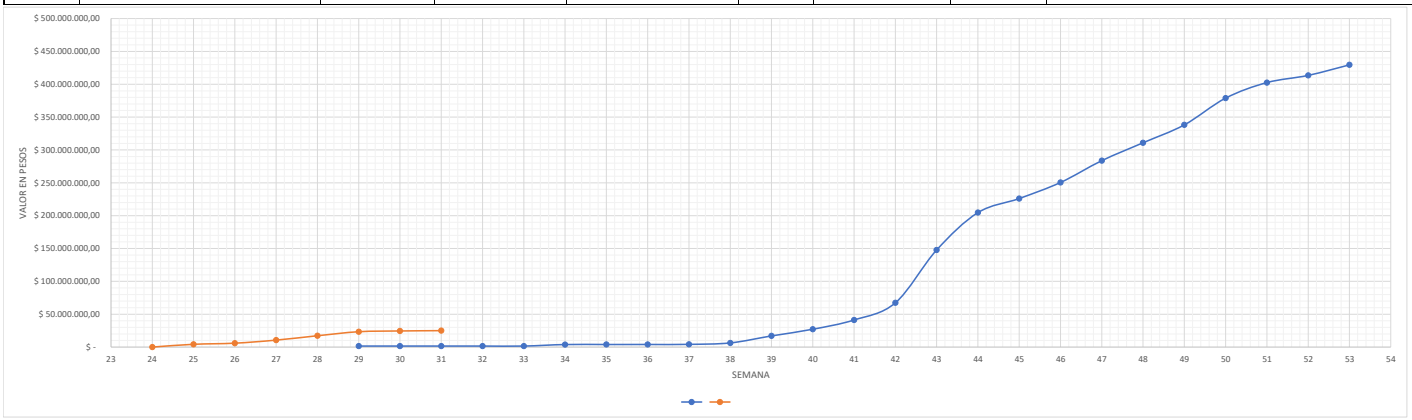

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Simón Bolívar		10/05/2023	16/12/2023	$ 543.797.778,83	46,67%	$ 34.972.236,56	6,43%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 40,24%
1	Preliminares			$ 253.772.296,79	46,67%	$ 34.841.343,56	6,41%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso, demolición de placa maciza H=0.10, demolición de acabado y alistado de piso E=0.08a 0.12 cm, desmonte de todo tipo de cieloraso existente, desmonte de lámparas.
2	Estructura			$ -	0,00%	$ 130.893,00	0,02%	Excavación manual en material común
3	Mampostería			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final			$ -	0,00%	$ -	0,00%	

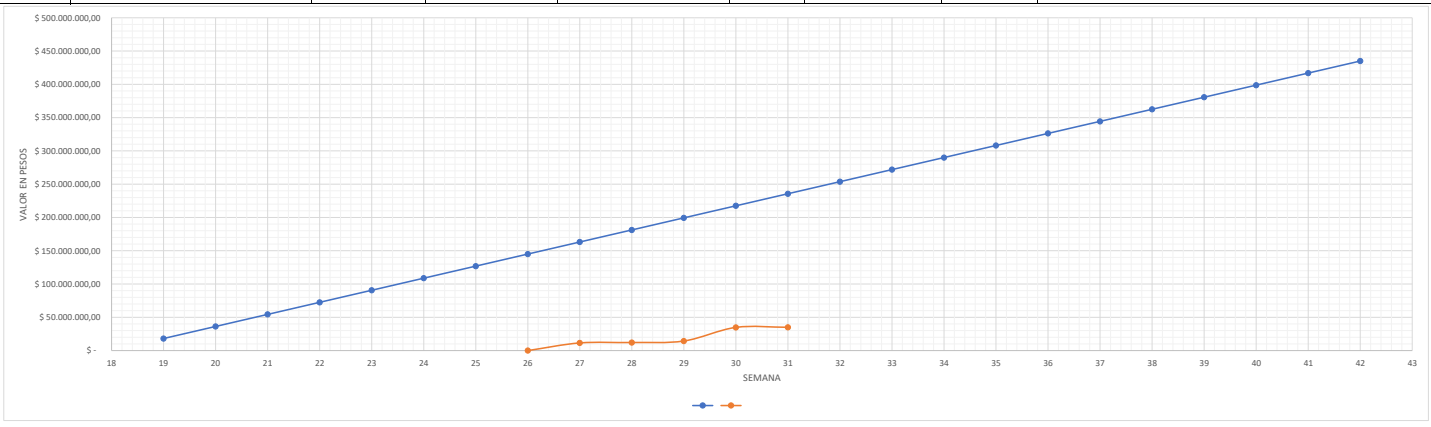

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
IED Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%
IED Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco IED	13/01/2023	21/01/2023					
IED Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023	-					
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023					
IED Nidia Quintero de Turbay, sede A	14/02/2023	6/03/2023					
IED República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023					
Dirección Local de Engativá	8/02/2023	-					
IT Francisco José de Caldas, sede A	30/03/2023	7/04/2023					
IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D	8/03/2023	27/03/2023					
IT Juan del Corral, sede A	2/06/2023	3/06/2023					
IED Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023	16/06/2023					
IED Francisco Berbeo	8/05/2023	-					
IED Naciones Unidas, sede A	21/04/2023	7/06/2023					
IED Antonio Nariño, sede A	21/04/2023	-					
IED Bolivia, sede B	21/04/2023	-					
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	31/05/2023	2/06/2023					
IED Heladia Mejía, sede B	26/05/2023	-					


PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,10%	$ 21.222.394,68	0,11%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,26%	$ 72.137.112,92	0,37%	4	$ 29.459.587,55	0,21%	$ 70.744.247,34	0,51%
5	$ 84.783.311,22	0,44%	$ 156.920.424,14	0,81%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 104.325.828,65	0,75%
6	$ 84.520.694,84	0,44%	$ 241.441.118,98	1,25%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 198.844.329,51	1,42%
7	$ 79.994.302,15	0,41%	$ 321.435.421,13	1,66%	7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 221.062.512,00	1,58%
8	$ 92.371.183,17	0,48%	$ 413.806.604,30	2,14%	8	$ 40.324.809,10	0,29%	$ 261.387.321,10	1,87%
9	$ 188.479.295,83	0,98%	$ 602.285.900,13	3,12%	9	$ 65.485.536,40	0,47%	$ 326.872.857,50	2,34%
10	$ 221.475.791,25	1,15%	$ 823.761.691,38	4,26%	10	$ 41.427.564,22	0,30%	$ 368.300.421,72	2,64%
11	$ 229.916.129,85	1,19%	$ 1.053.677.821,23	5,45%	11	$ 49.569.565,98	0,36%	$ 417.869.987,70	2,99%
12	$ 230.178.690,91	1,19%	$ 1.283.856.512,14	6,64%	12	$ 74.571.439,34	0,53%	$ 492.441.427,04	3,53%
13	$ 271.119.796,10	1,40%	$ 1.554.976.308,24	8,05%	13	$ 384.555.815,94	2,76%	$ 876.997.242,98	6,28%
14	$ 366.181.950,98	1,89%	$ 1.921.158.259,22	9,94%	14	$ 175.842.367,10	1,26%	$ 1.052.839.610,08	7,54%
15	$ 367.035.523,66	1,90%	$ 2.288.193.782,89	11,84%	15	$ 240.754.691,04	1,73%	$ 1.293.594.301,11	9,27%
16	$ 332.730.015,04	1,72%	$ 2.620.923.797,93	13,56%	16	$ 148.581.092,20	1,06%	$ 1.442.175.393,31	10,34%
17	$ 344.526.501,67	1,78%	$ 2.965.450.299,60	15,35%	17	$ 109.142.302,12	0,78%	$ 1.551.317.695,43	11,12%
18	$ 366.678.480,99	1,90%	$ 3.332.128.780,59	17,24%	18	$ 187.805.414,35	1,35%	$ 1.739.123.109,78	12,46%
19	$ 407.916.984,13	2,11%	$ 3.740.045.764,73	19,35%	19	$ 137.179.908,07	0,98%	$ 1.876.303.017,85	13,45%
20	$ 394.517.811,64	2,04%	$ 4.134.563.576,37	21,40%	20	$ 253.932.296,56	1,82%	$ 2.130.235.314,41	15,27%
21	$ 386.813.627,82	2,00%	$ 4.521.377.204,20	23,40%	21	$ 108.086.167,12	0,77%	$ 2.238.321.481,53	16,04%
22	$ 374.635.316,01	1,94%	$ 4.896.012.520,21	25,34%	22	$ 183.153.768,22	1,31%	$ 2.421.475.249,75	17,35%
23	$ 357.626.336,51	1,85%	$ 5.253.638.856,72	27,19%	23	$ 149.085.076,18	1,07%	$ 2.570.560.325,93	18,42%
24	$ 404.635.499,40	2,09%	$ 5.658.274.356,13	29,28%	24	$ 175.332.541,60	1,26%	$ 2.745.892.867,52	19,68%
25	$ 454.381.260,15	2,35%	$ 6.112.655.616,28	31,63%	25	$ 287.822.376,00	2,06%	$ 3.033.715.243,52	21,74%
26	$ 443.529.749,31	2,30%	$ 6.556.185.365,59	33,93%	26	$ 82.724.526,61	0,59%	$ 3.116.439.770,14	22,33%
27	$ 546.127.115,45	2,83%	$ 7.102.312.481,04	36,75%	27	$ 179.887.815,96	1,29%	$ 3.296.327.586,10	23,62%
28	$ 615.173.683,06	3,18%	$ 7.717.486.164,11	39,94%	28	$ 160.476.515,98	1,15%	$ 3.456.804.102,08	24,77%
29	$ 560.052.713,36	2,90%	$ 8.277.538.877,47	42,83%	29	$ 299.025.099,04	2,14%	$ 3.755.829.201,11	26,92%
30	$ 496.413.992,47	2,57%	$ 8.773.952.869,95	45,40%	30	$ 82.524.551,52	0,59%	$ 3.838.353.752,63	27,51%
31	$ 512.510.877,32	2,65%	$ 9.286.463.747,27	48,06%	31	$ 176.956.676,14	1,27%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
32	$ 442.246.042,89	2,29%	$ 9.728.709.790,16	50,34%	32	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
33	$ 449.945.708,87	2,33%	$ 10.178.655.499,04	52,67%	33	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
34	$ 499.136.744,68	2,58%	$ 10.677.792.243,72	55,26%	34	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
35	$ 530.459.117,03	2,75%	$ 11.208.251.360,76	58,00%	35	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
36	$ 495.998.909,79	2,57%	$ 11.704.250.270,55	60,57%	36	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
37	$ 471.321.040,33	2,44%	$ 12.175.571.310,88	63,01%	37	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

38	$ 441.690.342,55	2,29%	$ 12.617.261.653,44	65,29%	38	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
39	$ 519.236.713,88	2,69%	$ 13.136.498.367,32	67,98%	39	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
40	$ 510.632.776,52	2,64%	$ 13.647.131.143,85	70,62%	40	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
41	$ 510.901.872,45	2,64%	$ 14.158.033.016,30	73,27%	41	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
42	$ 440.348.539,65	2,28%	$ 14.598.381.555,95	75,54%	42	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
43	$ 367.615.278,66	1,90%	$ 14.965.996.834,62	77,45%	43	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
44	$ 219.051.900,97	1,13%	$ 15.185.048.735,59	78,58%	44	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%
45	$ 4.139.232.146,41	21,42%	$ 19.324.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 4.015.310.428,77	28,77%

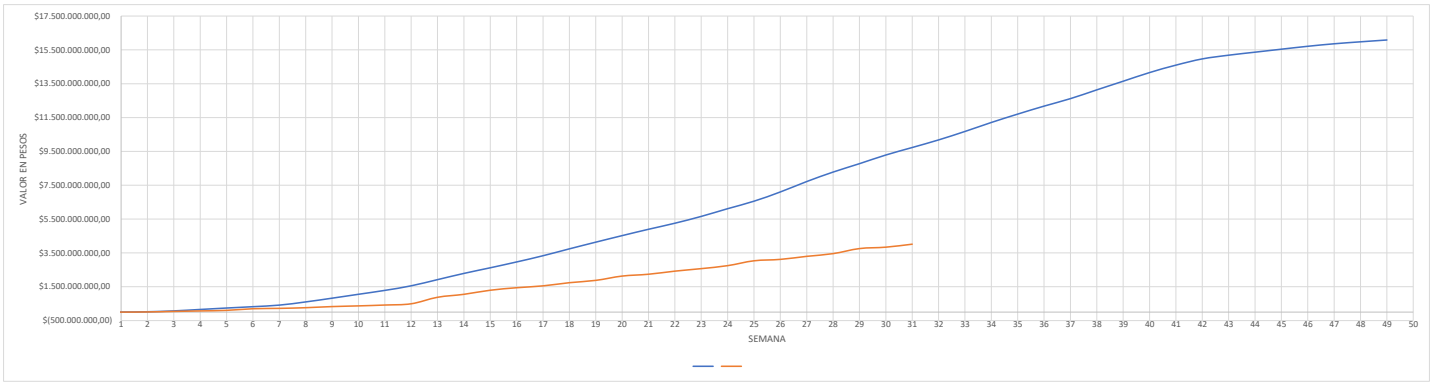

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	31/07/2023	-14	173	-187	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	16/12/2023	0	267	-267	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	6/01/2024	0	241	-241	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

El día 05 de abril de 2023 se realizó aprobación de Modificatorio No.1 Adición y Prórroga de Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1, No. 2, No.3 , No. 4 y No. 5 de contrato de obra e interventoría acorde a los avances realizados.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A



Picado de muros exteriores



Instalación de malla electro soldada en cancha



Fundida de cancha / acabado en helicóptero

IT Francisco José de Caldas, Sede A



Remates en marcos de puertas



Aplicación de pintura en pasillo de segundo piso



Instalación de cableado eléctrico

IED Garcés Navas



Instalación de tubería eléctrica



Instalación de puntos y tubería eléctrica



Instalación de puntos y tubería eléctrica

IED Floridablanca, sede A



Compactación de subbase en aula de música



Instalación de mampostería en bloque SENA



Instalación de perfiles en aula de computo

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

IED Juan del Corral, sede A

		
No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

		
Instalación de enchape en aula de Karate	Instalación de estructura metálica en aula múltiple	Instalación de teja en aula múltiple

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

		
No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana

IED Justo Victor Charry

		
No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana	No ejecución de actividades en la semana

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

IED San José Norte, sede A



Pendientado de terraza



Instalación de enchape en aula múltiple



Instalación de mampostería

IED República de Panamá



Aplicación de pañete en muros



Aplicación de pañete en muros



Aplicación de pañete en muros

IED Simón Bolívar



Aplicación de pintura en perfiles



Retiro de escombro aula múltiple



Retiro de escombro aula múltiple

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 09 de agosto de 2023 en instalaciones de IED Francisco José de Caldas, sede A.

Aspecto PMT


N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
7/08/2023	7:00 am 5:00 pm	3
8/08/2023	7:00 am 5:00 pm	0
9/08/2023	7:00 am 5:00 pm	4
10/08/2023	7:00 am 5:00 pm	0
11/08/2023	7:00 am 5:00 pm	2
12/08/2023	7:00 am 12:00 pm	0



CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	31	**DEL**	domingo, 6 de agosto de 2023	**AL**	sábado, 12 de agosto de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	213	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Relleno subbase granular B-200, red sanitaria, caja de inspección 1mx1m en concreto reforzado, suministro e instalación de enchape de piso, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de puerta de dos hojas dos cuerpos fijos, mini cancha múltiple baloncesto - microfútbol - voleibol.
• Colegio Francisco José de Caldas: Bloque I: Suministro e instalación de piso laminado 8 mm, aseo y disposición final. Bloque II: desmonte de todo tipo de cubierta existente, excavación manual en material común, relleno en recebo común compactado, escalera en concreto de 3500 PSI, caja de inspección 1.00x1.00, sondeo y revisión de desagües, alistado de pisos en mortero impermeabilizado, guarda escoba cerámico, suministro e instalación de enchape piso, suministro e instalación de hoja para puerta, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, pintura epóxica a 3 manos, esmalte sobre cerchas, manto asfáltico impermeabilizante, suministro e instalación de cubierta en teja, suministro y montaje de estructura metálica.
• Colegio Floridablanca: Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable aislado, esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica, suministro y montaje de estructura metálica, aseo general final y limpieza.
• Colegio Juan del Corral: pintura en esmalte, suministro e instalación de caballete para teja, lamina ancho 0.09 a 0.15 CAL 12, soldada sobre correas, orden y aseo general.
• Colegio San José Norte: Demolición de estructuras en concreto, demolición de placa de entrepiso aligerada o maciza existente, demolición de placa maciza H=0.10m, demolición de placa contrapiso 0.15M, demolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 CM, demolición de muro en mampostería con acabados, demolición de enchape de muros y pega, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, suministro e instalación de estructura metálica, suministro e instalación de modulo aula escolar tipo, protección provisional de elementos y superficies existentes, suministro e instalación de teja Ecoroof.
• Colegio República de Panamá: Desmonte de puertas existentes.

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 28,77%, con base en la programación presentada un avance general programado de 48,06%, teniendo una diferencia de 19,28% en atraso.
• Conforme con el seguimiento realizado a emergencias a la fecha se encuentra pendiente subsane de observaciones realizadas por interventoría en cuanto a acabados realizados en aula de preescolar y disposición final de residuos de construcción y demolición en IED Heladia Mejia, sede B y pendiente finalización y entrega en IED Morisco.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos, a la fecha se evidencia atraso en las instituciones por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 90,30% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 65,00% para IED Francisco José de Caldas; 91,40% para IED Garcés Navas; 66,00% para IED Floridablanca; 75,00% para Justo Víctor Charry; 42,00% para Rafael Bernal Jiménez, sede A, 95,30% para Juan del Corral, 8,96% para San José Norte, 40,00% para Rafael Bernal Jiménez, sede B, 42,00% para República de Panamá; 4,80% para IED Simón Bolívar. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas.	**FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR**

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
