CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022









"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No. 007

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE JULIO DE 2023 A 10 DE AGOSTO DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Titulo Documento		INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No.07		
Revisión		0	1	2
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Camilo Antonio Samacá Pesca		
	Firma			
	Fecha	10 de agosto de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	11 de agosto de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	12 de agosto de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 12
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 16
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16
1.3. ANTECEDENTES 16
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 18
1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 18
1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR 19
1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A 19
1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 19
1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 20
1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 20
1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 21
1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 21
1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 22
1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A 22
1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 23
1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 23
1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A 24
1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 24
1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 25
1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 25
1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A 26
1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 26
1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A 27
1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A 27
1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A 28
1.5.1.20. Colegio Juan del Corral, sede B 28
1.5.1.21. Colegio San José Norte 29
1.5.1.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 29
1.5.1.23. Colegio Villa Amalia 30
1.5.1.24. Colegio Francisco Primero, sede B 30
1.5.1.25. Colegio Torquigua, sede A 31
1.5.1.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 31
1.5.1.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 32
1.6. ACTIVIDADES DE OBRA 32
1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 32
1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 34
1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 34
1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 34
1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 34
1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 35
1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 35
1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 35
1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A, ... 36
1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 36
1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 36
1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 37
1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 37
1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 37
1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 38

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 38
1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 39
1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 39
1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 39
1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 39
1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 40
1.6.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 40
1.6.2.21. Colegio San José Norte 40
1.6.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 40
1.6.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A 40
1.6.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 41
1.6.2.25. Colegio Torquigua, sede A 41
1.6.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 41
1.6.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 41

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 41

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022 41
2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 41
2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 42

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 43
2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
2.2.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 45
2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 45
2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 45
2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA 45
2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA 46
2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 46
2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA 46
2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA 47

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 47
2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA. 47
2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA. 48

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 48

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO. 48
3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 48
3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 48

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO. 48
3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA 49
3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO. 50
3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 50
3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 50
3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022 50
3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 51
3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 51
3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 51
3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 52
3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 54
3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 54
3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 54
3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 57
3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 57
3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 57
3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 59
3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 62

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 66
3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 66
3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 70
3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 71
3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 71
3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 71
3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 73
3.3.1.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 73
3.3.1.2.21. Colegio San José Norte, sede A 74
3.3.1.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 74
3.3.1.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A 74
3.3.1.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 74
3.3.1.2.25. Colegio Torquigua, sede A 74
3.3.1.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 74
3.3.1.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 75
3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 75
3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 76
3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 76
3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 78
3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 78
3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 79

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: **80**
3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 80
3.4.2. CORRESPONDENCIA 81

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO **100**
3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 100
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 100
3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 100
3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 100
3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 101
3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 101
3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 103
3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 103
3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 103
3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 105
3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 105
3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 105
3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 109
3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 111
3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 114
3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 114
3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A 116
3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 118
3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 119
3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 120
3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 121
3.5.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 123
3.5.2.21. Colegio San José Norte, sede A 123
3.5.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 125
3.5.2.23. Colegio Villa Amalia 125
3.5.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 126
3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS 127
3.5.3.1. IED Morisco 127
3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B 129
3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A 130
3.5.3.4. IED República de Panamá 130
3.5.3.5. Dirección Local de Engativá 131
3.5.3.6. IED Laureano Gómez 132
3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A 132
3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera 132
3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo 132
3.5.3.10. IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D 133
3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO 138

3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS 139
3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 140
3.5.7. CONTROL DE CALIDAD 141
3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS 141
3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ 141
3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 147
3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 148

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 148

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL. 148

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 148

4.1. OBSERVACIONES 148

4.2. CONCLUSIONES 149

4.3. RECOMENDACIONES 150

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 34
TABLA 2. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA 34
TABLA 3. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED, SEDE B, PANAMERICANA....35
TABLA 4. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 35
TABLA 5. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA....35
TABLA 6. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA....36
TABLA 7. ALCANCE INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A....36
TABLA 8. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A....36
TABLA 9. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 37
TABLA 10. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 37
TABLA 11. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 37
TABLA 12. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 38
TABLA 13. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 38
TABLA 14. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 39
TABLA 15. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A, GARCES NAVAS 39
TABLA 16. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY 39
TABLA 17. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A 39
TABLA 18. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A 39
TABLA 19. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 40
TABLA 20. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DEL CORRAL, SEDE B. 40
TABLA 21. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ NORTE. 40
TABLA 22. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C 40
TABLA 23. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMALIA, SEDE A 40
TABLA 24. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE B 41
TABLA 25. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORQUIGUA, SEDE A 41
TABLA 26. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ, SEDE A 41
TABLA 27. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B 41
TABLA 28. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 42
TABLA 29. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 43
TABLA 30. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 44
TABLA 31. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 44
TABLA 32. PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 45
TABLA 33. PERSONAL MÍNIMO DE SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 46
TABLA 34. PERSONAL ADICIONAL SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 46
TABLA 35. PERSONAL MÍNIMO DE CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022. 47
TABLA 36. PERSONAL ADICIONAL CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 47
TABLA 37. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEL CONTRATISTA. 47
TABLA 38. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORÍA. 48
TABLA 39. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 48
TABLA 40. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
TABLA 41. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 50

TABLA 42. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 51
TABLA 43. PRESUPUESTO ASIGNADO EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA. 51
TABLA 44. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED – SEDE B, PANAMERICANA. 51
TABLA 45. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 52
TABLA 46. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 54
TABLA 47.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA 54
TABLA 48. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 54
TABLA 49. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A 54
TABLA 50. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A. 57
TABLA 51.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A 57
TABLA 52. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 57
TABLA 53. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 57
TABLA 54. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 59
TABLA 55.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 59
TABLA 56. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A. 62
TABLA 57.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 62
TABLA 58. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A. 66
TABLA 59. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 66
TABLA 60.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 66
TABLA 61. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 70
TABLA 62.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 70
TABLA 63. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 71
TABLA 64. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY, SEDE A. 71
TABLA 65. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A. 71
TABLA 66. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 72
TABLA 67. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 73
TABLA 68. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 73
TABLA 69. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DEL CORRAL, SEDE B 74
TABLA 70. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ NORTE. 74
TABLA 71. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C. 74
TABLA 72. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMALIA, SEDE A. 74
TABLA 73. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE B. 74

TABLA 74. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORQUIGUA, SEDE A. 74
TABLA 75. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ, SEDE A. 74
TABLA 76. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 75
TABLA 77. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 75
TABLA 78. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA. 76
TABLA 79. TABLA DE VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL CONTRATO DE OBRA. 78
TABLA 80. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 79
TABLA 81. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 79
TABLA 82. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 81
TABLA 83. CONTROL CORRESPONDENCIA. 100
TABLA 84. AVANCE DE OBRA MIGUEL ANTONIO CARO. 102
TABLA 85. AVANCE DE OBRA INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL 105
TABLA 86. AVANCE DE OBRA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 108
TABLA 87. AVANCE DE OBRA COLEGIO FLORIDABLANCA 111
TABLA 88. AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN 113
TABLA 89. AVANCE DE OBRA COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 116
TABLA 90. AVANCE DE OBRA COLEGIO JUSTO VÍCTOR CHARRY 118
TABLA 91 AVANCE DE OBRA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 119
TABLA 92. AVANCE DE OBRA COLEGIO GARCÉS NAVAS 121
TABLA 93. AVANCE DE OBRA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ 122
TABLA 94. AVANCE DE OBRA SAN JOSÉ NORTE. 125
TABLA 95. AVANCE DE OBRA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 127
TABLA 96. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED MORISCO 128
TABLA 97. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B 130
TABLA 98. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED NYDIA QUINTERO DE TURBAY. 130
TABLA 99. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED REPÚBLICA DE PANAMÁ. 131
TABLA 100. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA. 132
TABLA 101. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED JUAN FRANCISCO BERBEO. 133
TABLA 102. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. 135
TABLA 103. PRESUPUESTO EMERGENCIA IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 135
TABLA 104. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED JUAN DEL CORRAL 136
TABLA 105. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 136
TABLA 106. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED NACIONES UNIDAS, SEDE B. 137
TABLA 107. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED ANTONIO NARIÑO, SEDE A. 137
TABLA 108. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED BOLIVIA, SEDE B 137
TABLA 109. AVANCE GENERAL DE OBRA 139
TABLA 110. RELACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 147
TABLA 111. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 148

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....18
FIGURA 2. COLEGIO REPÚBLICA DE GUATEMALA (IED) – SEDE – REPÚBLICA DE GUATEMALA. 19
FIGURA 3. COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) – SEDE B – FLORENCIA. 19
FIGURA 4. COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA (IED) – SEDE B – PANAMERICANA. 20
FIGURA 5. COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED). 20
FIGURA 6. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE B – CIUDAD DE HONDA. 21
FIGURA 7. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) – SEDE C. 21
FIGURA 8. INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE –JUAN DEL CORRAL. 22
FIGURA 9. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED) – SEDE A – ALEMANIA. 22
FIGURA 10. COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN (IED) – SEDE MANUELA AYALA DE GAITÁN. 23
FIGURA 11. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE A – I.T FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS....23
FIGURA 12. COLEGIO FLORIDA BLANCA (IED) – SEDE – FLORIDA BLANCA. 24
FIGURA 13. COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN (IED) – SEDE A....24
FIGURA 14. COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (IED) – SEDE – SIDAUTO....25
FIGURA 15. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED) –SEDE A – RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 25
FIGURA 16. COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED) – SEDE A – GARCÉS NAVAS – ZONA ESCOLAR NO. 4.....26
FIGURA 17. COLEGIO ROBERT F KENNEDY (IED) – SEDE ROBERT F. KENNEDY 26
FIGURA 18. COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (IED) – SEDE A 27
FIGURA 19. COLEGIO GARCÉS NAVAS (IED) - SEDE A....27
FIGURA 20. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ (IED) – SEDE A. 28
FIGURA 21. COLEGIO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE B. 28
FIGURA 22. COLEGIO SAN JOSÉ NORTE (IED). 29
FIGURA 23. COLEGIO SAN JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C (IED). 29
FIGURA 24. COLEGIO VILLA AMALIA (IED). 30
FIGURA 25. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED)- SEDE B. 30
FIGURA 26. COLEGIO TORQUIGUA (IED)- SEDE A. 31
FIGURA 27. COLEGIO LAUREANO GÓMEZ (IED)- SEDE A. 31
FIGURA 28. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED)- SEDE B. 32

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1. VALORES ASIGNADOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 51
GRÁFICA 2. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 75
GRÁFICA 3. ACTAS PARCIALES DE OBRA. 76
GRÁFICA 4. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 78
GRÁFICA 5. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 79
GRÁFICA 6. ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA. 80
GRÁFICA 7. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO MIGUEL ANTONIO CARO. 102
GRÁFICA 8. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUAN DEL CORRAL. 105
GRÁFICA 9. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 109
GRÁFICA 10. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FLORIDABLANCA. 111
GRÁFICA 11. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JORGE ELIECER GAITÁN. 114
GRÁFICA 12. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 116
GRÁFICA 13. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUSTO VÍCTOR CHARRY. 118
GRÁFICA 14. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO SIMÓN BOLÍVAR 119
GRÁFICA 15. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO GARCÉS NAVAS. 121
GRÁFICA 16. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO REPÚBLICA DE PANAMÁ. 123
GRÁFICA 17. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO SAN JOSÉ NORTE. 125
GRÁFICA 18. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 127

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido A.I.U. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

El día 05 de abril de 2023 se realizó otrosí modificatorio No.1 adición y prórroga No.1 de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, conforme a las nuevas intervenciones de los Colegios adicionales consideran viable adicionar, ocho (8) sedes de colegios más, a las diecinueve (19) iniciales contempladas generando un nuevo universo de veintisiete (27) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 que se relacionan a continuación:

- IED San José Norte, Sede A

En el momento, esta institución educativa fue viabilizada por la Dirección de Evaluación de la Educación como uno de los diez (10) establecimientos aptos para implementar el programa educativo de Bachillerato Internacional, por lo tanto y para cumplir con los espacios educativos y estándares de calidad espacial que exige este proyecto educativo, se deben realizar obras de mejoramiento consistentes en cambios de cubiertas en general, adecuaciones en baterías de baños, readecuación de bloques de aulas costado sur de la sede y adecuaciones en la zona; esto con el motivo de ser certificado por la organización internacional competente.

- IED Villa Amalia, Sede única

El bloque ubicado en el costado occidental de la planta física de esta sede, es el único que cuenta aún con una cubierta en canaleta de asbesto cemento (90) en alto estado de deterioro, para lo cual se propone su cambio por una cubierta liviana y que brinde

protección al clima y mejores condiciones acústicas, climáticas e higiénico-sanitarias. Con las últimas temporadas invernales las tejas han empeorado su condición crítica para recambio. Adicionalmente, se pretende mejorar los espacios que ocupan actualmente tres aulas prefabricadas, con aulas modulares con mejores condiciones de iluminación ventilación, y por último el mejoramiento del drenaje de una parte del área recreativa principal.

- IED Juan del Corral, Sede B

Esta sede educativa cuenta con una pequeña zona recreativa central con falencias en el acabado de la superficie, al igual que una zona de juegos infantiles en el costado occidental, por lo tanto, se plantean obras de mejoramiento encaminadas en el mejoramiento físico y estético de estas áreas recreativas.

- IED Francisco Primero, Sede B

La institución educativa ha venido reportando fallas por sobrecarga en el servicio eléctrico general, además de filtraciones en la placa de cubierta del tanque de almacenamiento subterráneo de agua potable, por lo tanto, se proyecta la revisión de todos los circuitos eléctricos y la impermeabilización de un área libre con acabado en adoquín que cubre el tanque en mención.

- IED Rafael Bernal Jiménez, Sede B

Esta sede educativa presenta un problema de humedades en muro de cerramiento contra predios vecino y un empozamiento de aguas lluvias en un área libre recreativa, por consiguiente, se harán obras de mejoramiento correctivo en muro y adecuaciones de arcamos para el manejo de aguas lluvias.

- IED Laureano Gómez, Sede única

Este colegio cuenta con falencias de drenaje de aguas lluvias en algunas zonas verdes interiores que se traducen en empozamientos, que no permiten su uso cuando se presentan altas precipitaciones, adicional a esto falta implementar una malla contra impacto en el costado occidental de una de las canchas múltiples con las que cuenta, por lo tanto, se harán sistemas de drenaje como cárcamos con rejillas, sifones además de una malla contra impacto de 2,50m de altura.

- IED Toquigua

En el momento, esta sede educativa, no cuenta con una cocina ni con un comedor escolar para proveer de comida caliente a la población estudiantil, sin embargo, dentro del proyecto de habilitación de nuevos comedores y cocinas para las instituciones educativas del Distrito Capital se incluye a el Colegio Torquigua, cuyo desarrollo es mediante el suministro de estructuras móviles modulares “in situ” a diferencia de la

generalidad de las instituciones. Este tipo de construcción requiere adicionalmente el montaje de las redes y la provisión del equipamiento indispensable para su puesta en funcionamiento.

- IED Jorge Eliecer Gaitán, Sede C

En la zona de acceso principal de colegio se cuenta con un área de juegos infantiles inhabilitada que se ha venido agrietando y se ha afectado el acabado del piso, por lo que se debe hacer la reparación de las fisuras y grietas y nuevamente colocar un acabado amigable que permita nuevamente la utilización de esta zona, además del arreglo de los domos en marquesina de vidrio en los halles interiores.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($19.324.280.882) incluido AIU y conforme a lo establecido, el plazo para la ejecución inicial del objeto contractual es de doce (12) MESES, con lo cual el plazo total de ejecución sumados los 3 meses y 15 días de la prórroga No. 1 necesarios para la correcta terminación de los frentes de trabajo, se determina en quince (15) meses y quince días (15) a partir de la firma del acta de inicio.

Para la Interventoría del Contrato de Obra la Secretaría de Educación Distrital abrió el CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, que tiene por objeto: " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO”." Este Contrato fue adjudicado al CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 con número de Nit. 901.649.961-8 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla que a su vez está constituido por las empresas GNG PROYECTOS S.A.S BIC (50%) con número de Nit.901.477.828-7. representada legalmente por GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ identificado con cedula de ciudadanía No 72.201.382 de Barranquilla y GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. (50%) con número de Nit.901.383.717-3 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla, dando origen al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 del 24 noviembre de 2022; con un valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 951.138.738)**, y un plazo total para la ejecución del contrato de Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la etapa correspondiente, la cual se firmó el día 22 de diciembre de 2022.

Por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante modificatorio No.1 de 11 de mayo de 2023 se consideró viable adicionar recursos y prorrogar en tiempo el contrato de interventoría, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero de las ocho (8) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las diecinueve (19) iniciales, generan un nuevo universo de veintitrés (23) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, sedes descritas anteriormente.

Por lo tanto, se adiciona el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($310.122.937,00) incluido IVA.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.261.261.675) incluido IVA.

De conformidad a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, cuyo plazo de ejecución corresponde a (13) MESES, será prorrogado por tres (3) meses y veinte (20) días, más, para un total de dieciséis (16) meses y veinte (20) Días a partir de la firma del acta de inicio, es decir hasta el día 11 de mayo de 2024.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de julio de 2023 a 10 de agosto de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

El capítulo primero contiene la información general del proyecto, justificación, antecedentes, localización general y particular y las características técnicas del proyecto haciendo énfasis en el alcance establecido para cada una de las instituciones educativas.

El segundo capítulo corresponde a la información general del contrato de obra e interventoría en sus condiciones iniciales y actualizadas; así mismo, se relaciona el personal y los recursos involucrados en los contratos en mención.

El capítulo tercero corresponde a la información legal, financiera, administrativa, y técnica del proyecto, así como las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra como por la interventoría en los componentes de orden técnico, social y de seguridad y salud en el trabajo.

En el capítulo cuarto la interventoría realiza las observaciones, conclusiones y recomendaciones concernientes al desarrollo del contrato.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de reparaciones locativas correspondientes a: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos y de trabajo, e igualmente en la atención de obras de que por necesidad o por circunstancias sobrevinientes, causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas imprevisibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales las cuales deben ser atendidas de forma prioritaria; de allí se desarrolla la planificación para efectuar las intervenciones que sean necesarias a juicio de la supervisión de la Secretaría Distrital de Educación e interventoría, con ello, realizar sobre los planos existentes de cada Colegio los detalles constructivos, cálculos y presupuestos que estén dentro del alcance del objeto: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." – En las Localidades de Engativá y Barrios Unidos.

Por parte de la Secretaría de Educación Distrital se hizo entrega de los planos existentes de cada institución, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.
- Planos Eléctricos.
- Planos Hidrosanitarios.

1.3. ANTECEDENTES

En virtud a los lineamientos generales de la política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 del 2022 la Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, la promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, de selección de un total de doscientas veintitrés (223) plantas físicas, determinando 198 sedes educativas y 25 sedes administrativas, las cuales se encuentran ubicadas en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C”, Programa Línea Estratégica: 4 -Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con algunas infraestructuras con una antigüedad de más de cuarenta (40) años, es conveniente y necesario realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes de los niños y niñas del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento a dichas actividades.

La población beneficiada del proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá y ofrece cobertura en toda la ciudad. Igualmente, en la institución educativa trabajan un equipo de docentes, directivos docentes y administrativos de la SED, los cuales también se verían beneficiados al contar con nuevos espacios para impartir clase y áreas administrativas de atención a la comunidad, adicionalmente la comunidad educativa conformada por padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con estas doscientas veintitrés (223) intervenciones se beneficiará una población aproximada de ochenta mil (80.000) estudiantes para todas las localidades de la ciudad de Bogotá D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jóvenes, mujeres, en empleos directos e indirectos.

1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, más precisamente en la localidad de Engativá y Barrios Unidos.

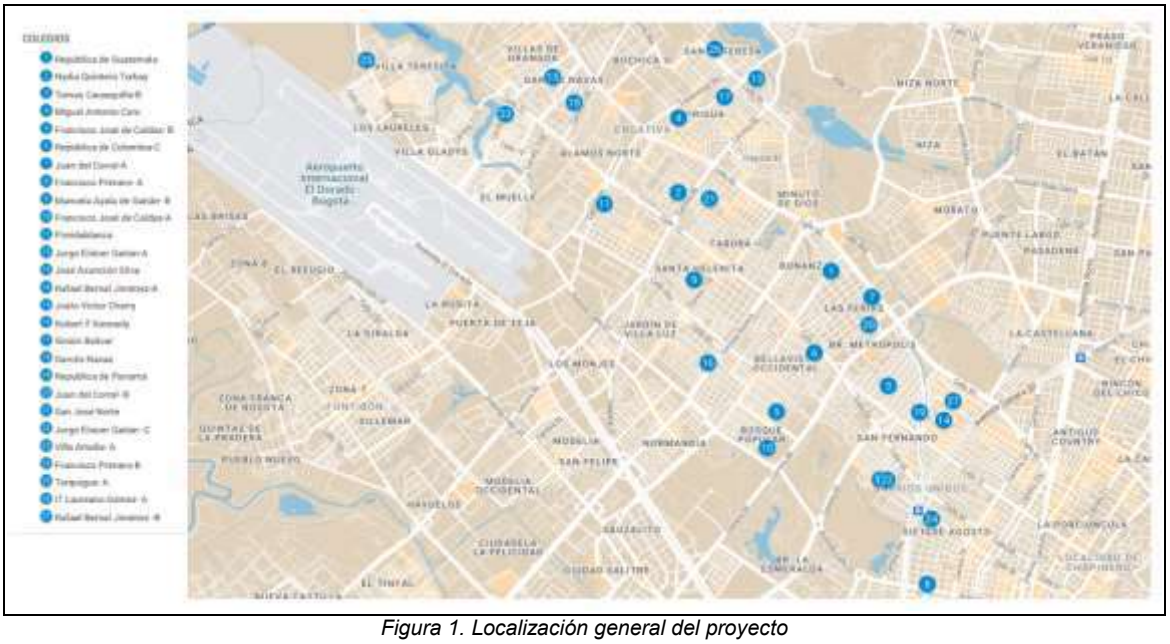


Figura 1. Localización general del proyecto
Fuente://www.google.com.co/maps/.

1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR

1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A

El colegio República de Guatemala se encuentra localizado en la Calle 78 Bis #68a – 45, localidad de Engativá.



Figura 2. Colegio República de Guatemala (IED) – Sede – República de Guatemala.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

El colegio Nidia Quintero de Turbay se encuentra localizado en Dg. 74b #87-40, localidad de Engativá.



Figura 3. Colegio Nidia Quintero de Turbay (IED) – Sede B – Florencia.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

El colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, se encuentra localizado en Cl. 75A #63-55, localidad de Barrios Unidos.



Figura 4. Colegio Tomás Carrasquilla (IED) – Sede B – Panamericana.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

El colegio Miguel Antonio Caro IED, se encuentra localizado en Tv. 94 # 81A-29, localidad de Engativá.

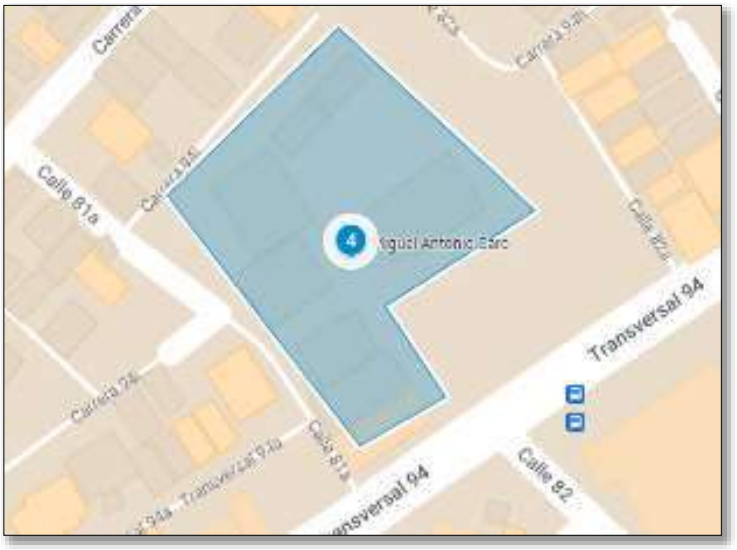


Figura 5. Colegio Miguel Antonio Caro (IED).
Fuente: Google Eath.

1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

El colegio Francisco José de Caldas, Sede B, se encuentra localizado en Cl. 64f Bis #68g -54, localidad de Engativá.



Figura 6. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede B – Ciudad de Honda.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

El colegio República de Colombia, Sede C, se encuentra localizado en Cra. 68h #71A-01, localidad de Engativá.



Figura 7. Colegio República de Colombia (IED) – Sede C.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

El Instituto técnico Juan del Corral, se encuentra localizado en Cra. 69b #79A-42, localidad de Engativá.

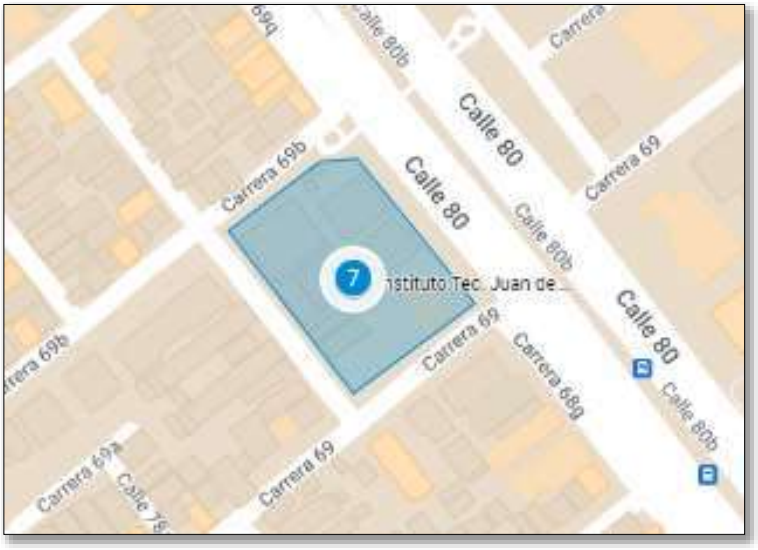


Figura 8. Instituto Técnico Juan del Corral (IED) – Sede –Juan del Corral.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A

El Colegio Francisco Primero, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 28 #63-64, localidad de Barrios Unidos.



Figura 9. Colegio Francisco Primero (IED) – Sede A – Alemania.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

El Colegio Manuela Ayala de Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 78 #69 A -11, localidad de Engativá.



Figura 10. Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED) – Sede Manuela Ayala de Gaitán.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

El Colegio Francisco José de Caldas se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 11. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede A – I.T Francisco José de Caldas.
Fuente: Google Eath.

1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A

El Colegio Florida Blanca, se encuentra localizado en Cra. 70A #94-38, localidad de Engativá.



Figura 12. Colegio Florida Blanca (IED) – Sede – Florida Blanca.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 66A #56- 35, localidad de Barrios Unidos.

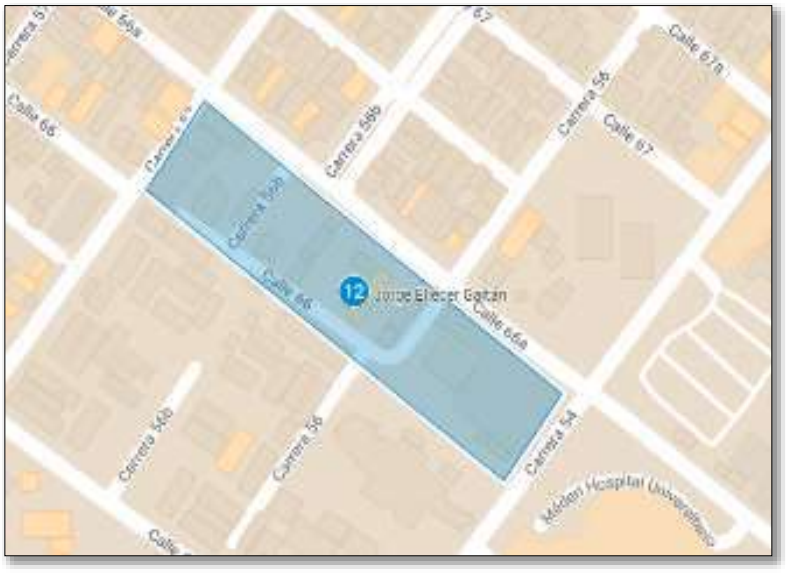


Figura 13. Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

El Colegio José Asunción Silva se encuentra localizado en Cl. 91 #16A - 82, localidad de Engativá.



Figura 14. Colegio José Asunción Silva (IED) – Sede – Sidauto.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, Sede A, se encuentra localizado en Cr 53 #75-17, localidad de Barrios Unidos.



Figura 15. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED) –Sede A – Rafael Bernal Jiménez.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A

El Colegio Justo Víctor Charry, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 108 #21, localidad de Engativá.



Figura 16. Colegio Justo Victor Charry (IED) – Sede A – Garcés Navas – Zona Escolar No. 4.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

El Colegio Robert F Kennedy, se encuentra localizado en Av. Boyacá #64h - 39, localidad de Engativá.



Figura 17. Colegio Robert F Kennedy (IED) – Sede Robert F. Kennedy
Fuente: Google Earth.

1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A

El Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 92 #86 - 18, localidad de Engativá.



Figura 18. Colegio Simón Bolívar (IED) – Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A

El Colegio Garcés Navas, se encuentra localizado en Cl. 104A #76B-9, localidad de Engativá.



Figura 19. Colegio Garcés Navas (IED) - Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A

El Colegio República de Panamá, se encuentra localizado en Cra. 57A #74A- 32, localidad de Barrios Unidos.



Figura 20. Colegio República de Panamá (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.20. Colegio Juan del Corral, sede B

El Colegio Juan del Corral, sede B, se encuentra localizado en Cra. 68G#78-20, Bogotá, localidad de Engativá.

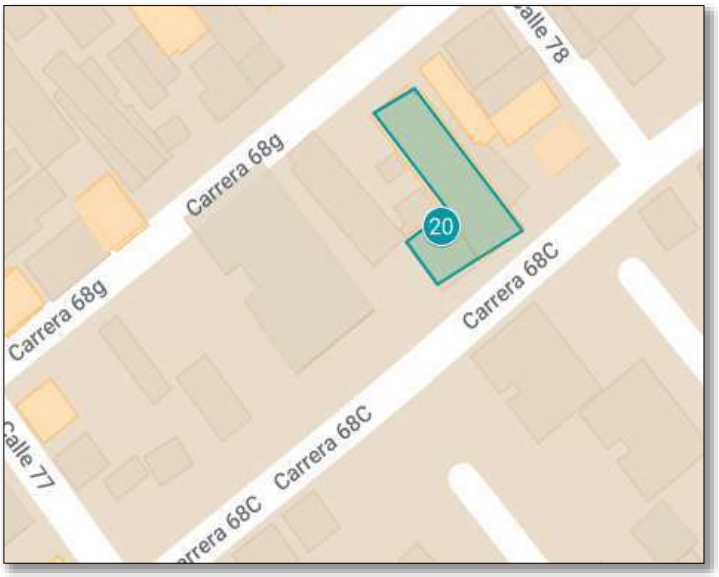


Figura 21. Colegio Juan del Corral (IED) – Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.21. Colegio San José Norte

El Colegio San José Norte, se encuentra localizado en Cra. 84 #75a-09, Bogotá, localidad de Engativá.

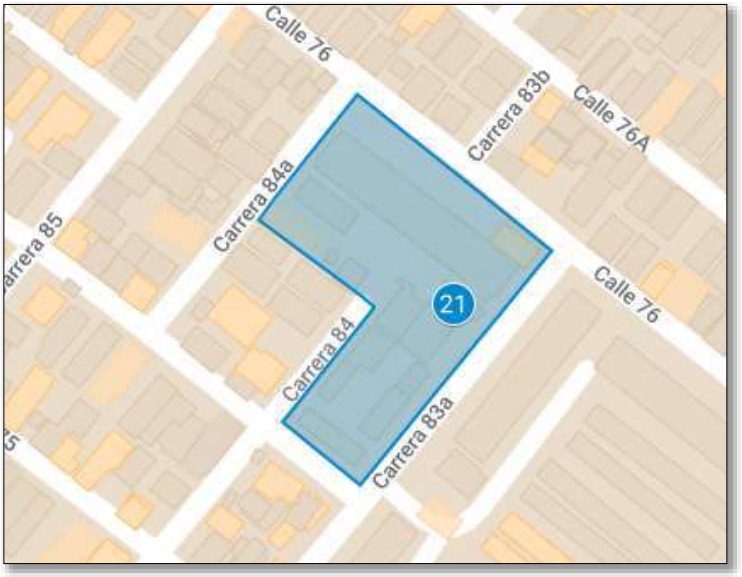


Figura 22. Colegio San José Norte (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C, se encuentra localizado en Cl. 66a #54-40, Bogotá, localidad de Barrios Unidos.



Figura 23. Colegio San Jorge Eliecer Gaitán, sede C (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.23. Colegio Villa Amalia

El Colegio Villa Amalia, se encuentra localizado en Cra. 110 #71a-10, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 24. Colegio Villa Amalia (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.24. Colegio Francisco Primero, sede B

El Colegio Francisco Primero, sede B, se encuentra localizado en Cra. 28b #65-80, Bogotá, localidad de Barrios Unidos.



Figura 25. Colegio Francisco Primero (IED)- Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.25. Colegio Torquigua, sede A

El Colegio Torquigua, sede A, se encuentra localizado en Cl 64 #128-50, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 26. Colegio Torquigua (IED)- Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

El Colegio Laureano Gómez, sede A, se encuentra localizado en Cl 90 A # 95A-56, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 27. Colegio Laureano Gómez (IED)- Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B, se encuentra localizado en Cra 54 #78-21, Bogotá, localidad de Engativá.

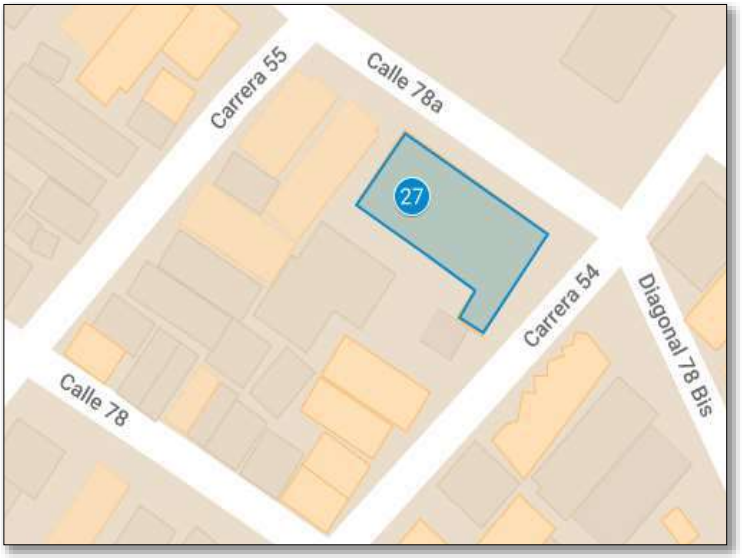


Figura 28. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED)- Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.6. ACTIVIDADES DE OBRA

1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se establecen los diagnósticos técnicos de las Instituciones Educativas a fin de brindar solución a las necesidades de cada una, de esta manera, se realiza la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, con ello, se efectuarán intervenciones que mejoran la infraestructura educativa en situaciones de atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la entidad contratante, obras menores de mitigación de posibles riesgos y mantenimientos correctivos, acorde con los requerimientos institucionales y de estudiantes que harán uso de estos espacios.

En atención a lo manifestado en visitas, reuniones previas al inicio de las obras, comités efectuados conjuntamente entre Supervisor de Contrato (SED), apoyo a la supervisión Contrato (SED), Contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA S.A.S.) e Interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022), y con base en los diagnósticos realizados, se identificó las insuficiencias y las soluciones a implementar para brindar seguridad, comodidad y estética a las instituciones a intervenir, de manera que, se presentaron las alternativas de mantenimiento y presupuestos ajustados acorde a cada necesidad y a la CARTILLA ILUSTRATIVA DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).

De este modo, de manera general las actividades a realizar en las instituciones educativas corresponden a:

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO**: Se refiere a todas las actividades necesarias de topografía y localización del área a ser intervenida.

- **CERRAMIENTO**: Obras necesarias de aislamiento contra personas ajenas para evitar el tránsito y riesgo de accidentes.

- **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO:** Actividad necesaria para la adecuación del área donde se realizarán las intervenciones.

- **DESMONTE:** Retiro de mobiliarios como puertas, ventanas, carpintería metálica, así como redes eléctricas, cielos rasos y cubiertas, entre otros.

- **EXCAVACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS:** Obras para la construcción de la cimentación y adecuación de las áreas aledañas al sitio de obra.

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:** Actividades de construcción de soporte del edificio.
- **MAMPOSTERÍA:** Se refiere a las actividades de cerramiento de los pórticos y muros.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** Actividades que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a las edificaciones e infraestructuras.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:** Sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de agua.

- **ENCHAPES, PINTURA, PAÑETE Y APARATOS SANITARIOS:** Obras necesarias para la entrega de las obras con las especificaciones necesarias para el buen uso de estas áreas.

- **CUBIERTA - CIELO RASO:** Adecuación de techos con las especificaciones técnicas establecidas.

- **CARPINTERÍA METÁLICA DE MADERA Y VIDRIOS:** Elementos que se instalan en los vanos dejados en la mampostería y para control en los accesos.

- **OBRAS EXTERIORES:** Todas las actividades necesarias de conectividad y urbanismo necesarias para acceder al edificio.

- **OTRAS OBRAS**: Se contemplan algunas obras complementarias como reparación de senderos, traslado de acometidas y aseo y disposición final.

1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, se relacionan las actividades priorizadas en cada una de las instituciones educativas de acuerdo a lo expresado por la Supervisión de la secretaria de Educación de Bogotá.

1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Calle 78 Bis #68a - 45	Mejoramiento de Canchas.	N/A	NO CUMPLE
	Baterías Sanitarias.	Intervención completa	CUMPLE
	Cambio de Cubierta.	Bloque C	CUMPLE
		Retirar antepecho	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de Baranda	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Patio.	N/A	NO CUMPLE

Tabla 1. Alcance Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Dg. 74b #87-40	Mejoramiento de cubierta	2 bloques / Intervención integral de cubierta. Revisar necesidad de estructura - Ventilación de aulas.	CUMPLE
	Patio.	Demolición de Tarima	CUMPLE
	Desagües.		NO CUMPLE
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Cuarto de refrigerios.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Pintura en carpintería metálica	CUMPLE

Tabla 2. Alcance Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75A #63-55	Baterías Sanitarias (Incluye Cubiertas).	Rehabilitación de baterías sanitarias - 2 bloques.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Mejoramiento de Patio y materas.	Remodelación patio y materas (Contenedores).	CUMPLE

Tabla 3. Alcance Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Tv. 94 # 81A-29	Se realizará valoración de los especialistas de la DCCEE a la estructura de los bloques existentes con el propósito de establecer situación actual y posibles intervenciones mientras se realizan nuevos estudios y obtención de licencia de construcción. Se evidencia alto deterioro en cubiertas de asbesto cemento y en piso de patio y canchas (requerimiento secretaria de Salud)	Reconocimiento de cubierta con dron. Ajuste de cubierta, canales, piezas necesarias y bajantes (impermeabilización).	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Tabla 4. Alcance Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64f Bis #68g -54	Mejoramiento de Batería Sanitaria.	Baño y lavamanos	CUMPLE
	Staff room, salón de educación física	Demolición de divisiones Cambio de cubierta. Tanque. Mejoramiento integral.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuar Shut de basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Patio.	Limpieza de zonas húmedas, Rehabilitación de cancha, demolición de placas, instalación de asfalto. (Conceptos técnicos).	CUMPLE

Tabla 5. Alcance Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68h #71A-01	Mejoramiento de Desagües.	Impermeabilización de techo y bajantes. Caja más profunda. Revisar viga canal y bajantes de cubierta.	CUMPLE
	Mejoramiento Equipo de Bombeo.	Revisar estado de bombas	CUMPLE
	Cancha deportiva.	Sellos de fisura y demarcación. Cambio de tableros de canchas.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
		Instalación de Cubierta en pasillo Cancha.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Tratamiento de filtraciones de Cubierta.	Impermeabilización de Cubierta.	CUMPLE
		Cuarto de Servicio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Ajustar cuarto de seguridad a Vestier.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Revisar filtraciones, humedades	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Reforzamiento de ventanas.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Cuarto de Refrigerios.	Cubierta de cuarto de refrigerios y cocina, reubicación de los mismos.	CUMPLE

Tabla 6. Alcance Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A,

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 69b #79A-42	Impermeabilización de Cubiertas Planas	Pasillos, escalera, biblioteca acceso. Mortero y manto de impermeabilización, sifón. Impermeabilización de puente (alternativas para evitar mantenimientos continuos). Flanches en cubierta.	CUMPLE
	Sistemas de desagües en sótano.	Redistribución de tubería - Anclajes.	CUMPLE

Tabla 7. Alcance Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28 #63-64	Mejoramiento de Cubiertas	AULAS 16,17, 18, 19. Bloque sur calle 63. Pintura.	CUMPLE
	Ventanería.	Casona Norte, Bloque sur Calle 63	CUMPLE
	Batería sanitaria.		NO CUMPLE
		Pintura y pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Zonas exteriores	Shut de basuras.	CUMPLE

Tabla 8. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 78 #69 A -11	Áreas exteriores	Organizar Cancha (Cambio de sentido), malla de cerramiento, mejoramiento de capa de asfalto, zona de volley ball demolición de baldosa, Demolición de muros en espacio público.	CUMPLE
	Cubierta bloque antiguo.	Bloque antiguo.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Pisos.	Demolición de baldos y ajuste.	CUMPLE
	Shut de basuras.	Shut de basuras.	CUMPLE
		Salón de educación física	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de tanque de reserva agua.		NO CUMPLE
	Sistema hidroneumático.	EAAB	CUMPLE

Tabla 9. Alcance Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cambio de Cubierta.	Cambio de cubierta Coliseo. Cubierta entre coliseo y bloque de salones.	CUMPLE
	Baterías sanitarias.		NO CUMPLE
	Pisos.	Sendero con cubierta. Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
	Iluminación.	Iluminación Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
		Ventanería coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventilación Cruzada.		NO CUMPLE

Tabla 10. Alcance Institución educativa Francisco José de Caldas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 70A #94-38	Cubierta.	Mantenimiento general bloque SENA (Pendiente por definir).	NO CUMPLE
	Pisos.	Pisos.	CUMPLE
	Ventanería.	Ventanería.	CUMPLE
	Adecuación área de servicios generales.	Adecuación área de servicios generales.	CUMPLE
	Piso Parqueadero y canchas.	Priorizar mejoramiento de canchas y parqueadero.	CUMPLE

Tabla 11. Alcance Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 66ª #56-35	Mejoramiento de Cubiertas en Bloque de aulas y coliseo.	Bloque occidental sede A.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Recuperación de Instalaciones - recolección de aguas lluvia.		NO CUMPLE
		Ventanería	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Sistema de iluminación general	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de cancha occidental y pisos de patios.		CUMPLE

Tabla 12. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 91 #16A - 82	Áreas exteriores.	Mejoramiento de pasillo en L.	CUMPLE
	Cubiertas.	Cambio de Cubierta salones y área administrativa.	CUMPLE
	Pisos.	Salones	CUMPLE
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuación Cuarto de Servicio generales y Refrigerio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Iluminación	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Ventanería salones y área administrativa	CUMPLE
	Muros	Shut basuras	CUMPLE

Tabla 13. Alcance Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cr 53 #75-17	Mejoramiento cubierta aula múltiple y policarbonato en marquesina.	Cambio de cubierta aula múltiple y comedor. Cambio de cubierta de policarbonato de aula principal.	CUMPLE
		Pintura general interior - exterior. / murales.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de césped	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Carpintería metálica	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Cerramiento.		NO CUMPLE
	Canales.		NO CUMPLE
	Bajantes.		NO CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Rejilla de Cárcamo.		NO CUMPLE

Tabla 14. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 108 #21	Mantenimiento de acabados de baños.	Baterías sanitarias. Soportes en fachada y acceso a cubierta.	CUMPLE

Tabla 15. Alcance Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Av. Boyacá #64h - 39	Mejoramiento de cubiertas.	Cambio de cubierta Administrativo, Enfermería, depósito y aulas. Revisión y ajuste de desagües.	CUMPLE
	Mejoramiento de Canchas.	Demoler y construcción de cancha.	CUMPLE

Tabla 16. Alcance Institución educativa Robert F Kennedy
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 92 #86 - 18	Mejoramiento de cubiertas bloque de aulas y auditorio, incluye instalaciones eléctricas y ventilación.	Mejoramiento integral de bloque costado sur - oriental cubierta incluye cubierta, pisos, pintura, ventanería, sistema de iluminación. Demolición de mesones laboratorio. Reforzamiento de estructuras de cubierta. Ajuste de canales, mejoramiento de paredes fisuradas.	CUMPLE

Tabla 17. Alcance Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 104ª #76B-9	Mejoramiento de cubiertas.	Mejoramiento integral de bloque con teja de fibrocemento prexistente incluye Pintura general, iluminación, ventanería, pisos, cambio de cubierta.	CUMPLE
	Baterías sanitarias		NO CUMPLE
	Cafetería	Demolición y construcción de salón polivalente en estructura metálica (opcional).	CUMPLE

Tabla 18. Alcance Institución educativa Garcés Navas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 57ª #74ª-32	Mejoramiento de Áreas de Comedor.	Demolición de tarima, construcción de muros divisorios, instalación de enchape, cambio de cubierta, construcción de comedor, instalación de mesones en acero inoxidable, cuartos fríos acorde a especificaciones SED.	CUMPLE

Tabla 19. Alcance Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68G#78-20, Bogotá	Mejoramiento Piso de Cancha y demarcación	Mejoramiento Piso de Cancha y demarcación.	CUMPLE

Tabla 20. Alcance Institución educativa Juan del Corral, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.21. Colegio San José Norte

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 84 #75a-09, Bogotá	Adecuaciones generales para Bachillerato Internacional	Impermeabilización placa auditorio, cubiertas, pintura en área administrativa, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalación de gas, baterías sanitarias, estructura metálica y aulas modulares.	CUMPLE

Tabla 21. Alcance Institución educativa San José Norte.
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 66a #54-40, Bogotá	Mejoramiento acabado piso zona infantil y mejoramiento domos en vidrio	Mejoramiento acabado piso zona infantil y mejoramiento domos en vidrio	CUMPLE

Tabla 22. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede C
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 110 #71a-10, Bogotá	Cambio de cubiertas faltantes y Aulas modulares	Mejoramiento de cubierta bloque de aulas, instalación de aulas modulares, mejoramiento de cárcamo.	CUMPLE

Tabla 23. Alcance Institución educativa Villa Amalia, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28b #65-80, Bogotá	Sistema eléctrico general e impermeabilización placa tanque.	Sistema eléctrico general e impermeabilización placa tanque.	CUMPLE

Tabla 24. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede B
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.25. Colegio Torquigua, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64 #128-50, Bogotá	Adecuación cocina móvil y comedor escolar	Adecuación cocina móvil y comedor escolar	CUMPLE

Tabla 25. Alcance Institución educativa Torquigua, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl 90A # 95A-56, Bogotá	Filtros en zonas verdes y tramo de cerramiento contra impacto		CUMPLE

Tabla 26. Alcance Institución educativa Laureano Gómez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 54 #78-85	Impermeabilización Muro de Cerramiento y adecuación desagües en patio	Impermeabilización Muro de Cerramiento y adecuación desagües en patio	CUMPLE

Tabla 27. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede B
Fuente: Elaboración Propia

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022

2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión	$ 13,954,280,882.00

Tabla 28. Condiciones iniciales del contrato de obra.

2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
Modificatorio No.1 – Adición y prórroga No.1	05 DE ABRIL DE 2023
Prórroga No.1	3 MESES Y 15 DÍAS
Plazo actualizado:	15 MESES Y 15 DÍAS
Terminación en virtud de la prórroga No.1	25 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión inicial	$ 13,954,280,882.00
Adición No.1 – Incluido AIU	$ 5,370,000,000.00
Valor total de Contrato de obra Actualizado	$ 19,324,280,882.00

Tabla 29. Condiciones actualizadas del contrato de obra.

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
Nit.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo	13 MESES

Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Costo básico	$ 770,422,377.78
IVA 19%	$ 180,716,360.22
Total	$ 951,138,738.00

Tabla 30. Condiciones iniciales del contrato de interventoría.

2.2.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
NIT.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo inicial	13 MESES
Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
Modificatorio No.1 – Adición y prórroga No.1	13 DE ABRIL DE 2023
Prórroga No.1	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
Plazo actualizado:	DIECISÉIS (16) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
Terminación en virtud de la prórroga No.1	11 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Valor total inversión inicial	$ 951,138,738.00
Adición No.1	$310.122.937,00
Valor total de Contrato de interventoría actualizado	$1.261.261.675

Tabla 31. Condiciones actualizadas del contrato de interventoría.

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el desarrollo de los contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La Secretaría de educación distrital cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Nombre
Supervisor de interventoría	Arq. Luis Antonio Pinzón Parra
Líder Territorial Zona Norte	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez
Apoyo a la supervisión	Arq. Juan Carlos Valencia Gamba

Tabla 32. Personal de la secretaria de educación distrital.

2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

El contratista SAFRID INGENIERÍA SAS, cuenta con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal	1	Miguel Alexander Cerón Molina
Director de Obra	1	Luis Eduardo Montes Álvarez
Residente de obra No.1	1	Gonzalo Enrique Sarmiento
Residente de obra No.2	1	Adriana Paola Méndez Navarro
Asesor Estructural	1	Ancizar Pérez Cervera
Asesor Ambiental	1	Natalia Carranza Cepeda
Asesor en redes eléctricas	1	Juan Fredy Montañez Muñoz
Asesor en redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios	1	Omar Archila Mendoza
Profesional de Costos, presupuestos y programación.	1	Alba Rocio Ramírez
Técnico SST No.1	1	Sandra Milena Huertas Barbosa
Técnico SST No.2	1	Angy Lorena Orozco Montilla
Técnico SST No.3	1	Leda Luz Lambis Castro
Técnico SST No.4	1	Claudia Mahecha

Cargo	Cant.	Nombre
Inspector de obra No. 1	1	José David Acuña Carvajal
Inspector de obra No. 2	1	Henry Ortigoza Montealegre
Inspector de obra No. 3	1	Miller Alberto Castañeda
Inspector de obra No. 4	1	Camilo Andrés Cárdenas
Maestro de obra	1	Manuel Guillermo Marulanda

Tabla 33. Personal mínimo de Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Personal Adicional		
Asesor en Geotecnia	1	Danilo Montaña Sanabria
Asesor Hidrosanitario	1	Omar Archila Mendoza
Inspector de obra	1	Jaime Alejandro Moreno Méndez
Inspector de obra	1	Juan Diego Candela
Inspector de obra	1	Andrea Camila Dussan
Inspector de obra	1	Gibson González

Tabla 34. Personal adicional Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal Suplente	1	Antonio Rafael González Fandiño
Director de Interventoría	1	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Residente de interventoría No. 1	1	Camilo Antonio Samacá Pesca
Residente de interventoría No. 2	1	Rodolfo Castro Ortegón
Asesor estructural	1	Jairo Andrés Meza Rosas
Asesor ambiental	1	Mónica Marcela de los Ángeles Gómez

Cargo	Cant.	Nombre
Asesor eléctrico	1	Hernando Gómez Casas
Asesor hidráulico	1	Guillermo Emilio Narváez Vélez
Asesor de costos y presupuestos	1	Enrique Luis Monroy Maldonado
Abogado	1	Milena Mercedes Albornoz Villota
Inspector de interventoría No. 1	1	Edwin Núñez Amaya
Inspector de interventoría No. 2	1	Natalia Vanessa Calderón Acevedo
Maestro de obra	1	Edison Calderón Castañeda
Inspector SST No. 1	1	Yanin Nathalia Huertas Medina
Inspector SST No. 2	1	Geraldine Daniela Quevedo Garay

Tabla 35. Personal mínimo de Consorcio Intercolegios 2022.

2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Cargo	Cant.	Nombre
Coordinador de proyectos	1	Manuel Antonio González Romero
Auxiliar de Ingeniería	1	Luis Felipe Lavado Alfonso

Tabla 36. Personal adicional Consorcio Intercolegios 2022

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

SAFRID INGENIERÍA S.A.S., en su compromiso contractual debe suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra de cada sede a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de las obras; además contará con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
5	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 37. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista.

2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
4	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 38. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de la interventoría.

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO.

3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha aprobación	14-10-2022		
Número	14-44-101164899		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 3,864,856,176.40	11-01-2023	27-10-2024
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 3,864,856,176.40	11-01-2024	11-01-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.395.458.088,20	11-01-2023	26-04-2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	$966,214,044.10	11-01-2023	26-04-2024

Tabla 39. Pólizas actualizadas del contrato de obra

3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha aprobación	29/11/2022		
Número	NB-100235369		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento	$ 252.252.335,00	22/12/2022	12/11/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 63.063.083,75	22/12/2022	11/05/2027
Calidad del servicio	$ 252.252.335,00	21/01/2024	21/01/2029

Tabla 40. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se detallan las modificaciones legales del contrato de obra e interventoría.

3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA

A la fecha se realizó otrosí modificatorio No.1 adición y prórroga No.1 de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, conforme con lo expuesto por parte del contratista de obra y de acuerdo con las directrices dadas por la entidad contratante en reunión efectuada el 15 de febrero de 2023, en la cual manifestó: (i) la necesidad intervenir la infraestructura de nuevos colegios, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el talento humano y (ii) adicionar recursos que permitan el cumplimiento del objeto del contrato.

3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante modificatorio No.1 de 11 de mayo de 2023 se consideró viable adicionar recursos y prorrogar en tiempo el contrato de interventoría, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero de las ocho (8) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las diecinueve (19) iniciales, generan un nuevo universo de veintitrés (23) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, sedes descritas anteriormente.

Por lo tanto, se adiciona el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($310.122.937,00) incluido IVA.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.261.261.675) incluido IVA.

De conformidad a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, cuyo plazo de ejecución corresponde a (13) MESES, será prorrogado por tres (3) meses y veinte (20) días, más, para un total de dieciséis (16) meses y veinte (20) Días a partir de la firma del acta de inicio, es decir hasta el día 11 de mayo de 2024.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de mayo de 2023 a 10 de junio de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO.

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.


3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A continuación, se presenta el presupuesto general del contrato de obra.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.								
No.	Instituciones Educativas	Sede	Presupuesto SED	% Respecto al Presupuesto SED	Valor Actualizado Contrato de Obra	% Respecto al Presupuesto Actualizado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Francisco José de Caldas	A	$ 1.899.219.346,73	13,61%	$ 1.962.546.144,54	14,06%	25/01/2023	31/10/2023
2	Jorge Eliecer Gaitán	A	$ 1.889.077.759,47	13,54%	$ 2.024.236.834,00	14,51%	25/01/2023	31/10/2023
3	Floridablanca	A	$ 774.817.748,37	5,55%	$ 699.153.025,00	5,01%	6/02/2023	31/10/2023
4	Garcés Navas	A	$ 677.885.855,00	4,86%	$ 787.083.405,50	5,64%	1/02/2023	31/07/2023
5	Rafael Bernal Jiménez	A	$ 651.384.822,00	4,67%	$ 677.034.595,00	4,85%	7/02/2023	31/07/2023
6	Juan del Corral	A	$ 527.199.087,00	3,78%	$ 524.030.444,00	3,76%	15/02/2023	12/09/2023
7	Justo Víctor Charry	A	$ 366.048.051,00	2,62%	$ 369.424.312,00	2,65%	13/02/2023	15/07/2023
8	Miguel Antonio Caro	A	$ 258.278.741,00	1,85%	$ 75.339.260,00	0,54%	7/02/2023	15/07/2023
9	Francisco Primero	A	$ 1.042.342.004,00	7,47%	$ 1.042.342.004,90	7,47%	24/03/2023	31/10/2023
10	José Asunción Silva	B	$ 856.851.911,00	6,14%	$ 856.851.911,18	6,14%	24/03/2023	31/10/2023
11	Simón Bolívar	A	$ 749.402.904,00	5,37%	$ 749.402.904,02	5,37%	24/03/2023	31/10/2023
12	República de Colombia	C	$ 742.966.924,00	5,32%	$ 742.966.924,05	5,32%	24/03/2023	31/10/2023
13	Manuela Ayala de Gaitán	A	$ 543.797.778,00	3,90%	$ 543.797.778,83	3,90%	24/03/2023	31/10/2023
14	Nidia Quintero	B	$ 467.530.342,00	3,35%	$ 467.530.342,00	3,35%	10/05/2023	31/10/2023
15	República de Guatemala	A	$ 461.642.257,00	3,31%	$ 461.642.257,00	3,31%	10/05/2023	31/10/2023
16	República de Panamá	A	$ 440.541.748,00	3,16%	$ 440.541.748,39	3,16%	10/05/2023	31/10/2023
17	Robert F Kennedy	A	$ 376.475.297,00	2,70%	$ 376.475.297,02	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
18	Tomas Carrasquilla	B	$ 376.628.772,00	2,70%	$ 376.268.772,57	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
19	Francisco José de Caldas	B	$ 369.762.456,00	2,65%	$ 369.762.456,00	2,65%	10/05/2023	31/10/2023
20	Saldo		$ 482.427.078,43	3,46%	$ 407.850.466,00	2,92%	11/01/2023	10/01/2024

Tabla 41. Presupuesto Del Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022

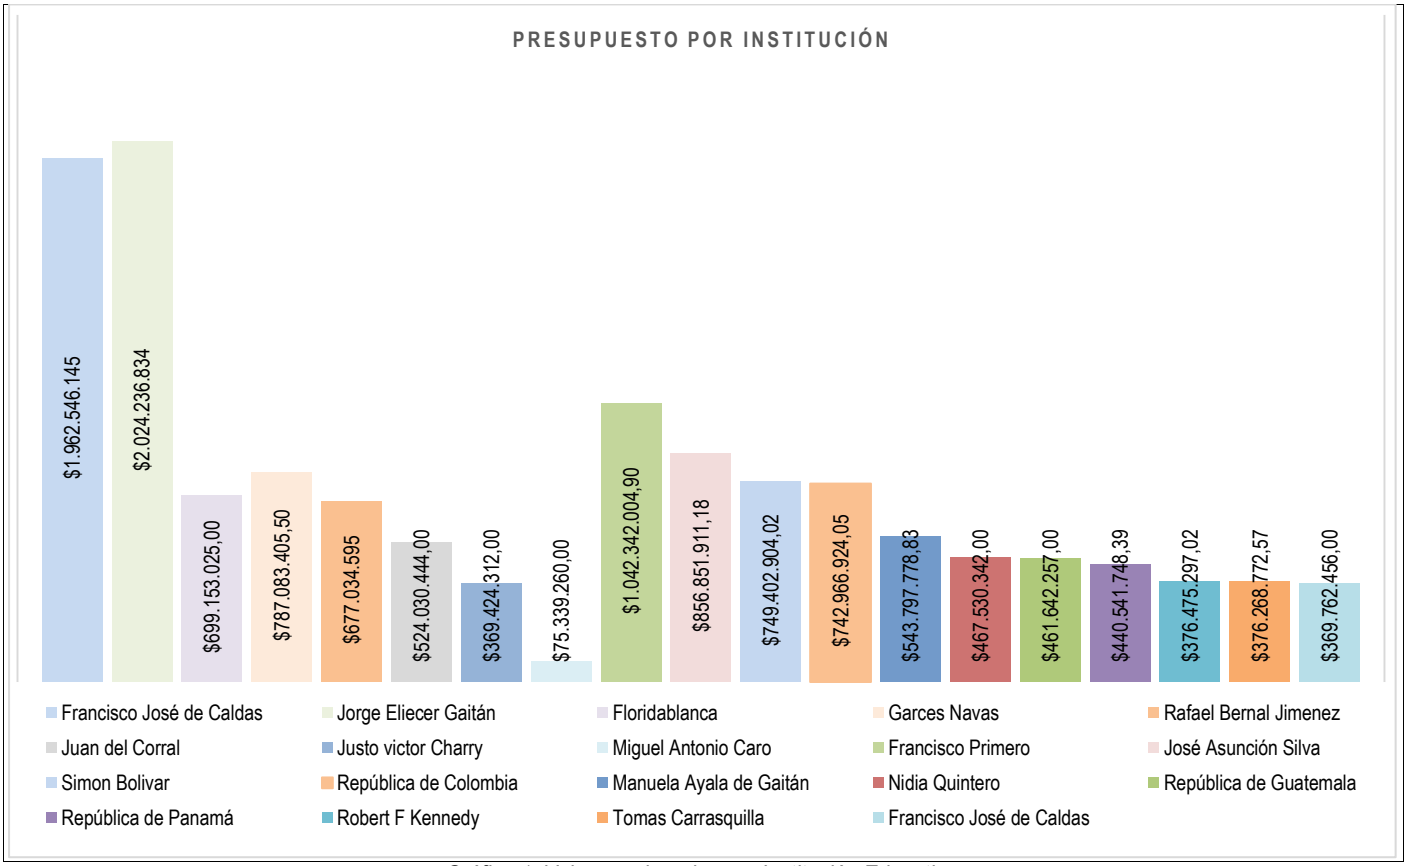

Gráfica 1. Valores asignados por Institución Educativa.

3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
1	REP. DE GUATEMALA	A	REP. DE GUATEMALA	Calle 78 Bis #68a - 45	$ 461,642,257.00

Tabla 42. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
2	NIDIA QUINTERO B	B	FLORENCIA	Dg. 74b #87-40	$ 467,530,342.00

Tabla 43. Presupuesto asignado Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
3	TOMAS CARRASQUILLA B	B	PANAMERICANA	Cl. 75A #63-55	$ 376,628,772.00

Tabla 44. Presupuesto asignado Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED – Sede B, Panamericana.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
4	MIGUEL ANTONIO CARO A	A	MIGUEL ANTONIO CARO	Tv. 94 # 81A-29	$ 258,278,741.00

Tabla 45. Presupuesto asignado Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1558,21	$ 5.217	$ 8.129.182
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	142,00	$ 35.333	$ 5.017.286
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,56	$ 66.499	$ 2.165.207
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	123,64	$ 16.774	$ 2.073.937
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,00	$ 29.021	$ 870.630
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	30,03	$ 8.863	$ 266.156
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN DE AMARRES, FIJACIÓN DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	489,21	$ 13.243	$ 6.478.608
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	45,36	$ 4.165	$ 188.924
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.189.930,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,15	$ 74.796	$ 86.015
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	105,82	$ 45.116	$ 4.774.175
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	52,91	$ 95.319	$ 5.043.328
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	24,42	$ 88.225	$ 2.154.455
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	27,95	$ 113.346	$ 3.168.021

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66,92	$ 8.654	$ 579.093
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.805.087**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	57,65	$ 73.003	$ 4.208.623
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 700.069	$ 700.069
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.908.692**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10,00	$ 114.403	$ 1.144.030
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	27,50	$ 74.888	$ 2.059.420
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	27,50	$ 38.953	$ 1.071.208
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.274.658**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	1,00	$ 29.328	$ 29.328
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	53,45	$ 15.577	$ 832.591
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 861.919**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.12	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	20,00	$ 60.265	$ 1.205.300
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.205.300**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 1.0 MM - TRASLUCIDA	M2	30,00	$ 89.966	$ 2.698.980
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	10,03	$ 64.233	$ 644.257

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	123,64	$ 63.242	$ 7.819.241
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.162.478**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1558,21	$ 7.657	$ 11.931.196
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.931.196**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**

Tabla 46. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
5	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS B	B	CIUDAD DE HONDA	Cl. 64f Bis #68g -54	$ 369,762,456.00

Tabla 47.Presupuesto asignado Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
6	REPUBLICA DE COLOMBIA	C	NUEVA ESTRADA	Cra. 68h #71A-01	$ 742,966,924.00

Tabla 48. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
7	JUAN DEL CORRAL A	A	JUAN DEL CORRAL	Cra 69B #79ª - 42	$ 527,199,087.00

Tabla 49. Presupuesto asignado Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	934,48	$ 5.217	$ 4.875.169
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	74,40	$ 30.460	$ 2.266.224
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00	$ 16.774	$ 587.090

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	771,78	$ 29.021	$ 22.397.711
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,50	$ 22.614	$ 440.973
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,23	$ 18.855	$ 494.567
1.2.44	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	60,00	$ 5.029	$ 301.740
1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	578,12	$ 7.165	$ 4.142.230
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	472,15	$ 21.075	$ 9.950.561
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	527,52	$ 20.851	$ 10.999.361
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	12,00	$ 7.945	$ 95.340
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	60,00	$ 4.165	$ 249.900
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 56.800.866**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	2250,00	$ 28.363	$ 63.816.750
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.816.750**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	35,00	$ 82.476	$ 2.886.660
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.886.660,00**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	60,00	$ 22.790	$ 1.367.400
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	578,12	$ 38.953	$ 22.519.508
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 23.886.908**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	929,06	$ 65.499,00	$ 60.852.658,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	206,51	$ 15.577,00	$ 3.216.806,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 64.069.464,00**
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,90	$ 122.378,00	$ 3.169.590,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.169.590,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 10.805,00	$ 4.604.875,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 17.655,00	$ 7.524.208,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 18.514,00	$ 4.515.379,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	750,00	$ 12.576,00	$ 9.432.000,00
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 8.182,00	$ 1.995.508,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.071.970,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	166,24	$ 46.399,00	$ 7.713.370,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	977,85	$ 57.806,00	$ 56.525.389,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	771,78	$ 180.356,00	$ 139.194.432,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	49,60	$ 95.654,00	$ 4.744.438,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	347,20	$ 96.953,00	$ 33.662.082,00
17.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES LATERALES PARA CUBIERTA UPVC, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 - DS= 1,00 - INCLUYEN PINTURAS	M	49,60	$ 146.822,00	$ 7.282.371,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	792,09	$ 34.274,00	$ 27.148.093,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 276.270.175,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,58	$ 7.657,00	$ 5.058.061,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.058.061,00**
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**21. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**

Tabla 50. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Instituto Técnico Juan del Corral, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
8	FRANCISCO I A	A	FRANCISCO I	Cra. 28 #63-64	$ 1,042,342,004.00

Tabla 51.Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
9	MANUELA AYALA DE GAITÁN A	A	MANUELA AYALA DE GAITÁN	Cra. 78 #69 A -11	$ 543,797,778.00

Tabla 52. Presupuesto asignado Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
10	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A	A	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Cra. 68f #63B-02	$ 1,899,219,346.00

Tabla 53. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	3829,12	$ 4.978,00	$ 19.061.354,00
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,70	$ 286.562,00	$ 2.492.115,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	114,58	$ 66.499,00	$ 7.619.189,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	416,77	$ 55.496,00	$ 23.128.978,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1642,96	$ 30.460,00	$ 50.044.537,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,67	$ 26.177,00	$ 2.451.869,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	493,07	$ 13.915,00	$ 6.861.063,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2313,37	$ 29.021,00	$ 67.136.189,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	139,00	$ 22.614,00	$ 3.143.346,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,00	$ 74.796,00	$ 4.936.536,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	66,00	$ 95.319,00	$ 6.291.054,00
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	83,35	$ 531.091,00	$ 44.268.386,00
2.2.18	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,70	$ 1.232.133,00	$ 10.715.368,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	790,66	$ 7.900,00	$ 6.246.233,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	9178,51	$ 9.719,00	$ 89.205.948,00
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00	$ 882.241,00	$ 3.528.964,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	159,41	$ 3.793,00	$ 604.642,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	70,00	$ 193.703,00	$ 13.559.210,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18,00	$ 294.411,00	$ 5.299.398,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	70,00	$ 51.975,00	$ 3.638.250,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	3117,04	$ 43.727,00	$ 136.298.956,00
7.2.49	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM	M	2297,47	$ 14.628,00	$ 33.607.411,00
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	2395,85	$ 71.855,00	$ 172.153.874,00
7.2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM COLOR A ELECCION	M2	364,00	$ 133.849,00	$ 48.721.036,00
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	93,67	$ 820.064,00	$ 76.811.295,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	493,07	$ 619.206,00	$ 305.311.655,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	179,00	$ 26.095,00	$ 4.671.005,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9178,51	$ 20.030,00	$ 183.845.575,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	650,00	$ 12.000,00	$ 7.800.000,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2022,60	$ 23.727,00	$ 47.990.230,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	71,94	$ 57.806,00	$ 4.158.275,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	275,00	$ 135.267,00	$ 37.198.425,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	2313,37	$ 180.356,00	$ 417.229.402,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	107,77	$ 91.273,00	$ 9.836.491,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	650,00	$ 96.953,00	$ 63.019.450,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3829,12	$ 7.657,00	$ 29.319.563,00
NP2	DESMONTE DE CABALLETE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	107,77	$ 14.526,13	$ 1.565.481,03
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CANALES, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	71,94	$ 36.500,00	$ 2.625.627,50
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**

Tabla 54. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
11	FLORIDABLANCA A	A	FLORIDABLANCA	Cra. 68f #63B-02	$ 774,817,748.00

Tabla 55.Presupuesto asignado Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FLORIDA BLANCA					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.354,00	$ 0,00
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1108,851	$ 5.217,00	$ 5.784.876,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	211,65	$ 35.333,00	$ 7.478.229,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	453,56	$ 35.555,00	$ 16.126.482,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	412,62	$ 30.460,00	$ 12.568.417,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,25	$ 24.626,00	$ 153.913,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	116,13	$ 218.577,00	$ 25.383.445,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,10	$ 13.915,00	$ 126.627,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,33	$ 29.021,00	$ 8.396.646,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00

1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	11,00	$ 5.029,00	$ 55.319,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	433,68	$ 7.165,00	$ 3.107.317,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	74,75	$ 7.945,00	$ 593.889,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 80.429.197,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	485,77	$ 108.346,00	$ 52.631.334,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	485,77	$ 95.319,00	$ 46.303.196,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	200,05	$ 122.556,00	$ 24.517.867,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	330,05	$ 8.654,00	$ 2.856.291,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 126.308.688,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1819,98	$ 6.662,00	$ 12.124.707,00
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	1819,98	$ 28.363,00	$ 51.620.093,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	589,01	$ 9.719,00	$ 5.724.588,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 69.469.388,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 195.726,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 521.131,00	$ 521.131,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	433,68	$ 42.185,00	$ 18.294.791,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	33,00	$ 165.535,00	$ 5.462.655,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	11,00	$ 22.790,00	$ 250.690,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	433,68	$ 38.953,00	$ 16.893.137,00

SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 41.422.404,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	412,62	$ 43.727,00	$ 18.042.652,00
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	719,59	$ 177.121,00	$ 127.454.678,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M	152,64	$ 52.995,00	$ 8.089.157,00
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	719,59	$ 52.022,00	$ 37.434.563,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	157,60	$ 5.595,00	$ 881.772,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	200,05	$ 82.537,00	$ 16.511.890,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 208.414.712,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	12,50	$ 354.225,00	$ 4.427.813,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	6,00	$ 252.544,00	$ 1.515.264,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.943.077,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 10.805,00	$ 6.364.253,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 20.030,00	$ 11.797.870,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	345,12	$ 30.300,00	$ 10.457.136,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	745,19	$ 23.727,00	$ 17.681.123,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 46.300.382,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.149.764,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA	M2	289,33	$ 180.356,00	$ 52.182.401,00

	DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)				
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	28,80	$ 95.654,00	$ 2.754.835,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,00	$ 96.953,00	$ 8.144.052,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.081.288,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1108,85	$ 7.657,00	$ 8.490.472,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.490.472,00**
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	412,62	$ 85.420,00	$ 35.246.034,57
NP6	DESMONTE TUBERÍA PVC	ML	433,68	$ 8.536,00	$ 3.701.892,48
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**

Tabla 56. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Florida Blanca, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
12	JORGE ELIECER GAITÁN A	A	JORGE ELIECER GAITÁN	Cra. 54 #65- 85	$ 1,889,077,759.00

Tabla 57.Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1924,15	$ 5.217,00	$ 10.038.282,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	200,00	$ 124.946,00	$ 24.989.200,00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2" H=2.2 M, (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	100,00	$ 194.702,00	$ 19.470.200,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1745,53	$ 66.499,00	$ 116.075.780,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,34	$ 58.160,00	$ 542.982,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	147,72	$ 8.856,00	$ 1.308.217,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	114,63	$ 218.577,00	$ 25.054.826,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	$ 13.915,00	$ 153.065,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,19	$ 75.460,00	$ 7.107.608,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,10	$ 26.177,00	$ 2.437.097,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,46	$ 13.915,00	$ 4.027.786,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	$ 14.791,00	$ 266.238,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	750,93	$ 29.021,00	$ 21.792.687,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	459,76	$ 22.614,00	$ 10.397.026,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	68,00	$ 8.576,00	$ 583.168,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	178,00	$ 8.863,00	$ 1.577.614,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1513,12	$ 7.165,00	$ 10.841.505,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1259,00	$ 21.075,00	$ 26.533.425,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5146,15	$ 10.552,00	$ 54.302.175,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	128,12	$ 4.165,00	$ 533.628,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 338.539.965,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	201,10	$ 74.796,00	$ 15.041.176,00
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 166.156,00	$ 16.706.653,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 181.505,00	$ 18.249.965,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	106,24	$ 601.926,00	$ 63.948.341,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	29,40	$ 202.929,00	$ 5.966.113,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	48,00	$ 471.301,00	$ 22.622.448,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	405,90	$ 7.900,00	$ 3.206.610,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	580,43	$ 8.654,00	$ 5.023.015,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 150.764.321,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	31,82	$ 115.309,00	$ 3.669.132,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.669.132,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 123.235,00	$ 1.478.820,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,00	$ 68.341,00	$ 1.845.207,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	31,00	$ 36.827,00	$ 1.141.637,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	5,00	$ 1.153.783,00	$ 5.768.915,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.234.579,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	68,00	$ 193.703,00	$ 13.171.804,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	$ 5.799.668,00	$ 34.798.008,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	68,00	$ 51.975,00	$ 3.534.300,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	178,00	$ 27.103,00	$ 4.824.334,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	1513,12	$ 38.953,00	$ 58.940.563,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 115.269.009,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	502,74	$ 43.727,00	$ 21.983.312,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	1688,51	$ 75.304,00	$ 127.151.911,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 149.135.223,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	147,72	$ 69.612,00	$ 10.283.154,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.283.154,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	289,46	$ 619.206,00	$ 179.233.140,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS (2) HOJAS Y DOS (2) CUERPOS FIJOS, MARCO EN PEINAZO CAL. 18 - HORIZONTALES EN TUBO CUADRADO DE 40 MM x 20 MM CAL.18, TABLERO TIPO PANEL, INCLUYE CERRADURA, PASADORES, FALLEBAS, PINTURA ANTICORROSIVO EN CROMATO DE ZINC Y ESMALTE TIPO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD.	M2	10,90	$ 574.844,00	$ 6.265.800,00
9.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON AISLANTE ACUSTICO	M2	82,20	$ 1.044.918,00	$ 85.892.991,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 271.391.931,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	14,00	$ 872.835,00	$ 12.219.690,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 688.692,00	$ 1.377.384,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.105.916,00	$ 2.105.916,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	10,14	$ 892.636,00	$ 9.051.329,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 24.754.319,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	55,80	$ 1.066.170,00	$ 59.495.271,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 59.495.271,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5146,15	$ 49.149,00	$ 252.928.126,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5146,15	$ 10.805,00	$ 55.604.151,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	7536,12	$ 20.030,00	$ 150.948.484,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	232,50	$ 30.300,00	$ 7.044.750,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5921,06	$ 23.727,00	$ 140.488.991,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 607.014.502,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	139,50	$ 93.091,00	$ 12.986.195,00
16.1.8	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFALTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	39,22	$ 168.035,00	$ 6.589.661,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29.725.620,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	750,93	$ 180.356,00	$ 135.434.406,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	15,32	$ 116.327,00	$ 1.782.130,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 137.216.536,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1924,15	$ 7.657,00	$ 14.733.204,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.733.204,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**

Tabla 58. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
13	JOSÉ ASUNCIÓN SILVA B	B	SIDAUTO	Cl. 91 #16A - 82	$ 856,851,911.00

Tabla 59. Presupuesto asignado Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
14	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ A	A	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cr 53 #75-17	$ 651,384,822.00

Tabla 60.Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1834,63	$ 5.217,00	$ 9.571.265,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	85,00	$ 124.946,00	$ 10.620.410,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 35.555,00	$ 568.880,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,07	$ 20.949,00	$ 1.405.049,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	539,66	$ 30.460,00	$ 16.438.044,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,09	$ 24.626,00	$ 297.728,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,77	$ 26.177,00	$ 360.457,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	99,48	$ 13.915,00	$ 1.384.264,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1121,29	$ 29.021,00	$ 32.540.957,00
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	$ 15.191,00	$ 103.299,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	35,00	$ 5.029,00	$ 176.015,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	4,00	$ 142.626,00	$ 570.504,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 74.036.872,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,80	$ 108.346,00	$ 520.061,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,08	$ 601.926,00	$ 650.080,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	18,00	$ 202.929,00	$ 3.652.722,00
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	12,00	$ 87.417,00	$ 1.049.004,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56,87	$ 106.387,00	$ 6.050.229,00
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	9,00	$ 122.556,00	$ 1.103.004,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	79,58	$ 8.654,00	$ 688.685,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.713.785,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	40,00	$ 114.906,00	$ 4.596.240,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.596.240,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	$ 98.496,00	$ 196.992,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 196.992,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	$ 70.647,00	$ 211.941,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	35,00	$ 308.542,00	$ 10.798.970,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	35,00	$ 51.975,00	$ 1.819.125,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 12.830.036,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	822,02	$ 43.727,00	$ 35.944.469,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	642,75	$ 150.374,00	$ 96.652.889,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	34,00	$ 73.121,00	$ 2.486.114,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,12	$ 105.976,00	$ 118.693,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	112,20	$ 180.761,00	$ 20.281.384,00
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	56,87	$ 116.961,00	$ 6.651.572,00
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	33,60	$ 19.403,00	$ 651.941,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 162.787.062,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	25,20	$ 69.612,00	$ 1.754.222,00
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	34,00	$ 62.105,00	$ 2.111.570,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.865.792,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,77	$ 559.540,00	$ 7.704.866,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,60	$ 631.610,00	$ 4.168.626,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO,	M	6,80	$ 928.733,00	$ 6.315.384,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
	PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	116,82	$ 619.206,00	$ 72.335.645,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 90.524.521,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO ANCHO 20 CM	M	12,00	$ 280.966,00	$ 3.371.592,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.371.592,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32,22	$ 44.672,00	$ 1.439.332,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	545,29	$ 17.655,00	$ 9.627.095,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	10,80	$ 26.095,00	$ 281.826,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	539,44	$ 18.514,00	$ 9.987.192,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	822,00	$ 12.576,00	$ 10.337.472,00
13.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	10,20	$ 30.830,00	$ 314.466,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1442,50	$ 23.727,00	$ 34.226.198,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.213.581,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.13	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3,20	$ 140.745,00	$ 450.384,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 450.384,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	49,64	$ 48.641,00	$ 2.414.539,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	77,04	$ 68.682,00	$ 5.291.261,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	66,00	$ 63.242,00	$ 4.173.972,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	776,05	$ 180.356,00	$ 139.965.274,00
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	283,50	$ 197.406,00	$ 55.964.601,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	514,08	$ 34.274,00	$ 17.619.578,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 225.429.225,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1016,78	$ 7.657,00	$ 7.785.484,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1783,87	$ 6.297,00	$ 11.233.029,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 19.018.513,00**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**

Tabla 61. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
15	JUSTO VICTOR CHARRY A	A	GARCÉS NAVAS	Cra. 108 #21	$ 366,048,051.00

Tabla 62.Presupuesto asignado Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	177,88	$ 5.217,00	$ 928.018,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,20	$ 41.408,00	$ 795.096,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,28	$ 24.626,00	$ 130.025,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	390,46	$ 8.856,00	$ 3.457.882,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,00	$ 26.177,00	$ 1.099.434,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	84,00	$ 14.791,00	$ 1.242.444,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	2259,50	$ 9.719,00	$ 21.960.041,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	60,00	$ 193.703,00	$ 11.622.180,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	100,00	$ 114.403,00	$ 11.440.300,00
5.1.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	120,00	$ 35.860,00	$ 4.303.200,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	177,88	$ 30.565,00	$ 5.437.009,00
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	390,46	$ 69.612,00	$ 27.180.454,00
9.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO FABRICADAS EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 18 CON MONTAJE FIJO Y MARCO TIPO ZAPATO DE 12CM DE ANCHO (NO INCLUYE BARRAS ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS)	M2	57,08	$ 825.461,00	$ 47.117.314,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	23,90	$ 619.206,00	$ 14.801.500,00
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	4,00	$ 1.198.611,00	$ 4.794.444,00
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	20,06	$ 664.220,00	$ 13.320.932,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32,00	$ 872.835,00	$ 27.930.720,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	10,00	$ 688.692,00	$ 6.886.920,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	34,21	$ 892.636,00	$ 30.537.078,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	52,60	$ 1.066.170,00	$ 56.080.542,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 10.805,00	$ 24.413.854,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 17.655,00	$ 39.891.402,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	177,88	$ 26.095,00	$ 4.641.870,00
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	41,05	$ 161.138,00	$ 6.615.037,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	41,05	$ 34.945,00	$ 1.434.562,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	177,88	$ 7.657,00	$ 1.362.054,00
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**

Tabla 63. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
16	ROBERT F KENNEDY A	A	ROBERT F KENNEDY	Av. Boyacá #64h - 39	$ 376,475,297.00

Tabla 64. Presupuesto asignado Institución educativa Robert F Kennedy, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
17	SIMÓN BOLÍVAR SEDE A	A	SIMÓN BOLÍVAR	Cra. 92 #86 - 18	$ 749,402,904.00

Tabla 65. Presupuesto asignado Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
18	GARCÉS NAVAS SEDE A	A	GARCÉS NAVAS	Cl. 78 #104a-2	$ 677,885,855.00

Tabla 66. Presupuesto asignado Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1868,14	$ 5.217,00	$ 9.746.105,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60,00	$ 35.333,00	$ 2.119.980,00
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	97,13	$ 18.057,00	$ 1.753.876,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,06	$ 26.177,00	$ 184.705,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,59	$ 13.915,00	$ 453.534,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1868,14	$ 29.021,00	$ 54.215.393,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1115,43	$ 22.614,00	$ 25.224.357,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	84,00	$ 5.029,00	$ 422.436,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	850,00	$ 7.165,00	$ 6.090.250,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	850,00	$ 21.075,00	$ 17.913.750,00
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	239,56	$ 119.052,00	$ 28.519.990,00
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	63,66	$ 142.626,00	$ 9.080.270,00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	1,00	$ 384.601,00	$ 384.601,00
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	450,12	$ 13.278,00	$ 5.976.693,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	143,55	$ 4.165,00	$ 597.886,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	100,00	$ 96.086,00	$ 9.608.600,00
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	35,00	$ 130.394,00	$ 4.563.790,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	375,00	$ 9.719,00	$ 3.644.625,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	84,00	$ 51.975,00	$ 4.365.900,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	84,00	$ 22.790,00	$ 1.914.360,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	850,00	$ 38.953,00	$ 33.110.050,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,06	$ 687.543,00	$ 4.851.303,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	17,00	$ 38.902,00	$ 661.334,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	375,00	$ 17.655,00	$ 6.620.625,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2110,260	$ 23.727,00	$ 50.070.139,00
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA METALICA PARA CERCHA METALICA	M	390,00	$ 29.446,00	$ 11.483.940,00
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	97,13	$ 46.399,00	$ 4.506.735,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	70,00	$ 63.242,00	$ 4.426.940,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	219,15	$ 57.806,00	$ 12.667.896,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1868,14	$ 180.356,00	$ 336.930.889,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1055,13	$ 96.953,00	$ 102.298.019,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	13,00	$ 103.890,00	$ 1.350.570,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1868,14	$ 7.657,00	$ 14.304.375,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1868,14	$ 6.297,00	$ 11.763.700,00
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE VIGA CANAL, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	219,15	$ 36.500,00	$ 7.998.792,50
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	32,59	$ 850.000,00	$ 27.704.220,00
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**

Tabla 67. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
19	REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A	A	REPÚBLICA DE PANAMÁ	Cl. 75 #55a-29	$ 440,541,748.00

Tabla 68. Presupuesto asignado Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
20	JUAN DEL CORRAL	B	JUAN DEL CORRAL	Cra. 68C#77-73, Bogotá	$

Tabla 69. Presupuesto asignado Institución educativa Juan del Corral, sede B
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.21. Colegio San José Norte, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
21	SAN JOSÉ NORTE	A	SAN JOSÉ NORTE	Cra. 84 #75a-09, Bogotá	$

Tabla 70. Presupuesto asignado Institución educativa San José Norte.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
22	JORGE ELIECER GAITÁN	C	JORGE ELIECER GAITÁN	Cl. 66a #54-40, Bogotá	$

Tabla 71. Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede C.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
23	VILLA AMALIA	A	VILLA AMALIA	Cra. 110 #71a-10, Bogotá	$

Tabla 72. Presupuesto asignado Institución educativa Villa Amalia, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
24	FRANCISCO PRIMERO	B	FRANCISCO PRIMERO	Cra. 28b #65-80, Bogotá	$

Tabla 73. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.25. Colegio Torquigua, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
25	TORQUIGUA	A	TORQUIGUA	Cl. 64 #128-50, Bogotá	$

Tabla 74. Presupuesto asignado Institución educativa Torquigua, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
26	LAUREANO GÓMEZ	A	LAUREANO GÓMEZ	Cl 90A # 95A-56, Bogotá	$

Tabla 75. Presupuesto asignado Institución educativa Laureano Gómez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
27	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	B	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cra. 54 #78-85	$


Tabla 76. Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de obra.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.		
Sub - total		$ 10.949.686.818,90
Administración obra	20,94%	$ 2.292.864.419,88
Imprevistos	1,50%	$ 164.245.302,28
Utilidad	5,00%	$ 547.484.340,95
IVA sobre utilidad	19,00%	$ 104.022.024,78
Valor total inversión		**$ 13.954.280.882,00**
Valor Adición No.1		**$ 5.370.000.000**
Valor Total de Contrato		**$ 19.324.280.882,00**

Tabla 77. Valores generales del contrato de obra.

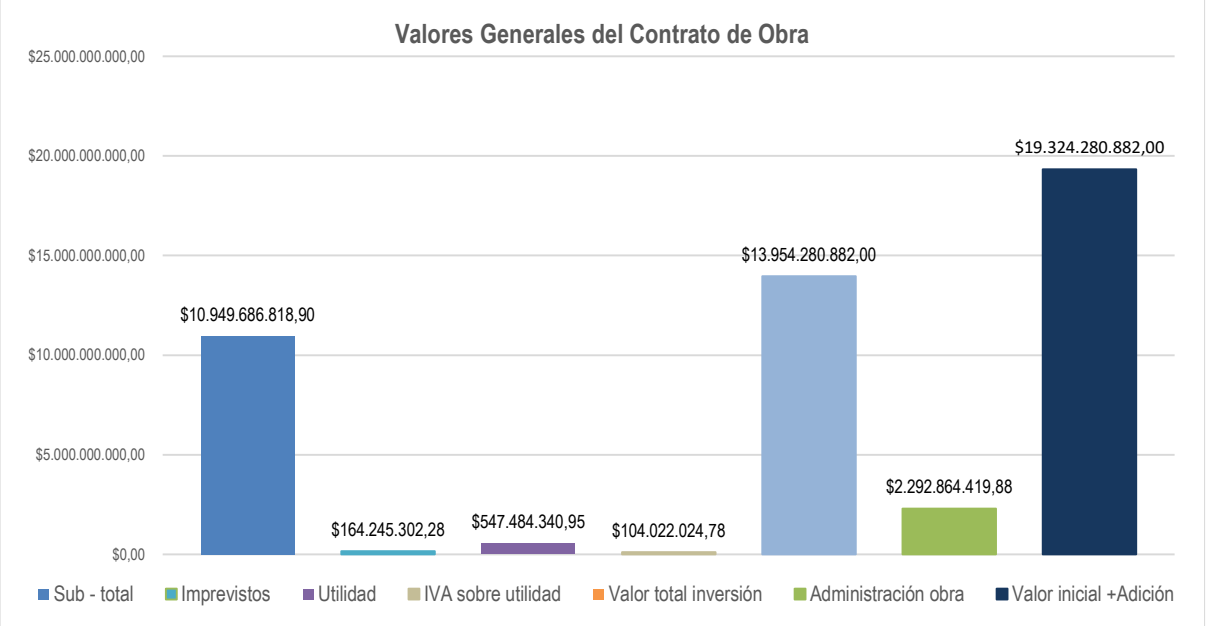

Gráfica 2. Valores generales del contrato de obra.

3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramitó el acta de recibo parcial de obra No.1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	%	Valor con AIU
Acta parcial de obra No.1	2232	47437	0.84	$ 163,188,031.00
Acta parcial de obra No.2	2232	47437	1.14	$ 220,392,311.41
Acta parcial de obra No.3	2232	47437	2.74	$ 529.663.359,00
Acta parcial de obra No.4	2232	47437	2.61	$505.076.302,00
Acta parcial de obra No. 5	2232	47437	2,47	$477.830.100,00
Acta parcial de obra No. 6	2232	47437	10,62	$2.052.048.070
Valor Total			20,43	$3.948.198.173,00

Tabla 78. Actas de recibo parcial de contrato de obra.



Gráfica 3. Actas parciales de obra.

3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.


De acuerdo con la programación adoptada por SAFRID INGENIERÍA S.A.S., la interventoría realiza seguimiento de acuerdo a las actividades ejecutadas.

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 1	11 de enero de 2023	17 de enero de 2023	0,00%	0,00%
Semana 2	18 de enero de 2023	24 de enero de 2023	0,01%	0,07%

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 3	25 de enero de 2023	31 de enero de 2023	0,11%	0,30%
Semana 4	1 de febrero de 2023	7 de febrero de 2023	0,37%	0,51%
Semana 5	8 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	0,81%	0,75%
Semana 6	15 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	1,25%	1,42%
Semana 7	22 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	1,66%	1,58%
Semana 8	1 de marzo de 2023	7 de marzo de 2023	2,14%	1,87%
Semana 9	8 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	3,12%	2,34%
Semana 10	15 de marzo de 2023	21 de marzo de 2023	4,26%	2,64%
Semana 11	22 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	5,45%	2,99%
Semana 12	29 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	6,64%	3,53%
Semana 13	5 de abril de 2023	11 de abril de 2023	8,05%	6,28%
Semana 14	12 de abril de 2023	18 de abril de 2023	9,94%	7,54%
Semana 15	19 de abril de 2023	25 de abril de 2023	11,84%	9,27%
Semana 16	26 de abril de 2023	2 de mayo de 2023	13,56%	10,34%
Semana 17	3 de mayo de 2023	9 de mayo de 2023	15,35%	11,12%
Semana 18	10 de mayo de 2023	16 de mayo de 2023	17,24%	12,46%
Semana 19	17 de mayo de 2023	23 de mayo de 2023	19,35%	13,45%
Semana 20	24 de mayo de 2023	30 de mayo de 2023	21,40%	15,27%
Semana 21	31 de mayo de 2023	6 de junio de 2023	23,40%	16,04%
Semana 22	7 de junio de 2023	13 de junio de 2023	25,34%	17,35%
Semana 23	14 de junio de 2023	20 de junio de 2023	27,19%	18,42%
Semana 24	21 de junio de 2023	27 de junio de 2023	29,28%	19,68%
Semana 25	28 de junio de 2023	04 de julio de 2023	31,63%	21,74%
Semana 26	05 de julio de 2023	11 de julio de 2023	33,93%	22,33%

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 27	12 de julio de 2023	18 de julio de 2023	36,75%	23,62%
Semana 28	19 de julio de 2023	25 de julio de 2023	39,94%	24,77%
Semana 29	26 de julio de 2023	01 de agosto de 2023	42,83%	26,92%
Semana 30	02 de agosto de 2023	08 de agosto de 2023	45,40%	27,51%
Semana 31	09 de agosto de 2023	15 de agosto de 2023	48,06%	28,77%

Tabla 79. Tabla de valores programados y ejecutados del contrato de obra.

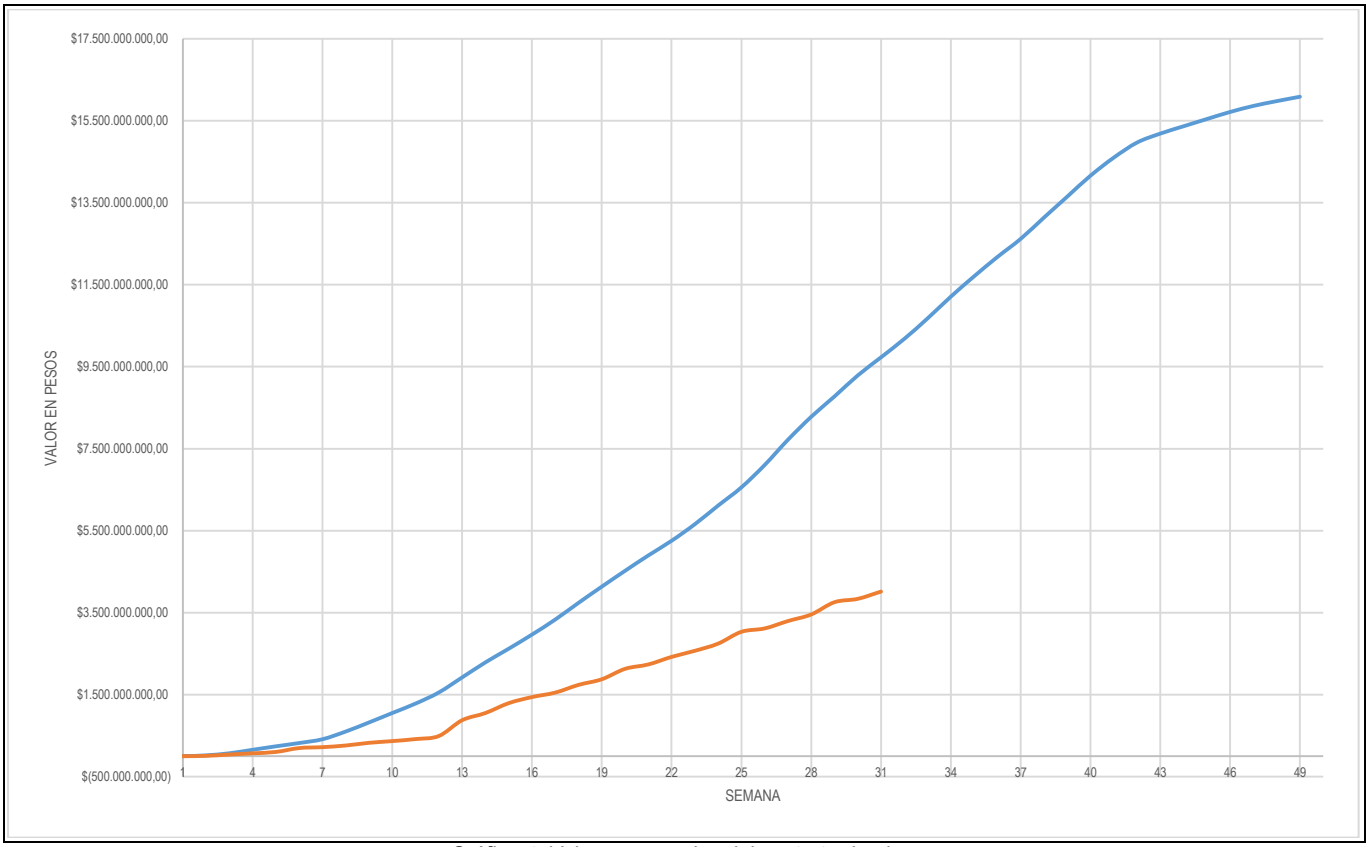

Gráfica 4. Valores generales del contrato de obra.


3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Descripción	Valor Inicial
Costo directo	$ 799.276.737,00
I.V.A. (19%)	$ 151.862.580,00
Valor inicial total inversión	**$ 951.139.317,00**
Valor adición No. 1	**$310.122.937,00**
Valor total contrato (incluye IVA)	**$1.261.261.675**

Tabla 80. Valores del contrato de interventoría.

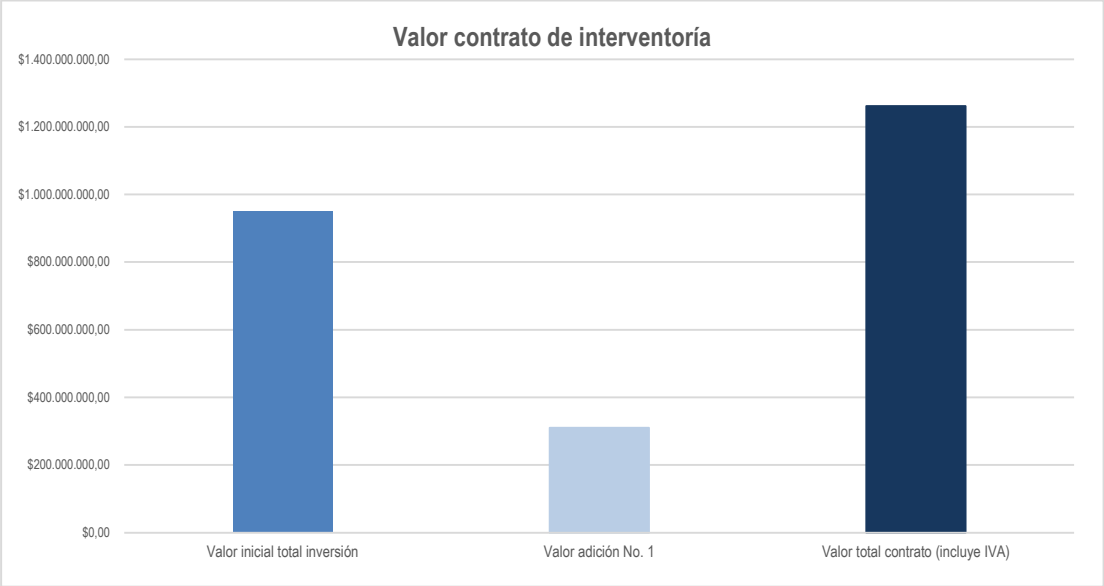


Gráfica 5. Valor del contrato de interventoría.

3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramito el acta de recibo parcial de obra No.1, 2, 3,4, 5 y 6.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	% Avance	Valor con AIU
Acta parcial de interventoría No.1	2409	5440	0.88	$ 11.128.323,00
Acta parcial de interventoría No.2	2409	5440	1.19	$ 15.027.992,00
Acta parcial de interventoría No.3	2409	5440	2.07	$ 26.061.201,00
Acta parcial de interventoría No.4	2409	5440	2.61	$ 44.418.179,00
Acta parcial de interventoría No.5	2409	5440	2.19	$ 27.631.954,00
Acta parcial de interventoría No.6	2409	5440	10.86	$136.973.018,00
Valor Total			20.71	$ 261.240.667,00

Tabla 81. Actas de recibo parcial de contrato de interventoría.

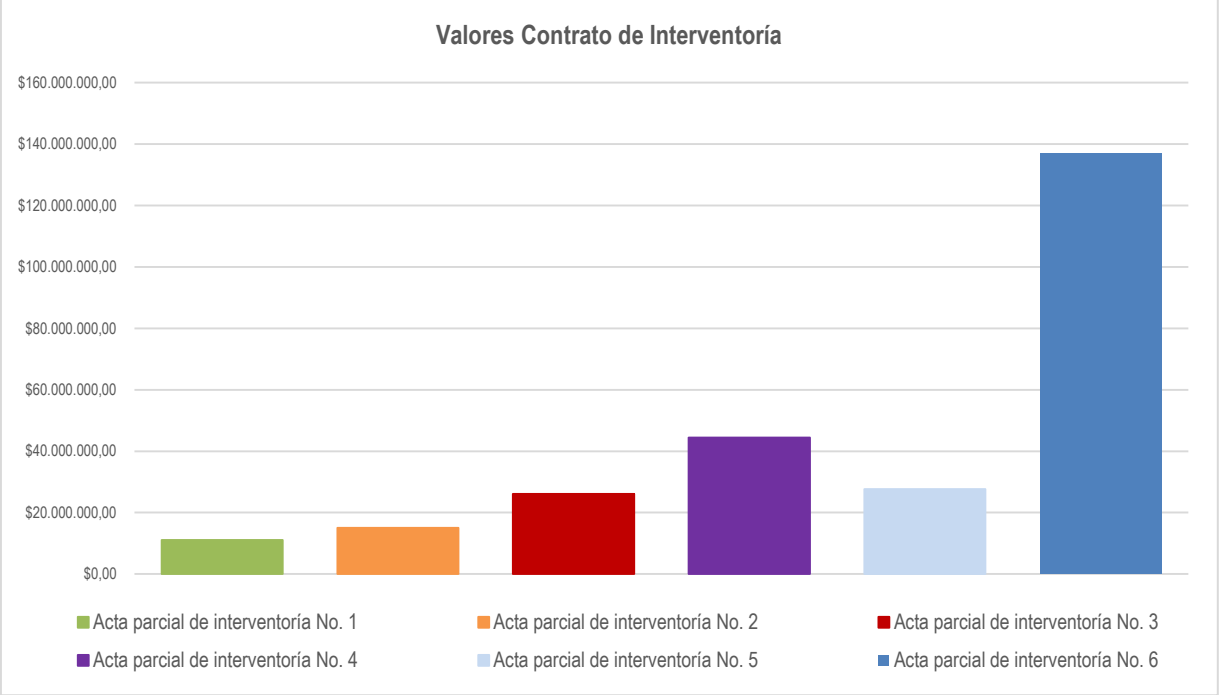

Gráfica 6. Actas parciales de interventoría.

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

En Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022, se firma acta de inicio entre Arq. Luis Antonio Pinzón Parra, director de construcción y conservación de Establecimientos educativos en calidad de Supervisor y Jorge Gómez Falla en calidad de representante legal del Consorcio Inter Colegios 2022.

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S., como Contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato de obra.

3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Obligaciones	Cumplimiento
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
1. Obligaciones previas para la suscripción del contrato	Cumplido.
2. Obligaciones relacionadas con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio generada por enfermedades contagiosas reguladas por emergencias sanitarias.	En proceso.
3. Obligaciones conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020	En proceso.
4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental	En proceso.

Obligaciones	Cumplimiento
5. Obligaciones administrativas	En proceso.
6. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra.	En proceso.
7. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.	En proceso.
8. Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar)	En proceso.
9. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	En proceso.
10. Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.	En proceso.
11. Obligaciones de información.	En proceso.
12. Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.	En proceso.
13. Obligaciones especiales.	En proceso.
14. Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación.	En proceso.
15. Obligaciones de trámites y permisos	En proceso.
16. Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.	En proceso.
17. Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista	En proceso.

Tabla 82. Control de cumplimiento del contrato de obra.

3.4.2. CORRESPONDENCIA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_039	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES CRONOGRAMA, PRESUPUESTO E INFORMES DE DIAGNÓSTICO.
CIC_BTA_SED_050_2022_040	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_041	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 023-GP2-SED-2022 "REMISION DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
CIC_BTA_SED_050_2022_043	25 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No. 1 Y 2
CIC_BTA_SED_050_2022_044	26 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACION DE LIBRO DE BITÁCORA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_045	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
CIC_BTA_SED_050_2022_046	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN RCD
CIC_BTA_SED_050_2022_047	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ADICACIÓN DE COMUNICADOS EN FÍSICO Y LINEAMIENTOS GENERALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_048	31 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_049	01 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ALCANCE COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_048 SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_050	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 034-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER GAITAN"
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. C.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_081	22 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE VISITA DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_082	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 067-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_083	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACORDE A DIRECTIRCES DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
CIC_BTA_SED_050_2022_084	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_085	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO MEMORANDO FECHAS DE RADICACION Y PROGRAMACION PAC 2023 CUENTAS DCCEE.
CIC_BTA_SED_050_2022_086	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 066-GP2-SED-2022 - ENTREGA INFORME RECOMENDACIONES JORGE ELIECER GAITAN SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_087	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 069-GP2-SED-2022 - CITACIÓN MESA DE TRABAJO.
CIC_BTA_SED_050_2022_088	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No.6
CIC_BTA_SED_050_2022_089	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 070-GP2-SED-2022 - TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_090	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 071-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN DE PERSONAL IED VICTOR CHARRY, BERNAL JIMENEZ Y JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_091	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 072-GP2-SED-2022 - PERSONAL CONTRATISTA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_092	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN DE ENTREGA DE DESGLOSE AIU Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_093	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ACTUALIZACIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_094	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 075-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO ESCALERA PARA ACCESO IED JUAN DEL CORRAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_095	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 076-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN PERSONAL

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_096	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 077-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_097	24 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORMES SEMANALES
CIC_BTA_SED_050_2022_098	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 065-GP2-SED-2022 - RADICADO – DIAGNOSTICOS ESTRUCTURALES, PLAN LOCAL, ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y MEMORIAS DE LAS CORREAS
CIC_BTA_SED_050_2022_099	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 078-GP2-SED-2022 - NO AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
CIC_BTA_SED_050_2022_100	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_101	28 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA IED RAFAEL BERNAL Y MIGUEL ANTONIO CARO
CIC_BTA_SED_050_2022_102	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD PENDIENTES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_103	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES
CIC_BTA_SED_050_2022_104	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.7
CIC_BTA_SED_050_2022_105	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 1 DE SST Y AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_106	2 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 082-GP2-SED-2022 RADICADO CÁLCULO DE PLACAS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_107	2 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 085-GP2-SED-2022 - SOLICITUD AUTORIZACION APLICACIÓN DE COLOR AMARILLO REAL ESTRUCTURA CUBIERTA
CIC_BTA_SED_050_2022_108	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 087-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_109	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DIRECTOR DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_110	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 093-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_111	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 080-GP2-SED-2022 ELEMENTOS QUE FUERON DADOS DE BAJA
CIC_BTA_SED_050_2022_112	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. OFICIO No. 090-GP2-SED-2022 CONCEPTOS GEOTÉCNICOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_113	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_078 OBSERVACIONES PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_114	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 083-GP2-SED-2022 - ENTREGA CORTE DE OBRA No. 001 CON SUS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_115	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_116	8 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 097-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE OPERADOR Y RETROEXCAVADORA SEDE FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_117	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1
CIC_BTA_SED_050_2022_118	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 094-GP2-SED-2022 - RADICADO CONCEPTOS ESTRUCTURALES #2
CIC_BTA_SED_050_2022_119	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 095-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNOSTICOS Y RECOMENDACIONES COLEGIOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_120	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.8
CIC_BTA_SED_050_2022_121	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_122	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_123	10 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S	RESPUESTA COMUNICADO No. 102-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED MIGUEL ANTONIO CARO, GARCES NAVAS Y SIMÓN BOLIVAR SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_124	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 104-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSE NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_125	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 105-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE EXCAVADORA Y OPERARIO IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_126	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_127	14 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 88-GP2-SED-2022 DISCRIMINACIÓN AIU.
CIC_BTA_SED_050_2022_128	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 89-GP2-SED-2022 AJUSTE A CALCULOS ESTRUCTURALES FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_129	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 088-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES DISCRIMINACIÓN A.I.U.
CIC_BTA_SED_050_2022_130	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 106-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST 2
CIC_BTA_SED_050_2022_131	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 113-114-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INGRESO PERSONAL Y MAQUINARIA
CIC_BTA_SED_050_2022_132	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 110-GP2-SED-2022 RADICADO CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_133	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 100-GP2-SED-2022 RADICADO ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_134	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 107-GP2-SED-2022 RADICADO FICHA TÉCNICA DE TEJA Y PERFILERÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_135	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 099-116-GP2-SED-2022 DOCUMENTACIÓN TALA ÁRBOLES COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_136	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 118-GP2-SED-2022 OPERARIO EXCAVADORA FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_137	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN HOJA DE VIDA CAMBIO ASESOR AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_138	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL 2
CIC_BTA_SED_050_2022_139	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	BALANCE GENERAL DE CONTRATO, CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FORMA DE PAGO.
CIC_BTA_SED_050_2022_140	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 115-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_141	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REPROGRAMACIÓN REUNIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO SOLICITADO POR SAFRID INGENIERÍA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_142	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 122-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_143	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	DATOS DE INGRESO AL "WEBFILE SDA" CARGUE DE RCD DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_144	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 125-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR A LA IED GARCES NAVAS Y IED SIMON BOLIVAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_145	23 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_146	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 120-GP2-SED-2022 RESPUESTA A OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_128 CÁLCULOS
CIC_BTA_SED_050_2022_147	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS EMERGENCIAS EDUCATIVAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_148	24 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
CIC_BTA_SED_050_2022_149	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.10
CIC_BTA_SED_050_2022_150	27 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_151	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 2 DE SST
CIC_BTA_SED_050_2022_152	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	RESPUESTA COMUNICADO No. 128-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJO NOCTURNO
CIC_BTA_SED_050_2022_153	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 131-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJADOR IED GARCÉS NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_154	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_155	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_156	29 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE PENDIENTES
CIC_BTA_SED_050_2022_157	29 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_158	30 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 132 Y 133-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED GARCES NAVAS Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_159	31 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CRONOGRAMA REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_160	03 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APREMIO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_161	04 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 136-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JORGE ELIECER
CIC_BTA_SED_050_2022_162	05 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD Y REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.1 Y NO. 2 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_163	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_164	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.12
CIC_BTA_SED_050_2022_165	10 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 142-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_166	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_167	11 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 144-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INFORME 2 AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_168	11 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	NO CONFORMIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_169	12 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 146-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 3
CIC_BTA_SED_050_2022_170	13 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 147-148-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_171	14 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 1 CO 4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_172	14 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	INFORME SEMANAL 13
CIC_BTA_SED_050_2022_173	18 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	NO CONFORMIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_174	19 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 154-155-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_175	19 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES INFORME 3 SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_176	20 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO DE SOLICITUD: RETIRO DE EQUIPOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_177	20 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO DE SOLICITUD: RETIRO DE EQUIPOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_178	20 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO DE DISEÑO DE VENTANERÍA EN PERFILERÍA METÁLICA EN ALUMINIO DEL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_179	20 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN HOJAS DE VIDA.
CIC_BTA_SED_050_2022_180	21 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD INVESTIGACIÓN TRABAJADOR DE LA I.E.D. GARCÉS NAVAS POR PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_181	21 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_182	23 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO HOJA DE VIDA TECNÓLOGO SST 2
CIC_BTA_SED_050_2022_183	24 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 160-161-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_184	24 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.14
CIC_BTA_SED_050_2022_185	26 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 162-GP2-SED "RESPUESTA OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_179 SUBSANE DOCUMENTACIÓN."
CIC_BTA_SED_050_2022_186	26 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_187	27 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 170-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_188	28 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 172-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_189	28 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NO.3
CIC_BTA_SED_050_2022_190	28 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_191	28 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_192	02 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 176-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_193	02 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_194	02 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.15
CIC_BTA_SED_050_2022_195	03 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.16
CIC_BTA_SED_050_2022_196	04 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	INFORME AFECTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_197	5 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 169-GP2-SED-2022"RADICADO CONCEPTO AULA MULTIPLE Y LABORATORIOS (COLEGIO SAN JOSE NORTE)"
CIC_BTA_SED_050_2022_198	5 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_199	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 183-GP2-SED-2022 NO APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_200	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD
CIC_BTA_SED_050_2022_201	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS SST
CIC_BTA_SED_050_2022_202	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 182-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN DE LA REINSTALACIÓN ENCERRAMIENTO DE POLISOMBRA PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE OBRA MIGUEL ANTONIO CARO, FRANCISCO JOSE DE CALDAS, FLORIDABLANCA SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_205	10 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	RESPUESTA A SOLICITUD ESTADO DE CERRAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES COLEGIO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_206	10 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS EMERGENCIAS EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_207	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES OBRAS REALIZADAS IED MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_208	11 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	RESPUESTA COMUNICADO No. 191-GP2-SED-2022 "RADICADO DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS"
CIC_BTA_SED_050_2022_209	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 156-GP2-SED-2022 "RADICADO CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)".
CIC_BTA_SED_050_2022_210	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 169-GP2-SED-2022 "RADICADO CONCEPTO AULA MÚLTIPLE Y LABORATORIOS (COLEGIO SAN JOSÉ NORTE)".
CIC_BTA_SED_050_2022_211	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 168-GP2-SED-2022 "RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN".
CIC_BTA_SED_050_2022_212	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 178-GP2-SED-2022 "NIVELES AULA MÚLTIPLE COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ".
CIC_BTA_SED_050_2022_213	12 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 192-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN DE TRABAJADORES PARA ACTIVIDADES EN ALTURAS EN LA IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_214	12 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_215	12 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	REQUERIMIENTO DE APUNTALAMIENTO DE COLUMNAS IED SAN JOSÉ NORTE SEDE A.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_216	15 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 193-194-196 OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL GARCÉS NAVAS Y RAFAEL BERNAL
CIC_BTA_SED_050_2022_217	15 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 181-195 AUTORIZACIÓN DE INFORME SSTA NO. 3
CIC_BTA_SED_050_2022_218	16 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 199 AUTORIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_219	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 201- 202 AUTORIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, GARCÉS NAVAS Y JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_220	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA INFORME MENSUAL SSTA No.4
CIC_BTA_SED_050_2022_221	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JOSÉ NORTE Y JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_222	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 204-GP2-SED-2022 APROBACIÓN MINI CARGADOR BOBCAT Y OPERADOR.
CIC_BTA_SED_050_2022_223	18 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA CORTE PARCIAL DE OBRA No.4
CIC_BTA_SED_050_2022_224	19 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 206-207-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL RAFAEL BERNAL SEDE B Y JORGE ELIECER GAITAN
CIC_BTA_SED_050_2022_225	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 205-208-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME SSTA 4
CIC_BTA_SED_050_2022_226	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 200-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_227	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 165-GP2-SED-2022 VALIDACIÓN DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS COLEGIOS JORGE ELIECER GAITÁN Y GARCÉS NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_228	25 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR SAFRID INGENIERÍA S.A.S.
CIC_BTA_SED_050_2022_229	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 200-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_230	30 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 216-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_231	30 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES INFORME 4 SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_232	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 219-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL
CIC_BTA_SED_050_2022_233	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.17
CIC_BTA_SED_050_2022_234	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.18

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_235	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.19
CIC_BTA_SED_050_2022_236	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.20
CIC_BTA_SED_050_2022_237	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 215-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_238	01 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 222-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_239	01 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 170-GP2-SED-2022 RADICADO MEJORAMIENTO PROYECTO ELÉCTRICO COLEGIOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, FRANCISCO PRIMERO.
CIC_BTA_SED_050_2022_240	05 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 224-225-226-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ
CIC_BTA_SED_050_2022_241	05 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 228-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE EMERGENCIA IED BOLIVIA SEDE B, IED MORISCO, IED ANTONIO NARIÑO E IED NACIONES UNIDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_242	06 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME 4 SST
CIC_BTA_SED_050_2022_243	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN AJUSTE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.1 A No.19 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_244	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 230-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_245	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 218-GP2-SED-2022 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ASBESTO – FIBRO CEMENTO, MANTO ASFÁLTICO Y DRYWALL
CIC_BTA_SED_050_2022_246	08 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD ACLARACIÓN POR QUEJA EN EL GARCÉS NAVAS Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_247	08 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 232-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_248	08 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 233-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_249	13 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 213-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIOS RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)
CIC_BTA_SED_050_2022_250	13 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 214-GP2-SED-2022 "DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS CERRAMIENTO COLEGIO BERNAL SEDE B"

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_251	11 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 240-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_252	13 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO SOLICITUD ACOPIO DE ESCOMBRO PROVENIENTE DE ÁREAS EXTERNAS AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_253	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 242-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_254	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 243-GP2-SED-2022 Y 246-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A Y JUSTO VICTOR CHARRY
CIC_BTA_SED_050_2022_255	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ESTADO DE FRENTES DE OBRA CONFORME A PROGRAMACIÓN APROBADA - SOLICITUD AVANCE DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_256	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 247-GP2-SED-2022 Y 248-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSÉ NORTE Y JUSTO VICTOR CHARRY
CIC_BTA_SED_050_2022_257	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS REDES DE CONEXIÓN
CIC_BTA_SED_050_2022_258	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 179-GP2-SED-2022, No. 186-GP2-SED-2022, No. 197-GP2-SED-2022 y No. 221-GP2-SED-2022, DEFINICIÓN DE ALCANCES Y SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES
CIC_BTA_SED_050_2022_259	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 187-GP2-SED-2022, No. 236-GP2-SED-2022 Y No. 238-GP2-SED-2022, ENTREGA DE ESPACIOS
CIC_BTA_SED_050_2022_260	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	ENTREGA INFORME SEMANAL No.21
CIC_BTA_SED_050_2022_261	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA INFORME SEMANAL No.22
CIC_BTA_SED_050_2022_262	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 229-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES PLAN DE CONTINGENCIA.
CIC_BTA_SED_050_2022_263	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUBSANACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
CIC_BTA_SED_050_2022_264	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REITERACIÓN COMUNICADO CIC-BTA-SED-050-2022-198 SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_265	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS
CIC_BTA_SED_050_2022_266	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 241-GP2-SED-2022 SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_267	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 185-GP2-SED-2022, No. 209-GP2-SED-2022 Y No. 220-GP2-SED-2022 EMITIDOS POR CONTRATISTA DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_268	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	TRASLADO COMUNICADO No. 185-GP2-SED-2022 APROBACIÓN Y AVAL DE LA PERFILERÍA METÁLICA EN ALUMINIO DEL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_269	20 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES SST Y AMBIENTAL No. 4. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_270	21 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_271	22 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 251-GP2-SED-2022 Y 255 -GP2-SED-2022 Y 254 -GP2-SED-2022 -APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A Y JUAN DEL CORRAL Y REPUBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_272	22 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA CORTE PARCIAL DE OBRA No.5
CIC_BTA_SED_050_2022_273	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_274	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_275	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 258-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_276	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN HV PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO SEGÚN ANEXO TÉCNICO.
CIC_BTA_SED_050_2022_277	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_278	26 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 260-261-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_279	26 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 262-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_280	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 266-GP2-SED-2022
CIC_BTA_SED_050_2022_281	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 252-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE, LABORATORIOS Y CUBIERTA DE AULAS COLEGIO SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_282	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ALCANCE COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_257 Y TRASLADO CORREO REMITIDO POR SED (PROTECCIÓN OTIC)
CIC_BTA_SED_050_2022_283	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE APU´S CONTRACTUALES NO OFERTADOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_284	27 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 241-GP2-SED-2022 CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_285	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_286	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ENTREGA INFORME SEMANAL No.23
CIC_BTA_SED_050_2022_287	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 253-GP2-SED-2022. INFORME 3A - RECOMENDACIONES PISO CANCHA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_288	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 244-GP2-SED-2022. INFORME 1ª- RECOMENDACIONES CAPACIDAD PORTANTE COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN – SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_289	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 232-GP2-SED-2022. INFORME 1 A- RECOMENDACIONES PAVIMENTO PARQUEADEROS COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_290	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_291	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_292	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 268-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE OPERADORES Y VOLQUETAS PARA IED FLORIDABLANCA SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_293	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 277-GP2-SED-2022 - RESPUESTA A OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_278.
CIC_BTA_SED_050_2022_294	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 280-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE CURSOS DE ALTURAS PARA EL PERSONAL DEL IED SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_295	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NÚMEROS 2 AL 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_296	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 280-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL IED BERNAL JIMÉNEZ.
CIC_BTA_SED_050_2022_297	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 264 -GP2-SED-2022 APROBACIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS CERRAMIENTO COLEGIO BERNAL SEDE B
CIC_BTA_SED_050_2022_298	04 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.23
CIC_BTA_SED_050_2022_299	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 284-GP2-SED-2022 - DISPOSICIÓN FINAL RCD.
CIC_BTA_SED_050_2022_300	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 263 -GP2-SED-2022 REFERENCIA: INFORME PROYECTO ELÉCTRICO BLOQUE COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_301	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 286-GP2-SED-2022 REFERENCIA: SOLICITUD TRABAJOS NOCTURNOS EMERGENCIA HELADIA MEJÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_302	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENVÍO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_303	5 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO DE PROFESIONALES Y REMISIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA TECNÓLOGO SST 1 E INSPECTOR 1, DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_304	6 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 287-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_305	6 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 259-GP2-SED-2022 - RESPUESTA AL OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_183
CIC_BTA_SED_050_2022_306	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 289-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y MINI CARGADOR DEL IED FLORIDABLANCA SEDE A..
CIC_BTA_SED_050_2022_307	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO COMUNICADOS No. 281-GP2-SED-2022 - No. 282-GP2-SED-2022 ENTREGA DE ESPACIOS IE FLORIDA BLANCA E IE SIMÓN BOLIVAR
CIC_BTA_SED_050_2022_308	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 267-GP2-SED-2022 – SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS REDES DE CONEXIÓN OTIC.
CIC_BTA_SED_050_2022_309	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 250 -GP2-SED-2022 - PROGRAMACIÓN DE OBRA COLEGIO SAN JOSÉ NORTE SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_310	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 288 -GP2-SED-2022 - SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA INSPECTORES DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_311	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_312	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_313	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 293-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_314	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A APROBACIÓN DE CONCEPTOS ESTRUCTURALES IED FLORIDABLANCA.
CIC_BTA_SED_050_2022_315	11 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 295-GP2-SED-2022 - CONCEPTO REVISIÓN CUBIERTA AULAS Y ZONA DE COCINA COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_316	12 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 296-GP2-SED-2022 - REMISION DE DOCUMENTOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_317	12 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 298-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO PERSONAL, VALIDACIÓN CERTIFICACIONES DE ALTURAS Y SOLDADOR I.E. BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_318	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 299-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA DEL IED FLORIDABLANCA SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_319	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 297-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_320	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 270-GP2-SED-2022 - ASUNTO: ENVIÓ LINK DRIVE DE DISEÑOS ELÉCTRICOS DE COLEGIOS JORGE ELIECER GAITÁN, GARCÉS NAVAS, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, FLORIDA BLANCA Y RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ
CIC_BTA_SED_050_2022_321	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 - AVANCE DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_322	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_323	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	MESA DE TRABAJO REVISIÓN FALENCIAS EN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_324	14 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	AJUSTE ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_325	15 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	INFORME SEMANAL 25 Y 26
CIC_BTA_SED_050_2022_326	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 303-GP2-SED-2022 Y 304-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_327	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIOS No. 305-GP2-SED-2022 Y 306-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_328	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 307-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_329	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN ENVÍO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_330	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NÚMERO 4 Y 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_331	18 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST.
CIC_BTA_SED_050_2022_332	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 285-GP2-SED-2022 CONCEPTO REVISIÓN AULAS (COLEGIO DISTRITAL SIMON BOLÍVAR)
CIC_BTA_SED_050_2022_333	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 308-GP2-SED-2022. DISEÑO AULAS MODULARES COLEGIO SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_334	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 310-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_335	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 312-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A Y JUAN DEL CORRAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_336	21 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 313-GP2-SED-2022-REMISION DE DOCUMENTOS PARA INGRESO A IED SAN JOSE NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_337	21 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUBSANACION OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_338	25 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 314-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NUMEROS 2 AL 5

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_339	25 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REUNIÓN CON PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA SED PARA CARGUE DE INFORMES RCD.
CIC_BTA_SED_050_2022_340	25 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES - AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_341	26 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. RAFAEL JIMÉNEZ SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_342	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_343	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 27 Y 28
CIC_BTA_SED_050_2022_344	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_345	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_346	01 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 29
CIC_BTA_SED_050_2022_347	27 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 320-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DE LOS IED SAN JOSE NORTE, IED JUSTO VICTOR CHARRY PERSONAL ROTATIVO EN EL IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_348	31 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO
CIC_BTA_SED_050_2022_349	31 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ SE SEGUIMIENTO DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_350	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORMES AMBIENTALES NUMERO 4 Y 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_351	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORME SST NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_352	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 6.
CIC_BTA_SED_050_2022_353	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NUMERO 6.
CIC_BTA_SED_050_2022_354	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADO No, 323-GP2-SED-2023 CON ASUNTO "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y TRÁNSITO VEHICULAR POR ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA LA SALIDA DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE ESCOMBRO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL SIMON BOLÍVAR SEDE A".
CIC_BTA_SED_050_2022_355	05 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No 321--GP2-SED-2023, CON ASUNTO " NOTIFICACIÓN DE OCUPACIÓN DE ÁREA DE SALÓN INTERVENIDO EN LA EMERGENCIA DEL I.E.D. HELADIA MEJIA.
CIC_BTA_SED_050_2022_356	08 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE OBRA FRENTES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_357	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO.
CIC_BTA_SED_050_2022_358	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 329-GP2-SED-2022 - CONCEPTO CUBIERTA AULA Y ZONA DE COCINA COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_359	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 332-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL IED GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_360	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD INFORME DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTE ESTUDIANTE I.E.D. RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_361	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 325-GP2-SED-2022 - CAMBIO DE COORDINADOR COMPONENTE SST
CIC_BTA_SED_050_2022_362	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 326-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_341
CIC_BTA_SED_050_2022_363	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 327-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_340
CIC_BTA_SED_050_2022_364	10 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	TRASLADO SOLICITUD DE DISEÑO DEL ÁREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA I.E.D REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_365	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES PROGRAMACIONES DE OBRA COLEGIOS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642

Tabla 83. Control correspondencia.

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Las actividades adelantadas por parte de Contratista de obra en el periodo de 11 de julio a 10 de agosto de 2023, se enfocaron en labores de orden administrativo y técnico como se presenta a continuación:

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023)

3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023)

3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023)


3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta existente, desmonte de canaleta metálica troquelada, diagnóstico y mantenimiento menor de cubierta, limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, relleno en recebo común compactado.
- Concretos: Placa de contrapiso de 10 cm – concreto de 3000 PSI.
- Elementos en concreto: Cuneta trapezoidal 3000 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación de malla electro soldada 6 mm.
- Redes de alcantarillado: suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4".
- Cajas y pozos de inspección: Caja de inspección 80 x 80.
- Otras instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio: Suministro y aplicación de pintura para tubería Red AN – ALL – re ventilación 3” a 6”, sondeo y revisión de desagües.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada, suministro e instalación de bala led de 18 W, suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1#10T.
- Alistado de piso: Concreto de limpieza, mediacaña en mortero.
- Acabado de piso: Suministro e instalación de bordillo prefabricado, afinado de piso en mortero impermeabilizado.
- Obras exteriores: reparación y adecuación de cunetas existentes.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja en fibrocemento, suministro e instalación de teja termo acústica, sei de viga canal galvanizada.
- Aseo y disposición final: Aseo general final y limpieza, embalaje de teja en asbesto cemento.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Miguel Antonio Caro		07/02/2023	15/07/2023	100,00%	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	07/02/2023	02/05/2023	30,10%	30,10%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta,	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						desmonte de canaleta metálica, diagnóstico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	22,90%	22,90%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	9,07%	9,07%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	08/06/2023	4,61%	4,61%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	4,56%	4,56%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabilizado.
16	Obras exteriores	11/04/2023	09/05/2023	1,38%	1,38%	Reparación y adecuación de cunetas existentes
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	19,53%	19,53%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.
20	Aseo y disposición final	07/03/2023	12/07/2023	7,85%	7,85%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento

Tabla 84. Avance de obra Miguel Antonio Caro.

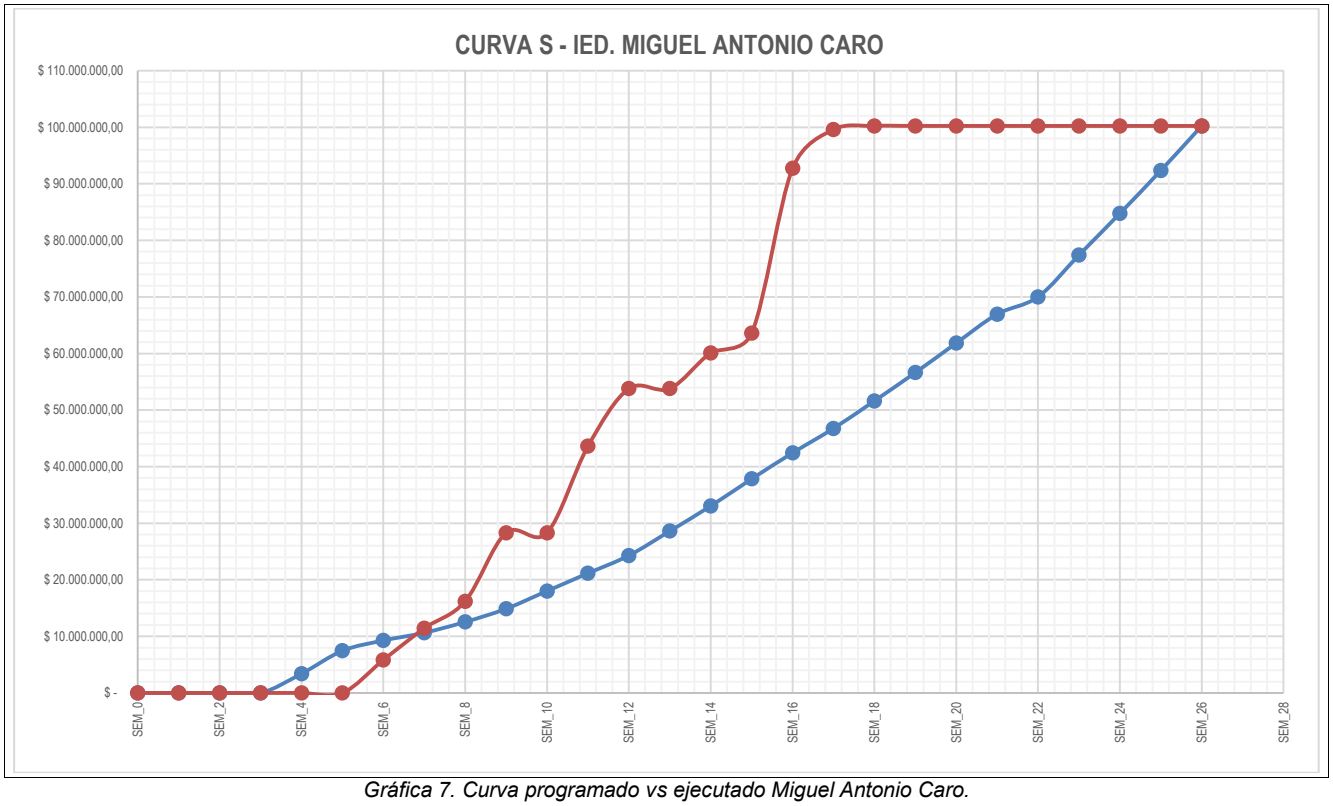

Gráfica 7. Curva programado vs ejecutado Miguel Antonio Caro.

3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023)

3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 10 de mayo de 2023)

3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de alistado de piso, desmonte de ventanas, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de red eléctrica, desmonte de alambrón 8 mm, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de cubierta termo acústica o tipo sándwich.
- Varios: Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, trasiego carretilla para proyectos especiales, limpieza de canales y bajantes.
- Estructura: Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, escalera maciza en concreto 3000 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 PSI.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4, mampostería estructural E=0.12 M, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista.
- Elementos estructurales: Anclajes de varillas 3/8”.
- Instalaciones sanitarias: Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado de 4”, PVCS 4”, PVCS 3”, PVCS 2”.
- Otras: Suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4”.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia LED, suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de Kit de guayas para panel LED, reinstalación de lámparas existentes.
- Sistema de detección de incendio y red contra incendio: suministro e instalación de soporte abrazadera de 1 a 1 – ½” S/placa.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero impermeabilizado, mediacaña en mortero.
- Mampostería seca: suministro e instalación de muro en Dry Wall de 12 mm.
- Aparato sanitarios y accesorios: Sum e insta de rejilla con sosco de 4” a 3”.

- Pañete y estuco en muros: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placas: Vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos, pintura tipo Korasa o similar para fachada, pintura en esmalte.
- Pintura sobre metal: Esmalte sobre puertas y marcos metálicos, esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, flanche lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 80 cm, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.
- Aseo y disposición final: Protección provisional de elementos y superficies existentes, disposición final de teja en asbesto.
- No previstos: Desmonte de flanche, suministro e instalación de membrana impermeabilizante Poliurea de alto desempeño E=2mm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Instituto técnico Juan del Corral		15/02/2023	12/09/2023	86,64%	51,68%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	34,96%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	23,84%	6,11%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, demolición de alistado y acabado de piso, desmonte retiro de tuberías, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica EMT, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de cubierta termo acústica, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, trasiego carretilla.	
3	Mampostería	03/07/2023	31/07/2023	12,18%	6,30%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	04/05/2023	0,55%	0,74%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", suministro e instalación de accesorios PCV-S 4", suministro e instalación de tubería PVCS 3" y 2", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	4,56%	0,28%	Suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de kit de guayas para panel LED, reinstalación de lámparas existentes.	
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	12,23%	5,09%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero	
8	Mampostería seca	17/05/2023	02/06/2023	0,60%	0,05%	Suministro e instalación de muro en Dry wall de 12 mm.	
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	5,36%	6,40%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos., pintura tipo korasa a 2 manos, esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	26,36%	3,04%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio,	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	08/08/2023	0,97%	1,83%	Protección provisional de elementos y superficies existentes.
NP	Actividades no previstas			0,00%	21,87%	Desmonte de flanche

Tabla 85. Avance de obra Instituto técnico Juan del Corral

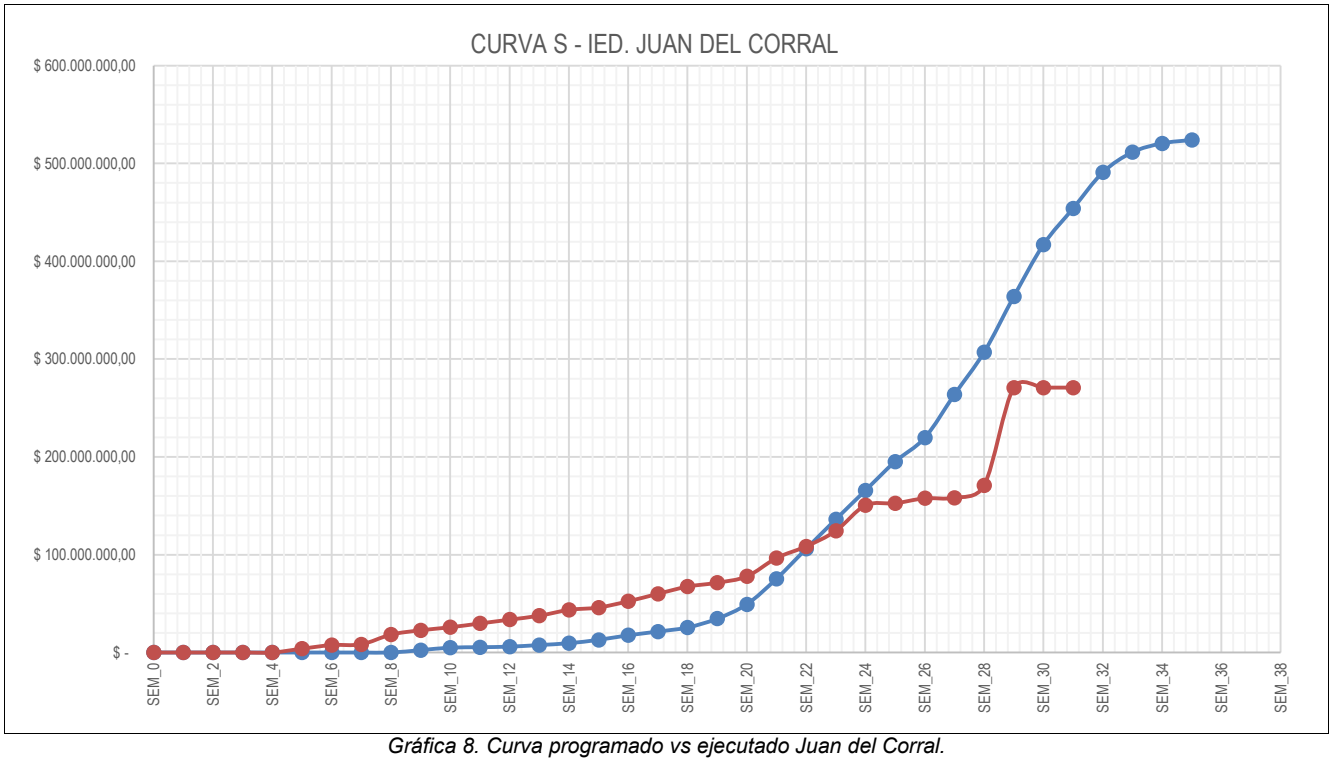

Gráfica 8. Curva programado vs ejecutado Juan del Corral.

3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 10 de mayo de 2023)

3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 10 de mayo de 2023)

3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.

- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muro y pega, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso y limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado y recebo común compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12x 20 cm en concreto de 3000 PSI, placa contrapiso de 10 cm, recalce de escaleras espesor promedio 0.07 m, concreto 3500 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro de malla electro soldada 6mm y suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros.
- Elementos estructurales: Anclajes varilla 3/8”.
- Redes de alcantarillado: Suministro e instalación de tubería Novafort de 8”
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVC-S 2”, suministro e instalación de tubería PVC-S 4”.
- Puntos sanitarios de agua frio y agua caliente: Suministro e instalación punto de agua fria lavamanos ½”, suministro e instalación punto sanitario 2” y 4”.
- Registros, cheques y válvulas: Suministro e instalación registro válvula de bola ½”.
- Cajas y pozos de inspección: Caja de inspección de 1.00 x 1.00, limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700, sondeo y revisión de desagües.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado para escalera en mortero.
- Instalaciones eléctricas: suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal, tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15cm, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de ¾”, suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED circular de 18W 8”.
- Acabados de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación piso cerámica antideslizante, tipo Mikonos o similares formato 33 x 33, suministro y aplicación de sellador elástico, para


sello de juntas a nivel de piso, suministro e instalación de guara escoba en porcelanato de 8 a 10 cm de alto.

- Mampostería seca: Suministro e instalación de muro en Dry Wall de 12 mm visto una cara.
- Carpintería metálica en aluminio: suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco en lamina calibre 18 entamborada con refuerzo interno, marco de puertas, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, incluye vidrio 4mm incoloro, suministro e instalación de ventana en lámina Coldrolled calibre 18 terminada con anticorrosivo.
- Pañete y pintura: Pañete muro 1:4 incluye filos y dilataciones, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placa: Vinilo tipo 1 a tres manos.
- Cubierta e impermeabilizaciones: Suministro e instalación de cubierta en teja traslucida opal PC 37, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfaltico con foil de aluminio.
- Aseo y disposición final: Embalaje de teja de asbesto cemento con vinipel, disposición final de teja de asbesto.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IT Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	85,74%	51,16%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 34,58%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	20,98%	5,68%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza, demolición de alistado y acabado de pisos, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muros, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas, desmonte de ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte y regatas en concreto, corte en concreto con pulidora, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	04/03/2023	23/09/2023	2,74%	11,53%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado, relleno en recebo común compactado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm y 15 cm, recalce de escaleras, suministro e instalación de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada.
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	4,55%	0,15%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	0,11%	0,66%	Tubería PVC U.M Ext corrugado/int liso, suministro e instalación de tubería PVCS 4", tubería PVCS 2", sifón de piso 2", tubería PVCP RDE 9 de 1/2" suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2", punto agua fría lavamanos 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación registro válvula de bola 1/2", caja de inspección 1.00x1.00, limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	0,40%	3,55%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15CM, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4", suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación panel LED circular de 18 W 8".
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	12,66%	3,69%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante tipo Mikonos, suministro y aplicación de sellador elástico, suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato.
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	18,17%	6,71%	Suministro e instalación de ventana metálica en lámina coldrolled calibre 18, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco, marco de puertas.
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	6,22%	5,21%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
16	Obras exteriores	01/09/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	19,16%	0,53%	Suministro e instalación de teja traslucida, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	0,57%	1,73%	Aseo general, disposición y embalaje de teja en asbesto cemento
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	02/09/2023	0,17%	11,72%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato

Tabla 86. Avance de obra Francisco José de Caldas, Sede A

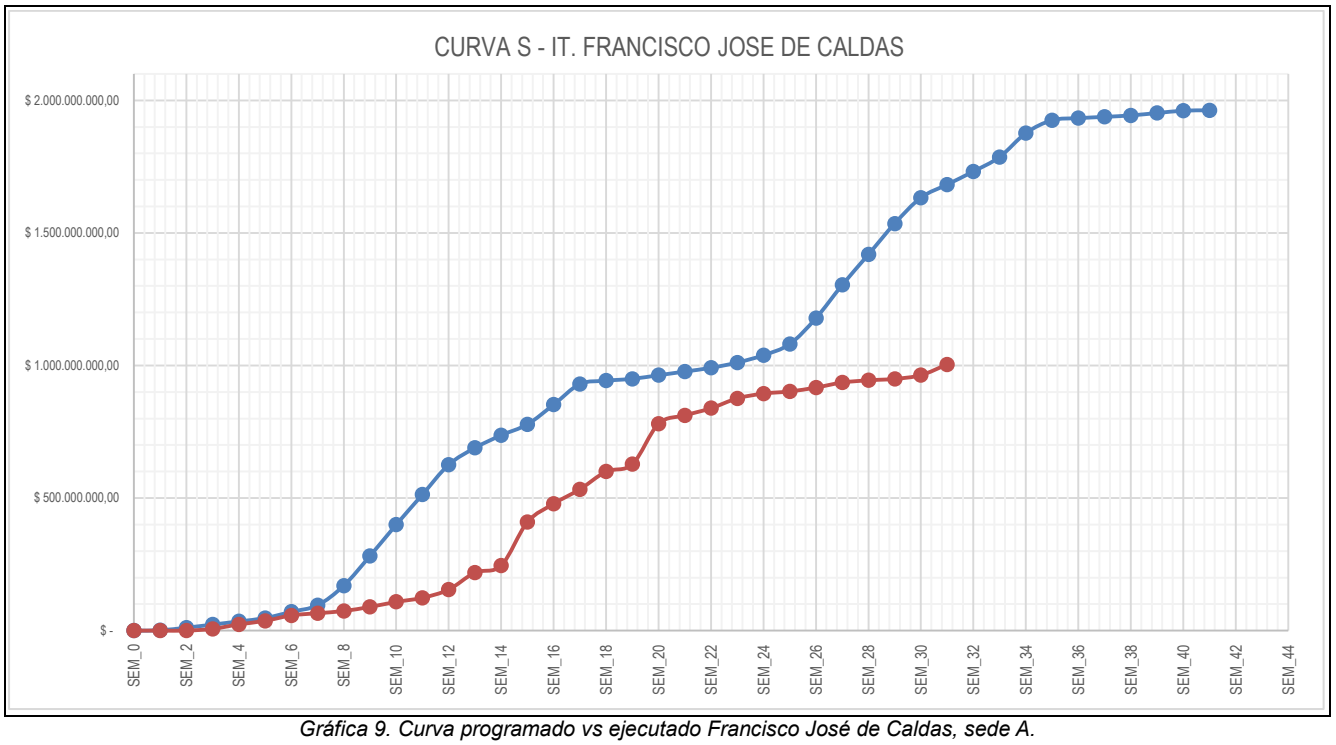

Gráfica 9. Curva programado vs ejecutado Francisco José de Caldas, sede A.

3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y localización y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de placa maciza, demolición de pavimento asfáltico, desmonte de canecas, desmonte de lámparas, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica, mantenimiento tapas y marcos para cajas de inspección, limpieza y mantenimiento a cárcamo.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común y recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-200, base granular clase C (BG_C).
- Concretos: Concreto corriente en grava común 3000 PSI.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro ladrillo prensado macizo.
- Redes de alcantarillado: Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6”.
- Cajas y pozos de inspección: Limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación geotextil tejido 2400.

- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de tubería PVC Conduit 3".
- Alistado de pisos: Concreto de limpieza de 2000 PSI, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado.
- Acabado de pisos: Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80.
- Carpintería metálica: Cerramiento contra impacto H=5,00 m.
- No previstos: Mejoramiento material granular existente con adición de cemento, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Floridablanca, sede A		06/02/2023	31/10/2023	48,25%	45,39%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 2,86%
1	Preliminares	06/02/2023	17/07/2023	6,15%	9,28%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza h=0.10m y h=0.15m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pavimento asfáltico, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte canecas de basura, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica PVC, mantenimiento tapas y marcos, limpieza y mantenimiento a cárcamos.
2	Estructura	06/03/2023	13/05/2023	18,07%	10,58%	Excavación manual en material común y recebo compactado, excavación mecánica, suministro e instalación de subbase granular B-400, base granular clase C, concreto corriente en grava común, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación malla electro soldada 6 mm, suministro e instalación de estructura metálica
3	Mampostería	08/05/2023	31/10/2023	5,56%	0,19%	Muro ladrillo prensado macizo
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	08/05/2023	0,03%	0,95%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6", limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección, suministro e instalación de geotextil tejido 2400 y 1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	08/05/2023	08/09/2023	4,65%	0,37%	Suministro e instalación de tubería PVC Conduit 3"
7	Pisos	06/09/2023	30/10/2023	0,00%	1,81%	Concreto de limpieza, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado, suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80.
9	Carpintería metálica	06/09/2023	30/10/2023	0,00%	0,80%	Cerramiento contra impacto H=5,00m
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	6,62%	0,00%	
16	Obras exteriores	06/03/2023	29/06/2023	1,45%	0,58%	Cancha múltiple baloncesto - microfútbol, voleibol.
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	3,58%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	0,64%	2,35%	Aseo general final y limpieza, embalaje y disposición final de teja en asbesto cemento con vinipel.
NP	Actividades no previstas	18/07/2023	24/10/2023	1,51%	18,49%	Mejoramiento material granular existente con adición de cemento (incluye extendido, nivelación,

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						humedecimiento y compactación con vibro compactado), suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.

Tabla 87. Avance de obra Colegio Floridablanca

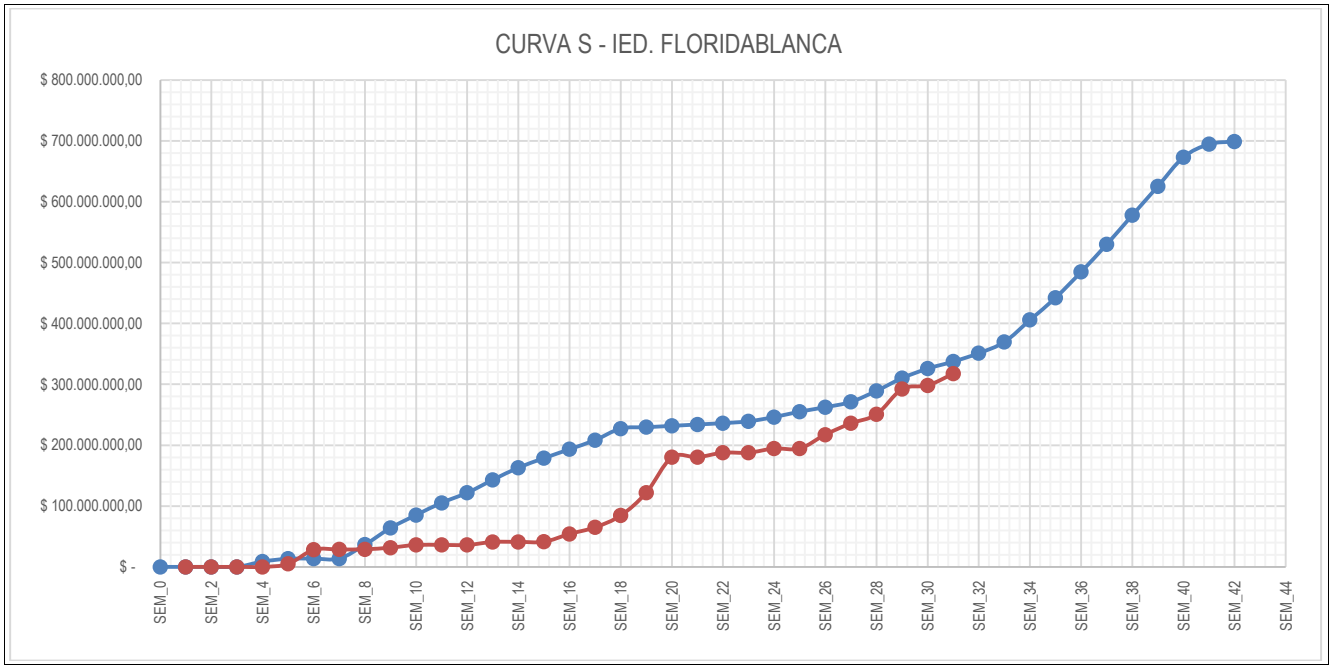

Gráfica 10. Curva programado vs ejecutado Floridablanca.

3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición de estructuras en concreto, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete y enchape de muros, demolición de pavimento asfáltico, demolición de encorozado, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de baranda metálica, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de cancha múltiple, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería, limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI, zapata en concreto, sum e inst de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, columnetas y viguetas en


concreto de 3000 PSI, placa de contrapiso de 10 cm, pedestales en concreto, cuneta trapezoidal.

- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5.
- Elementos estructurales y no estructurales: Anclajes para varilla 3/8" L=0.25m, anclaje para sujeción de elementos en concreto y epóxico para ½" – 10 cm.
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2".
- Red de agua fría: Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2", Suministro e instalación de tubería PCVP RDE 9 de ½".
- Puntos sanitarios de agua fría y agua caliente: Punto de agua fría sanitario lavamanos ½".
- Redes de drenaje de aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera.
- Acabados de pisos: Suministro e instalación piso en cerámica antideslizante tipo Mikonos, suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato.
- Carpintería metálica: Suministro e instalación de ventanas en aluminio tipo persiana.
- Pañete y pintura: Pañete en muro 1:4 incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placa: Vinito tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores.
- Cielos rasos: cielo raso blanco PVC sistema 200GS.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof, flanche en lámina galvanizada calibre 20.
- Aseo y disposición final: Emabalaje y disposición final de teja en asbesto cemento.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A		25/01/2023	31/10/2023	73,01%	53,43%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	19,58%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	21,85%	5,18%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de pisos, muros en mampostería, pañete de muros, enchape de muros, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, cubierta, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto y picado de muros en mampostería, limpieza de canales y bajantes.	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	3,54%	10,43%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, concreto corriente grava común 3000 PSI, columnetas y viguetas en concreto, placa de contrapiso de 10cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica.
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	0,00%	0,20%	Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5, anclajes de varillas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	02/08/2023	24/08/2023	0,25%	0,60%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", PVCP RDE 11 de 3/4", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario tanque 1/2", punto de agua frio lavamanos 1/2" y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	5,69%	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	5,77%	1,81%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, mediacaña en granito H=0.10m, suministro e instalación guarda escoba en media caña granito pulido, paso para escalera en gravilla lavada mona, piso cerámica antideslizante tipo Mikonos, win de aluminio, suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato.
8	Mampostería	25/07/2023	04/08/2023	0,51%	0,00%	
9	Carpintería metálica	05/08/2023	02/09/2023	3,75%	6,82%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, incluye vidrio de 4mm con película de seguridad
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	06/09/2023	0,00%	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	07/09/2023	23/09/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	05/04/2023	06/11/2023	19,13%	4,52%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores.
16	Obras exteriores	05/07/2023	19/09/2023	0,69%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	11,82%	0,45%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,25, canal de alta capacidad, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	0,00%	1,67%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades No previstas			0,00%	21,76%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche

Tabla 88. Avance de obra Colegio Jorge Eliecer Gaitán

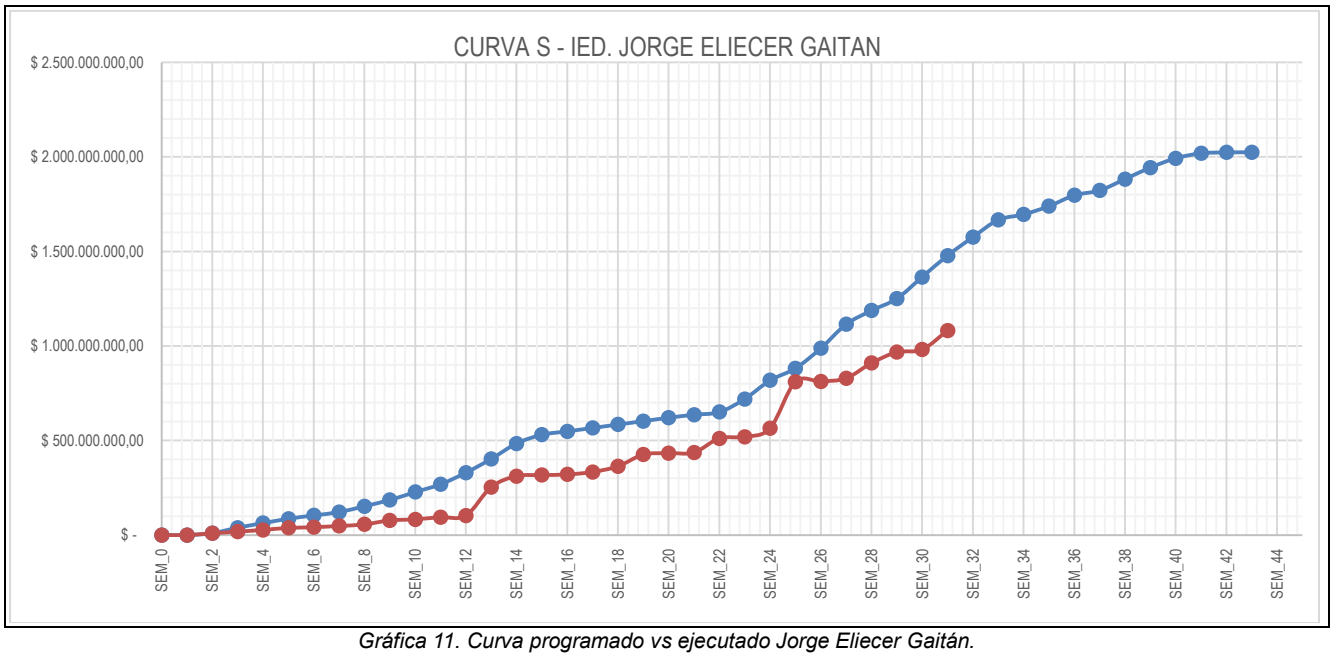

Gráfica 11. Curva programado vs ejecutado Jorge Eliecer Gaitán.

3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 10 de mayo de 2023).

3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en teja de zinc, cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, desmonte de puertas y ventanas, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora espesor de 3mm, limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, relleno con material seleccionado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI, placa contra piso 10 cm.
- Refuerzos: Suministro e instalación de malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro traba normal en ladrillo prensado liviano 24 x 12 x 6 acabado a la vista.
- Elementos estructurales: Anclajes varilla 3/8” L=0.25 m, dovelas mampostería estructural.

- Redes hidrosanitarias: Suministro e instalación de tubería PVCS 2”, suministro e instalación de sifón de piso 2”, suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½”.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero.
- Acabados de pisos: Suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso.
- Mampostería seca: Muro en superboard de 8mm, incluye estructura metálica.
- Pintura: Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Instalación de lámina de policarbonato.
- Orden y aseo: Aseo general y limpieza, embalaje y disposición final de teja en asbesto.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A		07/02/2023	31/07/2023	100,00%	55,23%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 44,77%
1	Preliminares	07/02/2023	17/05/2023	13,10%	8,19%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición placa maciza h=0.10m, demolición de alistado de piso, demolición de acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora y limpieza de canales.
2	Estructura	23/02/2023	05/05/2023	2,03%	11,37%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.
3	Mampostería	01/05/2023	17/05/2023	0,68%	0,07%	Muro traba normal en ladrillo prensado liviano, anclajes varilla 3/8" L=0.25m.
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	09/03/2023	11/03/2023	0,03%	0,14%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	1,37%	0,00%	
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	22,84%	3,38%	Alistado de piso en mortero, suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso.
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	0,57%	0,81%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica
9	Carpintería metálica	06/05/2023	21/06/2023	13,37%	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	04/07/2023	08/07/2023	0,50%	0,00%	
13	Pañete y pintura	01/04/2023	25/07/2023	9,48%	4,00%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
16	Obras exteriores	04/03/2023	08/03/2023	0,07%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	08/07/2023	33,30%	9,63%	Instalación de lámina de policarbonato
20	Aseo y disposición final	05/04/2023	29/07/2023	2,67%	4,74%	Aseo general y limpieza, disposición final teja en asbesto cemento.
NP	Actividades no previstas			0,00%	12,91%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

Tabla 89. Avance de obra Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A.

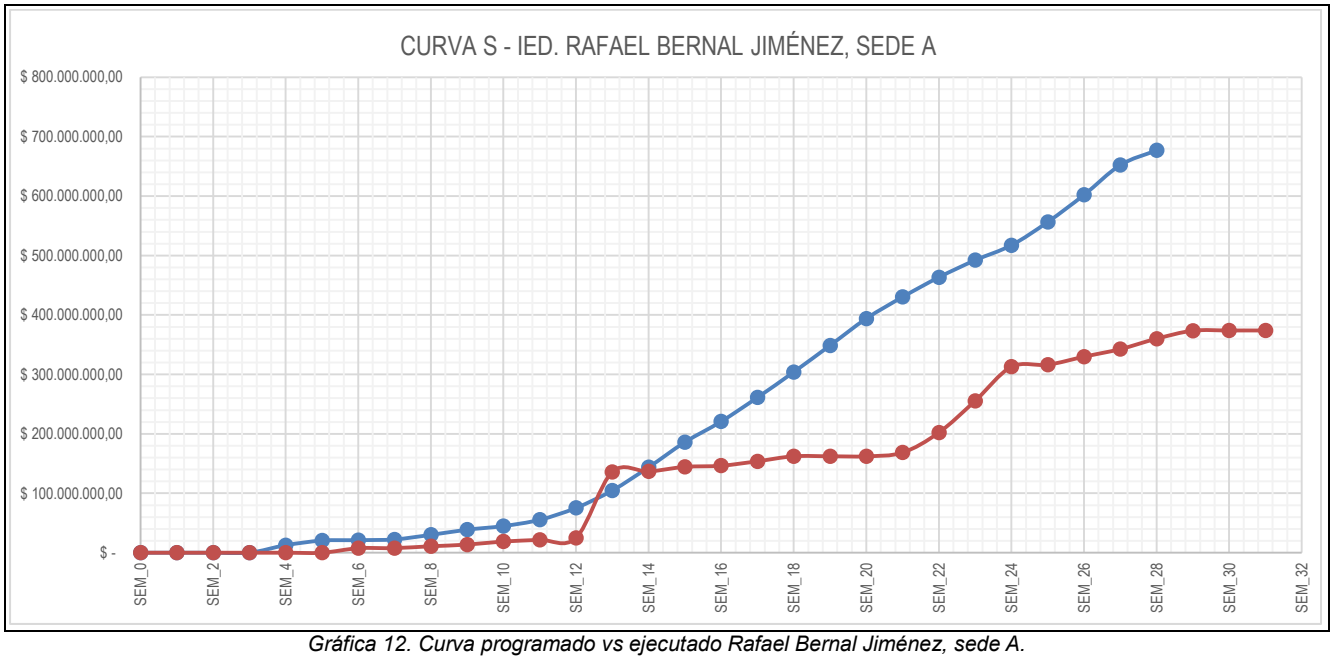

Gráfica 12. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez, sede A.

3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4.
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVC-S 4”, suministro e instalación de tubería PVC-S 2”.

- Red de agua fría: Suministro e instalación de tubería PVCP RDE 21 de 2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 21 de 1-1/2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 11 de 3/4", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½.
- Puntos sanitarios de agua fría y agua caliente: Suministro e instalación punto agua fría sanitario ½", suministro e instalación punto agua fría lavamanos ½", suministro e instalación punto sanitario 4", suministro e instalación punto sanitario 2".
- Registros, cheques y válvulas: Suministro e instalación registro válvula de bola ½".
- Otros: Sondeo y revisión de desagües, suministro e instalación de válvula de bola 2".
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: suministro e instalación de lámpara tipo LED 2x18W hermética.
- Pisos: Media caña en granito.
- Acabados de pisos: Suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio.
- Aparatos sanitarios y accesorios: Suministro e instalación lavamanos de incrustar, suministro e instalación sanitario línea infantil, suministro e instalación orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo, suministro e instalación de grifería de lavamanos, suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica.
- Aparatos y equipos especiales: Suministro e instalación división puertas y paneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable calibre 20.
- Pañete y pintura: Pañete muro, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placas: Pintura epoxica a 3 manos.
- Aseo y disposición final: Aseo general y limpieza.
- No previstos: Suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Justo Víctor Charry		13/02/2023	15/07/2023	100,00%	70,85%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	29,15%
1	Preliminares	13/02/2023	08/04/2023	2,07%	5,08%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.	
3	Mampostería	31/03/2023	08/04/2023	5,94%	0,02%	Muro divisorio bloque estriado No 4	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	7,41%	0,54%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para tomacorriente doble	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						normal GFCI tipo institucional, suministro e instalación de lámpara tipo LED hermética.
7	Pisos	27/04/2023	01/05/2023	1,47%	1,54%	Mediacaña en granito, suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio
8	Mampostería seca	04/04/2023	26/04/2023	7,36%	0,00%	
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	21,66%	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	17,69%	12,01%	Suministro de lavamanos de incrustar, sanitario línea infantil y orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio.
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	15,18%	27,70%	Suministro e instalación división puertas y paneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable para orinal.
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	18,66%	5,41%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	01/07/2023	2,18%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	0,37%	0,13%	Aseo general
NP	Actividades no previstas			0,00%	18,42%	Suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional color blanco.

Tabla 90. Avance de obra Colegio Justo Víctor Charry

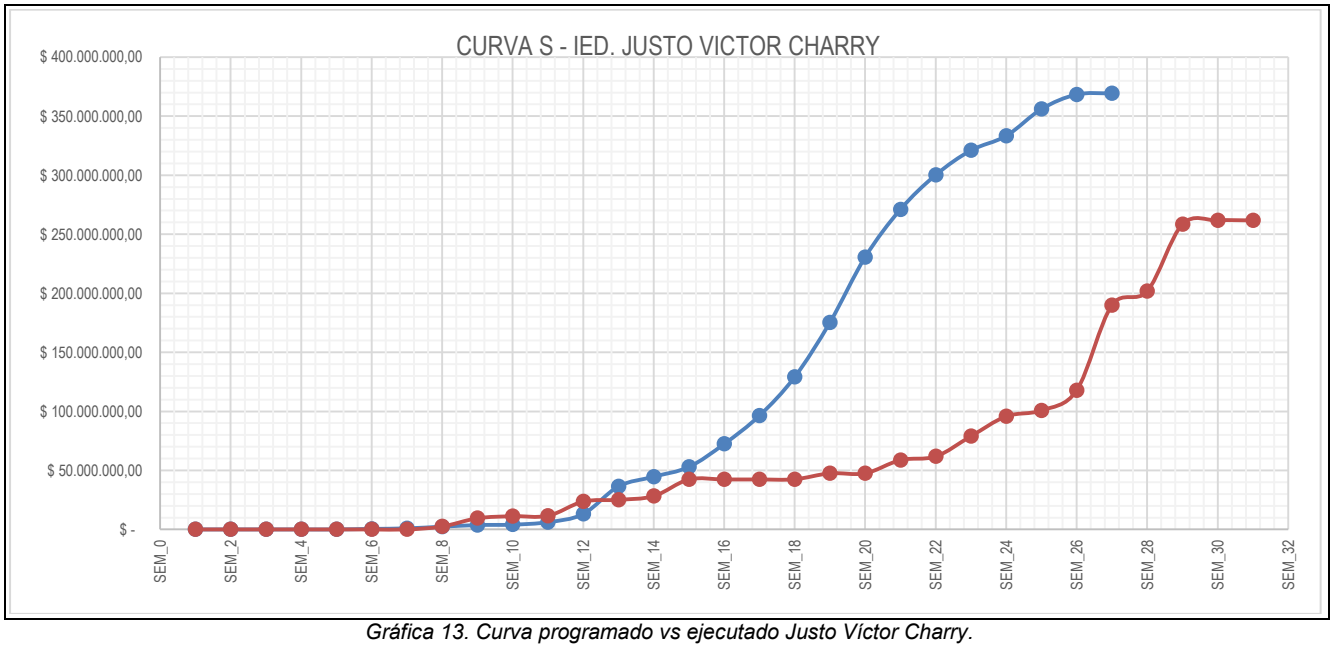

Gráfica 13. Curva programado vs ejecutado Justo Víctor Charry.

3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A


- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023).

3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza H=0.10,, demolición de acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, desmonte de todo tipo de cielo raso existente, desmonte de lámparas.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Simón Bolívar		10/05/2023	16/12/2023	46,67%	6,43%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	40,24%
1	Preliminares			46,67%	6,41%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso, demolición de placa maciza H=0.10, demolición de acabado y alistado de piso E=0.08a 0.12 cm, desmonte de todo tipo de cielo raso existente, desmonte de lámparas.	
2	Estructura			0,00%	0,02%	Excavación manual en material común	
3	Mampostería			0,00%	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			0,00%	0,00%		
7	Pisos			0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura			0,00%	0,00%		
16	Obras exteriores			0,00%	0,00%		
20	Aseo y disposición final			0,00%	0,00%		

Tabla 91 Avance de obra Colegio Simón Bolívar

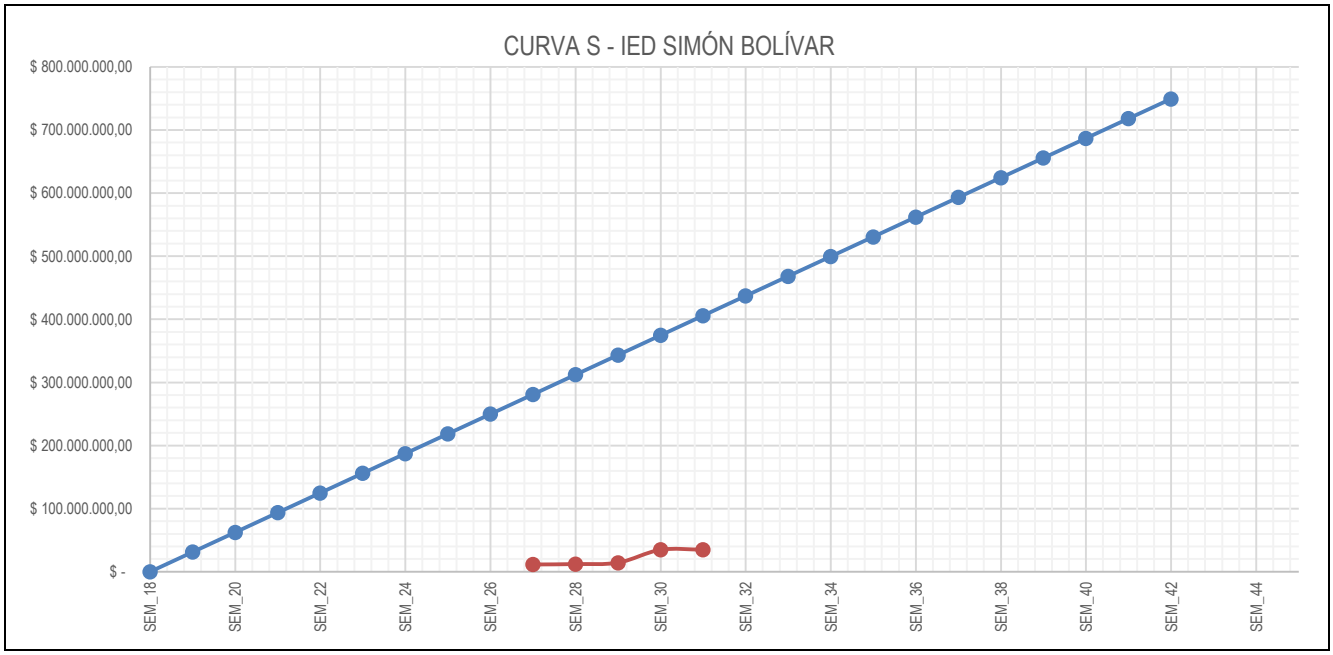

Gráfica 14. Curva programado vs ejecutado Simón Bolívar


3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en teja de zinc, cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de muro en mampostería, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.
- Estructura: Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, viga de amarre en concreto 3000 PSI.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000PSI.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro en ladrillo prensado macizo.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: flanche en lámina galvanizada calibre 20, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
- Aseo y disposición final: Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5mm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Garcés Navas		01/02/2023	31/07/2023	100,00%	44,38%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	55,62%
1	Preliminares	01/02/2023	03/05/2023	20,94%	11,25%	Cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición de muro en mampostería con acabados, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	08/04/2023	19/04/2023	1,22%	14,59%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica,.	
3	Mampostería	04/03/2023	15/03/2023	1,04%	0,42%	Muro en ladrillo prensado macizo	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	5,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	0,08%	0,00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	7,20%	0,00%		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
16	Obras exteriores	04/05/2023	20/05/2023	1,46%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	03/02/2023	29/07/2023	58,72%	2,91%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	05/06/2023	3,31%	8,80%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades no previstas	28/02/2023	16/03/2023	1,02%	6,41%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC

Tabla 92. Avance de obra Colegio Garcés Navas

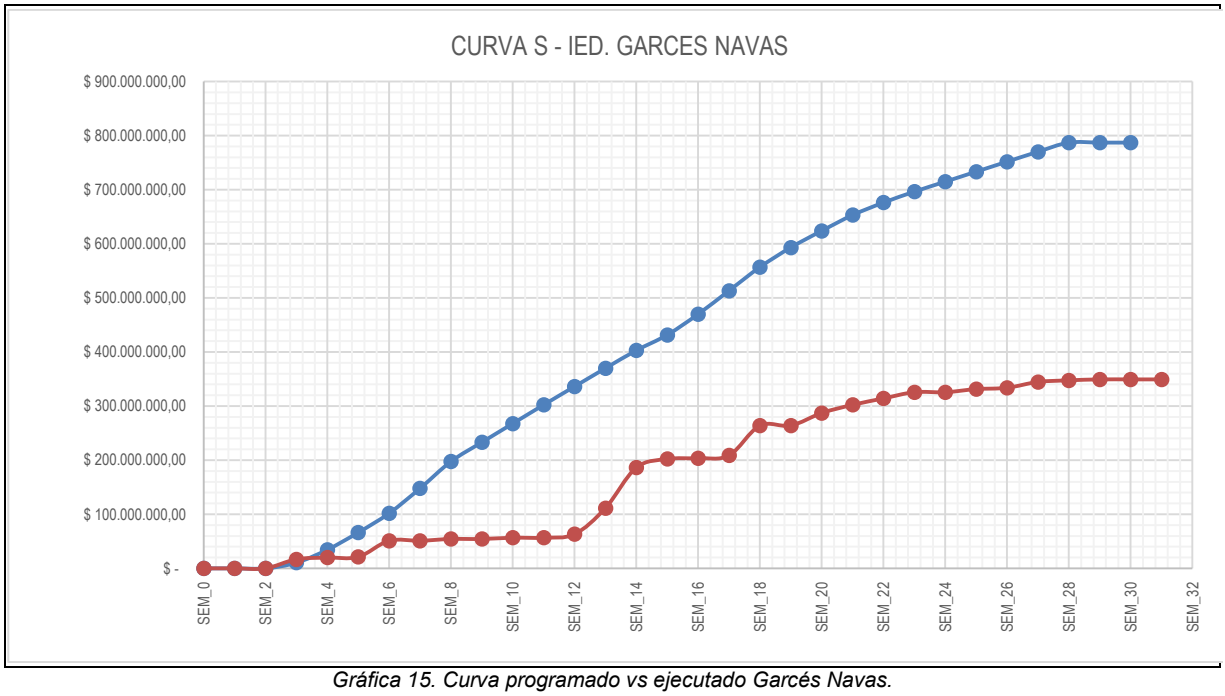

Gráfica 15. Curva programado vs ejecutado Garcés Navas.


3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona con parales de madera.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 M, demolición muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte de cubierta existente, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4.

- Carpintería metálica: Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior.
- Pañete y estuco de muros: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro 1:4, estuco filos sobre pañete.
- Pintura: Vinilo tipo 1 a tres manos.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED República de Panamá		17/07/2023	06/01/2024	0,36%	5,82%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-5,46%
1	Preliminares	21/08/2023	12/10/2023	0,00%	2,38%	Cerramiento en lona con parales de mader anclados al piso, demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a E=0.06 m, demolición de muro en mampostería con acabados E=0.15 m, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas todo tamaño, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.	
2	Estructura	17/07/2023	16/11/2023	0,36%	0,10%	Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	
3	Mampostería	30/09/2023	02/10/2023	0,00%	0,10%	Muro divisorio bloque estriado No. 4	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	17/11/2023	19/12/2023	0,00%	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	11/12/2023	16/12/2023	0,00%	0,00%		
6	Sistema de detección de incendio y red contra incendio	14/12/223	15/12/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	25/09/2023	24/10/2023	0,00%	0,00%		
8	Mampostería seca	25/10/2023	30/12/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	25/10/2023	30/12/2023	0,00%	1,78%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes.	
10	Carpintería madera	03/01/2024	04/01/2024	0,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/10/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	31/10/2023	02/11/2023	0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura	03/10/2023	30/10/2023	0,00%	1,46%	Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	31/10/2023	08/11/2023	0,00%	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	17/11/2023	21/12/2023	0,00%	0,00%		
20	Aseo y disposición final	13/10/2023	06/01/2024	0,00%	0,00%		

Tabla 93. Avance de obra Colegio República de Panamá

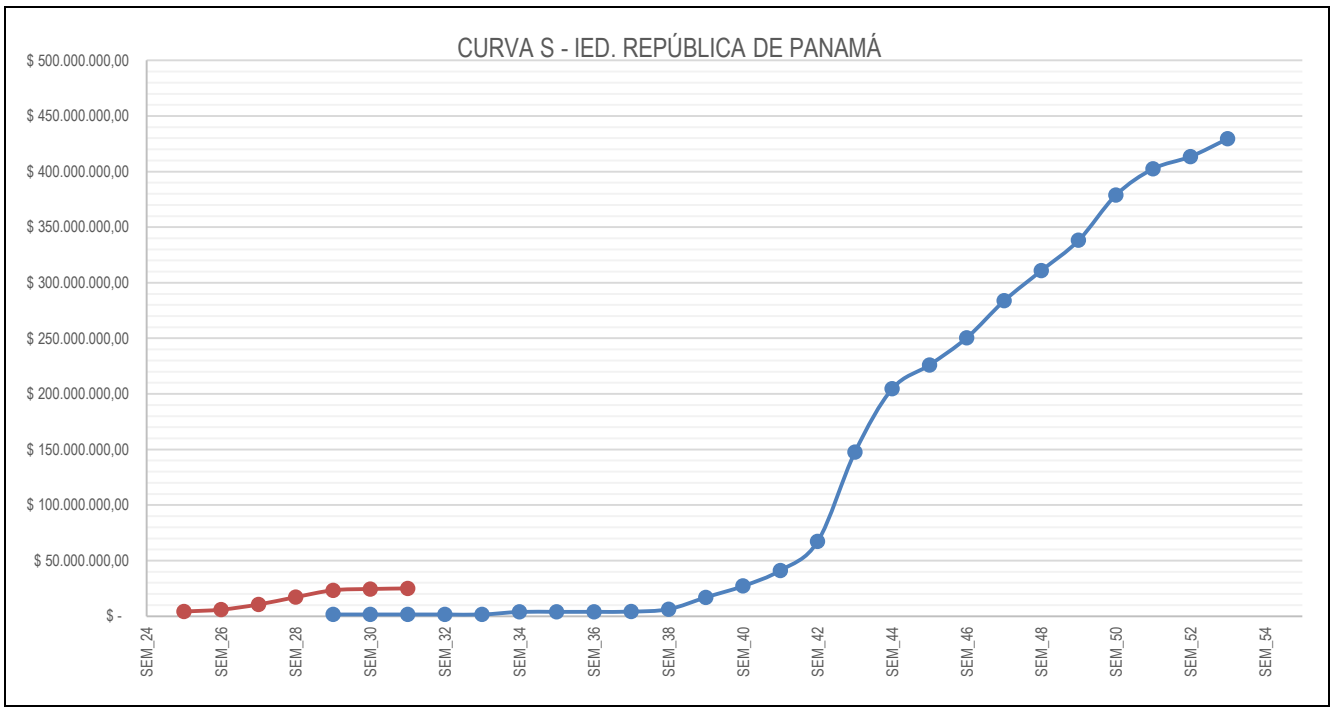

Gráfica 16. Curva programado vs ejecutado República de Panamá.

3.5.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023).

3.5.2.21. Colegio San José Norte, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de estructuras en concreto, demolición columna existente en concreto, demolición placa maciza H=0.10, H=0,15M, demolición de placa contrapiso 0.15M, demolición alfajía en concreto E=0.15M, demolición de alistado de piso E=0.08 a 0.12 CM, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape, desmonte de puertas y ventanas, desmonte desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de tanque elevado, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte de división sencilla, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes altos y bajos, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería.

- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concreto: Viga de cimentación en concreto 3000 PSI de 20 x 15 cm, placa contra piso de 10 cm – concreto 3000 PSI.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI y malla electro soldada 6mm.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 5.
- Red sanitaria: Suministro e instalación tubería PVCS 2".
- Red de agua fría: Suministro e instalación punto sanitario 4" y 2".
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación geotextil tejido T1700.
- Pisos: Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04
- Pañete y pintura: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED San José Norte		10/05/2023	30/11/2023	5,82%	5,94%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-0,12%
1	Preliminares	07/06/2023	30/11/2023	3,68%	2,20%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de columna existente en concreto, demolición de placa maciza h=010m, demolición placa maciza h=0.15m, demolición placa contra piso h=0.15m, demolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, demolición muro en mampostería, demolición enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica troquelada, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes, corte y regatas en concreto para instalación de tuberia.	
2	Estructura	15/07/2023	09/10/2023	1,23%	2,37%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI, suministro e instalación malla electro soldada 6mm.	
3	Mampostería	23/11/2023	28/11/2023	0,00%	0,01%	Muro divisorio bloque estriado No. 5	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	22/09/2023	04/12/2023	0,00%	0,25%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación geotextil tejido T1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	09/11/2023	28/11/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	04/10/2023	28/10/2023	0,00%	0,31%	Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04	
8	Mampostería seca	30/10/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	27/10/2023	13/11/2023	0,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	14/11/2023	18/11/2023	0,00%	0,00%		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
12	Aparatos y equipos especiales	14/11/2023	23/11/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	16/10/2023	16/11/2024	0,00%	0,80%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete
15	Cerraduras, vidrios y espejos	25/10/2023	25/10/2023	0,00%	0,00%	
16	Obras exteriores	11/08/2023	28/12/2023	0,91%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	21/06/2023	28/12/2023	0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	20/12/2023	21/12/2023	0,00%	0,00%	
NP	No Previstos	19/08/2023	28/12/2023	0,00%		

Tabla 94. Avance de obra San José Norte.

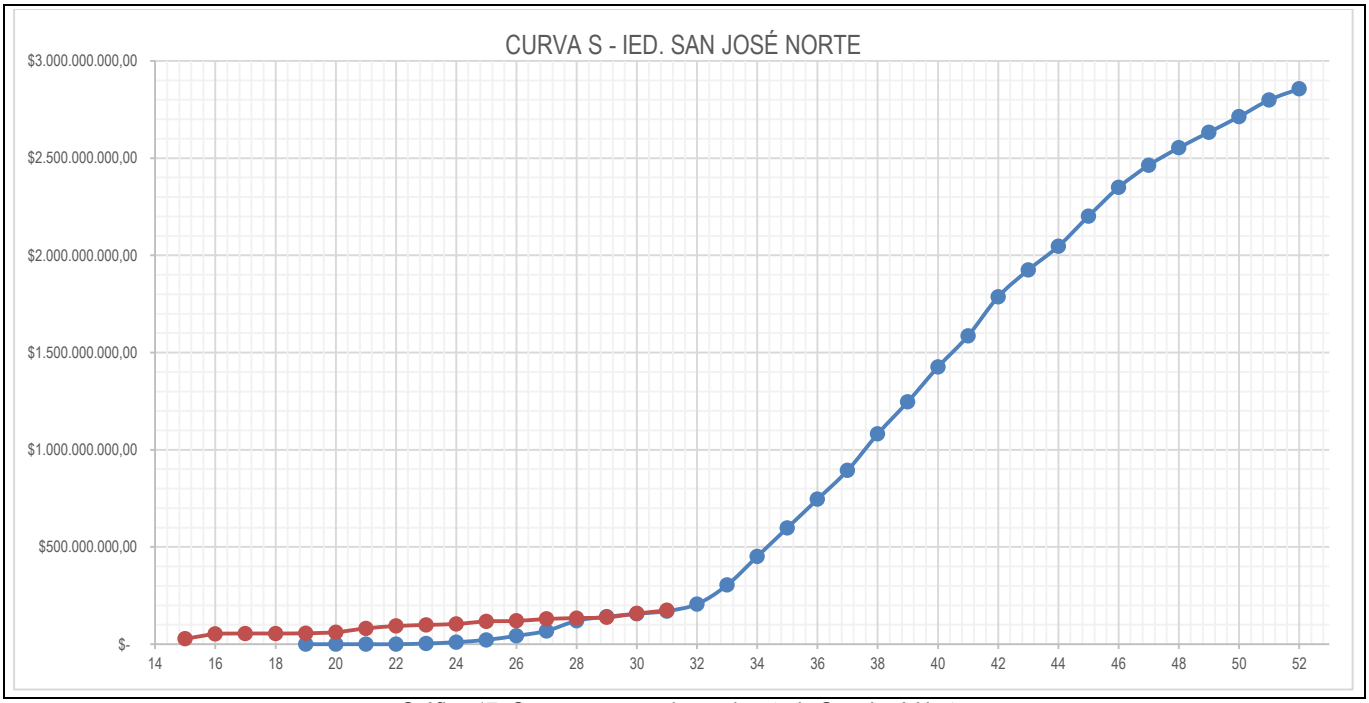

Gráfica 17. Curva programado vs ejecutado San José Norte.

3.5.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 26 de junio de 2023).

3.5.2.23. Colegio Villa Amalia

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 18 de diciembre de 2023).

3.5.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 18 de diciembre de 2023).

3.5.2.25. Colegio Torquigua, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 18 de diciembre de 2023).

3.5.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 18 de diciembre de 2023).


3.5.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza H=0.10 m, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 M, desmonte de juego infantil indiferente al material.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Zapata en concreto, viga 30x40 en concreto.
- Refuerzo: Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 PSI.
- Mampostería: Muro divisorio bloque No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B		18/12/2023	25/04/2024	0,00%	15,30%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-15,30%
1	Preliminares			0,00%	5,31%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso., demolición de placa maciza H=0.10, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 m, desmonte de juego infantil indiferente al material	
2	Estructura			0,00%	8,05%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, zapara en concreto 3000 PSI, viga 30x40 en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	

3	Mampostería			0,00%	1,95%	Muro divisorio bloque estriado No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			0,00%	0,00%	
7	Pisos			0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura			0,00%	0,00%	
16	Obras exteriores			0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final			0,00%	0,00%	

Tabla 95. Avance de obra Rafael Bernal Jiménez, sede B.

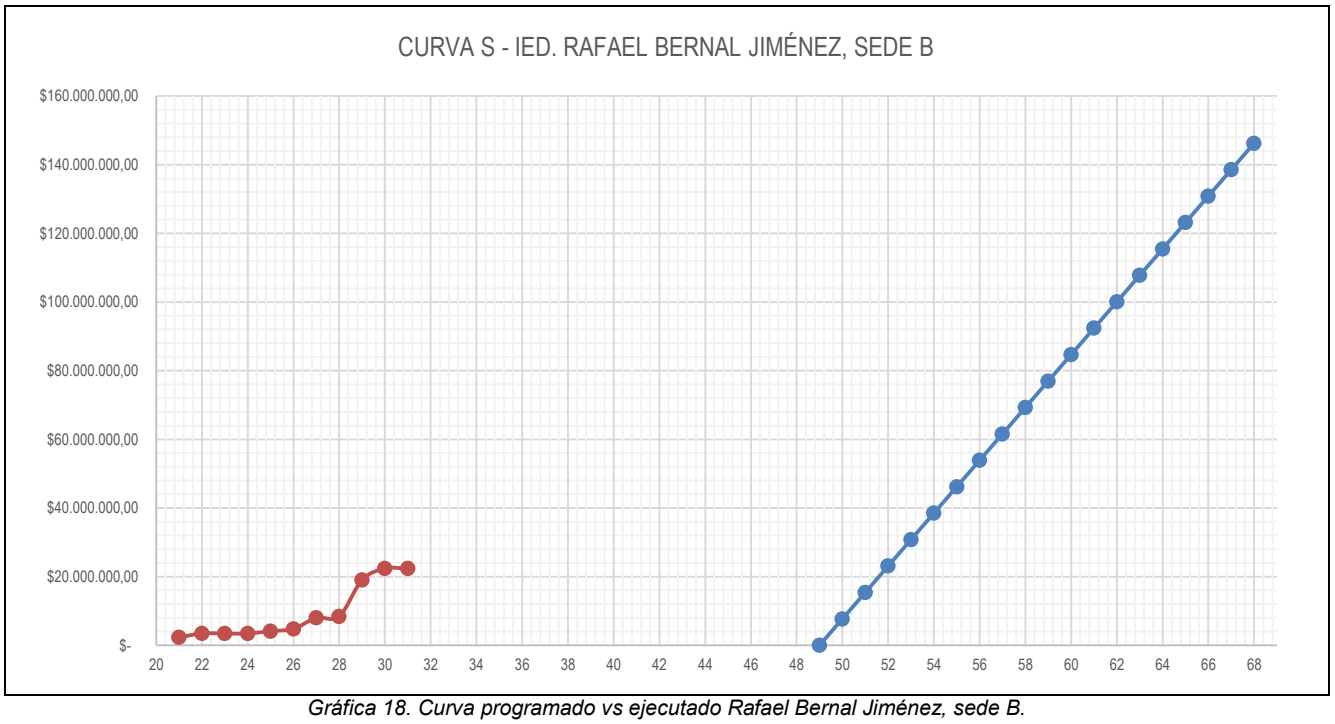

Gráfica 18. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez, sede B.

3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS

3.5.3.1. IED Morisco

En atención a emergencias se interviene red hidrosanitaria del colegio mediante sondeo de tuberías, limpieza de sifones, mantenimiento y limpieza de cajas, demolición de enchape de piso, pañete y afinado de caja de paso exterior, alistamiento para enchape, instalación de enchape de piso y elaboración de tapas de cajas de Inspección; dejando en funcionamiento la batería sanitaria afectada.

IED MORISCO					
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,72	$ 30.460,00	$ 204.691,20

	SUBTOTAL				$ 204.691,20
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4,00	$ 45.116,00	$ 180.464,00
	SUBTOTAL				$ 180.464,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 144.310,00	$ 721.550,00
	SUBTOTAL				$ 917.276,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	6,72	$ 43.727,00	$ 293.845,44
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	65,71	$ 21.334,00	$ 1.401.857,14
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDA ESCOBA BISELADO	M2	7,39	$ 150.374,00	$ 1.111.263,86
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	39,68	$ 30.565,00	$ 1.212.819,20
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	3,50	$ 73.121,00	$ 255.923,50
	SUBTOTAL				$ 4.275.709,14
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	M2	1,00	$ 58.002,00	$ 58.002,00
	SUBTOTAL				$ 58.002,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63,68	$ 7.657,00	$ 487.597,76
	SUBTOTAL				$ 487.597,76
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 13	TAPAS DE INSPECCIÓN SELLADAS EN CONCRETO 0.80*0.80 (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO)	UND	2,00	$438.531,00	$877.062,00
NP 14	TAPAS DE INSPECCIÓN SELLADAS, EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO 1.00*1.00MTS	UND	2,00	$470.656,00	$941.312,00
NP 15	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE REJILLAS DE CÁRCAMO EXISTENTE (LA ENTIDAD LAS SUMINISTRA)	ML	46,00	$14.452,00	$664.792,00
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA	M	3,50	$ 38.400,00	$ 134.400,00
	SONDEO TUBERÍA SANITARÍA	M	46,00	$ 27.300,00	$ 1.255.800,00
	SUBTOTAL				$ 3.873.366,00
	TOTAL				**$ 9.997.106,10**

Tabla 96. Presupuesto emergencia IED Morisco

Posterior a intervención realizada en batería sanitaria, se interviene emergencia con tala de dos individuos arbóreos y se brinda tratamiento a otras dos especies.

Se realiza intervención en aula de bachillerato internacional con instalación de muro en Dry Wall doble cara, instalación de luminaria y aplicación de estuco y pintura sobre muro.

3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en IED Rafael Bernal Jiménez, sede B en zonas afectadas; se realiza prueba de geofonía para encontrar fugas de agua, reparaciones en concreto, instalación de una universal y se retiran dos uniones de reparación.

IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,50	$ 30.460,00	$ 15.230,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 14.791,00	$ 31.002,00
	SUBTOTAL				$ 44.812,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	$ 16.443,00	$ 49.329,00
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	7,00	$ 7.440,00	$ 52.080,00
	SUBTOTAL				$ 101.409,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	0,50	$ 43.727,00	$ 21.864,00
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	3,00	$ 21.334,00	$ 64.002,00
	SUBTOTAL				$ 85.866,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDA ESCOBA BISELADO	M2	0,50	$ 150.374,00	$ 75.187,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	0,50	$ 30.565,00	$ 15.283,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	3,00	$ 73.121,00	$ 219.363,00
	SUBTOTAL				$ 309.833,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 7.657,00	$ 91.884,00
	SUBTOTAL				$ 91.884,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				

NP 11	PRUEBA DE GEÓFONO	UND	1,00	$684.990,00	$684.990,00
NP	DEMOLICIÓN MEDIA CAÑA	ML	1,00	$38.400,00	$38.400,00
NP	REPARACIÓN DE PLACA	UND	4,00	$68.634,50	$274.538,00
SUBTOTAL					$ 997.928,00
TOTAL					**$ 1.631.732,00**

Tabla 97. Presupuesto emergencia IED Bernal Jiménez, sede B

3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A

En atención a emergencias se efectúa intervención de tanque de almacenamiento de la institución educativa con la impermeabilización del mismo con geomembrana e instalación escalera para acceso.

IED NYDIA QUINTERO DE TURBAY					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,91	$ 20.851,00	$ 1.478.544,00
SUBTOTAL					$ 1.478.544,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	183,89	$ 12.685,00	$ 2.332.645,00
SUBTOTAL					$ 2.332.645,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE TIPO TEXSA O SIMILAR COMPUESTA DE POLYOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS Y MALLA DE POLYESTER DE ALTA CAPACIDAD COMO REFUERZO CENTRAL E= 1,2MM	M2	141,82	$ 240.705,00	$ 34.136.783,00
SUBTOTAL					$ 34.136.783,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE 2.5 MTS X 0.50 MTS. EN TUBO REDONDO DE 1 ¼" CALIBRE 18" INOXIDABLE 304, CON ANCLAJE EN CHAZOS EXPANSIVOS DE ⅜" X 2 ½" EN INOXIDABLE Y SELLADO CON RESINA EPOXICA.	UND	1,00	$6.004.663,00	$6.004.663,00
SUBTOTAL					$ 6.004.663,00
TOTAL					**$ 43.952.635,00**

Tabla 98. Presupuesto emergencia IED Nydia Quintero de Turbay.

3.5.3.4. IED República de Panamá

De acuerdo a la situación reportada en la ficha técnica enviada por la entidad de la institución educativa, se realizó la instalación de tubería, moto bomba, tanque hidroacumulador, tableros eléctricos y de control en cuarto de máquinas. Pendiente entrega.

IED REPÚBLICA DE PANAMÁ					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00

1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	$ 7.165,00	$ 143.300,00
SUBTOTAL					$ 289.881,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/2"	M	5,00	$ 86.519,00	$ 432.595,00
4.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO GALVANIZADO 1-1/2"	UN	4,00	$ 30.588,00	$ 122.352,00
4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VÁLVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 2"	UN	5,00	$ 321.953,00	$ 1.609.765,00
4.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	3,00	$ 294.954,00	$ 884.862,00
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 95.439,00	$ 95.439,00
SUBTOTAL					$ 3.145.013,00
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4,00	$ 51.932,00	$ 207.728,00
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	8,00	$ 74.454,00	$ 595.632,00
SUBTOTAL					$ 803.360,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 7.657,00	$ 91.884,00
SUBTOTAL					$ 91.884,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL CON MEMBRANA DE 500 LTS	UND	1,00	$7.326.959,00	$7.326.959,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO 50/70 PSI	UND	2,00	$95.602,00	$191.204,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" SALIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON INTERCONEXION DE TUBERÍAS GALVANIZADAS EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1 1/2" PARA ELECTROBOMBAS, INCLUYE ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$4.074.575,00	$4.074.575,00
NP 04	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1-1/2" DE SUCCIÓN POR 1-1/2" DE DESCARGA, MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 7.0 HP	UND	2,00	$9.953.287,00	$19.906.574,00
SUBTOTAL					$ 31.499.312,00
TOTAL					**$ 35.829.450,00**

Tabla 99. Presupuesto emergencia IED República de Panamá.

3.5.3.5. Dirección Local de Engativá

Se realiza visita de inspección de emergencia, evidenciando en tanques de agua, fuga en el sello del acople, déficit en presión de agua, deterioro de pintura por posibles filtraciones de agua y daño en manto asfáltico en placa de tanques (pendiente).

3.5.3.6. IED Laureano Gómez

Se encuentra en proceso de revisión para efectuar la insonorización de aula (pendiente).

3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A

En atención a emergencias se realiza revisión de equipos de presión de agua potable en cuarto de bombas, identificando que el tanque hidro acumulador expulsa agua por su válvula de aire y presenta signos de corrosión generalizada; se encuentran dos motobombas trabajando correctamente, sin embargo, sus conexiones eléctricas no tienen los terminales adecuados evidenciando cableado expuesto; las tuberías galvanizadas presentan corrosión externa e interna y filtraciones considerables.

3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera

En atención a emergencias se realiza revisión de fallos en circuitos eléctricos y aplicación de estuco y pintura en zona afectada.

IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA					
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,50	$ 10.805,00	$ 70.232,50
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,50	$ 30.300,00	$ 196.950,00
	SUBTOTAL				$ 267.182,50
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	7,00	$ 7.657,00	$ 53.599,00
	SUBTOTAL				$ 53.599,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA	M2	6,50	$ 18.605,62	$ 120.936,52
	SUBTOTAL				$ 120.936,52
	TOTAL				**$ 441.718,02**

Tabla 100. Presupuesto emergencia IED Tomas Cipriano de Mosquera.

3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo

En atención a emergencias se realiza intervención con instalación de estructura y membrana en tanque subterráneo de agua potable.

IED FRANCISCO BERBEO					
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECÁNICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN	2,00	$ 206.244,00	$ 412.488,00
	SUBTOTAL				$ 412.488,00

3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	218,07	$ 12.685,00	$ 2.766.217,95
	SUBTOTAL				$ 2.766.217,95
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 4"	M	4,00	$ 211.297,00	$ 845.188,00
4.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO GALVANIZADO 4"	UN	6,00	$ 94.498,00	$ 566.988,00
	SUBTOTAL				$ 1.412.176,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE TIPO TEXSA O SIMILAR COMPUESTA DE POLYOLEFINAS TERMOPLASTICAS Y MALLA DE POLYESTER DE ALTA CAPACIDAD COMO REFUERZO CENTRAL E= 1,2MM	M2	204,06	$ 240.705,00	$ 49.118.262,30
	SUBTOTAL				$ 49.118.262,30
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE 2.5 MTS X 0.50 MTS. EN TUBO REDONDO DE 1 ¼" CALIBRE 18" INOXIDABLE 304, CON ANCLAJE EN CHAZOS EXPANSIVOS DE ⅜" X 2 ½" EN INOXIDABLE Y SELLADO CON RESINA EPOXICA.	UND	1	$6.004.663,00	$6.004.663,00
NP	CORTE DE PELDAÑOS	UND	1		$0,00
NP	PERFORACIÓN 30 CM	UND	3	$5.800,00	$17.400,00
	SUBTOTAL				$ 6.022.063,00
	TOTAL				**$ 59.731.207,25**

Tabla 101. Presupuesto emergencia IED Juan Francisco Berbeo.

3.5.3.10. IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D

En atención a emergencias se realiza visita técnica el día 08 de marzo de 2023 a IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D en aras de identificar las posibles causas de las fallas presentadas en la infraestructura de la institución educativa y tomar las medidas sanitarias correspondientes; durante la inspección se observa lámina de agua en pasillo y acceso a aula 101D, levantamiento de acabado de piso, taponamiento y desbordamiento de canales existentes, filtración de agua lluvia en unión de placa tanque – cubierta, falta de guarda escobas en aulas ocasionando falta de continuidad y protección de muros y falla en la impermeabilización de placa en tanque, se realiza limpieza e impermeabilizado de canales, instalación de malla y desmonte y cambio de tanque en zona de cubierta, además de aplicación de alistado en aula, enchape y emboquillado de pisos de aula afectada.

IED DOMINGO FAUSTINO, SEDE D					
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			$ 20.949,00	$ 1.158.270,21
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO,	UN	2,00	105.209,00	$ 210.418,00

	DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	34,00	49.593,00	$ 1.686.162,00
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORÍA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	10,08	23.968,00	$ 241.597,44
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	63,80	4.165,00	$ 265.727,00
	SUBTOTAL				$ 3.562.174,65
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUÍN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	3,00	17.028,00	$ 51.084,00
	SUBTOTAL				$ 4.120.583,09
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	1.230.488,00	$ 1.230.488,00
4.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 500 LTS, INCLUYE FLOTADOR	UN	1,00	947.779,00	$ 947.779,00
	SUBTOTAL				$ 2.178.267,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	55,29	34.766,00	$ 1.922.212,14
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN TABLÓN TRADICIÓN EN GRESS	M2	55,29	82.537,00	$ 4.563.470,73
	SUBTOTAL				$ 6.485.682,87
9	**CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	11,60	47.112,00	$ 546.499,00
	SUBTOTAL				$ 546.499,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	3,00	30.300,00	$ 90.900,00
	SUBTOTAL				$ 90.900,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	2,00	46.399,00	$ 92.798,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	2,80	57.806,00	$ 161.856,80
	SUBTOTAL				$ 254.654,80
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,08	7.657,00	$ 1.110.877,56
	SUBTOTAL				$ 1.110.877,56

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
NP1	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS CON SONDA ELÉCTRICA.	M	40,50	27.300,00	$ 1.105.650,00
NP2	PINTURA TIPO PARAGUAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES H=3,5MTS	M	63,80	19.377,60	$ 1.236.290,88
SUBTOTAL					$ 2.341.940,88
TOTAL					**$ 20.691.579,85**

Tabla 102. Presupuesto emergencia IED Domingo Faustino Sarmiento.

3.5.3.11. IT Francisco José de Caldas, sede A

En atención a emergencias se realiza intervención en cerramiento de institución con la instalación y aplicación de pintura de dos módulos de rejas de seguridad; así mismo, se realiza intervención con tala de árboles en peligro de volcamiento en zona verde de Institución y poda en un individuo arbóreo.

IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORÍA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	60,00	$ 23.968,00	$ 1.438.080,00
SUBTOTAL					$ 1.438.080,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA PRE ONDULADA CALIBRE 10 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8".	M2	9,65	$ 360.604,00	$ 3.480.910,41
SUBTOTAL					$ 3.480.910,41
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	9,65	$ 21.897,00	$ 211.306,05
SUBTOTAL					$ 211.306,05
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	4,00	$ 892.759,00	$ 3.571.036,00
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	3,00	$ 892.759,00	$ 2.678.277,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	1,00	$ 393.263,00	$ 393.263,00
SUBTOTAL					$ 6.642.576,00
TOTAL					**$ 11.772.872,46**

Tabla 103. Presupuesto emergencia IT Francisco José de Caldas.

3.5.3.12. IT Juan del Corral, sede A

En atención a emergencias se realiza limpieza y lavado de tanques de almacenamiento y cambio de tres bombas sumergibles.

IED JUAN DEL CORRAL, SEDE A					
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	42,00	$ 86.974,00	$ 3.652.908,00
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 3"	UN	3,00	$ 875.124,00	$ 2.625.372,00
4.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	3,00	$ 715.350,00	$ 2.146.050,00
	SUBTOTAL				$ 8.424.330,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
	SUBTOTAL				$ 428.792,00
NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0024 VOLTAJE 220 TRIFASICA (364 GPM DESCARGA 3" , 2HP)	UN	1,00	$ 5.204.000,00	$ 5.204.000,00
NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0020 VOLTAJE 220 TRIFASICA (135 GPM DESCARGA 3" , 2HP)	UN	1,00	$ 2.075.000,00	$ 2.075.000,00
	SUBTOTAL				$ 7.279.000,00
	TOTAL				**$ 16.132.122,00**

Tabla 104. Presupuesto emergencia IED Juan del Corral

3.5.3.13. IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

En atención a emergencias se realiza instalación de ventanería en vanos de bloque de aulas a fin de evitar ingreso de aves a la misma.

IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M2	8,60	35.333,00	$ 303.863,80
	SUBTOTAL				$ 303.863,80
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	144,00	12.685,00	$ 1.826.640,00
	SUBTOTAL				$ 1.826.640,00
9	**CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	52,74	619.206,00	$ 32.656.924,44
	SUBTOTAL				$ 32.656.924,44
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	72,00	7.657,00	$ 551.304,00
	SUBTOTAL				$ 551.304,00
	TOTAL				**$ 35.338.732,24**

Tabla 105. Presupuesto emergencia IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

3.5.3.14. IED Naciones Unidas, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala y un individuo arbóreo para poda.

IED NACIONES UNIDAS, SEDE B					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
SUBTOTAL					$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	$ 892.759,00	$ 892.759,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	1,00	$ 393.263,00	$ 393.263,00
SUBTOTAL					$ 1.286.022,00
TOTAL					**$ 1.714.814,00**

Tabla 106. Presupuesto emergencia IED Naciones Unidas, sede B.

3.5.3.15. IED Antonio Nariño, sede A

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala.

IED ANTONIO NARIÑO, SEDE A					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	7.657,00	$ 428.792,00
SUBTOTAL					$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	892.759,00	$ 892.759,00
SUBTOTAL					$ 892.759,00
TOTAL					**$ 1.321.551,00**

Tabla 107. Presupuesto emergencia IED Antonio Nariño, sede A

3.5.3.16. IED Bolivia, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala.

IED BOLIVIA, SEDE B					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
SUBTOTAL					$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	$ 892.759,00	$ 892.759,00
SUBTOTAL					$ 892.759,00
TOTAL					**$ 1.321.551,00**

Tabla 108. Presupuesto emergencia IED Bolivia, sede B

3.5.3.17. IED Heladia Mejía, sede B

En atención a emergencias se realiza en aula de preescolar demolición de enchape existente, instalación de enchape en porcelanato y arreglo de humedad en pared afectada (resane y aplicación de pintura).

3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	-	0,00%	-	0,00%	1	-	0,00%	-	0,00%
2	1.270.756,93	0,01%	1.270.756,93	0,01%	2	9.458.499,71	0,07%	9.458.499,71	0,07%
3	19.951.637,75	0,10%	21.222.394,68	0,11%	3	31.826.160,08	0,23%	41.284.659,79	0,30%
4	50.914.718,24	0,26%	72.137.112,92	0,37%	4	29.459.587,55	0,21%	70.744.247,34	0,51%
5	84.783.311,22	0,44%	156.920.424,14	0,81%	5	33.581.581,31	0,24%	104.325.828,65	0,75%
6	84.520.694,84	0,44%	241.441.118,98	1,25%	6	94.518.500,86	0,68%	198.844.329,51	1,42%
7	79.994.302,15	0,41%	321.435.421,13	1,66%	7	22.218.182,48	0,16%	221.062.512,00	1,58%
8	92.371.183,17	0,48%	413.806.604,30	2,14%	8	40.324.809,10	0,29%	261.387.321,10	1,87%
9	188.479.295,83	0,98%	602.285.900,13	3,12%	9	65.485.536,40	0,47%	326.872.857,50	2,34%
10	221.475.791,25	1,15%	823.761.691,38	4,26%	10	41.427.564,22	0,30%	368.300.421,72	2,64%
11	229.916.129,85	1,19%	1.053.677.821,23	5,45%	11	49.569.565,98	0,36%	417.869.987,70	2,99%
12	230.178.690,91	1,19%	1.283.856.512,14	6,64%	12	74.571.439,34	0,53%	492.441.427,04	3,53%
13	271.119.796,10	1,40%	1.554.976.308,24	8,05%	13	384.555.815,94	2,76%	876.997.242,98	6,28%
14	366.181.950,98	1,89%	1.921.158.259,22	9,94%	14	175.842.367,10	1,26%	1.052.839.610,08	7,54%
15	367.035.523,66	1,90%	2.288.193.782,89	11,84%	15	240.754.691,04	1,73%	1.293.594.301,11	9,27%
16	332.730.015,04	1,72%	2.620.923.797,93	13,56%	16	148.581.092,20	1,06%	1.442.175.393,31	10,34%
17	344.526.501,67	1,78%	2.965.450.299,60	15,35%	17	109.142.302,12	0,78%	1.551.317.695,43	11,12%
18	366.678.480,99	1,90%	3.332.128.780,59	17,24%	18	187.805.414,35	1,35%	1.739.123.109,78	12,46%
19	407.916.984,13	2,11%	3.740.045.764,73	19,35%	19	137.179.908,07	0,98%	1.876.303.017,85	13,45%
20	394.517.811,64	2,04%	4.134.563.576,37	21,40%	20	253.932.296,56	1,82%	2.130.235.314,41	15,27%
21	386.813.627,82	2,00%	4.521.377.204,20	23,40%	21	108.086.167,12	0,77%	2.238.321.481,53	16,04%
22	374.635.316,01	1,94%	4.896.012.520,21	25,34%	22	183.153.768,22	1,31%	2.421.475.249,75	17,35%
23	357.626.336,51	1,85%	5.253.638.856,72	27,19%	23	149.085.076,18	1,07%	2.570.560.325,93	18,42%
24	404.635.499,40	2,09%	5.658.274.356,13	29,28%	24	175.332.541,60	1,26%	2.745.892.867,52	19,68%
25	454.381.260,15	2,35%	6.112.655.616,28	31,63%	25	287.822.376,00	2,06%	3.033.715.243,52	21,74%

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
26	443.529.749,31	2,30%	6.556.185.365,59	33,93%	26	82.724.526,61	0,59%	3.116.439.770,14	22,33%
27	546.127.115,45	2,83%	7.102.312.481,04	36,75%	27	179.887.815,96	1,29%	3.296.327.586,10	23,62%
28	615.173.683,06	3,18%	7.717.486.164,11	39,94%	28	160.476.515,98	1,15%	3.456.804.102,08	24,77%
29	560.052.713,36	2,90%	8.277.538.877,47	42,83%	29	299.025.099,04	2,14%	3.755.829.201,11	26,92%
30	496.413.992,47	2,57%	8.773.952.869,95	45,40%	30	82.524.551,52	0,59%	3.838.353.752,63	27,51%
31	512.510.877,32	2,65%	9.286.463.747,27	48,06%	31	176.956.676,14	1,27%	4.015.310.428,77	28,77%
32	442.246.042,89	2,29%	9.728.709.790,16	50,34%	32	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
33	449.945.708,87	2,33%	10.178.655.499,04	52,67%	33	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
34	499.136.744,68	2,58%	10.677.792.243,72	55,26%	34	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
35	530.459.117,03	2,75%	11.208.251.360,76	58,00%	35	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
36	495.998.909,79	2,57%	11.704.250.270,55	60,57%	36	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
37	471.321.040,33	2,44%	12.175.571.310,88	63,01%	37	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
38	441.690.342,55	2,29%	12.617.261.653,44	65,29%	38	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
39	519.236.713,88	2,69%	13.136.498.367,32	67,98%	39	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
40	510.632.776,52	2,64%	13.647.131.143,85	70,62%	40	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
41	510.901.872,45	2,64%	14.158.033.016,30	73,27%	41	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
42	440.348.539,65	2,28%	14.598.381.555,95	75,54%	42	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
43	367.615.278,66	1,90%	14.965.996.834,62	77,45%	43	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
44	219.051.900,97	1,13%	15.185.048.735,59	78,58%	44	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%
45	4.139.232.146,41	21,42%	19.324.280.882,00	100,00%	45	-	0,00%	4.015.310.428,77	28,77%

Tabla 109. Avance General de Obra

3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS

Durante el periodo del presente informe se presentó las siguientes contingencias y su respectiva alternativa de subsanación:

Modificación de presupuestos iniciales de instituciones educativas. Safrid ingeniería SAS, adelanta la actualización de balance presupuestal en aras de evitar afectaciones al alcance planificado por la secretaría de Educación del Distrito.

Se encuentran actividades a desarrollar que no están dentro del presupuesto oficial ofertado. Ante la situación, se proyecta por parte de contratista de obra la

elaboración de análisis de precios unitarios no previstos, con ello, atender las necesidades que surgen durante el proceso constructivo.

Cumplimiento de línea base de programación de actividades contrato de obra. Contratista de obra presenta plan de contingencia para mitigar los impactos por demoras en la ejecución de actividades.

Demoras en presentación de conceptos de especialistas en el desarrollo de las actividades en las instituciones educativas. Se efectúan mesas de trabajo entre pares de especialistas, con el fin, de efectuar definiciones con celeridad cumpliendo con los parámetros y normas vigentes.

Acopio de cantidades superiores a las permitidas de materiales de escombro en frentes de obra. Se realiza la disposición final de escombros a sitio autorizado conforme a las normas ambientales vigentes.

Afectación de cerramiento en lona para aislamiento de obras. Se realiza inspecciones por parte de los profesionales SSTA a cargo, con ello, mitigar los impactos a la comunidad estudiantil circundante.

3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo del presente informe corresponden a:

- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos que hacen parte integral del mismo.

- Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra.

- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.

- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.

- Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

- Garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

- Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.

3.5.7. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con las actividades que se han realizado en el transcurso de la ejecución de las obras la Interventoría ha verificado, el estado de los equipos e insumos.

3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS

3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
2	24/01/2023	Programación de obra ajustada	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente
		Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente
		Informes diagnósticos colegios	Contratista de obra	27/01/23	Pendiente
3	31/01/2023	Presupuestos colegios priorizados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		Diagnósticos subsanados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales y NP's	Contratista de obra	31/01/2023	Pendiente
		Programación ajustada	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
4	07/02/2023	Diagnósticos	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		APU's contractuales	Contratista de obra	01/02/2023	Pendiente
		Presupuestos ajustados	Contratista de obra	02/02/2023	03/02/2023
		APU' NP	Contratista de obra	31/01/2023	31/01/2023
5	14/02/2023	Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	18/02/2023	Pendiente
		Subsane de observaciones de diagnósticos	Contratista de obra	15/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
		Documentación autorización de ingreso de personal	Contratista de obra	14/02/2023	16/02/2023
		Actas de vecindad Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	16/02/2023	Pendiente
		Balance actualizado de frentes de obra iniciales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
6	21/02/2023	Concepto geotécnista Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	27/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	21/02/2023	21/02/2023
		Informe técnico mensual	Contratista de obra	22/02/2023	Pendiente
		Visita de personal social SED	Secretaría de Educación	01/03/2023	01/03/2023
		Visita especialistas estructurales	Contratista de obra	28/02/2023	28/02/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Inicio actividades Justo Victor Charry	Contratista de obra	23/02/2023	27/02/2023
		Instalación bombas República de Panamá	Contratista de obra	23/02/2023	22/02/2023
		Entrega concepto Juan del Corral	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023
		Instalación de programación en frentes de obra	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
7	28/02/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	06/03/2023	Pendiente
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente
		Informe mensual No. 1	Contratista de obra	17/03/2023	02/03/2023
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	03/03/2023	03/03/2023
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	02/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
		Motivación adición de obra	Secretaría de Educación	03/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023
		Entrega caracterización de granulares	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente
8	07/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	15/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	14/03/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado	Contratista de obra	107/03/2023	Pendiente
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	08/03/2023	Pendiente
		Entrega caracterización materiales cantera	Contratista de obra	10/03/2023	Pendiente
		Concepto geotecnia instituciones	Contratista de obra	08/03/2023	02/03/23
		Visita emergencia IED Francisco José de Caldas	Contratista, interventoría, SED	09/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 9	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023
9	15/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	17/03/2023	Pendiente
		Visita especialistas eléctricos	Contratista de obra	177/03/2023	Pendiente
		Concepto estructural Instituciones educativas	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023
		Mesa de trabajo / revisión presupuestos	Contratista de obra	16/03/2023	17/03/2023
		Caracterización granulares	Contratista de obra	23/03/2023	21/03/2023
		Ficha técnica emergencia Juan del Corral	Secretaría de Educación	23/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023
		Acta de entrega de emergencia (República de Panamá, Bernal Jiménez)	Contratista de obra	23/03/2023	08/03/2023
10	23/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	21/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	217/03/2023	Pendiente
		Entrega de emergencia República de Panamá y Domingo Faustino	Contratista de obra, interventoría	15/03/2023	15/03/2023
		Entrega informe semanal No. 10	Interventoría	21/03/2023	217/03/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Fichas técnicas emergencias	Secretaría de Educación	21/03/2023	Pendiente
11	28/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	30/03/2023	03/04/23
		Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	04/03/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	28/03/2023	Pendiente
		Plan de contingencia por cada institución	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023
		Fichas técnicas de emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	28/03/2023	Pendiente
		Especificación técnica teja - APU	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023
12	04/04/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	05/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	057/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural – cimentación y cubierta de Jorge Eliecer Gaitán.	Interventoría	07/04/2023	15/03/2023
13	28/03/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo, tarima, aula múltiple y cubierta	Contratista de obra	13/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia cimentación Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	17/04//2023	Pendiente
		Concepto estructural vigas de confinamiento Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán.	Contratista de obra	14/04/2023	Pendiente
		Concepto capacidad hidráulica canchas Floridablanca	Contratista de obra	17/042023	17/04/2023
		Concepto capacidad hidráulica canales cubierta Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	18/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca, Bernal Jiménez	Contratista de obra	19/04/2023	Pendiente
		Dossier estructura metálica Jorge Eliecer Gaitán, Francisco José de Caldas	Contratista de obra	18/04/2023	Pendiente
14	19/04/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo, tarima, aula múltiple y cubierta	Contratista de obra	19/04/2023	19/04/2023
		Concepto capacidad hidráulica Floridablanca	Contratista de obra	26/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca, Bernal Jiménez	Contratista de obra	19/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia lima hoya Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	21/04/2023	Pendiente
		Revisión NP's	Contratista de obra	25/04/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	21/04//2023	Pendiente
		Informe mensual No. 3 contrato de obra	Contratista de obra	21/04//2023	Pendiente
15	25/04/2023	Informe mensual No. 3 contrato de obra	Contratista de obra	25/04/2023	02/05/2023
		Reprogramación de contrato de obra	Contratista de obra	28/04/2023	28/04/2023
		Revisión de NP's	Contratista de obra	28/04/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	28/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia lima hoya Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	25/04/2023	25/04/2023
16	03/05/2023	Concepto capacidad hidráulica Floridablanca	Contratista de obra	04/05/2023	08/05/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Revisión de NP's	Contratista de obra	05//05/2023	08/05/2023
		Concepto eléctrico Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca	Contratista de obra	09/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	09/05/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	09/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	05/05/2023	Pendiente
		Diseño de ventanería San José Norte	Contratista de obra	05/05/2023	08/05/2023
		Concepto hidráulico zona canchas Floridablanca	Contratista de obra	09/05/2023	08/05/2023
17	09/05/2023	Concepto eléctrico Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca	Contratista de obra	13/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado contrato de obra	Contratista de obra	15//05/2023	15/05/2023
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	15/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	15/05/2023	Pendiente
18	16/05/2023	Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	18/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	18//05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento y conservación Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	18/05/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo SED, contratista de obra e interventoría.	SED, Contratista de obra e interventoría	18/05/2023	18/05/2023
		Justificación cerramiento	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
19	23/05/2023	Concepto especialista estructural San José Norte	Contratista de obra	26/05/2023	Pendiente
		Concepto piso aula múltiple Rafael Bernal Jiménez	Contratista de obra	26//05/2023	29/05/2023
		Acta de entrega Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
		Entrega acta parcial No. 4	Contratista de obra	25/05/2023	25/05/2023
		Plan de contingencia	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
		Presentación de alternativa de mantenimiento cubierta Juan del Corral	Contratista de obra	29/05/2023	Pendiente
		Programación y flujo de inversión semanal actualizado San José Norte	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	30/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	25//05/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
20	30/05/2023	Acta de entrega Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	30/05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	30/05/2023	05/06/2023
		Concepto especialista estructural San José Norte	Contratista de obra	06/06/2023	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Acta de entrega NP	Contratista de obra	06/06/2023	06/06/2023
		Plan de contingencia	Contratista de obra	02/06/2023	05/06/2023
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	31/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	31/05/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	01/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	05/06/2023	Pendiente
		Atención a emergencias Rafael Bernal Jiménez	Contratista de obra	01//06/2023	Pendiente
21	06/06/2023	Concepto estructural San José Norte	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
		Concepto estructural Simón Bolívar	Contratista de obra	09//06/2023	Pendiente
		Plan de contingencia (Revisión)	Interventoría	08/06/2023	Pendiente
		Alternativa intervención cubierta Juan del Corral – Mesa de trabajo	Contratista de obra e interventoría	08/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	13/06/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	08/06/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
		Informes mensuales No. 3 y 4.	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
22	14/06/2023	Concepto estructural San José Norte – (cubierta auto portante, placa aula múltiple)	Contratista de obra	21/06/2023	Pendiente
		Programación y flujo de inversión semanal actualizado San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra	15//06/2023	20/06/23
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	21/06/2023	20/06/23
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Bernal Jiménez	Contratista de obra e interventoría	15/06/2023	Pendiente
		Visita especialista estructural Simón Bolívar	Contratista de obra e interventoría	21/06/2023	16/06/23
		Concepto estructural Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	21/06/2023	Pendiente
		Programación general actualizada	Contratista de obra	21/06/2023	20/06/23
23	20/06/2023	Concepto estructural San José Norte – (cubierta auto portante, placa aula múltiple)	Contratista de obra	21/06/2023	21/06/2023
		Ajuste plan de contingencia	Contratista de obra	23//06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	27/06/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Bernal Jiménez	Contratista de obra e interventoría	21/06/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo – conceptos eléctricos.	Contratista de obra e interventoría	23/06/2023	Pendiente
		Concepto estructural Jorge Eliecer Gaitán – área de biblioteca, cubierta.	Contratista de obra	23/06/2023	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
24	29/06/2023	Concepto estructural Simón Bolívar	Contratista de obra	30/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	05//07/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto actualizado	Contratista de obra	04/07/2023	Pendiente
		Visita colegio Juan del Corral	SED, contratista de obra e interventoría	30/06/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	04/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado	Contratista de obra	29/06/2023	Pendiente
		Retiro y disposición de escombros a sitio autorizado – teja asbesto.	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
25	07/07/2023	Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra	10/07/2023	Pendiente
		Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	10/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Cuadro comparativo – balance presupuestal cubierta auto portante San José Norte	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Entrega de certificaciones – soportes de personal idóneo para trabajo en alturas	Contratista de obra	Inmediato	10/07/23
		Bitácora IED. Rafael Bernal Jiménez, sede B y IED República de Panamá	Contratista de obra	Inmediato	10/07/23
26	11/07/2023	Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	14/07/2023	Pendiente
		Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	14/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	12/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	18/07/2023	Pendiente
		Bitácora IED. Rafael Bernal Jiménez, sede B y IED República de Panamá	Contratista de obra	14/07/2023	Pendiente
		Discriminación responsable inspector SST por colegios asignados.	Contratista de obra	18/07/2023	Pendiente
		Permisos para ejecución de actividades de alto riesgo SSTA	Contratista de obra	18/07/2023	18/07/2023
27	18/07/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	24/07/2023	Pendiente
28	25/07/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	24/07/2023	Pendiente
29	01/08/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	24/07/2023	Pendiente
30	09/08/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	24/07/2023	Pendiente

Tabla 110. Relación de reuniones y seguimiento de compromisos.

3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

En el anexo registro fotográfico se presentan los avances de obra de las actividades realizadas en el periodo del presente informe en todos los frentes de obra y emergencias.

3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo del presente informe se realizan los siguientes ensayos de laboratorio:

Fecha	Localización	Material	Ensayo
13/07/2023	Francisco José de Caldas – anden lateral Bloque L	Subbase B-400	Densidades
24/07/2023	San José Norte - placa de contrapiso de cafetería	Concreto	Resistencia a la compresión
26/07/2023	Rafael Bernal Jiménez, sede A -	Perfiles metálicos	Tintas
28/07/2023	Jorge Eliecer Gaitán - Cancha	Subbase B-400	Densidades
28/07/2023	Floridablanca - parqueadero	Base y subbase granular	Densidades

Tabla 111. Análisis de ensayos de laboratorio.

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las gestiones realizadas en seguridad y salud en el trabajo se presentan en anexo 7 – Informe SSTA

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL.

Se realiza acompañamiento a estas actividades ya que en la propuesta no se establece por parte de la SED, este profesional.

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe se encuentra en trámite acta de recibo parcial No. 6 del contrato de obra e interventoría.

De acuerdo con acta modificatoria No. 1 de adición y prorroga al contrato de obra con fecha 05 de abril de 2023, se adicionan ocho (8) instituciones educativas para adecuación y mantenimiento; de acuerdo a esto, a la fecha se encuentran activos dos (2) de los ocho (8) colegios de adición (IED San José Norte, sede A e IED Rafael Bernal Jiménez, sede B)

A la fecha del presente informe se encuentran activos los frentes de obra en IED Garcés Navas, IT. Francisco José de Caldas, sede A, IED Floridablanca, IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A, IED Justo Víctor Charry, IED Bernal Jiménez, sede A, IED Juan del Corral, sede A, IED San José Norte, IED Rafael Bernal Jiménez, sede B, IED República de Panamá e IED Simón Bolívar.

De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 90,30% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 65,00% para IED Francisco José de Caldas; 91,40% para IED Garcés Navas; 66,00% para IED Floridablanca; 75,00% para Justo Víctor Charry; 42,00% para Rafael Bernal Jiménez, sede A, 95,30% para Juan del Corral, 8,96% para San José Norte, 40,00% para Rafael Bernal Jiménez, sede B, 42,00% para República de Panamá; 4,80% para IED Simón Bolívar.

Con base en el atraso evidenciado, se requirió por parte de interventoría la implementación por parte de Safrid Ingeniería SAS plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos considerables que conlleven a posibles incumplimientos.

De acuerdo con el atraso evidenciado en el contrato, se encuentra en ajuste de programaciones de los frentes de obra en ejecución, esto a fin de cumplir con los compromisos en las fechas establecidas.

4.2. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, al cierre del presente informe se presenta un avance general ejecutado de 28,77%, con base en la programación presentada un avance general programado de 48,06%, teniendo una diferencia de 19,28% en atraso.

Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

Por parte de esta interventoría, a la fecha se ha efectuado el oportuno proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables por parte del contratista de obra.

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría ha emitido y exigido el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación.

Esta interventoría continúa a la espera del balance actualizado, programación de obra y plan de trabajo de los frentes pendientes, de acuerdo a los compromisos adquiridos, con el fin, de continuar con el seguimiento riguroso.

En aras de establecer un mejor control y seguimiento al contrato y dar cumplimiento a los procesos técnicos y administrativos en el menor tiempo posible, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría.

4.3. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaria de Educación del Distrito de sus buenas gestiones para adelantar las visitas a las instituciones educativas que se encuentran pendientes por iniciar, en aras de efectuar, las actas de recibo de espacios para desarrollar la intervenciones.

Se encarga a la entidad contratante la entrega de los planos existentes de las instituciones educativas, con el fin de identificar los elementos estructurales, eléctricos, Arquitectónicos, hidrosanitarios y demás que hacen parte de los colegios contractuales.

Se recomienda a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

Se instó a Safrid Ingeniería S.A.S., la implementación y cumplimiento riguroso del plan de contingencia presentado, de manera que se tomen las acciones pertinentes para alcanzar las metas propuestas durante los plazos establecidos, en aras de no incurrir en presuntos incumplimientos.

ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 2. BITÁCORA DE OBRA

ANEXO 3. INFORME SSTA

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

Anexo 1. ACTAS DE COMITÉ

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
22	14/06/2023	9:00 am		IED FLORIDABLANCA
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Concepto estructural San José Norte, Visita auto portante, placa y aula múltiple.	Contratista de obra	9 de junio de 2023	Pendiente
2	Programación por instituciones y general actualizada, flujo de inversión semanal actualizado, Balance presupuestal actualizado de todos las Instituciones	Contratista de obra	08 de junio de 2023	Pendiente
3	Visita técnica especialistas estructurales en IED San José Norte, Rafael Bernal Jiménez y Simón Bolívar (Pendiente)	Contratista de obra e interventoría	13 de junio de 2023	09 de junio de 2023
4	Fichas técnicas atención a emergencias	SED	14 de junio de 2023	Pendiente
6	Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte	Contratista de obra	09 de junio de 2023	Pendiente
7	Concepto geotecnia zapata Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	09 de junio de 2023	Pendiente
8	Concepto parqueadero Floridablanca	Contratista de obra	06 de junio de 2023	06 de junio de 2023
10	Programación general actualizada	Contratista de obra	09 de junio de 2023	Pendiente
11	Subsane observaciones Informes Mensuales No. 3 y No.4.	Contratista de obra	09 de junio de 2023	Pendiente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la presente semana se realiza:

- Fabricación e instalación de ventanas
- Demolición de muro corona lateral biblioteca
- Aplicación de estuco en aula de fotografía
- Instalación de perfiles en aula de disfraces
- Biblioteca y hall de segundo piso
- Fundición de viga cinta en biblioteca
- Afinado de alistado en aula fotografía y disfraces

De acuerdo a esto, en el frente de obra se evidencia un avance físico de **52,00%**, avance ejecutado de **25,26%**, avance programado de **32,13%**, teniendo una diferencia de **6,87%** en atraso.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza:

- Aplicación de estuco y pintura
- Instalación de enchape de piso
- Aplicación de pintura en techos
- Desmonte de tubería eléctrica y puntos eléctricos
- Fabricación e instalación de ventanería, regatas para tubería en baños de segundo piso, instalación de tubería hidrosanitaria y muros para baños de oficinas en segundo piso.

En consideración a lo expuesto, se refleja un avance físico de **48,00%**, avance ejecutado de **42,74%**, avance programado de **50,40%**, teniendo una diferencia de **7,66%** en atraso.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de cubierta.
- Instalación de perfiles y tejas.
- Instalación de manto en viga canal de aula múltiple.

Se evidencia un avance físico de **60,00%**, avance ejecutado de **49,24%**, avance programado de **84,89%,** teniendo una diferencia de **35,65%** en atraso.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realiza:

- Aplicación de pintura en arcos, canastas, cárcamos y cajas de inspección en canchas.
- Orden y aseo general.

A la fecha se observa un avance físico de **51,00%**, avance ejecutado de **26,84%** avance programado de **33,79%**, teniendo una diferencia de **6,94%** en atraso.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realiza:

- Pulida de enchape de piso y media caña.
- Instalación de sanitarios y orinales en baño de niños bachiller.
- Muro en bloque de división.
- Desmonte de puertas en baño de niños preescolar.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la obra, se evidencia un avance físico **27,00%**, avance ejecutado de **16,73%**, avance programado de **86,90%**, teniendo una diferencia de **70,17%** en atraso.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realiza:

- Alistado e instalación de enchape en shut de basuras.
- Orden y aseo general en obra.

Por lo anteriormente mencionado, se muestra un avance físico de **26,00%,** avance de ejecutado de **29,85%**, avance programado de **68,44%**, teniendo una diferencia de **38,59%** en atraso.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realiza:

- Limpieza de portón en entrada a terraza de comedor.
- Resanes y aplicación de pintura en puente y cerchas de salón de música.
- Aplicación de impermeabilizante en muros.
- Desmonte de manto asfáltico entre muro y cubierta de coliseo.
- Trasiego de materiales a terraza comedor.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%,** avance ejecutado de **20,70%**, avance programado de **20,22%**, teniendo una diferencia de **0,48%** en adelanto.

IED San José Norte

Durante la semana se realiza:

- Instalación de geotextil tejido 1700
- Relleno y compactación de recebo en aula múltiple.
- Demolición de piso en cafetería.
- Fundida de placa en laboratorio y biblioteca.

Se observa un avance físico de **35,00%**, avance ejecutado de **3,19%,** avance programado de **17,86%**, teniendo una diferencia de **14,67%** en atraso.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de juego infantil.
- Demolición de piso en zona de juegos.
- Acopio de material de demolición.

A la fecha se evidencia un avance físico de **5,00%** en atraso.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **17,91%,** con base en la programación presentada un avance general programado de **38,99%,** teniendo una diferencia de **21,08%** en **atraso** del contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 7 de 10 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

IED FLORIDABLANCA: Se solicita presentar el presupuesto actualizado de la sede educativa. Por otra parte se requiere identificar las alternativas de cerramiento (posible) para establecer el valor total de la intervención, de manera, que se observe el monto del contrato.

IED JORGE ELIECER RAMAN: Se requiere presentar Balance presupuestal actualizado, en aras, de revisar el alcance de la sede educativa.

IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Se solicita revisar alternativa de bajantes de agua lluvia de cubiertas en aras de evitar afectaciones a la fachada. Se requiere presentar balance presupuestal actualizado. Se establece para recalce de escalera la instalación de gravilla Menor en

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

En atención a **emergencias**:

se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala y un individuo arbóreo para poda en IED Naciones Unidas, sede B.

Instalación de tubería de 3" en acero inoxidable, embobinado de dos unidades de bombas y reparación de muro con concreto de reparación y epóxico en IED República de Panamá, sede C.

Finalizan con instalación de membrana en tanque de almacenamiento en IED Juan Francisco Berbeo.

- Se requiere realizar Visita de emergencia a Colegio Monsco para identificar las actividades a desarrollar conforme a correo remitido por la entidad.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED SAN JOSE NORTE: Se requiere la entrega de Balance presupuestal, flujo de inversión y programación de las actividades planteadas para la culminación de la sede educativa.

IED RAFAEL BERNAL JIMENO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

IED GABRIEL NAVAS: Pendiente entrega de Balance presupuestal actualizado. Se realizó reunión con rector de institución para efectuar la entrega de espacios de Aula Múltiple. Sin embargo, se solicitó la entrega de las áreas que se encuentran en intervención para efectuar la liberación de la cerca. Por otra parte, es pertinente suplementar con rigurosidad el plan de contingencia presentado

IED JUSTO VICTOR CHARRY: Se solicita avanzar en las obras de adecuación y mantenimiento de baños, en otras, de realizar la entrega a la institución educativa e iniciar con las baterías pendientes.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE A. Se solicita subsanar las observaciones realizadas a conceptos estructurales por parte de interventoría, por lo tanto se requiere a SAFECO INGENIERIA SAS avanzar con los trámites en aras de evitar afectaciones al desarrollo del contrato, con ello, contemplar con la intervención de cubierta, y plan de contrapaso.

IT JOAN DEL CORRAL: Balance presupuestal actualizado pendiente por revisar. Se requiere mantener la obra con la protección (cerramiento) adecuado, con el fin de evitar afectaciones a terceros. Se solicita avanzar en las actividades para evitar atrasos Mayores a los presentados en el proceso constructivo.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se requiere efectuar la disposición final de escombros procedentes del desmonte de teja de asbesto – cemento en las instituciones educativas IT. Francisco José de Caldas, IED Garcés Navas e IED Jorge Eliecer Gaitán acorde a lo presentado en el plan de manejo ambiental.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

TEMAS SOCIAL

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Concepto Estructural San José Norte Visita Cubierta acceptante, Placa, Aula Multiple	Responsable:	Contratista
		Fecha:	21 junio de 2023
2	Programación y Plazo de Intervención Semanal Actualizado San José Norte, Rafael Bernal Jimenez	Responsable:	Contratista
		Fecha:	15 de junio de 2023
3	Fichas técnicas atención emergencias	Responsable:	SED Apoyo
		Fecha:	21 de junio de 2023
4	Mesa de Trabajo Revisión Presupuesto San José Norte Rafael Bernal Jimenez	Responsable:	Contratista - Interventoria
		Fecha:	15 de junio de 2023
5	Visita Estructural Esp. Simón Bolivar IED	Responsable:	Contratista e Interventoria
		Fecha:	21 de junio de 2023
6	Concepto estructural Jorge Eliecer Carta	Responsable:	Contratista de obra
		Fecha:	21 de junio de 2023
7	Programación General Actualizada	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	21 de junio de 2023
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	
15		Responsable:	
		Fecha:	
16		Responsable:	
		Fecha:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 14 días del mes de junio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

MG. CAMILO A. SAMACÁ PEDZA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	14/06/2023	Lugar:	IED FLORIDABLANCA	Acta de seguimiento No:	22
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Natalia Calderón A.	Inspector Interventoría.	Consorcio Intercolegios 2022	interventoroaoso@gmail.com	3028328214	
Luis Carlos Tovar	Inspector SST	Consorcio - Inter colegios	Inspector3.cic2022@gmail.com	301 756 3586	
LUIS EDUARDO MONTES	SAFRID	Proyectosedgrupo2@gmail.com		3006613168	
Juan Carlos Valencia	Apoyo supervision	DCEE-JBD		3147125636	
ANGELA CAÑON R	ING. Residente	Safid Ingenieria	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3102532159	
Christian Barros L.	Inspector de Obra.	Safrid.	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3202331302.	
Jaime Alejandro Narvaez M.	Insp. de Obra	Safrid	proyectosedgrupo2@gmail.com	3138706331	
Jessica Alvarez M.	Insp. de obra	Safrid.	Proyectosedgrupo2@. gmail.com	3115546608.	
Adriana Montes	Residente obra	Safrid	11 11	3115395011	
Adrian Martinez V.	Auxiliar SST	Safrid	Proyectosedgrupo2@gmail.com	320 857 7806	
Jerson Higuita P.	Residente Obra	Safrid.	11	3134991838.	
Fredy G. Rodriguez S.	Director Interventoria.	consorcio Inter Colegios 2022	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	6015202359	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
23	20/06/2023	9:00 am		FRANCISCO I SEDE A
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante) - San José Norte	Contratista de obra	15 de junio de 2023	Pendiente
2	Programación y flujo de inversión semanal actualizado (San José Norte, sede A, Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra	15 de junio de 2023	20/06/2023
3	Visita técnica especialistas estructurales en IED Simón Bolívar (Pendiente)	Contratista de obra e interventoría	21 de junio de 2023	16/06/2023
4	Fichas técnicas atención a emergencias	SED	21 de junio de 2023	20/06/2023
5	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra	15 de junio de 2023	Pendiente
6	Concepto estructural área de biblioteca (Jorge Eliecer Gaitán, sede A)	Contratista de obra	21 de junio de 2023	Pendiente
7	Programación general Actualizada	Contratista de obra	21 de junio de 2023	20/06/2023
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la presente semana se realiza:

- Desmonte de cubierta aula 201-2A
- Instalación de estuco aula de Inglés y disfraces
- Instalación de enchape en piso de aula fotografía y disfraces
- Armado e instalación de ventanas en aluminio
- Corte, figurado, armado e instalado de hierros vigas cinta de aula 201-2A
- Soldadura y aplicación de pintura en perfiles aula 201-2A

De acuerdo a esto, en el frente de obra se evidencia un avance físico de **59,2%**, avance ejecutado de **25,26%**, avance programado de **35,54%**, teniendo una diferencia de **9,86%** en atraso.

- Pendiente: Concepto estructural área de biblioteca.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza:

- Instalación de enchape y guarda escobas en pasillo y oficinas de segundo piso.
- Aplicación de estuco y pintura en pasillo de primer piso y pasillo de segundo piso.
- Regatas en muro para tubería de agua potable y bajantes.

- Relleno y compactación para anden perimetral.
- Instalación de tubería de agua potable, bajantes y registros.
- Aplicación de boquilla en primer piso.

En consideración a lo expuesto, se refleja un avance físico de **50,00%**, avance ejecutado de **44,63%**, avance programado de **51,41%**, teniendo una diferencia de **6,78%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de cubierta en salón de profesores.
- Instalación de perfiles.
- Instalación de cubierta en biblioteca
- Instalación de manto en viga canal aula múltiple.
- Aplicación de pintura en puertas y ventanas de salones, baños y biblioteca en bloque B.
- Instalación de mampostería para nivelación de placa.

Se evidencia un avance físico de **62,00%**, avance ejecutado de **53,89%**, avance programado de **87,46%,** teniendo una diferencia de **33,57%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realiza:

- Excavación para cintas de confinamiento en andén lado canchas.
- Desmonte, limpieza y re nivelación de adoquín.

A la fecha se observa un avance físico de **51,00%**, avance ejecutado de **26,84%** avance programado de **34,21%**, teniendo una diferencia de **7,37%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realiza:

- Instalación de sanitarios y enchape de piso en baño de niños preescolar.
- Instalación de policuarzo en baño de niños bachiller y preescolar.
- Desmonte de puertas.
- Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.
- Demolición de enchape.
- Demolición de divisiones de baño.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la obra, se evidencia un avance físico **32,00%**, avance ejecutado de **16,73%**, avance programado de **90,21%**, teniendo una diferencia de **68,84%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realiza:

- Fundida de placa en tarima aula múltiple.
- Fundida de maestras para alistado piso aula múltiple.

Por lo anteriormente mencionado, se muestra un avance físico de **31,30%,** avance de ejecutado de **37,72%**, avance programado de **72,69%**, teniendo una diferencia de **34,96%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de aluminio y vidrios claraboya
- Instalación de lucarnas
- Instalación de cerramiento placa acceso principal
- Desmonte de flanches cubierta coliseo
- Instalación de cerramiento placa acceso principal
- Demolición de alistado en terraza acceso a la institución
- Desmonte de alambron y flanches en salón de música

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **50,3%,** avance ejecutado de **23,73%**, avance programado de **25,98%**, teniendo una diferencia de **2,25%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED San José Norte

Durante la semana se realiza:

- Relleno y compactación de recebo en aula múltiple.
- Demolición de piso, enchape de muros y mesones de concreto en cocina.
- Desmonte de lavamanos en cocina.

Se observa un avance físico de **38,00%**, avance ejecutado de **3,38%,** avance programado de **19,64%**, teniendo una diferencia de **16,26%** en atraso.

Pendiente:

- Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante)
- Programación y flujo de inversión semanal actualizado

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana no se realizan actividades en el frente de obra.
A la fecha se evidencia un avance físico de **5,00%** en atraso.

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- . Pendiente: Presupuesto Actualizado.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED GAICES NARAS: Teniendo en cuenta que se viene adelantando el desmonte de cobierta del bloque de Aula múltiple, se requiere realizar la debida señalización para mitigar afectaciones al personal de la institución y de obra. Así mismo, es pertinente realizar la adecuada disposición final de la teja de asbesto en aras de evitar impactos en las ambientales en las áreas a intervenir. (implementar plan de Contingencia).

FLORIDABLANCA IED: Se solicita efectuar presupuesto actualizado de la institución, de manera que se determine el Alcance real del frente de obra.

JUSTO VICTOR CHARRY IED: Con base a los atrasos presentado se requiere de manera inmediata implementar plan de contingencia de manera rigurosa en aras de alcanzar las metas trazadas.

IED. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ: Se solicita realizar un corado de la nivelación de piso conforme a lo manifestado en los conceptos emitidos por los especialistas en estructuras. Por otra parte se requiere revisar el balance presupuestal, para establecer el alcance real de contrato en el frente de obra. Se solicita implentar plan de acción para mitigar atrasos.

I.T. JUAN DEL CORRAL; SEDE A: Es pertinente revisar las actividades de ruta crítica en aras de evitar retrasos. Se requiere ajustar balance presupuestal de la institución

SAN JOSE NORTE IED: Presenta atrasos respecto a la programación presentada (adición), Se solicita de manera inmediata entregar

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **19,16%,** con base en la programación presentada un avance general programado de **42,06%,** teniendo una diferencia de **22,90%** en **atraso** del contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en todos los frentes por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Emergencias Educativas:

Por parte de Apoyo de Supervisión de Contrato se remite las siguientes fichas de atención de emergencias:

- Juan Francisco Berbeo
- Tomas Carrasquilla
- Rafael Bernal Jimenez.

En el transcurso de la semana se continuara gestionando las fichas pendientes.

IED JOSE ELIECER GAITAN: Se requiere presentar presupuesto actualizado de la obra. se remite concepto de geotecnia cancha de institución educativa. Se solicita revisar el concepto emitido para la construcción de cimentación de columna salón de (una hoya) con el fin de continuar con la construcción de los elementos

IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS; SEDE A; Se requiere de las buenas gestiones por parte de SED para ~~[illegible]~~ llamar a las directivas del colegio para evitar afectaciones a las obras que se vienen adelantando, debido a que en ocasiones, el alumnado causa daños en muros, ventanas y demás obras desarrolladas. Se realizara embobinado de piso conforme a las directrices entregadas por SED, color gris.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

balance presupuestal actualizado. Se realiza entrega por parte de SED de planos de aulas modulares para su respectiva revisión, con ello, avanzar en el proceso constructivo de las mismas.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE B: Se requiere efectuar las actividades conforme a los términos establecidos.

EMERGENCIAS:

- Se solicita realizar el ajuste correspondiente de las mallas de cerramiento de Francisco José de Caldas, sede A, con ello, evitar afectaciones a la sede educativa.
- Juan Francisco Berbeo: Estan pendientes los originadores del tanque de la institución
- IED. Panamá, sede C: Se encuentran realizando llenado de tanque para efectuar la prueba de bombas.
- IED. HELADIA MEJIA (Barios Unidos): Se requiere efectuar visita de diagnóstico a la infraestructura de la institución educativa.
- IED. MORISCO: Se requiere iniciar las actividades establecidas para la atención solicitada por la institución, con ello, cerrar lo requerido por SED.

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se requiere efectuar la disposición final de escombros procedentes del desmonte de teja de asbesto – cemento en las instituciones educativas IT. Francisco José de Caldas, IED Garcés Navas e IED Jorge Eliecer Gaitán acorde a lo presentado en el plan de manejo ambiental.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Concepto Estructural (Placa aula múltiple, cubierta entrepiso) San José Norte.	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 21/06/23
2	Fichas técnicas atención de Emergencias	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 27/06/23
3	Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jimenez) (4:00pm)	Responsable: Contratista de Obra. Fecha: 21/06/23
4	Concepto Estructural área Biblioteca (Jorge Eliecer Gaitan) sede A.) - Cubierta	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 23/06/23
5	Mesa de Trabajo eléctrico Concepto	Responsable: Fecha:
6	Visita Garcés Navas OTIC. (9:00am)	Responsable: Contratista, Interv, SED. Fecha:
7	Ajuste plan de Contingencia.	Responsable: Fecha:
8		Responsable: Fecha:
9		Responsable: Fecha:
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 21 días del mes de junio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

ING. ANGELA CAÑÓN RIVERA
Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	20/Junio/2023	Lugar:	Francisco J Sede A.	Acta de seguimiento No:	23
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
ANGELA CAÑÓN	Ing. Residente	Safid Ingeniería	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3102532159	
Jerson Higuita	Ing. Residente.	Safid Ing.	" "	3134491838.	
Manuel Gonzalez	Coord. Proyectos	Consorcio Inter Colegios 2022	Director1.gng@gmail.com	6017122685	
Juan Carlos valencia	Apoyo supervision.	SED - DCCBE		3142125836	
LUIS EDUARDO MUNTOS	SAFRID D. OBRA	SAFRID	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3006613168	
Adriana Mendez	Residente obra	Safid.	" "	3115395011	
Jaime Alejandro Florero	Insp. de obra	SAFRID	proyectosedgrupo@email.com	3138706334	
Christian Barros L.	Insp de Obra	Safid	" "	3202331302	
Camilo Antonio Jamaica Perez	Residente Interventoría	Consorcio Interdegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163340746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	N° REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
24	27/06/2023	8:30 am	12:00 pm	IED. SAN JOSE NORTE

Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra		
INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante) - San José Norte	Contratista de obra	21 de junio de 2023	21 de junio de 2023
2	Programación y flujo de inversión semanal actualizado (San José Norte, sede A, Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra	20 de junio de 2023	20 de junio de 2023
3	Visita técnica especialistas estructurales en IED Simón Bolívar (Pendiente)	Contratista de obra e interventoría	21 de junio de 2023	Pendiente
4	Fichas técnicas atención a emergencias	SED	27 de junio de 2023	Pendiente
5	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra	21 de junio de 2023	Pendiente
6	Concepto estructural área de biblioteca (Jorge Eliecer Gaitán, sede A)	Contratista de obra	23 de junio de 2023	Pendiente
7	Programación general Actualizada	Contratista de obra	21 de junio de 2023	Pendiente
8	Ajuste plan de contingencia General de frentes activos	Contratista de obra	27 de junio de 2023	Pendiente
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la presente semana se realiza:

- Instalación de enchape de piso y gravilla en pasillo de segundo piso
- Aplicación de pañete en cuchillas de aula 201-2ª
- Instalación de perfiles para estructura cubierta aula 201-2A
- Alistado en aula de dibujo

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **64,70%**, avance ejecutado de **27,91%**, avance programado de **40,41%**, teniendo una diferencia de **12,50%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.
- Concepto zapata salón de Dibujo.
- Balance Presupuestal actualizado.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza:

- Demolición de placa y excavación manual en anden perimetral bloque L.
- Aplicación de boquilla en enchape de piso.
- Aplicación de estuco y pintura en segundo piso.
- Desmonte de ventanas y puerta en zona de escaleras.

- Instalación de ventanas en segundo piso.
- Demolición de alistado de escaleras.
- Instalación de enchape y cielo raso en baños de oficinas.
- Instalación de tubería y puntos eléctricos en primer piso.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **53,00%**, avance ejecutado de **49,25%**, avance programado de **52,83%**, teniendo una diferencia de **3,58%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.
- Visita de especialistas eléctricos.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de cubierta en salón de profesores y aula múltiple.
- Instalación de perfiles.
- Instalación de cubierta en biblioteca
- Instalación de manto en viga canal aula múltiple.
- Aplicación de pintura en puertas y ventanas de salones, baños y biblioteca en bloque B.
- Fundida de viga de confinamiento en salón de profesores.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **67,00%**, avance ejecutado de **52,16%**, avance programado de **89,81%**, teniendo una diferencia de **37,64%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.
- Desmonte de redes OTIC – Urgente.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realiza:

- Fundición de placa en cuarto de máquinas.
- Limpieza de adoquín sendero peatonal.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **52,00%**, avance ejecutado de **27,82%** avance programado de **35,22%**, teniendo una diferencia de **7,39%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realiza:

- Demolición de divisiones en baño de niñas preescolar.
- Desmonte de aparatos sanitarios y puertas en baño de niñas preescolar.
- Demolición de enchape de baño niñas bachiller y preescolar.
- Demolición de mesón de lavamanos en baño de niñas bachiller.
- Instalación de enchape en granito pulido baño niños preescolar.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **40,00%**, avance ejecutado de **25,93%**, avance programado de **96,37%**, teniendo una diferencia de **70,45%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realiza:

- Fundida de alistado de piso en aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,30%,** avance de ejecutado de **46,19%**, avance programado de **76,41%**, teniendo una diferencia de **30,22%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de aluminio y vidrios claraboya
- Instalación de lucarnas
- Instalación de cerramiento placa acceso principal
- Desmonte de flanches cubierta coliseo
- Instalación de cerramiento placa acceso principal
- Demolición de alistado en terraza acceso a la institución
- Desmonte de alambron y flanches en salón de música

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **80,30%,** avance ejecutado de **28,71%**, avance programado de **31,63%**, teniendo una diferencia de **2,92%** en atraso.

- Pendiente: Presupuesto Actualizado.

IED San José Norte

Durante la semana se realiza:

- Relleno y compactación de recebo en aula múltiple.
- Demolición de piso, enchape de muros y mesones de concreto en cocina.
- Desmonte de tubería eléctrica e hidráulica en cocina.
- Aplicación de pañete en muros de laboratorio y biblioteca.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**, avance ejecutado de **3,55%,** avance programado de **1,18%**, teniendo una diferencia de **-2,37%** en avance.

- Pendiente: Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante)

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana no se realizan actividades en el frente de obra.
A la fecha se evidencia un avance físico de **5,00%** en atraso.

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **20,83%,** con base en la programación presentada un avance general programado de **32,81%,** teniendo una diferencia de **11,98%** en el contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos, a la fecha se evidencia atraso en 8 de 9 instituciones por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

En atención a emergencias se realiza visita a institución ***IED Heladia Mejía, sede B*** en compañía de contratista de obra, supervisión de la Secretaría y directivas institucionales a fin de definir alcance de la intervención; se solicita realizar demolición de enchape existente, instalación de enchape en porcelanato y arreglo de humedad en pared afectada en aula de transición; se evidencia estructura de cubierta en madera con esterilla por lo que se solicita realizar un diagnóstico de la cubierta y la fumigación de la misma.

IED SAN JOSE NORTE: Se realiza recorrido por parte de Contratista de obra, Supervisión de Contrato e Interventoría, de compañía de especialista de estructuras de Consorcio Intercolegios 2022, de manera que se identifica las caracteristicas de los modulares existentes, revisada el area donde se proyectan las aulas se dejan las siguientes consideraciones:

- Se solicita realizar apiques y caracterización del suelo en pro de establecer la capacidad portante del terreno, así mismo, identificar los materiales existentes.
- Una vez efectuado el concepto desde el area en geotecnia, se requiere las alternativas de cimentación conforme a las cargas a soportar de la estructura.
- Se solicita desarrollar mesa de trabajo para definir la conexión de los elementos estructurales de las aulas modulares.
- Se solicita de manera urgente la entrega de concepto estructural de cubierta actoportante con su respectivo balance presupuestal.
-

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

JORGE ELIECER GAVIAN: Se solicita presenta concepto de componente geotecnia referente a zapata para estructura de cobertura salón de Ubaya. Se requiere entrega los atrasos presentados. Se requiere presentar cronograma actualizado

IED. FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Se vienen adelantando labores para acelerar la entrega del bloque en intervención de manera que SAFRID. INGENIERIA SAS efectuara el total de actividades para la entrega formal del bloque. Se requiere avanzar en aras de cumplir con los términos establecidos. Se solicita presentar cronograma actualizado.

IED. GABRIEL NAVAS: Teniendo en cuenta las actividades que se vienen realizando en el frente de obra, se solicita dar prioridad a la disposicion final de escombros a los correspondientes sitios autorizados, de manera que se evite acumulacion de los mismos. Respecto al mobiliario de OTIC, se requiere presentar a SED la trazabilidad de parte de Contratista de Obra e Interventoría, donde se manifieste a OTIC el desmonte del mismo

IED FLORIDABLANCA: Se encuentra pendiente la entrega de observaciones realizadas a concepto de geotecnia de parqueadero

IED JOSE VICTOR CHAPAY: Es pertinente revisar los atrasos presentados en el frente de obra, se solicita implementar plan de accion para mitigar la situacion. Asi mismo, actualizar en obra el proceso constructivo conforme a Cronograma.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ; SEDE A: Se solicita realizar plan de acción para mitigar atrasos. Es pertinente que se acelere las intervenciones y aumento de personal de obra para alcanzar las metas propuestas.

IED JUAN DEL CORRAL: Se encuentra pendiente la instalación de polisombra; debido a las condiciones climáticas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y recomendaciones de instalación. Se informa por parte de apoyo a IED la realización de visita para revisar el estado de la red contraincendios, por parte de contratista de Obra e Interventoría se efectuará el análisis correspondiente en aras de brindar un diagnóstico.

IED. Rafael BERNAL JIMENEZ SEDE B: Es pertinente avanzar en las actividades conforme a los plazos establecidos. De acuerdo al avance del total del Contrato se requiere a Contratista de obra tomar las acciones a que haya lugar para mitigar los atrasos presentados. Por otra parte; se solicita a Contratista de obra, efectuar la toma de muestras de concreto conforme a lo estipulado en la NSR-10.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se requiere efectuar la disposición final de escombros procedentes del desmonte de teja de asbesto – cemento en las instituciones educativas IT. Francisco José de Caldas, IED Garcés Navas e IED Jorge Eliecer Gaitán acorde a lo presentado en el plan de manejo ambiental.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 27 días del mes de junio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

ING. ANGELA CAÑON RIVERA
Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodriguez Salazar
Director de interventoria

CAMILO ANTONIO SAAVEDRA PESCA
Residente de interventoria

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Concepto estructural Simón Bolívar	Responsable: Contratista Fecha: 30/06/23
2	Fichas Técnicas Atención Emergencias	Responsable: Apoyo Supervisión Fecha: 05/07/23
3	Mesa de trabajo de Revisión Presupuesto actualizado	Responsable: Contratista Fecha: 30/06/23
4	Ajuste Plan de Contingencia General	Responsable: CONTRATISTA Fecha: 04/07/23
5	Visita Colegio Juan del Corral	Responsable: SED, INTERVENTORIA, CONTRATISTA Fecha: 30/06/23
6	Apiques - Caracterización de Suelo de fundación Aulas modulares San José Norte	Responsable: Contratista Fecha: 04/07/23
7	Concepto estructural Cubierta autoportante San José Norte - Balance Presupuestal	Responsable: Contratista Fecha: 05/07/23
8	Cronograma actualizado General	Responsable: Contratista Fecha: 29/06/23
9	Retiro y Disposición final de escombros a sitio autorizado - Teja asbesto	Responsable: Contratista Fecha: Inmediato
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:		Lugar:		Acta de seguimiento No:	24
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
JAIRO ANDRÉS MORA	RESP. ESTRUCTURAL	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022	jairomeza@eacoingenieria.com	3173726734	
ANGELA CAÑÓN	Residente de obra	Safrid ingeniería	Proyectogrupo2@gmail.com	3102532159	
Christian Barros L	Inspector de Obra	Safrid.	" "	3202331302	
Adrian Martinez V.	Aux SST.	Safrid	" " "	3208577806	
Sergio Higuita T.	Residente Obra	Safrid	" " "	3134491838	
Claudia P. Habecha G.	Residente SST	Safrid	" " "	3203152416	
Alvaro Nardot	Residente obra	Safrid	" "	3115395011	
Jaime Alejandro Moreno M.	Insp. de obra	SAFRID	proyectosedgrupo2@gmail.com	3138706334	
Jessica Alvarez Of.	Insp de obra.	Safrid.	Proyectosedgrupo2@Gmail	3155986088	
Juan Diego Cardoza	" " "	Safrid	" " "	3117331417	
SANDRA HUERTAS	INSP SST.	SAFRID	" " "	3164985903	
LUIS EDUARDO MONTES	DIRECTOR OBRA	SAFRID	" " "	3006613168	
Juan Carlos Valencia	Apoyo Supervisión	DCEE-SED		3147125636	
Fiedy G. Rodriguez S.	Directa Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	fiedy.rodriguezgrg@gmail.com	6015202359	
Camilo A. Saavedra Pérez	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163340746.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
25	07/07/2023	2:00 pm	4:00 pm	IED JORGE ELIECER GAITAN
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Concepto estructural– Simón Bolívar	Contratista de obra	30 de junio de 2023	05 de julio de 2023
2	Fichas técnicas atención a emergencias	SED	05 de julio de 2023	Pendiente
3	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	30 de junio de 2023	Pendiente
4	Ajuste plan de contingencia general	SED, interventoría, contratista de obra	04 de julio de 2023	Pendiente
5	Visita colegio Juan del Corral revisión de tanques.	Contratista de obra	30 de junio de 2023	Pendiente
6	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte.	Contratista de obra	04 de julio de 2023	Pendiente
7	Concepto estructural cubierta auto portante San José Norte – Balance presupuestal	Contratista de obra	05 de julio de 2023	Pendiente
8	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	29 de junio de 2023	Pendiente
9	Retiro y disposición final de escombros a sitio autorizado – teja en asbesto	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la presente semana se realiza:

- Aplicación de estuco en aula 201-2A y 116-2A
- Aplicación de pintura en parte externa de aulas 116-2A, 115-2A, fotografía e Inglés
- Excavación y fundición de zapata en aula de dibujo
- Demolición de piso y guardaescoba en biblioteca
- Instalación de alistado de piso en biblioteca
- Instalación de vidrios en ventanas.
- Soldadura y pintura en perfiles para cubierta en recepción
- Alistado de muro en fachada principal

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **68,70%**, avance ejecutado de **40,03%**, avance programado de **43,54%**, teniendo una diferencia de **3,51%** en atraso.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza:

- Aplicación de pintura en oficinas de primer piso.
- Compactación de recebo en andén perimetral.

- Instalación de ventanas.
- Instalación de enchape en muros de baños de oficinas.
- Recalce, alistado e instalación de enchape en escaleras.
- Instalación de tubería y puntos eléctricos en aulas de primer piso.
- Aplicación de boquilla en aulas de primer piso.
- Instalación de drywall en viga canal de oficina No. 1 de segundo piso y baños.
- Instalación de boca puerta en gravilla para aulas.
- Instalación de ventanas de zona escaleras.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **58,00%**, avance ejecutado de **50,89%**, avance programado de **55,07%**, teniendo una diferencia de **4,17%** en atraso.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realiza:

- Desmonte de cubierta en salón de profesores y aula múltiple.
- Instalación de perfiles.
- Instalación de cubierta en salón de profesores y biblioteca
- Instalación de manto en viga canal aula múltiple.
- Aplicación de pintura en puertas y ventanas de salones, baños y biblioteca en bloque B.
- Fundida de viga de confinamiento en salón de profesores.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **63,00%**, avance ejecutado de **52,89%**, avance programado de **92,15%,** teniendo una diferencia de **39,27%** en atraso.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realiza:

- Corte en placa de cuarto de máquinas.
- Trasiego de material a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **53,00%**, avance ejecutado de **27,82%** avance programado de **36,50%**, teniendo una diferencia de **8,67%** en atraso.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realiza:

- Demolición de enchape en baño niñas de bachiller y preescolar.
- Demolición de mesón de lavamanos en baño de niñas bachiller.
- Aplicación de pañete y enchape en baño de niñas bachiller y preescolar.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **48,00%**, avance ejecutado de **27,28%**, avance programado de **99,72%**, teniendo una diferencia de **72,43%** en atraso.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realiza:

- Instalación de ladrillo e instalación de enchape en área de shut de basuras
- Desmonte de cubierta en aula múltiple

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **50,30%,** avance de ejecutado de **46,72%**, avance programado de **82,19%**, teniendo una diferencia de **35,47%** en atraso.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realiza:

- Demolición e instalación de alistado en terraza de acceso a la institución
- Instalación de flanche perimetral en terraza de comedor
- Trasiego de materiales a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **83,30%,** avance ejecutado de **29,12%**, avance programado de **37,25%**, teniendo una diferencia de **8,13%** en atraso.

IED San José Norte

Durante la semana se realiza:

- Instalación del geotextil en zona de cocina y cuarto de sonido de aula múltiple.
- Fundida de placa de contra piso en aula múltiple.
- Mampostería en puerta de biblioteca.
- Instalación de la malla electro soldada en el aula múltiple.
- Desmonte de cubierta en laboratorio.
- Zafarreo de muros en aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**, avance ejecutado de **4,67%,** avance programado de **1,16%**, teniendo una diferencia de **-3,51%** en avance.

- Pendiente: Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante)

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Excavación manual para viga de cimentación en zona de juegos.
- Armado de hierro para viga de cimentación.

A la fecha se evidencia un avance físico de **12,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realiza:

- Demolición de muros en comedor
- Demolición de enchape de muros
- Demolición de mesón de cocina
- Desmonte de lámparas, lavaplatos
- Demolición de pisos comedor y patio

De acuerdo a esto, a la fecha se evidencia un avance físico de **12,00%.**

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **23,18%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **35,49%,** teniendo una diferencia de **12,31%** en el contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos, a la fecha se evidencia atraso en 8 de 10 instituciones por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

En atención a emergencias se realiza en **IED Heladia Mejía, sede B**:

- Demolición de enchape en aula de preescolar
- Reparación de muro por humedad en aula de preescolar.

IED JORGE ELIECER GAITAN: Se realiza recorrido de campo verificando el estado de instalación de estructura metálica, de manera, que Supervisión de Contrato realiza observaciones conforme a concepto estructural entregado de manera, que se evidencian no conformidades en la instalación de anclajes, por lo tanto, es pertinente revisar teniendo en cuenta el detalle estructural. Por otra parte, se solicita analizar la posibilidad de reutilizar el material de demolición de cancha para que haga parte de la estructura planificada para la intervención de la misma. Se solicita presentar el concepto eléctrico para las aulas de la institución educativa ajustada con base a lo estipulado por el asesor eléctrico. Se solicita cumplir el alcance planificado para la sede educativa.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Se realizó revisión de programación por etapas en el frente de obra. Se efectuó mesa de trabajo para establecer los puntos eléctricos de las aulas ~~[illegible]~~ intervenidas. Por otra parte, se solicita revisar la inclusión de escalera de emergencia teniendo en cuenta lo evidenciado en campo. Se define pintura de Fachada Graniplast (Gris, Basalto Amarillo, Gris claro) por parte de SED.

IED GARCES NAVAS: Se hace entrega de aulas 201-202-203 a almacenista de institución educativa, se queda pendiente de entrega de instalación eléctrica de las mismas. Se solicita avanzar en la revisión de conceptos eléctricos para agilizar la terminación definitiva de las intervenciones.

IED. FLORIDABLANCA: Se requiere avanzar en las obras para mitigar los atrasos presentados. Se encuentra pendiente la entrega de espacios de BLOQUE 3ENA., en aras, de avanzar en las actividades planeadas.

IED. VICTOR CHARRY: Se solicita agilizar las actividades que se encuentran pendientes, considerando lo presentado en programación general.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ: (A) Se solicita incrementar el personal de obra; para mitigar los atrasos presentados. Es pertinente, realizar la entrega de soporte, de personal de trabajos en alturas, en aras de surtir afectaciones del personal.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED JUAN DEL CORRAL: Se solicita avance en las actividades programadas en aras de entrega del frente de obra. Se solicita revisar tanques por tema de infiltraciones, así mismo realizar el diagnóstico de equipos y tanque.

IED SAN JOSE NORTE: Se viene adelantando la fabricación de estructura metálica conforme a planos de taller. Se solicita realizar actualización de presupuesto. Se requiere presentación de cuadro comparativo de tejas antiporfante. Se solicita realizar dilataciones de pisos

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE B: Se requiere presentar flujo de inversión semanal y programación del frente de obra. Por otra parte es importante, realizar de manera detallada ajuste a presupuesto contractual

IED REPUBLICA DE PANAMÁ: Se solicita realizar la implantación de diseños de cocina modular, teniendo en cuenta los espacios entregados para la intervención.

Teniendo en cuenta lo evidenciado en cada uno de los frentes, es pertinente que SAFRO INGENIERIA SAS presente de manera urgente la programación actualizada y flujo de inversión semanal. Con el fin de realizar el control y seguimiento conforme a lo estipulado en pliegos de condiciones y anexos técnicos.

Se remite a Contratista de obra, desarrollar las actividades con base a los conceptos emitidos por los especialistas de cada una de las áreas involucradas al proyecto.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

Se requiere a Contratista de obra efectuar las dilataciones de placa en los términos establecidos en la especificación técnica, en aras de evitar pérdida de estabilidad de las obras planteadas en las sedes donde se adelantan labores.

Se solicita realizar la toma de muestra teniendo como base la norma NSR-10, de manera que pueda validarse la calidad de los materiales (concreto). Así mismo, realizar las pruebas y/o ensayos a que haya lugar para los materiales pétreos. conforme a la normatividad vigente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se requiere efectuar la disposición final de escombros procedentes del desmonte de teja de asbesto – cemento en las instituciones educativas IT. Francisco José de Caldas, IED Garcés Navas e IED Jorge Eliecer Gaitán acorde a lo presentado en el plan de manejo ambiental.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Se solicita revisar la utilización de EPP y porte de los mismos en cada uno de los frentes

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Mesa de trabajo revisión presupuesto Sem José Norte y Rafael Bernal Jimenez, Sede B	Responsable:	Contratista de obra - Interventoría
		Fecha:	10-07-2023
2	Ajuste Plan de Contingencia General	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	10-07-2023
3	Caracterización Suelo de fundación de aulas Modulares Sem José Norte	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	11-07-2023
4	Cuadro Comparativo - Balance Presupuestal Cubierta aeroportante Sem José Norte	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	11-07-2023
5	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	11-07-2023
6	Entrega de Certificaciones - Soportes de Personal idoneo para trabajo en Alturas	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	Inmediato.
7	Bitácora IED. Rafael Bernal Jimenez Sede B y IED. República de Panamá - Suministro	Responsable:	Contratista de obra
		Fecha:	Inmediato.
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	
15		Responsable:	
		Fecha:	
16		Responsable:	
		Fecha:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los____días del mes de julio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

CAMILO ANTONIO JAMACÁ PESCA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	07/07/2023	Lugar:	JORGE ELIECER GAITAN SED	Acta de seguimiento No:	25
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Juan Carlos Valencia	Apoyo supervision	JED - DCCEE		3142125836	
Rodolfo Castro	Residente interventoria	Consorcio Inter Colegios 2022	Rodolfo.castro.grg@gmail.com	3175159255	
Jaime Alejandro Alvaro Mendez	Inspector de obra	SAFRID	proyectosedgrupo2@gmail.com	3138706334	
Simon Quiñones	Inspector SST - Interventoria	GNG/DCCEE	Inspector3.grgsas@gmail.com	3102771691	
Adrian Martinez	Auxiliar SST	Safrid	proyectosedgrupo2@gmail.com	320 857 7806	
Sandra Huertas	INSP SST.	SAFRID	" " " "	3164985903	
Claudia Machacha	INSP. SST	Safrid	" " " "	3203782476	
Edison Calderon C.	Insp. tec. interv.	Consorcio Inter Colegios	Inspector2.ci2022@gmail.com	3172588098	
Gibson González	Inspector de obra	Safrid	" " " "	3777162736	
Jerson Augusto F.	Residente Obra	Safrid.	" "	3134491838	
Juan Diego Cadena	Inspector obra	Safrid	" "	3117331419	
Fredy G. Rodriguez S.	Director Interventoria	Consorcio Inter Colegios 2022	fredy.rodriguez.grg@gmail.com	6315702359	
Luis Eduardo Montes	Director obra	SAFRID	" "	3006613168	
Edwin Sosa Tovar	Profesional especializado	DCCEE-SED	esalazar@educ	BAJA	
Manuel Gonzalez	Coord. Proyec.	Consorcio Inter	Director1.grg@gmail.com	3008581330	
Camilo A Zamacei	Residente Interventoría	" "	residente1-ci2022@gmail.com	3163340746.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Anexo 2. BITÁCORA DE OBRA

IED. JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A

Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Mini excavadora o Hoyo
Retomartillo, soldador
Compresor
Andamio certificado y tubular
Herramienta menor
Actividades: picado de muros fachada principal
biblioteca, fachada frente cancha:
instalación de pañete en fachada principal biblioteca-
fachada cancha.
Instalación de teja ecola de dibujo-
Excavación cancha:
Demolición cancha y patio principal
Nota: se requiere del contratista tener en cuenta.
los niveles de la cancha para la realización
de la demolición y excavación de la misma y así
evitar sobreexcavaciones los cuales no serán objeto
de pago.

Inspector interventoria. IDU cobra

11-07-2023 Interventoria, requiere al contratista de obra para la respuesta al concepto emitido por el especialista para el area de la cancha, ya que se evidencia la demolicion de las placas existente y la residencia de obra no tiene claridad de las actividades a realizar de igual manera interventoria solicito el manejo de aguas de la cancha y a la fecha no se ha remitido para revision, de igual manera el presupuesto ajustado no se ha remitido, se requiere a SAFRAD por la entrega de la documentacion pertinente de manera inmediata.

RESIDENTE INTERVENTORIA CAMILO A. SAMACA.

D. Fredy Rodriguez

Se realiza recorrido por interventoria y se observa la el acopio de Residuos RCD en la institución, por tanto, se le solicita realizar gestión de estos residuos. Por otro lado se aprecia el exceso de humo generado por la retroexcavadora así como visualmente la presunta fuga de aceite, al respecto se le solicita al contratista de obra hoja de vida y certificado del ultimo mantenimiento realizado. Asesor Ambiental

Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: soleado.
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector SST
Maestro (1)
Oficial (6), Ventanero (2)
Ayudante (2) Alarife (1)
Operador minicargador (1)
Operador Bobcat (1)
Personal interventoria: Director
Residente.
Residente ambiental
Equipos y herramientas: Bobcat, minicargador
Retomartillo, vibradora
Andamio certificado y tubular
Herramienta menor
Actividades: Demolición pavimento y cerca,
excavación en cancha
picado de muros fachada biblioteca y fachada
frente cancha, pañete
Estuco y pintura aula biblioteca.
Enchape cuero bajo
Nota: Visita de interventoria y recorrido por
la institución:

Inspector interventoria. Firma Adm

12-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado

Powered by CamScanner

Tarde. Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
Maestro
operadores Bobc. y mini ret. (2)
Ventanero (2)
Oficiales (6)
Ayudantes (3), Azo (1)
Personal intervención: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, mini retroexcavadora
Rotomartillo, picadoras
Compresor.
Andamio certificado y tubulares.
Actividades: Demolición y excavación piso concreto.
picado de muros y pintar en fachada
principal biblioteca y fachada frente cancha.
Modelación y dilatación piso para enchape aula
dibujo
Orden y aseo

12-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Soleado.
Personal intervención: Inspector técnico
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
operadores maquina (2)
Maestro.
Oficiales (6)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: Bobcat, mini retroexcavadora
Rotomartillo certificado
Andamio tubulares
Rotomartillo
Herramienta menor

Actividades: Enchape piso aula de dibujo
Demolición concreto patio principal
picado de muros en fachada principal y fachada
frente a cancha
Demolición y excavación en cancha y retiro
de material excavado
Estuco aula 3 2° piso

14-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado lluvia (2:00 pm)
Tarde: Nublado lluvias continuas.
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Ventanero (2)
Oficiales (6) operad. maq. (2)
Ayudantes (3)
Equipos y herramienta: Bobcat
Taladradora, picadora
Rotomartillo
Andamio certificado
" tubulares
Herramienta menor
Actividades: enchape aula de dibujo
Estuco aula 3 2° piso y techo
Demolición concreto
Repicado piso cancha.
Armado y instalado ventanas.
picado de muros fachadas.

15-07-2023 Estado del clima: Mañana soleado.
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Oficiales (5)
Ventanero (2)
Ayudantes (3)

Powered by CamScanner

Inspector interventoría:
Equipos y herramientas: Bobcat
transadera
Andamios certificado
y tubulares
Herramienta menor
Actividades: picado y pañete muros fachadas.
entrepiso de piso cuarto de baño
Replanteo y nivelación piso cuartos
Armado e instalación de ventanas

17-07-23. INTERVENTORIA REALIZA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES USO ADECUADO DE LOS EPP, REFORZAR SOBRE TEMAS DE ALTURAS, SE REALIZO CHARLA CON TODO EL PERSONAL SOBRE EL TEMA DE ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO TSA.
COORDINADOR: YOHAN HUERTAS — INTERVENTORIA SST.
Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas.
Tarde: soleado lloviznas después de las 4:20 pm.
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
Maestro
Ventanero (2)
oficial (6)
Ayudante (3)
Orden y aseo (1)
Personal de interventoría: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, Retrofit
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramientas menor
Actividades: Entrepiso piso cuarto de baño
picado y pañete muros fachada

Replanteo y nivelación cenefa
Estuco en cuarto 3er piso
Nota: se visita el contratista realizara las actividades de nivelación, excavación replanteo de acuerdo el concepto dado por el especialista y avalado por interventoría

18-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector técnico
Director
Inspector sst
Maestro
Ventanero (2)
oficiales (6)
Ayudantes (3) Aseo (1)
Personal interventoría: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, Retrofit
Andamio certificado y tubular
Herramienta menor
entrada de material: 4 viajes doble troque B-400
Actividades: Instalación de geotextil
Instalación de mate. B-400 compactado
Instalación de estuco Hall 2° piso y exterior
Instalación de entrepiso cuarto de baño
pañete y pintura fachada principal
Nota: Interventoría en recorrido por la institución se observo actividades realizadas en piso cuarto como instalación de geotextil y de material B-400 donde se evidencio Fallas en varias áreas de la cancha (colchones) que no han sido atendidos por el contratista se requiere de rapida ingerencia sst, Cumplir con las obligaciones expuestas en oficio CIC_BTA_SED_DSD_2022_248

Powered by CamScanner

referente a las recomendaciones pasa cambia
Habrán a entregar que cumplan los requerimientos
de especificaciones técnicas
debe presentar caracterización de materiales granulares
del concreto
El grado de compactación mínimo recomendado del 95%
Toma de densidades cada 50m² sugerido por especialista
diseño de diseño de 24.5 MPa (3500 psi) Considerando
por el especialista Cumpliendo con especificaciones
técnicas, comprobado con ensayos de resistencia
a la compresión así
1 vez al día. promedio 2 cilindros de diámetro 6"
por edad o 3 cilindros de diámetro 4" por edad
mínimo cada 90 m³ : 3 cilindros de diámetro 4" por edad
Instalación de malla electrosoldada acorde a los
detalles presentados para la construcción, material
granular tipo subbase e=20cm. y geotextil tejido 1200
o similar, se requiere cumplir con los traslapes, alturas
y parámetros establecidos por el especialista en
concepto de recomendaciones
Durante el proceso constructivo se deben respetar
las distancias y dimensiones dadas en los
detalles

19-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado lluvia 10.30am 11.00am
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
Inspector SST.
Maestro
Oficiales (6) operador retro (2)
Ayudantes (3)
Ventanero (2)
Personal intervención: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, Retro

Andamio certificado y tubular.
Herramiento menor.
Actividades: instalación de geotextil
Instalación de material B-400
extendido y compactado. y compactado.
pintura en fachadas
pañete en fachada.
Armado de ventanas.
Estuco en bolt y escalera.

21-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector técnico
Electricista
operador maquinaria (2)
oficiales (6) Ventanero (2)
Ayudantes (3)
Aseo (1)
Personal Intervención: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, Retro.
Andamio tubular y certificado.
Herramiento menor
Actividades: picado de muro y pañete fachada cocina.
Instalación de entrepiso cuarto de disco
Instalación de material B400, extendido y compactado

22-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Ayudantes (2), operadores (2)
Equipos y herramientas: Retro, Bobcat
Herramienta menor
Actividades: compactación y compactación B-400
Nota: para personal en obra.

24-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: Nublado

Powered by CamScanner

Personal obra: Inspector técnico-
Maestro, operadores retro (2)
operario (1), Ayudante (3)
Personal interventoria: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Bobcat, Rodillo-
Herramientas menores
Actividades: instalación, conformación y compactación-
de material B-400 en cantera-
Nota: se observa poco personal en obra

25-07-23 Dia soleado y en la tarde nublado
Personal obra: 1 Maestro, 1 inspector, ayudante 3, operadores 2
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Bobcat, compactador rodillo.
Se realiza recorrido entre ejecutor y supervisor donde se deja como recomendacion por parte de la supervision hacer tratamiento al piso del trad 200 piso, dejando dos opciones: la primera retirar la lamina del piso y instalar una nueva mas el piso en PVC y la segunda, instalar lamina sobre la existente mas el PVC esto siempre de la mano con el estructural.
El cielo raso de recepcion, cooperativa y informatica segun solicitud del colegio y en acuerdo se instala en PVC

Adicional se continua con la compactacion del terreno de la cancha para su respectiva prueba de densidades solicitada por el concepto del geotecnistan

Powered by CamScanner

26-07-2023 Estado del clima: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
electro
oficiales (3)
Ayudantes (3)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Toma de densidades arcilla cantera
Picado de muros fachada frente contra
Modelación enchape ladrillo disfraces
Orden y aseo

Inspector técnico. Ingeniero civil

27-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector técnico.
electro.
oficiales (1)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: Andamio certificado, rotomartillo
Herramienta menor.
Actividades: pintura ball 2 piso.
Demolición piso concreto.
picado y pañete frente contra

Inspector técnico. Ingeniero civil

28-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
electro
oficial (4)
Ayudantes (3)
aseo (1)
Personal interventoria: inspector técnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado.

Powered by CamScanner
Norma

Rotomartillo.
Herramienta menor
Actividades: Toma de densidades area contra
Picado de muros y pañete fachada frente
a conjunto
Instalación de estructura para cielo raso-
Demolición Cocineta
Orden y aseo.
Nota: se realizaron densidades en concreto por parte
de interventoria.

29-07-2023 Estado del clima: Mañana = Nublado
Tarde:
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector SST.
Maestro
Oficiales (4)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: pulidora, de grano-
Rotomartillo
Andamio certificado
y tubular
Herramienta menor
Actividades: pulida de granito guardaescoba bajo-
picado de muros fachada principal
frente palmeras.
Instalación embalaje piso y guarda escoba pasillo
disipadores.
Instalación estructura cielo raso en icopor

31-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector SST
Maestro
Oficial (4)

Ayudantes (3)
Tecnico electricista (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
pulidora
Herramienta menor
Actividades: picado y pañete muros fachada principal
frente palmera, Instalación tuberia pt y cableado
pulida de granito guardaescoba bajo.
Instalación de canales en cubiertas.
Nota.: visita de interventoria y recorrido obra (director, Residente).

Se realiza recorrido con parte de direccion de interventoria se requiere nuevamente la ejecucion de actividades en los plazos establecidos, es pertinente realizar la entrega del balance ajustado, se debe remitir a interventoria concepto electrico

Ingeniero Interventoria
RESIDENTE INTERVENTORIA

01-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas (8:30 am a 9:30 am) y lloviznas esporadicas y
Tarde: Nublado con lloviznas-
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector SST
Maestro
Oficiales (4)
Ayudantes (3) Area (4)
Tecnico electricista (2)
Equipos y herramientos: Andamio certificado
Andamio tubular
Rotomartillo.
Herramienta menor
Actividades: picado y pañete en fachada principal.
Demolición cocineta.
Instalación Canaleta prefabricada en area contra

Instalación de tubería mt. y alambre eléctrico aula de informática
Instalación de canal en zona de aulas fotografía inglés
Nota: se le recomienda al contratista realizar el cubrimiento de las excavaciones hechas en obra.

02-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado con lluvias
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
electricista
oficiales (6)
Ayudantes (3)
Tecnico electricista (2)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Rotomartillo
soldadora
Herramienta menor
Actividades: picado de muros y pañete fachada principal
Demolición piso concreto.
Instalación de canales zona de coop
Instalación de cuneta prefabricada area comun
Instalación de tubería mt y cableado electrico area
Cooperativo, refrigio e informatica
Desmonte de lampara aula 116-214 y 115.

03-8-23 INSPECCION DE INTERVENTORIA SST SE VERIFICA ASISTENCIA, EPP FALTAN GUANTES Y GAFAS AL PERSONAL LA CUAL SE EVIDENCIAN EN MAL ESTADO SE REALIZA SOLICITACIÓN DEL TEMA ELECTRICO PARA CUANDO HAGAN ALTA PARTE DE CONEXIONES

EN LOS TABLEROS LAS 5 REGLAS DE ORO. Y PENDIENTE POR ENTREGA DE DOTACION A 2 PERSONAS. SE EVIDENCIAN 13 PERSONAS EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. ESTABAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES - INSTALACIONES DE TUBERIA Y ALAMBRADO ELECTRICO. INSTALACION DE PVC, PICADO DE MUROS Y PAÑETE, INSTALACIÓN DE CANALES, ITSA / INSTALACION DE CUNETA.
CORDIALMENTE
INTERVENTORIA YANINA HUERTAS
Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado.
Personal obra: Electrico
Tecnico electricista (2)
Oficiales (6)
Ayudantes (3)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Inspector sst.
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
taladro
patinadora.
Herramienta menor
Actividades: Instalación de canales en cubiertas area biblioteca, aula 201-218
picado de muros fachada patio bloque 2 piso
Instalación de codo rojo pvc en aula informatica
instalación de tubería mt en aula biblioteca y cableado electrico
Instalación de cuneta prefabricada

04-08-2023 Estado del clima: Mañana soleado - Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Electrico
Tecnico electricista (2)

Powered by CamScanner

Oficiales (4)
Ayudantes (3)
Azed (1)
Personal Interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Trompadora
Pulidora, taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Picado de muro fachada principal y posterior
Instalación de canales en cubierta aula biblioteca y hall 2do piso
Instalación de tubería pvc y cableado electrico en aula biblioteca y hall 2do piso.
Instalación de cuneta prefabricada obra canal
Instalación de aula raso en pvc hall 2do piso y repisa
Nota: Interventoria recomienda al contratista se ejecute la nivelación del material granular de la cuneta en aras de cumplir con las especies de la estructura planificada ante la omisión de lo mencionado cualquier sobreespesor de la placa será asumido por el contratista
Satisf. Ingeniería sas: [signature] Inspector interventoria [signature] INP

05-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Personal de obra: Inspector interventoria
Maestro
Tecnico electricista (3)
Oficiales (6)
Ayudantes (3)
Azed (1)
Personal Interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Rotomartillo
Andamio tubular
Andamio certificado
Herramienta menor

Actividades: Instalación de canales bloque aula 201-20
pintura sobre fachada principal
Demolicion piso para pozo de concreto
Instalación tubería pvc y cableado electrico aula biblioteca
Nota: Interventoria exitesa la solicitud al contratista al cumplimiento de la toma de muestras en cada actividad de concretos de acuerdo a la norma NSR-10 titulo C, de no realizarse estas muestras no se avalara esta actividad [signature] Inspector interventoria [signature] INP

08-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector tecnico
Tecnico electrico (2)
Oficiales (4)
Ayudantes (2)
Azed (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Rotomartillo, taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Demolicion concreto
Instalación de pañete muros fachada interna bloque 2do piso
Instalación de tubería y cable electrico aula informatica.
Aplicacion de estuco y pintura aula 3y2 2do piso.
Tiro de material
Nota: llega malla electrosoldada [signature] contratista interventoria. [signature] INP

09-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado lluvias de (8:20am a 9:10am) y lloviznas
Tarde: Nublado
Personal obra: oficiales (4)
Ayudantes (2)

Powered by CamScanner

Tecnico electricista (2)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: pulidora
soldador
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Picado de muro fachada patio y pañete
Instalación tuberia mt de 3/4" y 1" y
Cableado electrico en sala biblioteca y aula 116-117
Instalación de cuneta prefabricada area comun
Instalación y modelación malla electrosoldada en
cancha.
soldadura y mantenimiento cancha.

10-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector sst
Maestro
tecnico electricista (2)
oficiales (1)
Ayudante (1)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Transpaleta, Rotomartillo
pulidora
Herramienta menor.
Actividades: Modelación e instalación de malla
electrosoldada en cancha
Picado de muros y pañete en fachada patio principal
Demolición piso exterior
Aseo y orden

11-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (9:45 a 10:30) am
Tarde: Nublado con lluvias.
Personal obra: Maestro
oficiales (5)
Ayudantes (3)
tecnico electricista (2)
Aseo (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: pulidora
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Picado de muros fachada patio interno
Modelación malla electrosoldada cancha.
Demolición piso exterior patio, instalación cuneta.
Instalación de tuberia y cableado electrico salas de
dibujo y diseños.
Nota: se insta al contratista realizar ensayo de pintura
en estructura modelada

12-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublada
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector sst.
Residente.
Maestro.
tecnicos electricista (2)
Oficiales (7)
Ayudantes (9)
operador helicoptero (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Vibrador electrico
helicoptero apisonador pisos
Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: Picado contra exterior y acabado

Powered by CamScanner

IT. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza emboquillado de aulas de segundo piso, aplicación de pintura en aulas y remates generales, en oficinas y pasillo de segundo piso, se realiza remates a cajas de inspección y señalización de las mismas.

NOTA= SE RECIBE VISITA DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE LA SED Y ABQ. JUAN CARLOS VALENCIA, SUPERVISOR DE LA SED; SE INFORMA QUE SE REQUIERE REALIZAR LA NORMALIZACIÓN DE LA CUENTA EXISTENTE, MANTENIENDO EL MEDIDOR EN EL SITIO E INSTALAR UN TABLERO NUEVO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; QUEDA PENDIENTE REVISIÓN DE PARTE DE ESPECIALISTA DE LA SED DE PLANOS Y DISTRIBUCIÓN REALIZADA POR CONTRATISTA; ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS A LA FECHA ESTÁN GENERANDO ATRASOS POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE AVANZAR CONFORME A PROGRAMACIÓN DE OBRA

Residente obra Inspinterv

11-07-2023 Martes

Clima: mañana: Nublado tarde: Nublado.

Personal obra	Personal Interventoría.
1 Residente	1 Director
4 Maestro	1 Residente.
4 Oficiales	1 Inspector.
3 Ayudantes.	1 SST.

Equipo: Andamio tubular, Herramienta menor.

Se realiza recorrido de campo a frente de obra, verificando instalación de enchapes en piso y pared. Se requiere efectuar toma de niveles en andén costado occidental de bloque L. Por otra parte, se solicita revisar planos eléctricos para definir las distancias entre lámparas de aulas.

Del componente SST-MA se evidencia ausencia de cerramiento en el área del jardín costado oriental, lo que ha contenido el ingreso de residuos y materiales de las actividades

constructivas ejecutadas en el contrato; por lo tanto se solicita realizar el cerramiento de los especies ornamentales a fin de evitar afectaciones tanto a la raiz como al fuste de los especies eugenia.

D. Fredy Rodriguez

Residente interventoria
Camilo Sanabria

Actividades: Se inicia con resanes en fachada posterior bloque L, instalación de boca puerta en entradas principales, aplicación de estuco y pintura en segundo piso / resanes e instalación de boca puerta.

Residente obra.

Natalia
Insp Interv.

12-07-2023 Miércoles.

Clima: Mañana: Nublado Tarde: Soleado.

Personal obra
1 Residente.
1 Maestro
4 Oficiales
3 Ayudantes

Personal Interv.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, andamio.

Actividades: Se realiza instalación de malla electrosoldada en anden zona posterior y se inicia con fundida del mismo en concreto de 3000 PSI, se continúa con boquilla en pasillo 2do piso y resanes / pintura en 2do piso.

Residente obra

Natalia
Insp Interv.

13-07-2023 Jueves.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro

Personal Inter
1 Inspector.

3 Oficiales.
2 Ayudantes
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se toman densidades en anden lateral bloque L, se finaliza fundida de anden posterior, se continúa con boquilla y pintura en 2do piso, se realiza demolición de anden zona norte y se realiza orden y aseo general en 2do piso.

Residente obra — Ing Inter.

14-07-23 Viernes.
Clima: mañana: Nublado (llovizna intermitentes)
tarde: Nublado (fuertes lluvias de 1:00 pm a 3:00 pm ?

Personal obra	Personal Inter
1 Residente	1 Inspector
1 Maestro	
3 Oficiales	
2 Ayudantes	

Equipo: Herramienta menor, andamio tubular.
Actividades: Se realiza instalación de malla electro soldada en anden lateral perimetral, se inicia con instalacion de puertas en entradas principales, oficinas y baños de oficinas y se finaliza aplicacion de boquilla en 2do piso.

Residente obra — Insp Interv.

15-07-23 Sábado
Clima: mañana: soleado

Personal de obra	Personal Interv.
1 Residente.	1 Inspector.
1 Maestro	
3 Oficiales	
2 Ayudantes	

Equipo: Herramienta menor, andamio tubular.

Actividades: Se inicia con fundición de anden lateral, se continúa con instalación de puertas en baños y oficinas y se continúa con resanes en fachada de bloque L.

Residente obra. Catalina. Insp. Interv.

17-07-23 Lunes

Clima: mañana: Nublado tarde: soleado

Personal obra
1 Residente
1 SST
1 Maestro.
3 Oficiales
1 Ayudante.

Personal Interv.
1 Inspector.

Residente obra

Equipo: Herramienta menor andamio.

Actividades: se continúa con fundición de anden lateral, y resane de fachada bloque L, así mismo se realizo protección de puertas instaladas e instalación de cerraduras de puertas.

18-07-23 NOTA ENTREGA FORMATO SST. Catalina Insp Interv

PERSONAL SIN GAFAS REALIZANDO TRABAJO DE RECOGER ESCOMBRO EN CARRETILLA. NO SE EVIDENCIA MAS HALLAZGOS. CORDIALMENTE. PROFESIONAL SST ENTREGA FORMATO

Martes

Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra
1 Residente.
1 Maestro
3 Oficiales
1 Ayudante.

Personal Interv.
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con fundición de anden lateral bloque L. y resane de fachada lado occidental bloque L.

Residente obra Catalina.

19-07-23 Miércoles

Clima: Mañana: nublado tarde: soleado.

Personal obra

1 Residente

1 Maestro

3 Oficiales.

1 Ayudante.

Personal Interv.

1 Inspector.

NOTA= SIENDO LAS 9:00 AM SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA.

Residente obra

Supervisor
Insp. Interv.

21-07-23 Viernes

Clima: Mañana: nublado Tarde: nublado.

Personal obra:

1 Residente

1 Maestro

3 Oficiales

1 Ayudante.

Personal Interventoría:

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, andamio tubular.

Actividades: Se continúa con fundida de anden lateral bloque L, remates en aulas de segundo piso y resanes en fachada lado occidental.

NOTA= SE SOLICITA IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA EN VISTA DEL ATRASO EVIDENCIADO EN EL FRENTE DE OBRA, ASI MISMO SE SOLICITA BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO A LA FECHA

Residente obra

Supervisor
Insp Interv.

22-07-23 Sábado.

Clima: mañana: nublado

Personal obra.

1 Residente.

1 Maestro

3 Oficiales

Personal Interv.

1 Inspector.

1 Residente.

1 SST.

1 Ayudante

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: se continúa con fundición de anden lado occidental bloque L.

NOTA: INTERVENTORIA REALIZA INSPECCIONES EN CAMPO ENCONTRANDO PERSONAL (DE) EN FUNDIDA DE ANDEN SIN GAFAS SE REALIZA RETROALIMENTACIÓN Y SE DEJA PARA MEJORAR ESTA PARTE, SE REALIZA INCLUSIVA DEL DIA CORRESPONDIENTE.
- SE HACE FIRMAR PERMISOS PENDIENTE RECORDAR LAS FIRMAS DIARIAS.
COORDINAMENTE YANIN HUERTAS INTERVENTORIA SST

22-07-23.

Residente obra | Natalia Insp Interv.

24/07/2023 Lunes

Clima: mañana: soleado | tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro
3 Oficiales
1 Ayudante

Personal Interventoría:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, andamio

Actividades: Se realizo remates en oficinas de segundo piso y pasillo de escaleras (estuco y lija) y se realiza orden y aseo general en obra a nivel interno y externo bloque L.

Residente obra | Natalia. Insp. Interv.

25/07/2023 Martes

Clima: mañana: soleado | tarde: Nublado con lluvias

Personal obra:
1 Residente

Personal Interv:
1 Inspector

MKB

1 Maestro. 1 Director.
3 Oficiales 1 Residente
1 Ayudante
Equipo: Herramienta menor, andamio.
Actividades: Se continúa con condición de parte de anden lateral bloque L. se realiza recorrido de obra en compañía de funcionarios de la SEQ, Interventoría y contratista de obra a fin de verificar avance de obra y solicitar entrega de ala 1 bloque L a Institución educativa con celeridad. NOTA = DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA SEQ SE SOLICITA BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO A CONTRATISTA DE OBRA.

Residente obra Supervisor Interv.

26/07/2023 Miércoles.
clima: mañana: nublado. tarde: nublado.
Personal obra: Personal Interv.
1. Residente. 1 Inspector.
1 Maestro.
2 Oficiales.
1 Ayudante.
Equipo: Herramienta menor; pulidora.
Actividades: Se realiza toma de niveles para canaleta lado occidental bloque L, resanes en segundo piso (aplicación de pintura y lija en estuco) y corte de anden (zona vehicular)

Residente obra Supervisor Interv.

27/07/2023 Jueves
Clima: mañana: Nublado con lluvianas. tarde: Soleado
Personal obra: Personal Interv.
1 Residente 3 eléctricos. 1 Inspector
1 Maestro
2 Oficiales
1 Ayudante

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se realiza corte en concreto en placa vehicular, instalación de puntos y tubería eléctrica en oficinas y pasillo de primer piso, resanes, aplicación de pintura en aulas de segundo piso.

Residente obra — Natalia C. Insp. Interv.

28/07/23 Viernes.

Clima: mañana: soleado tarde: nublado.

Personal obra: 1 Residente. 1 Ayudante. 1 Maestro 3 eléctricos. 2 oficiales

Personal Interventoría: 1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza fundida de canaleta posterior, remates en segundo piso, instalación de puntos y tubería eléctrica.

Residente obra — Natalia C. Insp Interv.

29/07/23 Sábado

Clima: mañana: soleado.

Personal obra: 1 Residente. 1 Ayudante. 1 Maestro 3 Eléctricos. 2 Oficiales.

Personal Interv: 1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con fundida de canaleta posterior, remates en segundo piso. e instalación de cableado electrico en primer piso.

29-07-23 A LA FECHA SE CIERRAN TODOS LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN LA INTERVENTORIA Y AUN HUERFAS REFERENTE A ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPI, ORDEN Y ASEO, Y PERMISOS DILIGENCIADOS Y FIRMADOS. QUIEN REALIZA LOS CIERRES DE LOS HALLAZGOS SANDRA HUESTAS INSP. SST.

Residente obra — Natalia C. Insp. Interv

31/07/23 Lunes

Clima: mañana: soleada tarde: nublada

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente 1 Inspector

1 Maestro 3 Eléctricos

1 Oficial

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: fundida de canaleta lateral bloque L, instalación de puntos y tubería eléctrica en segundo piso

Residente obra Inspector Inspección Interv.

01/08/23 Martes

Clima: mañana: nublada tarde: nublada con lloviznas

Personal obra: Personal Interv.

1 Residente 1 Inspector

4 Maestro

2 Oficiales 3 Eléctricos

1 Ayudante

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con instalación de tubería y puntos eléctricos en segundo piso y fundida de canaleta lateral bloque L.

NOTA= SE ESPERA ENTREGA DE BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO A CONTRATISTA DE OBRA

Residente obra. Inspector Inspección Interv.

02/08/23 Miércoles

Clima: mañana: nublada tarde: nublada con lloviznas

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente 1 Inspector.

1 Maestro 1 Ayudante

2 Oficiales 3 Electricos.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.
Actividades: Se continúa con instalación de puntos y tubería eléctrica en oficinas de segundo piso con los correspondientes pases, así mismo se continúa con fundida de canaleta posterior bloque L, se realiza orden y aseo general en la obra

Residente obra Ingeniero Catalina. Insp Interv.

03-08-23 INSPECCIONES INTERVENTORIA SST SE REALIZO RECORRIDO DE MEDICIONES AMBIENTALES EN 5 PUNTOS ESTRATEGICOS CON LA PERSONA PROFESIONAL DE MEDIO AMBIENTE. SE EVIDENCIA ACTIVIDADES: TERMINACIÓN DE CANAL, INSTALACIÓN TUBERIA ELECTRICA Y ORDEN Y ASEO 8 PERSONAS EN OBRA.
COORDINADOR
YENIN VARGAS INTERVENTORIA SST.
Clima: mañana: nublado con lluvias tarde: nublado con lluvias

Personal obra	Personal Interv.
1 Residente	1 Inspector
1 Maestro.	1 SST
2 oficiales 3 Eléctricos	
1 Ayudante	

Equipo: Herramienta menor, andamios.
Actividades: se continúa con instalación de puntos y tubería eléctrica y se inicia con cableado en segundo piso, se realizan remates en marcos de puertas.

Residente obra. Ingeniero Catalina. Insp Interv.

04-08-23 Viernes.
Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra:	Personal Interv.
1 Director	1 Director
1 Residente	1 Coordinador
1 Maestro	1 Residente

2 Oficiales
1 Ayudante
3 Eléctricos
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se realizan remates en canaleta lateral, instalación de puntos, tubería y cableado eléctrico en segundo piso.
NOTA= SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR EL ADECUADO ALINEAMIENTO DE CANALETA VERIFICANDO DISEÑO Y FUNCIONALIDAD DEL MISMO GARANTIZANDO A SU VEZ LA SEGURIDAD AL USUARIO.
• Se realiza reunión con funcionarios de la SED, interventoría y contratista a fin de verificar temas eléctricos (emergencia) en institución educativa.
•SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REEMPLAZAR CAJAS DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTE AFECTADAS POR MÉTODO DE INSTALACIÓN LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS RETIE

Residente obra — Catalina Insp Interv.

05-08-23 Sábado
Clima: mañana: soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal obra: — Personal Interv:
1 Residente — 1 Inspector
1 Maestro — 1 Ayudante
3 Oficiales — 3 Eléctricos.
Actividades: se realizan remates en canaleta lateral y se continúa con instalación de cableado, puntos y tubería eléctrica.

Residente obra — Catalina Insp. Interv.

08-08-23 Martes.
Clima: mañana: soleado — tarde: nublado
Personal obra: — Personal Interv:
1 Residente — 1 Inspector.
1 Maestro
2 Oficiales — 2 Eléctricos
1 Ayudante.

Se continúa con remates en canaleta lateral, reemplazo de cajas eléctricas afectadas cableado y conexiones eléctricas, se realiza instalación de puertas en aulas de primer piso y remates en marcos y ventanas

Residente obra — Natalia Insp Inter.

09/08/23 Miércoles

Clima: mañana: nublada con llovizna 7 am a 11 am
tarde: nublada.

Personal obra:	Personal Interv:
1 Director	1 Director.
1 Residente.	1 Residente
1 Maestro	1 Inspector.
2 Oficiales	3 Eléctricos.
1 Ayudante.	1 Inst. puertas

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de puertas en aulas de segundo piso, remates en marcos, pates, ventana de bloque aula 1, cableado eléctrico en primer piso y aplicación de pintura en segundo piso.

NOTA = SE REALIZA COMITÉ DE OBRA NO. 30. SE SOLICITA PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA EN VISTA DE ATRASO EVIDENCIADO EN EL FRENTE DE OBRA

Residente obra — Natalia Insp Inten.

10/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleada tarde: nublada

Personal obra:	Personal Interv:
1 Residente.	1 Inspector
1 Maestro	
2 Oficiales	
1 Ayudante.	
3 Eléctricos.	

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con instalación de cableado, tubería y puntos eléctricos y resanes en marcos, paredes, ventanas y techos de bloque intervenido, así mismo se continúa con instalación de puertas en aulas.

Residente obra Supervisor Inter.

11/08/23 Viernes

Clima: mañana: nublada con lluvianas tarde: nublada

Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro
3 Eléctricos
2 Oficiales
1 Ayudante

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, pulidora, taladro.

Actividades: Se realiza instalación de estructura y drywall en baños, instalación de lámparas en baños, instalación de puertas, aplicación de pintura en muros de segundo piso y remates en marcos de puertas.

Residente obra Supervisor.

GARCÉS NAVAS IED., SEDE A

*EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR • ARNES CERTIFICADO
• COMPRESOR 100 lb
* ACTIVIDADES
• CONTINUAN CON DETALLES DE PINTURA EN LOS SALONES DEL BLOQUE B.
• CONTINUAN CON DETALLES DE MAMPOSTERIA EN SALONES DEL BLOQUE B.

NOTA INTERVENTORIA
SE REALIZA RECORRIDO DE ENTREGA PARCIAL DE LOS SALONES 201-202-203 EN COMPAÑIA DE LA INTERVENTORIA, ALMACENISTA Y CONTRATISTA.

DONDE SE DEJO EN ACTAS LAS OBSERVACIONES QUE FALTAN EN CADA ZONA Y POR PARTE DEL COLEGIO ASUME CUALQUIER DAÑO DESPUES DE LAS ENTREGAS.
* SE TERMINAN LABORES A LAS 5 PM.

CAMILO FANDIÑO H
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

1-07-2023 | NOTA: INTERVENTORIA SST INSPECCION DE HALLAZGOS PENDIENTE DEL 06-07-23 LA CUAL FALTAN CIERRES COMO: ORDEN ASEO, PERSONAL SIN DOTACIÓN COMPLETA. USO DE E.P.P (GAFAS Y TAPABOCAS) CHARLAS CAPACITACIÓN FALTA DE PUESTO SST CONTRATISTA, ENTRENAMIENTO DESARROLLADO, FALTAN FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS. Y DEMARCACIÓN DE LOS MUROS (SGA).

PENDIENTE PROXIMA VISITA PARA CIERRES.
COORDINAMENTE: SYNAIN HERRERA INS SST

12-07-2023 MIERCOLES
* ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA: NUBLADO
. TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
. AYUDANTE (2)
. OFICIAL (1)
. INSPECTOR (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
. INSPECTOR (1)
* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR
. ANDAMIO CERTIFICADO
COMPRESOR 100 lb
* ACTIVIDADES
. CONTINUAR CON DETALLES DE PINTURA EN LAS PUERTAS Y VENTANAS DE CONSTRUCCION MEDIO INTEGRAL Y SALON DE PROFESORES.
. ASEO GENERAL EN BLOQUE B.
. CONTINUAR CON LA INSTALACION DE FLAUCHES EN EL BLOQUE B.



CAMILO FONSECA H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

13-07-2023 JUEVES
* ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA: NUBLADO
. TARDE: SOLEADO
* PERSONAL DE OBRA
. AYUDANTE (2)
. OFICIAL (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
. INSPECTOR (1)

* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR
• ANDAMIO TUBULAR
• COMPRESOR 100 lb
* ACTIVIDADES
• CONTINÚAN CON LA INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN LA ZONA DE LA VIGA CANAL DEL BLOQUE A.
• CONTINUÁN CON DETALLES DE PINTURA EN LOS SALONES DEL BLOQUE B.
• CONTINUAN CON LA INSTALACIÓN DE FLANCHES EN BLOQUE B

CAMILO FRANCISCO HERNANDEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

07-2023 VIERNES
* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: LLUVIAS LEVES (7 AM a 9 AM)
• TARDE: LLUVIAS LEVES (1 PM a 3 PM)
*PERSONAL DE OBRA
• MAESTRO (2)
• OFICIAL (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
• INSPECTOR (1)
* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR
• ANDAMIO TUBULAR
• COMPRESOR 100 lb
* ACTIVIDADES
• CONTINUÁN CON LA INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN LA ZONA DE LA VIGA CANAL DEL BLOQUE A.
• CONTINUAN CON LA INSTALACIÓN DE FLANCHES DEL BLOQUE B

CAMILO FRANCISCO HERNANDEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

15-07-2023 SABADO

*ESTADO DEL CLIMA:
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO

*PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTE (2)
- OFICIAL (1)

*PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

*EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
- COMPRESOR 100 lb

*ACTIVIDADES
- CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN el AULA MULTIPLE.
- CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LOS FLANCHES.
- CONTINUAR CON LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA TEJA DE ALBERTO.

NOTA: SE ENCUENTRA PERSONAL TRABAJANDO EN ALTURAS, EN CUANTO AL MISMO NO SE EVIDENCIO PERMISO DE ALTURAS EN EL SITIO NI ASISTENCIA ARL, PARA VERIFICACIÓN DILIGENTE ESTE TEMA.

Comunicante: Jonier Herrera Profesional SST Interventoria.

Cordial fin

Buenos días Interventoria

17-07-2023 LUNES

*ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO

*PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTES (2)
- OFICIAL (1)

*PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

Powered by CamScanner

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
- COMPRESOR 100 lb

* ACTIVIDADES
- CONTINUA CON LA INSTALACION DE CURIGATA EN EL AULA MULTIPLE.
- CONTINUA CON LA INSTALACION DE LOS FLANCHE.
- CONTINUA CON LA DISPOSICION final DE TEJA ALBERA

Cuadro f. 11

INSPECCION DE SEGURIDAD

18-07-2023 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO

* PERSONAL DE OBRA * PERSONAL DE INTERVENCION
- AYUDANTE (2) - INSPECTOR (1)
- OFICIAL (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
- COMPRESOR 100 lb

* ACTIVIDADES
- CONTINUA CON LA INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN LA IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA CANAL DEL BLOQUE A.
- CONTINUA CON DETALLES DE PINTURA EN LOS SALONES DEL BLOQUE B.

Cuadro f. 12

INSPECCION DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

19-07-2023 MIERCOLES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA NUBLADO
- TARDE NUBLADO

* PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTES (2)
- OFICIAL (2)
- ENCARGADO (2)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (2)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
- COMPRESOR 100 lb

* ACTIVIDADES
- CONTINUAR CON DETALLES DE PINTURA EN VENTANAS Y PUERTAS DEL BLOQUE B.
- CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LA PERFILERIA DE LA ESTRUCTURA METALICA

Camilo Fonseca H.
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

24-07-23 INSPECCIÓN INTERVENTORIA. HALLAZGOS

- ORDEN Y ASEO; ENCERRAMIENTOS ABIERTOS.
- IDENTIFICACION Y DELIMITACION CUADRILLA;
- PERMISOS DE TRABAJO.

PERSONAL A LAS 2:46 NO ESTABAN EJECUTANDO ACTIVIDAD(S).

COORDINANTE Y/AUXILIAR HSEQ

EDWIN NUÑEZ
INSP INT.

25/07/23 Continúa remate de pintura

Estado del Clima

Mañana y tarde = nublada

Personal de obra:

Encargado = 1

Oficial = 1

Ayudander = 2

Equipo y Herramientas:

Andamio certificado

* compresor

Actividades:

continúa remate de pintura sobre perfilería metalica en el cubo multiple del primer piso.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

26-07-23 Dia parcialmente soleado (lluvias de 12:00 PM a 2:45 PM)

Personal, obra

- 1 oficial
- 1 ayudante
- 1 inspector

PERSONAL INVOLUCRADO

1 inspector obra

Equipo y Herramientas

Compresor 1002

Se continua con actividades de remates de pintura en Cochera de cuarto frente a Salamultiple También se desarrolla la actividad de pintura en los rejas desmontadas

26/07/23 Tiempo = mañana = soleado y Tarde = nublado
Personal de obra =
oficiales = 1 Ayudantes = 1
1 Inspector de obra.
Equipo y Herramientas
Compresor = 50 L
Andamio certificado
Actividades:
* Remate de pinturas en perfilería metálica del aula frente al aula multiple.
EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

27-07-23 Dia nublado tarde soleada
Personal oficial 2 ayudantes 1 Inspector Inspectoria
Equipo: Compresor
• Mantenimiento de marcos de puertas y ventanas Sumado a esto remate de pinturas a cochos.
• Adicional ya se planea el inicio de actividades electricas para la siguiente semana y asi poder entregar a los tiempos contractuales

27/07/23 Tiempo = Mañana: nublado y tarde = soleado
Personal = 7 oficial y 2 ayudantes

Equipo = compresor
Actividades = continúa mantenimiento sobre marcos de puertas y perfilería metalica.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

28/07/23 Tiempo = Mañana: soleado y Tarde = parcialmente soleado
Personal de obra: oficiales = 7 Ayudantes = 2
7 Inspector de obra

Herramientas y equipo =
compresor de 50L
* Actividades
* Continúa mantenimiento sobre ventanales en los salones de proferores
EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

19-07-2023 Se continúa trabajando sin gafas, casco, guantes, botas, faja de trabajo en alturas sin dentro y con uso de algunos utensilios que estaban pendientes
Coordinamente
Edwin Nuñez / Supervisor

29/07/23 continúa rematar de pintura sobre perfilería metálica
Herramientas y equipo: compresor de 50L

EDWIN NUÑEZ
Insp, Interventoria

07/08/23 Tiempo: mañana = soleado y tarde = nublado
Personal de obra = 1 ayudante

Equipo y Herramienta = Herramientas menor
Actividades = * orden y aseo en coordinación.
* Aplicación de masillas sobre perfilería metálica del pasillo en el piso n° 2.

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

03/08/23 Tiempo = Mañana: nublada y tarde = soleado
Personal de obra = 3 ayudantes

Equipo y herramienta = Herramientas menor
compresor de 50 L (50L)

Powered by CamScanner

Actividades = Pinturas sobre perfilerias en el aulas multiple.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

04-08-23 INSPECCIONES INTERVENTORIA SE EVIDENCIA DOCUMENTACION INCOMPLETA SIN FIRMAS PARA LA ACTIVIDAD EN EJECUCION EN EL MOMENTO QUE SE REALIZO LA INSPECCION; TAMBIEN USO DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA EJECUTANDO ACTIVIDADES DE PINTURA DE ESTRUCTURA, FALTAN AREAS DE ORDEN Y ASEO LA CUAL EN LA INSPECCIÓN SE TOMA EVIDENCIAS QUE ESTAN PARA CIERRE. DE NUEVO SE DEJA RECOMENDACIÓN AL PROFESIONAL SST. DE DEJAR PERMISOS ABIERTOS DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO AL PERSONAL EXPUESTOS QUE LO FIRMEN Y DEJAR CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS. CANTIDAD DE PERSONAL HOY 6 PERSONAS CORDIALMENTE
INTERVENTORIA SST YANIO HUERTAS

09/08/23 Tiempo = nublado y tarde = nublado
Personal de obra = oficiales = 2 Ayudante 2
Equipo y Herramientas
Equipo de soldadura y herramientas menor, compresor de 50 L
Actividades:
Soldaduras sobre perfilerias metalicas (estructura) en el pocsillo del segundo piso
Instalaciones de tuberia EMT en el aulas de profesores y salas de audiovisuales

Powered by CamScanner

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

11-08-23 INSPECCION INTERVENTORIA SSTO DOTA Y ASEO EN BAÑOS DE PERSONAL, ENCHAPE MAL DISEÑO, FALTA DE FIRMAS DEL PERSONAL ELECTRICO, SUPERVISORES PARA EL PERSONAL DE ASEO NO TENIAN TAPABOCAS O FILTROS PARA MANEJO DE PINTURAS. TINTA SIN TERMINAR SE OBSERVAN CONFORMES CON CONFORME A NORMAS Y ESPECIFICACIONES CORDIALMENTE.
YANIN FUENTES
INTERVENTORIA SST.

15/08/23 Continúa instalación electrica en salas de audio visuales y remate de pintura en el aula multiple.
Personal operativo: 2 tecnicos electricos

Equipo: Herramienta menor.
Notas: Los SED: solicitó al contratista cubrir ductos para evitar los vapores de cemento de los actos de intervención. * Instalar PVC en baños de profesores y niñas * tapar a huecos donde ingresan palomas * Acomodar tuberia de los cemento

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

16/08/23 INSPECCION INTERVENTORIA - ORDEN Y ASEO, FIRMAS DE LOS PERMISOS DE LOS TRABAJOS NO ESTABAN, EN EL RECORRIDO CON LA SEÑORA CONSUELO DEJA DICHO LO CUAL DEBEN RETIRARSE SE DEJA DICHO AL CONTRATISTA LOS HALLAZGOS PARA SUBSANAR.
CORDIAL SALUDO YANIN FUENTES
INTERVENTORIA SST.
MCA

Powered by CamScanner

IED. FLORIDABLANCA, SEDE A

10/07/2023 Lunes.

mañana: Nublado (fuertes lluvias de 9:00 am a 11:00 am)

tarde: Soleado

Personal de obra:

1 Director de obra

1 Residente.

5 Oficiales

1 Ayudante.

Personal Interventoría

1 Inspector.

Equipo: Andamio tubular, Herramienta menor, Bob cat, Volquetas.

Actividades: Se inicia con retiro de material de demolición en área de parqueadero con Bobcat, se continúa con desmonte de cubierta en aula de ado física, salón de cómputo y salón de música.

Ing. Jerson Higuita R.
Sayid - Ingeniería.

Natalia C
Insp. Interv

11/07/2023 Martes

mañana: Nublado ; tarde: Soleado.

Personal obra:

1 Residente

5 Oficiales

1 Ayudante

Personal Interventoría

1 Inspector

Equipo: Andamio, Herramienta menor

Actividades: Se inicia con armado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento, se realiza apique en aula de música y demolición de piso en corredor aula música - almacén. Llega a obra pertenencia para cubierta.

NOTA: POR PARTE DE INTERVENTORÍA A LA FECHA NO SE TIENE APROBACIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL POR ESPECIALISTA.

Natalia C.
Insp Interv.

12/07/2023 Miércoles

Clima: mañana: Nublado ; tarde: Soleado

Personal obra:
1 Residente.
5 oficiales.
1 Ayudante.

Personal Interventoría.
1 Inspector.

Equipo: Andamios, Herramienta menor, polidora, taladro.
Actividades: Se continúa con armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento, se inicia instalación de formaletas, se continúa con desmonte de tubería eléctrica.
Nota: Se realiza acta de reunión en compañía de rectora, almacenista, Ing. residente de obra e inspector de Interventoría a fin de realizar entrega parcial de canchas y de acuerdo a esto se procede a abrir espacio en cerramiento perimetral para ingreso de personal educativo en las mismas.
NOTA: SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR EMBALAJE DE TEJAS DESMONTADAS DE ACUERDO A SU TIPOLOGIA Y TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL.

→ Natalia.
Insp Interv.

13/07/23 Jueves.
Clima: mañana: Nublado ; tarde: soleado
Personal de obra:
1 Residente
5 oficiales.
1 Operador excavadora
1 operador volqueta.
1 Ayudante
Personal Interventoría
1 Inspector
Equipo: excavadora, volqueta, andamio Herramienta menor.
Actividades: Se continúa con armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento, se inicia excavación y retiro de material en área de parqueadero.
NOTA: SE REQUIERE A CONTRATISTA DE OBRA LA TOMA DE NIVELES EN ÁREA DE PARQUEADERO A FIN DE EVITAR SOBRE EXCAVACIONES LAS CUALES NO SERÁN OBJETO DE PAGO.

Natalia.

14/07/2023 Viernes

Estado del clima: mañana: Nublado con llovizna intermitente
tarde: Nublado (fuertes lluvias de 3:00pm a 4:00pm)

Personal obra:
1 Residente
3 Oficiales
1 Ayudante
1 Operador

Personal Interventoría
1 Inspector
1 SST.

Equipo: Herramienta menor, andamio, excavadora de oruga, volqueta

Actividades: Se realiza armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento y armado de formaletas para las mismas se realiza excavación mecánica en parqueadero y retiro de material de excavación de la zona.

Natalia
Insp Interv.

15/07/2023 Sábado

Estado del clima: mañana: soleado

Personal de obra:
1 Residente
3 Oficiales
1 Ayudante
1 operador.

Personal Interventoría:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor, excavadora.

Actividades: Se continúa con corte, y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento y excavación mecánica y retiro en área de parqueadero.

Natalia
Insp. Interv.

17/07/2023 Lunes

Estado del clima: mañana: nublado; tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente

Personal Interventoría
1 Inspector

1 Oficiales

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo.

Actividades: Se continúa con armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento y se inicia con demolición de piso en aula de música.

Jose Acuña — Natalia C
Insp Obra — Insp. Interv.

18/07/23 Martes

Estado del clima: mañana: soleado

tarde: soleado.

Personal obra

1 Residente.

3 Oficiales

1. Ayudante.

Personal Interventoría

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo.

Actividades: Se realiza demolición de estructuras en concreto encontradas durante excavación en parqueadero y se continúa con demolición de piso en aula de música.

NOTA = SE REITERA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR EL DEBIDO EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA DESMONTADA EN BLOQUE SECA, ASI MISMO, SE SOLICITA LA ENTREGA DE BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADAS COMO LA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN PARQUEADERO.

Jose Acuña — Natalia C.
Insp Obra — Insp. Interv.

19/07/23 Miércoles.

Clima: Mañana: nublado. tarde: soleado.

Personal obra:

1 Inspector.

3 Oficiales

Personal Interv.

1 Inspector.

1 Ayudante

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo

Actividades: Se continúa con demolición de estructuras en concreto en parqueadero y demolición de piso en aula de música.

José Alcivar — Natalia
Insp Obra — Insp Interv

21/07/23 Viernes

Clima: mañana: nublado — tarde: nublado

Personal obra:

1 Inspector

3 Oficiales

1 Ayudante.

Personal Interv:

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza excavación manual en material común y recebo compactado en aula de música

José Alcivar — Natalia
Insp Obra — Insp Interv

22/07/2023 Sábado

Clima: mañana: nublado

Personal obra:

1 Inspector

3 Oficiales

1 Ayudante.

Personal Interv:

1 Inspector

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con excavación manual en aula de música y traslado de material de excavación a parqueadero.

NOTA: SE REMITE A CONTRATISTA DE OBRA SOBRE LA TOMA DE NIVELES EN EL AREA DE PARQUEADERO A FIN DE EVITAR SOBRE EXCAVACIONES LAS CUALES NO SERÁN OBJETO DE PAGO.

José Alcivar — Natalia
Insp Obra — Insp Interv

24/07/2023 Lunes

clima: mañana: soleado tarde: Soleado

Personal obra: Personal Interv:

1 Inspector. 1 Inspector.

3 Oficiales

1 Operario

1 SST

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, BobCat, Vibro compactador.

Actividades: Se realizo retiro de material de demolición de parqueadero, corte, armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento, instalación de geotextil T2400, instalación de afirmado en área de parqueadero.

NOTA = INTERVENTORIA REQUIERE DESARROLLAR LOS TRASLAPOS DE GEOTEXTIL TEJIDO CONFORME FICHA TÈCNICA DEL MATERIAL, ASI MISMO, SE NOTA REALIZAR LA ADECUADA COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALES GRANULARES DE LA ESTRUCTURA DE PARQUEADERO. CAFIRMADO Y SUBBASE) Y PARA CONTROL DE LOS MISMOS LLEVAR A CABO LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO.

Jose Acero Natalia.

Ing Obra Insp. Interv.

25/07/2023 Martes

clima: mañana: soleado.

tarde: Nublada (Fuertes lluvias de 1:30 pm a 3:00pm).

Personal obra: Personal Interventoria.

1 Inspector. 1 Inspector

3 Oficiales 1 SST.

1 Operario.

Equipo: Herramienta menor, Bobcat, Vibrocompactador.

Actividades: Se realizo compactación de material afirmado en zona de parqueadero, lleno de material subbase y compactación del mismo y corte, armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento bloque SENA NOTA=SE REALIZA LLENO DE SBG SIN REALIZAR DENSIDADES EN LAS CAPAS DE AFIRMADO CONFORME A LO SOLICITADO Natalia.

POR INTERVENTORIA. SEGÚN CONCEPTO DE ESPECIALISTA. Insp. Interv.

26/07/2023 Miércoles

Clima: mañana: soleado. tarde: Nublado

Personal obra: Personal Interv.

1 Inspector 1 Inspector.

3 Oficiales

1 Operario

1 Ayudante

Equipo: Herramienta menor, Bobcat, Vibrocompactador.

Actividades: Se realizo compactación de subbase en área de parqueadero, instalación de formaletas para vigas de confinamiento, excavación manual en aula de música y protección de material con plástico en área de parqueadero.

José Acuña Natalia Insp. Interv.

Iván Ore

27/07/23 Jueves

clima: mañana: nublado con lloviznas. tarde: soleado

Personal obra: Personal Interv.

1 Inspector 1 Inspector.

3 Oficiales

1 Operario

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador, rotomartillo

Actividades: Se continúa con compactación de subbase en área de parqueadero, demolición de piso en corredor lado cocina, instalación de formaleta para vigas de confinamiento bloque cerca.

José Acuña Natalia

Iván Ore Insp. Interv.

28/07/23 Viernes

clima: mañana: soleado tarde: nublado

Personal obra Personal Interv.

1 Inspector 1 Inspector

3 Oficiales 1 Ayudante

1 operario 2 soldadores

29/07

31/07/23 Lunes

Clima:

Personal

1 Inspecto

3 Oficiales

1 Ayudante

1 Operario

Equipo: H.

Actividades:

Equipo: Herramienta menor, andamios, vibro compactador
Actividades: Se realiza fundida de vigas de confinamiento bloque SENA, compactación de material en parqueadero, limpieza de viga canal, arreglo de altura arco concha No. 1 y excavación de cintas de confinamiento en anden lado conchas.
* Se realizan muestras de concreto de vigas de confinamiento
* Por parte de Interventoría se realizan toma de densidades en capa de afirmado y subbase en área de parqueadero

José Acuña — Natalia L.
Inspector — Insp. Interv.

29/07/23 Sábado
Clima: mañana: soleado
Personal obra: — Personal Interv.
1 Inspector. — 1 Inspector
1 Ayudante
3 Oficiales
1 Operario
Equipo: H. menor, Vibro compactador.
Actividades: Se continúa con fundida de vigas de confinamiento bloque SENA, compactación de material en parqueadero y armado de acero de refuerzo para vigas aula música.

José Acuña — Natalia L.
Inspector — Insp. Interv.

31/07/23 Lunes
Clima: mañana: soleada — tarde: nublada
Personal obra: — Personal Interv.
1 Inspector. — 1 Inspector
3 Oficiales
1 Ayudante.
1 Operario
Equipo: H. menor, vibrocompactador.
Actividades: Se realiza fundida de viga de confinamiento de aula de

música, compactación de subbase granular en parqueadero, fundida de cintas de confinamiento en anden lado canchas
* Por parte de Contratista se toman densidades en parqueadero.
NOTA = SE REQUIERE TOMA DE NIVELES EN ÁREA DE PARQUEADERO TENIENDO EN CUENTA EL DRENAJE DEL MISMO CON EL FIN DE EVITAR LOS FENÓMENOS DE BOMBEO ENTRE LAS LOSAS Y EL ESCALONAMIENTO ENTRE ENTRE LAS MISMAS. ASÍ MISMO SE REQUIERE BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO.

Jose Cleves — Catalina — Insp Interv.
Insp Obra

01/08/23 Martes.

Clima: mañana: nublado — tarde: nublado (fuertes lluvias 2:30 a 3:00)

Personal obra: — Personal Interv:
1 Inspector — 1 Inspector
1 Ayudante
4 Oficiales.

Equipo: Herramienta menor, andamio

Actividades: se realiza fundida de vigas de confinamiento de aula de música, excavación manual en material común en aula de música y fundida de cintas de confinamiento en anden lado canchas.

Jose Cleves — Catalina. — Insp Interv.
Insp Obra

02/08/23 Miércoles.

Clima: mañana: nublado — tarde: nublado con lluvianos.

Personal obra: — Personal Interventoría
1 Inspector. — 1 Inspector.
1 Ayudante. — 1 SST
4 Oficiales.

Equipo: herramienta menor, andamios.

Actividades: se realiza abancerado de vigas de confinamiento, se realiza embolado de vigas en asbesto cemento y se continúa con fundida de cintas de confinamiento en anden lado canchas

Jose Cleves — Catalina. — Insp Interv
Insp Obra

04/08/2

05/08/23 Cli
Clim
Perso
1 Ins
1 Ayu

03/08/2023 Jueves

Clima: mañana: nublado con lluvianas. tarde: nublado con lluvianas.

Personal obra:

1 Inspector

1 Ayudante.

4 Oficiales.

Personal Interventoria:

1 Inspector

Equipo: Andamios, Herramienta menor.

Actividades: Se realizo instalación de adoquin en orden lado canchas, desencofrado de vigas cinta aula música y embalaje y disposición final de tejas en asbesto cemento.

•Nota: se realizo retiro de material de excavación aula de música.

•NOTA= PARA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE ADOQUIN SE REQUIERE GARANTIZAR UNA SUPERFICIE TERMINADA LIBRE DE RESALTOS Y SALIENTES EN SUS UNIONES, DE MANERA QUE SEA UNIFORME Y CONTINUA.

Jose Acuña
Ing. Obra

Catalina
Insp. Interv.

04/08/23 Viernes

clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra.

1 Inspector.

1 Ayudante.

4 Oficiales.

Personal Interv:

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúo con instalación de adoquin y fundición de vigas de confinamiento, se realizo instalación de geotextil tejido en aula de música

Jose Acuña
Ing. Obra

Catalina
Insp. Interv.

05/08/23 Sábado

Clima: mañana: soleado

Personal obra:

1 Inspector

1 Ayudante.

Personal Interv:

1 Inspector

5 Oficiales.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza limpieza de caja existente en área de cocina, sondeo de tubería en zona de parqueadero y se continúa con instalación de adoquín y fundida de cintas en orden lado canchas.

NOTA- SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LA RESPECTIVA TOMA DE NIVELES EN ÁREA DE PARQUEADERO A FIN DE DEFINIR LAS CONDICIONES DE DRENAJE DE LAS ZONAS A INTERVENIR.

José Acuña — Natalia.
Inst. Obra — Insp. Interv

08/08/23 Martes

Clima: mañana: soleado — tarde: nublado

Personal obra: — Personal Interv:

1 Inspector. — 1 Inspector.

4 Oficiales — 1 soldador.

1 Ayudante

Equipo: Andamios, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de platinas en viga cinta e instalación de perfiles, soldadura en aula de Edu. Física, se realiza igualmente instalación de mampostería en pasillo bloque SENA e instalación de subbase en aula de música.

José Acuña — Natalia
Inst Obra — Insp. Interv.

09/08/23 Miércoles.

Clima: mañana: Fuertes lluvias de 7am a 11:30 am.

tarde: nublado.

Personal obra: — Personal Interv:

1 Inspector — 1 Inspector.

4 Oficiales

1 Ayudante.

1 soldador.

1 Residente

Equipo: Andamios, Herramienta menor

Actividades: Se continúa con soldadura e instalación de perfiles en aula de Edu. Física y pasillo bloque SENA, compactación de subbase en aula de música y embalaje de teja, aplicación de pañete en viga canal e instalación de mampostería en zona de viga canal

NOTA = SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR ENSAYO DE TINTAS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTE ASI MISMO SE SOLICITA COMPLIA CON CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL EMITIDO POR ESPECIALISTA Y AVALADO POR INTERVENTORÍA

José Acosta
Inst Obra.

Natalia
Inspl Interv.

10/08/23 Jueves.

Clima: mañana: soleado tarde: nublado

Personal obra:	Personal Interv.
1 Inspector.	1 Inspector
4 Ayudante.	1 SST
1 Maestro.	
2 Oficiales	
1 Soldador.	

Equipo: Andamios, tubular, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de mampostería en muro viga canal bloque SENA, instalación y soldadura de perfilería metálica, instalación de bordillo prefabricado y compactación de subbase en aula de música. se realiza igualmente sondeo de tubería lado cocina.

NOTA INSPECCION INTERVENTORIA SE EVIDENCIA. ORDEN Y ASEO SE EVIDENCIA MATERIALES POR TODOS LADOS NO ESTAN ACOPIANDO EN UN SOLO LUGAR HAY EVIDENCIAS DEL DIA 07- DEL MISMO MES DE MEJORAR CONDICIONES, TODAS SIN TERMINAR DE SACAR. TRABAJO EN ALTURAS PERSONAL SIN EQUIPO SIN ANCLAR A NADA, SE DEJA RECOMENDACIONES EN BITACORA PARA SUBSANAR INMEDIATO MEDIO DIALOGADO CON PERSONA RESPONSABLE SST CONTRATISTA.

IED. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A

NOTA: INSPECCION INTERVENTORIA SST
SE EVIDENCIAN (4) TRABAJOS DE ALTURAS
SIN PERMISOS DE TRABAJO; ORDEN Y ASEO
EN MAL ESTADOS PUNTOS NO IDENTIFICADOS
FORMATOS NO ESTAN EN EL SITIO, SE SOLICITO
RESIDENTE SST. DEL CONTRATISTA, LA CUAL
QUEDO PENDIENTE DE LOS HALLAZGOS ENCON-
TRADOS CERRADOS.
- PERSONAL SIN EPP COMPLETO.
" DOTACION INCOMPLETA.

PERSONAL EN CIVIL SIN CAMBIO DE ROPA DE
TRABAJO, REALIZANDO RECORRIDO EN OBRA.
SE RECOMIENDA VERIFICACION DE TRABAJOS
EN ALTURAS EVIDENCIAS DE ANCLAJE Y
DESCENSO INSTALACIÓN L.V. Y EPCC. DE LA
PERSONA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD. LA CUAL
NO SE PUDO EVIDENCIAR DE FORMA QUE ESTAN
REALIZANDO LA ACTIVIDAD.
COORDINALMENTE: YANIN RIVERA. INSPECTOR INTERVENTORIA
PLA SST. 10-07-23

11-07-2023 Estado del clima: mañana: Nublado
Tarde: Soleado
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
oficial (1)
soldador (1)
Ayudante (1)
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Arnamio certificado
Actividades: instalación anclaje punto shut horizontal
soldadura en perfiles e instalación

13-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

Personal obra: Inspector técnico, resp SST
soldador
oficial (1)
Ayudante (1)
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Arnamio certificado
Actividades: soldadura de perfiles y apoyos
Instalación de anclaje puntos shut
de barras y pisos.

13-07-23 NOTA: INSPECCIONES INTERVENTORIA SST.
FALTA DE DOTACIÓN DE EPP PARA EL
SOLDADOR MEDIA PARA TRABAJAR PIEZAS,
SALIDA DE MATERIALES TEJAS, IDENTIFICACION
DE LOS QUIMICOS Y FICHA DE SEGURIDAD,
SIGUE EL PERSONAL SIN DOTACION COMPLETA
SIGUE ALGUNOS HALLAZGOS SIN CERRAR COMO:
TABLEROS ELECTRICOS DESTAPADOS, ORDEN ASEO Y
CLASIFICACIÓN ARCUNDA.
COORDINANTE: YANIN RIVERAS INTERVENTORIA SST
Estado del clima: Mañana:
Tarde
Personal de obra: Inspector técnico
soldador
Oficial (1)
Ayudantes (1)
Personal Interventoría: Inspector técnico
Inspector SST
Equipos y herramientas: soldador
Arnamio certificado
Compresor
Herramienta menor
Portátil

Powered by CamScanner

Actividades: soldadeo para soporte estructura cubierta onda multiple

Instalación de enchape muros shut bajantes

Nota: En recorrido por la institución se evidencia para personal, no se evidencia mantenimiento en obra

se le recomienda al contratista ser mas constante en las actividades y se le recuerda cubrir el personal para asi dale puesta terminación.

14-Julio-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (9:00 a 9:00 am) y lloviznas

Tarde:

personal obra: Inspector obra
soldador
ayudantes (2)
Ayudantes (3)

Personal intervención: Inspector tecnico

Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado
Herramienta menor

Actividades: Instalación de enchape muros y piso shut bajantes.

soldeadura perfiles y apoyos y pintura.

Desmonte de cercas e instalación de perfiles

Nota: En recorrido por la institución se evidencia a cargo del personal de cocina filtración de agua por el cielo de la campana, se le recomienda al contratista realizar la actividad necesaria para mitigar esta filtración ya que estamos en dias de lluvias, asi mismo se le insta a acelerar el trabajo de cubierta

19-07-2023 INTERVENTORIA SST. REALIZA INSPECCION DE CIERRE DE HALLAZGOS IR CUAL SE ENCUENTRA PERSONAL CON TODOS SUS EPP Y DOTACION COMPLETA. PERMISOS DE TRABAJO COMPLETOS, DEMARCACIONES COMPLETAS, IDENTIFICACION QUIMICOS COMPLETAS. QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE ESCARGADIZARE ORDEN Y ASEO.

CORDIALMENTE: YANIN NATALIA HUERTAS INTERVENTORIA SST.

19-07-2023 A LA FECHA SE CUMPLE CON LOS CIERRES DE HALLAZGOS DEL DIA 10 Y 13 DE JULIO DE 2023, DANDO CUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES EN OBRA. (IN) EVIDENCIAS FUERON ENVIADOS AL WHATSAPP DE LA INTERVENTORIA ING. YANIN HUERTAS. 2/11/23 SANDRA HUERTAS INSPECTOR SST SAENZ INGENIERIA.

Estado del clima: Mañana: Nublado (lluvias 10 a 11:30 am

Tarde: Nublado lloviznas

Personal obra: Inspector sst.
Oficiales (2)
soldador (1)
Ayudantes (2)

Personal intervención: Inspector sst
Inspector tecnico

Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado
Herramienta menor

Actividades: Corte de lamina y soldadura en perfiles

pintura en perfiles e instalación

Nota: En recorrido por la institución se evidencia que no hay actividad laboral en el shut de bajantes, se le recomienda al contratista seguir con las medidas pertinentes para terminar las actividades en esta area. Asi mismo se le sabiste al contratista ensayo de tintas en trabajos realizados de soldadura

Powered by CamScanner

21-Julio-2023 Intervención: se realizo visita y recorrido por instalación no se evidencia actividad en dpto. de bazuca, se evidencia trabajo de soldadura y pintura perfiles

NOTA: SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION DE FORMATOS IA CUAL A LA HORA 1:30 PM. SE EVIDENCIO PERSONAL TRABAJANDO SIN FIRMAS DE PERMISO TSA, Y CALIENTE, SE DEJA POR ESCRITO HALLAZGO ENCONTRADO PARA MEJORAR EN CASO DE ACCIDENTE, Y USO DE CASCO EN LAS ACTIVIDADES. CORDIALMENTE Yonath INTERVENTORIAS 21-07-23
RECORDANDO AL PERSONAL NUEVO QUE DEBE DAR RETROALIMANTACION DE LOS FORMATOS Y SUS RESPONSABILIDADES.

Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: Nublado.
Personal obra: inspector tecnico
soldador
oficiales (2)
Ayudantes (2)
Personal intervención: inspector tecnico
inspector SST.
Equipos y herramientas: soldador
Compresor.
Andamio certificado.
Andamio tubular.
Herramienta menor
Actividades: Corte de lamina y soldadura perfiles
pintura en perfiles e instalación
instalacion de sikaflex en dilatadores para cada
multiple.
Nota: No se ve avance de obra en actividad del
dpto de bazuca

22-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado

Estado del clima: Nublado con lluvias
Personal obra: inspector obra.
soldadores (2)
oficiales (2)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado.
Herramienta menor
Actividades: soldadura soportes para perfiles
e instalacion.
pintura en perfiles
Desmonte de cubiertas.

24-07-2023 Estado del clima: Mañana: nublado
Tarde:
Personal obra: inspector obra.
soldadores (2)
oficiales (2)
Ayudantes (2)
Personal intervención: inspector tecnico
Equipo y herramienta: soldador
Compresor
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: soldadura soportes y perfiles.
estructura cubierta.
Desmonte de cubiertas.
Nota: No se evidencia avance de obra en
dpto de bazuca

25-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal obra: inspector tecnico, soldador(2); oficial(2)
Ayudantes (2)
Actividades: soldadura apoyos, perfiles e instalacion
cubierta cada multiple

Powered by CamScanner

26-07-23 INSPECCION INTERVENTORIA CON LOS SIGUIENTES HALLAZGOS - ORDEN Y ASEO TOTAL DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES - ESCOMBRO PARA SACAR, CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS EN LONAS MATERIALES NO CLASIFICADOS. TEJAS PARA SACAR. Y RECOMENDACIÓN EN MANTENER SITIOS EN BUENAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO.
COORDINADOR: YHAN [illegible] INTERVENTORIA. SST.
Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
soldadores (2)
oficiales (2)
ayudantes (2)
Personal interventoría: Inspectora SST.
Equipos y herramientas: soldador
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos, pespiles para estructura cubierta aula multiple
Nota: No hay actividad de obra en sitio de trabajo:

27-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
soldador (2)
oficiales (1)
Ayudantes (1)
Personal interventoría: Inspector técnico
Equipos y herramientas: soldador, Compresor
Andamio Certificado
Herramienta menor
Actividades: Desmonte de escombros cubierta

soldadura apoyos, pespiles para estructura cubierta aula multiple
Instalación de endrape piso aula de karate
Nota: interventoría en recorrido por obra en la instalación se evidencia la no actividad de obra en el sitio de trabajo, se le recomienda al contratista colocar personal en esta area para así avanzar en la terminación de la actividad.

27-07-2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Personal obra: inspector técnico.
soldador (2)
oficiales (1)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyo y pespiles cubierta aula multiple.
Instalación de endrape piso aula de karate.

28-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Personal obra: Inspector técnico
soldador (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado y tubular

Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles cubierta aula multiple
Instalación de enchape aula norte.

31-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
soldador (2)
oficial (1)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: soldadora
Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular
Actividades: instalación de enchape aula norte
soldadura apoyos y perfiles estructura cubierta aula multiple.

01-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (8:30 am - 9:15 am) y lluvias esporadicas
Tarde: Nublado con lluvias.
Personal obra: Inspector técnico
Oficial (1)
Ayudante (1)
Personal intervención: inspector técnico
Inspector sst.
Equipos y herramientas: herramienta menor
Andamio certificado
Andamio tubular
Actividades: instalacion de enchape aula de norte

Nota: se le hace al contratista realizar las subsanes requeridas por la interventoría en las observaciones hechas anteriormente con respecto al muro construido debido de clavo de bastones.
NOTA INTERVENTORIA SST: SE EVIDENCIAN MATERIALES TODAVIA DE IZADA SIN GUARDARSE Y ESCOMBROS PARA SACAR, ANDAMIOS SIN ANCLAR PLANCHONES, EPP CUENTES DE CONTRATO PARA PERSONAL CON ACTIVIDAD CON CONCRETO, ORDEN Y ASEO. CHUZA CON DIFERENTES MATERIALES VENTANAS, PUERTAS, TUBERIA PLASTICA PARA SACAR. Y ORGANIZAR.
YANIN HERRERA
INTERVENTORIA SST

02-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Soldador (1)
Equipos y herramientas: soldadora
Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular
Actividades: soldadura apoyos y perfiles cubierta Aula multiple
instalación de enchape piso aula norte.

03-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias esporadicas
Tarde: Nublado
Personal intervención: inspector técnico
Personal obra: inspector técnico y sst
soldador

Powered by CamScanner

Ayudantes (2)
Actividades: Aseo y orden
soldadura apoyos y perfiles en
cubierta cada multiple
Equipos y herramientas: soldador
Compresor
Andamio certificado
Herramienta menor

9-8-2023. INSPECCION INTERVENTORIA SST. PERMISOS SIN COMPLETAR FIRMAS, PERSONAL QUE GOLPEO TRABAJO EL DIA 7 DE AGOSTO Y SE EVIDENCIA QUE NO FIRMARON PERMISOS ESE DIA Y EDAN NOVEDADES DE (TSHA) TENER PRESENTE EN DIALOGO SOBRE EL TEMA DE IMPORTANCIA DE LOS PERMISOS Y DESCANSOS EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO DE PERSONAL, ORDEN Y ASEO, Y SEÑOR DE MANTENIMIENTO DE RECOPILAR DE SOBRANTES PARA SALIDAS. PERSONAL SIN TRABAJOS PINTANDO, CAMBIOS DE TERMINOS EN MATERIAL SIN DESCUENTOS.
SE EVIDENCIA TRABAJANDO 7 PERSONAS
Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde:
Personal obra: inspector tecnico
oficial (1)
soldador (1)
Ayudantes 3
Personal intervintoria: inspector tecnico
inspector sst
Equipos y herramientas: Compresor
soldador
Andamio certificado

Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalación de entrepiso
pintura y soldadura perfiles poco
Cubierta cada multiple
Orden y aseo
Nota: Sin novedad por la inspección se evidencia
que no hay actividades en el shut de basuras
se insta al contratista continuar con las actividades del shut de basuras ya que este no ocupo
en su mantenimiento

Yanin Ustariz
Interventoria

9-8-23 SE EVIDENCIA PERSONAL EN OBRA LA CUAL SE REUNE CON ELLOS EL ACCIDENTE DEL NIÑO Y EL SEÑOR TRANSPORTADOR PUBLICO COLECTIVO COMENTA QUE EL LLEGAR A LAS 7:15 AM Y SALIAN UNOS ESTUDIANTE DENTRO DEL ENCERRAMIENTO. Y LA HIPOTESIS DE LA SEÑORA DIRECTORA DICE QUE EL NIÑO COGIO EL BALON Y AL MANDARLE LA MANO SE CORTO CON LA MALLA (EL BORDE DE LA MISMA) SE DEJAN HIPOTESIS ESCRITO.
Yanin Ustariz
INTERVENTORIA.
Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (8:30 a 10:00am) y lluviosa
Tarde: Nublado
Personal obra: inspector tecnico
Inspector sst.
soldador (1)
oficial (1)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: soldador, Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular

Powered by CamScanner

Herramienta menor.
Actividades: soldadura apoyos pupitres estructura
Cubierta aula multiple
Instalación de enchape piso aula tarde.

10-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector Tecnico
Soldador
oficial
Ayudante (3)
Equipos y herramientas: soldadora
Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y pupitres estructura
Cubierta aula multiple
Instalación de enchape piso aula tarde.
Nota: No hay actividad en el turno de tarde

11-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde:
Personal obra: Inspector tecnico
Soldador
Oficial (1)
Ayudantes (3)
Personal Interventoria: Inspector tecnico.
Equipos y herramienta: soldador
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor

IED. JUAN DEL CORRAL, SEDE A

27-06-2023.
clima: soleado.
Personal en obra. 1 inspector tecnico
1 maestro
1 oficial
3 ayudantes.
1 aseo.

actividades.
- media caña en la placa del ingreso.
del colegio
- limpieza de los vidrios delas lucarnas.
- Remates de Pintura

28-06-2023 Estado del clima: Mañana
Tarde:
Personal obra: inspector tecnico
Maestro
oficial (3)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalación de media caña placa
acceso a la institución
Armado de andamio y desmonte de mampo asfaltico
placa ubicado aula maestro
- fundida existe colocar.
-06-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvia
Tarde
Personal obra: Maestro
Ayudante (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado

Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalacion adoquin ubicado aula
de maestros y limpieza de canales y
bajantes
Interventoria:
29-06-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: soleado
Personal obra: inspector tecnico
Maestro (1)
Electricista (1)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalación de mampo asfaltico
instalación de tomacorrientes
pintura en columnas.
Nota: Interventoria solicita nuevamente el balance
presupuestal actualizado al contratista. en vista
de no realizar actividades que no estan contempladas
en el mismo
Interventoria
01-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Maestro
Electricista
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalación de cubierta asfaltica y
mampo asfaltico
instalacion puntos electricos

Powered by CamScanner

Aplicación pintura en comedor

04-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias
Tarde: soleado.

Personal obra: Inspector técnico
Albañil
Ayudantes (3)

Equipos y herramientas: Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor

Actividades: Lavado muros en comedor
Instalación de cocineta y lavaplatos

Vº Bº

05-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado.

Personal obra: Inspector técnico
Albañil
Ayudantes (3)

Equipos y herramientas: Andamio tubular
Andamio certificado
Herramienta menor

Actividades: Aplicación pintura en puertas.
Lavado de muros

06/07-2023 Clima: lluvias intermitentes
Personal de Obra: 1 inspecto.
1 oficial
3 ayudantes

Actividades
- Aplicación de pintura en puertas
- Lavado de muros en comedor

03/07-2023 Clima: lluvias fuertes en la tarde
Personal de Obra: 1 inspector de obra
1 oficial
3 ayudantes
Equipos: andamio certificado
Actividades: -
- Aplicación de pintura en puertas
- Lavado de muros
- Resanes en escalera en el sotano

08/07/2023 Clima: lluvias intermitentes en la mañana.
Personal de obra: 1 inspector técnico
1 oficial
1 ayudante
Equipos: andamio certificado
Actividades
- Se finaliza la actividad de aplicación de pintura en puertas

10/07/2023 Clima: lluvias en la mañana
Personal de obra: 1 inspector técnico
1 oficial
1 ayudante
Equipos: andamio certificado
Actividades
- Demolición de baldo de concreto en sotano

11/07/2023 Clima: Nublado en la mañana
Personal de obra: 1 inspector 1 inspector de Vigilancia
1 oficial
2 ayudantes
1 inspector SST

Powered by CamScanner

Equipos: Andamio certificado
Actividades:
- Instalación de flauche en fachada de parqueadero
- orden y aseo de espacios

Observaciones
Se realiza visita técnica del especialista hidráulico para determinar el estado de las bombas del sótano con su red de distribución

12-07-23 Nota Intervención SST Evaluación Personal trabajando en alturas con andamio Tubular Incompleto, No estaban armados bien línea de vida una persona, Cliente sin casco, y Formatos sin diligenciar completamente para el Permiso. Condiciones de Sub y Jonin Ilumeros

13/07/23 Clima: Soleado
Personal de obra: 1 inspector técnico
1 ayudante
Equipos: andamio certificado
Actividades
- Limpieza en fachada de entrada al parqueadero

14-07-2023 Estado del clima: Mañana
Tarde:
Personal obra: Inspector obra
oficial (1)
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: pintura y resanes
Aseo y limpieza

15-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector obra.
oficial (1)
Equipos y herramientas: Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: Orden y aseo
Nota: llegan equipos y materiales para la impermeabilización de cubiertas.

17-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: soleado.
Personal obra: Inspector sst
oficial (1)
Orden aseo (1)
Personal Interventoria: Inspector técnico
inspector sst
Herramienta y equipos: Andami tubular
Herramienta menor
Actividades: Orden y aseo
Demolición concreto para bordillo de adoquín
Nota: poco personal en obra

18-07-2023 Clima: lloviznas en la mañana
personal de obra: Inspector de obra
1 Oficial
1 orden y aseo
Equipos: Andamio Certificado
Actividades: - Aseo general de obra
- Demolición de estructura en sótano

Powered by CamScanner

- reinstalación de alambrón

19-07-2023 Clima: lluvias intermitentes durante el día
Personal de obra: Inspector de obra
1 oficial
1 oficial + aseo
Equipos: andamio certificado
Actividades: - Aseo general de obra
- Pulida de piso en terraza

20-07-2023 Clima: día soleado
personal de obra: Inspector de obra
1 oficial
3 ayudantes
Equipos: andamio certificado - equipo de aplicación de pelicula
Actividades: - Pulido de pisos con disco diamantado
- Impermeación en terraza de portería

Observaciones
Se realiza adecuación eléctrica en tablero principal del edificio antiguo para suministrar energía al equipo de la pelicula

22-07-2023 Clima: día soleado en la mañana
Personal de obra: Inspector de obra
1 oficial
3 ayudantes
equipos: andamio certificado, impermeación de tenis - equipo de aplicación de pelicula
Actividades: - Pulida de pisos
- Aplicación de pelicula en terraza de portería

24-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector obra
Oficial (1)
Ayudante (1)
Personal pulimento (2)
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: pulida de pisos
Aseo y cafetería

25-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: oficial (1)
Ayudante (1)
Personal pulimento (2)
Personal interventoría: Inspector obra
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: aseo y aseo
preparación piso para impermeabilización
Nota: se evidencia en recorrido para instalación
en el area del edificio la demolición de placa
para ubicación de bomba de edigue la cual no
se continua por evidenciar varios de refuerzo
se le indica al contratista realizar un reporte
analisis para la ubicación de esta bomba

26-07-2023 No se realizan actividades de obra.

27-07-2023 No se realizan actividades de obra por
parte del contratista.

Powered by CamScanner

28-07-2023. Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado

Personal en obra: No.
Nota: S No se realizo actividad laboral por parte del contratista.

29-07-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores poliurea (2).
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Herramienta menor
Andamio tubular
Actividades: Instalación de imprimante terraza Comedor.

31-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
Personal obra: Instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Actividades: Aplicación de imprimante terraza Comedor.

01-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación de poliurea terraza Comedor.

02-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores de poliurea (2)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Mantenimiento equipos.

03-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado con lloviznas esporadicas
Personal obra: instaladores poliurea (2), maestro
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: no se realiza actividad de aplicacion de poliurea por falta de material.
se realiza corrección de aplicado terraza con biblioteca.

04-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Maestro (1)
Instaladores Poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Adecuacion y resanes terraza biblioteca
No se realiza aplicación de poliurea por falta de material.

Powered by CamScanner

05-09-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Personal obra: Maestro
Instaladores poliurea (2)
Equipos y Herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Personas en terraza sistoleca y sotano
Nota: No se realiza actividad de aplicación de poliurea por falta de material

08-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado - nublado
Personal obra: instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realizo ninguna actividad.

9-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado Hasta 9:30am
a 9:15 am Iniciamos.
Tarde:
Personal obra: Instaladores poliurea (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realizo ninguna actividad
por parte del contratista
Nota: interventoria solicita al contratista culminar
las actividades que se dieron pendientes

10-09-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores poliurea (2).
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realizo ninguna actividad
por parte del contratista.
Nota: No les ha llegado material para la instalación
de poliurea

11-09-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado (Horas 10 a 10:45am)
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividad: No se realizo ninguna actividad.
Nota: No hubo actividad laboral por falta de
material

Powered by CamScanner

IED. JUSTO VICTOR CHARRY, SEDE A

Actividades: Se realiza instalación de divisiones en acero en baño de niños bachiller y preescolar, instalación de lámparas en los mamos, e instalación de enchape en baño niñas

Residente obra — Supervisor Interv. — Inspector Interv.

10/07/23 Lunes

Clima: mañana: nublado
tarde: nublado

Personal obra:
1 Residente
2 Oficiales
2 Ayudantes

Personal Interv.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: enchape de baño de niñas bachiller y preescolar, aplicación de estuco.

Nota: El día de hoy (ingreso de estudiantes de vacaciones) se hace uso de baño de niños preescolar (y bachiller) y se continúa con intervención en baños de niñas bachiller y preescolar.

NOTA= SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA ENTREGAR APARATOS SANITARIOS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ASEGURADOS DEBIDAMENTE EN LAS BATERIAS QUE SERÁN USADAS A LA FECHA YA INTERVENIDAS.

Residente Obra — Supervisor Interv. — Insp Interv.

11/07/23 Martes

clima: mañana: Nublado
tarde: Nublado

Personal obra:
1 Residente.
2 Oficiales
2 Ayudantes.

Personal Interv.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en

baño de niños bachiller. y aplicación de pañete en el mismo. Se realiza trasiego de materiales a baño de niñas preescolar.

Residente obra — Catalina Insp Interv.

12/07/23 Miércoles

Clima: mañana: Nublado tarde: Soleado

Personal obra: 1 Residente. 1 Maestro 1 Oficiales 2 Ayudantes

Personal Interv. 1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de push, instalación de enchape y aplicación de pañete en baño de niñas bachiller.

Residente obra — Catalina Insp Interv.

13/07/23 Jueves.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Equipo: Herramienta menor.

Personal obra: 1 Residente. 2 Oficiales 2 Ayudantes.

Personal Interv. 1 Inspector.

Actividades: Se continúa con instalación de push, regatas, demolición de poyos, aplicación de pañete e instalación de enchape en baño niñas bachiller.

Residente obra — Catalina Insp Interv.

14/07/23 Viernes.

Clima: mañana: Nublado tarde: fuertes lluvias de 1:00 pm a 3:00 pm.

Personal obra — Personal Interv.
1 Residente — 1 Inspector
2 Oficiales
2 Ayudantes
Equipo: H.menor.
Actividades: Se continúa con aplicación de pañete e instalación de enchape en baño niñas bachiller.
NOTA= SE SOLICITA VERIFICAR ACABADOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES

Residente obra — Insp. Interv.

15/07/23 Sábado.
Clima: mañana: soleado
Personal obra — Personal Interv.
1 Residente — 1 Inspector
2 Oficiales
2 Ayudantes
Equipo: Herramiento menor
Actividades: se continúa con aplicación de pañete en cuarto de aseo de baños de bachiller e instalación de enchape en baño niñas bachille.

Residente obra — Insp. Interv.

17/07/23 Lunes
Clima: mañana: nublado — tarde: soleado
Personal obra — Personal Interv.
1 Residente — 1 Inspector
2 Oficiales
2 Ayudantes
Equipo: Herramiento menor
Actividades: Se continúan intervenciones en baño niñas bachiller con aplicación de pañete e instalación de enchape

Residente obra — Natalia Insp Interv

18/07/23 Martes

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado.

Personal obra

1 Residente.

2 Oficiales.

2 Ayudantes.

Personal Interv.

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizo Instalación de mesón de policuarzo en baño niñas bachiller. y baño niñas preescolar y se continúa con instalación de enchape en baño niñas bachiller.

Residente obra — Natalia Insp Interv.

19/07/23 Miércoles.

clima: mañana: nublado — tarde: Nublado.

Personal obra

1 Residente.

2 Oficiales

2 Ayudantes

Personal Interv.

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con instalación de policuarzo y enchape de muros en baño niñas bachiller.

Residente obra — Natalia Insp Interv.

21/07/23 Viernes

Clima: mañana: Nublado — tarde: Nublado

Personal obra

1. Residente

2 Oficiales

2 Ayudantes.

Personal Interv.

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza instalación de enchape de piso en baño niñas bachiller así como enchape de muros.
NOTA = SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES ACABADOS EN RESANES DE POLICUARZO INSTALADOS TANTO EN BAÑO DE NIÑOS COMO NIÑAS DE PREESCOLAR Y BACHILLER YA QUE POR PARTE DE INTERVENTORÍA NO SON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN SE OBSERVAN ACABADOS IRREGULARES E INADECUADOS.

Residente obra — Inspector Interventoría

22/07/23 Sábado
Clima: mañana: nublado.
Personal obra: — Personal Interv.
1 Residente — 1 Inspector
1 Operarios
2 Ayudantes
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: se continúa con instalación de enchape en baño de niñas bachiller en pisos y muros.
NOTA: INSPECCIÓN INTERVENTORÍA SST. SE DEJA PLASMADO PARA QUE REALICEN SALIDA DE ESCOMBRO, ORGANIZACIÓN DE LABORES DE PROPIOS Y SU IDENTIFICACIÓN, ARREGLAR CANCELAMIENTOS, NO MANTENER MATERIALES POR FUERA DEL MISMO, USO ADECUADO DE LOS E.P.P. NO USO DE CACHUCHAS DENTRO DEL CASCO. MANTENER LOS PERMISOS ACTUALIZADOS Y FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES.
CORDIALMENTE [illegible] INTERVENTORÍA SST 22-07-23

Residente obra — Inspector Interventoría

24/07/23 Lunes
Clima: mañana: soleado — tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente
2 Oficiales
2 Ayudantes

Personal Interventoria:
1 Inspector.
1 SST.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza aplicación de pintura epóxica en techos y muros e instalación de enchape en baño de niñas bachiller.

Residente obra | Inspector Interventoria

25/09/23 Martes

Clima: mañana: soleado | tarde: Nublado con lloviznas

Personal obra:
1 Residente.
1 Oficial
2 Ayudantes

Personal Interv:
1 Inspector.
1 Residente.
1 Director.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de divisiones en acero en baño niñas bachiller, se continúa con instalación de enchape en baño niños preescolar y bachiller.

NOTA= SON BASE EN EL ATRASO EVIDENCIADO EN EL FRENTE DE OBRA, SE SOLICITA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES.

Residente obra | Inspector Interventoria

26/09/23 Miércoles.

Clima: mañana: nublado | tarde: nublado

Personal obra:
1 Residente.
1 Oficiales
2 Ayudantes

Personal Interv.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con instalación de divisiones y enchape en baño niños bachiller., aplicación de estuco y pintura epóxica en muros y techos.

Residente obra

Catalina
Insp. Interv.

27/09/23 Jueves

Clima: mañana: Nublado con lluvias tarde: Soleado

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes

Personal Interv.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza instalación de sanitarios, enchape, y divisiones en baño niñas bachiller y aplicación de pintura epóxica en baño niñas preescolar y bachiller.

Residente obra

Catalina
Insp. Interv

28/07/23 Viernes

Clima: mañana: soleado tarde: nublado

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes

Personal Interv
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: se continúa con instalación de sanitarios, remates en pisos y muros, aplicación de pintura en techos y muros, esto en baño niñas bachiller y preescolar.

Residente obra

Catalina
Insp. Interv.

29/09/23 Sábado

clima: mañana: Soleado

Personal obra:
1 Residente 2 Ayudantes
1 Oficial

Personal Interv
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza instalación de policuarzo en baño de niñas preescolar junto con lavamanos de incrustar, se continúa con aplicación de pintura en muros y techos e instalación de sanitarios en baño niñas bachiller Se realiza retiro de escombro de frente de obra.

Residente obra. Inspector Interv.

31/07/23 Lunes

clima: mañana: soleado tarde: Nublado

Personal obra: Personal Interv.

1 Residente 1 Inspector.

1 Oficial

2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza emboquillado de enchape, aplicación de pintura epóxica en muros y techos de batería niñas sanitario bachiller y preescolar.

Residente obra. Inspector Interv.

01/08/23 Martes

Clima: mañana: nublado. tarde: nublada con lloviznas

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente 1 Inspector.

1 Oficial

2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza demolición de mampostería en área baño traperos baterías preescolar y aplicación de pañete en muro baño traperos baño niños bachiller.

Residente obra Inspector Interv.

02/08/2023 Miércoles

Clima: mañana: nublada tarde: nublada con lluvias.

Personal obra: Personal Interventoría

1 Residente. 1 Inspector.

1 Oficial

2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con aplicación de pintura en techos y muros y pañete en lava traperos batería niñas bachiller.

Residente obra Inspector Interv.

03/08/2023 Jueves

Clima: mañana: nublado con lluvias. tarde: nublado con lluvias.

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente 1 Inspector.

1 Oficial

2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con remates de pintura en batería preescolar y bachiller niñas

NOTA = SE SOLICITA VERIFICAR ACABADOS Y REMATES CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES.

Residente obra Inspector Interv.

04/08/2023 Viernes.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente. 1 Inspector.

NOTA = NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA

Residente obra Inspector Interv

05/08/2023 Sábado

Clima: mañana: soleado

Nota: No se ejecutan actividades en el frente de obra

Residente obra s/actalrac Insp Interv.

08/08/2023 Martes

Clima: mañana: soleado tarde: nublado

Nota: No se ejecutan actividades en el frente de obra.

No se evidencia personal laborando

Residente obra s/actalrac Insp. Interv.

09/08/2023 Miércoles

Clima: mañana: nublado con lluvias de 9am a 11 am

tarde: nublado

nota: No se evidencia personal en el frente, ni avance de obra.

NOTA = DE ACUERDO CON EL ATRASO EVIDENCIADO EN EL FRENTE DE OBRA RESPECTO A PROGRAMACIÓN ENTREGADA Y AVALADA Y EL INSUFICIENTE AVANCE FISICO Y FALTA DE PERSONAL SE NOTA REALIZA ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA, SU EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PERTINENTES PARA MITIGAR ESTE ATRASO. DE MANERA DILIGENTE. CON BASE EN COMITÈ DE OBRA NO. 30 SE SOLICITA LA ENTREGA DE PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO A LA FECHA.

Residente obra s/actalrac Insp Interv.

10/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Nota: NO se realizan actividades en el frente de obra.

Residente obra s/actalrac Insp Interv.

11/08/23 Viernes

Clima: mañana: nublado con lluvias tarde: nublado.

IED. SAN JOSÉ NORTE

SABADO 08-07-2023

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (5)
- AYUDANTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ROTOMARTILLO
- CANGURO COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON PATETE EN MUROS DE LA NUEVA MULTIPLE
- CONTINUAN CON EL TENDIDO AL PUNTO DE ACOPIO.

* SE TERMINAN LAS LABORES A LAS 12 PM.

CAMILO ANDRES M
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Contratista

10-07-2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: LLUVIAS LEVES (10 am a 12 pm)
- TARDE: LLUVIAS FUERTES (1 pm a 3 pm)

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (5)
- AYUDANTE (4)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ROTOMARTILLO
- CANGURO COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES

Powered by CamScanner

• CONTINUAN CON PAÑETE EN MUROS DEL AULA MULTIPLE.
• CONTINUAN CON RELLENO DE RECEBO B 400 EN LA ZONA DE LA COCINA.

* SE TERMINAN LAS LABORES A LAS 5PM

Residente de obra

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

11-07-2025 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: NUBLADO
• TARDE: SOLEADO

*PERSONAL DE OBRA
• OFICIAL (5)
• AYUDANTE (1)

*PERSONAL DE INTERVENTORIA
• INSPECTOR (1)

* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR
• ROTOMARTILLO
• CANGURO COMPACTADOR
• ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES
• CONTINUAN CON PAÑETE EN MUROS DEL AULA MULTIPLE
• INICIAN CON EL CORTE Y DILATACION DE LA PLACA DEL AULA MULTIPLE.
• INICIAN CON DEMOLICION DE MURO MACHETEADO MAMPOSTERIA DEL LABORATORIO.
• CONTINUAN CON EL TRASIEGO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.

Residente de obra

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

12-07-2023 MIERCOLES

*ESTADO DEL CLIMA

. MAÑANA : NUBLADO

. TARDE : NUBLADO

*PERSONAL DE OBRA

. OFICIAL (S)

. AYUDANTE (1)

. INSPECTOR (1)

*PERSONAL DE INTERVENTORIA

. INSPECTOR (1)

EQUIPO

. HERRAMIENTA MENOR

. ROTOMARTILLO

. CANGURO COMPACTADOR

. ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES

. CONTINUAR CON PAÑETES DEL AULA MULTIPLE.

. CONTINUAR CON RELLENO DE RECEBO B4U EN LA ZONA DE LA COCINA.

. CONTINUAR CON EL DESMONTE DE VEGETALES DEL AULA MULTIPLE.

* SE TERMINAN LAS LABORES A LAS 5 PM

Recibido con

CAMILO RANGEL II

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

13-07-2023 JUEVES

* ESTADO DEL CLIMA

. MAÑANA : NUBLADO

. TARDE : SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA

. OFICIAL (S)

. AYUDANTE (1)

. INSPECTOR (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA

. INSPECTOR (1)

* EQUIPO

. HERRAMIENTA MENOR

. ROTOMARTILLO


. CANGURO COMPACTADOR

. ANDAMIO CERTIFICADO

Powered by CamScanner

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON PARETE EN MIRAS DEL AULA MÚLTIPLE.
- CONTINUAN CON EL DESMONTE DE VENTANERIA DEL AULA MULTIPLE.

* SE TERMINAN LABORES A LAS 5 PM



Inspector de obra

CAMILO RAMOS
INSPECTOR DE INTELIGENCIA

14-07-2023 VIERNES
* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: LLUVIA LEVE (7am a 9 am)
- TARDE:

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (4)
- AYUDANTE (7)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ROTOMARTILLO
- CANGURO COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON PARETE EN CUARTO DE ENTRE-PAÑOS.
- CONTINUAN CON PARETE EN EL AULA MULTIPLE
- CONTINUAN CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE LA ZONA DE CAFETERIA.

14-07-23 NOTA: INTERVENTORIA. SE INSPECCIONA MURO DE LA CON LA PARTE TECNICA CUAL NO TE RIESGO DE CAIDA POR QUE ESTA EMPASADA CON CON LA COLUMNA Y MUROS.
COORDINAMENTE: CAMILO MURCIA

15/07/2023 Sábado

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (7)
- AYUDANTE (3)
- ENCARGADO (2)
* EQUIPO
- ROTOMARTILLO
- CAMION COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON PARTE EN MUROS DEL AULA MULTIPLE.
- CONTINUAN CON PARTE EN ZONA DE CRUCETO ENTRE PATIOS.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* SE TERMINAN LAS LABORES A LAS 5 PM

CAMILO FRANCISCO H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

17-07-2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (7)
- AYUDANTE (3)
- ENCARGADO (2)
* EQUIPO
- ROTOMARTILLO
- CAMION COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO
* ACTIVIDADES

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

Powered by CamScanner

• PAÑETE EN MUROS DEL AULA MULTIPLE.
• RELLENO DE SUBBASE RECIBO EN LA ZONA DEL LABORATORIO 2.
• INICIAN CON LA DEMOLICIÓN DE LAS AULAS PREFABRICADAS COSTADO SUR.

* SE TERMINAN ACTIVIDADES A LAS 5PM

CAMILO FRANCO H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

18.01.2023 MARTES
* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: NUBLADO
• TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
• OFICIAL (7)
• AYUDANTE (3)
• ENCARGADOS (2)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
• INSPECTOR (2)
* EQUIPO
• ROTOMARTILLO
• CANGURO COMPACTADOR
• ANDAMIO CERTIFICADO
* ACTIVIDADES
• CONTINUAN CON PAÑETE EN MUROS DEL AULA MULTIPLE
• CONTINUAN CON RELLENO DE SUBBASE GRANULAR EN LA ZONA DEL LABORATORIO 2.
• CONTINUAN CON LA DEMOLICIÓN DE LOS MODULOS DE LAS AULAS ZONA SUR CANCHA.
* NOTA INTERVENTORIA
SE EVIDENCIA QUE EL NUEVO PERSONAL QUE INGRESO NO CONTABA CON LOS EPP Y ESTABAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN.

CAMILO FRANCO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

19-01 2023 MIERCOLES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA NUBLADO
- TARDE:

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (6)
- AYUDANTE (5)
- INSPECTOR (2)
- ENCARGADO 1

* PERSONAL DE INTERVENTORIA:
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- ROTOMARTILLO
- CANGURO COMPACTADOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES
- CONTINUAR CON ESCARIFICACIÓN DE TECHOS DEL AULA MULTIPLE.
- INICIAR CON LA PICADA DE MANTO EN LA PLACA DEL AULA MULTIPLE.
- CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA MODULARES DE LA ZONA SUR DE CANCHA.

NOTA INTERVENTORIA: SE EVIDENCIA EN OBRA REALIZANDO TRABAJOS DE RETIRO DE TEJAS DEMOLICION DE PISOS, PAÑETES DE MURO EN RETIRO DE LAS MISMAS, PERSONAL NUEVO SIN CONOCIMIENTO DE PARTE DE INTERVENTORIA SST, LA CUAL ESTABAN SIN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPLETA KI DOTACIÓN Y SIN VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN PLATAFORMA NI EN FISICO EN CAMPO SE LES HACE LA RECOMENDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MISIÓN. HASTA NO TENER DOCUMENTACION AL DIA Y LOS E.P.P. PRIMORDIALES.
SE DEJAN HALLAZGOS ENCONTRADOS PARA CIERRES
- MEJORAR ENTRENAMIENTOS
- ENTREGAR DOTACIONES COMPLETAS A PERSONAL NUEVO. - ENTREGAR LOS E.P.P.

Powered by CamScanner

- Mejorar y verificar los documentos y formatos en campo su completo diligenciamiento por los trabajadores que firmen su respectivo permiso.
- Sacar escombros.
- Delimitar áreas de actividades críticas (en alturas)
- Demarcar sitios de acopios y puntos ecológicos de la obra. Pendientes algunos. Orden y aseo de los mismos.
- Realizar cambio a lugar visible el equipo de emergencia, (extintor, camilla, botiquín)
- Actualizar carteleria del SGST en lugar visibles para el personal.
- Explicar a personal nuevo o por reprogramación sobre el manejo de los formatos a cumplir
- Tener la documentación al día del personal en los sitios de trabajo estar verificando y actualizando.
- Dejo por escrito el personal que estuvo el día de hoy sin documentación en campo.

Orlando Liliani, Alberto Marquez, Daniel Marquez Lizbeski Mier, Yordi Muñoz, Heydi Quevedo, Fernando Minello Plazas, Daniel Escobar, Elvis José Aponte,

- Reforzar mucho el buen uso de los E.P.P apropiados. para labor desarrollada.

Cordialmente Yenia H [signature] 10-0421 Interventoria SST.

19/07/23 se realizan actividades en la obra: en la cual se solicitó al contratista la toma de 6 bolillindros probatorios para el concreto que será vaciado en el aula de laboratorio N° 2 e igualmente se había solicitado la toma de densidades al material granular compactado en la zona de baños contiguos al aula multiple. Reemplazando al inspector de interventoria saliente; inicio dejando esta anotación el día de hoy

Edwin NUÑEZ
Insp. Int.

27/07/23 Estado del Tiempo
Mañana y tarde = nublado.

Personal de obra: Personal operativo
Inspector de obra: 1
Encargado = 1
opiciales de obra: 3
Ayudantes = 7

Herramientas y Equipos
Andamios certificados
Pulidora
Herramienta menor

Actividades

*Continúa preparación de superficie bajo placas en el aula multiple.
* Levante de muro en la parte superior del aula multiple
* Aplicación de parche en el aula multiple.
* Continúa demolición de los modulares en el bloque n°1
* Inicia retiro de escombros en volqueta tradicional de 6 m³
Observaciones: se evidencia que en la demolición de los modulares en la parte externas de dichos muros, se evidencia que los muros externos estan contituidos por laminas metalicas y la parte interna por laminas en superboard.
* El concreto de la placa de contrapiso para el area del laboratorio n° 2, quedo programado para el dia lunes 24 segun el inspector de obra.
* Me informa el contratista (inspector de obra) que estan a la espera del resultado de las pruebas de densidades tomado en el area de baños

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

NOTA. INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLETO EL NUEVO CONTRATISTA DE EPP Y DOTACIÓN.
- PENDIENTE SACAR ESCANEO CAM-ANGELS
- PENDIENTE SACAR DRYWALL
- PENDIENTE DOTACIÓN PARA LOS SEÑORES: JOSE DAVID MUÑOZ PAEZ, DANIEL ESCOBAR, COD: YOHAN PUERTAS / 21-07-23 3:30
- PENDIENTE USO EPP STIVEN DE VOLANTAS. (LLEVO ORIENTACIÓN)

22/07/23 Estado del tiempo

Personal de obra
Inspector de obra = 1
Encargado = 1
Oficiales de obra = 3
Ayudantes = 7
Herramientas y equipos
Andamios certificados
Pulidora
Herramienta menor
Preparacion de superficie bordo placa
* Picado de membranas sobre placa en los bordes

EDWIN NUÑEZ
Inspector

24/07/23 * Se inicia el vaciado
Estado del clima
Mañana y tarde = soleada

*Personal de obra =
Inspector de obra = 1
Encargado = 1
oficiales de obra = 3
Ayudantes = 7
Herramientas y Equipos
* Mezcladora de concreto comun
* Andamio certificado.
* Herramienta menor.

Powered by CamScanner

Actividades

2

Vaciado de concreto en el area del laboratorio N°2 mezclado en sitio con mezcladora comun
Nota= se evidencia que contratistas no toma muestras de resistencias del concreto, aun menos utilizo vibrador para eliminar los burbujas de aire del concreto; se utilizo una dosificacion de: cemento: 1 bulto de 50 K9, paladas de arena= 30 y paladas de gravillas= 23. Nota 2= siendo un poco mas de las 04:0 P.M, el trompo o mezcladora se averio.
Nota 2= se recomienda el correcto curado del concreto y su debida dilatacion para evitar fisuras futuras.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

25-07-23 INSPECCION INTERVENTORIA SE REALIZA RECORRIDO
- PERSONAL SIN E.P.P COMPLETOS PARA LA ACTIVIDAD
- ORDEN Y ASEO FATAL
- CLASIFICACION DE RESIDUOS NO CLASIFICADOS PERFECTAMENTE,
- VARILLAS POR LOS SENDEROS DE PASO PEATONAL.
- CERRAMIENTOS CAIDOS NO AJUSTADOS.
- CARCAMOS LLENOS DE CEMENTO.
- SACAR CHATARRA
- SACAR BASURAS.
- SACAR MADERA.
- SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE PAÑETE Y AFINADO, PEGADA DE LADRILLOS, ARREGLO DE FILOS DE COLUMNAS. DEMOLICION DE PLACA.
- RECOMENDACION SE DEJA HALLAZGOS PENDIENTES PARA MANTENER COMO SE DEJO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y SST.
CORDIALMENTE YAVIN HUERTAS INTERVENTORIA. SST.

25/07/23 Tiempo:
Mañana y tarde: nublada.

Personal de obra:

Residente: 1
Inspector: 1
Inspector SST: 1

oficiales: 2
Ayudantes: 6

Actividades:
*Pacheteo dentro del aula multiple.
* Levante de muro en el laboratorio n° 1.
* Continúa demolición del techo en la terraza de bachs.
* Orden y aseo.
Notas: las franjas de areas faltantes en el laboratorio n° 2 en la placa de contrapiso fue vaciado con un mezclado manual; con una dosificación cuya resistencia fue mas baja.

EDWIN NUÑEZ
ING. INT.

26/07/23 Mañana y tarde: nublada

Personal de obra:
oficiales: 2
Ayudantes: 6

Actividades
Demolición de techo sobre terraza del aulamultiple.
Pacheteo en el aula multiple

EDWIN NUÑEZ

Powered by CamScanner

Inge Interventoria

27/07/23 Tiempo = mañana y tarde = soleado

Personal de obra

oficiales = 2

Ayudantes = 6

Actividades

* Pañete bajo placa en el aula multiple
* Armado de hierro entre viga de confinamiento en laboratorio
* Excavación manual en bajos
* Levante de muro en bajos

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

28-07-23. INSPECCION DE SEGUIMIENTO DE ORDEN Y USO EPP
- PERSONAL SIN CASCO, ARL SIN FIRMAR Y NO CONOCE
LA MIS PARA EL RECINTO.
COORDINADOR
Yairo Duran

28/07/23 Tiempo = mañana = soleado y tarde = nublado

Personal de obra oficiales 3 Ayudantes = 9

Equipo = herramienta menor

Andamio certificado.

Actividad

* Excavación manual en bajos.
* Demolición de manto asfaltico en la terminación del aula multiple
* Pañete bajo placa en el aula multiple
* Levante de muro en laboratorio

Nota = Se solicito al contratista considerar la seguridad del muro con altura mas alta en el aula de laboratorio ; teniendo en cuenta que dicho muro no esta reportado por columnas el cual tiene una longitud = 70.70m, logrando una altura de: 3.63 m al terminado de la vigueta de confinamiento lo cual es una altura considerable.

Powered by CamScanner

EDWIN NUÑEZ
LASP, IAT

31-07-23 INSPECCIÓN INTERVENTORÍA SST TENER PRESENTE LO SIGUIENTE) HALLAZGOS ENCONTRADOS PERMISOS DE TRABAJO NO EMISION, EPP PARA EL PERSONAL GUANTES, GAFAS, TAPABOCAS, PERSONAL SIN CASCO. ETIQUETADO DE QUIMICOS GASOLINA. Y FICHA DE SEGURIDAD. ORDEN Y ASEO EN SITIO DE CONFERENCIAS, ENTREGA DE DOTACIÓN A 3 PERSONAS PENDIENTES. ORGANIZAR CARPETA DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL FALTAN, COMPLETAR ANDAMIOS, USO DE PLANILLAS ANCLADOS, DEMARCACIÓN DE HUECOS. SACAR ESCOMBRO Y PENDIENTES. MANTENER EL ORDEN Y ASEO-
YAMIN NUÑEZ
INTERVENTORIA SST.

31/07/23 Tiempo = Mañana y tarde = nublados.
Personal de obra
oficiales = 7.
Ayudantes = 5.
Herramienta y Equipo
Andamios certificados
Herramienta menor

Actividades
* Pañete sobre muros en laboratorio
* Pañete bajo placa en el aula multiple
* Demolición manual en las terrazas del aula multiple
* Instalación hidrosanitarias en baños

Nota = la viga de laboratorio se vacio el dia sabado 29/07/23.
Hoy se tomo nuestras de testigos de concreto por parte de contratista.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

07/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublada
Personal de obra = oficiales = 7, Ayudantes = 5.
Herramientas y equipo = Andamio certificado y Herramienta menor
Actividades = * Pañete sobre muros en laboratorio.
* Pañete bajo placa en el aula multiple.
* Instalación hidro sanitarias en baños.
* Demolición resto de los terrazos del aula multiple.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

02-/08-23 INSPECCION DE INSTALACIONES SE EJECUTARON PERSONAL SIN BOTAS, PENDIENTE FIRMAS DE TRABAJADORES.
RESPONSABLE
YADIN NUÑEZ — INSPECTOR SST.

02/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado
Personal de obra = oficiales 7 = ayudantes = 3
Herramienta y equipo = Andamio certificado y herramienta menor
Actividades = * Pañete en laboratorio.
* Pañete en muros aula multiple. * Instalación tuberia y puntos hidrosanitarios en el baño.
EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

04/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = nublados.
oficiales = 6
Ayudantes = 2
Herramientas y equipo:
*Mezcladora pequeña.
* Herramienta menor.
Actividades = vaciado de alistado de piso en el aula multiple
* Pañete bajo placas en el aula multiple
* Instalación puntos hidrosanitarios en baños.
Notas = En el vaciado del alistado en el aula multiple se utilizo una clarificación de: cemento = 1 Bulto de 50 kg

Arena = 25 Paladas
el alistado de piso del aula multiple se realizo de forma manual, mezclado tradicionalmente con palas.
Se recomado limpiar el piso y aplicar agua antes de vaciar el alistado; para mayor calidad en las instalaciones

EDWIN NUÑEZ
Inge, Int.

08/08/23 Tiempo = mañana y tarde = soleado.
Personal de obra = oficiales = 5 y Ayudantes = 3
Herramienta y equipo = 2 mezcladora electrica de 7/2 bulto la cual fue remplazada por una mezcladora mediana.
y Herramienta menor, andamio certificado
Actividades
# Pañete y estuco en muros del salon multiple.
# Vaciado de concreto en la placa de contrapiso en el baño
Nota = aproximadamente el 40 % de la primera parte del las losas de esp = de 0.20m fundidas; fue vaciada con la mezcladora electrica de 7/2 bulto y la otra parte inicio a ser vaciada con la mezcladora de gasolina mediana
# con la mezcladora de 7/2 bulto de utilizo una dosificacion de 7/2 bulto de cemento, 2 cubetas de 20 litros de arena y 3 cubetas de 20 litros de gravillas (1-2-3), con las mezcladoras medianas se recomendo utilizar una dosificacion (1-2-3) para alcanzar la resistencia de 27 MPA.
# No se utilizo vibrador para eliminar las burbujas de aire del concreto.
Nota 2: Se solicita la correcta dosificación del concreto, vibrado, curado y vaciado teniendo en cuenta las normas vigentes y recomendaciones tecnicas del area de la construcción y niveles del terminado final del piso.

EDWIN NUÑEZ
Inge, Int.

Powered by CamScanner

10-08-2023 INSPECCIONES DE SUPERVISORIA, TOMA DE COTAS, USO DE INCORACIÓN, OBRA Y ASEO SE RECOMIENDA JEFATURA DE OBRA Y ASEO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES. ACTIVIDADES A REALIZARSE LAS SIGUIENTES: PARED DE MUROS ESTRUCTURA, FUNDICIÓN VIGAS Y PISOS EN CUADRANTES PERSONAL EN OBRA 10 PERSONAS.

CORDIALMENTE

JOHN MARIN SUPERVISOR TSE.

20/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = nublado

Personal operativo = Oficiales = 5 Ayudantes = 4

Herramientas: Mezcladoras electricas de 7/2 bulto de cemento y Herramientas menor.

Actividades = Vaciado de alistado de piso sin latex en la terraza de baños.

* Levante de muros en 2do (CONTINUACIÓN) el aulas multiple.

* Pañete sobre muros en el aulas multiple.

* Aplicación de estuco en muros del aulas multiple.

Notas: se recomendo asegurar el suficiente desnivel del pendiente todo de la terraza, su correcta dosificación (1-3) y su correcto curado.

EDWIN NUÑEZ

Insp, Int.

21/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado

Personal operativo = Oficiales = 5 Ayudantes = 3

Herramientas: mezcladoras electricas pequeña y herramientas menor

Actividades = * Levante de muros en cafeteria

* Enchape de piso en el aulas multiple. * Pañete lineal sobre columnas del aulas multiple.

* vaciado de alistado (pendiente todo) en las terrazas del aulas multiple.

Recomendaciones = * Se solicita asegurar la dosificación (1:3) del alistado de la terraza del aulas multiple: adicionalmente del correcto curado para evitar futuras fisuras o grietas sobre el mismo

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Actividades: Se continuan actividades de remate de pañetes y de estuco en area de comedor

10/07/23 Estado del Clima: -Mañana: Nublado
-Tarde: Soleado

Personal Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente
Equipo: Herramienta Menor.
Actividades: Se realiza ceramiento con polvombra en las areas a intervenir y de igual manera se continua con actividades de estuco en area de comedor

11/07/23 Estado del Clima: -Mañana: Nublado
-Tarde: Soleado

Personal Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente
Herramienta menor: Equipo:
Actividades: Se realizara demoliciones en area de la tarima, tanto de muros como de placa de la misma. De igual manera se continuan actividades de remate de estuco y filos de pañete en area de comedor

12/07/23 Estado del Clima: -Mañana: Nublado
-Tarde: Nublado.

Personal Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se continuan actividades de demolicion de tarima (placa y muros). Se realizan remates de estuco en area de comedor. (Remates en techo y filos de ventanas y puertas).

13/07/23 Estado del Clima: -Mañana: Nublado
-Tarde: Nublado.

Personal Obra
-1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente.
Equipo: 1 Demoledor, herramienta menor.
Actividades: Se continuan actividades de demolicion de tarima en muros y placa. Se continuan remates de estuco y filos.

14/07/23. Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.

Personal Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente
Equipo: 1 Demoledor. herramienta menor.
Actividades: Se continua con la demolicion de la tarima en muros y placa. De igual forma se realizan remate de estuco en area de comedor

15/07/23 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal de obra
1 Residente
1 OFicial
2 Ayudantes.
1 sst.
Equipo: 1 Demoledor herramienta menor
Actividades: Se continua con la demolicion de la tarima en muros y Placa. Se continuan remates de Filos de estuco en area de Comedor.

17/07/23 Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.

Powered by CamScanner

Personal de obra:
1 Oficial
1 Residente
2 Ayudantes.
Equipo: Rotomartillo, Herramienta menor.
Actividad: Se continua con la demolicion de la tarima en columnetas y vigas. Se continua con remate de friso y Pintura en zona de comedor.

18/07/23. Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

Personal de obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes.
1 interventor
Equipo: Rotomartillo, Herramienta menor.
Actividad: Se continua con la demolicion de la tarima en columnetas y vigas. Se continua con remate de pintura en zona de comedor.

19/07/23. Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal de obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes.
Equipo: Rotomartillo, Herramienta menor.
Actividad: Se continue con la demolicion de la tarima, se da inicio actividad de demolicion de Piso en area exterior comedor y Se continua con remate de Friso de estuco y Pintura en area de comedor. Se instalan Ventanas en area de comedor.

21/07/23 Estado del Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra:

1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes,
1 interventor.
Equipo: Herramienta menor.
Actividad: Limpieza de escombros, Se continua actividad de demolicion de Piso en area exterior de comedor e inicio de replanteo de estructura para modular cocina.

22/07/23. Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes.
Equipo: Herramienta menor.
Actividad: Replanteo de estructura para modular cocina e inicio de excavacion para zapatas.

24.07.2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

Personal obra: Inspector tecnico
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Rotomartillo
Herramienta menor
Actividades: Replanteo y excavacion para zapatas.
Picadura vigas y columnetas
Nota: se recibio visita del arquitecto Alejandro, Ricardo y Carlos de la sede, donde se toma la decision por parte de los arquitectos realizar un nuevo diseño de la cocina y el cerramiento de la instalacion donde expresaron de entrega dentro de un plazo maximo de 8 dias.

Powered by CamScanner

25/07/23 Estado del Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro ofical
2 Ayudantes
Equipo: Herramienta menor, Pulidora
Actividad: Relleno de excavacion anteriormente realizada por cambio de diseño de Cocina y Comedor, inicio de actividad de Pañete de muro exterior e inicio de actividad de levantamiento de muro divisorio en area de Cocina.

26/07/23 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Oficial
2 Ayudantes.
1 interventor.
Equipo: Herramienta menor, Pulidora.
Actividad: Se continua con el Pañete de muro exterior y el levantamiento de muro divisorio en area de Cocina.

27-07-23 INSPECCIÓN INTERVENTORIA SE ENCUENTRA 1 PERSONA TRABAJANDO SOLO, CON ANDAMIO INCOMPLETO, SE LE DA RECOMENDACIONES, FALTA ORDEN Y ASEO. Y CAPACITACIÓN DE MIEMBROS RETIRADOS, SE EVIDENCIO ENTREGA DE EPP CORRESPONDIENTES, ACTIVIDADES DE PAÑETANDO MURO. CORDIALMENTE YAIDEN HUERTAS INTERVENTORIA SST
Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Oficial (1)
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Actividades: pañete sobre muro perimetral

29-07-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Personal obra: NO.
Nota: No se realizo actividad laboral por parte del contratista.

31-07-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Oficial (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico.
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Actividades: pañete en muro perimetral

1-08-2023 Estado del tiempo: Mañana Soleado
tarde: Nublado
Personal de obra: Inspector tecnico
Oficial
Personal Interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Herramienta Menor
Actividad: Pañete muro perimetral.

2/08/2023. Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
Personal de obra. inspector tecnico
Oficial.
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Pañete de muro Perimetral.

03-08-2023 Estado del clima: Nublado con lloviznas.
Tarde: Nublado
Personal obra: oficial (1)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Andamio tubular
Actividades. afinado pañete perimetral

Powered by CamScanner

04/08/23 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal de obra: inspector tecnico
Oficial
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Continuacion y elaboracion columnetas muro divisorio en area de bodega.

05/08/2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: inspector tecnico
Oficial.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Terminacion de pañete muro perimetal exterior

08/08/2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde:
Personal obra: inspector tecnico
Oficial (1)
Personal interventoria: inspector tecnico
inspector sst
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Andamio tubular.
Estado de material: 1 viaje de arena de rio
Actividades: Afinado pañete muros.
Nota: En visita interventoria se observo 1 solo personal laborando

09/08/2023 Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: Nublado.
Personal de obra: inspector tecnico
1 Oficial
Equipos y herramientas: Herramienta menor.
Actividades: Fundida de columnetas e inicio de pañete muro divisorio

10/08/2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde:

Personal de obra: Inspector tecnico.
1 Oficial
Residente de obra
Director de obra.
Inspector interventoria.
Supervision.
Equipo y herramienta: Herramienta de caja menor.
Actividades: Se continuan actividades de pañete de muro divisorio.
Nota: Se recibe visita del arq. Juan Alejandro Carlos. por parte de la SED. Para definir y ultimar detalles del cambio del diseño de cocina modular donde se encuentra dentro de esos cambios la modificacion de la ventana de aluminio nueva recien instalada se hará el cambio por puerta y se hará el desmonte de la misma para ser entregada directamente a ellos y les sea de utilidad en otro colegio, adicional se hacia demolicion de baldosa en granito del area de cocina para instalacion sanitarios, y Contramarcos de Placa en area de cocina y comedor.

Powered by CamScanner

IED SIMÓN BOLÍVAR

10.07.2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: LLUVIAS LEVES (9 AM A 12 PM)
- TARDE: LLUVIAS FUERTES (1 PM A 3 PM)

* PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTES (2)
- RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
- INICIAN CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO DE 4 CM A 5 CM DEL AULA MULTIPLE SIN ACERO DE REFUERZO.
- INICIAN CON EL TRASLADO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.

* NOTA INTERVENTORIA
SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL CONCEPTO GEOTECNISTA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL SUELO DEL AULA MULTIPLE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN.

CAMILO [illegible] H.
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

11.07.2023 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTES (2)
- RESIDENTE (1)
- OFICIAL (2)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)
- INSPECTOR [illegible] (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
. CONTINUAN CON LA DEMOLICION DE PISOS EN LA ZONA DE (LABOR) AULA MULTIPLE.
. CONTINUAN CON EL TRASLADO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO

NOTA INTERVENTORIA SST SE ENCUENTRA REALIZANDO CHARLA CON CUADRILLA Y LUEGO SE SIGUE ENTRENAMIENTO CON POLISOMBRA, FALTA EQUIPOS DE EMERGENCIA, DELIMITACION DE ZONAS, Y EL BUEN USO DE LOS E.P.P., NO RETIRAR ENCERRAMIENTOS HASTA TERMINA OBRA.
CUADRILLA LABOR Y AULA MULTIPLE. INTERVENTORIA SST

CAMILO FANDIÑO H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

12-07-2023 MIERCOLES
* ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA NUBLADO
. TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
. OFICIAL (1)
. AYUDANTE (2)
. INSPECTOR (1)
* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
. INSPECTOR (1)
* ACTIVIDADES
. CONTINUAN CON LA DEMOLICION DE ENCHAPE Y ALISTADO DEL PISO DEL AULA MULTIPLE
. CONTINUAN CON EL TRASLADO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO

CAMILO FANDIÑO H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

13-01-2023 JUEVES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- Oficial (1)
- AYUDANTE (2)
- INSPECTOR (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON LA DEMOLICION DE ENCHAPE Y ALISTADO DEL PISO DEL AULA MULTIPLE.
- CONTINUAN CON EL TENDIDO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.

* SE TERMINAN LABORES A LAS 5 PM

Camila Fonseca H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

14-01-2023 VIERNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: LLUVIAS LEVES (7am a 9am)
- TARDE: LLUVIAS LEVES (1 PM a 3 PM)

* PERSONAL DE OBRA
- Oficial (1)
- AYUDANTE (2)
- INSPECTOR (1)
- RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON LA DEMOLICION DE ENCHAPE Y ALISTADO DEL PISO DEL AULA MULTIPLE

Powered by CamScanner

• CONTINUAN CON EL TRASLADO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.

* SE TERMINAN LABORES A LAS 5 P.M.

Cordial saludo H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

15-07-2023 SABADO
* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: NUBLADO
* ACTIVIDADES,
• NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo H.
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

17-07-2023 LUNES
* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: NUBLADO
• TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
• OFICIAL (1)
• AYUDANTE (2)
• INSPECTOR (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
• INSPECTOR (1)
* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
• INICIAN CON LA DEMOLICION DE CUARTOS AUXILIARES DEL AULA MULTIPLE
• CONTINUAN CON TRASLADO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.
* SE TERMINAN LAS LABORES A LAS 5 P.M.

Cordial saludo H
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

18.07.2023 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: NUBLADO

* PERSONAL DE OBRA
- Oficial (1)
- AYUDANTE (2)
- RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTORES (2)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
- CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LOS CUARTOS AUXILIARES DEL AULA MULTIPLE
- INICIAN CON LA DEMOLICIÓN DEL AULA DE MUSICA Y DANZAS.
- CONTINUAN CON EL TRASIEGO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.

CAMILO FAJARDO H.
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

19-07-2023 Miercoles

* Estado del Clima
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

* Personal de Obra
- Oficial (1)
- Ayudante (2)
- Residente (1)

* Personal de Interventoria
* Inspectores (2)

* Equipo
- Herramienta menor

* Continua demolicion de Cuartos y Bodegas Area Mujeres y Duchas
- Continuacion con el trasiego del escombros al punto de Acopio

Inspector de Interventoria.

20-07-2023 Jueves
No se laboro

21-07-2023 Viernes
* Estado del tiempo
Mañana: Lluvioso
Tarde: nublado
* Personal de Obra
• Oficial (1)
• Ayudante (2)
• Residente (1)
* Personal de Interventoría
* Inspector (1)
* Equipo
- Herramienta menor
• Se continua demolicion del Area de Solondeducao y musica
• Se continua transporte de Escombros A Area de punto de acopio.

Residente de obra

Inspector de Interventoría.

22/07/23 Continua acopio de escombro al patio cerrado.

Estado del tiempo = mañana =
Tarde = nublada.

personal de obra=
oficial = (2)
Ayudante: (2)
Residente = 1

Equipo:

Herramientas menor

Se realiza demolición en el salón de danza y música.
Continúa acopio de escombro alrededor del predio con cerramiento.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

24-07-23 INSPECCION DE SUPERVISORES SST. SE EVIDENCIA EXISTENTE ESCOMBRO, NO EXISTE PERSONAL TRABAJANDO, FALTA ORDEN Y ASEO.

CARLOS ALFARO
YANIN QUIROS

24/07/23 De acuerdo a lo indagado de acuerdo al percance: por el imprevisto presentado con las llaves del aulas de danza y música; al parecer no se pudo ingresar a la obra para su continuación

Residente de Obra

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

24/07/23 Hurta
* Estado del tiempo
Mañana: Luminoso
tarde: Lluvioso
* Personal obra
Oficial (1)
• Ayudantes (2)
• Residente (1)
* Personal de Intendencia
* Inspectores (2)
* equipo
- Herramientas menores
- Se Continua demoliendo Area de Salon de danzas y musica
• Se Continua trasiego de Escombros A Area de Predio de acopio

Residente de Obra

25/07/23 Estado del tiempo

Mañana y tarde = nublada.

Personal de obra =

Encargado = 1

oficiales = 1

Ayudantes = 3

Residentes = 1

Equipo :

Rotamartillo

Herramienta menor.

Actividades ,

*Continúa demolición del alistado y acabado de piso en el aula de música y danza.

* Acopio de escombro en el patio baño cervamiento.

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

Residente de obra

26/07/23 Estado del tiempo

Mañana y tarde = nublada

Personal de obra

Oficiales = 1 Residentes = 1

Ayudantes = 3

Equipo =

Taladro percutor

Herramientas menor

Actividades

* continúa demolición del alistado de piso, acabado y placa de contrapiso en el aula de música y danzas.

Powered by CamScanner

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

27/07/23 Personal de obra: Mañana y tarde = soleada
Opiciales =
Ayudantes = 3

Equipo:
Rotomartillo
Herramientas menor.

Actividades

* Continúa demolición del alistado, acabado y placa de contra piso en el aula de música y danza.

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

28/07/23 Personal de obra
Ayudantes = 3
Equipo = Rotomartillo - Herramientas menor.
Actividades:
* continúa demolición del alistado, acabado y placas de contra piso en el aula de música y danza.

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

29/07/23 Personal operativo: Ayudantes = 4
Herramienta y equipo = *Rotomartillo y Herramienta menor.
Actividades:
Continúa demolición de acabado, alistado, y placa de contra piso en el aula de músicas y danzas.

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

31-07-23 INSPECCION INTERVENTORIA SE ENCONTRO EN EL PISO DEMOLIDO PERSONAL EN MISIONES DE DEMOLICION PISO CON PORO MARTILLO ELECTRICO NO TENIAN TODO EL DOTACION NO HABIAN FIRMADO PLANILLA ATS POR QUE NO ESTABAN LOS PERMISOS. NI LLENADO PREOPERACIONAL POR FALTA DE ELEMENTOS. ESTAN TRABAJANDO CON ESCOMBRO AL DESPLAZARCE HAY MUCHO ACOPIO DE ESCOMBRO.

YAIRO HUERTAS
INTERVENTORIA SST

31/07/23 Personal Operativo = 2 ayudantes 1 Residente de obra.
Equipo = Herramienta menor y Rotomartillo.
Actividades
* Continúa demolición de acabado, enlistado y placa de contrapiso en el aula de musica y danza.
* Desmonte de cielo raso en madera en el aula de danza y musicas.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

1-08/23 Estado del tiempo : Mañana: Soleado
: Tarde: Nublado
Personal en Obra + Personal Entre Ventana: Inspector(2)
- Oficial 1
- Ayudante 2
- Residente 1
- Equipo
- Herramienta Menor, Mayuinan Rotomartillo. taladro
- Se continuo demoliendo placa y alistado en pasillo de Ventas y Salones de Musica. Se Continua trasiego de escombros A Area de Punto de acopio.
- Problema de Cielo Raso en mucho.

Residente de obra

2/03/23 Estado del tiempo: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

Personal en Obra
* 1 oficial
* 1 Ayudante
* Residente de Obra

Personal Interviniente: 1 Inspector

Equipo
- Herramienta Menor Equipo: Rotomartillo, taladro percutor
* Se Continua Demolicion de placa de contrapiso, area de Pasillos, de oficina y aislado y terminado de piso
* Se Continua con demolicion de Cielo Raso en area de Pasillos.
Se Continua transporte de escombros a lugar de punto de acopio.

Residente de Obra.

Inspector Interviniente

3/03/23 Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde:

Personal en obra
* 1 oficial
* 1 ayudante
* 1 Residente de Obra

Equipo
- Herramienta menor Eq
* Se Continua demolicion de placa y Contrapiso area de Pasillos, de oficina y aislado y terminado piso
* Continua Demolicion de Cielo Raso en area de Pasillos
Se Continua transporte de escombros a lugar de punto de acopio

Residente de Obra.

Inspector Interviniente

03/08/23 Estado del tiempo = mañana y tarde = soleada
Personal de obra = 1 oficial y ayudante
Equipo = Herramienta menor.
Actividades = Secuencia de demolición de alistado, enchapado y placa de contrapiso en el aula de música y danza

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

04/08/23 Personal operativo = Ayudantes=2 1 Residente de obra.
Equipo = Herramienta menor.
Actividades
Continúa demolición de alistado, enchapado y placa de contrapiso en el aula de música y danza

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

09/08/23 Tiempo = mañana = nublada y tarde = nublado.
Personal de obra = oficiales = 1 ayudantes = 1

Equipos =
Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades
* Pintura sobre estructura metalica de las cubiertas.
* Aplicación de soldadura sobre la estructura metalica de la cubierta.

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

11/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = oficiales = 1 ayudantes = 3
Equipos = Herramienta menor.
Actividades = * Excavación manual en el aula de Biblioteca
* Retiro de escombro del aula de música y danza
Nota: Interventoria SST. Entra dotación, EPP Personal de subsuelo Gafas, Guantes, Casco, y Tapaoidos se sacan escombro.

Anexo 3. INFORME SSTA

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 901.383.717-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) día del mes de agosto de 2023

JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216

Yo, **EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.323.194 de Puerto Salgar, Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 229728-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las NIAS: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con5dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2 002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) día del mes de agosto de 2023

EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ
Cc.1.073.323.194
T.P. 229728-T

GNG PROYECTOS SAS BIC
NIT. 901477828-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal Suplente de **GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C** identificada con Nit. 901477828-7, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.

FIRMA_____
JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216

Bogotá, 15 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CERTIFICA QUE:

Para El Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 De 2022, “Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo”, se evidencia la correcta implementación de medidas para la protección de los sumideros.

En constancia, se firma por solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

Elaboro: MMGR
Reviso: MAGR - FGRS
Aprobó: ARGF - FGRS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72227511de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 identificado con NIT No.901649961-8, certifico que durante los últimos seis (06) meses correspondientes la empresa ha realizado los pagos correspondientes a las obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.



Firma del Representante Legal.
ANTONIO RAFAEL GONZALEZ
C.C. 72227511 de Barranquilla
Representante legal

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No. 07

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



Titulo Documento		**INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No.07**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Mónica Marcela de los Ángeles Gómez Rodríguez		
	Firma			
	Fecha	11 de agosto de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	11 de agosto de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	12 de agosto de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS. 5
3. GESTIÓN DOCUMENTAL 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 9
4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO 9
4.2. MANEJO DE RESIDUOS 10
4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 11
4.4. MANEJO DE AGUA 12
4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA 13
4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 16
4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 17
4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 18
4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 20
4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 20
4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 21
4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES 21
4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 21
5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22
5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 22
5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 23
5.3. INDUCCIONES 23
5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL 23
5.5. HIGIENE INDUSTRIAL 24
5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO 24
5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo 24
5.6.2. Brigada de emergencias 24

5.6.3. Accidentes de trabajo 24
5.6.4. Capacitaciones SST 25
5.6.5. Inspección SST 27
5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30
5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA 31
6. CONCLUSIONES 33
7. ANEXOS 34

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido AIU. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Por tanto, el informe mensual de interventoría No.7 presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista y la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de julio al 10 de agosto de 2023.

2. OBJETIVOS.

- ✓ Informar las actividades del contratista SAFRID INGENIERÍA SAS desde el componente SSTA.
- ✓ Presentar las acciones de gestión realizadas por la interventoría de Inter Colegios 2022 desde el componente SSTA.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

En el periodo se presentó la siguiente trazabilidad documental:

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
1	CIC_BTA_SED_050_2022_316	12/07/2023	Señores: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Arq. Luis Antonio Pinzón Parra Supervisor de Contrato	RESPUESTA COMUNICADO No. 296-GP2-SED-2022 - REMISION DE DOCUMENTOS.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
2	CIC_BTA_SED_050_2022_317	12/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 298-GP2-SED-2022 - REMISION DE DOCUMENTOS PARA INGRESO PERSONAL, VALIDACION CERTIFICACIONES DE ALTURAS Y SOLDADOR I.E. BERNAL JIMENEZ SEDE A.
3	CIC_BTA_SED_050_2022_318	14/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 299-GP2-SED-2022 - REMISION DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA DEL IED FLORIDABLANCA SEDE A.
4	CIC_BTA_SED_050_2022_322	14/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A.
5	CIC_BTA_SED_050_2022_326	17/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO No. 303-GP2-SED-2022 Y 304-GP2-SED-2022.
6	CIC_BTA_SED_050_2022_327	17/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIOS No. 305-GP2-SED-2022 Y 306-GP2-SED-2022.
7	CIC_BTA_SED_050_2022_328	17/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO No. 307-GP2-SED-2022.
8	CIC_BTA_SED_050_2022_329	17/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN ENVÍO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
9	CIC_BTA_SED_050_2022_330	17/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SUBSANACION OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NUMERO 4 Y 5.
10	CIC_BTA_SED_050_2022_331	18/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST.
11	CIC_BTA_SED_050_2022_334	19/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 310-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. SAN JOSÉ NORTE.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
12	CIC_BTA_SED_050_2022_335	19/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 312-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A Y JUAN DEL CORRAL.
13	CIC_BTA_SED_050_2022_336	21/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 313-GP2-SED-2022- REMISION DE DOCUMENTOS PARA INGRESO A IED SAN JOSE NORTE.
14	CIC_BTA_SED_050_2022_337	21/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SUBSANACION OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 5.
15	CIC_BTA_SED_050_2022_338	25/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 314-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NUMEROS 2 AL 5
16	CIC_BTA_SED_050_2022_339	25/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SOLICITUD REUNIÓN CON PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA SED PARA CARGUE DE INFORMES RCD.
17	CIC_BTA_SED_050_2022_340	25/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	CIUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES - AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
18	CIC_BTA_SED_050_2022_341	26/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. RAFAEL JIMENEZ SEDE B.
19	CIC_BTA_SED_050_2022_347	27/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO No. 320-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DE LOS IED SAN JOSE NORTE, IED JUSTO VICTOR CHARRY PERSONAL ROTATIVO EN EL IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B.
20	CIC_BTA_SED_050_2022_348	27/07/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO.
21	CIC_BTA_SED_050_2022_350	1/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORMES AMBIENTALES NUMERO 4 Y 5.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
22	CIC_BTA_SED_050_2022_351	1/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORME SST NUMERO 5.
23	CIC_BTA_SED_050_2022_352	1/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 6.
24	CIC_BTA_SED_050_2022_353	1/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NUMERO 6.
25	CIC_BTA_SED_050_2022_357	9/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO.
26	CIC_BTA_SED_050_2022_359	9/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO 332-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL IED GARCES NAVAS
27	CIC_BTA_SED_050_2022_360	9/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	SOLICITUD INFORME DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTE ESTUDIANTE I.E.D. RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE A
28	CIC_BTA_SED_050_2022_361	10/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO 325-GP2-SED-2022 - CAMBIO DE COORDINADOR COMPONENTE SST
29	CIC_BTA_SED_050_2022_362	10/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO 326-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_341
30	CIC_BTA_SED_050_2022_363	10/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO 327-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_340

A la fecha de emisión del presente informe no se encuentran aprobados los Informes Mensuales por componente así: SST 5, 6 y 7; Ambiental 4, 5, y 6 del Contratista de Obra, teniendo en cuenta que no han sido subsanados para su aprobación. Adicionalmente, el informe mensual ambiental número 7 no fue remitido para revisión y aprobación por esta interventoría.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO

El contratista cuenta hasta el momento con los siguientes campamentos (Francisco José de Caldas, Garces Navas y Jorge Eliecer Gaitán Sede A) para aspectos administrativos y para uso del personal. Sin embargo, en los siguientes colegios no fueron asignadas aulas para el desarrollo de las actividades, por tanto, se dieron algunos espacios dentro del colegio en la IED Rafael Bernal, Juan del corral, Florida Blanca, Justo Víctor Charry y San José Norte.

<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIOS CON CAMPAMENTO</th></tr>
<tr><td>Francisco José de Caldas</td><td>Garces Navas</td><td>Jorge Eliecer Gaitán</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Floridablanca</td><td>Justo Víctor Charry</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Juan del Corral</td><td>Rafael Bernal Sede A</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

4.2. MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ Se realiza disposición final de residuos ordinarios por la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.
- ✓ En los colegios Juan del Corral, Francisco José de Caldas y Garces Navas, Jorge Eliecer, Justo Víctor Charry, Floridablanca, San José Norte se cuenta con la autorización respecto al préstamo de un punto ecológico, sin embargo, en el Colegio Rafael Bernal la solicitud no fue aprobada, por tanto, se les indico realizar la adquisición de este, con el fin de garantizar la disposición adecuada de los residuos aprovechables.

<table>
<tr><td colspan="3">PUNTOS ECOLÓGICOS</td></tr>
<tr><td>Francisco José de Caldas</td><td>Garcés Navas</td><td>Juan del Corral</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Jorge Eliecer Gaitán</td><td>Justo Víctor Charry</td><td>Floridablanca</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">San José Norte</td><td>Rafael Bernal Jiménez</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

- ✓ Si bien se realizó retiro de RCD durante el periodo del informe a la fecha el Contratista de obra no radicó la información del componente ambiental, por tanto, se desconocen las cantidades de residuos dispuestos, así como la cantidad de material ingresado a obra.
- ✓ Para la prevención de emisiones atmosféricas provocadas por la dispersión de material particulado procedente de las actividades de cada frente de obra, se mantiene el cerramiento con poli sombra.
- ✓ Se garantiza que los vehículos que ingresan a los frentes de obra mantienen una velocidad máxima de 20km/h, con esto se evitan accidentes y el arrastre de material particulado.
- ✓ Se realiza control en la salida de los vehículos mediante, pues deben salir totalmente carpados de manera que cubran los materiales RCD a fin de evitar dispersiones y emisiones al ambiente.

I.E.D Juan del Corral sede A	I.E.D Florida Blanca	I.E.D Justo Víctor Charry
		
I.E.D. Garces Navas	I.E.D. Francisco José de Caldas	San José Norte
		
I.E.D. Rafael Bernal Sede B	I.E.D. República de Panamá	I.E.D. Garcés Navas

4.4. MANEJO DE AGUA

El contratista está haciendo uso de los baños fijos de las instalaciones de los colegios y adicionalmente cuenta con unidades sanitarias portátiles a las cuales se les realiza mantenimiento semanal a través de un proveedor autorizado. Dado que a la fecha de emisión del presente el informe el Contratista de Obra no entregó el informe respectivo.

COLEGIOS CON UNIDADES SANITARIAS		
Francisco José de Caldas	Garces Navas	Juan Del Corral
		
Jorge Eliecer Gaitán	Justo Víctor Charry	
		
Rafael Bernal sede A	Simón Bolívar	

COLEGIOS CON UNIDADES SANITARIAS	
	
San José Norte	República de Panamá
	

4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA

En el área de influencia del Colegio Francisco José de Caldas, se cuentan con 8 individuos arbóreos, los cuales representan una emergencia para la población, no obstante, uno de estos presento caída y fue evaluado por los bomberos, sin causar ninguna lesión o daño material. Teniendo en cuenta el Acta de Evaluación de Silvicultura No. 9418 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en donde la Secretaria de Ambiente del Distrito autoriza el tratamiento silvicultural para 8 individuos arbóreos, se da alcance a los compromisos adquiridos el día 10 de marzo de 2023 y a los lineamientos de la Secretaria de Educación del Distrito mediante ficha SAE ITI del 16 de noviembre del 2022, donde solicita que por parte del contratista e interventoría se programe la ejecución del tratamiento autorizado, recolección y disposición adecuada de residuos generados por dicha actividad, de manera prioritaria.

Por lo anterior el día 31 de marzo, se remite a la profesional ambiental de la Secretaría de Educación el informe correspondiente al inventario de avifauna el cual se encuentra

orientado al desarrollo de procesos de control y verificación de la avifauna que pueda existir dentro de las especies arbóreas que se encuentran sujetas a tratamientos silviculturales prioritarias debido a que se encuentran declaradas en alto riesgo para la Institución Educativa. Dicho documento recibe aprobación el día 05 de abril de 2023.

Una vez, aprobado el inventario de avifauna se procede con la ejecución de actividades sobre los individuos arbóreos la cual se finaliza de la siguiente manera:

<table>
<tr><td colspan="3">Registro Fotográfico Francisco José de Caldas</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>

</td></tr>
<tr><td>Proceso de tala Individuo arbóreo No. 1</td><td>Proceso de tala finalizada individuo arbóreo No. 3</td><td>Proceso de tala finalizada individuos arbóreos No. 4 y 5. Los residuos resultantes de los individuos 4 y 5 son acopiados de tal forma que se separe el material vegetativo del material para chipeado.</td></tr>
</table>

		 
Proceso de tala finalizada individuos arbóreos No. 6	Proceso de tala finalizada individuos arbóreos No. 7	Proceso de tala finalizada individuos arbóreos No. 8. Teniendo en cuenta que el cerramiento del colegio se vio afectado por la caída del individuo arbóreo No. 8, se realiza reparación del mismo.

Para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2023 se llevó a cabo tratamiento silvicultural en los Colegios Antonio Nariño, Bolivia Sede B, Morisco y Naciones Unidas.

Registro fotográfico Antonio Nariño		
		
Justificación técnica: Se consideró técnicamente viable talar el individuo de la especie cerezo, pues se evidencia mal anclado con tronco muy inclinado y copa densa, condiciones que pueden llevar a su volcamiento, generando un riesgo para la comunidad escolar.		

Registro fotográfico Bolivia Sede B		
		
Justificación técnica: Se consideró técnicamente viable la tala para el individuo arbóreo cerezo debido a que presenta deficiente estado físico y sanitario con pudrición basal localizada en el fuste además de inclinación y torcedura con susceptibilidad de volcamiento hacia cerca perimetral, con riesgo de afectación tanto a la comunicad que transita por la zona.		

Registro fotográfico Morisco		
		
Justificación técnica: Se consideró técnicamente viable realizar la tala de dos pinos ciprés debido a sus condiciones físicas y de crecimiento pueden provocar falla estructural y caída del árbol. Y adicionalmente se consideró el tratamiento integral de dos árboles de especie: Eugenia y pino ciprés.		

Registro fotográfico Naciones Unidas		
		
Justificación técnica: Se consideró técnicamente viable talar un árbol de caucho benjamín, debido a su excesiva ramificación, ramas pediculares y desgarre de ramas, el fuste se encuentra inclinado con afectación mecánica, emplazado en patio de colegio, especie susceptible de volcamiento. También se consideró viable la poda de estructura de un individuo arbóreo de especie eucalipto de flor, con el fin de equilibrar la copa y mejorar su estructura.		

En cuanto a la disposición de los residuos vegetales, el contratista de obra remitió en el informe mensual número 5 el certificado de disposición final de residuos vegetales del Colegio Francisco José de Caldas. A la fecha se mantiene pendiente la entrega del certificado de disposición final de los Colegios: Antonio Nariño, Bolivia Sede B, Morisco y Naciones Unidas.

4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para el periodo de reporte, aunque se evidenció el ingreso de material en las diferentes instituciones no fue posible validar las cantidades toda vez, que se no se presentó el informe junto con los vales y/o certificaciones de origen emitidas por las canteras. Por ende, no es posible determinar las cantidades de material empleados en obra y que hayan sido extraídos legalmente, al respecto se han realizado mesas de trabajo en conjunto con el Contratista a fin de establecer los lineamientos para la subsanación de las observaciones identificadas en informes previos.

4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Mediante el oficio CIC_BTA_SED_050_2022_057, se le notificó al contratista la apertura del pin ambiental con el No. 22524 el día 06 de febrero. Sin embargo, con relación a las cantidades justificadas de residuos dispuestos con los gestores aprobados por esta interventoría. Debido a la no entrega del informe mensual del componente ambiental número 7 del Contratista de obra, por tanto, no ha sido posible validar las cantidades de RCD dispuestos en el periodo del informe.

- ✓ Residuos peligrosos

Dentro de las actividades contractuales se encuentra el desmonte y reemplazo de tejas de asbesto cemento (se relaciona evidencia fotográfica). Es importante señalar que, dadas las características de peligrosidad que contiene este tipo de residuo es indispensable que se dé el debido manejo para su proceso de disposición final; este proceso se realiza de acuerdo con la normatividad vigente y los diferentes protocolos de manejo de este residuo altamente contaminante. De manera que, los residuos generados son dispuestos con el siguiente gestor:

Gestor de residuos	Nombre sitio de disposición	Resolución vigente
G&L Soluciones Empresariales SAS / TRACOL SAS ESP	VALCO CONSTRUCTORES LTDA – Vereda Balsillas – Mosquera	Resolución No 0989 26/05/2015

Así las cosas, la actividad se realiza con personal capacitado que cuenta con los debidos elementos de protección personal EPP, posteriormente, una vez retirado el producto, se procede a embalar con plástico resistente las tejas en asbesto para su disposición final. Los residuos de asbesto pueden ser almacenados al aire libre o en superficies cubiertas, debidamente identificados y con su respectivo aislamiento o cercado, para lo cual dentro del frente de obra se dispone de un espacio exclusivo para su acopio.

Es importante señalar que este tipo de residuo no es reutilizado, ni es dispuesto como residuo ordinario de construcción en escombreras o rellenos sanitarios, se llevará a proceso de disposición final a través de gestor autorizado por la autoridad ambiental, cumpliendo con los protocolos de seguridad para el personal se procede con el traslado de los residuos peligrosos mediante un gestor especial.

Dado que el Contratista de obra no entregó el informe mensual del componente ambiental respecto al periodo del 11 de julio al 10 de agosto de 2023, no fue posible establecer las cantidades de residuos dispuestos con el gestor autorizado para tal fin. Sin embargo, del seguimiento realizado por esta interventoría se evidencia la gestión y traslado de los residuos especiales con el gestor autorizado.

<table>
<tr><th colspan="3">Traslado de residuos RCD</th></tr>
<tr><td>I.E.D. Simón Bolívar</td><td>I.E.D. Víctor Charry</td><td>I.E.D. Rafael Jiménez Sede A</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.E.D. Rafael Jiménez Sede B</td><td>I.E.D. San José Norte</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td>
</td></tr>
</table>

4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el periodo no se presentó el ingreso de volquetas, sin embargo, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la maquinaria y vehículos autorizados.

<table>
<tr><th>IED Floridablanca</th></tr>
<tr><td>


</td></tr>
</table>

IED Floridablanca	IED República de Panamá
	

Se cuenta con la aprobación del minicargador BOBCAT con No. de serie 512259677

- ✓ Equipos

Descripción	Identificación
Arnés de seguridad Safety Systems	Serial 16-21-41-71
Eslinga De Seguridad Safety Systems	Serial 29-55-83-59
Taladro Percutor Makita Azul	Serial N 1
BOBCAT 767	Serial 512259277
Cilindro Vibro Compactador (Equipo Nuevo)	Serial 375811122974
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00071
Eslinga SOEFEC	Serie 00042
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00190
Eslinga SOEFEC	Serie 00102
Línea De Vida Ep Nueva	Serial 29384
Arnés De Seguridad #1	Serial 410022020085
Eslinga #1	Serial Aa500842 - Pveeo
Arnés De Seguridad #2	Serial7795
Eslinga De Seguridad #2	Serial Aa102882/398
Arnés #3	Serial 7654
Eslinga#3	Serial 1244412
Línea De Vida Nueva	13mm
Equipo De Soldadura	Nom-003-Scfi
Careta Electrónica Automática	Falcom Fw 44

4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para el presente periodo, no se validan los siguientes indicadores de seguimiento, toda vez que el Contratista de obra no presentó el informe mensual del componente ambiental correspondiente al periodo del 11 de julio al 10 de agosto de 2023.

4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

El mantiene inventario de los sumideros aledaños al área de influencia, los cuales están siendo protegidos mediante el uso de provisional de polisombra. Se espera que en el próximo periodo se realice la reposición de dicha protección con malla azul, para evitar arrastre de materiales de volquetas y vehículos.

Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Floridablanca







Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Juan Del Corral







4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Según lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Contratista durante el periodo se realizaron capacitaciones, sin embargo, no se presentó el informe mensual del componente ambiental para revisión y verificación de las actividades ejecutadas frente a este ítem.

4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES

Se realizaron recorridos en conjunto con el contratista e interventoría, donde se identificó un almacenamiento inadecuado de los residuos sólidos y de construcción – demolición. Lo anterior, se puede verificar mediante los llamados de atención realizados al Contratista durante el periodo del informe.

4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Obligaciones	Cumple		
	SI	NO	No Aplica
Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental			
Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.		X	
Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	X		
Implementar jardines verticales u horizontales ofrecidos si es el caso, para lo que, de manera previa, el contratista deberá presentar los diseños a la Entidad contratante, para su respectiva aprobación.			X
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	X		
Gestión Integral de Residuos			
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.	X		
Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.		X	
Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.	X		
Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.	X		

Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador.	X		
El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS.	X		
Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización.		X	
Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	X		
Residuos de construcción y demolición RCD			
Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.		X	
Deberá revisar y dar aval al PGRCD, formatos RCD, informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD y garantizar el adecuado cargue mensual en aplicativo web de la SDA de los reportes RCD; desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado.		X	
Uso Eficiente del Agua			
Garantizar la implementación al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	X		
Garantizar la implementación de un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.			X
Garantizar la implementación al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	X		
Uso Eficiente de la Energía			
Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.	X		
Garantizar la implementación al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 177 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.			X

5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la información reportada por el Contratista en el informe mensual número 7 y de los ingresos aprobados por esta interventoría, a continuación, se presenta el personal presente en obra:

Contratista

- ✓ No. trabajadores nuevos: 27
- ✓ No. trabajadores antiguos: 40
- ✓ No. trabajadores retirados: 27
- ✓ No. Trabajadores rotativos: 27

Interventoría

Se dio cumplimiento con los pagos de seguridad del personal.

- ✓ No. de trabajadores nuevos: 1
- ✓ No. de trabajadores antiguos: 7
- ✓ No. de trabajadores retirados: 1

Le fue requerido al Contratista de obra la entrega de los soportes de los pagos realizados respecto a la seguridad social del personal mediante los comunicados CIC_BTA_SED_050_2022_329 del 17 de julio de 2023 y CIC_BTA_SED_050_2022_340 del 25 de julio de 2023, sin que a la fecha se obtenga respuesta por parte del Contratista de obra. No obstante, en el informe presentado para el correspondiente periodo allega los soportes de pago sin vigencia.

5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- ✓ Previamente el contratista había remito actas de conformación tanto del COPASST como del CCL, sin embargo, en el informe presentado no se allegan los soportes de los comités celebrados en el periodo del 11 de julio al 10 de agosto de 2023.

5.3. INDUCCIONES

- ✓ Se soportan parcialmente las inducciones realizadas en el periodo, ya que, se identificó el ingreso de personal es superior a los registros presentados para el cumplimiento de este ítem.

5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL

- ✓ Del personal aprobado se cuenta con exámenes ocupacionales; estos documentos fueron aprobados por interventoría.

5.5. HIGIENE INDUSTRIAL

- ✓ El contratista hace uso de los baños fijos que fueron previamente aprobados por los rectores de las siguientes instituciones: IED Juan del Corral, Francisco José de Caldas, Garces Navas, Jorge Eliecer Gaitán y Justo Víctor Charry; no obstante, se está llevando a cabo un control de orden y aseo.
- ✓ Por otro lado, la empresa Saniport realiza la limpieza y mantenimiento de los baños portátiles dos veces a la semana en las Instituciones Educativas Rafael Bernal, Floridablanca y San José Norte.

5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO

5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo

Dentro de las actividades realizadas por el Contratista de obra se mencionan las siguientes: demolición de acabado de pisos, muros, pañete, enchape de muros, encorozado de cubierta, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso, cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, tubería hidrosanitaria existente, lámparas, salidas eléctricas y tubería eléctrica, limpieza de canales y bajantes, excavaciones manuales, desmonte de lámparas y red eléctrica, desmonte puertas y ventanas, suministro e instalación de caballete para teja, embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento, desmonte de canaleta metálica, suministro e instalación de teja 2,5 mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico y desmonte de flanche; entre otros.

5.6.2. Brigada de emergencias

El contratista de obra tiene conformada la brigada de emergencias desde el pasado 06 de marzo de 2023, en el informe mensual SST número 3 del Contratista se presentó el respectivo soporte de la reunión y de la capacitación realizada. No obstante, y de conformidad con lo programado en el Plan Anual de Trabajo 2023, el Contratista programó realizar el simulacro de emergencias en evacuación (herido, incendio o asonada según aplique) de las oficinas y operaciones, sin embargo, no se tiene soporte de la actividad realizada, toda vez que, no se presentó el informe mensual para revisión y aprobación por interventoría.

5.6.3. Accidentes de trabajo

Durante el periodo de ejecución del objeto contractual, no se presentaron accidentes de trabajo en las Instituciones Educativas a la fecha intervenidas.

5.6.4. Capacitaciones SST

Para este periodo el contratista registra en el informe las charlas realizadas:

- ✓ Manejo seguro de sustancias químicas utilizadas en la operación
- ✓ Pausas activas para el personal operativo y administrativo
- ✓ Izaje seguro de cargas manuales y mecánicas.
- ✓ Seguimiento a casos con sintomatología presuntiva de LOM
- ✓ Campañas de orden y aseo

Por otro lado, se verifica la instalación de la cartelera informativa en las instituciones educativas objeto de intervención.

República de Panamá	Jorge Eliecer Gaitán
	
Rafael Jiménez Sede B	Garces Navas
	
Simón Bolívar	Justo Víctor Charry
	

Por parte de interventoría se dieron las siguientes charlas:

- ✓ Se realiza una dinámica con el personal del contratista e interventoría.
- ✓ Buenas prácticas de orden, aseo y limpieza.
- ✓ Buen uso de los EPP para evitar accidentes en obra.
- ✓ Con el personal eléctrico se realiza capacitación sobre las 5 reglas de oro.
- ✓ Retroalimentación de riesgos a personal nuevo y buen uso de EPP.
- ✓ Retroalimentación frente al diligenciamiento de permisos previo a la ejecución de actividades.
- ✓ Importancia del reporte de un accidente de trabajo.

Jorge Eliecer Gaitán	Floridablanca	Francisco José de Caldas
		
Rafael Bernal Jiménez Sede A	**Rafael Bernal Jiménez Sede B**	**Víctor Charry**
		
San José Norte		
		

5.6.5. Inspección SST

- **Elementos de atención de emergencia:** El contratista menciona que está en el proceso de compra de los elementos como el botiquín, extintor y camilla.

Colegio Francisco José de Caldas	Simón Bolívar
	
Colegio Floridablanca	**Justo Víctor Charry**
	

- **Dotación y EPP:** Se evidencia uso de dotación y elementos de protección personal del personal, durante este periodo, se realizó entrega de elementos de protección personal correspondientes para el personal nuevo. Además, en los oficios se les recalca que se requiere que todo el personal operativo cuente con elementos de protección individuales (EPI) acorde a las actividades a desarrollar por los colaboradores, y asimismo, se resalta el cumplimiento a lo indicado en el MANUAL DE USO DE MARCA ALCALDÍA DE BOGOTÁ, páginas 169, 170 y 171 “Indumentaria personal de obra y operarios”.

- **Señalización:**

Se llevó a cabo en el periodo por el Contratista de obra el mantenimiento al cerramiento y reposición de la señalización, como medida para el control de peligros y riesgos.

Rafel Jiménez Sede A	República de Panamá
	
Francisco José de Caldas	Jorge Eliecer Gaitán
	
Floridablanca	San José Norte
	
Rafel Jiménez Sede B	José Víctor Charry
	

- Maquinaria y/o equipos

I.E.D. Jorge Eliecer Gaitán	I.E.D. Garces Navas
	
I.E.D. Rafael Bernal Sede A	I.E.D. San José Norte
	

- **Puntos de acopio de materiales y de RCD**

I.E.D. Jorge Eliecer Gaitán	I.E.D. Justo Víctor Charry
	
I.E.D. Garces Navas	I.E.D. Francisco José De Caldas
	

I.E.D. Floridablanca	I.E.D. Juan del Corral
	
I.E.D. Rafael Jiménez Sede B	I.E.D. San José Norte
	

Interventoría

Se realizo inspección de EPP de los profesionales contractuales y se verifica que los elementos se encuentran en buen estado.

5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contratista

El contratista presenta los indicadores y estadísticas de seguimiento, de acuerdo a las actividades realizadas durante el periodo del informe mensual numero 7.

Interventoría





En cuanto a los indicadores de interventoría a continuación se presentan lo siguiente:


Nombre del Indicador	Formula	Indicador	Interpretación
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{7} * 100 = 0\%$	Por cada 100 trabajadores que laboraron durante el periodo (10 julio al 11 de agosto) se presentaron cero (0) accidentes de trabajo.
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{7} * 100 = 0\%$	Por cada 100 trabajadores que laboraron durante el periodo (10 julio al 11 de agosto) se perdieron cero (0) días por accidentes de trabajo.
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	En 2023, el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales.
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{7} * 100.000 = 0\%$	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos de enfermedad laboral durante el periodo (10 julio al 11 de agosto).
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{7} * 100.000 = 0\%$	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral durante el periodo (10 julio al 11 de agosto).
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	$\frac{0}{25} * 100 = 0\%$	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA

✓ A continuación, se presenta relación de personal de interventoría:

Tabla de control de personal para el periodo entre el 10 julio al 11 de agosto de 2023

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	80.539.072	Director de Interventoría	$6.500.000	Fijo	
Camilo Antonio Samacá Pesca	1.051.474.958	Residente de Interventoría 1	$4.954.666	Fijo	
Rodolfo Castro Ortegón	1.015.410.729	Residente de Interventoría 2	$4.000.000	Fijo	
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	Asesor Estructural	1.160.000	Fijo	
Mónica Marcela de los Ángeles Gómez Rodríguez	1.069.099.276	Asesor Ambiental y de Seguridad Industrial	$4.020.000	Fijo	
Hernando Gómez Casas	17.069.465	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas Voz y Datos	$1.160.000	Fijo	
Guillermo Emilio Narváez Vélez	72.201.382	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas	$26.789.981	Fijo	
Enrique Luis Monroy Maldonado	1.026.264.858	Asesor de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	$6.862.320	Fijo	
Milena Mercedes Albornoz Villota	1.085.250.609	Asesoría Jurídica	8.750.000	Fijo	
Camilo Fandiño Hernández	1.075.627.522	Inspector de Interventoría	$1.825.000	Fijo	
Edison Calderón Castañeda	79.403.208	Maestro De Obra	$2.173.333	Fijo	

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Luis Carlos Tovar Núñez	72.257.557	Tecnólogo SST 1	$2.173.333	Fijo	
Natalia Vanessa Calderón Acevedo	1.015.474.687	Inspector De Interventoría	$ 1.825.000	Fijo	

PERSONAL DE APOYO					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Manuel Antonio González Romero	1.152.447.887	Coordinador	$3.800.000	Fijo	
Luis Felipe Lavado Alfonso	1.014.264.625	Auxiliar de interventoría	$1.800.000	Fijo	

6. CONCLUSIONES

- ✓ Se continúa solicitando el uso de señalización, EPP y dotación en obra.
- ✓ Teniendo en cuenta la importancia que representa el cumplimiento del marco normativo para las respectivas licencias ambientales que requieren el abastecimiento de materiales pétreos y la disposición final de RCD en sitios de disposición debidamente autorizados, se realiza la validación de la documentación aportada ante cada las diferentes entidades y/o autoridades ambientales competentes, a fin de verificar la vigencia y veracidad de dicha documentación, registros y/o certificaciones presentadas por los proveedores que prestan los servicios de suministro de materiales pétreos y el transporte y disposición de residuos de demolición y escombro. Al respecto no es posible emitir la aprobación u observaciones al informe del componente ambiental, dado que, no fue radicado a esta interventoría para revisión.
- ✓ El contratista de obra no presentó las certificaciones de disposición de residuos vegetales producto del tratamiento silvicultural de las especies arbóreas localizados en las instituciones educativas: Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Bolivia Sede B, Morisco, Naciones Unidas.
- ✓ No se aportan los certificados de disposición de residuos RCD durante el periodo del informe.
- ✓ No se incluyen los indicadores ambientales del Contratista de obra, ya que, no se presentó el correspondiente informe para revisión de la interventoría.

- ✓ Se llevó a cabo la gestión y disposición de residuos peligrosos (tejas de asbesto cemento) con gestor idóneo en el manejo de este tipo de residuos, sin embargo, no es posible verificar las cantidades dispuestas, puesto que, no se radicó el informe ambiental de obra para revisión.
- ✓ No se tiene aprobación de los informes SSTA del contratista así: SST No. 5, 6 y 7; Ambiental 4, 5, 6 y 7 puesto que, a la fecha de emisión del presente documento no han sido subsanadas las observaciones realizadas por esta interventoría respecto a cada uno.

7. ANEXOS

A continuación, se presenta relación de anexos:

1) Soportes pagos de seguridad social interventoría correspondiente al período del informe.
2) Registros de charlas dictadas por la interventoría.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	68923364	$3.985.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	69.600	0		0		0	9	800	0	70.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.000	0		0		0	9	800	0	73.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	73.000	0		0		0	9	800	0	73.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	285.200	0		0		0	9	3.000	0	288.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.002.800	0	0	24.800	24.800	9	20.800	600	2.073.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	871.500				871.500	9	9.100	880.600			8.715	880.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	519.100	9	5.400	524.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	500.800	506.200
Pensión	1	2.052.400	2.073.800
Riesgos Laborales	1	871.500	880.600
CCF	1	519.100	524.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.943.800	3.985.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022		CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	68923364	$3.985.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1015474687	CALDERON ACEVEDO NATALIA VANESSA	1	0			S																	230301	1.825.000	292.000	0	0	0	0	EPS008	1.825.000	73.000	14-25	1.825.000	5	127.100	CCF24	1.825.000	73.000	0	0	0	0	0
2	CC	1051474958	SAMACA PESCA CAMILO ANTONIO	1	0			S																	230301	4.954.666	792.800	0	0	24.800	24.800	EPS037	4.954.666	198.200	14-25	4.954.666	5	344.900	CCF24	4.954.666	198.200	0	0	0	0	0
3	CC	1075627522	FANDIÑO HERNANDEZ CAMILO	1	0			S																	230301	1.825.000	292.000	0	0	0	0	EPS017	1.825.000	73.000	14-25	1.825.000	5	127.100	CCF24	1.825.000	73.000	0	0	0	0	0
4	CC	72257557	TOVAR NUÑEZ LUIS CARLOS	1	0			S		X															230301	1.738.667	278.200	0	0	0	0	EPS002	1.738.667	69.600	14-25	1.738.667	5	121.100	CCF24	2.197.482	87.900	0	0	0	0	0
5	CC	79403208	CALDERON CASTAÑEDA EDISON	1	0			S																	230301	2.173.333	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.333	87.000	14-25	2.173.333	5	151.300	CCF24	2.173.333	87.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	16/08/2023	68857454	$2.172.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	40	11.900	0	271.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	40	47.400	3.000	1.155.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	452.400				452.400	40	20.700	473.100			4.524	473.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	40	11.900	271.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	271.900
Pensión	1	1.105.000	1.155.400
Riesgos Laborales	1	452.400	473.100
CCF	1	260.000	271.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.077.400	2.172.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	16/08/2023	68857454	$2.172.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80539072	RODRIGUEZ SALAZAR FREDY GIOVANNI	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	5	452.400	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	Y	12/07/2023	68857444	$162.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	161.600				161.600	5	1.000	162.600			1.616	162.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	161.600	162.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	161.600	162.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	Y	12/07/2023	68857444	$162.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13874430	MEZA ROSAS JAIRO ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	17069465	GOMEZ CASAS HERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V / 003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	68996395	$7.076.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.800	0		0		0	0	0	0	160.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	322.000	0		0		0	0	0	0	322.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	643.200	0	0	0	0	0	0		643.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.171.200	0	0	0	0	0	0		2.171.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	1.036.800	0	0	32.400	32.400	0	0		1.101.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.395.600				1.395.600	0	0	1.395.600			13.956	1.395.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	802.000	0	0	802.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	962.800	962.800
Pensión	3	3.916.000	3.916.000
Riesgos Laborales	1	1.395.600	1.395.600
CCF	1	802.000	802.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	7.076.400	7.076.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	68996395	$7.076.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069099276	GOMEZ RODRIGUEZ MONICA MARCELA DE LOS ANGELES	1	0			S																	230201	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS008	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	160.800	0	0	0	0	0
2	CC	1109491513	CANDIA MARIN LINER FABIAN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	1	0			S							X										230301	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS005	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	160.800	0	0	0	0	0
4	CC	52882446	JIMENEZ GOMEZ ADRIANA FERNANDA	1	0			S																	231001	6.480.000	1.036.800	0	0	32.400	32.400	EPS017	6.480.000	259.200	14-25	6.480.000	5	451.100	CCF24	6.480.000	259.200	0	0	0	0	0
5	CC	92188831	BENITEZ ARCOS JADER WADITH	1	0			S																	230301	4.030.000	644.800	0	0	0	0	EPS008	4.030.000	161.200	14-25	4.030.000	5	280.500	CCF24	4.030.000	161.200	0	0	0	0	0
6	CC	1018402224	CARDENAS LORA VANESSA PAOLA	1	0			S											X						230301	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS017	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	0	CCF24	4.020.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E		68912554	$954.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.000	0		0		0	4	400	0	72.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	4	300	0	64.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	4	1.400	0	289.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	4	1.200	0	257.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	133.700				133.700	4	700	134.400			1.337	134.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	136.000	4	700	136.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	136.000	136.700
Pensión	2	544.000	546.600
Riesgos Laborales	1	133.700	134.400
CCF	1	136.000	136.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	949.700	954.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E		68912554	$954.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014264625	LAVADO ALFONSO LUIS FELIPE	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030653585	ALZATE QUEZADA VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	68857385	$7.249.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	7	2.500	0	302.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	600.000	0		0		0	7	4.900	0	604.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	37.500	37.500	7	9.700	800	1.285.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	7	19.300	1.400	2.570.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.566.000				1.566.000	7	12.600	1.578.600			15.660	1.578.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	300.000	7	2.500	302.500	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	7	4.900	604.900	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	900.000	907.400
Pensión	2	3.825.000	3.856.200
Riesgos Laborales	1	1.566.000	1.578.600
CCF	2	900.000	907.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.191.000	7.249.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	68857385	$7.249.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72007216	GOMEZ FALLA JORGE	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
2	CC	72201382	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF06	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
3	CC	72227511	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 20	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	12/07/2023	68997102	$1.245.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	160.000	0		0		0	5	1.000	0	161.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	5	3.700	0	643.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	278.400				278.400	5	1.600	280.000			2.784	280.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	160.000	5	1.000	161.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	160.000	161.000
Pensión	1	640.000	643.700
Riesgos Laborales	1	278.400	280.000
CCF	1	160.000	161.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.238.400	1.245.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 20	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	12/07/2023	68997102	$1.245.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015410729	CASTRO ORTEGON RODOLFO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16 / 1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	68912510	$2.250.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	134.800	0		0		0	12	1.900	0	136.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	152.000	0		0		0	12	2.100	0	154.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.147.200	0	0	0	0	12	15.900	0	1.163.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	499.100				499.100	12	6.900	506.000			4.991	506.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	286.800	12	4.000	290.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	286.800	290.800
Pensión	1	1.147.200	1.163.100
Riesgos Laborales	1	499.100	506.000
CCF	1	286.800	290.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.219.900	2.250.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	68912510	$2.250.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1152447887	GONZALEZ ROMERO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
2	CC	52073626	BELLO MACCHI MARTHA PATRICIA	1	0			S																	230301	3.369.600	539.200	0	0	0	0	EPS005	3.369.600	134.800	14-25	3.369.600	5	234.600	CCF24	3.369.600	134.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	68857305	$3.638.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	101.100	0		0		0	7	900	0	102.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	7	2.900	0	352.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	118.400	0		0		0	7	1.000	0	119.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	7	1.200	0	146.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	692.400	0	0	0	0	7	5.600	0	698.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.585.600	0	0	43.800	43.800	7	12.800	800	1.686.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	60.900				60.900	7	500	61.400			609	61.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	468.400	7	3.800	472.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	714.500	720.500
Pensión	2	2.365.600	2.384.800
Riesgos Laborales	1	60.900	61.400
CCF	1	468.400	472.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.609.400	3.638.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	68857305	$3.638.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010037763	CANTOR FRANCO LAURA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS008	1.740.000	69.600	14-25	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
2	CC	1010037763	CANTOR FRANCO LAURA ALEJANDRA	1	0			S												X					230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-25	60.000	1	0	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
3	CC	1075211095	MURCIA CORTES MARTHA MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1085250609	ALBORNOZ VILLOTA MILENA MERCEDES	1	0			S																	25-14	8.750.000	1.400.000	0	0	43.800	43.800	EPS005	8.750.000	350.000	14-25	8.750.000	1	45.700	CCF24	8.750.000	350.000	0	0	0	0	0
5	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	36312425	SANDINO PUENTES LILIANA	1	0			S											X						230301	2.527.200	404.400	0	0	0	0	EPS002	2.527.200	101.100	14-25	2.527.200	1	0	CCF24	2.527.200	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900283268-5	RETIN INGENIERIA SAS		CLL118 #60-51	6404348	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68924275	$3.244.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	286.400	0		0		0	0	0	0	286.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	905.600	0	0	0	0	0	0		905.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	445.700				445.700	0	0	445.700			4.457	445.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	466.400	0	0	466.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	466.400	466.400
Pensión	2	1.865.600	1.865.600
Riesgos Laborales	1	445.700	445.700
CCF	1	466.400	466.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.244.100	3.244.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900283268-5	RETIN INGENIERIA SAS		CLL118 #60-51	6404348	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68924275	$3.244.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016103945	ACUÑA ARIAS CESAR DAVID	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018437469	VILLALOBOS MEJIA CINDY PAOLA	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-7	4.200.000	1	22.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018437469	VILLALOBOS MEJIA CINDY PAOLA	1	0			S												X					25-14	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS005	300.000	12.000	14-7	300.000	1	0	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-7	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Demolición y excavación en cancha

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Aplicación de pañete en muros de fachada principal de biblioteca

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación, conformación y compactación de subbase B-400 en cancha

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (4)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Picado de muros en fachada frente a cancha

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de cuneta prefabricada área cancha

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (6)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de tubería eléctrica en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Demolición de cárcamo en patio central.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de malla electro soldada en cancha.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Resanes en fachada de bloque L.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Fundición de anden parte posterior bloque L

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Fundida de anden lateral bloque L.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de puntos y tubería eléctrica en aulas de segundo piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (13)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de puertas

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (14)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Aplicación de pintura en pasillo de segundo piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (155)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación de teja en aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (16)



Descripción:
IED Garcés Navas – Aplicación de pintura en carpintería metálica

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (167)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación de teja en aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (18)



Descripción:
IED Garcés Navas – Remates en cubierta

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (19)



Descripción:
IED Garcés Navas – Mantenimiento de carpintería metálica

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (170)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación de tubería eléctrica

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (21)



Descripción:
IED Floridablanca – Desmonte de cubierta aula de música

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (22)



Descripción:
IED Floridablanca – Excavación mecánica en parqueadero

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Descripción:
IED Floridablanca – Demolición de estructuras en concreto

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (24)



Descripción:
IED Floridablanca – Excavación manual en material común en aula de música

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (2518)



Descripción:
IED Floridablanca – Instalación de geotextil tejido 2400 y afirmado en área de parqueadero.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (26)



Descripción:
IED Floridablanca – Fundida de vigas de confinamiento en bloque SENA.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Descripción:
IED Floridablanca – Instalación de adoquines en anden lado canchas

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (2819)



Descripción:
IED Floridablanca – Instalación de estructura metálica y mampostería en bloque SENA

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (29)



Descripción:
IED Juan del Corral – Instalación de flanche en fachada lateral del coliseo

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (30)



Descripción:
IED Juan del Corral – Orden y aseo general terraza

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (31)



Descripción:
IED Juan del Corral – Sellado de juntas en terraza

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (32)



Descripción:
IED Juan del Corral – Aplicación de poliurea en terraza ingreso colegio

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (20)



Descripción:
IED Juan del Corral – Aplicación de poliurea en terraza

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (34)



Descripción:
IED Juan del Corral – Aplicación de poliurea en terraza

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (215)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de enchape en muros de shut de basuras

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (3622)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de enchape en muros de shut de basuras

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (37)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de estructura metálica en aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A - Instalación de enchape de piso en aula de Karate

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (3924)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A - Instalación de teja en aula de Karate

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (250)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A - Instalación de teja en aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (41)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Corte y figurado de hierro para columnas de muro perimetral

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (42)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Excavación para tubería sanitaria para shut de basuras

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (263)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Instalación de mampostería y estribos en columnas en muro perimetral zona de juegos

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Excavación manual para tubería en shut de basuras.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (45)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de enchape en baño de niñas bachiller.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (46)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Divisiones en acero para orinales

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (47)



Descripción:
IED Justo Victor Charry - Instalación de enchape en piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (4828)



Descripción:
IED Justo Victor Charry - Aplicación de pintura epoxica en techos de baño de niñas bachiller

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (49)



Descripción:
IED Justo Victor Charry - Instalación de divisiones en baño de niñas bachiller.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (50)



Descripción:
IED Justo Victor Charry - Demolición de enchape en cuarto de aseo preescolar

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (291)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de policuarzo en baño niñas bachiller

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (302)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Aplicación de pintura epoxica en techos de baño de niñas preescolar

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (53)



Descripción:
IED San José Norte – Desmonte de ventaneria en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (54)



Descripción:
IED San José Norte - Instalación de malla electro soldada

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (55)



Descripción:
IED San José Norte – Aplicación de pañete en muros de aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (56)



Descripción:
IED San José Norte – Fundida de placa de contrapiso en laboratorio

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (57)



Descripción:
IED San José Norte – Demolición de manto asfaltico en terraza del aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (58)



Descripción:
IED San José Norte – Instalación de tubería hidrosanitaria en baños

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (59)



Descripción:
IED San José Norte – Aplicación de pañete sobre muro en laboratorio

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (310)



Descripción:
IED San José Norte – Instalación de mampostería

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (61)



Descripción:
IED República de Panamá - Demolición muro, vigas y placa tarima

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (62)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de estuco en muros de cocina

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (63)



Descripción:
IED República de Panamá – Aplicación de pintura en muros de cocina

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (64)



Descripción:
IED República de Panamá – Muro en mampostería

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (65)



Descripción:
IED República de Panamá – Aplicación de pañete en muro perimetral

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (66)



Descripción:
IED República de Panamá – Aplicación de pañete en muro interior cocina

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (67)



Descripción:
IED Simón Bolívar – Demolición de acabado de piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (68)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Demolición de acabado de piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (69)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Demolición de acabado de piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (70)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Desmonte de cielo raso en madera en aula de música y danzas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (71)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Aplicación de pintura en perfiles

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio a 10 de agosto - 2023

FOTOGRAFÍA (71)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Retiro de escombro aula de danzas

Anexo 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6M1MYBOUp26AqHt7/7p1/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71646877	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.649.961-8
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	**TELÉFONO**	7122685
ASEGURADO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66 63	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66 63	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENICIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.4146207 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 12/11/2024	252.252.335,00	317.366,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 11/05/2027	63.063.083,75	123.520,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	252.252.335,00	558.833,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 567.567.753,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	999.719,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	999.719,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	189.947,00
TOTAL A PAGAR	$	1.189.666,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/12/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71646877	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

GRUPO 2
.
TOMADOR DE LA POLIZA CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CONFORMADO POR
GNG PROYECTOS SAS BIC NIT 901477828-7 (50%) Y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT 901383717-3 (50%)
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UN VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011. (DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100235369** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION / BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION** , expedida por la Compañía en **15/06/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **15** días del mes **JUNIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71646877

Fecha de Facturación	15/06/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100235369
Periodo Facturado	22/12/2022 — 21/01/2029

Fecha Límite de Pago	15/07/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	999.719,00
IVA	189.947,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.189.666,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CR 49 104 B 49	901649961
Intermediario	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **15/07/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71646877

Fecha de Facturación	15/06/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100235369
Periodo Facturado	22/12/2022 — 21/01/2029

Fecha Límite de Pago	15/07/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	999.719,00
IVA	189.947,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.189.666,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CR 49 104 B 49	901649961
Intermediario	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000071646877(3900)000001189666(96)20230715

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900716468773(900)000001189666(96)20230715

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre
