Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

Yopal, 06 de septiembre de 2023

ELABORADO POR: Francisco Alberto Sandoval Olaya

OBJETIVO(S):

Informar a la Supervisión las actividades realizadas, del periodo comprendido del 04/08/2023 al 03/09/2023, en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. *SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y No. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.*

1. CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

Objeto	**REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 *CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA*, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.**
Duración del Contrato:	cinco (5) meses
Valor del Contrato:	$ 14.137.200,00
Fecha suscripción del contrato	02/05/2023
Fecha De Inicio:	04/05/2023
Fecha de Terminación:	03/10/2023
Periodo del Informe	04/08/2023 – 03/09/2023
Número de periodo:	4 de 5
Estado físico:	*Hasta la fecha 03/09/2023, el Contrato de Prestación de Servicios* Profesionales presenta una ejecución del 80%, contra una programada de 100% Total.

2 CAPÍTULO II: ACTIVIDADES CONTRACTUALES

En los términos expuestos detallo las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto contractual, así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

1.1 Acopiar la documentación producida en la etapa contractual relacionada con el componente estructural y de instalaciones y, llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría.

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

LOGROS:

- Se realizan comunicaciones respecto al contrato de Interventoría No. 0874 con la empresa CONSORCIO VIVIENDA MANI 2023, que se relacionan a continuación:
  - Documentación del 09-08-2023 mediante radicado No. 08512 donde la Empresa Interventora presenta informe mensual No. 3 (Anexo No. 1).
  - Acta de comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 2).
  - Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)
  - Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 4).
  - Resolución aclaratoria No. 1 de la asignación de subsidios al proyecto mediante resolución 0034 del 03 de marzo de 2023. (Anexo No. 5).
  - Memorando 0223, el cual solicita la publicación en el secop II de la prórroga suscrita entre la Gobernación de Casanare y el Consorcio Vivienda Maní 2023 en el contrato No. 0874. (Anexo No. 6).
  - Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0688 del 29-08-2023 respecto a la solicitud de actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga suscrita del contrato No. 0874. (Anexo No. 7).

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXOS No. 1,2,3,4,5,6, y 7).**

Anexo 1. Documentación con radicado No. 08512 del 09-08-2023.
Anexo 2. *Acta de comité técnico del 10-08-2023.*
Anexo 3. Oficio con radicado No. 0640 del 14-08-2023.
Anexo 4. Acta de comité técnico del 16-08-2023.
Anexo 5. Resolución aclaratoria No. 1 del 28-08-2023.
Anexo 6. Memorando 0223 del 29-08-2023.
Anexo 7. Oficio con radicado No. 0688 del 29-08-2023.

- ✓ (Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 1.1).

1.2 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el avance administrativo de la aplicación de subsidios.

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

LOGROS:

- Se realizo comité de seguimiento y concertación técnica con la asistencia de la Interventoría, relacionado a continuación:
  - Acta de comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" donde se citaron temas de avance en las viviendas y revisión de los estados contractuales para aceptar la prórroga del contrato de Interventoría. (Anexo No. 2).
  - Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 donde se reviso el avance físico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 2 y 4).**

Anexo 2. Acta de comité técnico del 10-08-2023.
Anexo 4. Acta de comité técnico del 16-08-2023.

- ✓ *(Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 1.2).*

1.3 Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.

LOGROS:

- Para esta actividad, se cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de incumplimiento por parte del contratista, por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar en el presente informe.

EVIDENCIA: *Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el* archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. (SIN ANEXOS).

2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

2.1 Verificar que la interventoría cumpla con todas las funciones y actividades técnicas de los componentes estructurales y de instalaciones correspondientes al seguimiento de la aplicación de subsidios mediante la construcción de las 15 viviendas.

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

LOGROS:

- De acuerdo a lo conversado y citado en la reunión técnica en obra el día 16-08-2023 donde se revisó el avance físico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).

Anexo 4. Acta de comité técnico del 16-08-2023.

- ✓ (Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 2.1).

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(Anexo No. 4).**

2.2 Seguimiento a la interventoría en cuanto al cumplimiento en la entrega de los informes mensuales sobre la ejecución y programación de las obras encaminadas a la aplicación de subsidios.

LOGROS:

- La interventoría da cumplimiento a la presentación del informe mensual relacionado en la documentación del 09-08-2023 mediante radicado No. 08512 donde la Empresa Interventora presenta informe mensual No. 3 de Interventoría contrato No. 0874 del 2023. (Anexo No. 1).

- Durante el comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto se dio *aceptación después de la revisión del Informe de Interventoría No. 2 en donde no* existieron observaciones y se da cumplimiento a la obligación contractual de la Interventoría. (Anexo No. 2).

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 1 y 2).**

Anexo 1. Documentación con radicado No. 08512 del 09-08-2023.
Anexo 2. Acta de comité técnico del 10-08-2023.

- ✓ (Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 2.2).

2.3 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

LOGROS:

- Se evidencia que en el informe mensual de Interventoría No. 3; se realiza seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental. (Anexo No. 1).

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

EVIDENCIA: *Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el* archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 1).**

Anexo 1. Documentación con radicado No. 08512 del 09-08-2023.

- ✓ (Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 2.3).

2.4 Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.

LOGROS:

- Durante la estructuración del proyecto, se evidencia que el mismo contiene los documentos que involucran las actividades de permisos y licencias para la construcción de los subsidios asignados mediante la resolución No. 0034 del 2023.

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(SIN ANEXOS).**

3. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO

3.1 Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten y hacer las recomendaciones en *el componente estructural y de instalaciones a que haya lugar.*

LOGROS:

- Se realizo la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" y aceptados en el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 3).**

Anexo 3. Oficio con radicado No. 0640 del 14-08-2023.

- ✓ *(Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 3.1).*

3.2 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones al contrato de interventoría por razones debidas al componente estructural y de instalaciones.

LOGROS:

- Se realizo la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE *con código BPIN 2022005850016" y aceptados en* el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 3).**


Anexo 3. Oficio con radicado No. 0640 del 14-08-2023.

- ✓ (Anexo 1 CD: Soportes anexos ACTIVIDAD 3.2).

3.3 Suministrar la información administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este.

LOGROS:

- Se realizo cargue de información sobre el avance del proyecto en el aplicativo Gesproy mes cumplido correspondiente a julio 2023 el día 14 de agosto de 2023, para dar cumplimiento al seguimiento del Sistema General de Regalías, como se evidencia en la siguiente imagen:

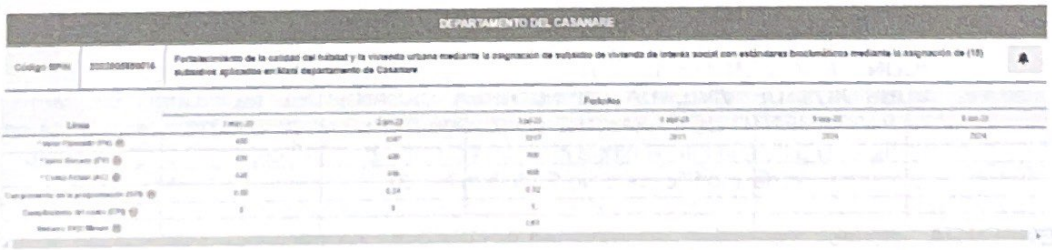

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(SIN ANEXO).**

3.4 Las demás actividades que requiera la administración y sean solicitadas por la supervisión en el desarrollo del proyecto de inversión.

LOGROS:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02.

- *Para esta actividad, se cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de* incumplimiento por parte del contratista, por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar en el presente informe.

EVIDENCIA: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la *secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto* sectorial urbano. **(SIN ANEXOS).**

PRODUCTO:

META DE PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PLAN 2023
Asignar subsidio de vivienda nueva o usada para hogares urbanos en el departamento de Casanare.	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda.	-	**213,20**

Para este periodo, esta actividad tiene un 80% de cumplimiento.

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
C.P.S.P. 0964 DE 2023
Contratista

Revisó:
Álvaro Alexander Álvarez
Profesional especializado

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
C.C.	1.020.808.320 DE BOGOTA D.C.
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/05/2023
FECHA ACTA DE INICIO	04/05/2023
PLAZO	Cinco (5) meses
TERMINACIÓN	*03/10/2023*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.137.200,00
FORMA DE PAGO	Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante cinco (5) mensualidades cada una por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 2.827.440,00), para un total de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS *M/CTE ($14.137.200,00)*; los pagos se realizaran previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato. Para efectos de cada pago se afectará el siguiente rubro presupuestal; 2.04.0.M.00AD.04001.1402.2022005850016.01 por un valor de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($14.137.200,00).

El siguiente informe se genera como resultado de la verificación de los soportes del informe de actividades No. 4, correspondiente al periodo del 04/08/2023 al 03/09/2023, presentado por el contratista, conforme contrato de la referencia.

ACTIVIDADES	SOPORTES ANEXOS VERIFICADOS
Actividad 1.1 Acopiar la documentación producida en la etapa contractual relacionada con el componente estructural y de instalaciones y, llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría.	
El apoyo a la supervisión estuvo presente en comunicaciones respecto al contrato de Interventoría No. 0874 con la empresa CONSORCIO VIVIENDA MANI 2023, que se relacionan a *continuación:* ➢ Documentación del 09-08-2023 mediante radicado No. 08512 donde la Empresa Interventora presenta informe mensual No. 3 (Anexo No. 1). ➢ *Acta de comité técnico realizado el día 10-08-*2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA	**Evidencia:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la *oficina juridica, así como los informes de* actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXOS No. 1,2,3,4,5,6, y 7).**

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 2). ➢ Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3) ➢ Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 4). ➢ Resolución aclaratoria No. 1 de la asignación de subsidios al proyecto mediante resolución 0034 del 03 de marzo de 2023. (Anexo No. 5). ➢ Memorando 0223, el cual solicita la publicación en el secop II de la prórroga suscrita entre la Gobernación de Casanare y el Consorcio Vivienda Maní 2023 en el contrato No. 0874. (Anexo No. 6). ➢ Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0688 del 29-08-2023 respecto a la solicitud de actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga suscrita del contrato No. 0874. (Anexo No. 7).	
ACTIVIDAD 1.2 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el avance administrativo de la aplicación de subsidios.	
El apoyo a la supervisión estuvo presente en el comité de seguimiento y concertación técnica con la asistencia de la Interventoria, relacionado a continuación: ➢ Acta de comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" donde se citaron temas de avance en las viviendas y revisión de los estados contractuales para aceptar la prórroga del contrato de Interventoria. (Anexo No. 2). ➢ Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 donde se revisó el avance fisico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).	**Evidencia:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina juridica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 2 y 4).**

ACTIVIDAD 1.3 Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.	
Para esta actividad, El apoyo a la supervisión cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de incumplimiento por parte del contratista, por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar en el presente informe.	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(SIN ANEXOS).**
ACTIVIDAD 2.1 Verificar que la interventoría cumpla con todas las funciones y actividades técnicas de los componentes estructurales y de instalaciones correspondientes al seguimiento de la aplicación de subsidios mediante la construcción de las 15 viviendas.	
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en lo conversado y citado en la reunión técnica en obra el dia 16-08-2023 donde se revisó el avance físico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(Anexo No. 4).**
ACTIVIDAD 2.2 Seguimiento a la interventoría en cuanto al cumplimiento en la entrega de los informes *mensuales sobre la ejecución y programación de las obras encaminadas a la aplicación de subsidios.*	
El apoyo a la supervisión cumple con el seguimiento a la interventoría avalando el cumplimiento a la presentación del informe mensual en el acta de reunión del 10-08-2023. (Anexo No. 2)	**EVIDENCIA**: Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 2).**
ACTIVIDAD 2.3 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.	
El apoyo a la supervisión evidencia que en el informe mensual de Interventoría No. 3; se realiza seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental. (Anexo No. 1).	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 1).**
ACTIVIDAD 2.4 Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.	
De acuerdo a la estructuración del proyecto, se evidencia que el mismo contiene los documentos que involucran las actividades de permisos y licencias para la construcción de los subsidios asignados mediante la resolución No. 0034 del 2023.	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente

	de proyecto sectorial urbano. **(SIN ANEXOS).**
ACTIVIDAD 3.1 Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten y hacer las recomendaciones en el componente estructural y de instalaciones a que haya lugar.	
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en la realizo la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" y aceptados en el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 3).**
ACTIVIDAD 3.2 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones al contrato de interventoría por razones debidas al componente estructural y de instalaciones.	
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" y aceptados en el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(ANEXO No. 3).**
ACTIVIDAD 3.3 Suministrar la información administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este.	
El profesional apoyo el cargue de información sobre el avance del proyecto en el aplicativo Gesproy mes cumplido correspondiente a julio 2023 el día 14 de agosto de 2023, para dar cumplimiento al seguimiento del Sistema General de Regalías.	***EVIDENCIA:*** *Informes mensuales* generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. ***(SIN ANEXOS).***
ACTIVIDAD 3.4 Las demás actividades que requiera la administración y sean solicitadas por la supervisión en el desarrollo del proyecto de inversión.	
Para esta actividad, se cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de incumplimiento por parte del contratista, *por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar* en el presente informe.	**EVIDENCIA:** Informes mensuales generados en la plataforma contractvs la cual reposan en el archivo central de la oficina jurídica, así como los informes de actividades los cuales reposan en la secretaria de desarrollo social y mujer-dirección técnica de vivienda/ expediente de proyecto sectorial urbano. **(SIN ANEXOS).**

ESTADO FINANCIERO

INFORME No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 Y NO. INTERNO 0964 DE 2023-05-02

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 14.137.200,00	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		$ 11.309.760,00
SALDO POR FACTURAR DEL CONTRATO		$ 2.827.440,00
SUMAS IGUALES	**$ 14.137.200,00**	**$ 14.137.200,00**

Una vez verificadas las actividades contractuales y los soportes entregados por el profesional; la Supervisión valida el informe No. 4 de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 04/08/2023 y el 03/09/2023, evidenciando un avance de ejecución del 80%. Así mismo, se realizó la verificación de pagos de aportes a la seguridad social correspondiente al periodo de agosto 2023 cumpliendo con los pagos de acuerdo al ingreso base cotización.

JOHANA MARITZA PEÑA GUTIERREZ
No. Cédula 33.646.605 de Aguazul
Director técnico de Vivienda
Acta de posesión No. 0011 del 29/06/2022

Revisó:
Álvaro Alexander Alvarez
Profesional Especializado

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 - CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 de 2023-05-02 cuyo Objeto: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.

Yopal, 06 de Septiembre del 2023.

Doctor(a)
JOHANA MARITZA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR(A) DE VIVIENDA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 - CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 de 2023-05-02.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 04/08/2023 hasta 03/09/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2023-05-04

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-10-03

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-10-03

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $14.137.200,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $14.137.200,00 M.L.C.

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 - CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 de 2023-05-02 cuyo Objeto: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL *COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.*

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 03/09/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 presenta una ejecución del 80% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$14.137.200,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$14.137.200,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.827.440,00	$0,00	$2.827.440,00
VALOR INFORME No. 2	$2.827.440,00	$0,00	$2.827.440,00
VALOR INFORME No. 3	$2.827.440,00	$0,00	$2.827.440,00
PRESENTE INFORME	$2.827.440,00	$0,00	$2.827.440,00
POR EJECUTAR	$2.827.440,00		
TOTAL	$14.137.200,00	$0,00	$11.309.760,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $2.827.440,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. *FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.* 1.1 Acopiar la documentación producida en la etapa contractual relacionada con el componente estructural y de instalaciones y, llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría. 1.2 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el avance administrativo de la aplicación de subsidios. 1.3 Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato. 2. FUNCIONES TÉCNICAS. 2.1 Verificar que la interventoría cumpla con todas las funciones y actividades técnicas de los componentes estructurales y de instalaciones correspondientes al seguimiento de la aplicación de subsidios mediante la construcción de las 15 viviendas. 2.2 Seguimiento a la interventoría en cuanto al cumplimiento en la entrega de los informes mensuales sobre la ejecución y programación de las obras encaminadas a la aplicación de subsidios. 2.3 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 2.4 Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual. 3. FUNCIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 3.1 Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten y hacer las recomendaciones en el componente estructural y de instalaciones a que haya lugar. 3.2 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones al contrato de interventoría por razones debidas al componente estructural y de instalaciones. 3.3 Suministrar la información administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. 3.4 Las demás actividades que requiera la administración y sean solicitadas por la *supervisión en el desarrollo del proyecto de inversión.*

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 - CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 de 2023-05-02 cuyo Objeto: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL *COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.*

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
El apoyo a la supervisión estuvo presente en comunicaciones respecto al contrato de Interventoría No. 0874 con la empresa CONSORCIO VIVIENDA MANI 2023, que se relacionan a continuación: Documentación del 09-08-2023 mediante radicado No. 08512 donde la Empresa Interventora presenta informe mensual No. 3 (Anexo No. 1). Acta de comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE *SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO* DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 2). Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3) Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016". (Anexo No. 4). Resolución aclaratoria No. 1 de la asignación de subsidios al proyecto mediante resolución 0034 del 03 de marzo de 2023. (Anexo No. 5). Memorando 0223, el cual solicita la publicación en el secop II de la prórroga suscrita entre la Gobernación de Casanare y el Consorcio Vivienda Maní 2023 en el contrato No. 0874. (Anexo No. 6). Oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0688 del 29-08-2023 respecto a la solicitud de actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga suscrita del contrato No. 0874. (Anexo No. 7).	80	1.1
El apoyo a la supervisión estuvo presente en el comité de seguimiento y concertación técnica con la asistencia de la Interventoría, relacionado a continuación: Acta de comité técnico realizado el día 10-08-2023 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, *DEPARTAMENTO DE CASANARE* con código *BPIN 2022005850016*" donde se citaron temas de avance en las viviendas y revisión de los estados contractuales para aceptar la prórroga del contrato de Interventoría. (Anexo No. 2). Acta de comité técnico realizado en obra el día 16-08-2023 donde se revisó el avance físico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).	80	1.2
Para esta actividad, se cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de incumplimiento por parte del contratista, por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar en el presente informe.	80	1.3
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en lo conversado y citado en la reunión técnica en obra el día 16-08-2023 donde se revisó el avance físico del proyecto y se evidenciaron observaciones las cuales fueron perfeccionadas en el acta para mejorar el rendimiento en actividades de obra. (Anexo No. 4).	80	2.1
El apoyo a la supervisión cumple con el seguimiento a la interventoría avalando el cumplimiento a la presentación del informe mensual en el acta de reunión del 10-08-2023. (Anexo No. 2)	80	2.2
El apoyo a la supervisión evidencia que en el informe mensual de Interventoría No. 3; se realiza seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental. (Anexo No. 1).	80	2.3
De acuerdo a la estructuración del proyecto, se evidencia que el mismo contiene los documentos que involucran las actividades de permisos y licencias para la construcción de los subsidios asignados mediante la resolución No. 0034 del 2023.	80	2.4
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en la realizo la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" y aceptados en el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)	80	3.1
El apoyo a la supervisión estuvo inmerso en la revisión y aprobación del componente estructural propuesto y aceptado en el Modificatorio No. 1 de los subsidios otorgados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE con código BPIN 2022005850016" y aceptados en el oficio dirigido a la Interventoría mediante el radicado 0640 del 14-08-2023 respecto a la aprobación del modificatorio No 1. (Anexo No. 3)	80	3.2
El profesional apoyo el cargue de información sobre el avance del proyecto en el aplicativo Gesproy mes cumplido correspondiente a julio 2023 el día 14 de agosto de 2023, para dar cumplimiento al seguimiento del Sistema General de Regalías.	80	3.3

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 - CAS-OAJ-CDPSP-0617-2023 de 2023-05-02 cuyo Objeto: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN EL *COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.*

Para esta actividad, se cita que no hubo hechos o situaciones las cuales fueran objeto de incumplimiento por parte del contratista, por lo que no es imputable algún acto administrativo para notificar en el presente informe.	80	3.4

F. OBSERVACIONES:
Anexo 1 CD y planilla de seguridad social.

Atentamente,

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

JOHANA MARITZA PEÑA GUTIERREZ
Supervisor(a)

V.°B.°:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Yopal, 06 de Septiembre del 2023.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1020808320 de BOGOTÁ, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0964 del Dos(02) de Mayo de 2023, cuyo Objeto es "REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) NRO. 0874 DE 2023-03-23 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE *SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE* CASANARE" EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 04/08/2023 hasta 03/09/2023, por un valor de $2.827.440,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
Anexo 1 CD y planilla de seguridad social.

JOHANA MARITZA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR(A) DE VIVIENDA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020808320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4515756888	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995680007		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 342.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 342.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1020809320
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCION:	CRA 29 NO 13 35	TELEFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	59-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4515750888	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/04	NUMERO AUTORIZACION:			8995690007

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000		$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-33	14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	SUBSTITUCIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COL EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																								ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
CC 1020809320	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA		59-INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO															230301-PORVENIR	$ 185.600	1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	$ 145.000	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.200	1.160.000	0,522	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 342.800

Planilla Pagada
